

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

Distrito Santiago de Cali, Julio 23 de 2026

CI-165-2026

Ingeniero

DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA

Supervisor Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.005-2022

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.005-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. 2000.46.01 .005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA

Asunto: Entrega Informe Mensual Interventoría Mes Junio de 2026

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio hacemos entrega del informe mensual de interventoría No. 38, al contrato de obra 2000.13.05.003.2022, EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA.", correspondiente al período 1 al 30 de Junio de 2026. Incluye los informes, reportes, anexos, soportes y demás información especificada en cada uno de los documentos.

Se presenta en original y copia.

Atentamente,



Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

Representante Legal Consorcio Interguacari

Interventor

Copia: Ing. Holmes Zúñiga García – Apoyo a la Supervisión Vallecaucana de Aguas

Archivo

INFORME DE INTERVENTORIA No. 38

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: JUNIO 30 DE 2026

INFORME DE INTERVENTORIA No. 38

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: JUNIO 30 DE 2026

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: _____

Representante de la Interventoria



 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
FECHA: JUNIO 30 DE 2026		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
INFORME No. 38					
CONTRATO: 2000.13.12.005-2022					
CONTENIDO					
ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S	S		
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S	S		
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S		
2.1	SANCIONES	N	N		
3	CONTROL FINANCIERO	S	S		
4	CONTROL DE EJECUCION	S	S		
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s	S		
5	ANEXOS	S	S		
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S	S		
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S	S		
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S	S		
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S	S		
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S	S		
5.6	RECURSO HUMANO	S	S		
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S	S		
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S	S		
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S	S		
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S	S		
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S	S		
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S	S		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORIA					
INFORME No. 38			PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA ☒		OTRO ☐ ESPECIFIQUE:	
1. INFORMACION GENERAL					
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA			1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA		
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022			CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01 .005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA			OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."		
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI			CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ			REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL		
PLAZO INICIAL: 16 MESES			PLAZO INICIAL: 13 MESES		
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022			ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022		
VALOR INICIAL: \$ 1.502.246.766			VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933		
CDR INICIAL No. 13041			CDR INICIAL No. 13039 - 13040		
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024			FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024		
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A			FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023		
VALOR ADICION (ES): \$ 131.126.000			VALOR ADICION (ES): \$N/A		
CDR OTRO SI (1) No. 16431			CDR OTRO SI (1) No. N/A		
VALOR ACTUAL: \$ 1.633.372.766			VALOR ACTUAL: \$29.432.080.933		
PLAZO ADICIONAL: N/A			PLAZO ADICIONAL: N/A		
FECHA DE TERMINACION: N/A			FECHA DE TERMINACION: N/A		
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A			FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		
VALOR ADICION (ES): \$ N/A			VALOR ADICION (ES): \$2.571.146.616		
CDR OTRO SI (2) No. N/A			CDR OTRO SI (2) No. 16430		
VALOR ACTUAL: \$N/A			VALOR ACTUAL: \$32.003.227.549		
PLAZO ADICIONAL: N/A			PLAZO ADICIONAL: N/A		
FECHA DE TERMINACION: N/A			FECHA DE TERMINACION:		
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): 10 JULIO 2025			FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): 08 JULIO 2025		
VALOR ADICION (ES): \$ 690.624.799			VALOR ADICION (ES): \$ 13.531.646.339		
CDR OTRO SI (3) No. N/A			CDR OTRO SI (3) No.		
VALOR ACTUAL: \$ 2.323.997.565			VALOR ACTUAL: \$45.534.873.888		
PLAZO ADICIONAL: SIETE MESES			PLAZO ADICIONAL: NUEVE MESES		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-SEPTIEMBRE-2024			FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-JUNIO-2024		
FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023			FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023		
FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024			FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024		
PLAZO ADICIONAL No. 01: 15-ABRIL-2025			PLAZO ADICIONAL No. 01: 14-MARZO-2025		
PLAZO ADICIONAL No. 02: 22 DE FEBRERO DE 2026			PLAZO ADICIONAL No. 02: 22-ENERO-2026		
PLAZO ADICIONAL No. 03: 22 DE AGOSTO DE 2026			PLAZO ADICIONAL No. 03: 22-JULIO-2026		
DATOS DE LA SUPERVISIÓN					
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando			DIEGO JOSÉ CALDERÓN VILLANUEVA		
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. que conoció de la ejecución del contrato			HOLMES ZUÑIGA GARCIA		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME No. 38		INFORME DE INTERVENTORÍA		
		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."				
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	☒	OTRO ☐ ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)	
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI			
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI			
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoría.	SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME No. 38		INFORME DE INTERVENTORÍA		
		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."				
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO
		ESPECIFIQUE:		
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.		SI		
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación		SI		
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.		SI		
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.		SI		
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.		SI		
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos per la entidad competente (cuando aplique intervenciones).		SI		
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.		SI		
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.		SI		
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.		SI		
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.		SI		
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.		N/A		
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.		SI		
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativas a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).		SI		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME DE INTERVENTORÍA				
INFORME No.	38	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."				
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO
		ESPECIFIQUE:		
14.	Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15.	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16.	Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17.	El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI		
18.	El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de obra contratada por la entidad.	SI		
19.	El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI		
20.	Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21.	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI		
22.	Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.	SI		
23.	Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI		
24.	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI		
25.	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	SI		
26.	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No. 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		OTRO	
27. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.		SI			
28. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.		SI			
29. Reportar la informacion relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el contratante.		SI			
30. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando par su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.		SI			
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:					
1. informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o case fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.		SI			
2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.		SI			
3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Valleducana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.		SI			
4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.		SI			
5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelacion al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal minimo requerido para la ejecución del contrato, con excepcion de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.		SI			
6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.		SI			
7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les-asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No. 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
					ESPECIFIQUE:
8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.		SI			
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.		SI			
10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyude su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasion del contrato.		N/A			
11. Asumir por su cuenta y riesgo, el page de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgo que se deriven de la contratacion. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio para el pago del RETEICA		SI			
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.					
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.		SI			
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.		SI			
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.		SI			
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No. 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
					ESPECIFIQUE:
5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.		SI			
6. También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.		N/A			
7. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances acompañados y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras.		N/A			
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.		SI			
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, y en general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No. 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
					ESPECIFIQUE:
12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
14. Suministrar a la interventoria oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados fines y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoria o la supervisión estime convenientes.		N/A			
15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.		SI			
16. Pactar con la interventoria de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizarlo y validarlo, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sino existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		N/A			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME No. 38		INFORME DE INTERVENTORÍA			
		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.		SI			
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.		N/A			
19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		SI			
20. No interferir la interventoria pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.		SI			
21. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. requeridos para la construcción de la obra. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoria, el contratante o sus representantes.		N/A			
22. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		SI			
23. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfección de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoria y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		N/A			
24. Entregar al contratante los planos record de la obra.		N/A			
25. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.		N/A			
26. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoria.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
27. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratación el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.		SI			
28. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No. 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
					ESPECIFIQUE:
29. Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentará a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:		SI			
PLAN DE TRABAJO DE OBRA					
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO		SI			
PLAN DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SI			
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		SI			
INFORME DE LABORES		SI			
BITÁCORA		SI			
ÍTEMS NO PREVISTOS		SI			
INFORME FINAL		N/A			
Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuación se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serialización Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.		SI			
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.		N/A			
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.		SI			
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..		N/A			
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante		SI			
En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.		SI			
La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No. 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
					ESPECIFIQUE:
El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.		SI			
Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de tránsito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado técnico-mecánico.		SI			
Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.		SI			
Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitación que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las seriales luminosas deben ser de luz opaca.		SI			
Apoyar en el trámite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.		SI			
Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc.		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORÍA					
INFORME No. 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		OTRO	
El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.		SI		ESPECIFIQUE:	
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de direccion del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicacion a la comunidad.		SI		ESPECIFIQUE:	
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion Municipal o a terceros		SI		ESPECIFIQUE:	

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI						Código: FO-PDA-4	
										Versión: 1	
				INFORME DE INTERVENTORIA						Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME No. 38				PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026							
2. CONTROL DE GARANTIAS											
2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA					
Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Cumplimiento	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	30-Nov-24	SUSPENSION 1	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25	REINICIO	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25	ADICIONAL EN VALOR	\$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	\$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25	PLAZO ADICIONAL	\$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
PLAZO ADICIONAL	\$ 163.337.276,60	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Aug-26	PLAZO ADICIONAL	\$ 6.400.645.509,80	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jul-26
ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 232.399.756,50	C-100050628 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	9-Jul-25	22-Aug-26	ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 9,106,974,777.60	C-100050102 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	4-Jul-25	22-Jul-26
PLAZO ADICIONAL	\$ 232.399.756,50	C-100050628 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-27	PLAZO ADICIONAL	\$ 9,106,974,777.60	C-100050102 ANEXO 11	SEGUROS MUNDIAL	21-Jan-26	22-Jan-27
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Buen Manejo del Anticipo	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	30-Nov-24	SUSPENSION 1	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25	REINICIO	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25	ADICIONAL EN VALOR	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	\$ 450.674.030,80	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25	PLAZO ADICIONAL	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
PLAZO ADICIONAL	\$ 450.647.029,80	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Aug-26	PLAZO ADICIONAL	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jul-26
ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 450.647.029,80	C-100050628 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	9-Jul-25	22-Aug-26	ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	4-Jul-25	22-Jul-26
PLAZO ADICIONAL	\$ 450.647.029,80	C-100050628 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-27	PLAZO ADICIONAL	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 11	SEGUROS MUNDIAL	21-Jan-26	22-Jan-27
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
SUSPENSION 1	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	31-May-27	SUSPENSION 1	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	30-Jun-27	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Apr-27
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jul-27	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-May-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Sep-27	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Jun-27
REINICIO	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-27	REINICIO	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Jun-27
ADICIONAL EN VALOR	\$ 81.668.638,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Sep-27	ADICIONAL EN VALOR	\$ 1.600.161.378,95	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Jun-27
PLAZO ADICIONAL	\$ 81.668.639,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15/94/2028	PLAZO ADICIONAL	\$ 1.600.161.378,95	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Mar-28
PLAZO ADICIONAL	\$ 81.668.638,30	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Feb-29	PLAZO ADICIONAL	\$ 1.600.161.377,45	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jan-29

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 116.199.878,25	C-100050628 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	9-Jul-25	22-Aug-26	ADICIONAL EN VALOR 2	\$2.276.743.694,40	C-100050102 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	4-Jul-25	22-Jan-29
PLAZO ADICIONAL	\$ 116.199.878,25	C-100050628 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Aug-29	PLAZO ADICIONAL	\$ 2.276.743.694,40	C-100050102 ANEXO 11	SEGUROS MUNDIAL	21-Jan-26	22-Jul-29
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29	Estabilidad	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
SUSPENSION 1	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-May-24	31-May-29	SUSPENSION 1	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	1-Mar-24	1-Mar-29
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	30-Jun-24	30-Jun-29	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	1-Apr-24	1-Apr-29
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Jul-24	31-Jul-29	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	1-May-24	1-May-29
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
REINICIO	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	REINICIO	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
ADICIONAL EN VALOR	\$ 490.011.829,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	ADICIONAL EN VALOR	\$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
PLAZO ADICIONAL	\$ 490.011.830,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	15-Apr-24	15-Apr-30	PLAZO ADICIONAL	\$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Mar-25	14-Mar-30
PLAZO ADICIONAL	\$ 490.011.829,80	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-31	PLAZO ADICIONAL	\$ 9.600.968.264,70	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	22-Jan-26	22-Jan-31
ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 697.199.269,50	C-100050628 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-31	ADICIONAL EN VALOR 2	\$13.660.462.166,40	C-100050102 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Jan-26	22-Jan-31
PLAZO ADICIONAL	\$ 697.199.269,50	C-100050628 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Aug-26	22-Aug-31	PLAZO ADICIONAL	\$ 13.660.462.166,40	C-100050102 ANEXO 11	SEGUROS MUNDIAL	22-Jul-26	22-Jul-31
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
SUSPENSION 1	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-May-24	SUSPENSION 1	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Mar-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	30-Jun-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Apr-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-Jul-24	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-May-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
REINICIO	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-24	REINICIO	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	ADICIONAL EN VALOR	\$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	15-Apr-25	ADICIONAL EN VALOR	\$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Mar-25
PLAZO ADICIONAL	\$ 427.050.000,00	C-100012719 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	22-Feb-26	PLAZO ADICIONAL	\$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	22-Jan-26
ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 427.050.000,00	C-100012719 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	22-Feb-26	ADICIONAL EN VALOR 2	\$ 2.276.743.694,40	C-100012551 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	22-Jan-26
PLAZO ADICIONAL	\$ 427.050.000,00	C-100012719 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	22-Aug-26	PLAZO ADICIONAL	\$ 2.276.743.694,40	C-100012551 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	22-Jul-26

2.1 SANCIONES

[illegible]

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI								Código: FO-PDA-4	
		INFORME DE INTERVENTORIA								Versión: 1	
										Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME No. 38				PERIODO:		01 AL 30 DE JUNIO DE 2026					
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		\$ 450.674.029,8	Anticipo (30 %)	23/12/2022	\$N/A	%		\$ 8.829.624.297,9
Acta No. 1	31-May-23	\$ 427.238.980	26,16%	\$ 128.171.694	\$ 299.067.286	Acta No. 1	31-May-23	\$8.371.066.842	26,16%	\$2.511.320.053	\$5.859.746.789
Acta No. 2	30-Jun-23	\$ 45.217.628	2,77%	\$ 13.565.288	\$ 31.652.340	Acta No. 2	30-Jun-23	\$886.015.856	2,77%	\$265.804.757	\$620.211.099
Acta No. 3	30-Mar-24	\$ 72.195.076	4,42%	\$ 21.658.523	\$ 50.536.553	Acta No. 3	31-Jan-24	\$907.712.127	2,84%	\$272.313.639	\$635.398.488
Acta No. 4	14-Jun-24	\$ 18.783.787	1,15%	\$ 5.635.136	\$ 13.148.651	Acta No. 4	30-Mar-24	\$503.892.952	1,57%	\$151.167.886	\$352.725.066
Acta No. 5	20-Jun-24	\$ 376.165.748	23,03%	\$ 112.849.724	\$ 263.316.024	Acta No. 5	30-Apr-24	\$369.286.058	1,15%	\$110.785.818	\$258.500.240
Acta No. 6	16-Aug-24	\$ 30.870.745	1,89%	\$ 9.261.224	\$ 21.609.521	Acta No. 6	31-May-24	\$7.371.115.364	23,03%	\$2.211.334.610	\$5.159.780.754
Acta No. 7	13-Sep-24	\$ 19.658.237	1,20%	\$ 5.897.471	\$13.760.766	Acta No. 7	31-Jul-24	\$604.131.566	1,89%	\$181.239.470	\$422.892.096
Acta No. 8	30-Sep-24	\$ 35.139.507	2,15%	\$ 10.541.852	\$24.597.655	Acta No. 8	31-Aug-24	\$385.455.620	1,20%	\$115.636.686	\$269.818.934
Acta No. 9	12-Nov-24	\$ 62.044.616	3,80%	\$ 18.613.385	\$43.431.231	Acta No. 9	30-Sep-24	\$689.009.943	2,15%	\$206.702.983	\$482.306.960
Acta No. 10	2-Dec-24	\$ 105.486.042	6,46%	\$ 31.645.813	\$73.840.229	Acta No. 10	8-Nov-24	\$1.216.561.098	3,80%	\$364.968.330	\$851.592.768
Acta No. 11	1-Feb-25	\$ 35.207.836	2,16%	\$ 10.562.351	\$24.645.485	Acta No. 11	30-Nov-24	\$2.068.353.769	6,46%	\$620.506.131	\$1.447.847.638
Acta No. 12	13-Mar-25	\$ 117.987.100	7,22%	\$ 35.396.130	\$82.590.970	Acta No. 12	28-Feb-25	\$690.349.724	2,16%	\$207.104.917	\$483.244.807
Acta No 13	15-Jul-25	\$ 84.651.904	3,64%	\$ 25.395.571	\$59.256.333	Acta No. 13	10-Mar-25	\$2.313.472.543	7,23%	\$694.041.763	\$1.619.430.780
Acta No.14	13-Aug-25	\$ 215.730.600	9,28%	\$ 21.479.868	\$194.250.732	Acta No. 14	15-Jul-25	\$ 1.659.841.253,00	3,12%	\$497.952.376	\$1.161.888.877
Acta No. 15	16/10/2025	27.254.704	1.17%	\$ -	\$27.254.704	Acta No. 15	13-Aug-25	\$ 4.230.011.773,00	9,29%	\$418.744.861	\$3.811.266.912
Acta No. 16	18/11/2025	37.648.761	1.62%	\$ -	\$37.648.761	Acta No. 16	30/09/2025	\$ 534.405.953	1.17%	\$0	\$534.405.953
Acta No. 17	4/12/2025	22.020.655	0.95%	\$ -	\$22.020.655	Acta No. 17	18/11/2025	\$ 736.963.238	1.62%	\$0	\$736.963.238
Acta No. 18	11/03/2026	36.826.266	1.59%	\$ -	\$36.826.266	Acta No. 18	25/11/2025	\$ 431.777.557	0,95%	\$0	\$431.777.557
Acta No. 19	20/04/2026	25.602.869	1.1%	\$ -	\$25.602.869	Acta No. 19	11/03/026	\$ 722.083.648	1,59%	\$0	\$722.083.648
Acta No. 20	17/06/2026	23.478.627	1,01%			Acta No. 20	20/04/2026	\$ 502.017.049	1,10%	\$0	\$502.017.049
						Acta No. 21	17/06/2026	\$ 460.365.240	1,01%	\$0	\$460.365.240
	TOTALES	\$ 1.819.209.688	78,30%	\$ 450.674.029,8	\$1.819.209.688			\$35.653.889.173	78,30%	\$ 8.829.624.279,9	\$26.824.264.893

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 78,3 % (CONSTRUCCION TANQUE PTAP GINEBRA, CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ALBANIA , INTERVENCIONES FLOCULADORES , SEDIMENTADORES, UNIDADES DE FILTRACION , SOPLADORES, SISTEMA ELECTRICO EN LA PTAP GINEBRA Y FLOCULADORES , SEDIMENTADORES , UNIDADES FILTRACION MODULO B, SOPLADORES MODULOS A - B Y SISTEMA ELECTRICO EN LA PTAP DE GUACARÍ, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 14" TRAMO 3, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 10" TRAMO 2 , SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 18" TRAMO 1, CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA VALVULAS DE PURGA , VENTOSAS Y QUIEBRE DE PRESION EN EL TRAMO 3)

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME No. 38	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
5. SEGURIDAD SOCIAL		
El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Angela Rosa Chavez Martinez, con número de tarjeta profesional 273857-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.		
 Firma del Interventor Contrato No. _____		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORÍA		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME No	38	PERIODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
6. ANEXOS				
6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).				
6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.				
6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.				
6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.				
6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.				
6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional				
6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).				
6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .				
6.9 Informe del Contratista				
6. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO				
Se continua en la instalacion de tubería PEAD de 18 " Tramo 1 , presencia en las excavaciones con material de roca con rendimientos bajos en la instalacion , se debe solucionar con la Comunidad de Puente Rojo - Proteritorio, la continuidad con la instalacion de tubería PEAD de 10" entre Villa Indigo (Alto) a Puente Rojo y Cadica. Se encuentra en etapa de revision por parte de Vallecana de Aguas y la Interventoria el diseño del Ing. Carlos Valencia donde se va a implementar la malla Coanda, para evitar la construcción del desarenador. Se encuentra en etapa final el presupuesto de la bocatoma. El personal que estaba bajo observacion medica por un posible caso de tuberculosis salio negativo las pruebas y esta laborando nuevamente en el tramo No. 01				
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES				
• Las labores en la obra continúan desarrollándose en cuatro frentes de trabajo: - PTAP de Guacarí: Filtración Modulo B, puesta en marcha y se inicia con el Modulo A , terminar con el sistema electrico para pruebas Retie. - PTAP de Ginebra: Se termina con el relleno perimetral para poder iniciar la instalacion de la tubería de entrega y salida al tanque de almacenamiento - Frente Familia Blum – Saavedra: A la espera de que la Comunidad deje laborar para continuar con la instalación tubería PEAD 10 ", desde Villa Indigo (El Alto) hasta llegar a la CADICA Tramo No. 02 • Con relación a los diseños de la Bocatoma, el contratista ya hizo entrega de los Estudios de Geología y Geotecnia, Diseño Hidráulico y Estructural de la Captación, Hidráulica Fluvial, Rediseño de Bocatoma, Vallecana de Aguas y la Interventoria Consorcio Interguacari termino de revisar los diseños estructurales con el Vo.Bo. • Pendiente por entregar: Presupuesto de la Bocatoma y Malla Coanda • El frente del Tramo 3 se continua con la construccion de camaras en concreto para válvulas de ventosas , purgas y quiebre de presion. Ademas se continua con pruebas hidrostáticas • En el predio de la Familia Saavedra - Blum falta la prueba hidraulica en la Tubería PEAD 10" en una L: 600 ml. • Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato • Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se les ha solicitado y permisos de demoliciones de pavimento ya hay resolucion de aprobacion por parte del Municipio de Ginebra • Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista, • Los acercamientos con los líderes del sector de Puente Rojo y Proteritorio ha sido escaso y de manera unilateral fueron suspendidos por parte de la Comunidad el día 20 de Enero 2026 la ejecución de la obra en el tramo de Villa Indigo a Puente Rojo y no permitieron realizar ningun tipo de intervencion en la via a pesar que ya cuenta con la resolucion de la Alcaldia de Ginebra. El día 06 de Mayo de 2026 ,integrantes de Proteritorio suspendio las labores de excavacion a maquina en el tramo No. 01 desde Batea Bananos a Puente Amarillo manifestando que Vallecana ha incumplido unos acuerdos que nada tiene que ver con el contrato de obra en ejecucion. • Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales. • Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo. • Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 30 de Junio de 2026:				
AVANCE (%) FISICO : 79,2 FINANCIERO : 78,3				

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4	
		INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 1	
				Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 38					
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO					
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION			
	SEDIMENTADOR No. 3 - PTAP GINEBRA	En servicio			
	SEDIMENTADOR No. 2 - PTAP GINEBRA	En servicio			
	SEDIMENTADOR No. 1 - PTAP GINEBRA	En servicio			
	Tanque de almacenamiento La Albania y Tanque Planta PTAP GINEBRA:	Rellenos perimetrales en etapa de culminacion. Actividades por ejecutar: • Losa superior de cámaras de entrada y salida • Instalación de sistema de válvulas • Instalación tubería de desagüe • Conexión al sistema existente			
	FILTRACION PTAP GINEBRA:	Filtros: No. 1 , No. 02 y No. 03 se encuentran en servicio			
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GINEBRA:	En servicio			
	MURO DE CONTENCIÓN - PTAP GINEBRA:	En comité de obra se decide que este muro no es necesario construirlo. El terreno es estable y no hay ningún tipo de riesgo en esta zona			
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 2	Se termina la instalación tubería PEAD 10 ", en predio otorgado mediante Servidumbre por parte de la Familia Saavedra - Blum. Falta la prueba hidrostática. Además falta tramo por instalar desde Villa Indigo hasta la CADICA			
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 3	Se continúa con la construcción de cámaras en concreto para válvulas de ventosas , purgas y quiebre de presión Se realizó la prueba hidrostática en los tramos desde el Uval a el Mister y tramo de Ingenio Pichichi , salió positiva la prueba Estado General Tramo 3: se han instalado 7.567 ml en Tubería PEAD diámetro 14"			
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 1	Se termina la instalación de tubería PEAD 18 " entre las abscisas K0+925 y K1+030 , K0+350 y K0+450 , K1+170 y K1+250. Se inicia la construcción del carcamo en una longitud de 80 ml como prueba piloto. Se termina la temporada de lluvias . Hay acceso vehicular en este sector.			
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GUACARÍ:	Se ejecutaron las siguientes actividades: - Instalación de la estructura metálica y cubierta - Instalación de los dos sistemas de sopladores - Instalación del sistema de tubería en acero inoxidable de 3 "para la inyección del aire a los filtros Modulos A y B			
	SEDIMENTADOR N° 1 - PTAP GUACARÍ:	En servicio			
	SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GUACARÍ:	En servicio			
	SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GUACARÍ:	En servicio			
	FILTRACION PTAP GUACARÍ:	Estado Actual Filtración: Modulo B Son tres filtros - Salieron positivas las pruebas con Acuavalle y están en servicio Acuavalle ya libero los filtros del Modulo A , se inicio con el Filtro No. 01 con demoliciones de canaletas en concreto y retiro de material de filtración: antracita y gravas.			
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)					
No.	DESCRIPCION	CONTENIDO			
1	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 38	SE ANEXA DOCUMENTO			
2	INFORME No 38 DE INTERVENTORIA INCLUYE INFORME DE SST Y COMPONENTE SOCIAL	SE ANEXA DOCUMENTO			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA				Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS							
FECHA:		JUNIO 30 DE 2026					
MATERIAL:							
CANTIDAD PARA PRUEBA:							
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:		Carreras y lavados filtracion Ptap Guacari					
LOCALIZACION:		PTAP GUACARI					
LABORATORIO:							
NORMA - ESPECIFICACION:							
ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO (Mpa)	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES	
	Control de asentamiento (Tanque Ginebra)						
	Control de asentamiento (Tanque Albania)						
	Carreras y lavados filtracion Ptap Ginebra						
	Nota: Se adjuntan Resultados en El Informe Tecnico						

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
I. LICENCIAS AMBIENTALES			
ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	
	INFORME AMBIENTAL	INFORMACION CONSIGNADA DENTRO DE LOS INFORMES DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA ANEXOS	
II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	SOLICITANTE:		
2	FUENTE RECEPTORA:		
3	PTAR:		
4	ESTADO:		
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):		
III. CONCESION DE AGUAS			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	SOLICITANTE:		
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:		
3	PTAP:		
4	ESTADO:		
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4
			Versión: 4
			Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES			
I. ASPECTOS SOCIALES			
ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	El contratista está cumpliendo con lo definido en el Plan de Gestión Social.	
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	En el mes de junio de 2026 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 78.57%	
3	Programa de Información a la Comunidad	La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.	
4	Programa de divulgación a la comunidad	En el mes de junio el contratista realizó la actualización de la información de la cartelera informativa en la Personería Municipal De Guacarí para la divulgación de los avances de obra a la comunidad.	
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidencia que el contratista ha dado cumplimiento a la actividad de reuniones con la comunidad establecida en el Plan de Gestión Social, mediante la realización de reuniones informativas y de concertación con las comunidades del área rural de los municipios de Ginebra y Guacarí, así como con los representantes de las Juntas de Acción Comunal de ambos municipios. Como resultado de estos espacios de diálogo y participación, la comunidad manifestó su disposición para permitir la ejecución de una prueba piloto consistente en la construcción de un cárcamo lateral destinado al alojamiento de la tubería, con el propósito de evaluar esta alternativa técnica y sus posibles beneficios en la mitigación de las afectaciones sobre la infraestructura vial y la movilidad del sector. En seguimiento a los compromisos adquiridos, se programará una nueva reunión con la comunidad para socializar los resultados de las actividades ejecutadas, presentar los avances del proyecto y concertar las acciones que se desarrollarán en las siguientes etapas de la intervención.	
6	Programa de atención a la comunidad	• Se mantiene habilitado el espacio del PAC con los formatos de PQRS, garantizando el acceso de la comunidad para la radicación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. • Se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias ubicados en la Personería de Guacarí y la Personería de Ginebra, sin evidenciarse PQRS radicadas por la comunidad durante el periodo evaluado. • Se efectuó seguimiento a las vallas informativas instaladas en las principales vías de acceso a los municipios de Ginebra y Guacarí, las cuales contienen información del contrato. Se evidenció que la valla ubicada en el municipio de Guacarí presenta actos de vandalismo, con daños visibles como roturas y grafitis.	
7	Programa de atención al ciudadano	El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos: Martes de 08:00 am a 12m Viernes 1:00 pm a 4:00 pm, Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - Corregimiento de Costa Rica, Municipio Ginebra, Valle del Cauca. Existen dos buzones de sugerencias ubicados en: 1. Personería de Guacarí. 2. Personería de Ginebra.	
8	Recorridos por la Obra	Durante el mes de junio se realizó recorrido de obra con veedores de los municipios de Ginebra y Guacarí- en las obras en las PTAP de Ginebra y Guacarí y se mostró la tubería instalada.	
9	Reunión de Avance de Obra	Se evidenció que el 18 de junio de 2026 el componente social del contratista llevó a cabo la reunión informativa sobre el avance de obra con los integrantes de la veeduría de ciudadanía de Guacarí y Ginebra.	
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	• Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto No. 10 del Plan de Gestión Social, mediante la conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana en los municipios de Guacarí y Ginebra. • La interventoría social participó y verificó que el 18 de junio de 2026 realizó de la reunión del comité de veeduría del municipio de Guacarí.	
11	Vinculación de mano de obra calificada y no calificada	Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 33 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 6 son mujeres, lo que representa el 21 % del personal, en cumplimiento de lo establecido en materia de contratación con enfoque de género. Así mismo, se verificó que 21 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 9 pertenecen al municipio de Ginebra y 12 al municipio de Guacarí, equivalente al 63% del total del personal, dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente en cuanto a la vinculación de personal de la zona. El contratista informó que durante el mes de junio realizaron 5 contrataciones nuevas.	
II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	ACTAS		
2	CORRESPONDENCIA		
3	VARIOS		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME DE INTERVENTORIA				
ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 38				
ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)	
I. PREDIOS				
	N/A			
II. SERVIDUMBRES				
No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)	
	Vía a el Ingenio Pichichi K6+350 a K6+850 Matricula inmobiliaria N° 373-112779	Dentro de las actividades que se realizaron en la obra fue la localización y replanteo del trazado de la tubería y dentro de este se tiene identificado una parte del trazado de la tubería fue planteado por un carreterable localizado dentro del predio identificado con la matricula inmobiliaria N° 373-112779 de propiedad del Ingenio Pichichi. Después de realizar el levantamiento topográfico se obtuvo que para continuar con el desarrollo del proyecto se requiere intervenir una longitud de 500 ml para la instalacion de tuberpia PEAD 350 MM PN 10 a una profundidad promedio de 1.45 mt.	FINALIZADO	
	Vía acceso planta de Ginebra	Permiso de intervención instalación tubería diámetro PEAD 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra ejecutado.	FINALIZADO	
III. PERMISOS				
No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)	
1	CVC	Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma desarenador, macromedidor y aducción.	Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 OTORGADO Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca"	
2	CVC	Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, d acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.	AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN	
3	CVC	PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo. Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto)	AMBIENTAL PARA PRÓRROGA Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024. Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024	
4	CVC	Permiso de Concesión de aguas superficiales	OTORGADO Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020 "Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" VIGENTE OTORGADO Resolución 740 No. 0741 0381 29-04-2024 Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.	
5	CVC	Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 38			
ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
6	Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público	OTORGADO Resolución No. 004-01 2023 26-01-2023 "Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público" VIGENCIA 26-01-2025 VIGENTE
7	Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público	OTORGADO Resolución No. 004-01 2023 26-01-2023 Por la cual se expide una licencia de intervención del espacio público para desarrollar un proyecto" VIGENCIA 03-02-2025 VIGENTE
8	Secretaría de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito	OTORGADO Resolución No. 900-50-020 20-03-2023 "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE
9	Secretaría de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito	OTORGADO "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE
10	Planeación Municipal Ginebra	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos: Tramo 1: Inicia desde la Bocatorna y finaliza en Puente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra	FINALIZADO
11	Planeación Municipal Guacarí	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo: Inicia desde la Abcisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí.	FINALIZADO
12	CVC	Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA En el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su recomendación para poder realizar esta compensación.	EN ESPERA DE RESPUESTA . Es este periodo visitan la obra dos funcionarios de la CVC, la Ingeniera Daniel Castillo y el Técnico Segundo Fiscal para a coordinar lo relacionado con la siembra por compensación en respuesta al requerimiento realizado por ACUVALLE y en cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal de la planta de Ginebra. Pero no se pudo hacer la visita a el predio debido a que no se dio la autorización para la visita, se debe reprogramar

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4
INFORME DE INTERVENTORIA				Versión: 1
				Fecha de Vigencia: 01/09/2025
ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 38				
I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	- Planificar la organización de la obra. - Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo de proyecto. - Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. - Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. - Controlar la documentación oficial de la obra. - Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	WILLIAM MORA JARAMILLO	ING. CIVIL	APOYO AL COORDINADOR DE PROYECTOS	- Planificar la organización de la obra. - Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo de proyecto. - Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. - Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. - Controlar la documentación oficial de la obra. - Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	DIEGO MONROY	ING. SANITARIO	APOYO A RESIDENTE DE OBRA HIDRAULICA	- Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. - Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. - Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. - Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. - Solicitar los materiales requeridos oportunamente. - Elaborar los reportes y avances de obra. - Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	- Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. - Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra - Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	- Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. - Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra - Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. - Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. - Solicitar los materiales requeridos oportunamente. - Elaborar los reportes y avances de obra. - Calcular las cantidades de obra ejecutada.
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	- Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. - Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. - Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. - Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. - Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad.

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4
		INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 1
				Fecha de Vigencia: 01/09/2025
ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 38				
I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	Altimetria - Planimetria- Carteras Topográficas
8	MARIA CAMILA GIL GIL	Ingeniera Ambiental	INGENIERO AUX. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	JUAN PABLO MONTENEGRO	Profesional-SST	PROFESIONAL-SST	• Responsable de la ejecucion del plan de gestión SST
10	ANA FERNANDA ROSERO	Ingeniera Civil	Apoyo al Residente de Obra	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas.
II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA RAMIREZ	INGENIERO SANITARIO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES	INGENIERO SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
4	JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ	TOPOGRAFO	TOPÓGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROL TOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
5	NEISLER ABADIA LONDOÑO	TRABAJORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
6	JULIANA IZQUIERDO MARULANDA	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
6	RODRIGO OBONAGA GAITAN	INGENIERO SANITARIO	APOYO AL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE HIDRAULICO
6	LUIS ARSENIO CUERO MURILLO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	INSPECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA
7	JULIAN ANDRADE	INGENIERO CIVIL	APOYO A LA DIRECCIÓN	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME N° 38

PERIODO:

01 AL 30 DE JUNIO DE 2026



ESTADO ACTUAL MODULO DE FILTRACION B PTAP GUACARI EN SERVICIO



ESTADO ACTUAL MODULO DE FILTRACION B PTAP GUACARI EN SERVICIO



ESTADO ACTUAL MODULO DE FILTRACION B PTAP GUACARI EN SERVICIO



EXCAVACION PARA PASE TRAMO 3 TUBERIA PEAD 14 PULGADAS - PICHICHI



EXCAVACION PARA PASE TRAMO 3 TUBERIA PEAD 14 PULGADAS - PICHICHI



COLOCACION FORMALETA CARCAMO TRAMO 1 TUBERIA 18 PULGADAS



COLOCACION FORMALETA CARCAMO TRAMO 1 TUBERIA 18 PULGADAS



ESTADO ACTUAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ALBANIA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME N° 38

PERIODO:

01 AL 30 DE JUNIO DE 2026



INICIO DE FUNDICION CARCAMO TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 PULGADAS



INICIO DE INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE MATERIAL ANTRACITA



INICIO DE INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE MATERIAL ANTRACITA



INICIO DE INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE MATERIAL GRAVA



COLOCACION DE SEÑALES CASETA ELECTRICA PTAP GUACARI



FUNDICION CAMARA DE VENTOSA TRAMO 3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025
ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME N° 38	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
			
FUNDICION CAMARA DE VENTOSA TRAMO 3		CARCAMO EN CONCRETO TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 PULGADAS	
			
INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE MATERIAL GRAVA		INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE FALSOS FONDOS	
			
INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE MATERIAL GRAVA		INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON DEMOLICION DE CANALETAS EN CONCRETO	
			
INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE REPELLO		INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON RETIRO DE REPELLO	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO		INFORME N° 38		PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
					
COLOCACION DE REFUERZO CAMARA DE CAMARA DE PRESION TRAMO 3		INTERVENCION FILTRACION MODULO A PTAP GUACARI CON REPELLO			
					
CANALETAS EN ACERO INOXIDABLE MODULO A PTAP GUACARI		PRUEBA HIDROSTATICA TRAMO 3 TUBERIA PEAD 14 PULGADAS			
					
FUNDICIO LOSA INFERIOR MODULO A FLTRACION PTAP GUACARI		MATERIAL GRANULAR A EMPLEAR EN EL MODULO A DE FLTRACION PTAP GUACARI			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI					Código: FO-PDA-4
							Versión: 1
		INFORME DE INTERVENTORIA					Fecha de Vigencia: 01/09/2025
ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO					PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO No. :		2000.13.05.003-2022					
OBJETO:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:		\$ 29.432.080.933,00					
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE					
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI					
PLAZO:		22 MESES					
VALOR ANTICIPO :		30%	\$ 8.829.624.279,80				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO	
1	ADMINISTRATIVOS				-	-	
2	EQUIPOS	\$ 1.744.905.661,00	\$ -		\$ 1.744.905.661,00	\$ -	
3	TRANSPORTES				\$ -	\$ -	
4	MATERIALES	\$ 6.125.300.150,00	\$ -		\$ 6.125.300.150,00	\$ -	
5	OTROS	\$ 959.418.469,00	\$ -		\$ 959.418.469,00	\$ -	
6	OTROS	\$ 10.542.663,00			\$ 10.542.663,00	\$ -	
	TOTALES	\$ 8.829.624.279,80	8.829.624.279,80		8.829.624.279,80	-	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORIA					
FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 37 MAYO DE 2026					
FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	
	30	6	2026	HORA DE FINALIZACIÓN :	
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS			MUNICIPIO:	GINEBRA/GUACARI
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :	
CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE				AVANCE DE OBRA (%)	79,20%
DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA					
COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL			SI	NO	N/A
AIRE				X	
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO				X	
EMISIONES DE RUIDO				X	
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS					
OTROS:					
SUELO			SI	NO	N/A
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA				X	
PROCESOS EROSIVOS				X	
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				X	
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)				X	
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD				X	
OTROS:					
AGUA			SI	NO	N/A
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA				X	
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS				X	
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES				X	
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS				X	
OTROS:					
FLORA Y FAUNA			SI	NO	N/A
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL			X		
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES				X	
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS				X	
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS				X	
AFECTACIÓN A HÁBITATS				X	
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS				X	
OTROS:					
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES			SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)			X		
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS			X		EN IMPLEMENTACION
PERMISO DE VERTIMIENTOS				X	
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL			X		PENDIENTE DE AUTORIZAR EN LA ZONA BOCATOMA
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS				X	
OTROS:					
SOCIOECONÓMICO			SI	NO	N/A
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			X		
ACTAS DE VECINDAD			X		
ACTAS DE RECIBO				X	
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES			X		
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS				X	
PREDIOS AFECTADOS				X	
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				X	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA				X	
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA			X		
MANO DE OBRA LOCAL			X		
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS				X	
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL				X	
GESTIÓN SOCIO -PRELIAL			X		
OTROS:					
OBSERVACIONES:					

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/09/2025	
INFORME DE INTERVENTORIA					
FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS					
FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	10
	5	7	2026	HORA DE FINALIZACIÓN:	12
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA:	
CONSORCIO:	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)	96%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	JUAN PABLO MONTENEGRO			NOMBRE PROF. SST INTERVENTORIA:	JULIANA IZQUIERDO M.
DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA					
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.	1			Se anexan soportes de pago de seguridad social	
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	1				
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1			En el mes de Junio no se presentaron accidentes, se reporta ausentismo por enfermedad común. El reporte en el caso de tuberculosis salio negativo. El Ingeniero Florez esta incapacitado por un mes por accidente de transito fuera de la obra	
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES	1			Se programa plan de trabajo para el año 2026.	
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1			Se adjunta registro fotografico de las inducciones en las que se tratan los temas de politicas y objetivos SST.	
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1			Se adjuntas formatos AROS para actividades de alto riesgo.	
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1			Se realizan inspecciones de equipos de emergencia y se mantiene en lugares estrategicos para su utilizacion.	
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1			Capacitar al personal brigadista en habilidades de liderazgo, comunicacion efectiva y coordinacion durante emergencias, con el fin de fortalecer su capacidad de guia y respuesta ante una evacuacion.	
SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS	1			Se delimita la zona de excavacion	
CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1			Se implementa y se deja registro fotografico	
EXTINTORES	1			Se implementa y se deja registro fotografico	
BOTIQUIN	1			Se implementa y se deja registro fotografico	
KIT DE DERRAMES	1			No hay uso de sustancias toxicas	
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).	1			Anexo del informe	
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, IPS, POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC)	1			Cartelera informativa SST	
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL	1				
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1			Se programa conformacion para COPASST Y COCOLA	
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS.	1			Aun no adjunta la certificacion por parte de la ARL y el ministerio de trabajo del porcentaje de cumplimiento del sisteme de gestion.	
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL		1			
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS	1			Se adjunta registro fotografico	
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O PLAN DE FORMACIÓN	1				
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN	1			Se presenta ATS para las actividades de alto riesgo	
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	1			Se divulga las politicas SST al personal operativo subcontratista y al personal	
PUNTO ECOLOGICO	1				
TOTAL	23	1	0		
CUMPLIMIENTO	96%				
OTROS:					
OBSERVACIONES:					

RECOMENDACIONES PARA LOS INTERVENTORES

1.- Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que el CONTRATISTA y/o INTERVENTORIA, requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. En todo caso, el supervisor deberá aprobar previamente el reemplazo.

En tal sentido se reitera verificar y evidenciar en los informes mensuales, el personal profesional presentado por el Contratista y/o Interventoria (equipo de trabajo) con su cargo, formación académica, y porcentaje de dedicación propuesto.

Formulario de personal mínimo requerido para el contrato de suministro y mantenimiento de agua potable en Vallecana de Aguas S.A. E.S.P. El formulario incluye una tabla con columnas para Cargo, Cantidad, y Personal, y una sección para el personal mínimo requerido.

Ejemplo de una propuesta de personal mínimo requerido presentado por el Contratista a Vallecana de Aguas.

En relación con el Coordinador Ambiental esté deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:

- 1.- Identificación de aspectos e impactos ambientales
- 2.- Plan de manejo para la mitigación de impactos ambientales identificados y generados en el desarrollo de la obra.
- 3.- Orden, limpieza y aseo en la obra.
- 4.- Informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique una intervención inmediata que genere impactos al ambiente y/o los recursos naturales.

En relación con el Coordinador Social este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:

- 1.- Acta de reunión con los comités de veeduría y/o ciudadanos que soliciten en el punto de atención a la comunidad
- 2.- Relación de PQRS, en cuadro indicar el número de quejas, inquietudes, reclamos y solicitudes que se presenten en el mes, con su respuesta y/o tratamiento a la misma, en caso de no presentarse indicar.
- 3.- Abrir y cerrar las Actas de Vecindad, que sean necesario tramitar, en los frentes de obra a intervenir por el contratista
- 4.- Fijar horario de atención a la comunidad, colocándolo en una cartelera visible.
- 5.- Participar de los comités de técnico de obra, veeduría y comités sociales en Vallecana de Aguas S.A. E.S.P. cuando se programen.

En relación con el Coordinador de seguridad y salud en el trabajo este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:

- 1.- Porcentaje de avance mensual de plan de trabajo SST.
- 2.- Evidencias del desarrollo del plan de emergencia y su brigada.
- 3.- Indicadores de EP, EG, IT, AT.
- 4.- Evidencia de entrega de Elementos de Protección Personal.
- 5.- Evidencia del desarrollo del programa de Capacitación.
- 6.- Evidencia de participación y consulta de los trabajadores en actividades del SG-SST.
- 7.- Seguridad Social Vigente de los trabajadores vinculados.
- 8.- Otros Hallazgos, así como informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique influyan en la Seguridad y Salud de los trabajadores.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

INFORME No. 38 DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005- 2022

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 200.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA “EJECUTAR EL PLAN DE OBRA PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

**CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**

**INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**

**SUPERVISOR
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA**

DISTRITO SANTIAGO DE CALI – JUNIO 2026

INFORMACION GENERAL

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933.00) M/CTE
Valor inicial	\$ 29.432.080.933.00
Valor Adición No.01	\$ 2.571.146.616.00
Valor Adición No. 02	\$ 13.531.646.339.00
Valor Total del Contrato	\$ 45.534.873.888.00
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Inicio:	Diciembre 1 de 2022
Plazo de ejecución del proyecto	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Fecha de Terminación:	Enero 1 de 2024
Fecha de suspensión No.01:	Dos meses a partir de Julio 27 de 2023
Prorroga No. 01 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Septiembre del 2023
Prorroga No. 02 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Octubre del 2023
Prorroga No. 03 a la Suspensión No.01	45 días a partir del 27 de Noviembre del 2023
Fecha de reinicio:	Enero 10 de 2024
Nueva fecha de terminación:	Junio 14 de 2024
Adicional en Tiempo No.01	Nueve (09) meses
Fecha de terminación prorroga	Marzo 14 de 2025
Adicional en Tiempo No.02	Diez (10) meses
Fecha de terminación prorroga	Enero 22 de 2026
Adicional en Tiempo No.03	Seis (06) meses
Fecha de terminación prorroga	Julio 22 de 2026

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico y financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2026.

2.1 COMITÉS DE OBRA

Durante este mes se realizó un comité de obra, al cual asistieron funcionario de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari.

2.1.1 – Junio 17 de 2026

Se realiza la reunión en las instalaciones de la PTAP de Guacari, durante este comité se tratan temas generales de cada una de la PTAP's, tanto en Ginebra como en Guacari.



2.2 OTRAS REUNIONES

2.2.1 – Junio 19 de 2026

Se realiza la reunión en las instalaciones de la Gobernación del Valle, con la Dra. Dilian Francisca Toro, Representantes de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, para mostrar los avances físicos y financieros de la obra.

Se adjunta presentación en Power Point de lo citado.

2.2 COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO

OBRA:

A la fecha se han tramitado veintiún actas parciales de obra, relacionadas así:

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		\$ 29.432.080.933	
Valor adicionado No. 01:		\$ 2.571.146.616	
Valor adicionado No. 02:		\$ 13.531.646.339	
Valor total del contrato:		\$ 45.534.873.888	
Valor Acta Parcial No. 1:	\$ 8.371.066.842		18,38%
Valor Acta Parcial No. 2:	\$ 886.015.856		1.95%
Valor Acta Parcial No. 3:	\$ 907.712.127		1.99%
Valor Acta Parcial No. 4:	\$ 503.892.952		1.11%
Valor Acta Parcial No. 5:	\$ 369.286.058		0.81%
Valor Acta Parcial No. 6:	\$ 7.371.115.364		16.19%
Valor Acta Parcial No. 7:	\$ 604.131.566		1,33%
Valor Acta Parcial No. 8:	\$ 385.455.620		0,85%
Valor Acta Parcial No. 9:	\$ 689.009.943		1,51%
Valor Acta Parcial No. 10:	\$ 1.216.561.098		2,67%
Valor Acta Parcial No. 11:	\$ 2.068.353.769		4,54%
Valor Acta Parcial No.12	\$ 690.349.724		1.52%
Valor Acta Parcial No.13	\$ 2.313.472.543		5.08%
Valor Acta Parcial No.14	\$ 1.659.841.253		3.65%
Valor Acta Parcial No. 15	\$ 4.230.011.773		9.29%
Valor Acta Parcial No.16	\$ 534.405.953		1.17%
Valor Acta Parcial No. 17	\$ 736.963.238		1.62%
Valor Acta Parcial No. 18	\$ 431.777.557		0.95%
Valor Acta Parcial No. 19	\$ 722.083.648		1.59%
Valor Acta Parcial No. 20	\$ 502.017.049		1.10%
Valor Acta Parcial No. 21	\$ 460.365.240		1.01%
Total, cancelado a la fecha:	\$ 35.653.889.173		78.3%
Saldo por ejecutar:	\$ 9.880.984.715		21.7%
Sumas iguales:	\$ 45.534.873.888	\$ 45.534.873.888	100,00%

Tabla No. 1. Relación pago actas parciales de obra al contratista

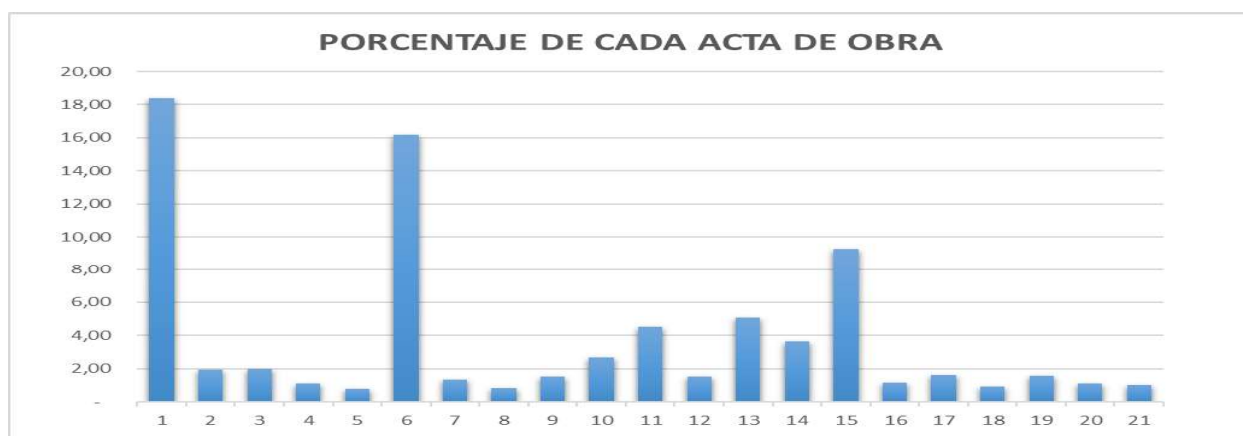


Figura No. 1. Gráfico de la relación de pagos de actas parciales de obra

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	% amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			\$ 8.829.624.279.90	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	\$ 2.511.320.053		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	\$ 265.804.757		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	\$ 272.313.639		3,08%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	\$ 151.167.886		1,71%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	\$ 110.785.818		1,25%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	\$ 2.211.334.610		25,04%
Amortización acta Parcial N° 7:	31/07/2024	\$ 181.239.470		2,05%
Amortización acta Parcial N° 8:	31/08/2024	\$ 115.636.686		1,31%
Amortización acta Parcial N° 9:	30/09/2024	\$ 206.702.983		2,34%
Amortización acta Parcial N° 10:	08/11/2024	\$ 364.968.330		4,13%
Amortización acta Parcial N° 11:	30/11/2024	\$ 620.506.131		7,03%
Amortización acta Parcial N° 12:	31/01/2025	\$ 207.104.917		2,35%
Amortización Acta Parcial No.13	10/02/2025	\$ 694.041.763		7.86%
Amortización Acta Parcial No.14	10/07/2025	\$ 497.952.376		5.62%
Amortización Acta Parcial No.15	13/08/2025	\$ 418.744.860.90		4.76%
Valor amortizado		\$ 8.829.624.279.90		100.00 %
Saldo por amortizar:		\$ 0.00		0.00%
Sumas iguales:		\$ 8.829.624.279.90	\$ 8.829.624.279.90	100,00%

Tabla N° 2. Relación amortización anticipo

Nota: Ya se amortizó la totalidad del Anticipo

INTERVENTORIA

A la fecha se han tramitado 20 actas parciales de interventoría, relacionadas así:

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		\$ 1.502.246.766	
Valor adicionado No. 01:		\$ 131.126.000	
Valor adicionado No. 02:		\$ 690.624.799	
Valor total del contrato:		\$ 2.323.997.565.	
Valor Acta Parcial No. 1:	\$ 427.238.980		18.38%
Valor Acta Parcial No. 2:	\$ 45.217.628		1.95%
Valor Acta Parcial No. 3:	\$ 72.195.076		3.1%
Valor Acta Parcial No. 4:	\$ 18.783.787		0.81%
Valor Acta Parcial No. 5:	\$ 376.165.748		16.17%
Valor Acta Parcial No. 6:	\$ 30.870.745		1.33%
Valor Acta Parcial No. 7:	\$ 19.658.237		0,85%
Valor Acta Parcial No. 8:	\$ 35.139.507		1.52%
Valor Acta Parcial No. 9:	\$ 62.044.616		2.67%
Valor Acta Parcial No. 10:	\$ 105.486.042		4.54%
Valor Acta Parcial No. 11	\$ 35.207.836		1.51%
Valor Acta Parcial No. 12	\$ 117.987.100		5.08%
Valor Acta Parcial No. 13	\$ 84.651.904		3.64%
Valor Acta Parcial No. 14	\$ 215.730.600		9.28%
Valor Acta Parcial No. 15	\$ 27.254.704		1.17%
Valor Acta Parcial No. 16	\$ 37.648.761		1.62%
Valor Acta Parcial No. 17	\$ 22.020.655		0.95%
Valor Acta Parcial No. 18	\$ 36.826.266		1.59%
Valor Acta Parcial No. 19	\$ 25.602.869		1.10%
Valor Acta Parcial No. 20	\$ 23.478.627		1.01%
Total, cancelado a la fecha:	\$ 1.819.209.688.00		78.3%
Saldo por ejecutar:	\$ 504.787.877.00		21.7%
Sumas iguales:	\$ 2.323.997.565	\$ 2.323.997.565	100,00%

Tabla No. 3. Relación de pagos actas parciales interventoría

Relación de la amortización del anticipo realizados a la interventoría:

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	Porcentaje % amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			\$ 450.674.029.80	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	\$ 128.171.694		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	\$ 13.565.288		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	\$ 21.658.523		4,81%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	\$ 5.635.136		1,25%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	\$ 112.849.724		25,04%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	\$ 9.261.224		2,05%
Amortización acta Parcial N° 7:	13/09/2024	\$ 5.897.471		1,31%
Amortización acta Parcial N° 8:	30/09/2024	\$ 10.541.852		2,33%
Amortización acta Parcial N° 9:	12/11/2024	\$ 18.613.385		4,13%
Amortización acta Parcial N° 10:	02/12/2024	\$ 31.645.813		7,02%
Amortización acta Parcial N° 11:	01/31/2025	\$ 10.562.351		2,34%
Amortización Acta Parcial No. 12:	11/03/2025	\$ 35.396.130		7,86%
Amortización Acta Parcial No. 13:	10/07/2025	\$ 25.395.571		5,63%
Amortización Acta parcial No. 14	13/08/2025	\$ 21.479.867.80		4,76%
Valor amortizado		\$ 450.674.029.80		100.00%
Saldo por amortizar:		\$ 0.00		
Sumas iguales:		\$ 450.674.029.80	\$ 450.674.029.80	100,00%

Tabla No. 4. Relación amortización del anticipo realizados a la interventoría


Nota: Ya se amortizó la totalidad del Anticipo

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano para los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras a construir son:

- Bocatoma
- Línea de Aducción
- Desarenador (No se va a construir. se está desarrollando un proyecto para construir la versión de Malla Coanda)
- Cámara de distribución de caudal – CADICA
- Viaductos en Puente Amarillo , Puente Rojo y La Magdalena
- Líneas de Conducción en tubería PEAD: Tramo 1 en 18” entre la Bocatoma y CADICA – Tramo 2 en 10 “ entre CADICA y PTAP de Ginebra y Tramo 3 en 14” entre CADICA y PTAP de Guacarí.
- Intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí en las unidades de floculación, sedimentación filtración y almacenamiento.

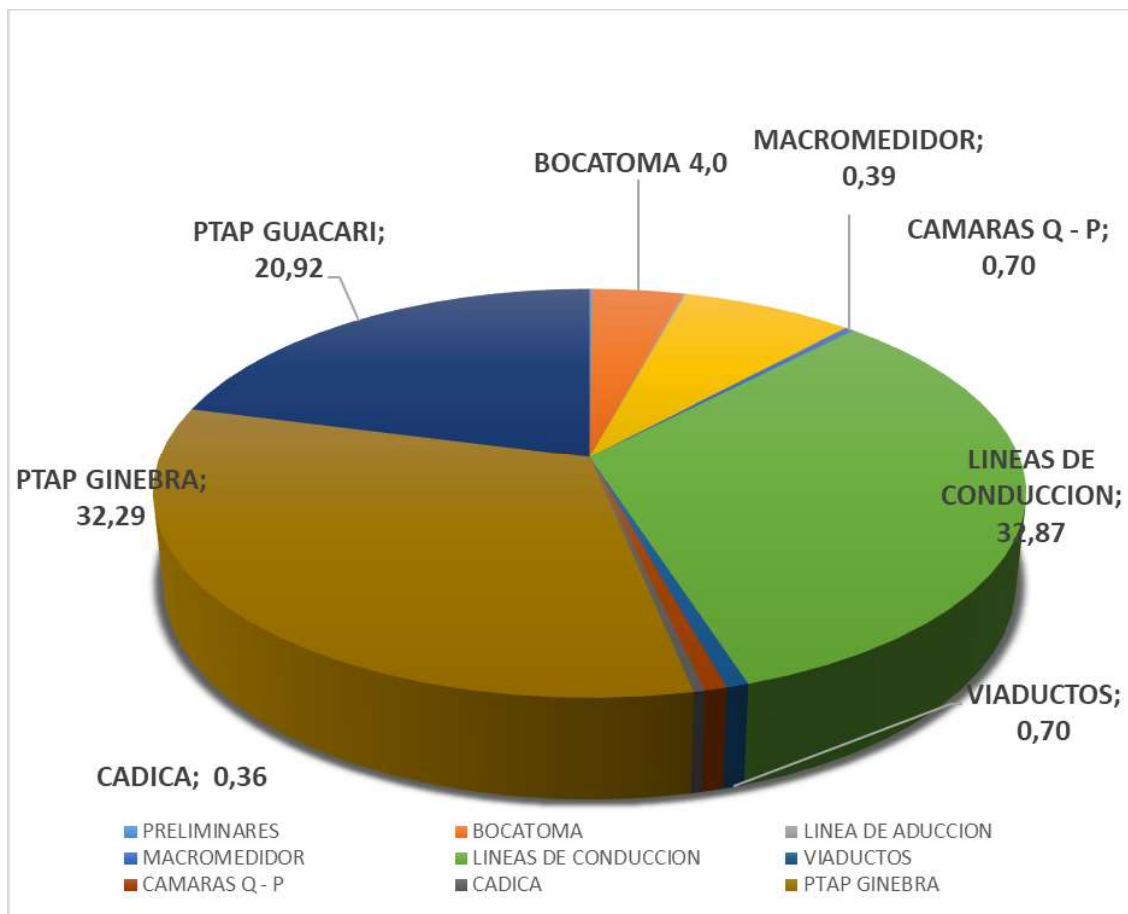

2.3 COMPONENTE TECNICO

Durante el mes de Junio de 2026, se desarrollan actividades en:



A. BOCATOMA

1. Tipo de Bocatoma: Lateral sobre el Rio Guabas
2. Caudal de Captación: 233 Lps
3. Caudal de Derivación a Guacari: 164.5 Lps
4. Caudal de Derivación a Ginebra: 68.5 Lps

Estado del Nuevo Diseño Bocatoma: Se contrato con el Ing. Carlos Valencia para implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del desarenador.

El diseño estructural ya tuvo concepto favorable por parte de la Interventoría

Nota: Se encuentra en etapa de elaboración de presupuesto por parte del Contratista.

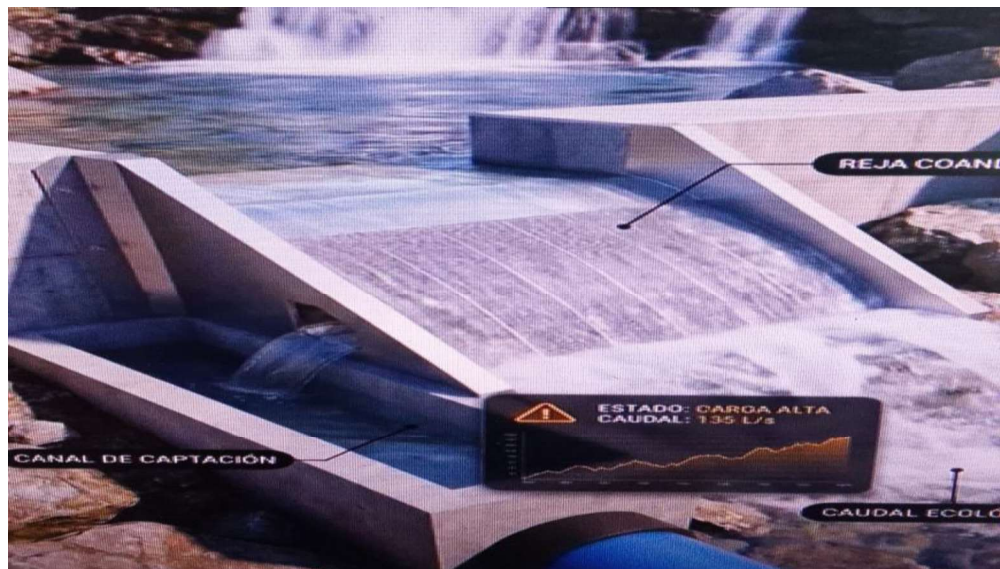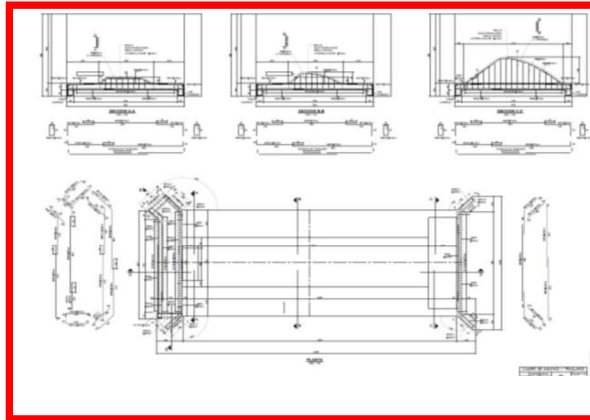

B. ADUCCIÓN

1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18" L: 6.0 ml
2. Caudal: 233 Lps


Estado Actual Línea de Aducción: Se contrato nuevo diseño con el Ing. Carlos Valencia para implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del desarenador.

Se encuentra en la última etapa de revisión presupuestal por parte del contratista

C. DESARENADOR

1. Caudal de diseño: No aplica


Estado Actual: Según el nuevo diseño **NO** se va a construir, se va a reemplazar por la malla Coanda

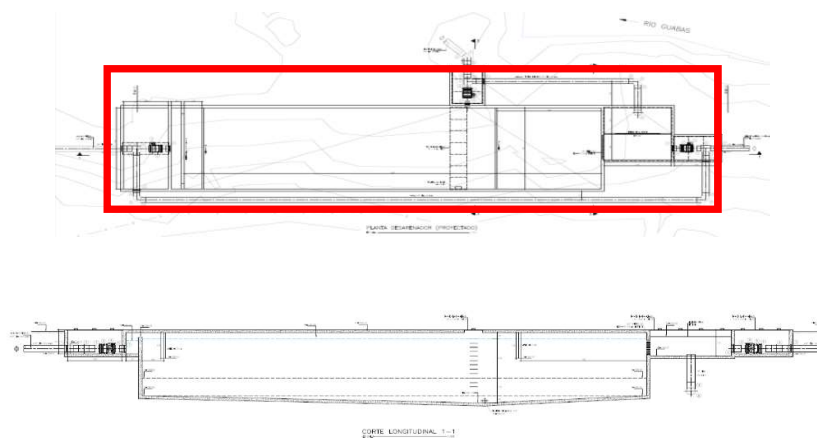

1.1 Dimensiones Exteriores (No aplica)

Largo: 38 mts
Ancho: 8 mts
Profundidad: 5 mts

D. MACROMEDIDOR

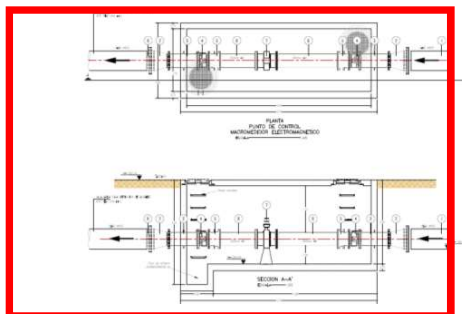


Sin ejecución.

2. CONDUCCIÓN

2.1 Tramo 1 Bocatoma – CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD DN 18" – L=3450ml

Estado Actual Tramo 1: En ejecución.

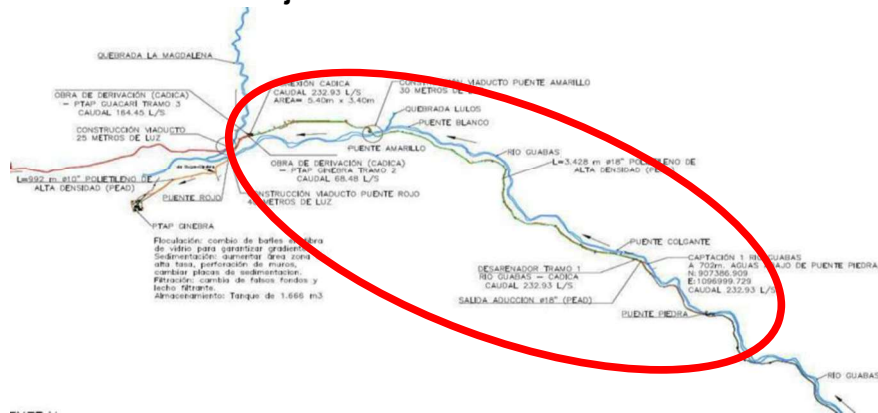


Fundición cárcamo entre las K1+170 a K1+250



Porcentaje de Ejecución: 16 %

D.2 CADICA: Cámara de Distribución de caudales

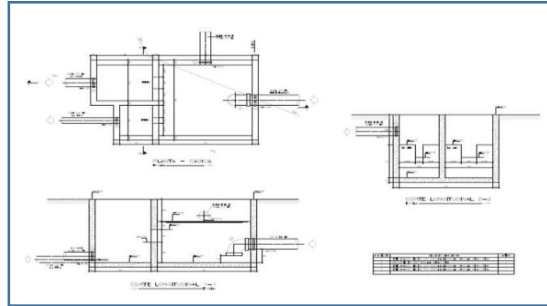

D 2.1 Dimensiones Exteriores

Largo: 5.4 mts

Ancho: 3.4 mts

Profundidad: 3 mts

Estado Actual CADICA: **Sin ejecución.**


Nota:

Se aprobó el cambio de lugar la CADICA, según la Ing. Gina López – encargada de la revisión hidráulica por parte del Contratista, se va a ubicar aguas arriba donde está proyectada, 81 ml aguas arriba donde estaba proyectada.

La revisión hidráulica donde la propone tiene el concepto favorable.

D.3 Tramo 2 CADICA en Puente Rojo a PTAP Ginebra: Tubería PEAD diámetro 10" – L=1000ml

Estado Actual Tramo 2: **Sin ejecución.**

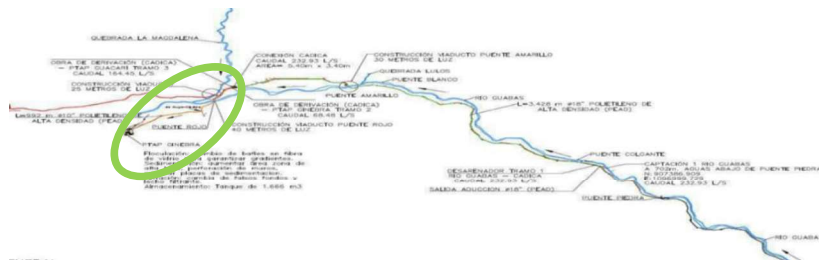


Nota: Continua sin ejecución desde el 20 de Enero de 2026 porque la Comunidad **NO** dejó realizar ningún tipo de intervención sobre la vía.

Los permisos dados por la Alcaldía de Ginebra para ruptura están vigentes.

Porcentaje de Ejecución: 64 %

D.4 Tramo 3 CADICA en Puente Rojo a PTAP Guacarí: Tubería PEAD DN 14"

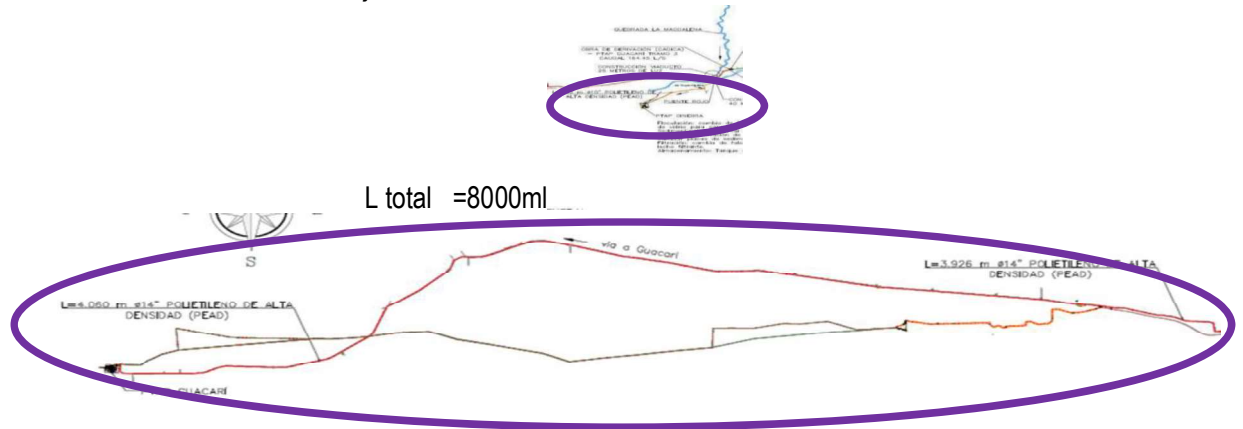

Porcentaje de Ejecución: 97 %

Estado Actual: Se continua con la excavación y construcción de las cámaras en concreto reforzado para las purgas , ventosas y quiebre de presión





Se hace prueba hidrostática en tramo No. 03 entre las abscisas K 4+560 a K 5+280, con resultado positivo

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PTAP GINEBRA

Floculadores: Cambio de placas de AC a Fibra de Vidrio
Concluido



Sedimentadores 1 – 2 – 3 : Concluido y en Servicio

Actividades ejecutadas:

Sistema de barrelos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas



FILTRACION

Actividades ejecutadas en Módulos de Filtración:

- Demolición de canales en concreto
- Retiro de material filtrante
- Demolición de falso fondo
- Ajuste Losa de Fondo
- Sistema de aireación en tubería proveniente de sopladores
- Reemplazo de material filtrante
- Reemplazo de válvulas de lavado
- Cambio de canaletas en acero inoxidable
- Canal Falso Fondo - Leopold

Estado Actual Filtración:

Filtros No. 01 – 02 y 03: Terminados y en servicio



En funcionamiento, las tasas de lavado pasaron de 36 horas paso a 70 horas

Tanques de Almacenamiento

Tanque de Almacenamiento Planta

Con una capacidad de almacenamiento de 470 m³ en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas

Estado Actual: En ejecución 96 %



Actividades por ejecutar:

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Rellenos perimetrales
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente

Actividades ejecutadas:

- Se termina los rellenos perimetrales
- Presentación tubería PEAD 10 " Entrada tanque

Caseta eléctrica




Estado Actual: En ejecución 100 % obra civil

Caseta de Sopladores: En operación los dos equipos de sopladores




Sistema Streaming Current

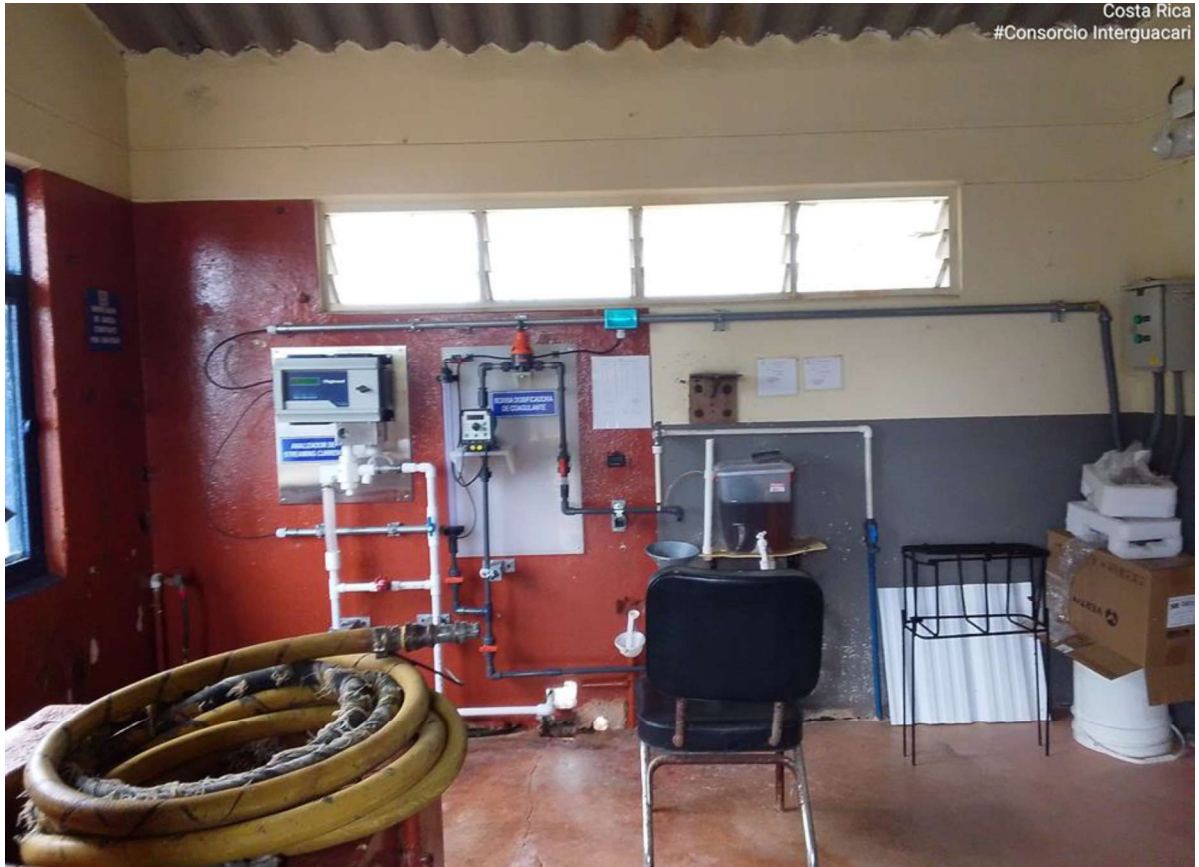

Por instalar: UPS que va a controlar la dosificación de coagulante

Tanque de almacenamiento La Albania

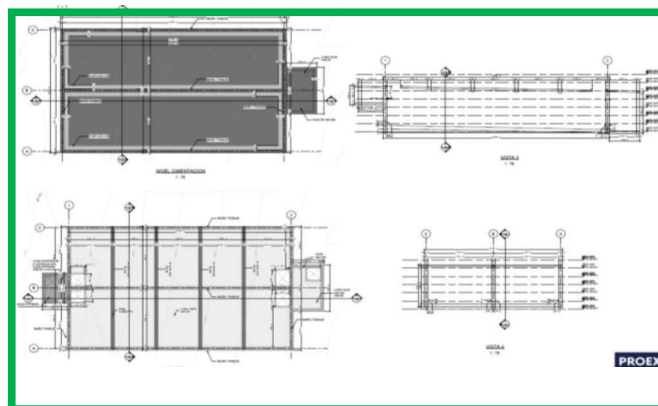

Dimensiones exteriores

Largo: 25 mts

Ancho: 15 mts

Profundidad: 5 mts


Actividades por ejecutar:

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Rellenos perimetrales
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente

Actividades ejecutadas en este periodo:

- Se termina con rellenos perimetrales

Area resaltada en rojo significa fundicion en concreto

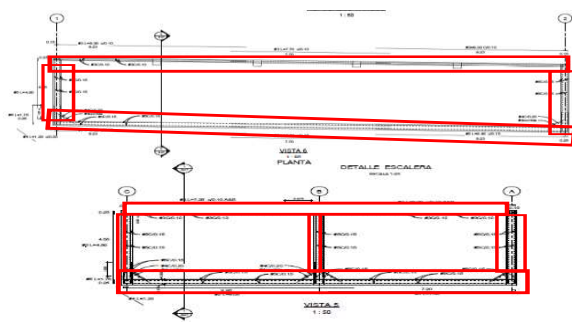

PTAP GUACARI

Floculadores: Sistema nuevo de seis paletas mecánicas para el primer circuito

Estado Actual Floculadores Línea 3 : En servicio

Se instalaron 6 moto reductores, pero hay en servicio 4 por poca capacidad eléctrica de la planta.



Sedimentadores 1 – 2- 3:

Se efectuaron las siguientes actividades en general:

- Sistema de barrelos
- Módulos Tipo Colmena
- Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
- Pasarelas

En Operación






Proceso de Filtración:

Actividades a ejecutar:

- Canal Falso Fondo - Leopold
- Ajuste Losa de Fondo
- Sistema tubería proveniente de los sopladores
- Reemplazo de material filtrante
- Reemplazo de válvulas de lavado
- Cambio de canaletas en acero inoxidable

Estado Actual Filtración: Modulo A Son tres filtros - En ejecución,



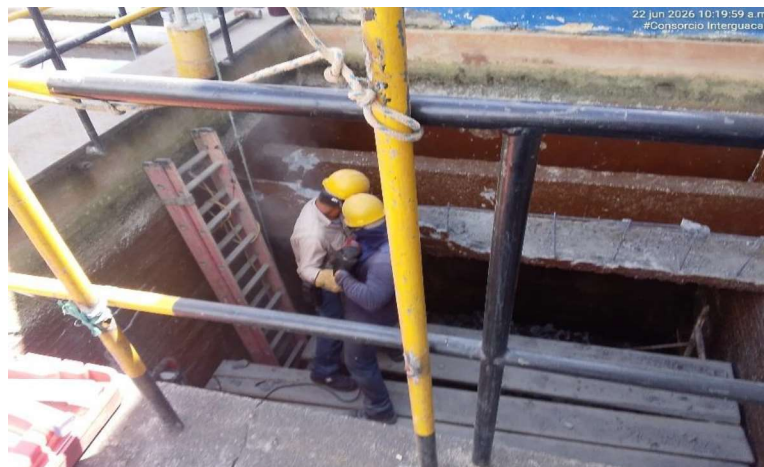

Estado Actual Filtración: Modulo B Son tres filtros - En operación



Suministro e Instalación de sopladores -Son dos unidades y en operación para las pruebas de los filtros



Caseta eléctrica

Estado Actual: Obra civil terminada





Sistema Streaning Current



Por instalar: UPS que va a controlar la dosificación de coagulante

Registro Fotográfico Inspección Interventoría Seguimiento Normalización NC RETIE PTAP de Guacarí.

 06/10/2026 10:38 a.m. Unnamed Road, Guacarí, Valle del Cauca CONSORCIO INTERGUACARÍ	 06/10/2026 10:45 a.m. Unnamed Road, Guacarí, Valle del Cauca CONSORCIO INTERGUACARÍ	-Subestacion exterior 150 KVA tipo Poste en estructura en H. -Pendiente por fijar el Faseo de las líneas de la Red Aérea Trifásica como lo exige la normas del OR Celsia y el RETIE.
 06/10/2026 11:03 a.m. Unnamed Road, Guacarí, Valle del Cauca CONSORCIO INTERGUACARÍ	 06/10/2026 11:03 a.m. Unnamed Road, Guacarí, Valle del Cauca CONSORCIO INTERGUACARÍ	-Inspección a la Acometida Secundaria principal, Sellado de salidas tubos PVC, -Pendiente marcar la Acometida con sus Acrílicos de identificación de especificar calibres de conductores .
 06/10/2026 10:49 a.m. Guacarí, Valle del Cauca CONSORCIO INTERGUACARÍ	 06/10/2026 10:36 a.m. Unnamed Road, Guacarí, Valle del Cauca CONSORCIO INTERGUACARÍ	-Caja Metálica o gabinete del Medidor Electrónico KWH/KWVARH Cable 7 Colores y bloque de pruebas instalados. -Se observa el Conductor de Puesta a Tierra y caja equipotencializada,

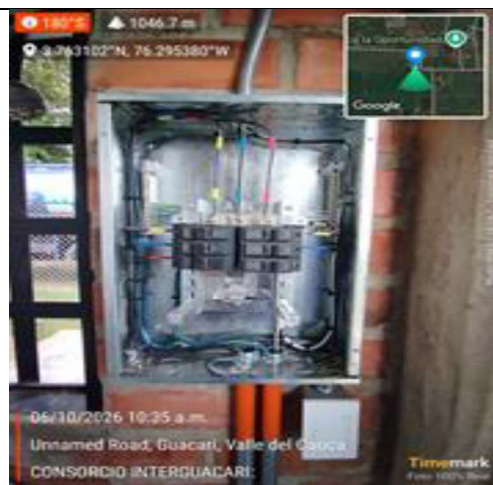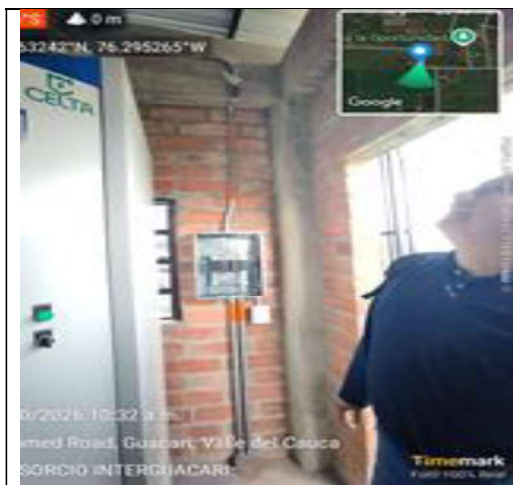


-Tablero de Distribución salidas de Uso Final Iluminación y Tomacorrientes de fuerza debidamente cableado y faseado con el Código de colores.

-Tablero bien terminado y peinado. Pendiente marcar el Tablero.




-Registro acceso Cuarto eléctrico Pendiente fijar Nombre del Cuarto y terminar de pintar el piso distancias de trabajo.

-Tapa posterior de los Tableros de Potencia pendiente fija los Diagramas Unifilares de Potencia.

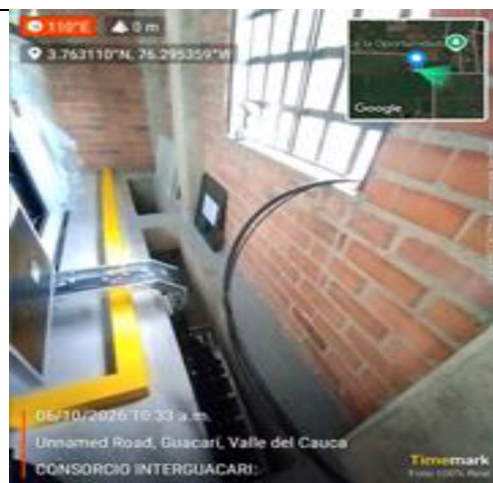


-Totalizador Planta GEN debidamente cableado y conectado su Alimentador desde el ATS o Tablero de Transferencia Automática.

-Carcamos cableados pendiente fijar base y tapas en lamina Alfajor según norma.

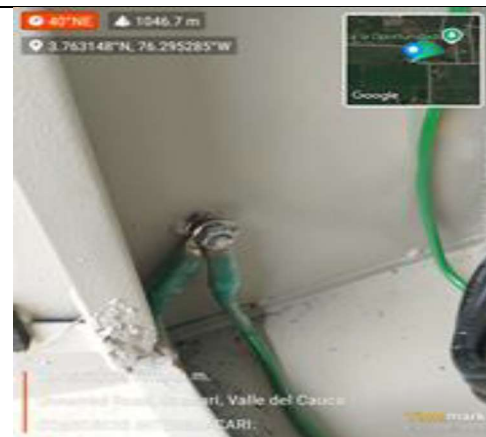



-Tableros de fuerza y Control Equipos de sopladores, se observa NC 2 conductores de Puesta a Tierra en un mismo terminal.

-Se debe de Normalizar instalando barraje que permita independizar las Tierras.

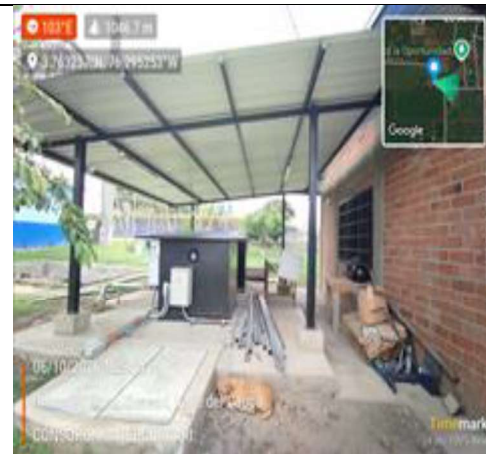

-Área de sopladores Tableros Eléctricos de Fuerza y Control pendientes de marcación Nombres.

-Retirar las tuberías metálicas y materiales excedentes.

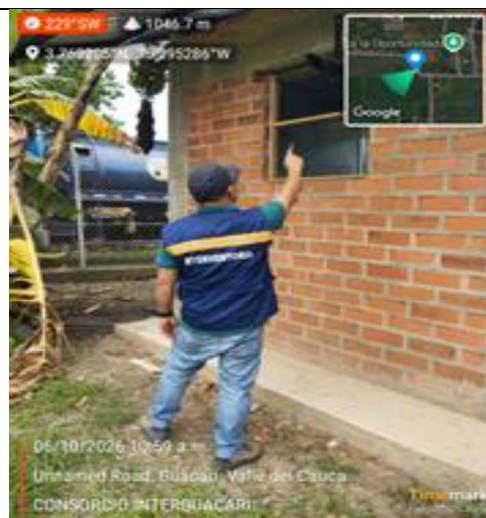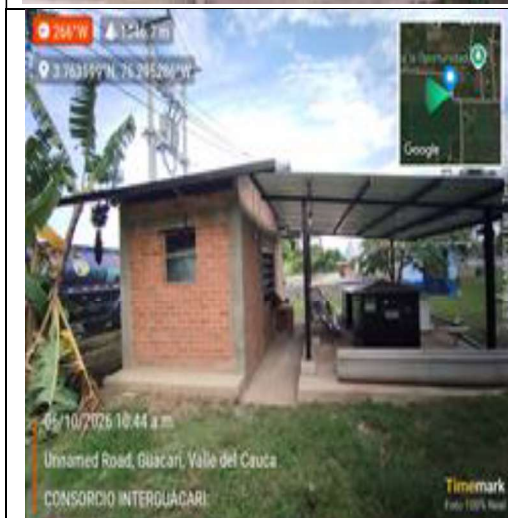

-Costado lateral oriental del cuarto de la Planta GEN pendiente la ventana tipo malla, pendiente en ducto del radiador de escape al exterior del aire caliente.

-Tubo de escape de Monóxido de Carbono CO sin terminar pendiente, aislamiento Térmico.

2.4 COMPONENTE AMBIENTAL

Con relación al tema ambiental se tiene:

- Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma ubicada en el Municipio de Ginebra, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta: Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - “Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca” - VIGENCIA: 23-07-2025 y en Proceso de Prorroga.

- Permiso Resolución No.PM.300-42-2-028 18-11-2024 para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, con vigencia al 18 de Noviembre de 2026.
- Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

- Permiso de rotura con resolucion de aprobacion por parte del Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:

Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.

Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

- Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

En el siguiente cuadro se registran los permisos, que se han solicitado, los que se han otorgado y los que estan en proceso de ejecución:

COMPONENTE AMBIENTAL 2025	CONSOLIDADO DE PERMISOS/ACTIVIDADES	ESTADO/VIGENCIA	OBSERVACIONES
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC	Permiso de Ocupación de Cauce	Otorgado: Vigente hasta 18- de noviembre 2026	"Por medio de la cual se prórroga un permiso de ocupación de cauce y obras hidráulicas en el predio denominado PTAP, ubicado en jurisdicción del municipio de Ginebra, departamento del Valle del cauca"
	Permiso de Aprovechamiento Forestal PTAP Acuavalle Ginebra	Otorgado: Vigente hasta 08 de junio de 2026	Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.
	Permiso de Aprovechamiento Forestal BOCATOMA Ginebra	Otorgado: Vigente hasta 22 de abril de 2026	Resolución 740 No. 0741 13191 22-10-2025
Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAP Acuavalle GINEBRA	Ejecución de Actividades Silviculturales (Erradicación y Poda) PTAP GINEBRA	Ejecutado	Se realiza la Tala y Poda de los individuos autorizados por la autoridad ambiental CVC.
Alcaldía Municipal GINEBRA	Permiso de rotura de vía	Otorgado: Vigente hasta el año 2027	Resolución No. 014- 09-2025
Alcaldía Municipal GUACARÍ	Permiso de rotura de vía	Otorgado: <u>Vigentes hasta el 18 de noviembre de 2026.</u>	Resolución No. PM.300-42-2-028 del 18 de Noviembre de 2024.
Alcaldía Municipal GINEBRA	Licencia de Espacio Público	Otorgado: <u>Vigentes hasta el año 2028.</u>	Se recibe autorización de prórroga: Resolución No. 0015-04-12-2025
Alcaldía Municipal GUACARÍ	Licencia de Espacio Público	Otorgado: <u>Vigentes hasta el año 2027.</u>	Se recibe autorización de prórroga: Resolución No. 140-23-3-001 del 13 de Enero de 2026.

2.4.1 Disposición de residuos sobrantes de obra:

El contratista cuenta con dos sitios autorizados para la disposición de estos residuos:

- El relleno sanitario en el corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro. Este cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CVC
- Servi Transportes López y Recuperación Ambiental S.A.S, en el Municipio de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición final de RCD avalado por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
- Como el tanque de la PTAP de Ginebra se debe rellenar debido a que el diseño inicial tenía una sección mayor, el material sobrante de las excavaciones del tramo 3 se está llevando a la planta y se está aprovechando este material para hacer el relleno.

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto

Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto

Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad

Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la Comunidad

Aspecto No. 5: Reuniones con la Comunidad

Aspecto No. 6: Programa de atención a la Comunidad

Aspecto No. 7: Programa de atención al Ciudadano

Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra

Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra

Aspecto No. 10: Conformación del comité de Veeduría Ciudadana

Aspecto No. 11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: Realizar las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Gestión Social, que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la Comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el Consorcio Redes y Ptaps Valle.

• ASPECTO No. 01: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Objetivo: Realizar el diagnóstico de la zona de influencia del proyecto mediante la identificación y análisis de las características sociales, comunitarias, territoriales y de servicios presentes en el área de intervención, con el fin de reconocer las condiciones actuales de la comunidad y orientar adecuadamente las actividades del proyecto.

Acciones Desarrolladas:

El contratista está cumpliendo con lo definido en el Plan de Gestión Social.

➤ ASPECTO No. 02: CENSOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PROYECTO

Objetivo: Garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de junio de 2026 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 78.57%

Hasta ahora se han realizado las siguientes actas:

Regaderos - Ginebra: 15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo: 6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda: 23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra: 7 actas de inicio
Sector Albania: 2 actas de vecindad
1 acta de entorno
Sector Planta de Guacarí Hacienda La Tesalia Guabitas 1 acta de entorno

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	55	15	78.57%

Tabla N° 1 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado

• ASPECTO No. 03 : PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Informar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, comprensión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.

- **ASPECTO No. 04 : PROGRAMA DE DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Implementar un programa de divulgación dirigido a la comunidad del área de influencia del proyecto, con el fin de informar de manera clara y oportuna sobre el alcance, avances, actividades y posibles impactos de la obra, promoviendo la participación, el acceso a la información y la adecuada relación entre la comunidad y el proyecto.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de junio el contratista realizó la actualización de la información de la cartelera informativa en la Personería Municipal De Guacarí para la divulgación de los avances de obra a la comunidad.




Foto N°1 Cartelera Informativa en la Personería de Guacarí

- **ASPECTO No. 05: REUNIONES CON LA COMUNIDAD**

Objetivo: Realizar reuniones con la comunidad del área de influencia del proyecto con el fin de socializar información sobre el desarrollo de la obra, presentar avances, resolver inquietudes y promover la participación comunitaria.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que el contratista ha dado cumplimiento a la actividad de reuniones con la comunidad establecida en el Plan de Gestión Social, mediante la realización de reuniones informativas y de concertación con las comunidades del área rural de los municipios de Ginebra y Guacarí, así como con los representantes de las Juntas de Acción Comunal de ambos municipios.

Como resultado de estos espacios de diálogo y participación, la comunidad manifestó su disposición para permitir la ejecución de una prueba piloto consistente en la construcción de un cárcamo lateral destinado al alojamiento de la tubería, con el propósito de evaluar esta alternativa técnica y sus posibles beneficios en la mitigación de las afectaciones sobre la infraestructura vial y la movilidad del sector.

En seguimiento a los compromisos adquiridos, se programará una nueva reunión con la comunidad para socializar los resultados de las actividades ejecutadas, presentar los avances del proyecto y concertar las acciones que se desarrollarán en las siguientes etapas de la intervención.



Fotos N°2 y 3. Construcción de un cárcamo lateral

- **ASPECTO No. 06: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Brindar atención oportuna y permanente a la comunidad del área de influencia del proyecto, mediante la recepción, orientación y gestión de inquietudes, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, con el fin de contribuir a la adecuada ejecución del proyecto.

Acciones Desarrolladas:

- Se mantiene habilitado el espacio del PAC con los formatos de PQRS, garantizando el acceso de la comunidad para la radicación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.
- Se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias ubicados en la Personería de Guacarí y la Personería de Ginebra, sin evidenciarse PQRS radicadas por la comunidad durante el periodo evaluado.
- Se efectuó seguimiento a las vallas informativas instaladas en las principales vías de acceso a los municipios de Ginebra y Guacarí, las cuales contienen información del contrato. Se evidenció que la valla ubicada en el municipio de Guacarí presenta actos de vandalismo, con daños visibles como roturas y grafitis.



Foto N°4. Punto de Atención a la Comunidad



Foto N°5. Seguimiento Buzón de Ginebra

Foto N°6. Seguimiento Buzón de la Personería Guacari



Foto N°7. Valla Informativa Ginebra

Foto N°8. Valla informativa en Guacarí

ASPECTO No. 07 : PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención al ciudadano que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos:

Martes de 08:00 am a 12m

Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,

Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - Corregimiento de Costa Rica, Municipio Ginebra, Valle del Cauca.

Existen dos buzones de sugerencias ubicados en:

1. Personería de Guacarí.
2. Personería de Ginebra.

NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	calle 11 # 4-37 tercer piso. edificio La Piscina barrio El Centro Corregimiento Costa Rica Municipio Ginebra.

Tabla N° 2 Información atención a la comunidad

- **ASPECTO No. 08: RECORRIDOS POR LA OBRA**

Objetivo: Realizar recorridos por la obra con la comunidad, veeduría ciudadana y demás actores interesados, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto, las actividades que se ejecutan en campo y resolver inquietudes, promoviendo la transparencia, la participación y el seguimiento comunitario al desarrollo de la obra.

Acciones Desarrolladas:

Durante el mes de junio se realizó recorrido de obra con veedores de los municipios de Ginebra y Guacari- en las obras en las PTAP de Ginebra y Guacari y se mostró la tubería instalada.



Fotos N°9 y 10. Reunión informativa de recorrido de obra, avance de obra y comité de veeduría Ginebra y Guacari

- **ASPECTO No. 09. REUNIÓN DE AVANCES DE OBRA**

Objetivo: Realizar reuniones de avances de obra con la comunidad y los actores involucrados, con el fin de socializar el estado de ejecución del proyecto, informar sobre las actividades desarrolladas y programadas, y atender inquietudes de la comunidad, promoviendo la transparencia y el seguimiento al desarrollo de la obra.

Acciones Desarrolladas:

Se evidenció que el 18 de junio de 2026 el componente social del contratista llevó a cabo la reunión informativa sobre el avance de obra con los integrantes de la veeduría de ciudadana de Guacari y Ginebra.




Ilustración N°1. Convocatoria reunión Comité de Veeduría Ginebra y Guacari

- **ASPECTO No.10: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA.**

Objetivo: Promover la conformación del comité de veeduría ciudadana en el área de influencia del proyecto, con el fin de fortalecer la participación comunitaria, el control social y el seguimiento a la ejecución de la obra, garantizando la transparencia y el adecuado desarrollo del proyecto.

Acciones Desarrolladas:

- Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto No. 10 del Plan de Gestión Social, mediante la conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana en los municipios de Guacarí y Ginebra.
- La interventoría social participó y verificó que el 18 de junio de 2026 realizó de la reunión del comité de veeduría del municipio de Guacari.

- **ASPECTO No.11: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA**

Objetivo: Promover la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, priorizando la contratación de personal residente en el área de influencia del proyecto, con el fin de generar oportunidades de empleo local, fortalecer la participación de la comunidad y contribuir al desarrollo social y económico de la zona.

DETALLE	NOMBRE COMPLETO	CARGO	MUNICIPIO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	GRUPO PROFESIONAL					
1	Willian Mora	Coordinador de proyectos	Cali	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	17/02/2026	
2	Carlos Andres Leyva	Director de Obra	Cali	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		

3	Aldo Gutierrez	Consortiado	Cali	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
4	Ana Fernanda Rosero Cajigas	Ing. Presupuesto	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	15/01/2024	
5	Darío Enrique Flórez	Residente Obra	Costa rica	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	05/02/24	
6	Juan Pablo Montenegro Morales	Residente SST	Guacarí	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	27/03/26	
7	María Fernanda Martínez	Profesional social	BUGA	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
8	María Camila Gil	Ing. Ambiental	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	02/05/25	
9	Carolina Mora Duarte	Aux. Administrativa	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	10/02/2026	
	GRUPO OPERATIVO					
10	Jorge Aponte	Ayudante de obra	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	2/9/2024	
11	Mauricio Fernando Soto	Ayudante obra	Puente rojo	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	14/11/24	
12	Jorge Hernán Ocampo Cortez	Ayudante obra	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	26/11/24	
13	Rodrigo Rodríguez	Ayudante obra	Puente rojo	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	02/07/25	
14	Saray Tonuzco	Aux vial	Guacarí	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	03/07/25	
15	Angelica Maria Gonzalez	Aux. Vial	Costa Rica	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	27/03/2026	
16	John Jairo Viveros	Ayudante de obra	Guacarí	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	14/07/25	
17	Guillermo Gonzalez	Topógrafo	Cali	TOPOGRAFIA	05/03/2026	
18	Jimmy Sinisterra	Topografo	Cali	YIMMY SINISTERRA	08/10/2025	
19	Jose Espinosa	Cadenero	Cali	CADENERO	05/03/2026	
20	Nelson Blanco	Electricista	Cali	ELECTROMONTAJ ES BS	15/10/2025	

21	Andrés Felipe Gómez	Ayudante	Guacarí	ELECTROMONTAJES BS	11/11/2025	
22	Ricardo Villegas	Ayudante	Cali	ELECTROMONTAJES BS	02/03/2026	
23	Iván Camilo Caicedo	Oficial	Guabitas	A7	15/07/25	
24	Alexander Araujo	Oficial	Guabitas	A7	31/05/25	
25	Olegario Cobo	Ayudante	Guabitas	ABRAHAM CAICEDO	10/01/2026	
26	Eduardo Garcia	Ayudante	Guabitas	ABRAHAM CAICEDO	10/03/2026	
27	Abraham Caicedo	Maestro	Guabitas	ABRAHAM CAICEDO	07/03/2026	
28	Alvaro Javier Corrales	Ayudante	Guabitas	ABRAHAM CAICEDO	02/04/2026	
29	David Lozano	Ingeniero	Cali	INGENIERIA Y SOLUCIONES	19/08/2025	
30	Maicol Caicedo	Maestro	Cali	INGENIERIA Y SOLUCIONES	19/08/2025	
31	Orley Gomez	Conductor	Costa Rica	INGENIERIA Y SOLUCIONES	19/08/2025	
32	Brayan Navarrete	Ayudante	Costa rica	INGENIERIA Y SOLUCIONES	20/01/2026	
33	Guillermo Alvarez	Operario	Cali	INGENIERIA Y SOLUCIONES	01/11/2025	

Tabla N° 3. Información personal contratado por el contratista

SECTOR / MUNICIPIO	CARGO	CANTIDAD
GUACARÍ	Ayudante de obra	1
GUACARÍ	Ayudante	3
GUACARÍ	Maestro	1
GUACARÍ – Guabitas	Ayudante	4
GUACARÍ – Guabitas	Oficial	2
GUACARI	Siso	1
TOTAL GUACARÍ		12
GINEBRA		
GINEBRA	Ayudante de obra	2
GINEBRA	Ingeniera ambiental	1
GINEBRA	Auxiliar administrativa	1
GINEBRA	Auxiliar vial	2
GINEBRA	Ingeniero de presupuesto	1
GINEBRA -Costa Rica	Almacenista	1
GINEBRA -Costa Rica	Residente de obra	1
TOTAL GINEBRA		9

Tabla N° 4. Mano de obra contratada por municipio.

GRUPO PROFESIONAL	FEMENINO	MASCULINO
	4	5
PERSONAL OPERATIVO	2	22
TOTAL	6	27

Tabla N°5. Personal por genero

TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA ZONA

MUNICIPIO	# PERSONAS CONTRATADAS
Ginebra	9
Guacari:	12
Otros municipios	12
TOTAL	33

Tabla N° 6. Total, personal activo en la zona

%	FORMULA	PORCENTAJE
PORCENTAJE DE MUJERES	Mujeres contratadas/ Personal activo*100%	21%
PORCENTAJE DEL AREA DE INFLUENCIA	Personas de la zona de influencia contratada/Personal *100%	63%

Tabla N°7. Porcentaje personal contratado

Acciones Desarrolladas:

El contratista promueve y fortalece la vinculación laboral de personal proveniente del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región, mediante la generación de empleo directo e indirecto durante la ejecución de la obra y el aporte a la disminución del desempleo.


Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 33 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 6 son mujeres, lo que representa el 21 % del personal, en cumplimiento de lo establecido en materia de contratación con enfoque de género.

Así mismo, se verificó que 21 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 9 pertenecen al municipio de Ginebra y 12 al municipio de Guacarí, equivalente al 63% del total del personal, dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente en cuanto a la vinculación de personal de la zona.

El contratista informó que durante el mes de junio realizaron 5 contrataciones nuevas.

COMITÉS DE OBRA

- En el mes de junio se realizó un comité técnico de obra el día 17 de junio de 2026.
- Se informó las actividades realizadas desde todas las áreas: Técnica, SST, Ambiental y social.

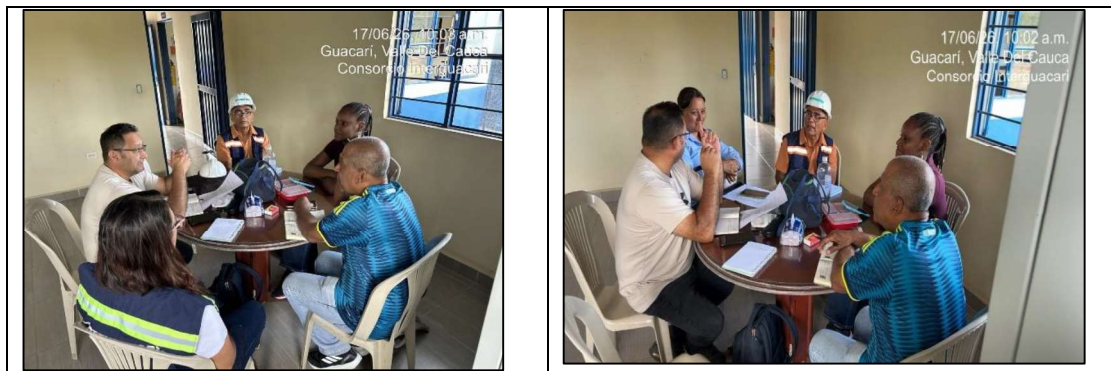

Fotos N°11 y 12. Comité técnico de obra 17 de junio de 2026


REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN GESTION SOCIAL

Se realizaron dos reuniones de seguimiento al componente de Gestión Social, con la participación de María Fernanda Martínez - profesional social del contratista; Neisler Abadía- profesional social de la interventoría; y Sandra Romero - profesional social de Vallecaucana de Aguas, los días 9 y 25 de junio de 2026, con el propósito de revisar el avance de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social y efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos.

Durante las reuniones se abordaron los siguientes aspectos:

- Se verificó el funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), evidenciando que continúa prestando atención a la comunidad de manera normal y conforme a los horarios establecidos.
- La profesional social del contratista informó sobre el seguimiento realizado a las solicitudes presentadas ante las alcaldías municipales de Ginebra y Guacarí, mediante las cuales se requirió apoyo institucional para la gestión de los predios con ocupación irregular ubicados dentro del área de influencia del proyecto.
- En relación con el municipio de Guacarí, se informó que, mediante oficio del 2 de junio de 2026, la Secretaría de Planeación Municipal, reportó la realización de una visita técnica con el acompañamiento de la Inspección de Policía, en la que se identificaron aproximadamente siete (7) viviendas construidas sobre espacio público en el sector de Chicuco. De acuerdo con la respuesta emitida, la situación se encuentra en trámite por parte de la Inspección de Policía, autoridad competente para adelantar las actuaciones administrativas y legales correspondientes.

- Respecto al municipio de Ginebra, el ingeniero José Luis Salcedo - Secretario de Planeación, manifestó que, como resultado de la visita efectuada a los predios durante el mes de marzo de 2026, el caso fue remitido a la Inspección de Policía para el trámite correspondiente. No obstante, a la fecha del seguimiento no se había recibido respuesta oficial por escrito sobre las actuaciones adelantadas.
- El componente social del contratista informó que sostuvo acercamiento con el doctor Engelberto Moreno, inspector de Policía de Ginebra, con el fin de conocer el estado del trámite, quien manifestó que la competencia para adelantar las actuaciones relacionadas con los predios corresponde a la Secretaría de Planeación Municipal.
- Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció que la gestión relacionada con la ocupación irregular de los predios ha presentado demoras administrativas, pese a la disposición manifestada por las administraciones municipales para apoyar la solución de la problemática. En consecuencia, se acordó solicitar al doctor Moisés Cepeda - Gerente de Vallecaucana de Aguas, gestionar una reunión con los alcaldes de Ginebra y Guacarí, con el propósito de articular acciones institucionales que permitan agilizar las actuaciones de las dependencias competentes y facilitar el avance del proyecto.

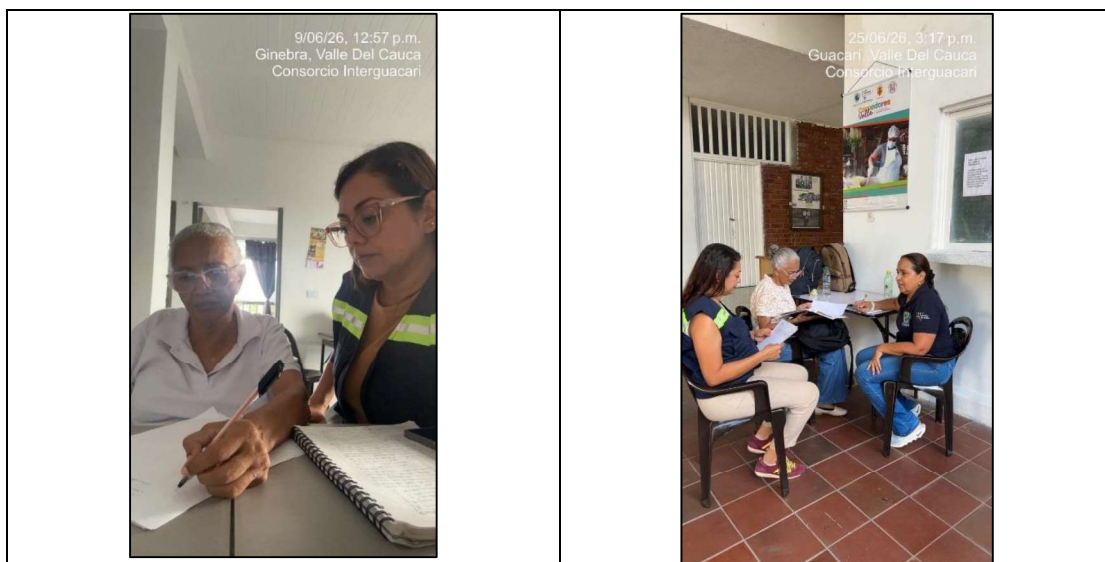

Fotos N°13 y 14. Reuniones de seguimiento del componente social

CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en este componente durante el mes de junio de 2026.
- Durante el mes de junio de 2026 se evidenció la continuidad en la implementación y el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social, garantizando el adecuado funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), el seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana y la actualización oportuna de los canales de información dirigidos a la comunidad del área de influencia del proyecto.
- La interventoría verificó el cumplimiento de los compromisos establecidos en materia de vinculación de mano de obra local y equidad de género, evidenciando que el contratista mantuvo una participación del 63 % de personal residente en la zona de influencia y del 21 % de mujeres dentro del total de trabajadores vinculados al proyecto, en concordancia con los lineamientos del contrato.
- Las actividades de información, socialización, seguimiento y participación ciudadana permitieron consolidar espacios de diálogo y concertación entre la comunidad, las administraciones municipales, Vallecaucana de

Aguas, la interventoría y el contratista, fortaleciendo la transparencia, la participación comunitaria y el flujo permanente de información sobre el avance y desarrollo del proyecto.

- Como resultado de los espacios de diálogo, información y concertación desarrollados con la comunidad, esta manifestó su disposición para permitir la ejecución de una prueba piloto consistente en la construcción de un cárcamo lateral para el alojamiento de la tubería, con el fin de evaluar la viabilidad de esta alternativa técnica y sus posibles beneficios para la reducción de las afectaciones sobre la infraestructura vial y la movilidad del sector. La implementación definitiva de esta solución estará sujeta a los resultados de la prueba piloto y a los acuerdos que se establezcan con la comunidad.
- El seguimiento realizado por la profesional social del contratista, permitió evidenciar que la gestión relacionada con la ocupación irregular de predios dentro del área de influencia del proyecto continúa presentando demoras en su trámite administrativo, pese a la disposición manifestada por las administraciones municipales para contribuir a la solución de esta problemática. En atención a esta situación, se acordó solicitar al doctor Moisés Cepeda, gerente de Vallecaucana de Aguas, la gestión de una reunión con los alcaldes de Ginebra y Guacarí, con el fin de fortalecer la articulación institucional, promover la intervención de las dependencias competentes y agilizar las actuaciones requeridas para facilitar el avance del proyecto.

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El **CONSORCIO INTERGUACARI**, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta que:

- Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos
- Se apliquen las medidas de seguridad en el trabajo.
- Se realicen las afiliaciones al sistema de Riesgos profesionales.

4.1 OBJETIVO

Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión de **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, referente a temas de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la obra en el mes del **1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**.

4.2 ALCANCE

El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realiza labores en campo, referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las actividades durante el mes, y así y la ejecución en los diferentes puntos de trabajo.

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.3.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIARIAS	OBSERVACIONES GENERALES
Verificación de condiciones de salud	Se mantienen controladas las condiciones de salud, dando cumplimiento a las recomendaciones y acciones implementadas por parte del contratista con el fin de evitar la propagación del caso de tuberculosis. De igual manera, se realiza seguimiento permanente a las condiciones de salud de todo el personal frente a la aparición de cualquier virus.
Verificación de la zona de trabajo y herramientas	Antes de iniciar las actividades, los trabajadores verifican las condiciones del área de trabajo, al igual que el estado de las herramientas a utilizar.
Uso de Elementos de Protección personal	Antes de iniciar las labores, los trabajadores hacen uso de los EPP, haciéndose responsable de su autocuidado y el de sus compañeros, en este periodo se entrega dotación al personal nuevo.
Delimitación del área de trabajo, orden y aseo	Antes de iniciar cualquier actividad, se delimita el área de trabajo, se solicitó instalar cinta como barrera de protección, para evitar cualquier caída en las excavaciones.
Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo en alturas	Antes de iniciar cualquier actividad, se realiza un análisis del área y los riesgos a los que están expuestos y que se deben intervenir, por esta razón se solicita como adjunto al informe del contratista ATS de las actividades de alto riesgo y permisos en alturas, para las actividades que lo requieran.
Exámenes médicos ocupacionales	Durante el mes de Junio se verifica el cumplimiento del programa de medicina preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar el estado integral de todos los colaboradores.
Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias	En el periodo de Junio se mantienen las condiciones óptimas de los elementos de atención a emergencias, las señalizaciones en oficina y obra, se realizó cambio y se encuentran en buen estado, se mantienen rutas de evacuación y puntos de encuentro. Se realiza un simulacro de emergencia en cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de gestión del riesgo y atención de emergencias.

Política y objetivos del SG-SST.	En este periodo de Junio se realizan inducción y reintroducción sobre las políticas SST, medio ambiente, sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Actualización curso de trabajo en alturas	En este periodo no se realiza actualización de curso de alturas.

Las charlas realizadas en el mes se describen a continuación:

4.3.2 CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.

DESCRIPCIÓN	Número de asistentes/ Capacitaciones	Dirigido a
Posturas Forzadas y Repetidas		TRABAJADORES
Caídas a distinto nivel		TRABAJADORES
Levantamiento de cargas		TRABAJADORES
Inspección EPCC		TRABAJADORES

4.3.3 INSPECCIÓN

En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones:

ITEM	INSPECCIÓN	HALLAZGOS	No. INSPECCIONES	
			PROGRAMADAS	REALIZADAS
1	Inspección de EPP	Revisión de las condiciones y el estado de los elementos de protección personal	Por actividad	06-2026
2	Inspecciones locativas (contenedores, excavaciones campamento y oficina)	Sin hallazgos	Por actividad	06-2026
3	Inspección de herramientas (Pulidora, taladro de mano, mezclador)	Sin hallazgos	Por actividad	06-2026
4	Inspecciones de extintores, botiquín y camillas	Sin hallazgos	or actividad	06-2026

INDICADORES DE AUSENTISMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR	
● Número de atenciones médicas comunes reportadas	0
● Días perdidos	2
● Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas	0
● Días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0

Una incapacidad por enfermedad común.

El contratista reporto una novedad por posible caso de tuberculosis en el equipo que está instalando la tubería en el tramo 1.

Los resultados de la Secretaria de Salud den Distrito Santiago de Cali salieron negativos

Hay incapacidad medica por un mes reportado por el Ing. Darío Flórez por accidente de transito fuera de la obra

a. VERIFICACION PERSONAL Y CONTRATISTA EN OBRA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	Aldo Gutiérrez	79.699.673	N/A		Consejero	Sura	Sura	Colpensiones
2	Carlos Andrés Leyva	89.008.184	N/A		Director de la Obra	Sura	Sura	Protección
3	Ana Fernanda Rosero Cajigas	36.759.739	17/01/24		Ing. Presupuesto	Sanitas	Sura	Colpensiones
4	Juan Pablo Montenegro	1.114.456.072	04/04/26		SST	S.O.S.	Sura	Porvenir
5	Darío Enrique Flórez	1.026.277.221	05/02/24		Residente Obra	Sura	Sura	Colfondos
6	Carolina Mora Duarte	1.082.976.100	10/02/2026		Aux administrativa	Sanitas	Sura	Colpensiones

7	María Camila Gil	31.658.574	02/05/24		Ingeniera Ambiental	N EPS	Sura	Colpensiones
8	María Fernanda Martínez	38.856.496	05/01/23		Profesional social	Sura	Sura	Colpensiones
9	Diana Marcela Echavarría	31.658.574	01-02-23		Ing. Ambiental	N. EPS	sura	Colpensiones
10	Jorge Aponte	1.112.098.988	02/09/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
11	Mauricio Fernando Soto	14.652.613	14/11/24		Ayudante obra	SOS	Sura	Porvenir
12	Jorge Hernán Ocampo Cortez	9.858.689	26/11/24		Ayudante obra	Emssanar	Sura	Porvenir
13	Rodrigo Rodríguez	16.860.355	02-07-25		Ayudante obra	Salud Total	Sura	Porvenir
14	Saray Tonuzco	1.005.870.273	03-07-25		Auxiliar Vial	Emssanar	Sura	Colpensiones
15	Ronald Andrés Gómez	1.112.958.420	16-01-26		Ayudante obra	Salud Total	Sura	Porvenir

PERSONAL OPERATIVO A7 CONSTRUCCIONES								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	IVAN CAMILO CAICEDO	1.114.457.595	15/07/25		MAESTRO	S TOTAL	SURA	PORVENIR
2	EIDER FLOREZ	1.114.621.798	01/12/25		AYUDANTE DE OBRA	EMSSANAR	SURA	PORVENIR
3	JHONATAN ANDRES HURTADO GIL	1.114.460.124	05/02/2026		AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES
--

No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	DAVID LOZANO	16.932.279	19/08/25		ING. ENCARGA D O	EMSSANAR	SURA	PORVENIR
2	MAICOL CAICED O	1.143.938.113	19/08/25		INSPECTO R	SURA	SURA	PORVENIR
3	WALTER ASPRILLA	16.789.876	19/08/25		AYUDANTE	N EPS	SURA	PORVENIR
4	ORLEY GOMEZ	94.301.373	19/08/25		CONDUCT O R	COLPENSIONES	SURA	SANITAS
5	JOSE ALBERTO MELENDEZ	PT5523201	19/08/25		OPERADO R MAQUINA	ASMET SALUD	SURA	PORVENIR
6	ALBEIR O ARANG O	94.474.251	01/11/25		OPERADO R MAQUINA	SOS EPS	COLME N A	COLPENSI O NES

PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	NELS ON BLAN CO	91.272.299	03/10/25		ELECTRICIS T A	N EPS	SURA	COLPENSION E S
2	ANDRÉS FELIPE GOMEZ	1.007.555.715	03/10/25		AYUNDANTE	S TOTAL	SURA	PROTECCION
3	LORENA GOMEZ	38.595.100	27/10/25		INSP SST	N EPS	SURA	PORVENIR

Fuente de elaboración: Informe de contratista, Juan Pablo Montenegro SST

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Personal Consorcio	15
Personal topografía	2
Personal Operativo A7 Construcciones	3
Personal Electro montajes	3
Personal Operativo Ingeniería y Soluciones Civiles	6
Personal Renovando Ingeniería SAS	4
TOTAL	33

REALIZACIÓN DE SIMULACROS

No se realizaron simulacros este mes.

5. MANEJO AMBIENTAL

5.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RCD

El aprovechamiento de los Residuos De Construcción Y Demolición - RCD se plantea con dos alternativas: reutilizar en obra o transportarlos a centros de acopio temporales o centros de aprovechamiento. Los centros de aprovechamiento planteados como alternativa implican, generalmente, una tercerización de los RCD. Por otro lado, un gran o mediano generador puede pensar en la construcción de centros de acopio temporales, de tal manera que se cuente con una zona de acopio donde se reúnan los RCD aprovechables que no se utilizaron en su totalidad en las obras para ser utilizado.

Las obras civiles, en la mayoría de las etapas constructivas, generan escombros, residuos de materiales de diferentes tamaños (virutas, polvillo de corte, piezas de cerámica, etc.), residuos tóxicos y algunos contaminantes orgánicos que son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD) y han de ser correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su aprovechamiento, y así favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. Igualmente, la interventoría realiza control a las volquetas y máquinas usadas en obra, verificando los siguientes documentos:

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica
- Póliza daños a terceros

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	CERTIFICADO
Madera	No reporta	N/A
Chatarra	No reporta	N/A
Material de Excavación RCD		
Residuos Aprovechables y no Aprovechables	No reporta	N/A.
Teja PVC otros	No se genera	N/A

5.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO:

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos.

Actividad que se supervisa por medio de las inspecciones que se realizan periódicamente.

- ❖ Señalización, cerramientos provisionales y aislamiento en de los sitios de trabajo.

5.3 INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

TIPO DE MATERIAL	FECHA	CANTIDAD
Inspección de seguridad y ambiente (orden y aseo)	Semanal	

5.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Equipos de topografía	Estación – Nivel	NIKON SNDWAY
Retroexcavadora Llantas	1	CAT
Volquetas	1	(UFK231)
Taladro demoledor	3	
Pulidora	2	DELWAT
Sierra circular para corte de madera	1	DELWAT
Planta Generadora 6.5	2	ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas	1	BARNES
Motobomba 3 pulgadas	1	
Mezcladora de concreto	2	TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico	3	BOSCH 2.8 HP-NUEVO
Taladros manuales	3	
Martillo demoledor	1	SIEFKEN
Rotomartillo	1	SIEFKEN
Buggy	7	Herragro- Toolcraft
Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate)		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMPONENTE EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- ✓ Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- ✓ Se adjuntan permisos de trabajo para tareas de alto riesgo trabajos en alturas, y trabajos en caliente.
- ✓ Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- ✓ Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Las labores en la obra continúan desarrollándose en cuatro frentes de trabajo:

PTAP de Guacarí:

- Filtración Modulo B, Se termina las pruebas de filtración con la ayuda de los aperadores de Acuavalle, salieron positivas y en servicio.
- Se inicio a intervenir el Módulo A con demoliciones de canaletas y repellos

PTAP de Ginebra:

- Floculación: Terminado
- Sedimentación: Terminado
- Filtración: terminado

Tanques de Almacenamiento

- Planta: falta las conexiones al sistema existente de suministro
- La Albania: falta las conexiones al sistema existente de suministro

Frente Tramo 3:

Se continua con la construcción de estructuras en concreto reforzado para válvulas de purga, ventosas y quiebre de presión,

Se hizo una prueba hidrostática con resultados positivo entre las abscisas K4+560 a K 5+280

- Frente Tramo No. 01:

Se inicio la construcción del piloto de cárcamo en concreto entre batea Bananos a Puente Amarillo.

- **Otros**

- Con relación a los diseños de la Bocatoma, el contratista ya hizo entrega de los Estudios de Geología y Geotecnia, Diseño Hidráulico de la Captación, Hidráulica Fluvial, Rediseño de Bocatoma y diseño estructural.
- Pendiente por entregar: Presupuesto de la Bocatoma, Malla Coanda y especificaciones técnicas
- Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato
- Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento ya fueron dados por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.
- Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- Continúa la situación de orden social ya que los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio suspendieron los trabajos en el sector de Villa Indigo a Puente Rojo, al no permitir que se ejecute ningún tipo de intervención en la vía.
- Esta pendiente que la Alcaldía de Ginebra solucione con tres personas la invasión que hicieron en el área donde se va a construir la bocatoma, recalando que invasores están en área de protección del Río Guabas.
- Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- Se siguen los lineamientos de medicina preventiva.
- Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 30 de Junio de 2026:

AVANCE	(%)
FISICO	79.2
FINANCIERO	78.3

Atentamente,



EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

Representante Legal
Consortio Interguacará
Interventoría

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO INTERGUACARI

ANEXO 2

PRESENTACION ENTE LA GOBERNADORA



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Identificación			dv	Razon Social							Clase Aportante					Sucursal Principal					Direccion					Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CC 16865991				CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO							INDEPENDIENTE					PRINCIPAL					CII 18 3N 70					CALI-VALLE				6530679		No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Periodo			Clave							Tipo			Fecha					Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pensión		Salud	Pago				Planilla			Planilla			Limite		Pago			Banco					Dias Mora		Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2026-06		2026-06	449578234				9507554149			I			2026/07/23		2026/07/06			BANCO DE BOGOTA					0		\$3,832,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Identificación	Nombre	ingre	tre	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca	de	ca</

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$292,400	\$0	\$0	\$292,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$292,400	\$0	\$0	\$292,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,500,000	\$0	\$0	\$1,500,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,500,000	\$0	\$0	\$1,500,000
TOTAL				1	\$3,832,400	\$0	\$0	\$3,832,400



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 02:22:03 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1081796793

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	Dirección	CL 0 #0 - 0
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5560163
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	AFEP	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16254057	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	57	02													(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	6.960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 121.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.800	\$ 0	\$ 340.800



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 03:39:58 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 86167548

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES		
Documento	CC16267590	Dirección	CL 47A #42 C - 78
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6669047
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	AFEP	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16267590	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES	57	04												(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	4,350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 76.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.100	\$ 0	\$ 295.100

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16257466	JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ		CL 31 33 93	3960341	jorgebarona2009@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93235070	06/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$261.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
PenSIón	0	0	0
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	261.600	261.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16257466	JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ		CL 31 33 93	3960341	jorgebarona2009@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I—Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93235070	06/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$261.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																											
INFORMACION COTIZANTE				INFORMACION NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 16257466	BARONA FLOREZ JORGE ENRIQUE	57	2															0	0	0	0	0	0	0	EP5005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																	
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante			Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF															
CC 1107071993			IZQUIERDO MARULANDA JULIANA				INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		cra 23 No 56-15		CALI-VALLE		3701768		No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																	
Periodo		Clave				Tipo	Fecha				Pago																						
Pensión	Salud	Pago			Planilla		Planilla		Limite	Pago			Banco			Dias Mora		Valor															
2026-06	2026-06	370682339			9506100361		I		2026/07/22		2026/06/09			NEQUI			0		\$576,900														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avg	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
1	CC	1107071993	IZQUIERDO JULIANA																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF57	30	\$1,750,905	\$35,100	14-11	30
Total Afiliados(1)													\$1,750,905			\$280,200			\$1,750,905			\$218,900			\$1,750,905				\$35,100				



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1107071993		IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	370682339	9506100361	I	2026/07/22	2026/06/09	NEQUI	0	\$576,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$576,900	\$0	\$0	\$576,900	



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-07, 09:35:06 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1083253677

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 06/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	Dirección	CL 0 #0 - 0
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5560163
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	4	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	AFEP	IAS	VAL	EPS	USP	COB	SAF	DEL	LMC	ACT	EPS	Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total									
CC 31522120	NANCY RAMIREZ CASTRILLON	01	04													0	0	30	30	30		(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.400
CC 3840488	SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANQ	01	00													0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 6183718	EINAR MARINO JIMENEZ SOTO	01	00													0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 66811813	LUZ AMERICA MONTAÑO SORNA	01	00													0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.252.715	\$ 7.003.620	\$ 7.003.620	\$ 7.003.620	\$ 840.600	\$ 280.400	\$ 149.500	\$ 280.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.550.900	\$ 0	\$ 1.550.900

Se certifica que la empresa , identificada con CC-16274754 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-06	230301	800224808	PORVENIR	1	3	320.000	800	320.800
Período salud:	2026-06	EPS010	800088702	EPS SURA	1	3	250.000	600	250.600
Planilla Nro.:	37783174 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	3	87.000	200	87.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	3	0	0	0
Fecha transacción:	2026-07-17	PASENSA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
Transacción:	489353446	PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 658.600	

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	LUIS MARIO DAVILA ROCHE
IDENTIFICACIÓN:	CC-16274754
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-14
FECHA DE PAGO:	2026-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37783174
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37783174
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 250.000	\$ 250.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 320.000	\$ 320.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 87.000	\$ 87.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 657.000	\$ 658.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2026
----------------------------------	------------



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 66658922		ABADIA LONDOÑO NEISLER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 N 9 - 60	EL CERRITO-VALLE	Z589110	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	362042555	9505982293	I	2026/07/07	2026/06/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$48,800	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$48,800	\$0
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$48,800	\$0
1	CC 66658922	ABADIA NEISLER	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0		14-23	\$2,000,000	\$48,800	0
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$48,800	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 66658922		ABADIA LONDOÑO NEISLER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 N 9 - 60	EL CERRITO-VALLE	2589110	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	362042555	9505982293	I	2026/07/07	2026/06/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$618,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800	



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 04:49:41 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1082669678

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RODRIGO OBONAGA GAITAN		
Documento	CC16608775	Dirección	CL 13B #66 B - 56
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3163384677
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	AFEP	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	IAS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16608775	RODRIGO OBONAGA GAITAN	57	00													(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 218.900	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 121.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621.000	\$ 0	\$ 621.000

Contratante:



Contratista:



Interventor:

**CONSORCIO
INTERGUACARÍ**

CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

OBJETO:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

**JUNIO DE 2026
SANTIAGO DE CALI**

Componente Técnico

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	(\$29.432.080.933) M/CTE
Valor adición reformulación No.1:	(\$2.571.146.616) M/CTE
Valor adición reformulación No.2:	(\$13.531.646.339) M/CTE
Valor total del Contrato:	(\$45.534.873.888) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S. P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación inicial:	1 de enero de 2024
Nueva fecha de terminación:	22 de julio de 2026

Contratante:



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.

Interventor:

CONSORCIO
INTERGUACARÍ


Contratista:

CONSORCIO REDES
Y PTAPS VALLE

Componente Técnico – Avance de Obra

EJECUTADO AL DIA DE HOY CON REFORMULACIÓN

Porcentaje
Financiero
78%

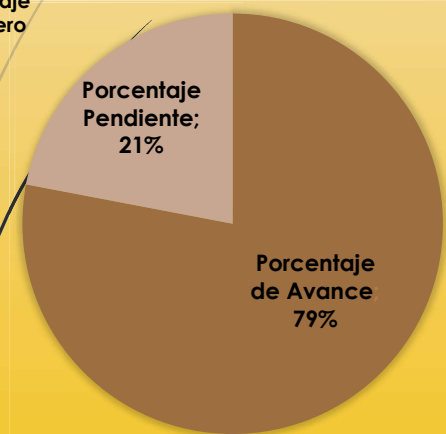

■ CAPÍTULOS DEL CONTRATO

- Preliminares. (ok)
- Bocatoma. (pendiente por ejecutar)
- Línea de aducción.
- Desarenador.
- Macromedidor.
- Líneas de conducción. (en ejecución)
- Cámaras de quiebre de presión.
- Cámaras de purga y ventosas.
- Cámara distribuidora de caudal. (CADICA)
- Intervenciones en la PTAP de Ginebra.
- Intervenciones en la PTAP de Guacará.
- Tanque de almacenamiento Ginebra.
- Tanque de almacenamiento Predio Acuavalle (Sector La Albania)
- Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental.



Componente Técnico

Frente de Obra Tubería Conducción:

Tramo PEAD de 18" (Tramo 1 con un 10% de Avance)



Propuesta Batea Bananos – Puente Amarillo:

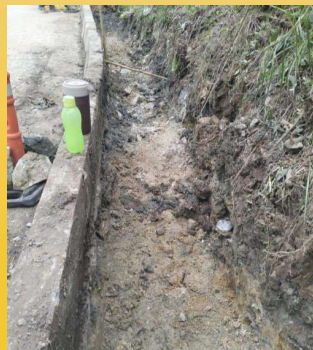


Componente Técnico

Frente de Obra Tubería Conducción:

Tramo PEAD de 10" -Tramo 2 con un 64% de Avance. **Suspendido por la Comunidad desde el 20 de enero de 2026**

Frente de Obra Tubería Conducción:

Tramo PEAD de 14" (Tramo 3 con un 97% de Avance)



Componente Técnico

- Frente de obra "Intervenciones Planta de Tratamiento **GINEBRA**". (Aprox 95% de Avance)
- Frente de obra "Intervenciones Planta de Tratamiento **GUACARÍ**". (Aprox 85% de Avance)

GINEBRA



GUACARÍ:



Componente Técnico

- Frente de obra "Tanque de Almacenamiento PTAP Ginebra" (**Aprox 92% de Avance**).
- Frente de obra "Tanque de Almacenamiento La Albania" (**Aprox 85% de Avance**).

Tanque de Almacenamiento PTAP Ginebra




#Gestión Técnica #Gestión Ambiental #Gestión Social #Gestión SST
10 de febrero de 2026

Tanque de Almacenamiento La Albania:



#Gestión Técnica #Gestión Ambiental #Gestión Social #Gestión SST
10 de febrero de 2026

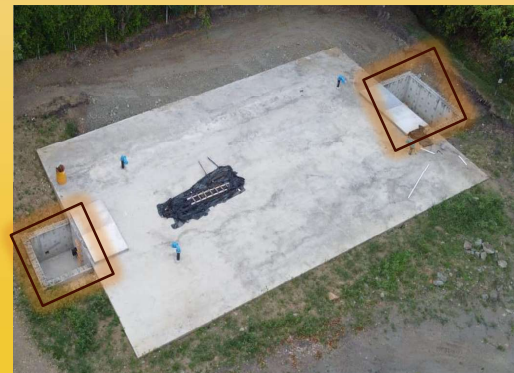

Contratante:



Contratista:

**CONSORCIO REDES
Y PTAPS VALLE**

Interventor:

**CONSORCIO
INTERGUACARÍ**

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**
