



PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Contrato Interadministrativo 859 de 2019 (Numeración ENTerritorio 219141)

Proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias Tadó, Chocó

Informe correspondiente al periodo entre el 24 de diciembre y el 24 de enero de 2021

Fecha de elaboración: 25 de enero de 2021

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

1. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- El 28 de julio de 2020 se dio inicio a la ejecución del contrato, mediante el inicio de las Actividades 1 y 2 del contrato.
- Se aprobó por parte de la interventoría el 28 de agosto de 2020 la Actividad 1: chequeo de los diseños, el cual fue realizado por el contratista de obra.
- Se inició la Actividad 3 ejecución de obras en el mes de septiembre de 2020.

El 28 de diciembre de 2020: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.

El 04 de enero de 2021: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.

El 12 de enero de 2021: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.

El 18 de enero de 2020: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.




2. DATOS CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	2200813
Objeto	Chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en los municipios de María la Baja (Bolívar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - grupo 4 Tadó - Chocó
CONTRATISTA	CONSORCIO AGUAS DEL FUTURO
Plazo inicial	6 MESES
Valor inicial	\$ 3.911.978.483,00

FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO DE OBRA	
EVENTO	Fecha
Adjudicación del contrato	25 de junio de 2020
Suscripción de contratos	07 de julio de 2020
Aprobación de protocolos de bioseguridad por parte del municipio	24 de julio de 2020
Acta de inicio del contrato	28 de Julio de 2020
Fecha de Terminación	28 de enero de 2021

Barrio	ALCANCE DE OBRAS					Observaciones
	Visitadas	Diagnosticadas	Aprobadas	Ejecutadas	Avance (%)	
San Pedro	590	550	550	510	93	Se encuentran en ejecución 40 viviendas
Potencial Inclusiones	0					

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL
Continúa la ejecución de las Actividades 2, 3 y 4 en el municipio de Tadó.

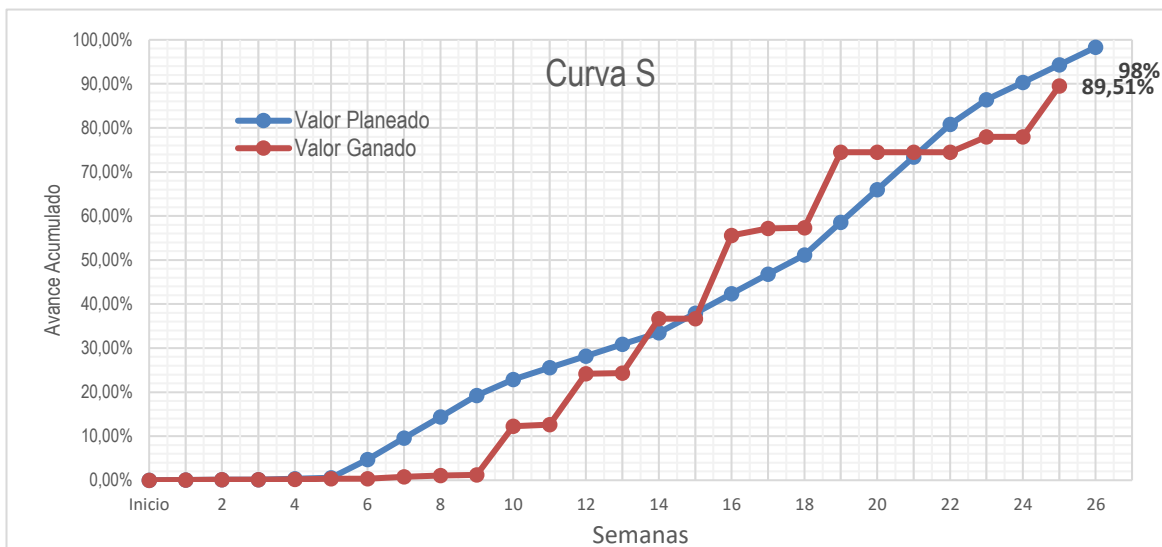

Curva S de acuerdo a programación aprobada a contratista de obra a la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO



14 de enero de 2021: Entrega de unidades sanitarias a dos beneficiarias del proyecto.



10 de enero de 2021: Entrega de obras a beneficiarios del proyecto.

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Obra:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICA DO	% CUBRIMIENT O	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	45-45- 101086765	30%	\$ 1.173.593.544,90	28/07/2020	28/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	45-45- 101086765	30%	\$ 34.646.735,00	28/01/2021	28/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	45-45- 101086765	5%	\$ 195.598.924,15	28/07/2020	28/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

Estabilidad de Obra	45-45-101086765	50%	\$ 1.898.244.684,00	5 años 0 meses 0 días A partir del acta de recibo final		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101059770	15% Del valor de la perdida - Mínimo: 1,00 SMMLV	\$ 1.173.593.544,90	28/07/2020	28/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Buen manejo del anticipo	45-45-101086765	100%	\$ 379.648.937,00	28/07/2020	28/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

MANEJO DE ANTICIPO

Se realizó el desembolso del anticipo el 29 de septiembre de 2020 por valor de \$379.648.937

A la fecha se ha realizado una amortización del anticipo por valor de \$257.254.884,51, quedando un saldo de \$22.394.052,49.



3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2200827
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de María la Baja (Bolívar) Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - Grupo 4. Tadó - Chocó.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-CONNECTIONS
Plazo inicial	6 MESES
Valor inicial	\$424.652.510
Fecha de Inicio	28-07-2020
Fecha de Terminación Inicial	28-01-2021
Si hay modificaciones al contrato... incluirlas (suspensiones, prórrogas, adiciones)	N/A

PERSONAL APROBADO DE INTERVENTORÍA – PARA EL PERIODO DEL INFORME

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNÁNDEZ	Ingeniero Civil-ESP. Geotecnia Vial y Pavimentos.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JESÚS ANTONIO PALACIOS PALACIOS	ING CIVIL
AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	CARLOS JULIO ARIAS LOPEZ	ING CIVIL
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	DAVID LEONARDO ROZO GASCA	ING CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS
PROFESIONAL SOCIAL	ANA YENCY TORRES ALLIN	PSICÓLOGA
PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	WENDY YINETH PARRA ROJAS	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE CALIDAD	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNÁNDEZ	Ingeniero Civil-ESP. Experiencia específica en Gestión de Calidad
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 1	VÍCTOR LUIS MURILLO RAMÍREZ	ING CIVIL



CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2	LINA MARCELA MOSQUERA MOSQUERA	Arquitecta
TECNICO PGIO	SAVIER PALACIOS ROMANA	Ingeniero Ambiental

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Interventoría:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICADO	% CUBRIMIENTO	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	21-45-101305285	20%	\$ 84.930.503,00	28/07/2020	18/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	21-45-101305285	30%	\$ 127.395.754,50	28/07/2020	18/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	21-45-101305285	5%	\$ 21.232.625,75	28/07/2020	18/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101151981	10% del valor de la perdida - Minimo: 1,00 SMMLV	\$ 219.450.750,00	28/07/2020	29/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

PROBLEMÁTICAS

Hasta la fecha no se han presentado problemáticas que afecten el desarrollo del proyecto

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS



SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE INTERVENTORIA

La Interventoría ha presentado en este periodo 4 Informes semanales de interventoría con corte a:
27 de diciembre de 2020
03 de enero de 2021
10 de enero de 2021
17 de enero de 2021

Y ha presentado en este periodo 1 Informe mensual con corte al 30 de diciembre de 2020

COMUNICACIONES Y SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA

Se anexa Matriz de comunicaciones

REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

28 de noviembre de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.
11 de enero de 2021: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.
18 de enero de 2021: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.
25 de enero de 2021: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.

Elaborado por:

ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE
SUPERVISOR
