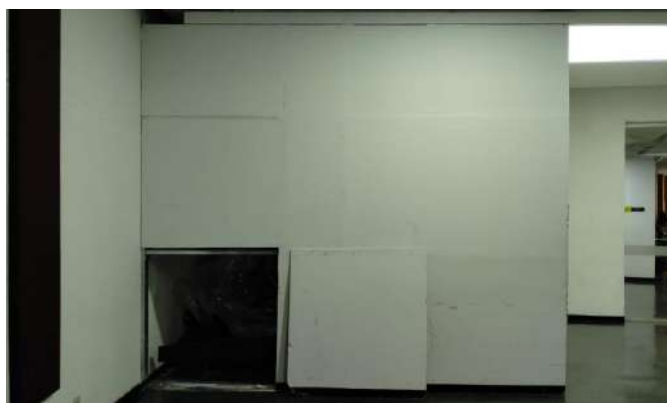
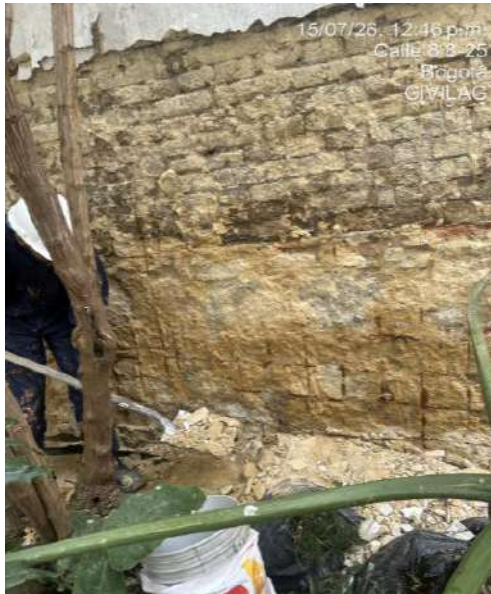


		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.									
FECHA		21/07/2026			PERIODO No.		55	DEL	14/07/2026	AL	20/07/2026
1. INFORMACIÓN GENERAL											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A						CONTRATO DE OBRA - SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S					
CONTRATO No.:		1880-2025				CONTRATO No.:		1844-2025			
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES."				OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES."			
CORREO ELECTRONICO		interventoria1880idartes@velnec.com				CORREO ELECTRONICO		mantenimientosidartes25@gmail.com			
PLAZO INICIAL:		9 meses				PLAZO INICIAL:		8 meses			
FECHA DE SUSCRIPCION:		17 de junio de 2025				FECHA DE SUSCRIPCION:		3 de junio de 2025			
FECHA DE INICIACIÓN:		4 de julio de 2025				FECHA DE INICIACIÓN:		4 de julio de 2025			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A				**FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A			
**FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A				**FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:		4 de julio de 2026				FECHA DE TERMINACIÓN:		4 de junio de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:		366				PLAZO ACTUALIZADO:		336			
PLAZO TRANSCURRIDO:		381		EQUIVALE AL 104,10%		PLAZO TRANSCURRIDO:		381		EQUIVALE AL 113,39%	
VALOR INICIAL :		\$ 503.467.331,00				VALOR INICIAL :		\$ 3.355.937.000,00			
VALOR ADICION No.1:		\$ 157.773.775,00				VALOR ADICION No.1:		\$ 699.997.277,00			
VALOR ADICION No.2:		\$ 105.188.427,00				VALOR ADICION No.2:		\$ 550.975.596,00			
VALOR CON ADICION		\$ 766.429.533,00				VALOR CON ADICION		\$ 4.606.909.873,00			
VALOR PAGADO:		\$ 438.945.303,00				VALOR PAGADO:		\$ 2.134.068.865,00			
VALOR POR PAGAR:		-\$ 157.773.394,00				VALOR POR PAGAR:		-\$ 699.996.896			
VALOR POR PAGAR:		\$ 64.522.028,00				VALOR POR PAGAR:		\$ 2.472.841.008			
SUPERVISOR:		ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR				INTERVENTOR:		VELNEC S.A.			
2. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS 1880-2025 Y 1844-2025											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1880-2025											
Modificación	Fecha de suscripción del documento contractual	Tipo de Póliza	No. Póliza	Anexo No.	Amparo	Vigencia		Valor			
						Inicio	Fin				
Minuta contractual	17/06/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	0	Cumplimiento de contrato	17/06/2025	17/09/2026	50.346.733,10			
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2025	17/03/2029	25.173.366,55			
					Calidad del servicio	17/03/2026	17/03/2031	151.040.199,30			
								226.560.298,95			
					ResponsabilidadCivil Extracontractual	N/A	N/A	N/A			
Minuta contractual	17/06/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	1	Cumplimiento de contrato	17/06/2025	17/09/2026	50.346.733,10			
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2025	17/03/2029	25.173.366,55			
					Calidad del servicio	17/03/2026	17/03/2031	151.040.199,30			
								226.560.298,95			
					ResponsabilidadCivil Extracontractual	N/A	N/A	N/A			
Actualizado con acta de inicio	4/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	4	Cumplimiento de contrato	4/07/2025	3/03/2027	76.642.953,30			
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	4/07/2025	3/09/2029	38.321.476,65			
					Calidad del servicio	3/09/2026	3/09/2031	229.928.859,90			
								344.893.289,85			
					ResponsabilidadCivil Extracontractual	N/A	N/A	N/A			
CONTRATO DE OBRA 1844-2025											
Minuta contractual	1/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-47-994000071799	1	Cumplimiento	10/06/2025	10/06/2026	335.593.700,00			
					Buen manejo del anticipo	10/06/2025	10/02/2026	1.006.781.100,00			
					Pago de salarios y prestaciones	10/06/2025	10/02/2029	67.796.850,00			
					Calidad del servicio			1.006.781.100,00			
					Predios, Labores y Operaciones	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00			
					Contratistas y Subcontratistas	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00			
					RCE Patronal	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00			
					Vehiculos propios y no propios	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00			
Actualizado con acta de inicio	4/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-47-994000071799	4	Cumplimiento	10/06/2025	4/12/2026	460.690.987,30			
					Buen manejo del anticipo	10/06/2025	3/08/2026	1.006.781.100,00			
					Pago de salarios y prestaciones	10/06/2025	3/08/2029	230.345.493,65			
					Calidad del servicio			1.382.072.961,90			
					Predios, Labores y Operaciones	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00			
					Contratistas y Subcontratistas	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00			
					RCE Patronal	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00			
					Vehiculos propios y no propios	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00			


		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.									
FECHA	21/07/2026				PERIODO No.	55	DEL	14/07/2026	AL	20/07/2026	
5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS											
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.											
NO APLICA											
6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA											
ACTIVIDAD						RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA			
NO APLICA						NO APLICA		NO APLICA			
7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES											
N.A											
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - ETAPA DIAGNOSTICO											
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO											
1	SE REALIZO EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL NO. 55 EN IDARTES EL 22 DE JULIO DEL 2026										
2. COMPONENTE TECNICO											
3. COMPONENTE SST											
4. COMPONENTE AMBIENTAL											
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - ETAPA DE EJECUCIÓN											
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO											
1	SE REALIZO EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL NO. 55 EN IDARTES EL 22 DE JULIO DEL 2026										
2	Se remite la comunicación 0547.26 IDARTES GTC del 14 de julio de 2026, con asunto "FILTRACIÓN ESCENARIO TEATRO AL PARQUE."										
3	Se remite la comunicación 0548.26 IDARTES GTC del 14 de julio de 2026, con asunto "REMISION CRONOGRAMA DE INSTALACION ORTOPROYECTOR PLANETARIO"										
4	Se remite la comunicación 0549.26 IDARTES GTC del 14 de julio de 2026, con asunto "OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE CALIDAD No.12 V2"										
5	El día 16 de julio de 2026 la arquitecta Marisol envió correo electrónico con asunto "SOLICITUD ESPACIO TALLER No. 5 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS CASABLANCA EN CASA FERNÁNDEZ"										
6	Se remite la comunicación 0550.26 IDARTES GTC del 16 de julio de 2026, con asunto "INFORME DE POTABILIDAD DE AGUA"										
7	Se remite la comunicación 0551.26 IDARTES GTC del 16 de julio de 2026 Rad. 20264600089042, con asunto "APROBACION UBICACION DE ANCLAJES PILONA 10"										
8	Se remite la comunicación 0552.26 IDARTES GTC del 16 de julio de 2026 Rad. 20264600089232, con asunto "APROBACION INFORME MENSUAL DE CALIDAD No.12 V3"										
9	El contratista envía mediante correo electrónico el día 14 de julio de 2026 el "GESTIÓN SOCIAL_1844_2025_IDARTES_INFORME SEMANAL No. 54"										
10	El contratista envía mediante oficio OI-512-2026 el día 14 de julio de 2026 el "Cronograma Instalación Ortoproyector"										
11	El contratista envía mediante oficio OI-513-2026 el día 16 de julio de 2026 la "Respuesta al comunicado No. 0504.26 IDARTES GTC – Contrato de Obra No. 1844-2025 y Procedimientos BIC V1 16.07.2026"										
	El contratista envía mediante oficio OI-514-2026 el día 16 de julio de 2026 la "SUBSANACION 02 INFORME MENSUAL DE CALIDAD #12"										
12	El contratista envía mediante oficio OI-515-2026 el día 16 de julio de 2026 la "ENTREGA DE INFORME DE PAGO 10 CON SOPORTES E INFORMES APROBADOS"										
2. COMPONENTE TECNICO											
1	El Contratista dio cumplimiento a la obligación de mantener en obra el personal profesional y técnico solicitado en los pliegos, dentro de los tiempos exigidos, lo cual fue verificado por la Interventoría.										
2	Durante la presente semana no se realizaron ensayos de laboratorio, toda vez que las actividades ejecutadas fueron de baja magnitud. Una vez se inicien frentes de obra con mayores volúmenes de trabajo y se considere necesario por parte de la Interventoría, se procederá con la caracterización de materiales y la ejecución de los ensayos correspondientes. Sin embargo, las fichas técnicas de materiales, y procedimientos constructivos, se incluirán como anexo en el informe mensual										
3	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se presentaron daños ni afectaciones a la obra, a los inmuebles aledaños, ni a las estructuras, instalaciones o redes de servicio superficiales y subterráneas existentes en el área de trabajo o en sus alrededores, al igual que no se presentaron deterioros en las vías de acceso asociados a la ejecución de las obras, por lo cual no fue necesario realizar reparaciones.										
4	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se ha requerido la movilización de maquinaria y equipo pesado, por lo cual no aplicó la verificación de esta obligación.										
5	A continuacion, se relacionan las actividades ejecutadas por equipamiento:										
								SEMANA ANTERIOR	PRESENTE SEMANA	TENDENCIA	
1. CINEMATECA:				% Programado	99,05%	% Ejecutado	97,22%	% Desviación	-1,27%	-1,83%	↑
2. TEATRO JORGE ELIECER GAITAN				% Programado	97,83%	% Ejecutado	94,26%	% Desviación	-2,46%	-3,57%	↑
FECHA DE INICIO		FECHA FIN		DESCRIPCION				CANTIDAD			
20/07/2026		20/07/2026		PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION				54,31m2			
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.											
3. PLANETARIO				% Programado	94,13%	% Ejecutado	87,26%	% Desviación	-15,65%	-6,87%	↓
FECHA DE INICIO		FECHA FIN		DESCRIPCION				CANTIDAD			
14/07/2026		16/07/2026		Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrilico permeable techos)				132,15m2			
17/07/2026		17/07/2026		Desmonte de muro en drywall				12,65m1			
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.											

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.								
FECHA	21/07/2026				PERIODO No.	55	DEL	14/07/2026	AL	20/07/2026
4. CASA FERNANDEZ										
		% Programado	92,23%	% Ejecutado		65,38%	% Desviación		-24,05%	-26,85%
FECHA DE INICIO		FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
15/07/2026		18/07/2026	Recuperacion de pasos de madera en escalera metalica exterior en patio(pelar, lijar, pintar). incluye cinta antideslizante y pintura de pasamanos					23 unid		
14/07/2026		18/07/2026	Protección de mobiliario para instalación de pinturas					167m2		
14/07/2026		18/07/2026	Desmonte de luminarias					39 unid		
14/07/2026		18/07/2026	Resane y pintura a la cal 3 manos (incluye trabajo en alturas)					70 m2		
15/07/2026		18/07/2026	Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm					39 unid		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.										
		5. GALERIA SANTA FÉ	% Programado	100,00%	% Ejecutado		100,00%	% Desviación		0,00%
		6. CASONA DE LA DANZA	% Programado	100,00%	% Ejecutado		99,69%	% Desviación		-0,31%
		7. TEATRO AL PARQUE	% Programado	84,88%	% Ejecutado		62,66%	% Desviación		-28,77%
FECHA DE INICIO		FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
14/07/2026		17/07/2026	Impermeabilización de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1.5mm, suministro e instalación					21,16m2		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.										
		8. BLOQUE PEDAGOGICO	% Programado	93,40%	% Ejecutado		91,61%	% Desviación		-2,02%
FECHA DE INICIO		FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
15/07/2026		18/07/2026	Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrílico permeable techos)					7,1 m2		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.										
		9. TEATRO EL ENSUEÑO	% Programado	64,15%	% Ejecutado		29,53%	% Desviación		-11,08%
		10. TEATRO SAN JORGE	% Programado	43,30%	% Ejecutado		2,69%	% Desviación		-31,62%
FECHA DE INICIO		FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
14/07/2026		17/07/2026	Excavacion de tierra a cielo abierto bajo rasante, con medios manuales.					2,93m3		
		11. PILONA	% Programado	94,37%	% Ejecutado		54,44%	% Desviación		-65,69%
FECHA DE INICIO		FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
17/07/2026		17/07/2026	Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1.5mm, suministro e instalación. Cubierta + Terraza Cafetería					185,38m2		
14/07/2026		17/07/2026	Curado fisuras con Sikaflex en placa					40 ml		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.										
		12. LAVADO DE TANQUES	% Programado	71,99%	% Ejecutado		72,77%	% Desviación		0,34%
3. COMPONENTE SST										
1	Se cumplió con la entrega de la documentación vigente de afiliaciones y pagos del personal vinculado al contrato de obra y de interventoría, incluyendo los respectivos soportes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral, lo cual fue verificado por parte del interventor en el contrato de obra y por el supervisor en el contrato de interventoría. Esta información será incorporada en el informe mensual correspondiente.									
2	Se está cumpliendo con las obligaciones laborales, contractuales y de seguridad social integral por parte de la empresa de obra y de la empresa interventora, de acuerdo con lo acreditado mediante la respectiva certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal. Así mismo, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los correspondientes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Esta certificación será incorporada en el informe mensual correspondiente.									
3	Para el presente informe semanal no se requirió la presentación de documentación de ingreso de maquinaria, equipo o vehículos por parte del contratista.									
4. COMPONENTE AMBIENTAL										
4. COMPONENTE SOCIAL										
El contratista envía mediante correo electrónico el día 14 de julio de 2026 el "GESTIÓN SOCIAL_1844_2025_IDARTES_INFORME SEMANAL No. 54"										
9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA										
PLANETARIO										
ACTIVIDAD 1. Desmonte de muro en drywall										
ANTES			DURANTE			DESPUES				
										

IDARTES INSTRUMENTOS DE TRABAJO		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.				VELNEC 33 años		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ BOGOTÁ			
FECHA		21/07/2026			PERIODO No.		55	DEL	14/07/2026	AL	20/07/2026
ACTIVIDAD 2. Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrílico permeable techos)											
ANTES				DURANTE				DESPUES			
											
TEATRO JORGE ELIECER GAITAN											
ACTIVIDAD 3. PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION											
ANTES				DURANTE				DESPUES			
											
CASA FERNÁNDEZ											
ACTIVIDAD 4. Recuperacion de pasos de madera en escalera metalica exterior en patio(pelar, lijar, pintar). incluye cinta antideslizante y pintura de pasamanos											
ANTES				DURANTE				DESPUES			
											

IDARTES INSTITUTO DE ARTES DE BOGOTÁ		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.				VELNEC 25 años		BOGOTÁ BOGOTÁ		
FECHA	21/07/2026				PERIODO No.	55	DEL	14/07/2026	AL	20/07/2026
ACTIVIDAD 5. Protección de mobiliario para instalación de pinturas										
ANTES			DURANTE			DESPUES				
 14/07/26, 12:11 p.m. Calle 8 8A-1 Bogotá CIVILAG			 14/07/26, 2:38 p.m. Calle 8 8A-1 Bogotá CIVILAG			 14/07/26, 3:11 p.m. Calle 8 8A-1 Bogotá CIVILAG				
ACTIVIDAD 6. Desmonte de luminarias										
ANTES			DURANTE			DESPUES				
 15/07/26, 9:53 a.m. Calle 8 8A-74 Bogotá CIVILAG			 15/07/26, 9:53 a.m. Calle 8 8A-74 Bogotá CIVILAG			 15/07/26, 9:53 a.m. Calle 8 8A-74 Bogotá CIVILAG				
ACTIVIDAD 7. Resane y pintura a la cal 3 manos (incluye trabajo en alturas)										
ANTES			DURANTE			DESPUES				
 15/07/26, 12:46 p.m. Calle 8 8-25 Bogotá CIVILAG			 15/07/26, 12:46 p.m. Calle 8 8-25 Bogotá CIVILAG			 15/07/26, 1:38 p.m. Calle 8 8-29 Bogotá CIVILAG				
ACTIVIDAD 8. Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm										
ANTES			DURANTE			DESPUES				
 17/07/26, 1:30 p.m. Calle 8 8-72 Bogotá CIVILAG			 17/07/26, 1:30 p.m. Calle 8 8-72 Bogotá CIVILAG			 17/07/26, 1:30 p.m. Calle 8 8-72 Bogotá CIVILAG				

 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.		 					
FECHA	21/07/2026	PERIODO No.	55	DEL	14/07/2026	AL	20/07/2026
TEATRO AL PARQUE							
ACTIVIDAD 9. Impermeabilización de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1,5mm, suministro e instalación							
ANTES		DURANTE		DESPUES			
							
BLOQUE PEDAGÓGICO							
ACTIVIDAD 10. Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrílico permeable techos)							
ANTES		DURANTE		DESPUES			
							
PILONA 10							
ACTIVIDAD 11. Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1,5mm, suministro e instalación. Cubierta + Terraza Cafetería							
ANTES		DURANTE		DESPUES			
 17 jul 2026 2:38:45 p.m. # 18T-32 Calle 66A Sur Ciudad Bolívar Bogotá, D.C.		 17 jul 2026 2:36:39 p.m. # 18U-8 Calle 66A Sur Ciudad Bolívar Bogotá, D.C.		 17 jul 2026 12:41:34 p.m. # 18T-32 Calle 66A Sur Ciudad Bolívar Bogotá, D.C.			

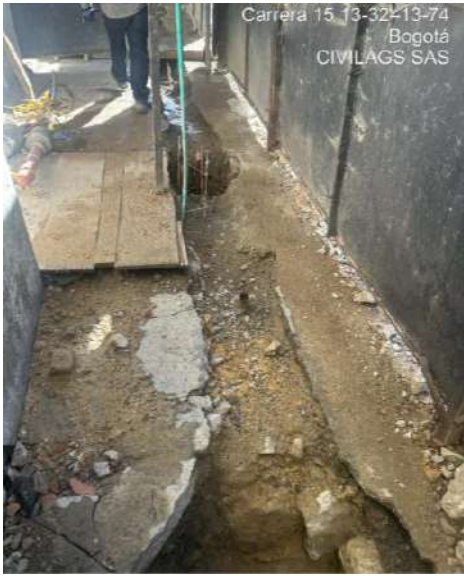		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.									
FECHA	21/07/2026			PERIODO No.	55	DEL	14/07/2026		AL	20/07/2026	
ACTIVIDAD 12. Curado fisuras con Sikaflex en placa											
ANTES				DURANTE				DESPUES			
											
TEATRO SAN JORGE											
ACTIVIDAD 13. Excavacion de tierra a cielo abierto bajo rasante, con medios manuales.											
ANTES				DURANTE				DESPUES			
											
* VoBo SUPERVISOR IDARTES NOMBRE SUPERVISOR: JOSE EMILIO BERNAL SIERRA * Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma  FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA NOMBRE: FRANCIS IVAN CALDERON VELNEC S.A.S						* VoBo SUPERVISOR IDARTES NOMBRE SUPERVISOR: GLADYS BARRERA * Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma * VoBo SUPERVISOR IDARTES NOMBRE SUPERVISOR: ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR * Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma					
