

INFORME ACTA PARCIAL 1

Número Contrato de Obra	130.19.06-179 DE 2026
Contratante	MUNICIPIO DE ZARZAL
Nit	891.900.624-0
Contratista	INGEARQ SAS
Nit	901.186.507-9
Valor Inicial del Contrato	DOCIENTOS SIETE MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ,DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$207.645.264)
Valor Adición	OCHENTA Y UN MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 81.999.558)
Valor total del Contrato	DOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$ 289.644.822)
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto del Contrato	EJECUTAR EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 12A Y 13 DEL BARRIO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA
Porcentaje de anticipo	30%
Valor del Anticipo	\$ 62.293.579
Duración del Contrato	Noventa (90) días
Fecha de Inicio	04 de junio de 2026
Fecha de terminación	01 de septiembre de 2026
Periodo del informe	04 de junio al 27 de julio de 2026.

1. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO



Ubicación Tramo a intervenir – Casco urbano del Municipio de Zarzal
Fuente: Google Earth

Tramo	Coordenadas
Barrio las Mercedes	4°24'03.9"N 76°04'15.3"W

2. ESTADO INICIAL DEL TRAMO A INTERVENIR

La zona de intervención se encuentra ubicada en el Barrio las Mercedes, casco urbano del Municipio de Zarzal, el estado de las vías antes de la intervención es el siguiente:



Se trata de una calzada de 61 metros de largo x 6 metros de ancho, la cual tiene un carril construido en concreto y un carril en afirmado.

3. ACTIVIDADES Y CANTIDADES CONTRACTUALES.

Descripción	Unidad	Cantidad
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	144,80
COMISION TOPOGRAFIA	DIA	6,00
DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	16,55
EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	119,83
CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	199,71
CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	163,33
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA	M3	17.432,48
TRANSPORTE DE EQUIPOS	TON- KM	1.994,72
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION	M3 - E	163,33
RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	79,88
RELLENO SUB BASE COMPAC- CILINDRO	M3	167,62
PAV.CONCR.MR=40 MEZCLA IN SITU E=0.20,INC. JUNTA	M2	199,71
CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	311,345
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	M	50,10
LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	1,00

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	451,42
ADICION 1		
COMISION TOPOGRAFIA	DIA	5,00
MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	DIA	7,00
PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	DIA	7,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	85,68
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	68,00
DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	1,00
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1,00
RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND	3,00
SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	0,18
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	68,00
COLCHON ARENA GRUESA E=5- 7CM	M3	6,12
TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M	68,00
SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	9,00
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	85,68
CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	111,38
ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - DESDE CANTERA	M3/KMS	4673,44
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	111,38

EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	3,00
ITEM NO PREVISTOS		
CONCRETO MR40	M3	3,35
SELLADO JUNTA DE AISLAMIENTO	M	68,00
DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	4,00
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	4,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,40

4. CANTIDADES EJECUTADAS DESDE EL 04 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2026

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	146,00
COMISION TOPOGRAFIA	DIA	6,00
DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	68,04
EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	161,59
CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	249,14
CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	227,75
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA	M3	3.128,49
TRANSPORTE DE EQUIPOS	TON- KM	0,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION	M3 - E	227,75

RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	118,21
RELLENO SUB BASE COMPAC-CILINDRO	M3	65,82
PAV.CONCR.MR=40 MEZCLA IN SITU E=0.20,INC. JUNTA	M2	0,00
CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	0,00
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	M	0,00
LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	0,00
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	0,00
ADICION 1		
COMISION TOPOGRAFIA	DIA	5,00
MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	DIA	7,00
PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	DIA	7,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	85,68
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	68,00
DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	1,00
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1,00
RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND	3,00

SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	0,18
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	68,00
COLCHON ARENA GRUESA E=5- 7CM	M3	6,12
TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M	68,00
SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	9,00
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	76,16
CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	111,38
ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - DESDE CANTERA	M3/KMS	1294,72
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	111,38
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	3,00

5. DESARROLLO DEL CONTRATO

En desarrollo de las actividades del contrato 130.19.06-179 DE 2026, se han presentado inconvenientes derivados del estado de la red de Alcantarillado, lo anterior dada la obsolescencia de un tramo de dicha red, de forma general, el desarrollo de las actividades ha sido el siguiente:

Actividad	Desarrollo
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	Se ha llevado a cabo el cerramiento de sector calle 16 entre carrera 12a y 13, sobre una longitud de 146 metros.
COMISION TOPOGRAFIA	La comisión topográfica llevo a cabo la localización y el replanteo del carril de vía de a construir, se trabajó durante 6 días.
DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	Se realizó la demolición de fragmentos sueltos de losa, los cuales deben contruidos nuevamente para así garantizar el buen funcionamiento del concreto nuevo, se demolieron 68,04 M2.
EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	Se llevó a cabo la excavación a máquina sobre el carril que se va a construir en concreto rígido, se excavaron 161,59 M3
CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	Se realizó la conformación de 249,14 M2, los cuales serán utilizados para la fundación de las capas de roca muerta y sub base del pavimento.
CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	Se llevó a cabo el cargue a volquetas del material excavado para la red de alcantarillado, para la vía y los sobrantes de demolición, se cargaron 227,75 M3.
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA	Se realizó el transporte desde sitio autorizado, de los materiales Pétreos necesarios para la obra, la cantidad fue 3.128,49
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION	Se realizó el transporte hasta el sitio de disposición final de todos los sobrantes

	de demolición y excavación, la cantidad total fue 227,75 M-E
RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	Se llevó a cabo la colocación y compactación del material de ROCAMUERTA, con un espesor de capa de 40cm, la cantidad total fue 118,21 M3.
RELLENO SUB BASE COMPAC-CILINDRO	Se llevó a cabo la colocación y compactación del material de SUBBASE, con un espesor de capa de 20cm, la cantidad total fue 65,82 M3.
ADICION 1	
COMISION TOPOGRAFIA	La comisión topográfica llevo a cabo la localización y el replanteo de la tubería de alcantarillado a optimizar, realizando la ubicación de cotas de batea y cotas claves de las tuberías, ubicación de las cámaras de inspección, se trabajó durante 5 días.
MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	La motobomba fue utilizada para la extracción de las aguas residuales de la red de Alcantarillado, se utilizó durante 7 días.
PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	La planta Eléctrica fue utilizada durante la extracción de las aguas residuales, se utilizó durante 7 días.
EXCAVACION TIERRA A MANO	Se llevó acabo la excavación a mano de la red de Alcantarillado, con el fin de evacuar la tubería de asbesto cemento y el material contaminado, se excavaron 85,68 M3.
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	Se llevó a cabo el manejo de aguas residuales de la tubería matriz a reponer, en total se manejó el agua en 68 metros lineales.

DEMOLICION CONCRETO	CAMARA	DE	Se llevó a cabo la demolición de una cámara de concreto, la cual estaba en mal estado.
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS			Se construyó una cámara de concreto para reemplazar la cámara demolida.
RECONSTRUCCION SUPERIOR-TAPA CAMARA	LOSA		Se realizó la reconstrucción de 3 losas superiores de cámaras de inspección existentes.
SOLADO ESPESOR E=0.07M PSI 210 MPA	3000		Se realizó la instalación de un solado para la fundación de la nueva cámara de concreto, se fundieron 0,18 M2.
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"			Se llevó a cabo el retiro de 68 Metros lineales de tubería de red matriz de alcantarillado, la cual estaba en asbesto cemento.
COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM			Posterior al retiro de la tubería de asbesto cemento y posterior a la preparación del fondo de la zanja, se instaló el colchón de grava para la tubería de PVC, se instalaron 6,12 M3.
TUBERIA PVC NOVAFORT 12"			Se llevó a cabo la instalación de tubería de pvc para la red matriz, en total se instalaron 68 metros lineales de tubería de 12".
SILLA YEE NOVAF 6"X12"			Se realizó la instalación de 9 domiciliarias que estaban conectadas a la antigua red matriz, la conexión se realizó mediante SILLAS YEE.
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN			Se realizó el lleno y compactación de las zanjas para las tuberías, se utilizaron 76,16 M3 de rocamuerta para lleno.
CARGUE DE MAQUINA	SOBRANTES	A	Se llevó a cargue a máquina, de los sobrantes de excavación y demolición

		de la red matriz de alcantarillado, el cargue total fue de 111,38 M3.
ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - DESDE CANTERA		Se llevó a cabo el cargue de los materiales pétreos para la instalación de la red matriz de Alcantarillado, la producción fue de 1294,72M3/KM
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.		Se ejecutó el transporte de sobrantes desde la Obra, se transportaron 111,38M3
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO		Se realizaron 3 empalmes a las cámaras existentes en el tramo

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD – foto barrio Las Mercedes.



COMISION TOPOGRAFIA - foto barrio Las Mercedes.



DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM - foto barrio Las Mercedes.



EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO - foto barrio Las Mercedes.



CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 - foto barrio Las Mercedes.



CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA - foto barrio Las Mercedes.



ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA - foto barrio Las Mercedes.



TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION - foto barrio Las Mercedes.



RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) - foto barrio Las Mercedes.



RELLENO SUB BASE COMPAC-CILINDRO - foto barrio Las Mercedes.



COMISION TOPOGRAFIA ALCANTARILLADO - foto barrio Las Mercedes.



MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER) - foto barrio Las Mercedes.



PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER) - foto barrio Las Mercedes.



EXCAVACION TIERRA A MANO - foto barrio Las Mercedes.




MANEJO DE AGUAS RESIDUALES - foto barrio Las Mercedes.




DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO - foto barrio Las Mercedes.



CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS - foto barrio Las Mercedes.

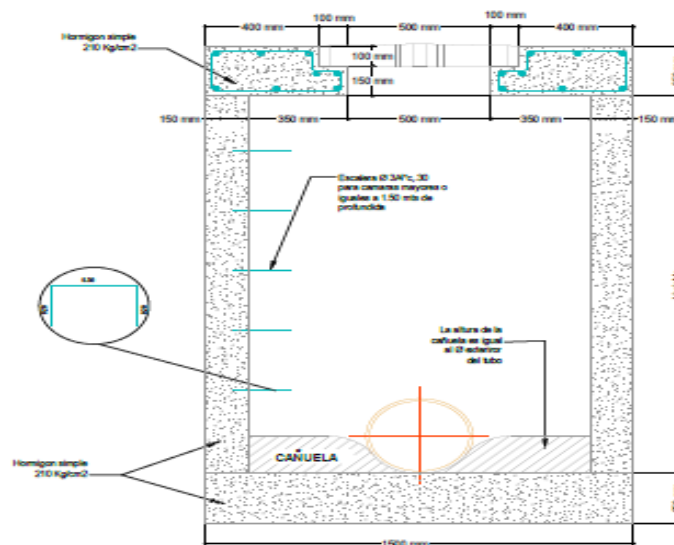

RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA - foto barrio Las Mercedes.

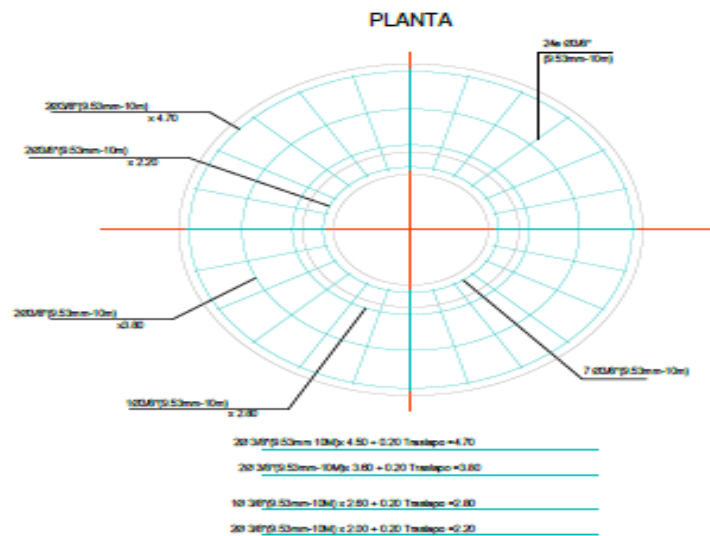

RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" - foto barrio Las Mercedes.



COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM - foto barrio Las Mercedes.



TUBERIA PVC NOVAFORT 12" - foto barrio Las Mercedes.



SILLA YEE NOVAF 6"X12" - foto barrio Las Mercedes.



RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN - foto barrio Las Mercedes.



CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA - foto barrio Las Mercedes.




ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - DESDE CANTERA - foto barrio Las Mercedes.



ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM. - foto barrio Las Mercedes.



EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO - foto barrio Las Mercedes.

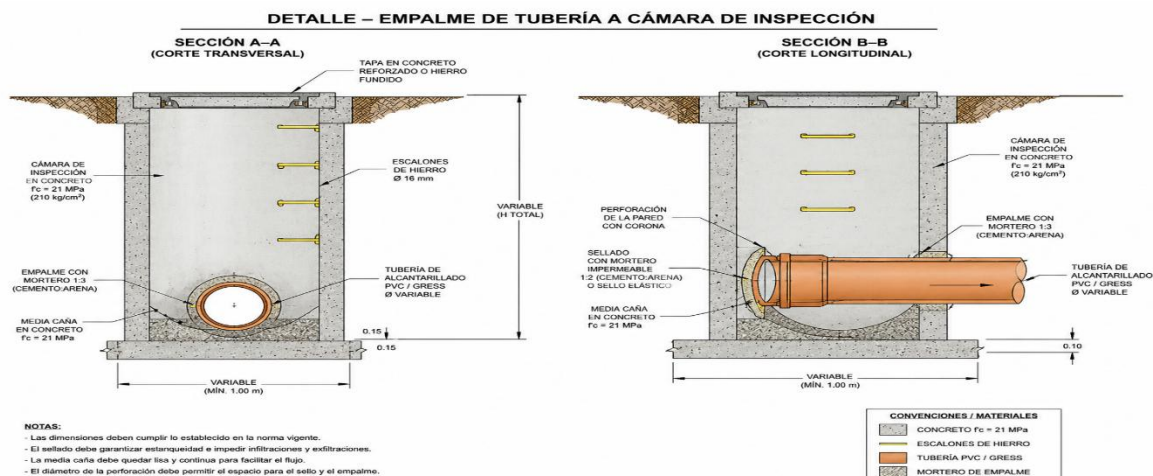


7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En la inspección realizada a la losa existente, la cual estará empalmada se encuentra en regular estado, con fisuras longitudinales, transversales, desprendimiento y desprendimiento de bordes.


En vista de lo anterior, se realizó revisión de los documentos especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022, el Título C de la NSR – 10 y el documento técnico MANUAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGON del ICPA de Argentina, con el fin de plantear una solución que permita que no se presente la transferencia de fisuras de la losa vieja a la losa nueva, como resultado de la revisión, se propuso construir una JUNTA DE AISLAMIENTO CON SOBRESPESOR DE LOSA.

Detalle junta de aislamiento con sobreespesor de losa

SOBRESPESOR DE LOSA

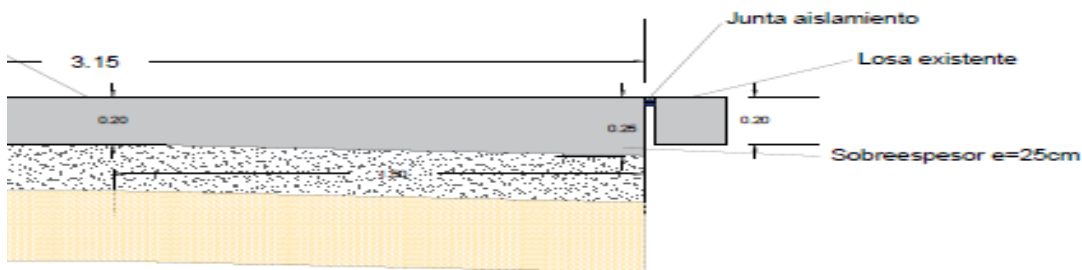

DETALLE JUNTA DE AISLAMIENTO



Fuente: Diseño Proyecto.

DETALLES ÍTEM NO PREVISTOS

Actividad	Unidad	Cantidad
CONCRETO MR40	M3	3,35
SELLADO JUNTA DE AISLAMIENTO	M	68,00
DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	4,00
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	4,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,40

8. CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

Además de los ÍTEM NO PREVISTOS, los cuales serán cubiertos con los recursos sobrantes de las menores cantidades de obra del contrato principal, se encontró una red de Alcantarillado, en asbesto cemento, la cual estaba ubicada bajo la zona sobre la cual se construiría el nuevo pavimento, por lo anterior, se solicitó la elaboración de una adición presupuestal, con el fin de cubrir las siguientes actividades constructivas:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
COMISION TOPOGRAFIA	DIA	5,00
MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	DIA	7,00
PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	DIA	7,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	85,68
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	68,00
DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	1,00
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1,00

RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND	3,00
SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	0,18
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	68,00
COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	6,12
TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M	68,00
SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	9,00
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	85,68
CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	111,38
ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - DESDE CANTERA	M3/KMS	4673,44
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	111,38
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	3,00

9. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Descripción	CDP N°	Valor CDP	Valor Contrato
Contrato No. 130.19.06- 179 DE 2026	2.3.2.01.01.001.03.02	\$ 208.876.944	\$ 207.645.264
Contrato Modificadorio No. 001 — ADICIÓN EN VALOR	2.3.0.01.01.001.03.02	\$ 81.999.558	\$ 81.999.558



CONSTRUCTORA INGEARQ S.A.S

CONTRATADO						ACTA PARCIAL 1		
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PRELIMINARES					ACTA PARCIAL 1		
1.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	144,80	\$ 12.748	\$ 1.845.910	146,00	\$ 12.748	\$ 1.861.208
1.2	COMISION TOPOGRAFIA	DIA	6,00	\$ 1.531.700	\$ 9.190.200	6,00	\$ 1.531.700	\$ 9.190.200
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	16,55	\$ 38.142	\$ 631.250	68,04	\$ 38.142	\$ 2.594.991
1.4	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	119,83	\$ 21.935	\$ 2.628.471	161,59	\$ 21.935	\$ 3.544.422
1.5	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	199,71	\$ 7.387	\$ 1.475.258	249,14	\$ 7.387	\$ 1.840.360
1.6	CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	163,33	\$ 6.149	\$ 1.004.285	227,75	\$ 6.149	\$ 1.400.452
1.7	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA	M3	17.432,48	\$ 1.690	\$ 29.460.891	3.128,49	\$ 1.690	\$ 5.287.150
1.8	TRANSPORTE DE EQUIPOS	TON-KM	1.994,72	\$ 2.300	\$ 4.587.856	0,00	\$ 2.300	\$ -
1.9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION	M3 - E	163,33	\$ 35.400	\$ 5.781.705	227,75	\$ 35.400	\$ 8.062.451
SUB TOTAL PRELIMINARES					\$ 56.605.826	SUB TOTAL PRELIMINARES		\$ 33.781.234

CONTACTANOS



CALLE 16 # 10-66
BARRIO LAS MERCEDES



322 3118194
315 5965949



ingearqsas01@gmail.com



CONSTRUCTORA INGEARQ S.A.S

2 INFRAESTRUCTURA VIAL						INFRAESTRUCTURA VIAL		
2.1	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	79,88	\$ 110.064	\$ 8.791.912	118,21	\$ 110.064	\$ 13.011.084
2.2	RELLENO SUB BASE COMPAC-CILINDRO	M3	167,62	\$ 133.186	\$ 22.324.637	65,82	\$ 133.186	\$ 8.765.650
2.3	PAV.CONCR.MR=40 MEZCLA IN SITU E=0.20,INC. JUNTA	M2	199,71	\$ 294.120	\$ 58.738.705	0,00	\$ 294.120	\$ -
2.4	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	311,345	\$ 7.730	\$ 2.406.697	0,00	\$ 7.730	\$ -
2.5	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	M	50,10	\$ 37.643,66	\$ 1.885.948	0,00	\$ 37.643,66	\$ -
2.6	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	1,00	\$ 958.946,20	\$ 958.946	0,00	\$ 958.946,20	\$ -
2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	451,42	\$ 7.448,07	\$ 3.362.209	0,00	\$ 7.448,07	\$ -
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL					\$ 98.469.055	SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL		\$ 21.776.734
3 ITEM NO PREVISTOS						ITEM NO PREVISTOS		
3.1	CONCRETO MR40	M3	3,35	\$ 888.843		0,00	\$ 888.843	\$ -
3.2	SELLADO JUNTA DE AISLAMIENTO	M	68,00	\$ 15.592		0,00	\$ 15.592	\$ -
3.3	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	4,00	\$ 7.463		0,00	\$ 7.463	\$ -
3.4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	4,00	\$ 95.004		0,00	\$ 95.004	\$ -

CONTACTANOS



CALLE 16 # 10-66
BARRIO LAS MERCEDES



322 3118194
315 5965949



ingearqsas01@gmail.com



CONSTRUCTORA INGEARQ S.A.S

3.5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,40	\$ 35.899			0,00	\$ 35.899	\$ -
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS					\$ -		SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS		\$ -
MODIFICATORIO 001							MODIFICATORIO 1		
4.0 PRELIMINAR									
4.1	COMISION TOPOGRAFIA	DIA	5,00	\$1.537.765	\$ 7.688.827		5,00	\$ 1.537.765	\$ 7.688.827
4.2	MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	DIA	7,00	\$ 287.672	\$ 2.013.704		7,00	\$ 287.672	\$ 2.013.704
4.3	PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	DIA	7,00	\$ 94.680	\$ 662.760		7,00	\$ 94.680	\$ 662.760
SUBTOTAL PRELIMINAR					\$ 10.365.291		SUBTOTAL PRELIMINAR		\$ 10.365.291
5.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS						OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	85,68	\$ 27.159,42	\$ 2.327.019		85,68	\$ 27.159	\$ 2.327.019
5.2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	68,00	\$ 14.763,04	\$ 1.003.887		68,00	\$ 14.763	\$ 1.003.887
5.3	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	1,00	\$ 337.789,00	\$ 337.789		1,00	\$ 337.789	\$ 337.789
5.4	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1,00	\$ 2.316.331,13	\$ 2.316.331		1,00	\$ 2.316.331	\$ 2.316.331
5.5	RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND	3,00	\$ 1.030.654,60	\$ 3.091.964		3,00	\$ 1.030.655	\$ 3.091.964

CONTACTANOS



CALLE 16 # 10-66
BARRIO LAS MERCEDES



322 3118194
315 5965949



ingearqsas01@gmail.com



CONSTRUCTORA INGEARQ S.A.S

5.6	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	0,18	\$ 56.941,98	\$ 10.250			0,18	\$ 56.942	\$ 10.250
5.7	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	68,00	\$ 12.958,03	\$ 881.146			68,00	\$ 12.958	\$ 881.146
5.8	COLCHON ARENA GRUESA E=5- 7CM	M3	6,12	\$ 72.734,83	\$ 445.137			6,12	\$ 72.735	\$ 445.137
5.9	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M	68,00	\$ 188.574,68	\$ 12.823.078			68,00	\$ 188.575	\$ 12.823.078
5.10	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	9,00	\$ 283.309,39	\$ 2.549.785			9,00	\$ 283.309	\$ 2.549.785
5.11	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	85,68	\$ 118.339,20	\$ 10.139.303			76,16	\$ 118.339	\$ 9.012.713
5.12	CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA	M3	111,38	\$ 6.342,12	\$ 706.385			111,38	\$ 6.342	\$ 706.385
5.13	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - DESDE CANTERA	M3/KMS	4673,44	\$ 2.244,00	\$ 10.487.199			1294,72	\$ 2.244	\$ 2.905.352
5.14	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	111,38	\$ 27.641,00	\$ 3.078.655			111,38	\$ 27.641	\$ 3.078.655
5.15	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	3,00	\$ 225.394,00	\$ 676.182		3,00	\$ 225.394	\$ 676.182	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO						\$ 50.874.110		SUBTOTAL ALCANTARILLADO		\$ 42.165.673
		VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 216.314.281		VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 108.088.932	

CONTACTANOS



CALLE 16 # 10-66
BARRIO LAS MERCEDES



322 3118194
315 5965949



ingearqsas01@gmail.com



CONSTRUCTORA INGEARQ S.A.S

COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACIÓN	28,90%	\$ 62.514.827,31
IMPREVISTOS	0,00%	\$ -
UTILIDAD	5,00%	\$ 10.815.714,07
TOTAL AIU	33,90%	\$ 73.330.541

COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	28,90%	\$ 31.237.701
IMPREVISTOS	0,00%	\$ -
UTILIDAD	5,00%	\$ 5.404.447
TOTAL AIU	33,90%	\$ 36.642.148

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$ 289.644.822
------------------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL 1	\$ 144.731.080
-----------------------------------	-----------------------

ANTICIPO		
VALOR INICIAL CONTRATO	PORCENTAJE DE ANTICIPO (SOBRE EL VALOR INICIAL)	VALOR DEL ANTICIPO
\$ 207.645.264	30%	\$ 62.293.579

ANTICIPO		VALOR
AMORTIZACIÓN	30,00%	\$ 43.419.324

TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL 1	\$ 101.311.756
-------------------------------------	-----------------------

CONTACTANOS



CALLE 16 # 10-66
BARRIO LAS MERCEDES



322 3118194
315 5965949



ingearqsas01@gmail.com



CONSTRUCTORA
INGEARQ S.A.S

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 207.645.264
VALOR DE ANTICIPO 30%	\$ 62.293.579
VALOR DE LA ADICIÓN 1	\$ 81.999.558
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 289.644.822
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 144.731.080
VALOR A DESCONTAR ANTICIPO 30%	\$ 43.419.324
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1	\$ 101.311.756

CARLOS MARIO RESTREPO VICTORIA

Representante legal
INGEARQ SAS
Contratista

CONTACTANOS



CALLE 16 # 10-66
BARRIO LAS MERCEDES





322 3118194
315 5965949



ingearqsas01@gmail.com

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141127281950			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901186507				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tuluá	
						14. Buzón electrónico 21	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social INGEARQ S.A.S							
36. Nombre comercial						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA			39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Zarzal		
41. Dirección principal CL 16 10 66							
42. Correo electrónico ingearqsas01@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3223118194		45. Teléfono 2 3155965949	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4112		47. Fecha inicio actividad 20180605		48. Código 4220		49. Fecha inicio actividad 20180605	
50. Código 1 4210		50. Código 2 4290		51. Código		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144247485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
47- Régimen Simple de Tributación - SIM							
48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
52- Facturador electrónico							
55- Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre RESTREPO VICTORIA CARLOS MARIO 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141127281950			
 (415)7707212489984(8020) 000014112728195 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 8 6 5 0 7 9		9		Impuestos y Aduanas de Tuluá		2 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 8 0 5 1 7				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 8 0 6 0 5				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		9 3 9 4 5				85. Extranjero	
78. Departamento		7 6				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 3 6				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 1 8 0 6 0 5				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
92. DV							
1		8 1		2 0 1 8 0 6 0 5		-	
2		1 0 1		2 0 2 4 0 2 2 9		-	
3						-	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.							
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141127281950			
 (415)7707212489984(8020) 000014112728195 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 8 6 5 0 7		9		Impuestos y Aduanas de Tuluá		2 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 2 0 0 1 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 6 1 9 9 1 6 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RESTREPO		105. Segundo apellido VICTORIA		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres MARIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 2 0 0 1 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 6 1 9 8 7 8 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RESTREPO		105. Segundo apellido VICTORIA		106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres HERNAN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0844dd34841e802c13186f65e4336c52ee0826d4413d133270e08c9355de3e59fcf789f774984ea93a8325e7827968d2

Número de Factura: FEIA-36

Fecha de Emisión: 28/07/2026

Fecha de Vencimiento: 02/08/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGEARQ S.A.S

Nombre Comercial: INGEARQ S.A.S

Nit del Emisor: 901186507

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-47

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4112

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: Zarzal

Dirección: CL 16 10 66

Teléfono / Móvil: 3223118194

Correo: facturacioncarbocarlosm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 891900624

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: Zarzal

Dirección: CARRERA 9 N 10-36

Teléfono / Móvil: 5722219000

Correo: obraspublicas@zarzal-valle.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	032	ACTA PARCIAL 1 CONTRATO DE OBRA 130 19 06 179 DE 2026 EJECUTAR EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 12A Y 13 DEL BARRIO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	NIU	1,00	\$ 144.731.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 144.731.080,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	ANTICIPO	30,00	\$ 43.419.324,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/07/2026 16:25:15
Documento validado por la
DIAN:
28/07/2026 16:25:16
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	144731080
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	144731080
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	144731080
Descuento Global (-)	43419324
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 101311756

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	144.731.080,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	144.731.080,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	144.731.080,00
Descuento Global (-)	43.419.324,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 101.311.756,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103900766 Rango desde: 27 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-29

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901186507	9	INGEARQ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 16 N° 10-66	ZARZAL-VALLE	2236110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	450775263	9507561728	E	2026/07/02	2026/07/06	BANCOLOMBIA	4	\$4,304,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct

Sucursal: PRINCIPAL (11 Afiliados)

Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3(7 Afiliados)

Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE(7 Afiliados)

1	CC	1114122730	ANDRADE PULIDO JOSE MANUEL	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	1193145610	ANDRADE PULIDO JUAN PABLO	Dependiente	0	No	No																											
3	CC	94386830	ANDRADE ROJAS JUAN MANUEL	Dependiente	0	No	No		X	2026/06/26																								
4	CC	111644062	CASTILLO ARCOS CRISTIAN ANDRES	Dependiente	0	No	No		X	2026/06/30																								
5	CC	1115184057	DIAZ RESTREPO JORGE IVAN	Dependiente	0	No	No																											
6	CC	1007581122	MURILLO IBARGUEN JHON ESTEBAN	Dependiente	0	No	No		X	2026/06/30																								
7	CC	6119314	OSPINA QUICENO JUAN CARLOS	Dependiente	0	No	No		X	2026/06/30																								

Centro de Trabajo: RIESGO 5 6960(4 Afiliados)

Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE(4 Afiliados)

8	CC	1116444530	CARRETERO LADINO LUIS FELIPE	Dependiente	0	No	No																											
9	CC	1112106249	JIMENEZ PALACIO ANGELICA MARIA	Dependiente	0	No	No																											
10	CC	6199163	RESTREPO VICTORIA CARLOS MARIO	Dependiente	0	No	No																											
11	CC	29314530	VEDMA MURILLO MARIA DEL PILAR	Dependiente	0	No	No																											

Total Afiliados(11)

Planilla Integrada

PLANILLA DE PAGO																												
SALARIO							PENSION													SALUD								
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																						\$2,386,500						\$509,600
																						\$915,500						\$229,200
																						\$915,500						\$229,200
						\$1,750,905	No	Variable	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA E.P.S.	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	5	\$291,818	16%	SIN RIESGO	\$46,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46,700	NUEVA E.P.S.	5	\$291,818	4%	\$11,700		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	EMSSANAR	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	EMSSANAR	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	NUEVA E.P.S.	1	\$58,364	4%	\$2,400		
																					\$1,471,000					\$280,400		
																						\$1,471,000					\$280,400	
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	26%	ALTO RIESGO	\$455,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$455,300	NUEVA E.P.S.	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA E.P.S.	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA E.P.S.	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	26%	ALTO RIESGO	\$455,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$455,300	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
																					\$2,386,500					\$509,600		

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES												
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF		
	\$509,600						\$509,600						\$886,000				\$0		\$0		\$0			\$0		
	\$229,200						\$229,200						\$398,400				\$0		\$0		\$0			\$0		
	\$229,200						\$229,200						\$398,400				\$0		\$0		\$0			\$0		
\$0	\$70,100		COMFANDI	30	\$1,750,905	4%	\$70,100	COLPATRIA ARP	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$70,100		COMFANDI	30	\$1,750,905	4%	\$70,100	COLPATRIA ARP	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$11,700		COMFANDI	5	\$291,818	4%	\$11,700	COLPATRIA ARP	5	\$291,818	6.96%	5	\$20,400	5	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$2,400		COMFANDI	1	\$58,364	4%	\$2,400	COLPATRIA ARP	1	\$58,364	6.96%	5	\$4,100	1	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$70,100		COMFANDI	30	\$1,750,905	4%	\$70,100	COLPATRIA ARP	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$2,400		COMFANDI	1	\$58,364	4%	\$2,400	COLPATRIA ARP	1	\$58,364	6.96%	5	\$4,100	1	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$2,400		COMFANDI	1	\$58,364	4%	\$2,400	COLPATRIA ARP	1	\$58,364	6.96%	5	\$4,100	1	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$280,400						\$280,400						\$487,600				\$0		\$0		\$0			\$0		
	\$280,400						\$280,400						\$487,600				\$0		\$0		\$0			\$0		
\$0	\$70,100		COMFANDI	30	\$1,750,905	4%	\$70,100	COLPATRIA ARP	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$70,100		COMFANDI	30	\$1,750,905	4%	\$70,100	COLPATRIA ARP	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$70,100		COMFANDI	30	\$1,750,905	4%	\$70,100	COLPATRIA ARP	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$70,100		COMFANDI	30	\$1,750,905	4%	\$70,100	COLPATRIA ARP	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$509,600						\$509,600						\$886,000				\$0		\$0		\$0			\$0		

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901186507	9	INGEARQ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 16 N° 10-66	ZARZAL-VALLE	2236110	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-07	450775263	9507561728	E	2026/07/02	2026/07/06	BANCOLOMBIA	\$4,304,600
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$2,386,500	\$7,100	\$0	\$2,393,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,190,800	\$3,500	\$0	\$1,194,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$915,500	\$2,700	\$0	\$918,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$900	\$0	\$281,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$886,000	\$2,600	\$0	\$888,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	\$886,000	\$2,600	\$0	\$888,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$509,600	\$1,500	\$0	\$511,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	11	\$509,600	\$1,500	\$0	\$511,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$509,600	\$1,700	\$0	\$511,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$4,800	\$100	\$0	\$4,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$294,500	\$900	\$0	\$295,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$210,300	\$700	\$0	\$211,000
TOTAL				11	\$4,291,700	\$12,900	\$0	\$4,304,600

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

Zarzal, 28 de Julio de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

INGEARQ S.A.S
901186507-9

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LA FECHA.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

GLORIA LISETH VELEZ MUÑOZ

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. ____ 101500-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 6.199.163

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.718.227**

VELEZ MUÑOZ

APELLIDOS

GLORIA LISETH

NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1970**

TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

11-DIC-1989 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Fingerprint]
ÍNDICE DERECHO

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100700-01078881-F-0066718227-20190702 **0065835513A 1** **51964933**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

101500-T

GLORIA LISETH VELEZ MUÑOZ
C.C. 66718227
RES. INSCRIPCION 95 DEL 27/05/2004
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

264357 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL 111090



Identificación Pilética S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 B F 7 7 0 F E 2 E 8 0 1 0 9 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA LISETH VELEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66718227 de TULUA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 101500-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
