

LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSTRUCTORA SH SAS, identificado con **NIT No. 900627079**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 2038/2025**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.⁽¹⁾

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **\$ 113.669.344,57 "CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 57/100 PESOS M/Cte."**; correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
103026	C-3301-1603-40-20302F-3301088-02	A-02-02-02-005- 004-01-2	\$ 113.669.344,57
T O T A L			\$ 113.669.344,57

Se expide en Bogotá, D.C. a los 23 días del mes de julio de 2026



JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:

PERIODO DEL INFORME:

VIGENCIA DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.⁽¹⁾

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

	LISTA CHEQUEO PARA INFORME MENSUAL DE OBRA			Página 1 de 1	
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			Código: F-GIN-115 Versión: 4 Fecha: 8/May/2026	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA					
FECHA DE INICIACIÓN	12/02/2026		FECHA DEL REGISTRO	01/07/2026	
DEPARTAMENTO (s)	Huila		MUNICIPIO (s)	Tesalia	
CONTRATO No.	2038 de 2025		VALOR DEL CONTRATO	\$1.398.019.370,00	
DURACIÓN	5 meses		FECHA DE SUSPENSIÓN		
FECHA DE REINICIO			FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	11/07/2026		PERIODO DEL INFORME	12/04/2026 - 11/06/2026	
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES		CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SH S.A.S.	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL - (LOTE 3) - CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE TESALIA- HUILA				
REGISTRO DE CHEQUEO					
	CUMPLE SI NO N.A.			OBSERVACIONES	SOPORTE
1. INFORME MENSUAL DE OBRA (Documento)					
1.1	Estado General del Contrato	X			
1.2	Informe Técnico	X			
1.3	Informe Administrativo	X			
1.4	Informe Financiero	X			
1.5	Actualizaciones al Plan de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo solicitadas por la interventoría	X			
1.6	Registro fotográfico del periodo que reporta	X			
2. ANEXOS					
2.1	Acta parcial de cantidades de obra del periodo que reporta	X			
2.2	Acta de mayores y menores cantidades de obra del periodo que reporta			X	
2.3	Memoria de cálculo de cantidades de obra del periodo que reporta	X			
2.4	Formato cambio de especificaciones técnicas			X	
2.5	Formato inclusión ítem no previsto			X	
2.6	Copia Bitácora del periodo que reporta	X			
2.7	Actas de comités (contrato)	X			
2.8	Factura en original	X			
2.9	Paz y Salvo de cumplimiento en pagos de parafiscales	X			
2.10	Soportes pagos parafiscales del personal junto con planillas firmadas por el interventor (revisar vs propuesta presentada)	X			
2.11	Soportes de ingresos y egresos cuenta bancaria	X			
2.12	Soportes inversión anticipo (solo para el primer informe)	X			
2.13	Copia permisos o licencias tramitados en el periodo que reporta	X			
2.14	Actualización de documentos legales del contrato (pólizas)	X			
2.15	Soporte SECOP II que evidencie que el informe del pago anterior está debidamente registrado y aprobado				
2.16	Certificación de interventoría en la que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo por todo concepto, habilitando el trámite de pago.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA R.L. CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO Directora de Interventoría INTERVENTORÍA </div> </div>					

		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES							Página 1 de 10				
									Código: F-GIN-100 Versión: 4 Fecha: 21/Feb/2022				
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado											
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA SH SAS			FECHA:		(11/06/26)		OBRA:				
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL			CONTRATO No:		2038 - 2025		PERIODO (desde - hasta):				
OBJETO:		Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)			VALOR:		\$ 1,398,019,370.00		OBRA CONSTRUIDA 1/05/2026 11/06/2026				
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. ACTUALIZADAS (FECHA)		ACTA PARCIAL No.2						
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	4. OBRA EJECUTADA					
								ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES												
1.01	Preliminares												
1.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m. Incluye postes en madera rolliza y/o	m	\$ 17,319.00	115.00	\$ 1,991,685.00			98.55	\$ 1,706,787.00		\$ -	98.55	\$ 1,706,787.00
1.01.03	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRAFICA	m2	\$ 3,518.00	650.00	\$ 2,286,700.00			650.00	\$ 2,286,700.00		\$ -	650.00	\$ 2,286,700.00
1.01.04	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m. incluye trámite de conexión y contador	u	\$ 483,820.00	1.00	\$ 483,820.00			1.00	\$ 483,820.00		\$ -	1.00	\$ 483,820.00
1.01.05	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m. incluye trámite de conexión y contador	u	\$ 1,608,877.00	1.00	\$ 1,608,877.00			1.00	\$ 1,608,877.00		\$ -	1.00	\$ 1,608,877.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS								\$ -			-	\$ -
2.02	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3											
			\$ 44,122.00	97.90	\$ 4,319,544.00			78.96	\$ 3,483,873.00	17.70	\$ 780,959.00	96.66	\$ 4,264,833.00
2.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	\$ 21,408.00	26.40	\$ 565,171.00			19.85	\$ 424,949.00		\$ -	19.85	\$ 424,949.00
2.05	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	\$ 208,764.00	30.60	\$ 6,388,178.00				\$ -	2.21	\$ 461,368.00	2.21	\$ 461,368.00
2.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	m3	\$ 66,757.00	136.07	\$ 9,083,625.00				\$ -	107.69	\$ 7,189,328.00	107.69	\$ 7,189,328.00
3	CIMENTACIÓN								\$ -			-	\$ -
3.01	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	\$ 30,976.00	98.85	\$ 3,061,978.00			63.10	\$ 1,954,586.00	27.19	\$ 842,237.00	90.29	\$ 2,796,823.00
3.02	CONCRETO CICLOPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo). Incluye, formaleta, mano de obra,	m3	\$ 330,975.00	21.18	\$ 7,010,051.00			17.64	\$ 5,838,399.00	-	\$ -	17.64	\$ 5,838,399.00
3.05	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muestra para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	\$ 767,519.00	10.69	\$ 8,204,778.00			8.48	\$ 6,508,561.00	-	\$ -	8.48	\$ 6,508,561.00
3.08		m3											
			\$ 808,367.00	23.02	\$ 18,608,608.00			10.91	\$ 8,819,284.00	11.97	\$ 9,676,153.00	22.88	\$ 18,495,437.00
4	REFUERZO								\$ -			-	\$ -
4.01	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	\$ 7,548.00	16,782.70	\$ 126,675,820.00			6,105.93	\$ 46,087,560.00	6,452.18	\$ 48,701,055.00	12,558.11	\$ 94,788,614.00
4.02	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	\$ 7,714.00	1,210.00	\$ 9,333,940.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
4.03	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 3/8" PARA PERFORACIÓN Ø 1/2" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO	u	\$ 11,956.00	444.00	\$ 5,308,464.00				\$ -	120.00	\$ 1,434,720.00	120.00	\$ 1,434,720.00
4.04	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO	u	\$ 13,342.00	139.00	\$ 1,854,538.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
4.05	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 5/8" PARA PERFORACIÓN Ø 3/4" PROF MAX 0,30	u	\$ 14,927.00	152.00	\$ 2,268,904.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								\$ -			-	\$ -
5.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c=20,7 Mpa (3.000 PSI) e=0.10, según	m2	\$ 125,121.00	341.00	\$ 42,666,261.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
5.09	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado	m	\$ 5,931.00	258.06	\$ 1,530,554.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
5.10	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de	m	\$ 17,617.00	258.06	\$ 4,546,243.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
5.11	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	\$ 976,878.00	16.94	\$ 16,548,313.00			0.90	\$ 879,190.00	8.90	\$ 8,694,214.00	9.80	\$ 9,573,404.00
5.14	VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	\$ 1,042,991.00	22.00	\$ 22,945,802.00				\$ -	13.28	\$ 13,850,920.00	13.28	\$ 13,850,920.00
5.18	LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	\$ 196,576.00	12.65	\$ 2,486,686.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
5.29	POYO EN CONCRETO REFORZADO f'c=17,5 Mpa (2500 PSI), a=0.45; e=0.08. No incluye acero de refuerzo.	m	\$ 51,050.00	7.00	\$ 357,350.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
5.30	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4.000 PSI) , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado pendiente al 1% longitudinal, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 capas en todo el contorno de la canal, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	\$ 927,600.00	20.50	\$ 19,015,800.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
6	ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA								\$ -			-	\$ -
6.01	Estructura Metálica								\$ -			-	\$ -
6.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templates, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	kg	\$ 20,759.00	337.37	\$ 7,003,464.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
6.02.05	PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090 (según diseño estructural) incluye la instalación, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	u	\$ 21,150.00	396.00	\$ 8,375,400.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
6.02.06	CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHBLAAS	u	\$ 4,965.00	1,000.00	\$ 4,965,000.00				\$ -		\$ -	-	\$ -

		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES								Página 2 de 10			
		<div>☒ Público☐ Clasificado☐ Reservado</div>								Código: F-GIN-100 Versión: 4 Fecha: 21/Feb/2022			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA SH SAS				FECHA:		(11/06/26)		OBRA:		OBRA CONSTRUIDA	
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL				CONTRATO No:		2038 - 2025		PERIODO (desde - hasta):		1/05/202611/06/2026	
OBJETO:		Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)				VALOR:		\$1,398,019,370.00		ACTA PARCIAL No.2			
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
6.02.07	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m	u	\$ 10,312.00	232.00	\$ 2,392,384.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
6.02.08	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m	u	\$ 14,428.00	72.00	\$ 1,038,816.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
6.02.13	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 80 x 140 mm LAMINADO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	\$ 148,102.00	748.55	\$ 110,861,752.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
6.02.14	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 2"x 6" (4.1 x 13.8 cm) (+ - 5mm) CEPILLADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	\$ 70,052.00	491.04	\$ 34,398,334.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI								\$ -		\$ -	-	\$ -
7.01	CAJAS, POZOS, CARCAMOS								\$ -		\$ -	-	\$ -
7.01.01	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	\$ 1,085,285.00	1.00	\$ 1,085,285.00				\$ -	2.50	\$ 2,713,213.00	2.50	\$ 2,713,213.00
7.01.02	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	\$ 724,685.00	5.00	\$ 3,623,425.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.01.03	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	\$ 568,725.00	1.00	\$ 568,725.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.01.04	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	\$ 500,302.00	5.00	\$ 2,501,510.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.01.05	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	\$ 103,354.00	65.00	\$ 6,718,010.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.02	REDES SANITARIAS								\$ -		\$ -	-	\$ -
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	\$ 46,108.00	57.50	\$ 2,651,210.00				\$ -	21.81	\$ 1,005,615.00	21.81	\$ 1,005,615.00
7.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	\$ 32,005.00	10.60	\$ 339,253.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.02.05	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 4" (Incluye 1.5 m de tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	\$ 76,762.00	2.00	\$ 153,524.00				\$ -	2.00	\$ 153,524.00	2.00	\$ 153,524.00
7.02.07	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	\$ 41,826.00	4.00	\$ 167,304.00				\$ -	4.00	\$ 167,304.00	4.00	\$ 167,304.00
7.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	\$ 121,525.00	8.00	\$ 972,200.00				\$ -	5.00	\$ 607,625.00	5.00	\$ 607,625.00
7.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	\$ 64,362.00	1.00	\$ 64,362.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	\$ 54,123.00	12.00	\$ 649,476.00				\$ -	9.70	\$ 524,993.00	9.70	\$ 524,993.00
7.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	\$ 38,518.00	59.80	\$ 2,303,376.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03	REDES HIDRÁULICAS								\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	\$ 826,663.00	1.00	\$ 826,663.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	\$ 16,446.00	30.60	\$ 503,248.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	\$ 13,241.00	64.50	\$ 854,045.00				\$ -	18.00	\$ 238,338.00	18.00	\$ 238,338.00
7.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	\$ 11,603.00	32.90	\$ 381,739.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1.5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	\$ 53,411.00	4.00	\$ 213,644.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1.5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	\$ 42,285.00	1.00	\$ 42,285.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1.5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	\$ 38,158.00	10.00	\$ 381,580.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	\$ 184,121.00	4.00	\$ 736,484.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	\$ 133,296.00	3.00	\$ 399,888.00				\$ -		\$ -	-	\$ -

		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES								Página 3 de 10			
										Código: F-GIN-100			
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado								Versión: 4			
										Fecha: 21/Feb/2022			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA SH SAS				FECHA:		(11/06/26)		OBRA:		OBRA CONSTRUIDA	
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL				CONTRATO No:		2038 - 2025		PERIODO (desde - hasta):		1/05/2026 11/06/2026	
OBJETO:		Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)				VALOR:		\$ 1,398,019,370.00		ACTA PARCIAL No.2			
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
7.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA O REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	\$ 109,680.00	5.00	\$ 548,400.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.03.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA.	u	\$ 52,791.00	6.00	\$ 316,746.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.04	REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS								\$ -		\$ -	-	\$ -
7.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	\$ 29,704.00	8.40	\$ 249,514.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	\$ 45,825.00	13.60	\$ 623,220.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.04.05	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	u	\$ 183,292.00	8.00	\$ 1,466,336.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.05	TANQUES Y EQUIPOS								\$ -		\$ -	-	\$ -
7.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	\$ 4,405,901.00	1.00	\$ 4,405,901.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
7.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	\$ 1,883,134.00	2.00	\$ 3,766,268.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN								\$ -		\$ -	-	\$ -
8.01	EQUIPO DE MEDIDA								\$ -		\$ -	-	\$ -
8.01.01	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	u	\$ 485,265.00	1.00	\$ 485,265.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.02	REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN								\$ -		\$ -	-	\$ -
8.02.01	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	\$ 35,870.00	128.00	\$ 4,591,360.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.02.02	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	\$ 44,689.00	74.00	\$ 3,306,986.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.02.03	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma, incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	\$ 998,138.00	4.00	\$ 3,992,552.00				\$ -	1.50	\$ 1,497,207.00	1.50	\$ 1,497,207.00
8.03	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES								\$ -		\$ -	-	\$ -
8.03.01	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	u	\$ 7,219,734.00	1.00	\$ 7,219,734.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.03.02	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	\$ 1,209,945.00	1.00	\$ 1,209,945.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.03.03	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	\$ 419,702.00	1.00	\$ 419,702.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.04	ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN								\$ -		\$ -	-	\$ -
8.04.01	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	\$ 165,297.00	45.00	\$ 7,438,365.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.04.03	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	\$ 66,190.00	30.00	\$ 1,985,700.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.04.05	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	\$ 37,437.00	30.00	\$ 1,123,110.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.04.06	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras	m	\$ 31,964.00	10.00	\$ 319,640.00				\$ -		\$ -	-	\$ -

		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES								Página 4 de 10			
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado								Código: F-GIN-100			
										Versión: 4			
										Fecha: 21/Feb/2022			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA SH SAS				FECHA:		(11/06/26)		OBRA:		OBRA CONSTRUIDA	
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL				CONTRATO No:		2038 - 2025		PERIODO (desde - hasta):		1/05/2026 11/06/2026	
OBJETO:		Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)				VALOR:		\$ 1,398,019,370.00		ACTA PARCIAL No.2			
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
8.05	RED NORMAL Y REGULADA							CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
8.05.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 116,167.00	17.00	\$ 1,974,839.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.05.02	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 168,687.00	4.00	\$ 674,748.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.05.03	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 140,207.00	14.00	\$ 1,962,898.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.05.04	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 20A 120V, instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde, marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 116,635.00	6.00	\$ 699,810.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.05.05	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 20A 120V; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado tipo Tamper Resist, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, AT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 118,030.00	6.00	\$ 708,180.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.05.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 186,602.00	2.00	\$ 373,204.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.05.08	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C	m							\$ -		\$ -	-	\$ -
8.06	CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA								\$ -		\$ -	-	\$ -
8.06.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m							\$ -	58.60	\$ 1,457,441.00	58.60	\$ 1,457,441.00
			\$ 24,871.00	130.00	\$ 3,233,230.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07	ILUMINACIÓN								\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.01	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportaría necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 149,103.00	10.00	\$ 1,491,030.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.02	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportaría necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 179,416.00	5.00	\$ 897,080.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.03	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en tubería EMT; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportaría necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 171,942.00	44.00	\$ 7,565,448.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.05	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u							\$ -		\$ -	-	\$ -
			\$ 116,181.00	20.00	\$ 2,323,620.00				\$ -		\$ -	-	\$ -

		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES								Página 5 de 10					
		<div>☒ Público☐ Clasificado☐ Reservado</div>								Código: F-GIN-100 Versión: 4 Fecha: 21/Feb/2022					
<div><div>CONTRATISTA:CONSTRUCTORA SH SAS</div><div>INTERVENTOR:CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL</div><div>OBJETO:Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)</div></div> <div><div>FECHA:(11/06/26)</div><div>CONTRATO No:2038 - 2025</div><div>VALOR:\$ 1,398,019,370.00</div></div> <div><div>OBRA:OBRA CONSTRUIDA</div><div>PERIODO (desde - hasta):1/05/202611/06/2026</div></div>															
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		ACTA PARCIAL No.2							
								4. OBRA EJECUTADA							
	DESCRIPCION					UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
										CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
8.07.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).					u	\$ 146,060.00	18.00	\$ 2,629,080.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.07	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2.27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60,000 Horas, 60W, 5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceras para descolgar y demás elementos necesarios para su correcta instalación.					u	\$ 740,955.00	19.00	\$ 14,078,145.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.09	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso mínimo 1680 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.					u	\$ 98,452.00	4.00	\$ 393,808.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.11	Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.					u	\$ 171,813.00	6.00	\$ 1,030,878.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.12	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360° horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.					u	\$ 242,339.00	2.00	\$ 484,678.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.13	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo bala para montaje en cilindro 5w mínimo 90 minutos de autonomia incluye guaya y soportes					u	\$ 414,813.00	18.00	\$ 7,466,634.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.07.15	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía					u	\$ 147,132.00	4.00	\$ 588,528.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08	ILUMINACIÓN EXTERIOR										\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.01	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control, incluye alambre de cobre desnudo 1F#8 AWG, varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8" y conector para varilla a tierra 2/8					u	\$ 832,745.00	4.00	\$ 3,330,980.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.02	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica CODENSA AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.					u	\$ 515,262.00	4.00	\$ 2,061,048.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.03	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona					m	\$ 56,952.00	40.00	\$ 2,278,080.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.					m	\$ 24,871.00	40.00	\$ 994,840.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.05	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación					u	\$ 128,087.00	14.00	\$ 1,793,218.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.06	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP					u	\$ 972,448.00	4.00	\$ 3,889,792.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.07	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180 , temperatura de color máximo 3000K, lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación					u	\$ 149,615.00	8.00	\$ 1,196,920.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.08.19	Suministro e instalación de luminaria LED SOLAR GARDEN 3250LM – 25W, incluye poste 3m galvanizado acabado oxidado, con canastilla y soportes de fijación, base en concreto de 21MPa y acero de refuerzo, sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m, cable de cobre, conectores, tratamiento, poste y luminaria deben contar con certificado de conformidad de producto					u	\$ 1,621,557.00	2.00	\$ 3,243,114.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
8.09	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA										\$ -		\$ -	-	\$ -
8.09.01	Suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 70 cm					m	\$ 69,998.00	30.00	\$ 2,099,940.00		\$ -		\$ -	-	\$ -

		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES										Página 6 de 10					
		<div>☒ Público☐ Clasificado☐ Reservado</div>										Código: F-GIN-100					
												Versión: 4					
												Fecha: 21/Feb/2022					
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA SH SAS				FECHA:				(11/06/26)				OBRA:		OBRA CONSTRUIDA	
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL				CONTRATO No:				2038 - 2025				PERIODO		11/06/2026	
OBJETO:		Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)				VALOR:				\$ 1,398,019,370.00				ACTA PARCIAL No.2		1/05/2026	
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA									
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO					
								CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL				
8.09.02	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	\$ 36,972.00	10.00	\$ 369,720.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.09.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	\$ 266,811.00	4.00	\$ 1,067,244.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.09.04	Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red, marcación sistema de tierra general	u	\$ 151,492.00	1.00	\$ 151,492.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.09.05	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	\$ 109,006.00	4.00	\$ 436,024.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.10	APANTALLAMIENTO (SISTEMA DE CAPTACIÓN - BAJANTES -SPT)								\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.10.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 70 cm	m	\$ 61,867.00	120.00	\$ 7,424,040.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.10.03	Suministro y montaje de varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	\$ 266,811.00	8.00	\$ 2,134,488.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.10.04	Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red, marcación sistema de apantallamiento	u	\$ 151,492.00	8.00	\$ 1,211,936.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.10.05	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	u	\$ 153,223.00	8.00	\$ 1,225,784.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.10.06	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambirón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	\$ 46,937.00	240.00	\$ 11,264,880.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.10.07	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetalico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	\$ 129,764.00	8.00	\$ 1,038,112.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.11	VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN								\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.11.01	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	u	\$ 166,656.00	4.00	\$ 666,624.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.11.02	Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3 velocidades, aspas mínimo de 12", sistema conexión a 120V	u	\$ 433,456.00	4.00	\$ 1,733,824.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.12	CERTIFICACIONES Y TRAMITES								\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.12.01	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	u	\$ 4,236,750.00	1.00	\$ 4,236,750.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.12.02	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	\$ 5,411,836.00	1.00	\$ 5,411,836.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.12.03	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 3.3.1.1. Diseño detallado del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación, los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	u	\$ 3,275,283.00	1.00	\$ 3,275,283.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
8.12.04	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	u	\$ 2,187,944.00	1.00	\$ 2,187,944.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9	REDES ESPECIALES								\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01	CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS)								\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.01	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	u	\$ 102,329.00	20.00	\$ 2,046,580.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.02	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	\$ 9,219.00	915.00	\$ 8,435,385.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.03	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	\$ 950,424.00	1.00	\$ 950,424.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.04	Suministro e instalación de Switch 24 puertos 10/100/1000	u	\$ 404,378.00	1.00	\$ 404,378.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.05	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	\$ 38,743.00	20.00	\$ 774,860.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.06	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1)	u	\$ 944,866.00	1.00	\$ 944,866.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.07	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	u	\$ 2,980,599.00	1.00	\$ 2,980,599.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4	u	\$ 117,435.00	2.00	\$ 234,870.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.09	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería Conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	\$ 12,805.00	80.00	\$ 1,024,400.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su	m	\$ 27,897.00	36.00	\$ 1,004,292.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
9.01.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás	m	\$ 24,871.00	60.00	\$ 1,492,260.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
10	MAMPOSTERÍA								\$ -		\$ -	-	\$ -				
10.01	Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mortero de pega, emboquille, graffles. Según diseños.	m2	\$ 68,665.00	78.41	\$ 5,384,023.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
10.14	DILATACIONES EN ICOPOR E=20MM ENTRE FACHADA EXISTENTE Y FACHADA FLOTANTE	m	\$ 6,093.00	44.00	\$ 268,092.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
10.15	DINTEL EN CONCRETO REFORZADO a la vista f.c. 3.000 psi dimensiones: 0,15 m x 0,15 m.	m	\$ 95,871.00	56.00	\$ 5,368,776.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				
10.16	MORTERO DE INYECCIÓN TIPO GROUTING 3000 PSI PARA LLENADO DE DOVELAS DE MUROS EN BLOQUE ESTRUCTURAL	m3	\$ 963,218.00	0.44	\$ 423,816.00				\$ -		\$ -	-	\$ -				

<div></div>		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES										Página 7 de 10					
												Código: F-GIN-100					
												Versión: 4					
		<div>☒ Público☐ Clasificado☐ Reservado</div>										Fecha: 21/Feb/2022					
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA SH SAS				FECHA:				(11/06/26)		OBRA:		OBRA CONSTRUIDA			
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL				CONTRATO No:				2038 - 2025		PERIODO (desde - hasta):		1/05/202611/06/2026			
OBJETO:		Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)				VALOR:				\$1,398,019,370.00		ACTA PARCIAL No.2					
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA									
	DESCRIPCION					UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
10.17	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2					m	\$95,195.00	44.00	\$4,188,580.00			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
10.19	MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE f'c=20,7 Mpa (3000 PSI), incluye formaleta, desencofrante, todos los elementos para su correcta ejecución (No incluye refuerzo)					m3	\$982,310.00	4.82	\$4,734,734.00				\$-	2.74	\$2,691,529.00	2.74	\$2,691,529.00
10.21	MURO EN CELOSÍA CUADRADA DE 16x11,5x11cm (L x a x h) (producto de la partida de un ladrillo de 33X11,5X11 de media traba o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille,					m2	\$112,208.00	36.37	\$4,081,005.00				\$-		\$-	-	\$-
10.26	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA POR DOS CARAS DE 24x12x6,5cm (L x a x h) (o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafíes. NO incluye aceros de refuerzos,					m2	\$131,705.00	127.46	\$16,787,119.00				\$-		\$-	-	\$-
11	CUBIERTAS Y CIELO RASOS												\$-		\$-	-	\$-
11.01	Cubiertas												\$-		\$-	-	\$-
11.01.03	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. INCLUYE:					m2	\$225,033.00	512.17	\$115,255,152.00				\$-		\$-	-	\$-
11.01.08	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación					m	\$57,590.00	66.15	\$3,809,579.00				\$-		\$-	-	\$-
12	PAÑETES												\$-		\$-	-	\$-
12.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación					m2	\$30,925.00	172.50	\$5,334,563.00				\$-		\$-	-	\$-
13	PISOS Y ENCHAPES												\$-		\$-	-	\$-
13.01	Enchapes pisos y paredes												\$-		\$-	-	\$-
13.01.02	ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca.					m2	\$91,759.00	18.98	\$1,741,586.00				\$-		\$-	-	\$-
13.01.11	ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Cuarzo, Modulado acorde a planos.					m2	\$25,660.00	132.57	\$3,401,746.00				\$-		\$-	-	\$-
13.02	Guarda escobas y boca puertas												\$-		\$-	-	\$-
13.02.06	ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en granito pulido, incluye dilataciones en t longitudinales.					m	\$55,566.00	10.68	\$593,445.00				\$-		\$-	-	\$-
13.04	Pisos en madera												\$-		\$-	-	\$-
13.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LISTONES MACHIHEMBRADOS DE MADERA SAPAN (O EQUIVALENTE) inmunizada al vacío, e = 0,018 m y ancho útil 0,10 m; sobre doble entramado de listones en Sapan (o equivalente) de 0,04 x 0,04 m ubicados sobre cojines de caucho de alta densidad e = 0,02 m, sobre membrana acústica e = 0.003 m (base asfáltica con polímeros, elastómeros y fibra de vidrio), con relleno de frescasa de baja densidad entre el entramado; incluye acabado con fondo acrílico minicomponente de un alto contenido en sólidos y terminación en poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación y funcionamiento					m2	\$269,226.00	76.82	\$20,681,941.00				\$-		\$-	-	\$-
13.04.02	GUARDA ESCOBA EN MADERA SAPAN (O SIMILAR) INMUNIZADA AL VACÍO, E = 0,018 M Y ANCHO ÚTIL 0,10 M, con acabado con fondo acrílico minicomponente de un alto contenido en sólidos y terminación en poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación y funcionamiento					m	\$68,520.00	10.70	\$733,164.00				\$-		\$-	-	\$-
13.05	Varios												\$-		\$-	-	\$-
13.05.01	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido in sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +/-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución					m	\$307,534.00	6.03	\$1,854,430.00				\$-		\$-	-	\$-
13.05.02	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido in sitio, forma y dimensiones según diseño, incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta, refuerzo, y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución					m	\$299,146.00	2.54	\$759,831.00				\$-		\$-	-	\$-
13.05.03	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido in sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución					u	\$276,789.00	1.00	\$276,789.00				\$-		\$-	-	\$-
14	CARPINTERIA EN MADERA												\$-		\$-	-	\$-
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN MADERA PINO AMARILLO O SIMILAR INMUNIZADA perfiles principales en 2" x 4", persianas en tabla de 18 x 900 mm, incluye inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, angeo, pisavidrio 1 x 1 cm, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.					m2	\$341,974.00	66.36	\$22,693,395.00				\$-		\$-	-	\$-

<div></div>		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES										Página 8 de 10	
		<div>☒ Público☐ Clasificado☐ Reservado</div>										Código: F-GIN-100	
												Versión: 4	
												Fecha: 21/Feb/2022	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS													
INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL													
FECHA: 11/06/26													
OBRA: OBRA CONSTRUIDA													
CONTRATO No: 2038 - 2025													
PERIODO (desde - hasta): 1/05/2026 11/06/2026													
OBJETO: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)													
VALOR: \$ 1,398,019,370.00													
ACTA PARCIAL No.2													
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN HDF color gris o a definir, marco de 8 cm de ancho en mdp rh con acabado en melamina del mismo color de la puerta, enchapado con canto de 0,5 mm en PVC, incluye bisagras y elementos de sujeción.	m2	\$ 279,891.00	11.63	\$ 3,255,132.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
14.14	ESTANTERÍA EN TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH COLOR GRIS O AGAVE 15 mm. Soportes horizontales en madera de pino 2x4 cm.	m	\$ 280,368.00	13.74	\$ 3,852,256.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
15	CARPINTERÍA METÁLICA								\$ -		\$ -	-	\$ -
15.01	REJAS Y VENTANAS								\$ -		\$ -	-	\$ -
15.01.10	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA EXPANDIDA Cal 18, CON MARCO EN ANGULO DE 2" X 1/8" WASH PREMIER Y PINTURA ESMALTE. Incluye soldadura, puerta dos hojas, portacandado y manijas para la puerta, materiales, anclajes, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	\$ 344,346.00	91.74	\$ 31,590,302.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
15.02	PUERTAS								\$ -		\$ -	-	\$ -
15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CALIBRE 20, ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" SEGÚN PLANOS, incluye marco en lamina CR calibre 16, pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, anclaje tipo y, bisagras, soporte para cerradura, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	\$ 396,254.00	11.08	\$ 4,390,494.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y superior en estructura tubular de 3" x 1 1/2" , pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, bisagras, topes de caucho, aldaba tipo pasador en varilla lisa de 1/2" y portacandado, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	\$ 323,303.00	7.26	\$ 2,347,180.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y riel superior, pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, pivote 600kg, bisagras para cada cuerpo, topes de caucho, rueda de 3" capacidad de carga 80 kg 1 por cuerpo, aldaba tipo pasador en varilla lisa de 1/2", portacandado y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	\$ 397,573.00	31.68	\$ 12,595,113.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
15.03	VARIOS								\$ -		\$ -	-	\$ -
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación.	u	\$ 285,391.00	1.00	\$ 285,391.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
16	CERRADURAS								\$ -		\$ -	-	\$ -
16.02	CERRADURA MANIJA LISA PARA ENTRADA CAPRI CROMADO MATE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	\$ 168,559.00	9.00	\$ 1,517,031.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS								\$ -		\$ -	-	\$ -
17.01	APARATOS SANITARIOS								\$ -		\$ -	-	\$ -
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL COLOR (Incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 775,629.00	1.00	\$ 775,629.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 849,180.00	1.00	\$ 849,180.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 428,030.00	1.00	\$ 428,030.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 249,137.00	1.00	\$ 249,137.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER ESFÉRICO 42 CM ACERO INOXIDABLE, TIPO INSTITUCIONAL Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 127,728.00	3.00	\$ 383,184.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.02	GRIFERÍAS								\$ -		\$ -	-	\$ -
17.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 313,189.00	2.00	\$ 626,378.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 1,148,395.00	1.00	\$ 1,148,395.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	\$ 168,341.00	1.00	\$ 168,341.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
17.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO JARDÍN + ACCESORIOS (Tipo pesada)	u	\$ 47,713.00	1.00	\$ 47,713.00				\$ -		\$ -	-	\$ -

		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES							Página 9 de 10						
									Código: F-GIN-100 Versión: 4 Fecha: 21/Feb/2022						
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado													
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS											FECHA: (11/06/26)		OBRA: OBRA CONSTRUIDA		
INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL											CONTRATO No: 2038 - 2025		PERIODO (desde - hasta): 1/05/2026 11/06/2026		
OBJETO: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)											VALOR: \$ 1,398,019,370.00		ACTA PARCIAL No.2		
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
	DESCRIPCION					UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
										CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
17.03	ACCESORIOS										\$ -		\$ -		\$ -
17.03.01	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.					u	\$ 431,558.00	1.00	\$ 431,558.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
17.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 multifold.					u	\$ 256,211.00	2.00	\$ 512,422.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
17.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado o mate, incluye anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento					u	\$ 48,919.00	2.00	\$ 97,838.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
17.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE 1000 Ml de 20x13 cm					u	\$ 76,629.00	2.00	\$ 153,258.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
17.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.					u	\$ 27,229.00	12.00	\$ 326,748.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
18	PINTURAS										\$ -		\$ -	-	\$ -
18.02	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución					m2	\$ 18,857.00	692.00	\$ 13,049,044.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
19	VIDRIOS Y ESPEJOS										\$ -		\$ -	-	\$ -
19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL 4 MM CON MARCO EN MADERA SAPAN O SIMILAR 0.04 m x 0.02 m por todo su contorno (según diseño), acabado con poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate, con ranura en la mitad de la sección, en la cual reposa la lámina de espejo, incluye ICOPOR para amortiguación contra la pared, anclaje a muro con chazos					m2	\$ 332,628.00	14.40	\$ 4,789,843.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta					m2	\$ 447,647.00	1.00	\$ 447,647.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación					m2	\$ 347,601.00	1.00	\$ 347,601.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
20	EQUIPOS Y OTROS										\$ -		\$ -	-	\$ -
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación acorde a normatividad vigente, soportes y aviso.					u	\$ 121,312.00	3.00	\$ 363,936.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte y aviso señalética)					u	\$ 73,833.00	5.00	\$ 369,165.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
20.03	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidro acumulador, arrancador montado, válvula de pie, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20 psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1HP.					u	\$ 834,357.00	1.00	\$ 834,357.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
21	OBRAS EXTERIORES										\$ -		\$ -	-	\$ -
21.01	ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del andén) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.					m2	\$ 135,438.00	284.96	\$ 38,594,412.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
21.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80 (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm). Incluye mortero de nivelación y pega, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.					m	\$ 89,430.00	81.00	\$ 7,243,830.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
21.13	REINSTALACIÓN / SIEMBRA DE CESPEDONES (reservados del descapote) en patios. Incluye acarreos, conservación, cama en tierra negra abonada h, 10 cm.					m2	\$ 34,361.00	105.37	\$ 3,620,619.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
21.14	SIEMBRA DE ÁRBOL NATIVO DE PORTE MEDIANO (INCLUYE TRANSPORTE, SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR)					u	\$ 349,626.00	4.00	\$ 1,398,504.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
22	SEÑALIZACIÓN										\$ -		\$ -	-	\$ -
22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN - PORTA PLANO DE EVACUACIÓN DE 50 x 35 cm, elaborado en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportado con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color, según diseño.					u	\$ 177,094.00	1.00	\$ 177,094.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
22.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN - AVISOS ESPACIOS DE 20 x 20 cm, elaborado en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportado con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior, según diseño.					u	\$ 140,732.00	10.00	\$ 1,407,320.00		\$ -		\$ -	-	\$ -

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES										Página 10 de 10		
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado										Código: F-GIN-100 Versión: 4 Fecha: 21/Feb/2022		
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA SH SAS		FECHA:		(11/06/26)		OBRA:		OBRA CONSTRUIDA			
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL		CONTRATO No:		2038 - 2025		PERIODO (desde - hasta):		1/05/2026 11/06/2026			
OBJETO:		Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)		VALOR:		\$ 1,398,019,370.00		ACTA PARCIAL No.2					
1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA						
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
22.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN - AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA DE 21 x 29,7 cm, elaborado en acrílico cristal Cal. 2 mm cuerpo reflectivo, soportado con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, según diseño.	u	\$ 189,370.00	2.00	\$ 378,740.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
22.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO. Letras tipo NUNTO SANS o según diseño de 0.30 m de altura, profundidad de 0.01 m, Primera letra Capital, fabricadas en aluminio fundido con acabado semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la letra, anclados a sitio definido en diseños, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución e instalación.	u	\$ 73,124.00	23.00	\$ 1,681,852.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
23	AISLAMIENTO ACUSTICO								\$ -		\$ -	-	\$ -
23.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS TIPO ARQUITECTÓNICO PARA MUROS Y/O TECHO CON ACABADO EN MADERA LAMINADA Y PERFORADA.	m2	\$ 411,820.00	20.00	\$ 8,236,400.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
24	ASEO	UND.							\$ -		\$ -	-	\$ -
24.01	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	\$ 4,418.00	629.50	\$ 2,781,150.00				\$ -		\$ -	-	\$ -
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				1,064,751,995.00			80,082,586.00		102,687,743.00		182,770,329.00	
B	A.I.U (30.35%)				323,152,231.00			24,305,064.85		31,165,730.01		55,470,794.86	
C	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B+C)				1,387,904,226.00			104,387,650.85		133,853,473.01		238,241,123.86	
D	AMORT. DE FACTURAS y/o CUENTAS DE COBRO (anexar soportes)							16,501,682.00		21,159,662.00		37,661,344.00	
E	TOTALES (C-D)				1,387,904,226.00			87,885,968.85		112,693,811.01		200,579,779.86	
	UTILIDAD (5% sobre los costos directos)				53,237,599.75			4,004,129.30		5,134,387.15		9,138,516.45	
	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)				10,115,144.00			760,784.57		975,533.56		1,736,318.13	
	VALORB TOTAL				1,398,019,370.00			88,646,753.42		113,669,344.57		202,316,097.99	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:				CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON													
				SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ									
EFRAIN SANTANDR ESPAÑA CONSTRUCTORA SH. S.A.S. CONTRATISTA DE OBRA				SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL INTERVENTOR									

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1f26636d0f8dc6d05cb71334f75b0204fc1cccbd5d64a703a55ab1ba2bd3f3e1eff858ccc5b24d0f6d773a3573da3deb

Número de Factura: FESH-181

Fecha de Emisión: 21/07/2026

Fecha de Vencimiento: 22/07/2026

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: 2

Fecha de orden de pedido: 21/07/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA SH SAS

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA SH SAS

Nit del Emisor: 900627079

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4112

País: Colombia

Departamento: Nariño

Municipio / Ciudad: Pasto

Dirección: CL 21 A 31 A 76 BRR LAS CUADRAS

Teléfono / Móvil: 3154059363

Correo: consorciosh@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830034348

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-15;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Calle 9 #8 - 31

Teléfono / Móvil: 00000006013424100

Correo: serviciobciudadano@mincultura.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	98	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA 2 CONTRATO 2038 DEL 2025 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL LOTE 3 CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE TESALIA HUILA	ZZ	1,00	\$ 102.687.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 102.687.743,00
2	99	ADMINISTRACION ACTA 2 TESALIA	ZZ	1,00	\$ 25.517.904,14	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 25.517.904,14
3	101	IMPREVISTOS ACTA PARCIAL 2 TESALIA	ZZ	1,00	\$ 513.438,72	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 513.438,72
4	100	UTILIDAD ACTA PARCIAL 2 TESALIA	ZZ	1,00	\$ 5.134.387,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 975.533,56	19.00			\$ 5.134.387,15

Datos AIU


Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: CONTRATO 2038 DE 2025 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL - (LOTE 3) - CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE TESALIA, HUILA

Notas Finales

#\$33-01-01;CT-2038-2025;jramirezrmincultura.gov.co#\$
Linea de negocio: AMORTIZACION ANTICIPO \$16.501.682 - ADMINISTRACION 15.808% - IMPREVISTOS 0.5% - UTILIDAD 5%

Datos Totales



Documento generado el:
21/07/2026 15:24:02
Documento validado por la
DIAN:
21/07/2026 15:24:02
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	133853473.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	133853473.01
IVA	975533.56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	975533.56
Total neto factura (=)	134829006.57
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 134829006.57

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	



Subtotal	133.853.473,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	133.853.473,01
IVA	975.533,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	975.533,56
Total neto factura (=)	134.829.006,57
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 134.829.006,57

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099698307 Rango desde: 150 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-04

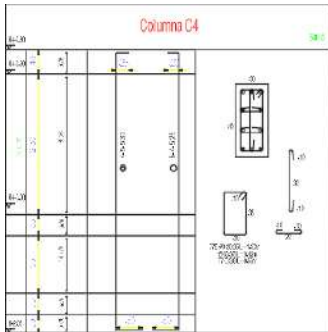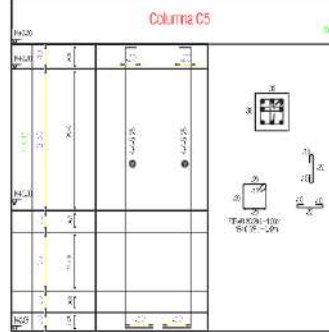
		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA					Página 1 de 10							
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado					Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019							
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:			Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila											
			Tesalia - Huila											
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)							CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS							
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL			Contrato de interventoría No.		2059 -2025		Contrato de Obra No. 2038 - 2025							
							Vigencia del contrato		5 meses					
CAPITULO:			DESCRIPCIÓN ITEM											
No CORTE			Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)											
ACTA PARCIAL No.2			PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026											
			LOCALIZACIÓN				MEDIDAS		FICHA #	6 DE 20				
							Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD	SUBTOTAL M.L	KG X M.L	PESO EN KG			
<div><div>Columna C4</div></div> <div><div>Columna C5</div></div> <div></div>			Aceros Columnas				EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)	Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD	SUBTOTAL M.L	KG X M.L	PESO EN KG
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.3 (Columna C4)jeje E4				E4		37.00	3/8.	1.30	48.10	0.560	26.94
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.42 (Columna C4)jeje E4				E4		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=0.55 (Columna C4)jeje E4				E4		37.00	3/8.	0.55	20.35	0.560	11.40
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.3 (Columna C4)jeje E5				E5		37.00	3/8.	1.30	48.10	0.560	26.94
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.42 (Columna C4)jeje E5				E5		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=0.55 (Columna C4)jeje E5				E5		37.00	3/8.	0.55	20.35	0.560	11.40
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.3 (Columna C4)jeje E6				E6		37.00	3/8.	1.30	48.10	0.560	26.94
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.42 (Columna C4)jeje E6				E6		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=0.55 (Columna C4)jeje E6				E6		37.00	3/8.	0.55	20.35	0.560	11.40
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.3 (Columna C4)jeje E7				E7		37.00	3/8.	1.30	48.10	0.560	26.94
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.42 (Columna C4)jeje E7				E7		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=0.55 (Columna C4)jeje E7				E7		37.00	3/8.	0.55	20.35	0.560	11.40
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.3 (Columna C4)jeje E8				E8		37.00	3/8.	1.30	48.10	0.560	26.94
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.42 (Columna C4)jeje E8				E8		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=0.55 (Columna C4)jeje E8				E8		37.00	3/8.	0.55	20.35	0.560	11.40
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.0 (Columna C5)jeje F4				F4		37.00	3/8.	1.00	37.00	0.560	20.72
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.40 (Columna C5)jeje F4				F4		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.0 (Columna C5)jeje F5				F5		37.00	3/8.	1.00	37.00	0.560	20.72
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.40 (Columna C5)jeje F5				F5		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.0 (Columna C5)jeje F6				F6		37.00	3/8.	1.00	37.00	0.560	20.72
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.40 (Columna C5)jeje F6				F6		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.0 (Columna C5)jeje F7				F7		37.00	3/8.	1.00	37.00	0.560	20.72
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.40 (Columna C5)jeje F7				F7		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			Acero refuerzo horizontal 40E#3 L=1.0 (Columna C5)jeje F8				F8		37.00	3/8.	1.00	37.00	0.560	20.72
			Acero refuerzo horizontal 80E#3 L=0.40 (Columna C5)jeje F8				F8		74.00	3/8.	0.40	29.60	0.560	16.58
			flejes #3 L=1,0 (Columna tipo C1)jeje A1				A1		35.00	3/8.	1.00	35.00	0.560	19.60
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C1)jeje A1				A1		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,0 (Columna tipo C1)jeje A2				A2		35.00	3/8.	1.00	35.00	0.560	19.60
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C1)jeje A2				A2		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,0 (Columna tipo C1)jeje A3				A3		35.00	3/8.	1.00	35.00	0.560	19.60
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C1)jeje A3				A3		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
flejes #3 L=1,0 (Columna tipo C1)jeje A4				A4		35.00	3/8.	1.00	35.00	0.560	19.60			

			MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA					Página 2 de 10	
			☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado					Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019	
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:			Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila						
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)			Tesalia - Huila						
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL			Contrato de interventoria No.		2059 -2025		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS Contrato de Obra No. 2038 - 2025		
							Vigencia del contrato		5 meses
CAPITULO:			DESCRIPCIÓN ÍTEM						
ITEM N°.	UNIDAD	No CORTE	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)						
4.01	Kg	ACTA PARCIAL No.2	PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026				FICHA #	6 DE 20	
			LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			
			Aceros Columnas	EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)	Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD	SUBTOTAL M.L
									KG X M.L
									PESO EN KG
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C1)eje A4	A4		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,0 (Columna tipo C1)eje A5	A5		35.00	3/8.	1.00	35.00
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C1)eje A5	A5		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje B1	B1		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje B1	B1		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje B1	B1		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje B2	B2		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje B2	B2		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje B2	B2		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje B3	B3		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje B3	B3		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje B3	B3		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje B4	B4		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje B4	B4		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje B4	B4		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje B5	B5		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje B5	B5		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje B5	B5		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje C1	C1		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje C1	C1		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje C1	C1		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje C2	C2		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje C2	C2		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje C2	C2		70.00	3/8.	0.40	28.00
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2)eje C3	C3		35.00	3/8.	1.30	45.50
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2)eje C3	C3		35.00	3/8.	0.55	19.25
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2)eje C3	C3		70.00	3/8.	0.40	28.00





		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA					Página 3 de 10				
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado					Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019				
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:			Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila								
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)			Tesalia - Huila				CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS				
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL			Contrato de interventoría No.		2059 -2025	Contrato de Obra No. 2038 - 2025		Vigencia del contrato		5 meses	
CAPITULO:			DESCRIPCION ITEM								
ITEM N°.	UNIDAD	No CORTE	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)								
4.01	Kg	ACTA PARCIAL No.2	PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026					FICHA #	6 DE 20		
 			LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			KG X M.L	PESO EN KG	
			Aceros Columnas	EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)	Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD			SUBTOTAL M.L
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2) eje C4	C4		35.00	3/8.	1.30	45.50	0.560	25.48
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2) eje C4	C4		35.00	3/8.	0.55	19.25	0.560	10.78
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2) eje C4	C4		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2) eje C5	C5		35.00	3/8.	1.30	45.50	0.560	25.48
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2) eje C5	C5		35.00	3/8.	0.55	19.25	0.560	10.78
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2) eje C5	C5		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2) eje D4	D4		35.00	3/8.	1.30	45.50	0.560	25.48
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2) eje D4	D4		35.00	3/8.	0.55	19.25	0.560	10.78
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2) eje D4	D4		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2) eje D5	D5		35.00	3/8.	1.30	45.50	0.560	25.48
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2) eje D5	D5		35.00	3/8.	0.55	19.25	0.560	10.78
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2) eje D5	D5		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2) eje D6	D6		35.00	3/8.	1.30	45.50	0.560	25.48
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2) eje D6	D6		35.00	3/8.	0.55	19.25	0.560	10.78
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2) eje D6	D6		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2) eje D7	D7		35.00	3/8.	1.30	45.50	0.560	25.48
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2) eje D7	D7		35.00	3/8.	0.55	19.25	0.560	10.78
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2) eje D7	D7		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			flejes #3 L=1,30 (Columna tipo C2) eje D8	D8		35.00	3/8.	1.30	45.50	0.560	25.48
			ganchos #3 L=0,55 (Columna tipo C2) eje D8	D8		35.00	3/8.	0.55	19.25	0.560	10.78
			ganchos #3 L=0,40 (Columna tipo C2) eje D8	D8		70.00	3/8.	0.40	28.00	0.560	15.68
			Muro Confinamiento eje c (3-4) acero longitudinal 2#3/8 L= 3.42	C	3-4.	2.00	3/8.	3.42	6.84	0.560	3.83
			Muro confinamiento eje c (3-4) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	C	3-4.	33.00	3/8.	0.43	14.19	0.560	7.95
			Muro confinamiento eje c (2-3) acero longitudinal 2#3/8 L= 3.42	C	2-3.	2.00	3/8.	3.42	6.84	0.560	3.83
			Muro confinamiento eje c (2-3) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	C	2-3.	33.00	3/8.	0.43	14.19	0.560	7.95
			Muro confinamiento eje c (1-2) acero longitudinal 2#3/8 L= 3.42	C	1-2.	2.00	3/8.	3.42	6.84	0.560	3.83
			Muro confinamiento eje c (1-2) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	C	1/2.	33.00	3/8.	0.43	14.19	0.560	7.95
			Muro confinamiento eje A (1-2) acero longitudinal 2#3/8 L= 3.42	A	1-2.	2.00	3/8.	3.42	6.84	0.560	3.83
			Muro confinamiento eje A (1-2) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	A	1-2.	33.00	3/8.	0.43	14.19	0.560	7.95
			Muro confinamiento eje A (2-3) acero longitudinal 2#3/8 L= 3.42	A	2-3.	2.00	3/8.	3.42	6.84	0.560	3.83
			Muro confinamiento eje A (2-3) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	A	2-3.	33.00	3/8.	0.43	14.19	0.560	7.95
			Muro confinamiento eje A (3-4) acero longitudinal 2#3/8 L= 3.42	A	3-4.	2.00	3/8.	3.42	6.84	0.560	3.83
			Muro confinamiento eje A (3-4) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	A	3-4.	33.00	3/8.	0.43	14.19	0.560	7.95
			Muro confinamiento eje A (4-5) acero longitudinal 2#3/8 L= 3.42	A	4-5.	2.00	3/8.	3.42	6.84	0.560	3.83
			Muro confinamiento eje A (4-5) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	A	4-5.	33.00	3/8.	0.43	14.19	0.560	7.95
			Muro confinamiento eje 1 (A-B) acero longitudinal 2#3/8 L= 2.35	1	A-B	2.00	3/8.	2.35	4.70	0.560	2.63
Muro confinamiento eje 1 (A-B) acero transversal #3/8 cada 10 cml= 0.43m	1	A-B	22.00	3/8.	0.43	9.46	0.560	5.30			
Muro confinamiento eje 1 (B-C) acero longitudinal 2#3/8 L= 7.32	1	B-C	2.00	3/8.	7.32	14.64	0.560	8.20			

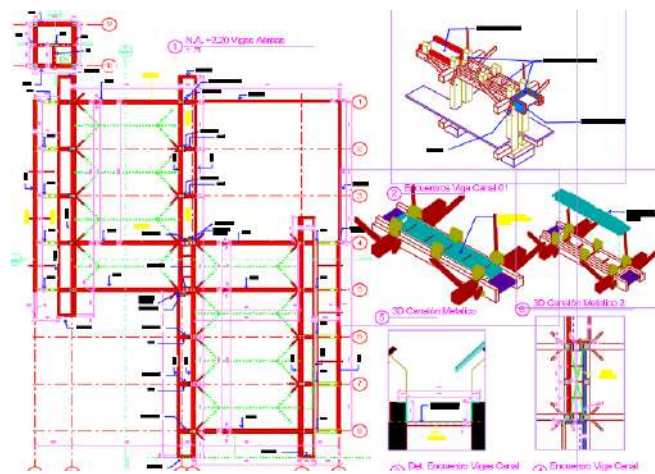		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA				Página 4 de 10					
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado				Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019					
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:		Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila									
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)		Tesalia - Huila				CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS					
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL		Contrato de interventoría No.		2059 -2025		Contrato de Obra No. 2038 - 2025					
						Vigencia del contrato 5 meses					
CAPITULO:		DESCRIPCION ITEM									
ITEM N°.	UNIDAD	No CORTE	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)								
4.01	Kg	ACTA PARCIAL No.2	PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026				FICHA #	6 DE 20			
 			LOCALIZACIÓN		MEDIDAS		KG X M.L	PESO EN KG			
			Aceros Columnas	EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)			Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD	SUBTOTAL M.L
			Muro confinamiento eje 1 (B-C) acero transversal #3/8 cada 10 cmL= 0.43m	1	B-C	72.00	3/8.	0.43	30.96	0.560	17.34
			Aula Musica								
			Viga aerea V201 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.80	8	D-F	3.00	1/2.	4.80	14.40	0.994	14.31
			Viga aerea V201 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.80	8	D-F	3.00	1/2.	7.80	23.40	0.994	23.26
			Viga aerea V201 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.70	8	D-F	3.00	1/2.	4.70	14.10	0.994	14.02
			Viga aerea V201 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.40	8	D-F	3.00	1/2.	8.40	25.20	0.994	25.05
			Viga aerea V201 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=3.0	8	D-F	3.00	1/2.	3.00	9.00	0.994	8.95
			Viga aerea V201 Acero refuerzo transversal 85E#3 L=1.10	8	D-F	72.00	3/8.	1.10	79.20	0.560	44.35
			Viga aerea V201 Acero refuerzo transversal 42E#3 L=1.0	8	D-F	42.00	3/8.	1.00	42.00	0.560	23.52
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.80	4	D-F	3.00	1/2.	4.80	14.40	0.994	14.31
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.80	4	D-F	3.00	1/2.	7.80	23.40	0.994	23.26
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.70	4	D-F	3.00	1/2.	4.70	14.10	0.994	14.02
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.40	4	D-F	3.00	1/2.	8.40	25.20	0.994	25.05
			Viga aerea V204 Acero refuerzo transversal 85E#3 L=1.20	4	D-F	72.00	3/8.	1.20	86.40	0.560	48.38
			Viga aerea V204 Acero refuerzo transversal 30E#3 L=1.10	4	D-F	30.00	3/8.	1.10	33.00	0.560	18.48
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.80	5	D-F	3.00	1/2.	4.80	14.40	0.994	14.31
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.80	5	D-F	3.00	1/2.	7.80	23.40	0.994	23.26
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.70	5	D-F	3.00	1/2.	4.70	14.10	0.994	14.02
			Viga aerea V204 Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.40	5	D-F	3.00	1/2.	8.40	25.20	0.994	25.05
			Viga aerea V204 Acero refuerzo transversal 85E#3 L=1.20	5	D-F	72.00	3/8.	1.20	86.40	0.560	48.38
			Viga aerea V204 Acero refuerzo transversal 30E#3 L=1.10	5	D-F	30.00	3/8.	1.10	33.00	0.560	18.48
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.50 VIGA V208	E	4-8.	3.00	1/2.	7.50	22.50	0.994	22.37
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.0 VIGA V208	E	4-8.	3.00	1/2.	8.00	24.00	0.994	23.86
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.90 VIGA V208	E	4-8.	3.00	1/2.	4.90	14.70	0.994	14.61
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.35 VIGA V208	E	4-8.	3.00	1/2.	4.35	13.05	0.994	12.97
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.90 VIGA V208	E	4-8.	3.00	1/2.	7.90	23.70	0.994	23.56
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.80 VIGA V208	E	4-8.	3.00	1/2.	7.80	23.40	0.994	23.26
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=4.20 (sobrealto) VIGA V208	E	4-8.	1.00	3/8.	4.20	4.20	0.560	2.35
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=7.80 (sobrealto) VIGA V208	E	4-8.	1.00	3/8.	7.80	7.80	0.560	4.37
			eje E (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=7.65 (sobrealto) VIGA V208	E	4-8.	1.00	3/8.	7.65	7.65	0.560	4.28
			eje E (4-8) Acero refuerzo transversal 188E#3 L=1.20 VIGA V208	E	4-8.	188.00	3/8.	1.20	225.60	0.560	126.34
			eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.50 VIGA V208	D	4-8.	3.00	1/2.	7.50	22.50	0.994	22.37
			eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.0 VIGA V208	D	4-8.	3.00	1/2.	8.00	24.00	0.994	23.86
			eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.90 VIGA V208	D	4-8.	3.00	1/2.	2.90	8.70	0.994	8.65
			eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.35 VIGA V208 VIGA V208	D	4-8.	3.00	1/2.	4.35	13.05	0.994	12.97
			eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.90 VIGA V208	D	4-8.	3.00	1/2.	7.90	23.70	0.994	23.56
			eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=6.0 VIGA V208	D	4-8.	3.00	1/2.	6.00	18.00	0.994	17.89
			eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=4.20 (sobrealto) VIGA V208	D	4-8.	1.00	3/8.	4.20	4.20	0.560	2.35



<div></div>		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA				Página 5 de 10					
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado				Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019					
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:		Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila									
		Tesalia - Huila									
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)						CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS					
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL		Contrato de interventoría No.		2059 -2025		Contrato de Obra No. 2038 - 2025					
						Vigencia del contrato					
						5 meses					
CAPITULO:		DESCRIPCION ITEM									
ITEM N°.		Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)									
4.01		PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026									
UNIDAD		LOCALIZACIÓN				MEDIDAS					
Kg		ACTA PARCIAL No.2				FICHA #					
						6 DE 20					
<div><p>5/06/2026 10:39:38 a. m. 2°29'23.68" N 75°43'49.559" W # 3-3 Carrera 7 Tesalia Huila</p></div>		Aceros Columnas		EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)	Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD	SUBTOTAL M.L	KG X M.L	PESO EN KG
		eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=7.80 (sobrealto) VIGA V208		D	4-8.	1.00	3/8.	7.80	7.80	0.560	4.37
		eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=5.855 (sobrealto) VIGA V208		D	4-8.	1.00	3/8.	5.85	5.85	0.560	3.28
		eje D (4-8) Acero refuerzo transversal 188E#3 L=1.20 VIGA V208		D	4-8.	167.00	3/8.	1.20	200.40	0.560	112.22
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=7.85 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	5/8.	7.85	15.70	1.552	24.37
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=6.25 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	5/8.	6.25	12.50	1.552	19.40
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.45 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	3/8.	7.45	14.90	0.560	8.34
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=6.10 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	3/8.	6.10	12.20	0.560	6.83
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=4.90 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	5/8.	4.90	9.80	1.552	15.21
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=9.0 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	5/8.	9.00	18.00	1.552	27.94
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=4.50 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	3/8.	4.50	9.00	0.560	5.04
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=9.0 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	2.00	3/8.	9.00	18.00	0.560	10.08
		Acero refuerzo transversal 114E#3 L=1.48 Viga Canal aerea V209		C	5-8.	114.00	3/8.	1.48	168.72	0.560	94.48
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=4.75 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	5/8.	4.75	9.50	1.552	14.74
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=4.65 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	3/8.	4.65	9.30	0.560	5.21
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=7.80 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	5/8.	7.80	15.60	1.552	24.21
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.0 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	3/8.	7.00	14.00	0.560	7.84
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=8.40 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	5/8.	8.40	16.80	1.552	26.07
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=6.30 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	3/8.	6.30	12.60	0.560	9.30
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=8.25 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	5/8.	8.25	16.50	1.552	25.61
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.80 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	3/8.	7.80	15.60	0.560	8.74
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=8.00 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	5/8.	8.00	16.00	1.552	24.83
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.70 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	3/8.	7.70	15.40	0.560	8.62
		Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=4.30 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	5/8.	4.30	8.60	1.552	13.35
		Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=4.20 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	2.00	3/8.	4.20	8.40	0.560	4.70
		Acero refuerzo transversal 176E#3 L=1.38 Viga canal aerea V207		E'	4-8.	176.00	3/8.	1.38	242.88	0.560	136.01
		Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=5.60 Viga aerea V206		F	4-8.	3.00	1/2.	5.60	16.80	0.994	16.70
		Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.0 Viga aerea V206		F	4-8.	3.00	1/2.	8.00	24.00	0.994	23.86
		Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=3.0 Viga aerea V206		F	4-8.	3.00	1/2.	3.00	9.00	0.994	8.95
		Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=9.0 Viga aerea V206		F	4-8.	3.00	1/2.	9.00	27.00	0.994	26.84
		Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=6.65 Viga aerea V206		F	4-8.	3.00	1/2.	6.65	19.95	0.994	19.83
		Acero refuerzo transversal 150E#3 L=1.0 Viga aerea V206		F	4-8.	150.00	3/8.	1.00	150.00	0.560	84.00
		Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=1.60 Viga aerea V203		6	C-D.	6.00	1/2.	1.60	9.60	0.994	9.54
		Acero refuerzo transversal 12E#3 L=1.0 Viga aerea V203		6	C-D.	12.00	3/8.	1.00	12.00	0.560	6.72
Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=1.60 Viga aerea V203		7	C-D.	6.00	1/2.	1.60	9.60	0.994	9.54		
Acero refuerzo transversal 12E#3 L=1.0 Viga aerea V203		7	C-D.	12.00	3/8.	1.00	12.00	0.560	6.72		
Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=3.25 Viga aerea V202		6	E-F.	6.00	1/2.	3.25	19.50	0.994	19.38		
Acero refuerzo transversal 27E#3 L=1.0 Viga aerea V202		6	E-F.	27.00	3/8.	1.00	27.00	0.560	15.12		
Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=3.25 Viga aerea V202		7	E-F.	6.00	1/2.	3.25	19.50	0.994	19.38		

		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA					Página 6 de 10				
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado					Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019				
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:		Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila									
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)		Tesalia - Huila					CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS				
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL		Contrato de interventoria No.		2059 -2025		Contrato de Obra No. 2038 - 2025		Vigencia del contrato	5 meses		
CAPITULO:		DESCRIPCIÓN ÍTEM									
ITEM N°.	UNIDAD	No CORTE	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)					FICHA #	6 DE 20		
4.01	Kg	ACTA PARCIAL No.2	PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026								
			LOCALIZACIÓN			MEDIDAS					
			Aceros Columnas	EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)	Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD	SUBTOTAL M.L	KG X M.L	PESO EN KG
			Acero refuerzo transversal 27E#3 L=1.0 Viga aerea V202	7	E-F.	27.00	3/8.	1.00	27.00	0.560	15.12
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202	4	E-F.	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202	4	E-F.	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202	5	E-F.	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202	5	E-F.	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202	6	E-F.	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202	6	E-F.	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202	7	E-F.	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202	7	E-F.	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202	8	E-F.	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202	8	E-F.	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo longitudinal sobre alto V208 eje D (4-8) 1#3	D	4-8.	1.00	3/8.	16.40	16.40	0.560	9.18
			Acero refuerzo transversal sobre alto V208 eje D (4-8) 1E#3 L=0.85cm cada 20cm	D	4-8.	82.00	3/8.	0.85	69.70	0.560	39.03
			Acero refuerzo longitudinal sobre alto V208 eje E (4-8) 1#3	E	4-8.	1.00	3/8.	18.25	18.25	0.560	10.22
			Acero refuerzo transversal sobre alto V208 eje E (4-8) 1E#3 L=0.85cm cada 20cm	E	4-8.	91.00	3/8.	0.85	77.35	0.560	43.32
			Acero refuerzo Longitudinal 4#4 L=1.22 EJE D 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA	D	4-8.	36.00	1/2.	1.22	43.92	0.994	43.66
			Acero refuerzo Transversal 11#3 L=0.80 EJE D 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA	D	4-8.	99.00	3/8.	0.80	79.20	0.560	44.35
			Acero refuerzo Longitudinal 4#4 L=1.22 EJE F 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA	E	4-8.	36.00	1/2.	1.22	43.92	0.994	43.66
			Acero refuerzo Transversal 11#3 L=0.80 EJE F 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA	E	4-8.	99.00	3/8.	0.80	79.20	0.560	44.35
			Acero refuerzo longitudinal 2#4 L=1.70 MENSULA 01 (TRES UNIDADES)	D	MENSUL	6.00	1/2.	1.70	10.20	0.994	10.14
			Acero refuerzo transversal 1#3 L=1.75 MENSULA 01 (TRES UNIDADES)	D	MENSUL	3.00	1/2.	1.75	5.25	0.994	5.22
			Acero refuerzo transversal 1#3 L=1.15 MENSULA 01 (TRES UNIDADES)	D	MENSUL	3.00	1/2.	1.15	3.45	0.994	3.43
			Acero refuerzo transversal 5#3 L=1.40 MENSULA 02	C	5	5.00	3/8.	1.40	7.00	0.560	3.92
			Acero refuerzo transversal 2#3 L=0.73 MENSULA 02	C	5	2.00	3/8.	0.73	1.46	0.560	0.82
			Acero de refuerzo longitudinal 5# 3 L=13.0 VIGA CANAL EJE C-D (4-8)	C-D.	4-8.	5.00	3/8.	13.00	65.00	0.560	36.40
			Acero de refuerzo transversal 5# 3 L=1.40 VIGA CANAL EJE C-D (4-8)	C-D.	4-8.	83.00	3/8.	1.40	116.20	0.560	65.07
			Acero de refuerzo longitudinal 5# 3 L=18.40 VIGA CANAL EJE E-F (4-8)	E-F.	4-8.	5.00	3/8.	18.40	92.00	0.560	51.52
			Acero de refuerzo transversal 5# 3 L=1.34 VIGA CANAL EJE E-F (4-8)	E-F.	4-8.	121.00	3/8.	1.34	162.14	0.560	90.80
			Acero de refuerzo longitudinal 4# 4 L=1.20 BORDILLO TAPA CANAL EJE D (SON 2 UND)	D		8.00	1/2.	1.20	9.60	0.994	9.54
			Acero de refuerzo transversal 5# 3 L=0.77 BORDILLO TAPA CANAL EJE D (SON 2 UND)	D		10.00	3/8.	0.77	7.70	0.560	4.31
			Acero de refuerzo longitudinal 4# 4 L=1.15 BORDILLO TAPA CANAL EJE F (SON 2 UND)	F		8.00	1/2.	1.15	9.20	0.994	9.14
			Acero de refuerzo transversal 5# 3 L=0.77 BORDILLO TAPA CANAL EJE F (SON 2 UND)	F		10.00	3/8.	0.77	7.70	0.560	4.31



9/06/2018 13:37:53 p.m.
2°29'23.59"N, 75°13'49.518"W
6-43 Calle 4a
Tesalia
Huila

		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA						Página 7 de 10					
								Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019					
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado											
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:		Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila											
		Tesalia - Huila											
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)								CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS					
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL		Contrato de interventoria No.		2059 -2025				Contrato de Obra No. 2038 - 2025					
								Vigencia del contrato					
								5 meses					
CAPITULO:		DESCRIPCION ÍTEM											
ITEM N°.		UNIDAD		No CORTE		Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)							
4.01		Kg		ACTA PARCIAL No.2		PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026							
						LOCALIZACIÓN		MEDIDAS		FICHA #		6 DE 20	



<div></div>		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA				Página 8 de 10								
		<div>☒ Público☐ Clasificado☐ Reservado</div>				Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019								
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:		Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila												
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)		Tesalia - Huila				CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS								
INTERVENTORIA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL		Contrato de interventoría No.		2059 -2025	Contrato de Obra No. 2038 - 2025		Vigencia del contrato	5 meses						
CAPITULO:		DESCRIPCION ITEM												
ITEM N°.	UNIDAD	No CORTE		Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)										
4.01	Kg	ACTA PARCIAL No.2		PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026										
				LOCALIZACIÓN			MEDIDAS		FICHA #	6 DE 20				
				Aceros Columnas	EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)	Ø (pulg) VARILLA			LONGITUD	SUBTOTAL M.L		
									KG X M.L	PESO EN KG				
				Viga aerea V201 Acero refuerzo transversal 42E#3 L=1.0			1	A-D	42.00	3/8.	1.00	42.00	0.560	23.52
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.50 VIGA V208			C	4-8.	3.00	1/2.	7.50	22.50	0.994	22.37
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.0 VIGA V208			C	4-8.	3.00	1/2.	8.00	24.00	0.994	23.86
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.90 VIGA V208			C	4-8.	3.00	1/2.	2.90	8.70	0.994	8.65
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=4.35 VIGA V208 VIGA V208			C	4-8.	3.00	1/2.	4.35	13.05	0.994	12.97
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=7.90 VIGA V208			C	4-8.	3.00	1/2.	7.90	23.70	0.994	23.56
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=6.0 VIGA V208			C	4-8.	3.00	1/2.	6.00	18.00	0.994	17.89
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=4.20 (sobrealto) VIGA V208			C	4-8.	1.00	3/8.	4.20	4.20	0.560	2.35
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=7.80 (sobrealto) VIGA V208			C	4-8.	1.00	3/8.	7.80	7.80	0.560	4.37
				eje D (4-8) Acero refuerzo Longitudinal 1#3 L=5.855 (sobrealto) VIGA V208			C	4-8.	1.00	3/8.	5.85	5.85	0.560	3.28
				eje D (4-8) Acero refuerzo transversal 188E#3 L=1.20 VIGA V208			C	4-8.	167.00	3/8.	1.20	200.40	0.560	112.22
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=7.85 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	5/8.	7.85	15.70	1.552	24.37
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=6.25 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	5/8.	6.25	12.50	1.552	19.40
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.45 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	3/8.	7.45	14.90	0.560	8.34
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=6.10 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	3/8.	6.10	12.20	0.560	6.83
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=4.90 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	5/8.	4.90	9.80	1.552	15.21
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=9.0 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	5/8.	9.00	18.00	1.552	27.94
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=4.50 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	3/8.	4.50	9.00	0.560	5.04
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=9.0 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	2.00	3/8.	9.00	18.00	0.560	10.08
				Acero refuerzo transversal 114E#3 L=1.48 Viga Canal aerea V209			D	1-5.	114.00	3/8.	1.48	168.72	0.560	94.48
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=4.75 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	5/8.	4.75	9.50	1.552	14.74
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=4.65 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	3/8.	4.65	9.30	0.560	5.21
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=7.80 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	5/8.	7.80	15.60	1.552	24.21
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.0 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	3/8.	7.00	14.00	0.560	7.84
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=8.40 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	5/8.	8.40	16.80	1.552	26.07
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=6.30 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	3/8.	8.30	16.60	0.560	9.30
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=8.25 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	5/8.	8.25	16.50	1.552	25.61
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.80 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	3/8.	7.80	15.60	0.560	8.74
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=8.00 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	5/8.	8.00	16.00	1.552	24.83
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=7.70 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	3/8.	7.70	15.40	0.560	8.62
				Acero refuerzo Longitudinal 2#5 L=4.30 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	5/8.	4.30	8.60	1.552	13.35
				Acero refuerzo Longitudinal 2#3 L=4.20 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	2.00	3/8.	4.20	8.40	0.560	4.70
				Acero refuerzo transversal 176E#3 L=1.38 Viga canal aerea V207			B'.	1-5.	176.00	3/8.	1.38	242.88	0.560	136.01
				Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=5.60 Viga aerea V206			A	1-5.	3.00	1/2.	5.60	16.80	0.994	16.70
				Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=8.0 Viga aerea V206			A	1-5.	3.00	1/2.	8.00	24.00	0.994	23.86
				Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=3.0 Viga aerea V206			A	1-5.	3.00	1/2.	3.00	9.00	0.994	8.95
				Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=9.0 Viga aerea V206			A	1-5.	3.00	1/2.	9.00	27.00	0.994	26.84
				Acero refuerzo Longitudinal 3#4 L=6.65 Viga aerea V206			A	1-5.	3.00	1/2.	6.65	19.95	0.994	19.83



9/06/2026 9:14:26 a. m.
2°29'2.442" N 75°43'49.418" W
3-3 Carrera 7
Tesalia
Huila



10/06/2026 11:47:26 a. m.
2°29'2.496" N 75°43'49.476" W
3-3 Carrera 7
Tesalia
Huila



		MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA					Página 9 de 10					
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado					Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019					
PROYECTO: DIRECCIÓN OBRA:			Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila									
			Tesalia - Huila									
Objeto: Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)								CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS				
INTERVENTORÍA: CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL			Contrato de interventoria No.		2059 -2025		Contrato de Obra No. 2038 - 2025					
								Vigencia del contrato				
								5 meses				
CAPITULO:			DESCRIPCION ÍTEM									
ITEM N°.			UNIDAD		No CORTE		Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)					
4.01			Kg		ACTA PARCIAL No.2		PERIODO DEL CORTE: 11 de junio 2026					
			LOCALIZACIÓN				MEDIDAS		FICHA #			
									6 DE 20			
			Aceros Columnas		EJE	ENTRE EJES	CANTIDAD(Ø)	Ø (pulg) VARILLA	LONGITUD	SUBTOTAL M.L	KG X M.L	PESO EN KG
			Acero refuerzo transversal 150E#3 L=1.0 Viga aerea V206		A	1-5.	150.00	3/8.	1.00	150.00	0.560	84.00
			Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=1.60 Viga aerea V203		3	C-D.	6.00	1/2.	1.60	9.60	0.994	9.54
			Acero refuerzo transversal 12E#3 L=1.0 Viga aerea V203		3	C-D.	12.00	3/8.	1.00	12.00	0.560	6.72
			Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=1.60 Viga aerea V203		2	C-D.	6.00	1/2.	1.60	9.60	0.994	9.54
			Acero refuerzo transversal 12E#3 L=1.0 Viga aerea V203		2	A-B	12.00	3/8.	1.00	12.00	0.560	6.72
			Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=3.25 Viga aerea V202		2	A-B	6.00	1/2.	3.25	19.50	0.994	19.38
			Acero refuerzo transversal 27E#3 L=1.0 Viga aerea V202		2	A-B	27.00	3/8.	1.00	27.00	0.560	15.12
			Acero refuerzo Longitudinal 6#4 L=3.25 Viga aerea V202		3	A-B	6.00	1/2.	3.25	19.50	0.994	19.38
			Acero refuerzo transversal 27E#3 L=1.0 Viga aerea V202		3	A-B	27.00	3/8.	1.00	27.00	0.560	15.12
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202		1	A-B	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202		1	A-B	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202		2	A-B	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202		2	A-B	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202		3	A-B	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202		3	A-B	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202		4	A-B	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202		4	A-B	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo Longitudinal 2#4 L=2.0 SOBRE ALTO VIGA V202		5	A-B	2.00	1/2.	2.00	4.00	0.994	3.98
			Acero refuerzo transversal 1E#3 L=1.0 SOBRE ALTO VIGA V202		5	A-B	1.00	3/8.	0.68	0.68	0.560	0.38
			Acero refuerzo longitudinal sobre alto V208 eje C (1-5) 1#3		C	1-5.	1.00	3/8.	16.40	16.40	0.560	9.18
			Acero refuerzo transversal sobre alto V208 eje C (1-5) 1E#3 L=0.85cm cada 20cm		C	1-5.	82.00	3/8.	0.85	69.70	0.560	39.03
			Acero refuerzo longitudinal sobre alto V208 eje B (1-5) 1#3		B	1-5.	1.00	3/8.	18.25	18.25	0.560	10.22
			Acero refuerzo transversal sobre alto V208 eje B (1-5) 1E#3 L=0.85cm cada 20cm		B	1-5.	91.00	3/8.	0.85	77.35	0.560	43.32
			Acero refuerzo Longitudinal 4#4 L=1.22 EJE D 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA		C	1-5.	36.00	1/2.	1.22	43.92	0.994	43.66
			Acero refuerzo Transversal 11#3 L=0.80 EJE D 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA		C	1-5.	99.00	3/8.	0.80	79.20	0.560	44.35
			Acero refuerzo Longitudinal 4#4 L=1.22 EJE F 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA		B	1-5.	36.00	1/2.	1.22	43.92	0.994	43.66
			Acero refuerzo Transversal 11#3 L=0.80 EJE F 9 UNIDADES PEDESTALES CUBIERTA		B	1-5.	99.00	3/8.	0.80	79.20	0.560	44.35
			Acero refuerzo longitudinal 2#4 L=1.70 MENSULA 01 (TRES UNIDADES)		C	MENSUL	6.00	1/2.	1.70	10.20	0.994	10.14
			Acero refuerzo transversal 1#3 L=1.75 MENSULA 01 (TRES UNIDADES)		C	MENSUL	3.00	1/2.	1.75	5.25	0.994	5.22
			Acero refuerzo transversal 1#3 L=1.15 MENSULA 01 (TRES UNIDADES)		C	MENSUL	3.00	1/2.	1.15	3.45	0.994	3.43
			Acero refuerzo transversal 5#3 L=1.40 MENSULA 02		C	4	5.00	3/8.	1.40	7.00	0.560	3.92
			Acero refuerzo transversal 2#3 L=0.73 MENSULA 02		C	4	2.00	3/8.	0.73	1.46	0.560	0.82
			Acero de refuerzo longitudinal 5# 3 L=13.0 VIGA CANAL EJE C-D (1-5)		C-D.	1-5.	5.00	3/8.	13.00	65.00	0.560	36.40
			Acero de refuerzo transversal 5# 3 L=1.40 VIGA CANAL EJE C-D (1-5)		C-D.	1-5.	83.00	3/8.	1.40	116.20	0.560	65.07




10/06/2026 11:49:32 a.m.
2:29 2.61 11.75 43.49 / 68.3
N. 3. 3 Carrera 7
Tesalia
Huila



10/06/2026 11:49:15 a.m.
2:29 2.52 11.75 43.49 / 65.3 W
N. 1-50 Carrera 7
Tesalia
Huila



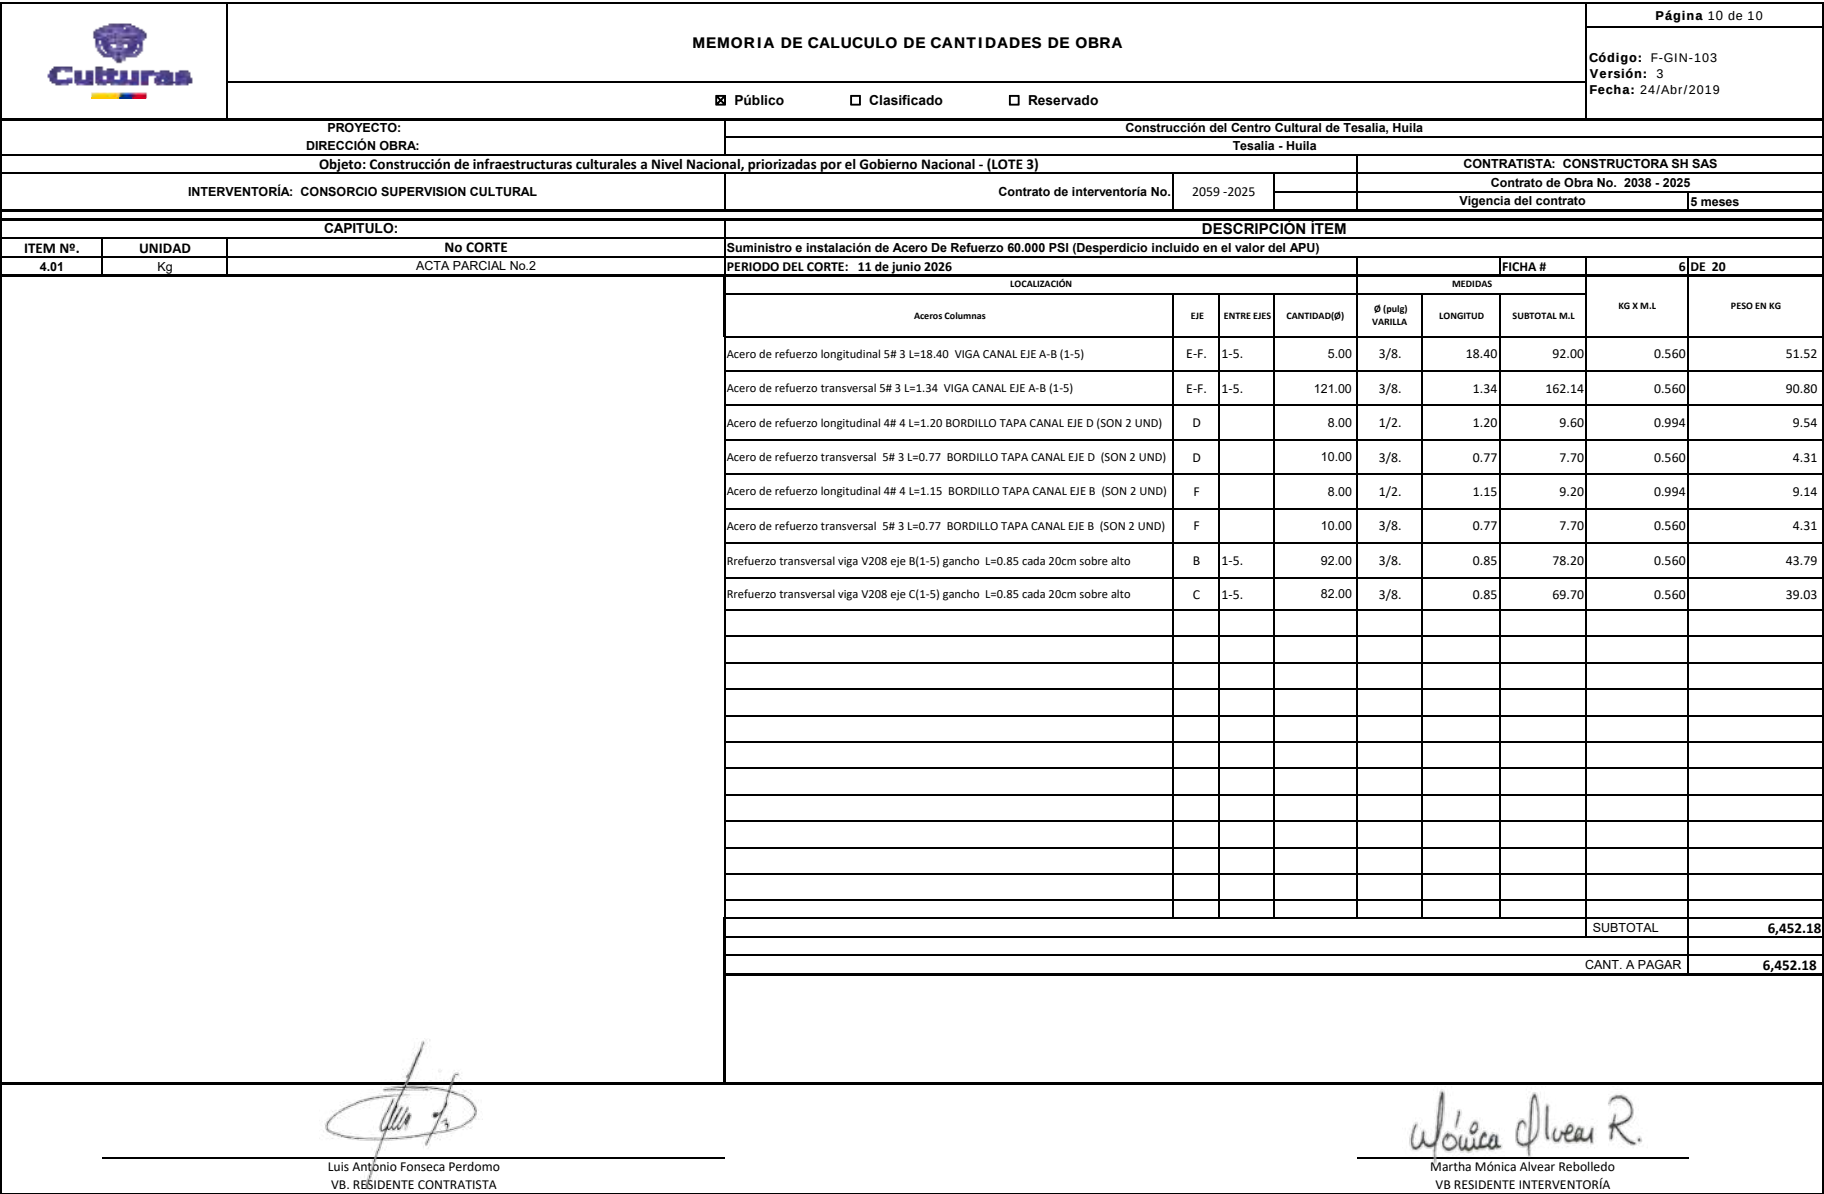


**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA**

EFRAIN SANTANDER ESPAÑA identificado (a) con c.c. 12.992.113 en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCTORA SH SAS, identificada con NIT 900627079-8, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se efectuaron los retiros correspondientes de afiliaciones al sistema de seguridad social integral, del personal, correspondientes al último periodo de vigencia del contrato de obra

La presente se expide al 21 día del mes de julio de 2026, en la Ciudad de Pasto.



Nombre: EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA SH SAS
Documento de Identidad: 12.992.113

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12.992.113
NUMERO

SANTANDER ESPAÑA
APELLIDOS

EFRAIN
NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

[Fingerprint]
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1967**

PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-JUL-1986 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

[Barcode]

A-2300100-53 129931-M-0012992113-20050531 03949 05151A 02 169873885

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36695281
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900627079	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21A N031A76	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADSHSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186002882
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12992113	PRIMER APELLIDO	SANTANDER	SEGUNDO APELLIDO	ESPANA
PRIMER NOMBRE	EFRAIN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		\$22.042.337		36695281

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4919866	01	5	No	No	41	797	5411101	Fijo	CAMPOS SILVA GUILLERMO	\$1.750.905
CC-87103202	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	CEPEDA JURADO JORGE HUMBERTO	\$4.230.000
CC-83254727	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	CUENCA BURGOS VICTOR MANUEL	\$1.750.905
CC-1087961373	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	FLOREZ FLOREZ ANDERSON DANIEL	\$1.750.905
CC-79289035	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	FONSECA PERDOMO LUIS ANTONIO	\$4.230.000
CC-1004075176	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	GOMEZ CASTRO CARLOS ANDRES	\$1.750.905
CC-14697094	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	GUERRERO JOJOA CARLOS FLORENCIO	\$1.750.905
CC-1079409778	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	MENDEZ RAMIREZ GEINER	\$1.750.905
CC-87491547	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	MENESES ESTRADA HARO HENRRY	\$1.968.000
CC-79905064	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	OROZCO RAMIREZ LUIS ALEXANDER	\$1.750.905
CC-1086328152	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	PUPIALES JOJOA MARCOS EVANGELISTA	\$1.750.905
CC-98391650	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER BURITICA MARCIAL	\$1.750.905
CC-30713911	01	1	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER ESPAÑA MAXIMILIANA DEL CARMEN	\$1.750.905
CC-1079410152	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	VALENZUELA ZULETA JESUS ALBERTO	\$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 4919866	X	2026-02-25	X	2026-02-27																									0			
CC - 87103202																														0		
CC - 83254727	X	2026-02-25																												0		
CC - 1087961373																														0		
CC - 79289035	X	2026-02-01																												0		
CC - 1004075176	X	2026-02-17																												0		
CC - 14697094	X	2026-02-17																												0		
CC - 1079409778	X	2026-02-25																												0		
CC - 87491547																														0		
CC - 79905064																														0		
CC - 1086328152																														0		
CC - 98391650																														0		
CC - 30713911																														0		
CC - 1079410152	X	2026-02-25																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4919866	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 87103202	PROTECCION	30	\$4.230.000	0.1600000	\$676.800	\$0	\$0	\$676.800	\$0	\$0	\$0
CC - 83254727	PROTECCION	6	\$350.181	0.1600000	\$56.100	\$0	\$0	\$56.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1087961373	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 79289035	COLPENSIONES	30	\$4.230.000	0.1600000	\$676.800	\$0	\$0	\$676.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1004075176	PORVENIR	14	\$817.089	0.1600000	\$130.800	\$0	\$0	\$130.800	\$0	\$0	\$0
CC - 14697094	PROTECCION	14	\$817.089	0.1600000	\$130.800	\$0	\$0	\$130.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1079409778	PROTECCION	6	\$350.181	0.1600000	\$56.100	\$0	\$0	\$56.100	\$0	\$0	\$0
CC - 87491547	PROTECCION	30	\$1.968.000	0.1600000	\$314.900	\$0	\$0	\$314.900	\$0	\$0	\$0
CC - 79905064	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1086328152	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 98391650	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 30713911	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1079410152	PORVENIR	6	\$350.181	0.1600000	\$56.100	\$0	\$0	\$56.100	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4919866	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	1	0.0696000	\$12.200
CC - 87103202	SANITAS	30	\$4.230.000	0.0400000	\$169.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.230.000	1	0.0696000	\$294.500
CC - 83254727	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350.181	1	0.0696000	\$24.400
CC - 1087961373	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 79289035	SANITAS	30	\$4.230.000	0.0400000	\$169.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.230.000	1	0.0696000	\$294.500
CC - 1004075176	NUEVA E.P.S. S.A.	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$817.089	1	0.0696000	\$56.900
CC - 14697094	NUEVA E.P.S. S.A.	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$817.089	1	0.0696000	\$56.900
CC - 1079409778	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350.181	1	0.0696000	\$24.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 87491547	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.968.00 0	1	0.0696000	\$137.000
CC - 79905064	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1086328152	EPS-S EMSSANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 98391650	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 30713911	MIN001 - ADRES	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1079410152	SALUD TOTAL	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350.181	1	0.0696000	\$24.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4919866	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87103202	CCF DE NARINO	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-83254727	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087961373	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79289035	CCF DE NARINO	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004075176	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-14697094	CCF DE NARINO	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079409778	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87491547	CCF DE NARINO	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79905064	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1086328152	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-98391650	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30713911	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079410152	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
COLPENSIONES	1	\$676.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$676.800	
PROTECCION	6	\$1.514.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.514.900	
PORVENIR	5	\$1.027.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.027.500	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$14.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.10 0	0	\$0	\$0	\$14.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$14.10 0	\$0	\$0	\$14.10 0
SANITAS	3	\$408.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$408.5 00	0	\$0	\$0	\$408.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$408.5 00	\$0	\$0	\$408.5 00
NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$305.6 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$305.6 00	0	\$0	\$0	\$305.6 00	\$0	0	\$0	\$0	\$305.6 00	\$0	\$0	\$305.6 00
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$14.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.10 0	0	\$0	\$0	\$14.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$14.10 0	\$0	\$0	\$14.10 0
EPS-S EMSSANAR	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0
MIN001 - ADRES	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	14	\$1.534.700	0	\$0	\$0	\$1.534.700	0	\$0	\$1.534.700	0	\$0	\$0	\$1.534.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	8	\$730.300	0	\$0	\$730.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$152.200	0	\$0	\$152.200
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$882.500
PENSIONES	4	\$3.219.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.534.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$882.500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$6.518.900

VR SEGURIDAD SOCIAL DE TESALIA \$4.937.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36972973
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900627079	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21A N031A76	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADSHSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186002882
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Pública	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12992113	PRIMER APELLIDO	SANTANDER	SEGUNDO APELLIDO	ESPANA
PRIMER NOMBRE	EFRAIN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
22		\$28.403.962		36972973

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-98387352	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	ARAUJO SARASTY MARIO FERNANDO	\$1.750.905
CC-87103202	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	CEPEDA JURADO JORGE HUMBERTO	\$4.230.000
CC-1085316789	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	CORAL CHAMORRO DARIO FERNANDO	\$1.750.905
CC-83254727	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	CUENCA BURGOS VICTOR MANUEL	\$1.750.905
CC-1087961373	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	FLOREZ FLOREZ ANDERSON DANIEL	\$1.750.905
CC-79289035	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	FONSECA PERDOMO LUIS ANTONIO	\$4.230.000
CC-1004075176	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	GOMEZ CASTRO CARLOS ANDRES	\$1.750.905
CC-1079411206	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	GONGORA MARTINEZ JUAN DANIEL	\$1.750.905
CC-14697094	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	GUERRERO JOJOA CARLOS FLORENCIO	\$1.750.905
CC-1079411345	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	LASSO GUALY ALEJANDRO	\$1.750.905
CC-18420438	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	MARTINEZ JUAN DAVID	\$1.750.905
CC-1085285480	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	MARTINEZ JIMENEZ YESENIA DEL CARMEN	\$1.750.905
CC-1079409778	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	MENDEZ RAMIREZ GEINER	\$1.750.905
CC-87491547	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	MENESES ESTRADA HARO HENRRY	\$1.968.000
CC-1006509015	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	MUÑOZ CORDOBA JAIDER ESTIVEN	\$1.750.905
CC-79905064	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	OROZCO RAMIREZ LUIS ALEXANDER	\$1.750.905
CC-1086328152	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	PUPIALES JOJOA MARCOS EVANGELISTA	\$1.750.905
CC-12959705	01	5	No	No	41	797	5411101	Fijo	QUIROZ LIMA SEGUNDO ARTEMIO	\$1.750.905
CC-1079410547	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	SALAZAR LEIVA WILLIAM ANDRES	\$1.750.905
CC-98391650	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER BURITICA MARCIAL	\$1.750.905
CC-30713911	01	1	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER ESPAÑA MAXIMILIANA DEL CARMEN	\$1.750.905
CC-1079410152	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	VALENZUELA ZULETA JESUS ALBERTO	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	S LN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVC	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 98387352	X	2026-03-18																											0		
CC - 87103202																													0		
CC - 1085316789	X	2026-03-03	X	2026-03-30																									0		
CC - 83254727			X	2026-03-07																									0		
CC - 1087961373																													0		
CC - 79289035																													0		
CC - 1004075176																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411206	X	2026-03-26																											0		
CC - 14697094																													0		
CC - 1079411345	X	2026-03-25																											0		
CC - 18420438	X	2026-03-26																											0		
CC - 1085285480	X	2026-03-30																											0		
CC - 1079409778			X	2026-03-07																									0		
CC - 87491547																													0		
CC - 1006509015	X	2026-03-25																											0		
CC - 79905064																													0		
CC - 1086328152																													0		
CC - 12959705	X	2026-03-30																											0		
CC - 1079410547	X	2026-03-19																											0		
CC - 98391650																													0		
CC - 30713911																													0		
CC - 1079410152			X	2026-03-07																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 98387352	PORVENIR	13	\$758.726	0.1600000	\$121.400	\$0	\$0	\$121.400	\$0	\$0	\$0
CC - 87103202	PROTECCION	30	\$4.230.000	0.1600000	\$676.800	\$0	\$0	\$676.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1085316789	PORVENIR	28	\$1.634.178	0.1600000	\$261.500	\$0	\$0	\$261.500	\$0	\$0	\$0
CC - 83254727	PROTECCION	7	\$408.545	0.1600000	\$65.400	\$0	\$0	\$65.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1087961373	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 79289035	COLPENSIONES	30	\$4.230.000	0.1600000	\$676.800	\$0	\$0	\$676.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1004075176	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1079411206	PORVENIR	5	\$291.818	0.1600000	\$46.700	\$0	\$0	\$46.700	\$0	\$0	\$0
CC - 14697094	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1079411345	PORVENIR	6	\$350.181	0.1600000	\$56.100	\$0	\$0	\$56.100	\$0	\$0	\$0
CC - 18420438	COLPENSIONES	5	\$291.818	0.1600000	\$46.700	\$0	\$0	\$46.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1085285480	PORVENIR	1	\$58.364	0.1600000	\$9.400	\$0	\$0	\$9.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1079409778	PROTECCION	7	\$408.545	0.1600000	\$65.400	\$0	\$0	\$65.400	\$0	\$0	\$0
CC - 87491547	PROTECCION	30	\$1.968.000	0.1600000	\$314.900	\$0	\$0	\$314.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1006509015	PORVENIR	6	\$350.181	0.1600000	\$56.100	\$0	\$0	\$56.100	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 79905064	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1086328152	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 12959705	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1079410547	PORVENIR	12	\$700.362	0.1600000	\$112.100	\$0	\$0	\$112.100	\$0	\$0	\$0
CC - 98391650	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 30713911	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1079410152	PORVENIR	7	\$408.545	0.1600000	\$65.400	\$0	\$0	\$65.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 98387352	SANITAS	13	\$758.726	0.0400000	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$758.726	1	0.0696000	\$52.900
CC - 87103202	SANITAS	30	\$4.230.000	0.0400000	\$169.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.230.000	1	0.0696000	\$294.500
CC - 1085316789	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$1.634.178	0.0400000	\$65.400	\$0	0	\$0	0	\$0	28	\$1.634.178	1	0.0696000	\$113.800
CC - 83254727	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$408.545	1	0.0696000	\$28.500
CC - 1087961373	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 79289035	SANITAS	30	\$4.230.000	0.0400000	\$169.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.230.000	1	0.0696000	\$294.500
CC - 1004075176	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1079411206	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$291.818	0.0400000	\$11.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$291.818	1	0.0696000	\$20.400
CC - 14697094	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1079411345	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350.181	1	0.0696000	\$24.400
CC - 18420438	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$291.818	0.0400000	\$11.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$291.818	1	0.0696000	\$20.400
CC - 1085285480	SANITAS	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$58.364	1	0.0696000	\$4.100
CC - 1079409778	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$408.545	1	0.0696000	\$28.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 87491547	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.968.00 0	1	0.0696000	\$137.000
CC - 1006509015	SANITAS	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350.181	1	0.0696000	\$24.400
CC - 79905064	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1086328152	EPS-S EMSSANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 12959705	EPS-S EMSSANAR	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$58.364	1	0.0696000	\$4.100
CC - 1079410547	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$700.362	1	0.0696000	\$48.800
CC - 98391650	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 30713911	MIN001 - ADRES	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1079410152	SALUD TOTAL	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$408.545	1	0.0696000	\$28.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-98387352	CCF DE NARINO	13	\$758.726	0.0400000	\$30.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87103202	CCF DE NARINO	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085316789	CCF DE NARINO	28	\$1.634.17 8	0.0400000	\$65.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-83254727	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087961373	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79289035	CCF DE NARINO	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004075176	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079411206	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$291.818	0.0400000	\$11.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-14697094	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079411345	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18420438	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$291.818	0.0400000	\$11.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085285480	CCF DE NARINO	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079409778	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87491547	CCF DE NARINO	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006509015	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79905064	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1086328152	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12959705	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$58.364	0.0400000	\$2.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079410547	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-98391650	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-30713911	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079410152	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	6	\$1.682.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.682.900
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	12	\$1.849.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.849.500
COLPENSIONES	2	\$723.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$723.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	6	\$455.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$455.4 00	0	\$0	\$0	\$455.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$455.4 00	\$0	\$0	\$455.4 00
NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$478.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$478.5 00	0	\$0	\$0	\$478.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$478.5 00	\$0	\$0	\$478.5 00
MIN001 - ADRES	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0
EPS-S EMSSANAR	2	\$72.50 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$72.50 0	0	\$0	\$0	\$72.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$72.50 0	\$0	\$0	\$72.50 0
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$44.50 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$44.50 0	0	\$0	\$0	\$44.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$44.50 0	\$0	\$0	\$44.50 0
SALUD TOTAL	1	\$16.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$16.40 0	0	\$0	\$0	\$16.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$16.40 0	\$0	\$0	\$16.40 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	22	\$1.978.100	0	\$0	\$0	\$1.978.100	0	\$0	\$1.978.100	0	\$0	\$0	\$1.978.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
CCF DE NARINO	11	\$865.900	0	\$0
COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$271.500	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$1.137.400
PENSIONES	3	\$4.255.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.978.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$1.137.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.508.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36969562
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900627079	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21A N031A76	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADSHSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186002882
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Pública	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12992113	PRIMER APELLIDO	SANTANDER	SEGUNDO APELLIDO	ESPANA
PRIMER NOMBRE	EFRAIN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		\$0		36969562

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411181	59	4	No	No	41	797	5411101	Salario	MUÑOZ MARTINEZ JULIETH MARITHZA	\$1.750.905
CD-1076500127	59	No	No	No	41	797	5411101	Salario	ORTIZ CASTRO ISABELA	\$1.750.905
CC-1085899762	59	No	No	No	52	1	5411101	Salario	OSEJO ARGOTY KAREN NATHALY	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411181																													0		
CD - 1076500127																													0		
CC - 1085899762																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411181	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CD - 1076500127	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1085899762	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411181	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CD - 1076500127	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1085899762	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411181	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CD-1076500127	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085899762	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	\$365.700	0	\$0	\$0	\$365.700	0	\$0	\$365.700	0	\$0	\$0	\$365.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
SIN CCF		3		\$0	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$365.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$365.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37275096

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-05-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900627079	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21A N031A76	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADSHSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186002882
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Pública	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12992113	PRIMER APELLIDO	SANTANDER	SEGUNDO APELLIDO	ESPANA
PRIMER NOMBRE	EFRAIN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
22		\$39,493,025		37275096

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-98387352	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	ARAUJO SARASTY MARIO FERNANDO	\$1,750,905
CC-87103202	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	CEPEDA JURADO JORGE HUMBERTO	\$4,230,000
CC-1085316789	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	CORAL CHAMORRO DARIO FERNANDO	\$1,750,905
CC-1004074566	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	CUMBE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO	\$1,750,905
CC-1087961373	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	FLOREZ FLOREZ ANDERSON DANIEL	\$1,750,905
CC-79289035	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	FONSECA PERDOMO LUIS ANTONIO	\$4,230,000
CC-1004075176	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	GOMEZ CASTRO CARLOS ANDRES	\$1,750,905
CC-1079411206	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	GONGORA MARTINEZ JUAN DANIEL	\$1,750,905
CC-14697094	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	GUERRERO JOJOA CARLOS FLORENCIO	\$1,750,905
CC-1079411345	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	LASSO GUALY ALEJANDRO	\$1,750,905
CC-18420438	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	MARTINEZ JUAN DAVID	\$1,750,905
CC-1085285480	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	MARTINEZ JIMENEZ YESENIA DEL CARMEN	\$1,750,905
CC-87491547	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	MENESES ESTRADA HARO HENRRY	\$1,968,000
CC-1006509015	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	MUÑOZ CORDOBA JAIDER ESTIVEN	\$1,750,905
CC-12975709	01	3	No	No	52	1	5411101	Fijo	NARVAEZ PAZ ALBERTO MARINO	\$1,750,905
CC-79905064	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	OROZCO RAMIREZ LUIS ALEXANDER	\$1,750,905
CC-1086328152	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	PUPIALES JOJOA MARCOS EVANGELISTA	\$1,750,905
CC-12959705	01	5	No	No	41	797	5411101	Fijo	QUIROZ LIMA SEGUNDO ARTEMIO	\$1,750,905
CC-1079409879	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	SALAZAR LEIVA JOHN ANDERSON	\$1,750,905
CC-1079410547	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	SALAZAR LEIVA WILLIAM ANDRES	\$1,750,905
CC-98391650	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER BURITICA MARCIAL	\$1,750,905
CC-30713911	01	1	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER ESPAÑA MAXIMILIANA DEL CARMEN	\$1,750,905

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVC	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 98387352																													0		
CC - 87103202																													0		
CC - 1085316789	X	2026-04-01																											0		
CC - 1004074566	X	2026-04-25																											0		
CC - 1087961373																													0		
CC - 79289035																													0		
CC - 1004075176																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1079411206			X	2026-04-21																									0			
CC - 14697094																														0		
CC - 1079411345																														0		
CC - 18420438			X	2026-04-25																										0		
CC - 1085285480																														0		
CC - 87491547																														0		
CC - 1006509015																														0		
CC - 12975709	X	2026-04-25																												0		
CC - 79905064																														0		
CC - 1086328152																														0		
CC - 12959705			X	2026-04-25																										0		
CC - 1079409879	X	2026-04-06																												0		
CC - 1079410547																														0		
CC - 98391650																														0		
CC - 30713911																														0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 98387352	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 87103202	PROTECCION	30	\$4,230,000	0.1600000	\$676,800	\$0	\$0	\$676,800	\$0	\$0	\$0
CC - 1085316789	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1004074566	PORVENIR	6	\$350,181	0.1600000	\$56,100	\$0	\$0	\$56,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1087961373	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 79289035	COLPENSIONES	30	\$4,230,000	0.1600000	\$676,800	\$0	\$0	\$676,800	\$0	\$0	\$0
CC - 1004075176	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1079411206	PORVENIR	21	\$1,225,634	0.1600000	\$196,200	\$0	\$0	\$196,200	\$0	\$0	\$0
CC - 14697094	PROTECCION	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1079411345	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 18420438	COLPENSIONES	25	\$1,459,088	0.1600000	\$233,500	\$0	\$0	\$233,500	\$0	\$0	\$0
CC - 1085285480	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 87491547	PROTECCION	30	\$1,968,000	0.1600000	\$314,900	\$0	\$0	\$314,900	\$0	\$0	\$0
CC - 1006509015	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 12975709	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 79905064	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1086328152	PROTECCION	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 12959705	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1079409879	PORVENIR	25	\$1,459,088	0.1600000	\$233,500	\$0	\$0	\$233,500	\$0	\$0	\$0
CC - 1079410547	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 98391650	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 30713911	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 98387352	SANITAS	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 87103202	SANITAS	30	\$4,230,000	0.0400000	\$169,200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4,230,000	1	0.0696000	\$294,500
CC - 1085316789	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1004074566	SANITAS	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350,181	1	0.0696000	\$24,400
CC - 1087961373	SANITAS	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 79289035	SANITAS	30	\$4,230,000	0.0400000	\$169,200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4,230,000	1	0.0696000	\$294,500
CC - 1004075176	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1079411206	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$1,225,634	0.0400000	\$49,100	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$1,225,634	1	0.0696000	\$85,400
CC - 14697094	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1079411345	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 18420438	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$1,459,088	0.0400000	\$58,400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1,459,088	1	0.0696000	\$101,600
CC - 1085285480	SANITAS	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 87491547	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,968,000	0.0400000	\$78,800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,968,000	1	0.0696000	\$137,000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1006509015	SANITAS	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	1	0.0696000	\$121,900
CC - 12975709	EPS-S EMSSANAR	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350,181	1	0.0696000	\$24,400
CC - 79905064	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1086328152	EPS-S EMSSANAR	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	1	0.0696000	\$121,900
CC - 12959705	EPS-S EMSSANAR	25	\$1,459,08 8	0.0400000	\$58,400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1,459,08 8	1	0.0696000	\$101,600
CC - 1079409879	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25	\$1,459,08 8	0.0400000	\$58,400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1,459,08 8	1	0.0696000	\$101,600
CC - 1079410547	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	1	0.0696000	\$121,900
CC - 98391650	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	1	0.0696000	\$121,900
CC - 30713911	MIN001 - ADRES	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	1	0.0696000	\$121,900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-98387352	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87103202	CCF DE NARINO	30	\$4,230,00 0	0.0400000	\$169,200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085316789	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004074566	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087961373	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79289035	CCF DE NARINO	30	\$4,230,00 0	0.0400000	\$169,200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004075176	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079411206	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	\$1,225,63 4	0.0400000	\$49,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-14697094	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079411345	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-18420438	COMFAMILIAR DEL HUILA	25	\$1,459,08 8	0.0400000	\$58,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085285480	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87491547	CCF DE NARINO	30	\$1,968,00 0	0.0400000	\$78,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006509015	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12975709	CCF DE NARINO	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79905064	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1086328152	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12959705	COMFAMILIAR DEL HUILA	25	\$1,459,08 8	0.0400000	\$58,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079409879	COMFAMILIAR DEL HUILA	25	\$1,459,08 8	0.0400000	\$58,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079410547	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-98391650	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-30713911	CCF DE NARINO	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	13	\$3,287,800	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$2,400	\$0	\$0	\$3,290,200
COLPENSIONES	2	\$910,300	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$700	\$0	\$0	\$911,000
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0
PROTECCION	4	\$1,552,100	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$1,200	\$0	\$0	\$1,553,300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	7	\$632,900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$632,900	1	\$500	\$0	\$633,400	\$0	0	\$0	\$0	\$633,400	\$0	\$0	\$633,400
NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$606,900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$606,900	1	\$500	\$0	\$607,400	\$0	0	\$0	\$0	\$607,400	\$0	\$0	\$607,400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$128,500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$128,500	1	\$100	\$0	\$128,600	\$0	0	\$0	\$0	\$128,600	\$0	\$0	\$128,600
EPS-S EMSSANAR	3	\$142,600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$142,600	1	\$200	\$0	\$142,800	\$0	0	\$0	\$0	\$142,800	\$0	\$0	\$142,800
MIN001 - ADRES	1	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70,100	1	\$100	\$0	\$70,200	\$0	0	\$0	\$0	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜACIÖN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	22	\$2,749,700	0	\$0	\$0	\$2,749,700	1	\$2,000	\$2,751,700	0	\$0	\$27,517	\$2,751,700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFAMILIAR DEL HUILA		10		\$588,900	
CCF DE NARINO		12		\$992,100	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$1,582,400

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	4	\$5,754,500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$2,751,700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$1,582,300
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$11,670,900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37276374
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900627079	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21A N031A76	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADSHSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186002882
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12992113	PRIMER APELLIDO	SANTANDER	SEGUNDO APELLIDO	ESPANA
PRIMER NOMBRE	EFRAIN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		\$0		37276374

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411181	59	No	No	No	41	797	5411101	Salario	MUÑOZ MARTINEZ JULIETH MARITHZA	\$1,750,905
CD-1076500127	59	No	No	No	41	797	5411101	Salario	ORTIZ CASTRO ISABELA	\$1,750,905
CC-1085899762	59	No	No	No	52	1	5411101	Salario	OSEJO ARGOTY KAREN NATHALY	\$1,750,905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411181																													0		
CD - 1076500127																													0		
CC - 1085899762			T	2026-04-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411181	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CD - 1076500127	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1085899762	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411181	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CD - 1076500127	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1085899762	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411181	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CD-1076500127	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085899762	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	\$365,700	0	\$0	\$0	\$365,700	1	\$300	\$366,000	0	\$0	\$3,660	\$366,000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
SIN CCF		3		\$0	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$366,000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$366,000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37708202

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-06-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900627079	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21A N031A76	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADSHSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186002882
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12992113	PRIMER APELLIDO	SANTANDER	SEGUNDO APELLIDO	ESPANA
PRIMER NOMBRE	EFRAIN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
29		\$48.656.094		37708202

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085272124	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	AGUIRRE ORTIZ EDISSON WILMER	\$1.750.905
CC-98385092	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	ALMEIDA CAICEDO ROMAN	\$1.750.905
CC-98387352	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	ARAUJO SARASTY MARIO FERNANDO	\$1.750.905
CC-87103202	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	CEPEDA JURADO JORGE HUMBERTO	\$4.230.000
CC-27254110	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	CHAVES JACOME LISBETH CAROLINA	\$1.750.905
CC-1085316789	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	CORAL CHAMORRO DARIO FERNANDO	\$1.750.905
CC-1085275425	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	CUASPUD ANDRADE LUIS ARMANDO	\$1.750.905
CC-12986359	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	CUASPUD JOSA LUIS EDUARDO	\$1.750.905
CC-1004074566	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	CUMBE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO	\$1.750.905
CC-15811099	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	FERNANDEZ MONCAYO GIL ALBERTO	\$1.750.905
CC-1087961373	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	FLOREZ FLOREZ ANDERSON DANIEL	\$1.750.905
CC-79289035	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	FONSECA PERDOMO LUIS ANTONIO	\$4.230.000
CC-1004075176	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	GOMEZ CASTRO CARLOS ANDRES	\$1.750.905
CC-14697094	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	GUERRERO JOJOA CARLOS FLORENCIO	\$1.750.905
CC-1079411345	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	LASSO GUALY ALEJANDRO	\$1.750.905
CC-1085285480	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	MARTINEZ JIMENEZ YESENIA DEL CARMEN	\$1.750.905
CC-87491547	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	MENESES ESTRADA HARO HENRRY	\$1.968.000
CC-1006509015	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	MUÑOZ CORDOBA JAIDER ESTIVEN	\$1.750.905
CC-12975709	01	3	No	No	52	1	5411101	Fijo	NARVAEZ PAZ ALBERTO MARINO	\$1.750.905
CC-79905064	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	OROZCO RAMIREZ LUIS ALEXANDER	\$1.750.905
CC-1086328152	01	No	No	No	52	885	5411101	Fijo	PUPIALES JOJOA MARCOS EVANGELISTA	\$1.750.905
CC-18518117	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	RAMIREZ LOPEZ JAIRO ANTONIO	\$1.750.905
CC-1079408843	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	RAMIREZ MURCIA DARWIN ALEXIS	\$1.750.905
CC-1079411946	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	SAENZ YEINER AUGUSTO	\$1.750.905
CC-1079409879	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	SALAZAR LEIVA JOHN ANDERSON	\$1.750.905
CC-1079410547	01	No	No	No	41	797	5411101	Fijo	SALAZAR LEIVA WILLIAM ANDRES	\$1.750.905
CC-98391650	01	No	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER BURITICA MARCIAL	\$1.750.905
CC-30713911	01	1	No	No	52	1	5411101	Fijo	SANTANDER ESPAÑA MAXIMILIANA DEL CARMEN	\$1.750.905
CC-1004075085	01	No	No	No	41	797	4411101	Fijo	TRUJILLO YUCUMA LIBARDO ANDRES	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085272124	X	2026-05-19																											0		
CC - 98385092	X	2026-05-19																											0		
CC - 98387352																													0		
CC - 87103202																													0		
CC - 27254110	X	2026-05-14																											0		
CC - 1085316789																													0		
CC - 1085275425	X	2026-05-21																											0		
CC - 12986359	X	2026-05-21																											0		
CC - 1004074566																													0		
CC - 15811099	X	2026-05-19																											0		
CC - 1087961373																													0		
CC - 79289035																													0		
CC - 1004075176																													0		
CC - 14697094																													0		
CC - 1079411345																													0		
CC - 1085285480																													0		
CC - 87491547																													0		
CC - 1006509015																													0		
CC - 12975709																													0		
CC - 79905064																													0		
CC - 1086328152																													0		
CC - 18518117	X	2026-05-08																											0		
CC - 1079408843			X	2026-05-27																									0		
CC - 1079411946	X	2026-05-05																											0		
CC - 1079409879																													0		
CC - 1079410547																													0		
CC - 98391650																													0		
CC - 30713911																													0		
CC - 1004075085	X	2026-05-05																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085272124	PORVENIR	12	\$700.362	0.1600000	\$112.100	\$0	\$0	\$112.100	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 98385092	PORVENIR	12	\$700.362	0.1600000	\$112.100	\$0	\$0	\$112.100	\$0	\$0	\$0
CC - 98387352	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 87103202	PROTECCION	30	\$4.230.000	0.1600000	\$676.800	\$0	\$0	\$676.800	\$0	\$0	\$0
CC - 27254110	COLPENSIONES	17	\$992.180	0.1600000	\$158.800	\$0	\$0	\$158.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1085316789	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1085275425	PORVENIR	10	\$583.635	0.1600000	\$93.400	\$0	\$0	\$93.400	\$0	\$0	\$0
CC - 12986359	PORVENIR	10	\$583.635	0.1600000	\$93.400	\$0	\$0	\$93.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1004074566	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 15811099	PORVENIR	12	\$700.362	0.1600000	\$112.100	\$0	\$0	\$112.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1087961373	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 79289035	COLPENSIONES	30	\$4.230.000	0.1600000	\$676.800	\$0	\$0	\$676.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1004075176	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 14697094	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1079411345	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1085285480	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 87491547	PROTECCION	30	\$1.968.000	0.1600000	\$314.900	\$0	\$0	\$314.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1006509015	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 12975709	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 79905064	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1086328152	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 18518117	COLPENSIONES	23	\$1.342.361	0.1600000	\$214.800	\$0	\$0	\$214.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1079408843	PORVENIR	27	\$1.575.815	0.1600000	\$252.200	\$0	\$0	\$252.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1079411946	PROTECCION	26	\$1.517.451	0.1600000	\$242.800	\$0	\$0	\$242.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1079409879	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1079410547	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 98391650	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 30713911	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1004075085	COLFONDOS	26	\$1.517.451	0.1600000	\$242.800	\$0	\$0	\$242.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085272124	SANITAS	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$700.362	1	0.0696000	\$48.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 98385092	NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$700.362	1	0.0696000	\$48.800
CC - 98387352	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 87103202	SANITAS	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.230.00 0	1	0.0696000	\$294.500
CC - 27254110	NUEVA E.P.S. S.A.	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$992.180	1	0.0696000	\$69.100
CC - 1085316789	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1085275425	EPS-S EMSSANAR	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$583.635	1	0.0696000	\$40.700
CC - 12986359	EPS-S EMSSANAR	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$583.635	1	0.0696000	\$40.700
CC - 1004074566	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 15811099	NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$700.362	1	0.0696000	\$48.800
CC - 1087961373	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 79289035	SANITAS	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.230.00 0	1	0.0696000	\$294.500
CC - 1004075176	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 14697094	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1079411345	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1085285480	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 87491547	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.968.00 0	1	0.0696000	\$137.000
CC - 1006509015	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 12975709	EPS-S EMSSANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 79905064	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1086328152	EPS-S EMSSANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18518117	EPS SURA	23	\$1.342.36 1	0.0400000	\$53.700	\$0	0	\$0	0	\$0	23	\$1.342.36 1	1	0.0696000	\$93.500
CC - 1079408843	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$1.575.81 5	0.0400000	\$63.100	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$1.575.81 5	1	0.0696000	\$109.700
CC - 1079411946	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.517.45 1	1	0.0696000	\$105.700
CC - 1079409879	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1079410547	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 98391650	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 30713911	MIN001 - ADRES	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1004075085	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.517.45 1	1	0.0696000	\$105.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085272124	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-98385092	CCF DE NARINO	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-98387352	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87103202	CCF DE NARINO	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-27254110	COMFAMILIAR DEL HUILA	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085316789	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085275425	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12986359	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004074566	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-15811099	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$700.362	0.0400000	\$28.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087961373	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79289035	CCF DE NARINO	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004075176	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-14697094	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079411345	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085285480	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-87491547	CCF DE NARINO	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006509015	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12975709	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79905064	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1086328152	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-18518117	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	\$1.342.36 1	0.0400000	\$53.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079408843	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	\$1.575.81 5	0.0400000	\$63.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079411946	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079409879	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079410547	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-98391650	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-30713911	CCF DE NARINO	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004075085	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	5	\$1.794.900	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$5.300	\$0	\$0	\$1.800.200
COLPENSIONES	3	\$1.050.400	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$3.100	\$0	\$0	\$1.053.500
COLFONDOS	1	\$242.800	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$800	\$0	\$0	\$243.600
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	18	\$4.137.700	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$12.200	\$0	\$0	\$4.149.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	8	\$717.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$717.000	4	\$2.100	\$0	\$719.100	\$0	0	\$0	\$0	\$719.100	\$0	\$0	\$719.100
EPS SURA	1	\$53.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$53.700	4	\$200	\$0	\$53.900	\$0	0	\$0	\$0	\$53.900	\$0	\$0	\$53.900
NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$719.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$719.100	4	\$2.200	\$0	\$721.300	\$0	0	\$0	\$0	\$721.300	\$0	\$0	\$721.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$200.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$200.900	4	\$600	\$0	\$201.500	\$0	0	\$0	\$0	\$201.500	\$0	\$0	\$201.500
EPS-S EMSSANAR	4	\$187.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$187.000	4	\$600	\$0	\$187.600	\$0	0	\$0	\$0	\$187.600	\$0	\$0	\$187.600
MIN001 - ADRES	1	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.100	4	\$300	\$0	\$70.400	\$0	0	\$0	\$0	\$70.400	\$0	\$0	\$70.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	29	\$3.387.900	0	\$0	\$0	\$3.387.900	4	\$10.000	\$3.397.900	0	\$0	\$33.979	\$3.397.900	

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	16	\$871.600	4	\$2.600	\$874.200
CCF DE NARINO	13	\$1.076.200	4	\$3.200	\$1.079.400
SENA	0	\$0	4	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	4	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	4	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	4	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$1.953.800
PENSIONES	5	\$7.247.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$3.397.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$1.953.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$14.552.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37475989

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-06-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900627079	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 21A N031A76	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADSHSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186002882
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12992113	PRIMER APELLIDO	SANTANDER	SEGUNDO APELLIDO	ESPANA
PRIMER NOMBRE	EFRAIN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$0		37475989

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411181	59	No	No	No	41	797	5411101	Salario	MUÑOZ MARTINEZ JULIETH MARITHZA	\$1.750.905
CD-1076500127	59	No	No	No	41	797	5411101	Salario	ORTIZ CASTRO ISABELA	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411181																													0		
CD - 1076500127																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411181	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CD - 1076500127	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1079411181	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900	
CD - 1076500127	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900	

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411181	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CD-1076500127	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	2	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$243.800	0	\$0	\$0	\$243.800	4	\$800	\$244.600	0	\$0	\$2.446	\$244.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
SIN CCF		2		\$0	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$244.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$244.600

CONTRATO DE OBRA 2038 DE 2025

**“Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional,
priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)” – Tesalia, Huila”**

INFORME DE OBRA MENSUAL No.3

Periodo:

12 de abril al 11 de mayo de 2026

CONSTRUCTORA SH SAS.

Tesalia, 11 de mayo de 2026

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
Generalidades	4
Descripción general del contrato de obra	4
Objeto del Contrato	5
Localización	6
Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos:	7
Clima	8
Personal de obra	8
1.7,1 Control de Personal del Constructor	8
ASPECTO ADMINISTRATIVO	9
Actas Contractuales	9
Acta de Suspensión	9
Acta de Reinicio	9
Otras Actas	9
Actualización de Pólizas	9
Balance financiero del contrato obra.	10
Informe sobre el manejo del anticipo y anexos.	11
Avance Programado VS Ejecutado "Financiero y Físico"	11
ASPECTO TÉCNICO	12
Cronograma detallado del contrato, aprobado por la interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.	12
Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría. (INCLUYE PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN)	13
Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma contractual.	13
Control de Planes de Gestión	14
Control de Calidad	14
Plan Manejo Ambiental	14
Plan de SGSST	14
3.5 Avance Físico de Obra.	15
Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo.	15

Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo.	16
Certificados de calibración de equipos de inspección, medición y ensayos.	16
Descripción de obras complementarias.	16
ASPECTO PRESUPUESTAL.....	16
Acta de Pago Parcial y Balance Presupuestal	16
Informe descriptivo	17
JORNADA LABORAL.....	19
Copia de bitácora	20
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	20
○ CONCLUSIONES.....	24

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información contractual de Contratista de obra	9
Tabla 2. Personal del contrato de obra	10
Tabla 3. Personal del contrato de obra y dedicación	10
Tabla 4. Información vigencia póliza No 41-44-101299244.....	12
Tabla 5. Información vigencia póliza No 41-40-101058798.....	12
Tabla 6. Balance financiero contrato de obra -.....	13
Tabla 7. Manejo anticipo	13
Tabla 8. Avance de tiempo y financiero del contrato,	14
Tabla 9. Resumen del Seguimiento a cronograma.....	16
Tabla 10. Seguimiento a cronograma y ejecución de obra.....	17
Tabla 11. Control ejecución físico	21
Tabla 12. Cantidades ejecutadas parciales a noviembre y totales.....	22
Tabla 13. Jornada de trabajo implementada.....	23

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Generalidades

Se suscribe el **CONTRATO DE OBRA No. 2038-2025**, entre el **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**, y la **CONSTRUCTORA SH SAS.**, que tiene como objeto “**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)**” – Tesalia, Huila”. Para este periodo se presenta el Informe técnico No. 3, que corresponde del 12 de abril al 11 de mayo de 2026, el cual se elabora de acuerdo con lo estipulado en las obligaciones del contrato de Obra.

Descripción general del contrato de obra

El proyecto descrito en el presente informe tiene como objetivo la construcción de las actividades necesarias para la puesta en operación del proyecto (lote 3) – construcción centro cultural de Tesalia- Huila. Las intervenciones planificadas contemplan preliminares, movimiento de tierras, cimentación, refuerzo, estructuras en concreto, estructura metálica y madera, redes hidráulicas, sanitarias, aguas de recolección, instalaciones eléctricas e iluminación, redes especiales, mampostería, cubiertas y cielo rasos, pañetes, pisos y enchapes, carpintería en madera, carpintería metálica, cerraduras, dotación de baños, griferías y accesorios, pinturas, vidrios y espejos, equipos y otros, obras exteriores, señalización, aislamiento acústico, aseo.

El presupuesto para la ejecución del proyecto contempla los capítulos que se detallan a continuación.

- 1.0 actividades preliminares, desmontes y demoliciones.
- 2.0 movimiento de tierras.
- 3.0 cimentación.
- 4.0 refuerzo.
- 5.0 estructuras en concreto.
- 6.0 estructura metálica y madera.
- 7.0 redes hidráulicas, sanitarias, aguas de recolección.

- 8.0 instalaciones eléctricas e iluminación.
- 9.0 redes especiales.
- 10. mampostería.
- 11. cubiertas y cielos rasos.
- 12. pañetes.
- 13. pisos y enchapes
- 14. carpintería en madera.
- 15. carpintería metálica.
- 16. cerraduras.
- 17. dotación de baños, griferías y accesorios
- 18. pinturas.
- 19. vidrios y espejos.
- 20. equipos y otros.
- 21. obras exteriores.
- 22. señalización
- 23. aislamiento acústico.
- 24 aseo.

En este sentido, el proyecto contempla la construcción de:

- Sala de danzas
- Sala de música
- Baños discapacitados
- Baño niños
- Bodega (2)
- Cuarto eléctrico
- Sala de música
- Ensayo individual (2)
- Cocineta
- Corredor
- Anden perimetral
- Jardin exterior
- Jardín interior
- Torre de tanques de abastecimiento

Objeto del Contrato

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL - (LOTE 3) – CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE TESALIA- HUILA.”

Localización

1.4.1 Localización general

El municipio de Tesalia se encuentra ubicado al occidente de la capital del departamento del Huila y al suroccidente de Colombia, a una distancia aproximada de 110 km de Neiva. Geográficamente, se localiza a los 2°29'05" de latitud norte y 75°43'48" de longitud oeste, con una extensión territorial cercana a 373,68 km². El territorio municipal presenta una altitud de 830 m s. n. m.,. La temperatura media anual se sitúa entre 24 °C y 26 °C; durante el día, las temperaturas máximas oscilan entre 29 °C y 33 °C, mientras que en horas de la madrugada las mínimas se registran entre 20 °C y 25 °C. Tesalia fue fundada en 1775 y establecida como municipio mediante la Ordenanza Departamental N.º 26 de 1912. Se encuentra asentada sobre las estribaciones de la Cordillera Central, y su territorio forma parte de los valles de los ríos Páez y Magdalena. Administrativamente, integra la región Suboccidente del departamento del Huila. De acuerdo con las proyecciones del DANE para el año 2019, cuenta con una población aproximada de 9.365 habitantes. Su economía se basa principalmente en la ganadería, la producción agrícola y la explotación de recursos mineros e hidrocarburos (petróleo).



Ilustración 1. Ubicación Municipio de Tesalia en el departamento del Huila (Fuente, Cartografía Wikipedia)

1.4.2 Localización específica del proyecto.

El proyecto se localiza en la cabecera municipal de Tesalia, ubicado como se detalla:

- **Ubicación Específica:** Se sitúa en el núcleo urbano del municipio de Tesalia, departamento del Huila. Dirección del predio urbano ubicado en la Carrera 7 No. 3 - 20, Barrio El Centro.
- **Coordenadas Geográficas:** De acuerdo con la descripción técnica del proyecto y los datos de ordenamiento territorial:
Latitud: 2° 29' 13" N (aproximada para la zona urbana de Tesalia).
Longitud: 75° 44' 34" O (aproximada para la zona urbana de Tesalia).

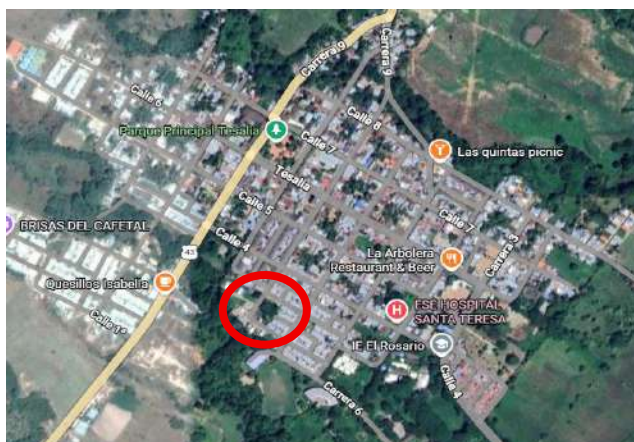


Ilustración 2. Tesalia, carrera 7 con calle 3. Fuente: Google Earth

Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos:

CONTRATO DE OBRA	
No:	2038 de 2025.
Nombre:	"Construcción de infraestructuras culturales a nivel nacional, priorizadas por el gobierno nacional - (Lote 3) – Construcción Centro Cultural De Tesalia- Huila."
Contratista:	CONSTRUCTORA SH SAS.
Plazo Inicial:	5 meses
NIT:	900.627.079-8
Representante Legal	EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA
Fecha De Iniciación:	12 de febrero de 2026
Fecha finalización inicial:	11 de julio de 2026
Valor Inicial:	\$ 1.398.019.370,00
Valor Anticipo:	\$ 221.000.000

Tabla 1. Información contractual del contratista.

Clima

En cuanto al comportamiento climático registrado entre el 12 de abril y el 11 de mayo, el clima fue muy variado presentándose lluvias fuertes en gran porcentaje, lluvias aisladas y tiempo seco en algunos días, sin embargo, las temperaturas fueron altas oscilando entre 27° hasta 32° Centígrados.

Personal de obra

1.7,1 Control de Personal del Constructor

A continuación, se relaciona el personal profesional dispuesto por la CONSTRUCTORA SH S.A.S., tanto en campo como en oficina, para la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato de Obra No. 2038 de 2025, cuyo objeto es la construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila. Por otra parte, el personal de mano de obra no calificada se encuentra reportado y detallado en el Informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). y a medida que las obras lo requieran, se involucrará el personal necesario según su especialidad.

personal profesional contrato de obra	
nombre	cargo
Lisbeth Carolina Chaves Jácome	Director de Obra
Jorge Cepeda	Coordinador del Proyecto
Luis Antonio Fonseca	Residente de Obra
Julieth Maritza Muñoz Martínez	Auxiliar técnico en seguridad y salud en el trabajo
Isabela Ortiz Castro	Auxiliar trabajadora social

Tabla 2. Personal del contrato de obra Elaboración propia

A1. PERSONAL CON DEDICACIÓN FIJA (Por la duración del proyecto)		
Director de Obra	1	30%
Residente de Obra	1	100%
Profesional social	1	25%
Especialista Hidrosanitario	1	25%
Especialista Geotécnico	1	25%
Especialista estructural	1	25%
Especialista eléctrico de iluminación y electrónico	1	25%
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente	1	50%

Tabla 3. Personal del contrato obra y dedicación.

ASPECTO ADMINISTRATIVO

Actas Contractuales

- Acta de inicio al Contrato de Obra del 12 de febrero de 2026.

Acta de Suspensión

- Para el período que comprende este informe, no se suscribe el acta indica

Acta de Reinicio

- Para el período que comprende este informe, no se suscribe el acta indicada.

Otras Actas

Para el período comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo de 2026, se han realizado actas de comité semanal, según como se ha realizado cada una de las reuniones, donde se cuenta con la participación de todas las partes Entidad, Contratista de obra e Interventoría, las cuales se detallan a continuación:

- Acta de Reunión No. 8. – 16/04/2026.
- Acta de Reunión No. 9. – 23/04/2026
- Acta de Reunión No.10. – 30/04/2026
- Acta de Reunión No.11 – 07/05/2026

Actualización de Pólizas

En las siguientes tablas se presentan los datos correspondientes a las pólizas actualizadas con ocasión de la suscripción del contrato. No obstante, con corte al mes de febrero, aún no se cuenta con las pólizas actualizadas posteriores a la suscripción del Acta de Inicio de Obra No. 2038 de 2025, las cuales se encuentran pendientes de entrega.

Pólizas y Garantías Contrato de Obra No. 41-44- 101301105 (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)

- Póliza de seguro de cumplimiento estatal No. 41-44- 101301105 Anexo 1 y 2.

TIPO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	04/03/2026	12/02/2026	13/01/2027	\$279,603,874.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/03/2026	12/02/2026	13/01/2027	\$221,000,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 69,900,968.50
Estabilidad y calidad de la obra	04/03/2026	Si ampara 5 años	\$279,603,874.00	\$279,603,874.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/03/2026	Si ampara 5 años	\$279,603,874.00	\$279,603,874.00

Tabla 4. Información vigencia póliza No 41-44-101301105

Pólizas y Garantías Contrato de Obra No. 41-40-101058798 (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 41-40-101058798 Anexo 1 y 2.

TIPO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 284.700.000,00

Tabla 5. Información vigencia póliza No 41-40-101058798

Balance financiero del contrato obra.

Hasta la fecha de cierre de este informe No.3 comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo de 2026, se tiene que no se ha realizado trámite para acta parcial.

CONTRATO DE OBRA 2038 - 2025	
	Valor Total del Contrato:
	\$ 1.398.019.370,00
ACTAS PRESENTADAS FASE DE OBRA	
ANTICIPO CONTRATISTA	\$221.000.000,00
Amortización del anticipo	\$0
Pago parcial No .	\$ 0
SALDO	\$ 1.398.019.370,00

Tabla 6. Balance financiero contrato de obra -.

Informe sobre el manejo del anticipo y anexos.

El contrato de obra establece pago de anticipo al contratista por el 15.81% del valor total, valorado en \$ 221.000.000,00 que corresponde a lo presentado en el plan de inversión V1 que el contratista presento a Interventoría para aprobación:

OBRA		
CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS (\$)
valor anticipo:	20,00%	\$ 221.000.000,00
valor propuesta:	100,00%	\$ 1.398.019.370,00
ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
Compra de materiales	72%	\$ 159.787.240,00
Pgos, salarios y jornales	23%	\$ 50.025.139,00
Compra y alquiler de equipo y herramientas	3%	\$ 7.429.731,00
Transportes	2%	\$ 3.757.890,00

Tabla 7. Manejo anticipo

A la fecha del presente informe, se registra que el día 24 de marzo fue efectuado el pago correspondiente al anticipo al contratista de obra, el cual fue consignado a la fiducia, (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA), conforme a lo establecido en las condiciones contractuales. A la fecha nos encontramos adelantando la consolidación de la documentación de los soportes correspondientes a las órdenes de operación.

Avance Programado VS Ejecutado “Financiero y Físico”

	Inicio	Fecha de corte	Avance Financiero
Programado	12/02/2026	11/05/2026	15.39%
Ejecutado	12/02/2026	11/05/2026	9.15%

Tabla 8. Avance de tiempo y financiero del contrato,

Durante el periodo comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo de 2026, se ha realizado el seguimiento de las actividades, de acuerdo con la programación establecida para el contrato de obra; teniendo en cuenta lo ejecutado a corte de este informe se presenta un avance financiero \$ 127.885.150,00 equivalente al 9,15% de ejecución de las actividades pactadas, versus el avance programado del \$ 215.146.296 equivalente a 15,39%; teniendo a cierre un porcentaje de atraso del - 6,24%.

ASPECTO TÉCNICO

Cronograma detallado del contrato, aprobado por la interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.

Conforme a lo acordado en la mesa de trabajo realizada el día 9 de marzo de 2026, con la participación de las partes involucradas en el proyecto, se deja constancia de que, aunque el Acta de Inicio del Contrato fue suscrita el 12 de febrero de 2026, durante la etapa inicial de ejecución se presentaron situaciones ajenas al contratista que incidieron en el desarrollo de las actividades programadas, entre ellas la disponibilidad efectiva del lote para el inicio de las obras, condición necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos en el cronograma.

En atención a las condiciones presentadas durante la etapa inicial del proyecto, se realizó el ajuste correspondiente a la programación de obra, manteniendo como fecha de inicio el 12 de febrero de 2026 y como fecha de terminación el 11 de julio de 2026. Esta actualización fue estructurada de manera que permitiera reprogramar las actividades afectadas, optimizar la secuencia constructiva y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos.

A corte del 11 de mayo de 2026, el avance de obra es el siguiente:

- (%) Programado acumulado 15,39%
- (%) Ejecutado acumulado: 9,15%.
- (%) Diferencia entre ejecutado y programado: -6,24 %

En la siguiente tabla se detalla el resumen consolidado por semanas de lo que se ha ido presentando para este primer periodo:

	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13
	19- abril	26- abril	3- mayo	10- mayo
Programación semanal	1,47%	2,40%	4,12%	3,83%
Ejecución semanal	1,40%	1,20%	1,12%	1,62%
Programación acumulada	5,04%	7,44%	11,56%	15,39%
Ejecución acumulada	4,87%	6,07%	7,19%	9,15%
Avance	-0,17%	-1,37%	-4,37%	-6,24%

Tabla 9. Resumen del Seguimiento a cronograma

Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría. (INCLUYE PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN)

Para el periodo objeto del presente informe comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo de 2026, se reporta un atraso del -6,24 % en la ejecución de las actividades de la obra, de acuerdo con la programación.

Si bien durante el período evaluado se evidenció una mejora en el rendimiento de las actividades ejecutadas, este pudo haber sido superior. Tras el análisis de la ejecución del proyecto, se identificaron diversos factores que limitaron el alcance de un mayor avance, los cuales se relacionan a continuación:

- Las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por precipitaciones de alta intensidad, generaron acumulación de agua y sedimentos en el área de intervención, requiriendo actividades de evacuación y adecuación del terreno, lo que incidió en la ejecución normal de las actividades programadas.
- Durante la ejecución de las excavaciones se evidenció la presencia de rocas y elementos de concreto enterrados no contemplados inicialmente, lo que afectó el rendimiento de las actividades y requirió labores adicionales para su remoción.
-

Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma contractual.

En el presente informe comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo, se reporta que las actividades ejecutadas indican una diferencia entre actividades ejecutadas y actividades programadas positivas del -6,24%.

SEMANA No.		ACUMULADO FINANCIERO	
		PROGR (%)	EJEC (%)
10	Abril 13 – abril 19	5,04%	4,87%
11	Abril 20 – abril 26	7,44%	6,07%
12	Abril 27 – mayo 3	11,56%	7,19%
13	Mayo 4 – mayo 10	15,39%	9,15%

Tabla 10. Seguimiento a cronograma y ejecución de obra.

Control de Planes de Gestión

Control de Calidad

Durante el periodo se realizó pruebas slump y cilindros, se complementa con verificaciones visuales de cada una de las actividades realizadas de manera coordinada con interventoría.

Plan Manejo Ambiental

El contratista implementa el Plan de Manejo Ambiental, destacándose:

- Manejo adecuado de residuos de construcción.
- Control de emisiones de polvo mediante riego periódico.
- Disposición de escombros en sitio autorizado.

No se presentaron afectaciones ambientales durante el periodo.
(ver anexo adjunto)

Plan de SGSST

Durante el periodo se contó con un promedio de 13 trabajadores en obra.
Actividades realizadas:

- Inducción de seguridad a personal nuevo.
- Charlas diarias.
- Supervisión del uso de elementos de protección personal (EPP).
- Control de equipos y maquinaria.
- Gestión y control documental de personal

Accidentes laborales:

No se presentó ningún tipo de accidente durante la realización de las labores diarias.
(ver anexo adjunto)

3.5 Avance Físico de Obra.

Durante el mes de abril se ejecutaron las siguientes actividades:

Fundiciones

- Se fundieron solado de limpieza con concreto $f'c = 2000$ psi, se realizó en los ejes D entre ejes 5 a 8, eje E entre ejes 5 a 8, eje F entre ejes 5 a 8, ejes 5 entre ejes D y F, eje 6 entre ejes D y F, eje 7 entre ejes D y F, eje 8 entre ejes D y F.
- Se fundieron la viga de cimentación con concreto $f'c = 3000$ psi, del salón de música en el nivel $-0.95m$ en los ejes E y F entre ejes 5-6-7-8 y en los ejes 5, 6, 7, 8 entre E y F de igual manera las vigas de cimentación nivel $+ 0$ los ejes D, E y F entre ejes 5-6-7-8 y en los ejes 5, 6, 7, 8 entre D- E y F.
- Se fundieron la viga de cimentación con concreto $f'c = 3000$ psi, del salón de danzas nivel $-0.25m$ en los ejes A, B, y C entre ejes 1-2-3-4-5
- Fundición de los pedestales de las columnas en el salón de música en los ejes D, E, F entre ejes 5, 6, 7, 8.

Manejo de aceros

- Se realizó el corte, figurado y armado de hierros para las vigas de cimentación del salón de música y salón de danzas.

Rellenos

- Se realizó el relleno compactado con material producto de la excavación en el salón de música.

Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo.

Durante el período comprendido entre el 12 de abril y el 11 de mayo, se realizó la toma de muestras de concreto a las vigas de cimentación y a los pedestales de las columnas en cumplimiento de los procedimientos de control de calidad establecidos para el proyecto y de las especificaciones técnicas aplicables. Las muestras fueron obtenidas y debidamente preservadas para la ejecución de los ensayos correspondientes.

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra en trámite la realización y/o consolidación de los ensayos de laboratorio, cuyos resultados permitirán verificar el cumplimiento de la resistencia a la compresión especificada para este elemento, correspondiente a 3.000 psi. Una vez se cuente con los resultados emitidos por el laboratorio, estos serán incorporados al expediente de calidad del proyecto y presentados dentro de los informes correspondientes.

Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo.

Se hizo entrega de los diseños de mezcla de concretos de 2000psi, 250psi, 3000psi y 4000psi, caracterización de agregados, la cual fue entregada vía correo electrónico del 12 de marzo y 8 de abril de 2026

Certificados de calibración de equipos de inspección, medición y ensayos.

Se hizo entrega de los certificados de calibración de los equipos de topografía, correspondientes en el mes de febrero, en este mes no se han utilizados equipos.

Descripción de obras complementarias.

Durante el periodo comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo, no se tienen actividades no previstas

ASPECTO PRESUPUESTAL

Acta de Pago Parcial y Balance Presupuestal

Durante el período comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo, no se realizó trámite para Acta de Pago Parcial.

Durante el período objeto del presente informe se elaboró el Acta de Pago Parcial No. 1, mediante la cual el Contratista de Obra, con la verificación de la Interventoría, consolidó las actividades ejecutadas, incluyendo las respectivas memorias de cálculo, soportes técnicos, planos de detalle y registro fotográfico, en cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos para el trámite de pago.

Una vez surtida la revisión correspondiente por parte de la Interventoría, el acta será remitida a la Supervisión para el trámite administrativo y la gestión del pago, el cual estará sujeto a la disponibilidad y giro del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava – Forma de Pago del contrato

Informe descriptivo

De acuerdo con la programación de obra vigente y los términos contractuales.

	INICIO	FIN	AVANCE FÍSICO
Proyectado	12/02/2026	11/07/2026	15,39%
Ejecutado	12/02/2026	11/07/2026	9,15%

Tabla 11. Control ejecución físico

El resumen del desarrollo del proyecto a la fecha es que se ha intervenido los siguientes capítulos: CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES, CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CAPITULO 3: CONCRETOS.

teniendo el avance en las siguientes actividades e ítems del presupuesto contractual:

Avance físico del proyecto a corte del 11 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION	UN D	V. UNIT	CANT. ANTER	CANT. PRESENTE MES	CANT. ACUMUL.	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES							
1.01	Preliminares							
1.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	\$ 17.319,00	98,55	-	98,55	1.706.787,00	85,70%
1.01.03	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	m2	\$ 3.518,00	650,00	-	650,00	2.286.700,00	100,00%
1.01.04	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	\$ 483.820,00	1,00	-	1,00	483.820,00	100,00%
1.01.05	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	\$1.608.877,00	1,00	-	1,00	1.608.877,00	100,00%
Total							\$6.086.184,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS							

2.02	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	\$ 44.122,00	52,41	26,55	78,96	3.483.873,00	80,65%
2.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	\$ 21.408,00	-	23,85	23,85	510.581,00	90,34%
2.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	m3	\$ 66.757,00	-	10,00	10,00	667.570,00	7,35%
Total							\$ 4.662.024,00	
3	CIMENTACIÓN							
3.01	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	\$ 30.976,00	28,04	60,06	88,10	2.729.079,00	89,13%
3.02	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	\$ 330.975,00	17,42	0,22	17,64	5.838.399,00	83,29%
3.05	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO f'c= 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	\$ 767.519,00	5,44	3,05	8,48	6.510.096,00	79,35%
3.08	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO f'c= 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	\$ 808.367,00	-	16,38	16,38	13.242.345,00	71,16%

Total							\$28.319.919,00	
4	REFUERZO							
4,01	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	\$ 7.548,00	2.339,62	5.170,00	7.509,62	56.682.591,00	44,75%
Total							\$56.682.591,00	
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
5.11	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	\$ 976.878,00		1,69	1,69	1.648.482,00	9,96%
Total							\$1.648.482,00	
	COSTOS DIRECTOS						\$97.399.200,00	9,15%
	ADMINISTRACION						\$24.203.701,00	9,15%
	IMPREVISTOS						\$486.996,00	9,15%
	UTILIDAD						\$4.869.960,00	9,15%
	IVA SOBRE UTILIDAD						\$925.292,00	9,15%
	TOTAL A.I.U. 30,35%						\$30.485.949,00	9,15%
	TOTAL, COSTO DIRECTO + AIU						\$127.885.149,00	

Tabla 12. Cantidades ejecutadas parciales a febrero

JORNADA LABORAL.

La jornada de trabajo de obra establecida para realización de las actividades se relacionan a continuación.

JORNADAS DE TRABAJO DEL PROYECTO						
Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Jornada	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 11:00 AM

Tabla 13. Jornada de trabajo implementada.

PERSONAL Y MAQUINARIA EN OBRA

Personal

Cargo	Cantidad
Arquitecto residente	1
Maestro de obra	1
Oficial	1
Ayudantes	4
Profesional siso y social	2

Maquinaria

Equipo	Cantidad
Mezcladoras de concreto	1
Vibradores de concreto	1
Herramienta menor	varios

Copia de bitácora

Se lleva el libro de bitácora consignando todos los aspectos relevantes que se presentan día a día y con la revisión directa de la ingeniera residente de interventoría. (ver anexo)

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Para el período comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo, se relaciona el registro fotográfico correspondiente.

CONTRATO DE OBRA 2038 DE 2025

**“Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional,
priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)” – Tesalia, Huila”**

INFORME DE OBRA MENSUAL No.4

Periodo:

12 de mayo al 11 de junio de 2026

CONSTRUCTORA SH SAS.

Tesalia, 11 de junio de 2026

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
Generalidades	4
Descripción general del contrato de obra	4
Objeto del Contrato	5
Localización	6
Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos:	7
Clima	8
Personal de obra	8
1.7,1 Control de Personal del Constructor	8
ASPECTO ADMINISTRATIVO	9
Actas Contractuales	9
Acta de Suspensión	9
Acta de Reinicio	9
Otras Actas	9
Actualización de Pólizas	9
Balance financiero del contrato obra.	11
Informe sobre el manejo del anticipo y anexos.	11
Avance Programado VS Ejecutado “Financiero y Físico”	14
ASPECTO TÉCNICO	15
Cronograma detallado del contrato, aprobado por la interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.	15
Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría. (INCLUYE PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN)	16
Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma contractual.	16
Control de Planes de Gestión	17
Control de Calidad	17
Plan Manejo Ambiental	17
Plan de SGSST	17
3.5 Avance Físico de Obra.	17
Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo.	18

Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo.	19
Certificados de calibración de equipos de inspección, medición y ensayos.	19
Descripción de obras complementarias.	19
ASPECTO PRESUPUESTAL.....	19
Acta de Pago Parcial y Balance Presupuestal	19
Informe descriptivo	20
JORNADA LABORAL.....	23
COPIA DE BITÁCORA	24
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	24
○ CONCLUSIONES.....	34

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información contractual de Contratista de obra	9
Tabla 2. Personal del contrato de obra	10
Tabla 3. Personal del contrato de obra y dedicación	10
Tabla 4. Información vigencia póliza No 41-44-101299244.....	12
Tabla 5. Información vigencia póliza No 41-40-101058798.....	12
Tabla 6. Balance financiero contrato de obra -.....	13
Tabla 7. Manejo anticipo	13
Tabla 8. Avance de tiempo y financiero del contrato,	14
Tabla 9. Resumen del Seguimiento a cronograma.....	16
Tabla 10. Seguimiento a cronograma y ejecución de obra.....	17
Tabla 11. Control ejecución físico	21
Tabla 12. Cantidades ejecutadas parciales a noviembre y totales.....	22
Tabla 13. Jornada de trabajo implementada.....	23

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Generalidades

Se suscribe el **CONTRATO DE OBRA No. 2038-2025**, entre el **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**, y la **CONSTRUCTORA SH SAS.**, que tiene como objeto “**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 3)**” – Tesalia, Huila”. Para este periodo se presenta el Informe técnico No.4, que corresponde del 12 de mayo al 11 de junio de 2026, el cual se elabora de acuerdo con lo estipulado en las obligaciones del contrato de Obra.

Descripción general del contrato de obra

El proyecto descrito en el presente informe tiene como objetivo la construcción de las actividades necesarias para la puesta en operación del proyecto (lote 3) – construcción centro cultural de Tesalia- Huila. Las intervenciones planificadas contemplan preliminares, movimiento de tierras, cimentación, refuerzo, estructuras en concreto, estructura metálica y madera, redes hidráulicas, sanitarias, aguas de recolección, instalaciones eléctricas e iluminación, redes especiales, mampostería, cubiertas y cielo rasos, pañetes, pisos y enchapes, carpintería en madera, carpintería metálica, cerraduras, dotación de baños, griferías y accesorios, pinturas, vidrios y espejos, equipos y otros, obras exteriores, señalización, aislamiento acústico, aseo.

El presupuesto para la ejecución del proyecto contempla los capítulos que se detallan a continuación.

- 1.0 actividades preliminares, desmontes y demoliciones.
- 2.0 movimiento de tierras.
- 3.0 cimentación.
- 4.0 refuerzo.
- 5.0 estructuras en concreto.
- 6.0 estructura metálica y madera.
- 7.0 redes hidráulicas, sanitarias, aguas de recolección.

- 8.0 instalaciones eléctricas e iluminación.
- 9.0 redes especiales.
- 10. mampostería.
- 11. cubiertas y cielos rasos.
- 12. pañetes.
- 13. pisos y enchapes
- 14. carpintería en madera.
- 15. carpintería metálica.
- 16. cerraduras.
- 17. dotación de baños, griferías y accesorios
- 18. pinturas.
- 19. vidrios y espejos.
- 20. equipos y otros.
- 21. obras exteriores.
- 22. señalización
- 23. aislamiento acústico.
- 24 aseo.

En este sentido, el proyecto contempla la construcción de:

- Sala de danzas
- Sala de música
- Baños discapacitados
- Baño niños
- Bodega (2)
- Cuarto eléctrico
- Sala de música
- Ensayo individual (2)
- Cocineta
- Corredor
- Anden perimetral
- Jardin exterior
- Jardín interior
- Torre de tanques de abastecimiento

Objeto del Contrato

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL - (LOTE 3) – CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE TESALIA- HUILA.”

Localización

1.4.1 Localización general

El municipio de Tesalia se encuentra ubicado al occidente de la capital del departamento del Huila y al suroccidente de Colombia, a una distancia aproximada de 110 km de Neiva. Geográficamente, se localiza a los 2°29'05" de latitud norte y 75°43'48" de longitud oeste, con una extensión territorial cercana a 373,68 km². El territorio municipal presenta una altitud de 830 m s. n. m.,. La temperatura media anual se sitúa entre 24 °C y 26 °C; durante el día, las temperaturas máximas oscilan entre 29 °C y 33 °C, mientras que en horas de la madrugada las mínimas se registran entre 20 °C y 25 °C. Tesalia fue fundada en 1775 y establecida como municipio mediante la Ordenanza Departamental N.º 26 de 1912. Se encuentra asentada sobre las estribaciones de la Cordillera Central, y su territorio forma parte de los valles de los ríos Páez y Magdalena. Administrativamente, integra la región Suboccidente del departamento del Huila. De acuerdo con las proyecciones del DANE para el año 2019, cuenta con una población aproximada de 9.365 habitantes. Su economía se basa principalmente en la ganadería, la producción agrícola y la explotación de recursos mineros e hidrocarburos (petróleo).



Ilustración 1. Ubicación Municipio de Tesalia en el departamento del Huila (Fuente, Cartografía Wikipedia)

1.4.2 Localización específica del proyecto.

El proyecto se localiza en la cabecera municipal de Tesalia, ubicado como se detalla:

- **Ubicación Específica:** Se sitúa en el núcleo urbano del municipio de Tesalia, departamento del Huila. Dirección del predio urbano ubicado en la Carrera 7 No. 3 - 20, Barrio El Centro.
- **Coordenadas Geográficas:** De acuerdo con la descripción técnica del proyecto y los datos de ordenamiento territorial:
Latitud: 2° 29' 13" N (aproximada para la zona urbana de Tesalia).
Longitud: 75° 44' 34" O (aproximada para la zona urbana de Tesalia).

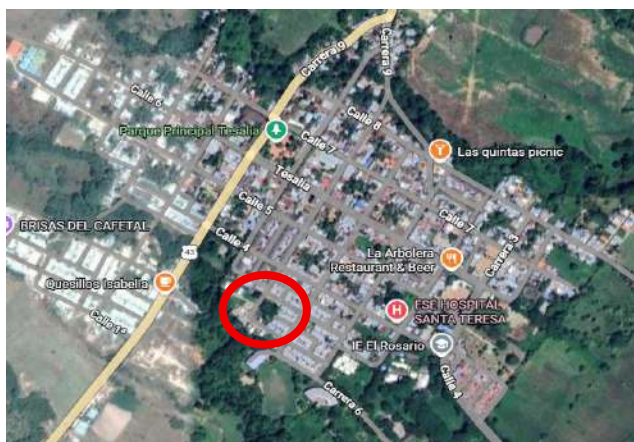


Ilustración 2. Tesalia, carrera 7 con calle 3. Fuente: Google Earth

Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos:

CONTRATO DE OBRA	
No:	2038 de 2025.
Nombre:	"Construcción de infraestructuras culturales a nivel nacional, priorizadas por el gobierno nacional - (Lote 3) – Construcción Centro Cultural De Tesalia- Huila."
Contratista:	CONSTRUCTORA SH SAS.
Plazo Inicial:	5 meses
NIT:	900.627.079-8
Representante Legal	EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA
Fecha De Iniciación:	12 de febrero de 2026
Fecha finalización inicial:	11 de julio de 2026
Valor Inicial:	\$ 1.398.019.370,00
Valor Anticipo:	\$ 221.000.000

Tabla 1. Información contractual del contratista.

Clima

Con el fin de evidenciar las condiciones climáticas presentadas durante el período comprendido entre el 12 de mayo y el 11 de junio, se registraron condiciones climáticas caracterizadas por temperaturas elevadas durante la mayor parte de las jornadas laborales, así como por la ocurrencia de precipitaciones de intensidad moderada y fuerte en días específicos. Estas condiciones meteorológicas incidieron de manera parcial en el desarrollo de algunas actividades constructivas, afectando temporalmente los rendimientos de ejecución y la programación de determinados frentes de trabajo, debido a las restricciones operativas generadas por dichos eventos climáticos.

Personal de obra

1.7,1 Control de Personal del Constructor

A continuación, se relaciona el personal profesional dispuesto por la CONSTRUCTORA SH S.A.S., tanto en campo como en oficina, para la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato de Obra No. 2038 de 2025, cuyo objeto es la construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila. Por otra parte, el personal de mano de obra no calificada se encuentra reportado y detallado en el Informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). y a medida que las obras lo requieran, se involucrará el personal necesario según su especialidad.

personal profesional contrato de obra	
nombre	cargo
Lisbeth Carolina Chaves Jácome	Director de Obra
Jorge Cepeda	Coordinador del Proyecto
Luis Antonio Fonseca	Residente de Obra
Julieth Maritza Muñoz Martínez	Auxiliar técnico en seguridad y salud en el trabajo
Isabela Ortiz Castro	Auxiliar trabajadora social

Tabla 2. Personal del contrato de obra Elaboración propia

A1. PERSONAL CON DEDICACIÓN FIJA (Por la duración del proyecto)		
Director de Obra	1	30%
Residente de Obra	1	100%
Profesional social	1	25%
Especialista Hidrosanitario	1	25%

Especialista Geotécnico	1	25%
Especialista estructural	1	25%
Especialista eléctrico de iluminación y electrónico	1	25%
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente	1	50%

Tabla 3. Personal del contrato obra y dedicación.

ASPECTO ADMINISTRATIVO

Actas Contractuales

- Acta de inicio al Contrato de Obra del 12 de febrero de 2026.

Acta de Suspensión

- Para el período que comprende este informe, no se suscribe el acta indicada.

Acta de Reinicio

- Para el período que comprende este informe, no se suscribe el acta indicada.

Otras Actas

Para el período comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio de 2026, se han realizado actas de comité semanal, según como se ha realizado cada una de las reuniones, donde se cuenta con la participación de todas las partes Entidad, Contratista de obra e Interventoría, las cuales se detallan a continuación:

- Acta de Reunión No. 12. – 14/05/2026.
- Acta de Reunión No. 13. – 21/05/2026.
- Acta de Reunión No. 14. – 28/05/2026.
- Mesa de trabajo revisión reprogramación plan contingencia – 1/06/2026
- Acta de Reunión No. 15. – 4/06/2026.

Actualización de Pólizas

En las siguientes tablas se presentan los datos correspondientes a las pólizas actualizadas con ocasión de la suscripción del Acta de Inicio de Obra No. 2038 de 2025.

Pólizas y Garantías Contrato de Obra No. 41-44- 101301105 (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)

- Póliza de seguro de cumplimiento estatal No. 41-44- 101301105 Anexo 1 y 2.

TIPO	FECHA DE EXPEDICIÓ N	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	04/03/2026	12/02/2026	13/01/2027	\$279,603,874.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/03/2026	12/02/2026	13/01/2027	\$221,000,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 69,900,968.50
Estabilidad y calidad de la obra	04/03/2026	SI AMPARA 5 AÑOS	\$279,603,874.00	\$279,603,874.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/03/2026	SI AMPARA 5 AÑOS	\$279,603,874.00	\$279,603,874.00

Tabla 4. Información vigencia póliza No 41-44-101301105

Pólizas y Garantías Contrato de Obra No. 41-40-101058798 (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 41-40-101058798 Anexo 1 y 2.

TIPO	FECHA DE EXPEDICIÓ N	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	04/03/2026	12/02/2026	13/07/2029	\$ 284.700.000,00

Tabla 5. Información vigencia póliza No 41-40-101058798

Balance financiero del contrato obra.

Hasta la fecha de cierre de este informe No. 4 comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio de 2026, se tiene que se envió el día 27 de mayo de 2026, mediante comunicado No. SH-MC-26-073, la presentación del Acta Parcial de Obra No. 1, junto con sus respectivos soportes y la correspondiente amortización, para revisión por parte de la Interventoría.

CONTRATO DE OBRA 2038 - 2025	
	Valor Total del Contrato:
	\$ 1.398.019.370,00
ACTAS PRESENTADAS FASE DE OBRA	
Anticipo contratista	\$221.000.000,00
Amortización del anticipo	\$16.501.682,00
Pago parcial No 1 (en trámite).	\$104.387.650,85
VALOR TOTAL PAGOS (incluye AIU) – Según Acumulado en Acta parcial No. 1	\$104.387.650,85
SALDO	\$1.293.631.719,15

Tabla 6. Balance financiero contrato de obra

Informe sobre el manejo del anticipo y anexos.

El contrato de obra establece pago de anticipo al contratista por el 15.81% del valor total, valorado en \$ 221.000.000,00 que corresponde a lo presentado en el plan de inversión V1 que el contratista presento a Interventoría para aprobación:

OBRA		
CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS (\$)
valor anticipo:	20,00%	\$ 221.000.000,00
valor propuesta:	100,00%	\$ 1.398.019.370,00
ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
Compra de materiales	72%	\$ 159.787.240,00
Pagos, salarios y jornales	23%	\$ 50.025.139,00
Compra y alquiler de equipo y herramientas	3%	\$ 7.429.731,00
Transportes	2%	\$ 3.757.890,00
CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS (\$)
valor pago anticipado:	N.A.	N.A.
porcentaje ofertado:	N.A.	N.A.
valor contractual Interventoría:	N.A.	N.A.
valor contractual obra:	N.A.	N.A.
Nota: A la fecha la totalidad de los rubros asignados para el uso del anticipo, fueron aprobados por la interventoría para su respectivo trámite ante la fiduciaria		

Tabla 7. Manejo anticip

A la fecha del presente informe, se registra que el día 24 de marzo fue efectuado el pago correspondiente al anticipo al contratista de obra, el cual fue consignado a la fiducia, (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA), conforme a lo establecido en las condiciones contractuales. Así mismo es de indicar que el 29 de mayo fue pagado el valor del anticipo correspondiente a las órdenes de operación presentadas, tal como se detalla a continuación:

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No. 2					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 08-05-2026		
P.A. 18382			PAGADO A: CONSTRUCTORA SH SAS		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	N.I.T: 900627079		
			NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	COMPRA DE MATERIALES	FERRETERIA G Y J	T124 62430797	24/03/26	\$35.281.767
		FERRETERIA G Y J	T124 62431151	22/04/26	\$19.285.949
		FERRETERIA G Y J	T124 62431293	22/04/26	\$6.538.384
		FERRETERIA G Y J	T124 62431324	27/04/26	\$210.916
		CEMENTO ARGOS SA	1040577240	07/03/26	\$3.092.762
		CEMENTO ARGOS SA	1040596597	01/04/26	\$12.182.668
		MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS	48900	11/03/2026	\$1.314.367
		MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS	49073	27/03/2026	\$817.233
		MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS	49103	29/03/2026	\$535.286
		MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS	49285	16/04/2026	\$1.220.500
		MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS	49438	29/04/2026	\$1.437.746
		María Paula Esquivel Vargas - SERVILECTRICO MONACO	FPOS-641	28/02/26	\$454.000

		María Paula Esquivel Vargas - SERVILECTRICO MONACO	FPOS-645	04/03/26	\$422.001
		María Paula Esquivel Vargas - SERVILECTRICO MONACO	FPOS-646	05/03/26	\$316.500
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE691	20/03/2026	\$3.407.000
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE699	27/03/2026	\$139.400
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE700	28/03/2026	\$36.900
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE714	9/04/2026	\$75.000
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE715	10/04/2026	\$124.900
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE719	13/04/2026	\$375.000
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE720	13/04/2026	\$85.000
		DUVER MARTINEZ CASTILLO CEDECON EL CENTRO DEL CONSTRUCTOR	FE723	17/04/2026	\$417.500
		FERRETERIA LA NOVENA DE TESALIA	FE4480	12/02/26	\$55.500

		FERRETERIA LA NOVENA DE TESALIA	FE4500	19/02/26	\$29.600
		FERRETERIA LA NOVENA DE TESALIA	FE4631	30/03/26	\$14.000
		FERRETERIA LA NOVENA DE TESALIA	FE4634	31/03/26	\$43.000
		FERRETERIA LA NOVENA DE TESALIA	FE4635	31/03/26	\$290.000
		FERRETERIA LA NOVENA DE TESALIA	FE4666	10/04/26	\$187.500
		PROTECTO SAS	FED 6727	27/03/26	\$875.191
		PROTECTO SAS	FED 6839	18/04/26	\$570.800
TOTAL, ITEM 1					\$ 89.836.370
2	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	JESUS ALBERTO VALENZUELA ZULETA	ACTA MANO OBRA 1	11/03/26	\$3.448.885
		NOMINAS 1	NOMINAS 1	28/02/26	\$2.260.724
		NOMINAS 2	NOMINAS 2	31/03/26	\$6.122.636
		NOMINAS 3	NOMINAS 3	15/04/26	\$9.779.860
		JUAN PABLO VILLARREAL BELTRAN	ACTA MANO OBRA 1	11/03/26	\$769.231
TOTAL, ITEM 2					\$22.381.336
3	COMPRA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
TOTAL, ITEM 3					\$ -
4	TRANSPORTES	VALENCIA LIZCANO OLMEDO	FE 470	21/03/26	\$3.238.000
		VALENCIA LIZCANO OLMEDO	FE 482	16/04/26	\$519.890
TOTAL, ITEM 4					\$ 3.757.890
VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION					\$115.975.596

Tabla 8. Órdenes de operación presentadas a interventoría

Avance Programado VS Ejecutado “Financiero y Físico”

	Inicio	Fecha de corte	Avance Financiero
Programado	12/02/2026	11/05/2026	46,86%
Ejecutado	12/02/2026	11/05/2026	14,19%

Tabla 9. Avance de tiempo y financiero del contrato

Durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio de 2026, de acuerdo con la programación establecida para el contrato de obra; teniendo en cuenta lo ejecutado a corte de este informe se presenta un avance financiero \$ 198.369.950,15 equivalente al 14,19% de ejecución de las actividades pactadas, versus el avance programado del \$ 655.043.724 equivalente a 46,86%; teniendo a cierre del periodo un porcentaje de atraso del -32,67%.

ASPECTO TÉCNICO

Cronograma detallado del contrato, aprobado por la interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.

Conforme a lo acordado en la mesa de trabajo realizada el día 9 de marzo de 2026, con la participación de las partes involucradas en el proyecto, se deja constancia de que, aunque el Acta de Inicio del Contrato fue suscrita el 12 de febrero de 2026, durante la etapa inicial de ejecución se presentaron situaciones ajenas al contratista que incidieron en el desarrollo de las actividades programadas, entre ellas la disponibilidad efectiva del lote para el inicio de las obras, condición necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos en el cronograma.

En atención a las condiciones presentadas durante la etapa inicial del proyecto, se realizó el ajuste correspondiente a la programación de obra, manteniendo como fecha de inicio el 12 de febrero de 2026 y como fecha de terminación el 11 de julio de 2026. Esta actualización fue estructurada de manera que permitiera reprogramar las actividades afectadas, optimizar la secuencia constructiva y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos.

A corte del 11 de junio de 2026, el avance de obra es el siguiente:

- (%) Programado acumulado 46,86%
- (%) Ejecutado acumulado: 14,19%.
- (%) Diferencia entre ejecutado y programado: -32,67 %

En la siguiente tabla se detalla el resumen consolidado por semanas de lo que se ha ido presentando para este primer periodo:

	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
	17- mayo	24- mayo	31- mayo	7- junio
Programación semanal	5,88%	7,05%	8,60%	9,94%
Ejecución semanal	1,35%	0,88%	1,03%	1,78%
Programación acumulada	21,26%	28,32%	36,92%	46,86%
Ejecución acumulada	10,50%	11,38%	12,41%	14,19%
Avance	-10,76%	-16,94%	-24,51%	-32,67%

Tabla 10. Resumen del Seguimiento a cronograma

Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría. (INCLUYE PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN)

Para el periodo objeto del presente informe comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio de 2026, se reporta un atraso del -32,67 % en la ejecución de las actividades de la obra, de acuerdo con la programación presentada.

Durante el período evaluado se evidenció una mejora en el rendimiento de las actividades ejecutadas y en el avance del proyecto. No obstante, persistieron algunas situaciones que incidieron en el desarrollo de la programación y limitaron la posibilidad de alcanzar un mayor porcentaje de ejecución. A continuación, se presentan los principales factores que influyeron en dicha situación:

- Las altas temperaturas registradas durante el período evaluado afectaron el rendimiento de las labores en campo, al incrementar el nivel de fatiga del personal operativo. En consecuencia, fue necesario implementar pausas de hidratación y recuperación, priorizando la seguridad y salud de los trabajadores, lo que incidió en el ritmo de ejecución de algunas actividades..

Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma contractual.

En el presente informe comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio, se reporta que las actividades ejecutadas indican una diferencia entre actividades ejecutadas y actividades programadas positivas del -32,67%.

SEMANA No.		ACUMULADO FINANCIERO	
		PROGR (%)	EJEC (%)
14	Mayo 11 – mayo 17	21,26%	10,50%
15	Mayo 18 – mayo 24	28,32%	11,38%
16	Mayo 25 – mayo 31	36,92%	12,41%
17	Junio 1 – junio 7	46,86%	14,19%

Tabla 10. Seguimiento a cronograma y ejecución de obra.

Control de Planes de Gestión

Control de Calidad

Durante el periodo se realizó pruebas slump y cilindros, se complementa con verificaciones visuales de cada una de las actividades realizadas de manera coordinada con interventoría.

Plan Manejo Ambiental

El contratista implementa el Plan de Manejo Ambiental, destacándose:

- Manejo adecuado de residuos de construcción.
- Control de emisiones de polvo mediante riego periódico.
- Disposición de escombros en sitio autorizado.

No se presentaron afectaciones ambientales durante el periodo.
(ver anexo adjunto)

Plan de SGSST

Durante el periodo se contó con un promedio de 7 trabajadores en obra.

Actividades realizadas:

- Inducción de seguridad a personal nuevo.
- Charlas diarias.
- Supervisión del uso de elementos de protección personal (EPP).
- Control de equipos y maquinaria.
- Gestión y control documental de personal

Accidentes laborales:

No se presentó ningún tipo de accidente durante la realización de las labores diarias.
(ver anexo adjunto)

3.5 Avance Físico de Obra.

Durante el mes de mayo se ejecutaron las siguientes actividades

Excavaciones

- Se realizaron excavaciones para la construcción del, alcantarillado sanitario y pluvial y la red eléctrica, incluidas las cajas de inspección. De igual manera se excavó para la tubería de la red de agua potable.

Fundiciones

- Se fundieron todas las columnas de los salones de música y danzas de acuerdo con plano de diseño de altura +2.20m.
- Se fundieron las vigas aéreas del salón de música de los ejes D, E, F entre 4,5,6,7,8 y de los ejes 4,5,8 entre D-F
- Se fundieron las viguetas de sobrecimiento en el salón de danzas en los ejes C entre 1-4 eje 1 entre A-C y eje A entre 1-5
- Se ejecutó la fundición de las vigas de borde de la placa de contrapiso para el confinamiento del andén en fachada de la calle 3 y en la zona de acceso principal del proyecto.

Manejo de aceros

- Se continuó con el corte, figurado y armado de hierros para las columnas, vigas aéreas, viga canal para el salón de música y salón de danzas.

Rellenos

- Se realizó el relleno compactado con material producto de la excavación para la instalación de las tuberías del alcantarillado pluvial sanitario y de la red eléctrica.

Cajas de inspección

- Construcción de cajas de inspección del alcantarillado pluvial y sanitario y de la red eléctrica.

Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo.

Durante el período comprendido entre el 12 de mayo y el 11 de junio, se realizó la toma de muestras de concreto a las vigas de cimentación y a los pedestales de las columnas en cumplimiento de los procedimientos de control de calidad establecidos para el proyecto y de las especificaciones técnicas aplicables. Las muestras fueron obtenidas y debidamente preservadas para la ejecución de los ensayos correspondientes.

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra en trámite la realización y/o consolidación de los ensayos de laboratorio, cuyos resultados permitirán verificar el cumplimiento de la resistencia a la compresión especificada para este elemento, correspondiente a 3.000 psi. Una vez se cuente con los resultados emitidos por el

laboratorio, estos serán incorporados al expediente de calidad del proyecto y presentados dentro de los informes correspondientes.

Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo.

Se hizo entrega de los diseños de mezcla de concretos de 2000psi, 250psi, 3000psi y 4000psi, caracterización de agregados, la cual fue entregada vía correo electrónico del 12 de marzo y 8 de abril de 2026

Certificados de calibración de equipos de inspección, medición y ensayos.

Se hizo entrega de los certificados de calibración de los equipos de topografía, correspondientes en el mes de febrero, en este mes no se han utilizados equipos.

Descripción de obras complementarias.

Durante el periodo comprendido entre el 12 de abril al 11 de mayo, no se tienen actividades no previstas

ASPECTO PRESUPUESTAL

Acta de Pago Parcial y Balance Presupuestal

Desde el 30 de abril se realizó trámite para Acta de Pago Parcial, a la fecha no se ha recibido pago de esta.

Durante el período objeto del presente informe se elaboró el Acta de Pago Parcial No. 1, mediante la cual el Contratista de Obra, con la verificación de la Interventoría, consolidó las actividades ejecutadas, incluyendo las respectivas memorias de cálculo, soportes técnicos, planos de detalle y registro fotográfico, en cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos para el trámite de pago.

Una vez surtida la revisión correspondiente por parte de la Interventoría, el acta será remitida a la Supervisión para el trámite administrativo y la gestión del pago, el cual estará sujeto a la disponibilidad y giro del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava – Forma de Pago del contrato.

Informe descriptivo

De acuerdo con la programación de obra vigente y los términos contractuales.

	INICIO	FIN	AVANCE FÍSICO
Proyectado	12/02/2026	11/07/2026	15,39%
Ejecutado	12/02/2026	11/07/2026	9,15%

Tabla 11. Control ejecución físico

El resumen del desarrollo del proyecto a la fecha es que se ha intervenido los siguientes capítulos: CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES, CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS, teniendo el avance en las siguientes actividades e ítems del presupuesto contractual:

Avance físico del proyecto a corte del 11 de mayo de 2026

ITEM	DESCRIPCION	U N D	V. UNIT	CANT. ANTE R.	CANT. PRES ENTE MES	CANT. ACUM UL.	VALOR ACUMULA DO	% AC UM UL AD O
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES							
1,01	Preliminares							
1.01. 01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	\$ 17.319,00	98,55	-	98,55	1.706.787,00	85,70%

1.01.03	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	m 2	\$ 3.518,00	650,00	-	650,00	2.286.700,00	100,00%
1.01.04	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	\$ 483.820,00	1,00	-	1,00	483.820,00	100,00%
1.01.05	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	\$1.608.877,00	1,00	-	1,00	1.608.877,00	100,00%
Total		4					\$6.086.184,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
2.02	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m 3	\$ 44.122,00	52,41	26,55	78,96	3.483.873,00	80,65%
2,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m 3	\$ 21.408,00	-	23,85	23,85	510.581,00	90,34%
2,06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	m 3	\$ 66.757,00	-	10,00	10,00	667.570,00	7,35%
Total							\$ 4.662.024,00	
3	CIMENTACIÓN							
3,01	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m 2	\$ 30.976,00	28,04	60,06	88,10	2.729.079,00	89,13%

3.02	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m 3	\$ 330.975,00	17,42	0,22	17,64	5.838.399,0 0	83,2 9%
3.05	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO f _c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m 3	\$ 767.519,00	5,44	3,05	8,48	6.510.096,0 0	79,3 5%
3.08	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO f _c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m 3	\$ 808.367,00	-	16,38	16,38	13.242.345, 00	71,1 6%
Total							\$28.319.919 ,00	
4	REFUERZO							
4,01	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	\$ 7.548,00	2.339, 62	5.170, 00	7.509, 62	56.682.591, 00	44,7 5%
Total							\$56.682.591 ,00	
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
5.11	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f _c =28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta	m 3	\$ 976.878,00		1,69	1,69	1.648.482,0 0	9,96 %

	metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad							
Total							\$1.648.482,00	
	COSTOS DIRECTOS						\$97.399.200,00	9,15 %
	ADMINISTRACION						\$24.203.701,00	9,15 %
	IMPREVISTOS						\$486.996,00	9,15 %
	UTILIDAD						\$4.869.960,00	9,15 %
	IVA SOBRE UTILIDAD						\$925.292,00	9,15 %
	TOTAL A.I.U. 30,35%						\$30.485.949,00	9,15 %
	TOTAL, COSTO DIRECTO + AIU						\$127.885.149,00	

Tabla 12. Cantidades ejecutadas parciales a febrero

JORNADA LABORAL.

La jornada de trabajo establecida por el contratista de obra para realización de las actividades se relacionan a continuación.

JORNADAS DE TRABAJO DEL PROYECTO						
Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Jornada	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 4:00 PM	7:00 AM - 11:00 AM

Tabla 13. Jornada de trabajo implementada.

PERSONAL Y MAQUINARIA EN OBRA

Personal

Cargo	Cantidad
Arquitecto residente	1
Maestro de obra	3
Oficial	4
Ayudantes	12
Profesional siso y social	2

Maquinaria

Equipo	Cantidad
Mezcladoras de concreto	1
Vibradores de concreto	1
Herramienta menor	varios

COPIA DE BITÁCORA

Se lleva el libro de bitácora consignando todos los aspectos relevantes que se presentan día a día y con la revisión directa de la ingeniera residente de interventoría. (ver anexo)

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Para el período comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio, se relaciona el registro fotográfico correspondiente.

○ CONCLUSIONES

En este periodo se puede evidenciar que se pudo avanzar en varias actividades paralelamente, esto como resultado de la implementación del plan de choque basado en aumento de personal operativo y horas de trabajo extras, nocturnas y dominicales.



Arq. Luis Antonio Fonseca
Residente de Obra
