

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9
INFORME PARCIAL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. MCSAMNCO111-2026

OBJETO:

REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA.

CAMPOALEGRE – HUILA

27 JULIO DE 2026

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Avance de Obra se elabora con el propósito de presentar el estado de ejecución física, técnica, administrativa y financiera del Contrato de Obra cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA", permitiendo evidenciar el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período objeto de seguimiento, así como el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

El seguimiento permanente realizado por la supervisión constituye un instrumento fundamental para verificar que las obras se ejecuten de conformidad con los estudios previos, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma de actividades y demás documentos que hacen parte integral del contrato, garantizando que los recursos públicos sean invertidos bajo criterios de eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la contratación estatal.

Durante el período informado, la supervisión efectuó visitas técnicas de inspección, seguimiento y control a las actividades desarrolladas en el Centro de Convenciones y de Cultura, verificando el cumplimiento de los procedimientos constructivos, la calidad de los materiales empleados, el avance físico de la obra, el desempeño del personal vinculado al proyecto, el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo, así como la correcta ejecución de las actividades programadas conforme al cronograma contractual.

Así mismo, el presente informe consolida las actividades ejecutadas por el contratista, los avances alcanzados, las observaciones formuladas por la supervisión y las acciones implementadas para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, constituyéndose en un soporte técnico que permite evaluar el comportamiento de la ejecución contractual y el cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los componentes de la obra.

El desarrollo del proyecto reviste especial importancia para el Municipio de Campoalegre, toda vez que las intervenciones permitirán recuperar y fortalecer las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del Centro de Convenciones y de Cultura, espacio destinado a la realización de actividades institucionales, culturales, artísticas, educativas, recreativas y comunitarias que benefician a la población del municipio..

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad ejecutar las obras de cubiertas y adecuaciones locativas necesarias para el mejoramiento integral de la infraestructura física del Centro de Convenciones y de Cultura del Municipio de Campoalegre, Huila, mediante intervenciones orientadas a recuperar las condiciones estructurales, funcionales y arquitectónicas de la edificación, prolongando su vida útil y garantizando espacios seguros, confortables y adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades que allí se realizan.

Para el cumplimiento del objeto contractual se contempla la ejecución de actividades relacionadas con el suministro, fabricación e instalación de estructuras metálicas para cubierta, instalación de tejas, caballetes, canales, bajantes y demás elementos destinados a garantizar el correcto funcionamiento del sistema de cubierta y la adecuada evacuación de aguas lluvias, eliminando filtraciones que afectan la infraestructura y los espacios interiores del inmueble.

De igual manera, el proyecto comprende la ejecución de adecuaciones locativas orientadas al

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

mantenimiento, reparación y mejoramiento de los diferentes elementos constructivos de la edificación, incluyendo actividades de demolición, desmontes, reposición de elementos deteriorados, pañetes, estucos, pintura, enchapes, pisos, instalaciones eléctricas, adecuaciones hidrosanitarias, carpintería metálica y de madera, así como todas aquellas intervenciones complementarias necesarias para garantizar la correcta terminación y funcionamiento de la infraestructura.

Las actividades ejecutadas buscan restablecer las condiciones óptimas de servicio del Centro de Convenciones y de Cultura, mejorando la seguridad estructural y funcional de la edificación, incrementando el nivel de protección frente a las condiciones climáticas, optimizando la imagen arquitectónica del inmueble y proporcionando espacios adecuados para el desarrollo de eventos institucionales, académicos, culturales, sociales y comunitarios.

La ejecución de las obras se desarrolla bajo la supervisión técnica del Municipio de Campoalegre, verificando permanentemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales, el avance físico y financiero del contrato, el cumplimiento del cronograma de ejecución, las obligaciones contractuales del contratista y la correcta inversión de los recursos públicos, con el propósito de garantizar que el proyecto se entregue en condiciones óptimas de calidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad, satisfaciendo las necesidades para las cuales fue concebido.

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto del presente informe se desarrolla en el Centro de Convenciones y de Cultura del Municipio de Campoalegre, ubicado en la Calle 17 No. 13-08, barrio Centro, en la zona urbana del municipio de Campoalegre, departamento del Huila. Su localización estratégica dentro del casco urbano facilita el acceso de la comunidad y de las diferentes entidades públicas y privadas que hacen uso de este escenario para el desarrollo de actividades institucionales, culturales, artísticas, educativas, sociales y comunitarias.

El Centro de Convenciones y de Cultura constituye uno de los principales equipamientos públicos del municipio, siendo un espacio destinado a la realización de eventos de carácter oficial, encuentros comunitarios, actividades académicas, presentaciones culturales, capacitaciones, exposiciones y demás actividades que contribuyen al fortalecimiento del desarrollo social y cultural de la población.

Las obras contempladas en el Contrato de Obra se ejecutan sobre la infraestructura existente del inmueble, comprendiendo intervenciones de cubiertas y adecuaciones locativas orientadas a mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad de la edificación, con el propósito de garantizar la conservación de la infraestructura, prolongar su vida útil y brindar espacios adecuados, seguros y confortables para los usuarios.

La ubicación del proyecto permite un adecuado acceso para el ingreso de personal, materiales, equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de las actividades constructivas, facilitando igualmente las labores de seguimiento, supervisión y control por parte del Municipio de Campoalegre. Las intervenciones se desarrollan de manera planificada, procurando minimizar las afectaciones al entorno y garantizando la continuidad de las actividades propias del escenario en la medida de lo posible.

En términos generales, el proyecto se encuentra localizado en un sector consolidado del casco urbano del municipio, donde confluyen equipamientos administrativos, comerciales e institucionales, lo que resalta la importancia de las obras ejecutadas para la preservación y fortalecimiento de uno de los principales escenarios destinados al desarrollo cultural, social e institucional del Municipio de Campoalegre, Huila.



Ilustración 1 Localización - fuente: Wikipedia

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

NÚMERO DE CONTRATO:	MCSAMNCO111-2026
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT:	902.063.807-9
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$171.771.972).
OTROSÍ ADICIÓN:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE (\$9.583.110)
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILOCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$181.355.082).
VALOR DEL EJECUTADO:	CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$106.174.799 M/CTE) IVA Incluido sobre utilidad.
FECHA DE INICIO:	13 de mayo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

2.2. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO.

Descripción	21 de Julio de 2026
Avance Físico Mensual	58,55%

2.3. PERSONAL UTILIZADO.

CARGO / PERFIL	CANTIDAD
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Profesional / SISO	1
Soldador	1

2.4. ESTADO DE PÓLIZAS

Pólizas Nros. CHU-100079294 y CHU-100014899, con fecha de expedición 11 de Mayo de 2026, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., la cual presenta los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO	\$17'177.197,20	08/05/2026 – 08/01/2027
PRESTACIONES SOCIALES	\$8'588.598,60	08/05/2026 – 08/09/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$34'354.394,40	08/05/2026 – 08/09/2027
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$34'354.394,40	08/05/2026 – 08/09/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$34'354.394,40	08/09/2026 – 08/09/2031
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$350'181.000,00	08/05/2026 – 08/09/2026

Póliza Nro. **CHU-100079294 de otrosí 1**, con fecha de expedición 14 de julio de 2026, expedida por compañía mundial de seguros.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO	\$18'135.508,20	08/05/2026 – 08/01/2027
PRESTACIONES SOCIALES	\$9'067.754,10	08/05/2026 – 08/09/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$36'271.016,40	08/05/2026 – 08/09/2027
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$36'271.016,40	08/05/2026 – 08/09/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$36'271.016,40	08/09/2026 – 08/09/2031

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En desarrollo del Contrato de Obra No. MCSAMNCO111-2026, cuyo objeto es "Realizar obras de cubiertas y adecuaciones locativas para el mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Convenciones y de Cultura del municipio de Campoalegre, Huila", durante el presente período se ejecutaron actividades orientadas al fortalecimiento estructural del sistema de cubierta, así como al mejoramiento de las condiciones funcionales de las instalaciones.

Las actividades iniciaron con la localización y replanteo de las áreas de intervención y la excavación manual para la construcción de las nuevas cimentaciones. Posteriormente, se ejecutó el figurado e instalación del acero de refuerzo, junto con la construcción de zapatas y pedestales en concreto de 3.000 PSI, requeridos para soportar la nueva estructura metálica incorporada al proyecto.

Como resultado de las condiciones encontradas durante la ejecución de la obra y de la necesidad de garantizar la estabilidad estructural de la cubierta, fue necesaria la incorporación de ítems no previstos, entre los cuales se ejecutó la construcción e instalación de columnas metálicas, correas metálicas de mayor capacidad estructural y la fabricación e instalación de cerchas metálicas, elementos que permitieron adecuar la estructura portante conforme a los requerimientos técnicos definidos durante la ejecución del contrato.

De igual manera, se ejecutó el suministro e instalación de canales en lámina galvanizada para la adecuada evacuación de aguas lluvias, así como la instalación de un alero en teja VPVC para la protección de la ventana de los baños y una cubierta en policarbonato tipo Tejasky Control Solar, mejorando la funcionalidad y protección de las áreas intervenidas.

Finalmente, como parte de las adecuaciones locativas contempladas dentro del contrato, se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU, 24.000 BTU y del equipo tipo piso-techo de 36.000 BTU, efectuando labores de limpieza, revisión de componentes eléctricos y mecánicos, verificación del sistema de refrigeración y pruebas de funcionamiento, garantizando su correcto desempeño.

Las actividades descritas corresponden a las obras efectivamente ejecutadas y recibidas durante el presente período, las cuales respaldan el Acta de Cobro por valor de Ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos (\$106.174.799 M/CTE), equivalente al 58,55 % del valor total de la modificación contractual.

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

1. PRELIMINARES


1.1. Localización y replanteo.

Se realizó la localización y replanteo de las áreas objeto de intervención, definiendo los ejes, niveles y puntos de referencia necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en la modificación contractual. Esta actividad permitió garantizar la adecuada ubicación de las cimentaciones y de los elementos estructurales metálicos que soportan la nueva cubierta.



1.2. Excavación manual en material conglomerado (0 – 2 m)

Se ejecutaron excavaciones manuales para la conformación de las cimentaciones requeridas, retirando el material existente hasta alcanzar las dimensiones y profundidades establecidas para la construcción de las zapatas y pedestales que soportan la estructura metálica.

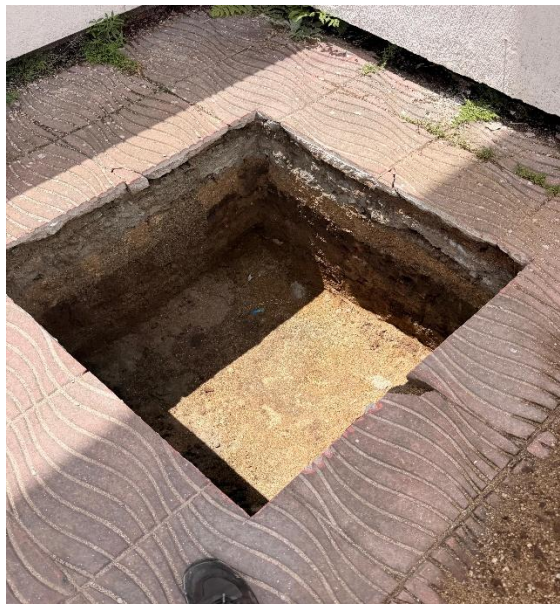

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

2. CIMIENTOS.

2.3. Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo.

Se suministró, figuró e instaló el acero de refuerzo requerido para las nuevas cimentaciones, garantizando el cumplimiento de las especificaciones estructurales y la resistencia necesaria para soportar las cargas transmitidas por la nueva cubierta metálica



Ítem NP-1. Concreto de 3.000 PSI para zapatas.

Se construyeron las zapatas adicionales mediante el suministro, transporte, vaciado, vibrado y curado de concreto de 3.000 PSI, correspondientes a un ítem no previsto incorporado durante la ejecución del proyecto para atender las nuevas condiciones estructurales identificadas en obra.



CONSORCIO INGENIERIA CING

NIT 902.063.807-9

Ítem NP-2. Concreto de 3.000 PSI para pedestales.


Se ejecutó la construcción de los pedestales adicionales en concreto de 3.000 PSI, permitiendo el adecuado anclaje de las columnas metálicas y garantizando la estabilidad de la estructura proyectada.



3. CUBIERTA.

3.1. Canal en lámina galvaniza.

Se suministraron e instalaron canales en lámina galvanizada calibre 18, incluyendo soportes, bajantes, anclajes y aplicación de pintura anticorrosiva, con el fin de garantizar la adecuada conducción y evacuación de las aguas lluvias provenientes de la cubierta.

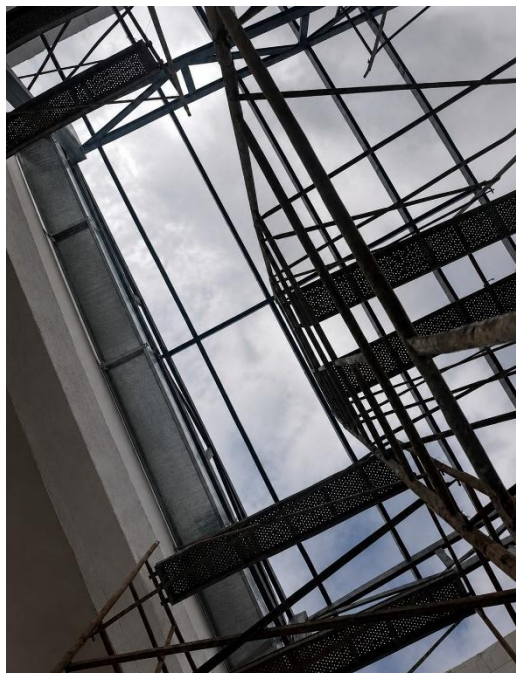

CONSORCIO INGENIERIA CING

NIT 902.063.807-9

3.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALERO PARA VENTANA DE BAÑO EN TEJA VPVC, 7,50X4,50 EN PERFIL 100MMX100MM.

Se construyó e instaló un alero metálico con cubierta en teja VPVC para la protección de la ventana del baño, disminuyendo el impacto directo de las lluvias y evitando filtraciones hacia el interior de las instalaciones.



3.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 5X5 EN TEJASKY CONTROL SOLAR POLICARBONATO DE 1,2MM, INCLUYE CANAL AGUAS LLUVIAS GALVANIZADO REVESTIDO EN ESMALTE WASH PRIMER

Se suministró e instaló una cubierta en policarbonato tipo Tejasky Control Solar de 1,2 mm, incluyendo la estructura de drenaje mediante canal galvanizada con acabado en esmalte Wash Primer, mejorando la protección y funcionalidad del área intervenida.



CONSORCIO INGENIERIA CING

NIT 902.063.807-9

NP-3. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA DE 4 TUBOS CUADRADO DE 10X10 CAL 14, SOPORTADA EN PLATINA DE 1/2", CON TUERCAS Y PERNOS DE 3/4", INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO

Se fabricaron e instalaron columnas metálicas con perfiles tubulares estructurales, platinas de anclaje, pernos, soldaduras y aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado, garantizando el adecuado soporte estructural de la cubierta conforme a los ajustes realizados durante la ejecución del proyecto.



NP-4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO CERRADO (H=150 MM, A=50 MM, ESPESOR 2,5 MM CAL 12)

Se suministraron e instalaron correas metálicas cerradas calibre 12, incluyendo soldadura, pintura anticorrosiva y acabado, proporcionando un sistema de apoyo con mayor capacidad estructural para la cubierta instalada.



CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

NP-5. FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA DE 6,58 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36

Se fabricó, transportó e instaló una cercha metálica de 6,58 metros de longitud, incluyendo corte, armado, soldadura, aplicación de pintura anticorrosiva, izaje, alineación y fijación definitiva, de acuerdo con los planos estructurales del proyecto.



NP-6. FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA DE 6,58 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36

Se fabricaron e instalaron dos cerchas metálicas adicionales con las mismas especificaciones técnicas, fortaleciendo el sistema estructural de la cubierta y garantizando la estabilidad y seguridad de la intervención ejecutada.



CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

7. AIRES ACONDICIONADOS

7.1. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU.

Se realizó el mantenimiento preventivo de seis (6) equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU, efectuando limpieza general, lavado de serpentines, revisión de conexiones eléctricas y mecánicas, verificación del sistema de drenaje y pruebas de funcionamiento para garantizar su óptimo desempeño.



7.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU.

Se ejecutó el mantenimiento preventivo de tres (3) equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU, realizando limpieza, inspección de componentes eléctricos y mecánicos, revisión de presiones y pruebas operacionales para asegurar su correcto funcionamiento.



7.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PISO TECHO

CONSORCIO INGENIERIA CING
NIT 902.063.807-9

36000 BTU.

Se realizó el mantenimiento preventivo de un (1) equipo de aire acondicionado tipo piso-techo de 36.000 BTU, incluyendo limpieza integral, revisión de los componentes eléctricos y mecánicos, verificación del sistema de refrigeración y pruebas finales de funcionamiento para garantizar su adecuada operación.




R/L CONSORCIO INGENIERIA CING

CONTRATISTA

[illegible]

3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, LONGITUD DE DESARROLLO HASTA 0,60 MT. INCLUYE MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN BAJANTE, ANCLAJES EN PERFIL DE 2"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVO.	ML	11,00	\$ 150.245	\$ 1.652.695	=	11,0	\$ 1.652.695	11,00	\$ 1.652.695	11,00	\$ 1.652.695
3.2	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA DE 4 TUBO CUADRADO DE 90X90 CAL16, UNIONES LATERALES EN PERFIL 50X25 CAL 18 CADA 25 CENTÍMETRO. SOPORTADA EN PLATINA DE 1/2" POR 70 CENTÍMETROS, CON TUERCAS DE 3/4" Y PERNOS DE 3/4" POR 50 CENTÍMETROS DE LARGO. INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ML	29,00	\$ 506.000	\$ 14.674.000	-	0,0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO EN C DOBLE (H=150 MM, A=50,0 MM, ESPESOR 1,88MM CAL 14). INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ML	50,00	\$ 156.607	\$ 7.830.350	-	0,0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO CERRADO (H=100 MM, A=40,0 MM, CAL 16). INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ML	90,00	\$ 89.705	\$ 8.073.450	-	0,0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJASKY CONTROL SOLAR POLICARBONATO DE 1,2 MM CRISTAL, INCLUYE SET DE FIJACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	123,00	\$ 136.789	\$ 16.825.047	=	123,0	\$ 16.825.047		\$ -	0,00	\$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALERO PARA VENTANA DE BAÑO EN TEJA VPVC, 7,50X4,50 EN PERFIL 100MMX100MM	UND	1,00	\$ 13.895.073	\$ 13.895.073	=	1,0	\$ 13.895.073	1,00	\$ 13.895.073	1,00	\$ 13.895.073
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 5X5 EN TEJASKY CONTROL SOLAR POLICARBONATO DE 1,2MM. INCLUYE CANAL AGUAS LLUVIAS GALVANIZADO REVESTIDO EN ESMALTE WASH PRIMER	UND	1,00	\$ 11.447.701	\$ 11.447.701	=	1,0	\$ 11.447.701	1,00	\$ 11.447.701	1,00	\$ 11.447.701

NP-3	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA DE 4 TUBOS CUADRADO DE 10X10 CAL14,. SOPORTADA EN PLATINA DE 1/2" POR 45 CENTÍMETROS, CON TUERCAS DE 3/4" Y PERNOS DE 3/4" POR 50 CENTÍMETROS DE LARGO. INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ML		\$ 485.470		+	29,00	\$ 14.078.630	29,00	\$ 14.078.630	29,00	\$ 14.078.630
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO EN CERRADO (H=150 MM, A=50,0 MM, ESPESOR 2,5MM CAL 12). INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ML		\$ 165.308		+	112,80	\$ 18.646.742	112,80	\$ 18.646.742	112,80	\$ 18.646.742
NP-5	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METÁLICA DE 5,86 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36 DE 150X50X2 MM PARA CORDONES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFILES PARA CELOSIA DE 100X40X2 MM PARA DIAGONALES Y MONTANTES. INCLUYE CORTE, BISELADO, ARMADO, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACABADO, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE, IZAJE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA	UND		\$ 1.685.000		+	1,00	\$ 1.685.000	1,00	\$ 1.685.000	1,00	\$ 1.685.000
NP-6	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA DE 6,58 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36 DE 150X50X2 MM PARA CORDONES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFILES PARA CELOSIA DE 100X40X2 MM PARA DIAGONALES Y MONTANTES. INCLUYE CORTE, BISELADO, ARMADO, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACABADO, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE, IZAJE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA	UND		\$ 1.820.000		+	2,00	\$ 3.640.000	2,00	\$ 3.640.000	2,00	\$ 3.640.000
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL							

4.0	ACABADOS											
4.1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	M2	202	\$26.019	\$ 5.255.838	=	202	\$ 5.255.838		\$ -	0,00	\$ -
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA BAÑOS	M2	202	\$94.380	\$ 19.064.760	=	202	\$ 19.064.760		\$ -	0,00	\$ -
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL							
5	CARPINTERIA METALICA											
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE 1,25X1,66 INCLUYE VIDRIO	M2	2,00	\$301.753	\$ 603.506	=	2,00	\$ 603.506		\$ -	0,00	\$ -
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE 1,25X1,66 INCLUYE VIDRIO	M2	3,22	\$301.753	\$ 971.645	=	3,22	\$ 971.645		\$ -	0,00	\$ -
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA UNIDAD SANITARIA SEGÚN DISEÑO EXISTENTE	UND	3,00	\$475.403	\$ 1.426.209	=	3,00	\$ 1.426.209		\$ -	0,00	\$ -
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL							
6.0	SANITARIOS											
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES	UND	4	\$986.408	\$ 3.945.632	=	4,00	\$ 3.945.632		\$ -	0,00	\$ -
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL							
7.0	AIRES ACONDICIONADOS											
7.1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	UND	6,00	\$552.662	\$ 3.315.972	=	6,00	\$ 3.315.972	6,00	\$ 3.315.972	6,00	\$ 3.315.972
7.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU	UND	3,00	\$552.662	\$ 1.657.986	=	3,00	\$ 1.657.986	3,00	\$ 1.657.986	3,00	\$ 1.657.986
7.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PISO TECHO 36000 BTU	UND	1,00	\$606.933	\$ 606.933	=	1,00	\$ 606.933	1,00	\$ 606.933	1,00	\$ 606.933
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL							
8.0	ELECTRICOS											
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLEXTORES LED DE 200W	UND	5,00	\$358.070	\$ 1.790.350	=	5,00	\$ 1.790.350		\$ -	0,00	\$ -
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL							
9.0	VENTILACION											
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES	UND	4,00	\$1.987.000	\$ 7.948.000	=	4,00	\$ 7.948.000		\$ -	0,00	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 132.132.286			\$ 139.503.909		\$ 81.672.922,00		\$ 81.672.922
			30%		\$ 39.639.686			\$ 41.851.173		\$ 24.501.877,00		\$ 24.501.877,00
	Administracion	A	25%		\$ 33.033.072		A	\$ 34.875.977	A	\$ 20.418.231,00	A	\$ 20.418.231
	Imprevisto	I	1%		\$ 1.321.323		I	\$ 1.395.039	I	\$ 816.729,00	I	\$ 816.729
	Utilidad	U	4%		\$ 5.285.291		U	\$ 5.580.156	U	\$ 3.266.917,00	U	\$ 3.266.917
	VALOR TOTAL				\$ 171.771.972			\$ 181.355.082		\$ 106.174.799		\$ 106.174.799


JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA
 CONTRATISTA - R.L CONSORCIO INGENIERIA CING


DANIEL FRANCISCO GUTIERREZ
 APOYO


CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR
 DIRECTOR OPERATIVO - SUPERVISOR

	CONSORCIO INGENIERIA CING NIT 902.063.807-9	CONTRATO DE OBRA No.	
	BITACORA	MCSAMNCO111-2026	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO. MCSAMNCO111-2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Y CONSORCIO INGENIERIA CING			
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA.		
SUPERVISOR	CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR		
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERIA CING	NIT:	902.063.807-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO PABÓN ANDUQUIA	CC:	1.075.293.056 de Neiva
Se procedió iniciando la construcción de la obra cumpliendo con el objeto contractual del contrato.			
FECHAS		LABORES REALIZADAS	
SEMANA 1 (13 AL 17 DE MAYO DE 2026)		• Socialización del proyecto con la supervisión. • Localización y replanteo de las áreas objeto de intervención. • Toma de medidas y verificación de niveles. • Marcación de puntos para cimentaciones y estructura metálica. • Inicio de excavaciones manuales para zapatas.	
SEMANA 2 (18 AL 24 DE MAYO DE 2026)		• Continuación de excavaciones para cimentaciones. • Armado y figurado del acero de refuerzo para zapatas y pedestales. • Preparación de formaletas. • Organización y acopio de materiales para la estructura metálica. • Continuación de excavaciones para cimentaciones. • Armado y figurado del acero de refuerzo para zapatas y pedestales. • Preparación de formaletas. • Organización y acopio de materiales para la estructura metálica.	

	CONSORCIO INGENIERIA CING NIT 902.063.807-9	CONTRATO DE OBRA No.	
	BITACORA	MCSAMNCO111-2026	

SEMANA 3 (25 AL 31 DE MAYO DE 2026)	• Construcción de zapatas de cimentación. Fundida de concreto para zapatas. • Construcción de pedestales de soporte. • Instalación de pernos y elementos de anclaje para columnas metálicas.
SEMANA 4 (01 AL 07 DE JUNIO DE 2026)	• Curado y verificación de elementos de cimentación. • replanteo y rediseño parte del sistema estructural inicialmente previsto, incorporando nuevos elementos de soporte.
SEMANA 5 (08 AL 14 DE JUNIO DE 2026)	• Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU. • Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU. • Mantenimiento preventivo de equipo piso techo de 36.000 BTU.

	CONSORCIO INGENIERIA CING NIT 902.063.807-9	CONTRATO DE OBRA No.	
	BITACORA	MCSAMNCO111-2026	

SEMANA 6 (15 AL 21 DE JUNIO DE 2026)	• Replanteo y verificación de medidas del área de intervención. • Suministro y corte de perfiles metálicos 100x100 mm. • Fabricación y armado de la estructura metálica de soporte. • Aplicación de pintura anticorrosiva a la estructura. • Instalación y anclaje de la estructura metálica. • Suministro e instalación de la cubierta en teja VPVC. • Instalación de elementos de fijación y remates. • Verificación de estabilidad, nivelación y correcto funcionamiento del alero.
SEMANA 7 (22 AL 28 DE JUNIO DE 2026)	• Adecuación y preparación de la estructura de soporte para la cubierta. • Suministro e instalación de canal de aguas lluvias en lámina galvanizada. • Instalación de accesorios, anclajes y elementos de fijación. • Aplicación de recubrimiento en esmalte tipo Wash Primer sobre la canal. • Instalación y fijación de las láminas de policarbonato.
SEMANA 8 (29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026)	• Se elaboraron los ajustes técnicos correspondientes y se gestionó la aprobación de un otrosí modificatorio para la inclusión de actividades no previstas

	CONSORCIO INGENIERIA CING NIT 902.063.807-9	CONTRATO DE OBRA No.	
	BITACORA	MCSAMNCO111-2026	

SEMANA 9 (06 AL 12 DE JULIO DE 2026)	• Fabricación de columnas metálicas en taller. • Aplicación de pintura anticorrosiva a elementos estructurales. • Transporte de materiales al sitio de obra
SEMANA 10 (13 AL 21 DE JULIO DE 2026)	• Instalación de columnas metálicas. • Alineación y nivelación de la estructura principal. • Instalación de anclajes y soldaduras estructurales. • Verificación técnica de la estructura instalada. • Fabricación e instalación de cerchas metálicas. • Instalación de correas metálicas para cubierta. • Ajustes estructurales requeridos en obra. • Aplicación de pintura anticorrosiva en puntos de unión. • Continuación de instalación de correas metálicas. • Instalación de canales para aguas lluvias. • Montaje de estructura secundaria de cubierta. • Revisión de alineamientos y pendientes.


JUAN CAMILO PABÓN ANDUQUIA
 R.LCONSORCIO INGENIERIA CING


CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR
 DIRECTOR OPERATIVO - SUPERVISOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902063807	9	CONSORCIO CING (CONVENCIONES)	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CL 48 A 2 W 04		3142881847		CIVILYARQUITECTURACONSORCIOING@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38099772	E	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.652.400	25.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38099772	2026-07-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 12278527	MONTILLA CABRERA MARIO	1.750.905		F	X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411201
2	CC 1075257744	LOSADA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO	1.750.905		F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411201
3	CC 1079173225	NARVAEZ DIAZ LEONARDO	1.750.905		F	X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902063807	9	CONSORCIO CING (CONVENCIONES)	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CL 48 A 2 W 04		3142881847		CIVILYARQUITECTURACONSORCIOING@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38099772	E	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.652.400	25.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38099772	2026-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.252.715	5.252.715	5.252.715	5.252.715	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	840.600	0	13.200	0	853.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	4.400	0	284.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	4.400	0	284.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	4.400	0	284.600
EPS(Administradoras: 1)				3	210.300	0	3.300	0	213.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	210.300	0	3.300	0	213.600
ARP(Administradoras: 1)				3	365.700	0	5.700	0	371.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	365.700	0	5.700	0	371.400
CCF(Administradoras: 1)				3	210.300	0	3.300	0	213.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	210.300	0	3.300	0	213.600
Gran Total					1.626.900	0	25.500	0	1.652.400

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902063807	9	CONSORCIO CING (CONVENCIONES)	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CL 48 A 2 W 04		3142881847		CIVILYARQUITECTURACONSORCIOING@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	38112943	E	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.013.200	36.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38112943	2026-06-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 12278527	MONTILLA CABRERA MARIO	1.750.905		F	X														0			18	18	18	18	COLPENSIONES-25-14	1.050.543	168.100	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	1.050.543	42.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5411201
2	CC 1075257744	LOSADA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO	1.750.905		F	X														0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.050.543	168.100	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	1.050.543	42.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5411201
3	CC 1079173225	NARVAEZ DIAZ LEONARDO	1.750.905		F	X														0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	1.050.543	168.100	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	1.050.543	42.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902063807	9	CONSORCIO CING (CONVENCIONES)	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CL 48 A 2 W 04		3142881847		CIVILYARQUITECTURACONSORCIOING@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	38112943	E	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.013.200	36.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38112943	2026-06-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.151.629	3.151.629	3.151.629	3.151.629	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	504.300	0	18.900	0	523.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	168.100	0	6.300	0	174.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	168.100	0	6.300	0	174.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	168.100	0	6.300	0	174.400
EPS(Administradoras: 1)				3	126.300	0	4.800	0	131.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	126.300	0	4.800	0	131.100
ARP(Administradoras: 1)				3	219.600	0	8.200	0	227.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	219.600	0	8.200	0	227.800
CCF(Administradoras: 1)				3	126.300	0	4.800	0	131.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	126.300	0	4.800	0	131.100
Gran Total					976.500	0	36.700	0	1.013.200

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		4884580		NÚMERO PLANILLA:		6026403391		TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		HECTOR PABON GUTIERREZ		DEPARTAMENTO:		HUILA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		2026					
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA		TELÉFONO:		8389606		DÍAS DE MORA:		14		MAYO		MAYO					
DIRECCIÓN:		CRA 3-4-48		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		445904559					
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act		NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		6018976412		FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2026/06/04					
TIPO EMPRESA:		PRIVADA																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO															

TOTAL APORTES A SALUD																			
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS			1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SUBTOTALES:															\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 33.500	\$ 33.500	\$ 400	\$ 0	\$ 33.900	
SUBTOTALES:									\$ 33.500	\$ 400	\$ 0	\$ 33.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				
1	CC 4884580	PABON GUTIERREZ HECTOR	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	REQ CUMPLENS	\$ 1.750.905				NO							A													\$ 0	30	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 1.750.905	4884580	\$ 9.200		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								
2	CC 4884580	PABON GUTIERREZ HECTOR	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	REQ CUMPLENS	\$ 1.750.905				NO							C													\$ 0	30	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 1.750.905	4884580	\$ 42.700		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								
3	CC 4884580	PABON GUTIERREZ HECTOR	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	REQ CUMPLENS	\$ 1.750.905				NO							R													\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0	\$ 0	4884580	\$ 33.500		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								

TOTAL PAGADO: \$ 33.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4884580
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		HECTOR PABON GUTIERREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3-4-48	TELÉFONO:	8389606
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		6018976412		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		mayo AÑO		2026			
DÍAS DE MORA:						PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
								mayo AÑO	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/06/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		364288241	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:									\$ 218.900				\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 228.100
----------------------	-------------------

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700
SUBTOTALES:									\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700

TOTAL PAGADO:	\$ 261.600
----------------------	-------------------
