



NRO INT: 639552

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 25306** **De 24/07/2026** **Por 6.573.769.926,00**
PAGO FV - 12574 (TRANSPORTE) FV - 12572 FV - 12573 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 4347 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 21882 de 24/07/2026 C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 60 de *****CXP: NO
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. **C.C o Nit** 900188750

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 de 26/03/2026 Por 40.000.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Seis Mil Quinientos Setenta Y Tres Millones Setecientos Sesenta Y Nueve Mil Novecientos Veintiseis Pesos M/Cte. **6.573.769.926,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	517	4.619.913.886,95	2,50	115.497.847,00	325.671.478,00
RETEIVA	517	877.783.636,00	15,00	131.667.545,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2291	4.619.913.886,95	0,75	34.649.354,00	
RETEFUENTE	524	904.262.509,00	1,00	9.042.625,00	
RETEIVA	524	171.809.876,75	15,00	25.771.482,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	904.262.509,00	1,00	9.042.625,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 6.248.098.448,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 5169 **Fecha. 26/03/2026**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2024660010029	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	6.573.769.926,00

Total obligación 6.573.769.926,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción	
511114104	Elementos construccion, instalac., c	5.497.697.540,25	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7751 CONTRATO DE SUMINI	
550705023	Comunicaciones y transporte	1.076.072.385,75	0,00	Acta de recibo PARCIAL 512379 CONTRATO DE SUMIN	
243605001	Servicios	0,00	9.042.625,00	Acta de recibo PARCIAL 512379 CONTRATO DE SUMIN	
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	9.042.625,00	Acta de recibo PARCIAL 512379 CONTRATO DE SUMIN	
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	25.771.482,00	Acta de recibo PARCIAL 512379 CONTRATO DE SUMIN	
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	34.649.354,00	ENTRADA POR COMPRA 7751 CONTRATO DE SUMINI	
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	115.497.847,00	ENTRADA POR COMPRA 7751 CONTRATO DE SUMINI	
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	131.667.545,00	ENTRADA POR COMPRA 7751 CONTRATO DE SUMINI	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.032.215.653,75	Acta de recibo PARCIAL 512379 CONTRATO DE SUMIN	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.215.882.794,25	ENTRADA POR COMPRA 7751 CONTRATO DE SUMINI	

Sumas Iguales 6.573.769.926,00 6.573.769.926,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	504.201.681,00
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CTOOBRA SUP 30 SMLV	672.268.908,00



NRO INT: 639552

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25306 De 24/07/2026 Por 6.573.769.926,00

PAGO FV - 12574 (TRANSPORTE) FV - 12572 FV - 12573 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 4347 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 21882 de 24/07/2026 C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 60 de ***CXP: NO**

33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	672.268.908,00	672.268.908,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	336.134.454,00	336.134.454,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	672.268.908,00	672.268.908,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461246165154-5454527-011167409

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21882**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4347

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificación 900188750 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	26/03/2026	Valor orden gasto	40.000.000.000
Fecha iniciación	27/03/2026	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	30.600.269.733
Fecha Terminación	31/12/2026	Valor acta	1.076.072.386
Duración	Hasta agotar el presupuesto asignado, contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2026, o lo que primero ocurra.		Saldo pendiente 8.323.657.881

OBJETO DEL CONTRATO:**Periodo de pago:**

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FV - 12574 (TRANSPORTE) CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 4347 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SEC	904.262.509	171.809.877
Total:		904.262.509	171.809.877
Total recibido			1.076.072.386
- Amortización de anticipo			
Valor	Mil Setenta Y Seis Millones Setenta Y Dos Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Pesos Con Setenta Y Cinco Centavos M/Cte.		1.076.072.386
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 24/07/2026



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :512379

Impreso en: 25-JUL-26 06:20 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21882

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4347

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificación 900188750 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02461246163559-5454499-011167252



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7751

ENTRADA POR COMPRA 60

Fecha 24/07/2026

Proveedor 900188750
4347

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA,
MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Factura Nro. 12573-12572

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2026

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
104011325	SUBBASE GRANULAR	1276	MT3	112.562,00		22.932.380,00	0,00	143.629.117,87
104011317	BASE GRANULAR	1555	M3	130.929,00		32.506.700,00	0,00	203.594.595,31
104011296	EMULSION ASFALTICA	3850	GL	33.113,00		20.354.755,00	0,00	127.485.047,69
104011295	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3	4250,05	MT3	1.140.301,99		*****	0,00	4.846.340.490,45
104011326	GEOMALLA BIAxIAL M2	4124	MT2	29.557,01		19.461.922,00	0,00	121.893.091,51
104011324	CEMENTO ASFALTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO	3550	MT3	15.423,99		8.742.423,00	0,00	54.755.180,12
104016169	AJUSTE AL PESO	1	UN	17,30		0,00	0,00	17,30

Son :Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Siete Mil Quinientos Cuarenta
Pesos Con Veinticinco Centavos M/Cte.

5.497.697.540,25

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	5.497.697.540,25
-----	---	------------------

Observaciones PAGO DE MATERIALES PETREOS Y CONCRETOS SEGUN FACTURA 12573-12572

DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA

02461246115752-5454472-011163775



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 60

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4347

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificación 900188750 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	40.000.000.000
Fecha de firma	26/03/2026	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	25.102.572.193
Fecha iniciación	27/03/2026	Valor Entrada	5.497.697.540,00
Fecha finalización	31/12/2026	(-) Amort.Anticipo	0
Duración	Hasta agotar el presupuesto asignado, c	Saldo Pendiente	9.399.730.267

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 60

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	5.497.697.540,25
-----	---	------------------

Valor a cancelar Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte. **5.497.697.540,00**

Para constancia se firma en Pereira el 24/07/2026

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02461246163616-5454367-011167253

DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA

02461246115801-5454367-011163776



AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Nit: 900188750-8

KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA -
SANTUARIO

Teléfono: 606-3450060

Celular: 3128905408

SANTUARIO



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

RUCOM-201707289642

Número

FV - 12572

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764107339122 del 18/03/2026 Hasta el 18/03/2028 del No FV 12.001 al No FV 14.000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nit / C.C.:	891480030	Fecha y hora de expedición	22/07/2026 4:16 p. m.
Dirección:	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	Fecha y hora validación DIAN	22/07/2026 4:23 p. m.
Ciudad:	PEREIRA	Fecha de vencimiento	30/07/2026
Teléfono:	3248230		

Correo electrónico tesoreria@pereira.gov.co;repcionfacturas@agreoccidente.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
OT02	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO	3850	gl	27.826,05	19%	107.130.294,12
RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3	4250,05	M3	958.236,97	19%	4.072.555.054,71
RI161	GEOMALLA BIAxIAL M2	4124	M2	24.837,82	19%	102.431.149,58
RI204	CEMENTO ASFALTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	3550	kg	12.961,34	19%	46.012.773,11

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 DEL 2026 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMA S Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PERERIA

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S, Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogota cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No.127569997266.

Si dentro de los ocho (8) primeros dias habiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entendera como aceptada.

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

VALOR ANTES DE IVA:	4.328.129.271,52
I.V.A	822.344.561,58
DESCUENTO:	0,00
TOTAL FACTURA:	% 5.150.473.833,10
RETEFUENTE:	% 0,00
RETEIVA:	% 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	5.150.473.833,10

Elaborado por:
BELKIS PEÑA

Aceptado por: MUNICIPIO DE PEREIRA
891480030

Código CUF: c8b9b9d432f90935c8db9ccb132edae286fbf56e22c4c3b738408a4bef802331c0150cb5b1e07db3fc3649ac28840667





AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Nit: 900188750-8

KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA -
SANTUARIO

Teléfono: 606-3450060

Celular: 3128905408

SANTUARIO



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

RUCOM-201707289642

Número **FV - 12573**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764107339122 del 18/03/2026 Hasta el 18/03/2028 del No FV 12.001 al No FV 14.000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nit / C.C.:	891480030	Fecha y hora de expedición	22/07/2026 4:20 p. m.
Dirección:	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	Fecha y hora validación DIAN	22/07/2026 4:23 p. m.
Ciudad:	PEREIRA	Fecha de vencimiento	30/07/2026
Teléfono:	3248230		

Correo electrónico tesoreria@pereira.gov.co; recepcionfacturas@agreoccidente.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
MP03	SUB-BASE GRANULAR	1276	M3	94.589,92	19%	120.696.732,77
MP04	BASE GRANULAR	1555	M3	110.024,37	19%	171.087.894,96

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 DEL 2026 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMA S Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PERERIA

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S, Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogota cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No.127569997266.

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como aceptada.

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

VALOR ANTES DE IVA:	291.784.627,73
I.V.A	55.439.079,27
DESCUENTO:	0,00
TOTAL FACTURA:	% 347.223.707,00
RETEFUENTE:	% 0,00
RETEIVA:	% 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	347.223.707,00

Elaborado por:
BELKIS PEÑA

Aceptado por: MUNICIPIO DE PEREIRA
891480030

Código CUFE: 70da227d31db7b2f2062452f370df29b62f2a03f724488608542b44dcaca89713360d3be69706577587787c272e3ee2b





AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Nit: 900188750-8

KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA -
SANTUARIO

Teléfono: 606-3450060

Celular: 3128905408

SANTUARIO



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

RUCOM-201707289642

Número **FV - 12574**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764107339122 del 18/03/2026 Hasta el 18/03/2028 del No FV 12.001 al No FV 14.000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nit / C.C.:	891480030	Fecha y hora de expedición	22/07/2026 4:21 p. m.
Dirección:	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	Fecha y hora validación DIAN	22/07/2026 4:23 p. m.
Ciudad:	PEREIRA	Fecha de vencimiento	30/07/2026
Teléfono:	3248230		

Correo electrónico tesoreria@pereira.gov.co; recepcionfacturas@agreoccidente.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
TR47	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL MDC, SUBBASE, BASE,ETC....	1	MKM	904.262.509,22	19%	904.262.509,22

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 DEL 2026 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMA S Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PERERIA

VALOR EN LETRAS: MIL SETENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S, Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogota cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No.127569997266.

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como aceptada.

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

VALOR ANTES DE IVA:	904.262.509,22
I.V.A	171.809.876,76
DESCUENTO:	0,00
TOTAL FACTURA:	% 1.076.072.385,98
RETEFUENTE:	% 0,00
RETEIVA:	% 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	1.076.072.385,98

Elaborado por:
BELKIS PEÑA

Aceptado por: MUNICIPIO DE PEREIRA
891480030

Código CUF: 26ec972dcfa058c49b39c811864d3ed03d2723a37d3bf4b41ef4c5a5ef67b458da66b8c3a9b074111bef912faf619108



Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL Y
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS**

Julio de 2026

Doctora

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Secretaria de Infraestructura

Municipio de Pereira

Asunto: Informe de ejecución *CUARTO* corte del **contrato No. 4347 de 2026**, “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETOS PREMEZCLADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA DE PEREIRA”, suscrito con AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S Nit. 900.188.750-8, representada legalmente por Juan Sebastián García Henao identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.291.689 de Pereira.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del Contrato No. 4347 de 2026 suscrito con Agregados Del Occidente De Risaralda S.A.S, identificado con Nit 900.188.750-8.

Información general del contrato:

Contrato:	No. 4347 de 2026
Nombre e identificación del Contratista:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S NIT. 900.188.750-8, REPRESENTANTE LEGAL POR JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N°1.088.291.689 DE PEREIRA

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Objeto:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETOS PREMEZCLADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PEREIRA
Valor Inicial:	\$ 40.000.000.000,00
Valor total ejecutado:	\$ 31.676.342.119,22
Saldo:	\$ 8.323.657.880,78
Duración:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
Plazo:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
Fecha de Inicio	27 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

Apropiación presupuestal

Compromiso presupuestal N°5169	
Fecha de expedición	26/02/2025
Rubro:	2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinarias y equipos.
Proyecto:	2020660010089 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Centro de costos:	1107Secretaría de Infraestructura
Fondo:	824 Recursos del balance Fondos Comunes 101 Fondos comunes 428 Excedentes Financieros
Valor:	\$ 40.000.000.000 ,00

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Ítems de Suministro de Materiales Contemplados en el contrato, condiciones técnicas y valores individuales:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1	MDC-10 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m ³	\$ 1.164.899
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m ³	\$ 1.140.302
3	M-GCR-12 vs mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería con grano de caucho reciclado vía seca	m ³	\$ 1.157.269
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70Subbase tipo A	Kg	\$ 15.424
5	Sub Base tipo A	m ³	\$ 112.562
6	Base tipo A	m ³	\$ 130.929
7	Geomalla Biaxial	m ²	\$ 29.557
8	Emulsión Asfáltica CRL-1	Galón	\$ 33.113
9	Servicio de transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a diferentes sectores del Municipio	m ³ xKm	\$ 3.000
10	Pintura base solvente acrílica para demarcación vial	Galón	\$ 443.898
11	Microesferas de vidrio para demarcación vial	Kg	\$ 33.387
12	Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos	Galón	\$ 381.313
13	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m ³	\$ 873.535
14	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	m ³	\$ 978.504
15	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 días.	m ³	\$ 1.068.525
16	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m ³	\$ 927.098

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

17	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	m ³	\$ 1.037.083
18	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 días	m ³	\$ 1.124.172
19	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m ³	\$ 976.343
20	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	m ³	\$ 1.085.114
21	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 días	m ³	\$ 1.173.142
22	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 días	m ³	\$ 1.044.715
23	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 días	m ³	\$ 1.174.258
24	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 días	m ³	\$ 1.281.871
25	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 días	m ³	\$ 1.107.332
26	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 días	m ³	\$ 1.240.153
27	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 días	m ³	\$ 1.350.179

Ejecución del contrato

La Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial, en cumplimiento de sus funciones misionales, ejecuta actividades de mantenimiento correctivo sobre la red vial municipal, abarcando tanto el sistema vial urbano como rural. Dichas intervenciones se realizan en tramos donde la capa de rodadura presenta niveles de deterioro que afectan las condiciones de seguridad, transitabilidad y confort de los usuarios, por lo cual se hace necesaria su rehabilitación con el propósito de restablecer condiciones adecuadas de movilidad.

En este marco, la Administración Municipal ha adoptado un enfoque estratégico para la gestión de las intervenciones viales, orientado a la implementación de soluciones integrales

que generen impactos positivos y sostenibles en la movilidad, optimizando simultáneamente la percepción del servicio por parte de la ciudadanía y beneficiando al mayor número posible de usuarios de la red vial. En consecuencia, las acciones de mantenimiento no se limitan a la reparación puntual de fallas superficiales, tales como baches, sino que contemplan intervenciones de rehabilitación de mayor alcance en los sectores afectados, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional, la integridad estructural y la vida útil del pavimento intervenido.

La priorización y selección de los puntos de intervención se realiza en el marco de comités técnicos de obra, en los cuales participan el Secretario de Infraestructura, el Director Operativo y el Ingeniero Coordinador del área de mantenimiento vial. Estas decisiones se adoptan conforme a las directrices establecidas por el señor Alcalde, y se sustentan en recorridos de inspección técnica efectuados por personal especializado, así como en las solicitudes, reportes y requerimientos presentados por la comunidad, los cuales son canalizados a través de los diferentes medios de atención y comunicación dispuestos por la Administración Municipal.

Las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato, con base en los materiales suministrados, comprendieron la intervención integral de la capa de rodadura en tramos con deterioro avanzado, mediante la aplicación de procedimientos constructivos especializados. Entre estos se incluyen: escarificación y fresado de la superficie existente, demolición de losas de concreto, cajeo de baches, reparación y/o reconstrucción de la estructura del pavimento, sellado y curado de grietas, imprimación con emulsión asfáltica, instalación de geomalla sintética biaxial, así como la colocación y compactación de mezcla asfáltica.

Cada una de estas actividades fue ejecutada conforme a las condiciones técnicas particulares de los sectores intervenidos, atendiendo criterios de diseño, niveles de deterioro, capacidad estructural requerida y especificaciones técnicas aplicables, con el fin de garantizar la adecuada adherencia entre capas, mejorar el desempeño estructural del pavimento y asegurar la durabilidad de las intervenciones realizadas.

Adicionalmente, se ejecutaron actividades de mantenimiento y mejoramiento en vías no pavimentadas, orientadas a optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad para los

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

usuarios. Estas labores comprendieron la conformación y regularización del perfil vial, mediante procesos de nivelación, escarificación y compactación de la superficie existente, con el fin de restablecer la geometría transversal y longitudinal de la vía.

De igual manera, se realizó la colocación, extendido, conformación y compactación de materiales granulares destinados a las capas de subbase y base, los cuales fueron dispuestos conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. Estas intervenciones permitieron mejorar la capacidad portante de la estructura vial, optimizar el drenaje superficial y reducir la presencia de deformaciones, baches y material suelto, contribuyendo así a garantizar condiciones más adecuadas de circulación, especialmente en sectores rurales o de alta sensibilidad a factores climáticos.

Cabe resaltar que, dentro de las actividades de rehabilitación vial ejecutadas, se implementó la técnica de “Black Topping”, la cual consiste en la colocación de una capa de mezcla asfáltica sobre pavimentos rígidos existentes (concreto), con el propósito de mejorar las condiciones de rodadura y recuperar la funcionalidad de la vía.

En el desarrollo del presente proyecto se aplicó una variante reforzada de esta técnica, mediante la incorporación de geomalla sintética biaxial de fibra, instalada entre las capas del sistema de rehabilitación. Este refuerzo tiene como finalidad mejorar la adherencia entre capas, mitigar la propagación de fisuras por reflexión provenientes del pavimento de concreto subyacente y aumentar la capacidad estructural y la vida útil del sistema de pavimento resultante.

La implementación de esta metodología permitió optimizar el desempeño funcional y estructural de los tramos intervenidos, particularmente en sectores sometidos a niveles de tránsito moderados a altos, contribuyendo a mejorar el nivel de servicio y la durabilidad de la solución de rehabilitación adoptada.

Disposición Y Uso De Ítems En La Ejecución Del Contrato

Ítem 2 – Mezcla Asfáltica MDC-19:

Este tipo de mezcla fue empleada en la totalidad de los trabajos ejecutados, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar una capa de rodadura duradera y adecuada al tránsito vehicular previsto.

Ítem 4– Liga asfáltica:

El cemento asfáltico (Liga asfáltica) considerado en este ítem se usó para la impermeabilización de y sello de juntas de dilatación, grietas y fisuras.

Ítems 5 y 6 – Sub-base Tipo A y Base Tipo A:

Estos materiales granulares fueron utilizados para la reparación y reconstrucción de la estructura granular de los pavimentos, en tramos donde se evidenció deterioro estructural que comprometía la capacidad portante del sistema vial.

Ítem 7 – Geomalla Biaxial:

La geomalla biaxial se utilizó para hacer reforzamiento de la estructura y mitigar la propagación de fisuras de las capas inferiores a la capa de asfalto.

Ítem 8 – Emulsión Asfáltica CRL-1:

La emulsión asfáltica fue utilizada principalmente en las actividades de riego de imprimación, paso esencial para preparar la superficie de la vía antes de la aplicación de la mezcla asfáltica. La dosificación de este material se determinó en función del estado de la superficie (rasante) y de las condiciones climáticas al momento de la intervención. Adicionalmente, la emulsión CRL-1 se empleó en la elaboración de mezcla asfáltica en frío, compuesta por material fresado y emulsión, destinada a reparaciones provisionales de carácter urgente.

Nota importante: Por razones logísticas de transporte, la emulsión y el cemento asfálticos, se solicita en volúmenes globales, siendo almacenada en las instalaciones municipales de talleres en el corregimiento de San Joaquín. Su distribución se realiza según las necesidades específicas de cada proyecto.

Ítem 9 – Servicio de Transporte:

Este ítem fue destinado al traslado de materiales como mezcla asfáltica, base y sub-base desde la planta de producción hasta los frentes de obra, asegurando el suministro oportuno y continuo para el desarrollo eficiente de los trabajos.

Ítems no descritos:

Cabe mencionar que los demás ítems del contrato que no se detallan en el presente informe no han sido requeridos hasta el momento para la ejecución de las actividades desarrolladas.

Avance de Ejecución – CUARTO Corte del Contrato No. 4347 de 2026

Durante el CUARTO corte del contrato No. 4347 de 2026, se alcanzó un avance de ejecución del 79,19% del presupuesto total. En este periodo se realizaron intervenciones en puntos estratégicos de la ciudad con alto impacto en la movilidad, priorizando aquellos que presentaban un deterioro significativo y representaban un riesgo para la seguridad de los usuarios.

En el marco del programa “Cero Huecos”, se ejecutaron intervenciones menores de mantenimiento vial mediante actividades de bacheo, incluyendo demolición, fresado, adecuación de la estructura granular, imprimación y aplicación de carpeta asfáltica. Estas acciones permitieron mitigar puntos críticos de deterioro y mejorar las condiciones de la vía. A continuación, se relacionan los tramos intervenidos.

Adicionalmente, se realizaron obras complementarias consistentes en la construcción de resaltos y la rehabilitación puntual de la carpeta asfáltica en sectores estratégicos del municipio:

- Alcaldía: Carrera 8 Bis con Calle 44, barrio Turín, comuna Centro.
- Alcaldía: Reparcheo en la Carrera 6 con Avenida del Río, comuna Oriente.
- Alcaldía: Construcción de resaltos en el sector Palo de Agua, comuna San Joaquín.
- Alcaldía: Construcción de resaltos y reparcheo en la Calle 72, sector Panadería Los Sauces, barrio El Oso.
- Alcaldía: Construcción de resaltos y reparcheo en el sector de la Estación de Policía de Mundo Nuevo, corregimiento La Bella.

Avenida 30 de Agosto, sector EDS Don Ernesto, corregimiento Cerritos: Como parte de las actividades de mantenimiento vial, se ejecutaron trabajos en jornada nocturna con el fin de minimizar las afectaciones a la movilidad vehicular y garantizar la continuidad de las intervenciones. Durante el desarrollo de las labores se implementó un Plan de Manejo de Tránsito, mediante señalización preventiva y dispositivos de canalización complementados con iluminación artificial, garantizando condiciones adecuadas de seguridad tanto para los usuarios de la vía como para el personal operativo.

En los sectores intervenidos se realizaron labores de fresado sobre los tramos que presentaban deterioro de la capa de rodadura. El material resultante fue cargado, transportado y dispuesto en la escombrera municipal Guadalcanal, asegurando su adecuada disposición final. Posteriormente, se ejecutaron actividades de limpieza, barrido y sopleteo de la superficie fresada, con el propósito de garantizar las condiciones técnicas requeridas para la aplicación del riego de imprimación y la posterior colocación de la nueva carpeta asfáltica.

Avenida 30 de Agosto, sector El Viajero, comuna El Jardín: Con el propósito de mantener la funcionalidad del corredor vial y reducir las afectaciones a la movilidad, las actividades de rehabilitación fueron programadas en horario nocturno, permitiendo la ejecución de los trabajos bajo condiciones de menor flujo vehicular. Durante la intervención se implementaron las medidas contempladas en el Plan de Manejo de Tránsito, mediante la instalación de señalización temporal, dispositivos de control e iluminación del frente de obra, garantizando la seguridad de peatones, conductores y personal operativo.

Como etapa inicial de la intervención, se retiró la capa asfáltica deteriorada mediante el proceso de fresado, eliminando el material que presentaba pérdida de sus condiciones de servicio. Posteriormente, el material recuperado fue evacuado del sitio de trabajo y transportado a la escombrera municipal Guadalcanal para su disposición autorizada. Una vez liberada el área de intervención, se efectuó la preparación de la superficie

mediante limpieza manual y mecánica, complementada con sopleteo para eliminar partículas sueltas y residuos. Estas actividades permitieron obtener una superficie uniforme y libre de contaminantes, apta para la aplicación del riego asfáltico y la posterior conformación de la nueva capa de rodadura.

Calle 35 entre Avenida 30 de Agosto y Carrera 12, barrio Las Garzas, comuna Centro: Previo a la rehabilitación del pavimento, fue necesario intervenir los puntos donde se presentaban daños en la red de alcantarillado, permitiendo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ejecutar el reemplazo de los elementos deteriorados. Superada esta etapa, se inició la reconstrucción de la estructura vial mediante la conformación de la base granular y su respectiva compactación hasta alcanzar las especificaciones técnicas requeridas. Como actividad final, se ejecutó la rehabilitación del pavimento mediante la técnica de Black Topping, la cual comprendió con el sello de juntas y fisuras, la aplicación del riego de liga, la instalación de una malla asfáltica de refuerzo y la posterior colocación de una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente sobre la superficie previamente preparada. Esta intervención permitió mejorar el desempeño estructural del pavimento, incrementar la capacidad de distribución de esfuerzos, minimizar la propagación de fisuras reflejadas y restablecer las condiciones de servicio de la vía, proporcionando una superficie de rodadura uniforme, segura y adecuada para la circulación vehicular.

Calle 80B entre Carreras 30 y 31, barrio Atenas, comuna San Joaquín: Se ejecutaron labores de excavación para retirar el material deteriorado y preparar la estructura del pavimento para su rehabilitación. Posteriormente, se realizó la conformación, extendido y compactación de la base granular, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Una vez conformada la estructura de soporte, se aplicó el riego de imprimación y se procedió con la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, restableciendo las condiciones estructurales y funcionales de la vía y proporcionando una superficie de rodadura uniforme y segura para los usuarios.

Carrera 14 entre Calles 12B Este y 13 Este, barrio Simón Bolívar, comuna Oriente:

Se ejecutaron labores de retiro de los adoquines existentes, debido al avanzado estado de deterioro que presentaba la superficie de rodadura. Posteriormente, se realizó el reemplazo de la base granular, seguido de su conformación y compactación, garantizando las condiciones estructurales requeridas para la rehabilitación del pavimento. Finalmente, se aplicó el riego de imprimación y se procedió con la instalación de la carpeta asfáltica en caliente, restableciendo las condiciones de servicio de la vía y mejorando la seguridad y comodidad para la circulación vehicular.

Don Quijote: Calle 14, tramo comprendido entre las Carreras 23 y 24, barrio Los

Ángeles, comuna Universidad: Con el fin de corregir el fallo identificado en el tramo vial, se ejecutó la rehabilitación del pavimento mediante la excavación y retiro del material comprometido, la conformación de una nueva estructura granular con piedra filtro, subbase y base granular, el sellado de juntas y fisuras y la ejecución de la carpeta de rodadura mediante un sistema Black Topping con refuerzo en geomalla asfáltica de fibras de vidrio. La intervención permitió recuperar la capacidad estructural del pavimento, optimizar las condiciones de drenaje del sector y disminuir la probabilidad de recurrencia del mecanismo de falla identificado.

Escuela Leningrado, Calle 82, barrio Leningrado II, comuna San Joaquín:

Se ejecutaron actividades de excavación para retirar el material deteriorado y adecuar el área de intervención. Posteriormente, se realizó la conformación y compactación de la base granular, garantizando las condiciones técnicas requeridas para la rehabilitación del pavimento. Finalmente, se aplicó el riego de imprimación y se llevó a cabo la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, restableciendo las condiciones estructurales y funcionales de la vía y mejorando la calidad de la superficie de rodadura.

Manzana 6, Quintas de Panorama II, comuna Consota: Debido al deterioro que presentaba el pavimento en adoquín, se llevó a cabo el retiro de las piezas existentes para iniciar las labores de rehabilitación. Posteriormente, se ejecutó la reposición de la base granular, realizando su conformación y compactación conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Como actividad final, se aplicó el riego de

imprimación y se instaló la mezcla asfáltica en caliente, permitiendo recuperar las condiciones funcionales del tramo intervenido y mejorar la calidad de la superficie de rodadura para el tránsito vehicular.

Reparación en el sector Terminal, Calle 17 con Carrera 19, barrio Boston: Como parte de las actividades de mantenimiento vial, se realizó el fresado de los sectores afectados, seguido de la limpieza integral de la superficie de intervención mediante barrido y sopleteo. Posteriormente, se aplicó el riego de imprimación conforme a las especificaciones técnicas y se procedió con la colocación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente, restableciendo la capa de rodadura y mejorando las condiciones de servicio de la vía.

Reparación de vías internas de MEPER, Convenio PONAL–Infraestructura, comuna El Jardín: Como parte de un acuerdo de colaboración inter institucional entre la Policía Nacional de Colombia y la Alcaldía Municipal, una vez recibida la solicitud por parte de La Secretaría de Gobierno y teniendo en cuenta el principio de celeridad en atención de emergencias, se ejecutaron actividades de mejoramiento vial en La Estación de Policía Metropolitana, para ello se adecuó el acceso a uno de los parqueaderos de esta institución con el propósito de optimizar las condiciones de ingreso y salida de los vehículos. En el área del parqueadero se realizó el extendido y conformación de material de fresado para mejorar la superficie de rodadura. Adicionalmente, en la vía de acceso se ejecutó el suministro, extendido y compactación de base granular. Posteriormente, se aplicó el riego de imprimación y se instaló la carpeta asfáltica en caliente, mejorando las condiciones de funcionalidad, seguridad y transitabilidad del acceso.

Sector D, Manzana 12, barrio Paz Verde, comuna Del Café: Como parte de las obras de mejoramiento vial, se realizó el suministro, extendido, conformación y compactación de la base granular, conformando la estructura necesaria para la pavimentación del tramo intervenido. Posteriormente, se aplicó el riego de imprimación y se efectuó la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, obteniendo una nueva superficie de rodadura que mejoró las condiciones de circulación, seguridad y funcionalidad de la vía.

Sector D, Manzana 6, barrio Paz Verde, comuna Del Café: Se ejecutaron trabajos de rehabilitación del pavimento mediante la técnica de Black Topping, iniciando con el sellado de juntas y fisuras existentes. En los sectores donde las losas de concreto presentaban un avanzado estado de deterioro, se realizó su demolición y el reemplazo de la estructura mediante la conformación y compactación de base granular. Posteriormente, se efectuó la limpieza de la superficie y la aplicación del riego de liga, seguida de la instalación de la geomalla asfáltica de refuerzo y, finalmente, de la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, permitiendo mejorar el comportamiento estructural del pavimento y prolongar su vida útil.

Vía La Siria, corregimiento Combia Baja: Se ejecutaron actividades de adecuación del área de intervención mediante la conformación y compactación de la base granular, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de la estructura del pavimento. Posteriormente, se aplicó el riego de imprimación y se llevó a cabo la instalación de la mezcla asfáltica en caliente, conformando una nueva superficie de rodadura y mejorando las condiciones de transitabilidad y funcionalidad de la vía.

Ejecución de trabajos en múltiples frentes de obras simultáneos

En atención a los compromisos adquiridos por el señor Alcalde durante los consejos comunitarios realizados en la vigencia 2025 en las 19 comunas y los 12 corregimientos del municipio de Pereira, se implementó una estrategia operativa intensiva, coordinada y orientada a resultados, con el propósito de dar respuesta efectiva a las necesidades manifestadas por la comunidad en materia de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial.

Dicha estrategia se fundamenta en la articulación de recursos técnicos, operativos y logísticos, así como en la priorización y programación de frentes de intervención, permitiendo ampliar la cobertura de las actividades de mantenimiento vial en el territorio municipal. De esta manera, se busca atender de manera progresiva y sistemática la totalidad de las solicitudes y

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

requerimientos presentados por las comunidades, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad, accesibilidad y calidad del servicio de la red vial urbana y rural.

Las actividades fueron ejecutadas mediante la conformación de múltiples cuadrillas de trabajo especializadas, cada una encargada de desarrollar las distintas operaciones requeridas en el proceso de rehabilitación de los sectores intervenidos. Estas labores comprendieron, entre otras, sellado de juntas y grietas, demoliciones localizadas, fresado de la carpeta existente, cajeo de baches, conformación y mejoramiento de la estructura granular, nivelación de superficies, seriado para control de cotas, aplicación de riego de imprimación, así como el extendido, nivelación y compactación de mezcla asfáltica.

La organización operativa de las cuadrillas permitió optimizar la secuencia constructiva y la ejecución simultánea de diferentes frentes de trabajo, garantizando eficiencia en el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos. Asimismo, con el fin de acelerar el avance de las obras y reducir las afectaciones a la movilidad urbana, las labores se desarrollaron mediante jornadas diurnas y nocturnas, incluyendo trabajos durante fines de semana, lo que permitió mantener la continuidad del proceso constructivo y minimizar el impacto sobre el flujo vehicular en los corredores intervenidos.

BALANCE

El contrato No. 4347 de 2026 en su CUARTO corte alcanzó una ejecución del 79,19% del presupuesto, restando un saldo del 20,81%.

BALANCE CONTRATO No. 4347 DE 2026		
VALOR CONTRATO	\$ 40.000.000.000,00	100,00%
PRIMER CORTE	\$ 10.222.089.278,52	25,56%
SEGUNDO CORTE	\$ 8.925.112.513,66	22,31%
TERCER CORTE	\$ 5.955.370.400,96	14,89%
CUARTO CORTE	\$ 6.573.769.926,08	16,43%
TOTAL EJECUTADO	\$ 31.676.342.119,22	79,19%
SALDO	\$ 8.323.657.880,78	20,81%

EJECUCIÓN POR ÍTEM

La siguiente tabla resume la ejecución del contrato por ítem para el CUARTO corte:

EJECUCIÓN POR ÍTEM – CUARTO CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	MDC-10 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m³	0	\$ 1.164.899,00	\$ -
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m³	4250,05	\$ 1.140.302,00	\$ 4.846.340.515,6
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	kg	3550	\$ 15.424,00	\$ 54.755.200,5
5	Subbase tipo A	m³	1276	\$ 112.562,00	\$ 143.629.112,0
6	Base tipo A	m³	1555	\$ 130.929,00	\$ 203.594.595,0
6	EMULSION ASFÁLTICA CRL-1(Asfalto Liquido 70-90 de curación rápida crl-1)	gal	3850	\$ 33.113,00	\$ 127.485.048,6
7	Geomalla Biaxial	m²	4124	\$ 29.557,00	\$ 121.893.068,5
8	Servicio de transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a diferentes sectores del departamento	m3*km	Global	\$ 3.000,00	\$ 1.076.072.386,0
10	Pintura base solvente acrílica para demarcación vial	gal	0,00	\$ 443.898,00	\$ -
11	Microesferas de vidrio para demarcación vial	kg	0,00	\$ 33.387,00	\$ -
12	Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos	gal	0,00	\$ 381.313,00	\$ -
16	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m³	0,00	\$ 927.098,00	\$ -
				TOTAL	\$ 6.573.769.926,08

La siguiente tabla muestra la facturación del contrato para el CUARTO corte:

FACTURACIÓN DEL TERCER CORTE - No. 4347 DE 2026		
FACTURA FV - 12572	Material asfáltico	\$ 5.150.473.833,10
FACTURA FV - 12573	Material Granular	\$ 347.223.707,00
FACTURA FV - 12574	Transporte	\$ 1.076.072.385,98
	Total Facturado	\$ 6.573.769.926,08

La siguiente tabla muestra los frentes de obra intervenidos con material asfáltico para este periodo.

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

EJECUCIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO POR OBRA – CUARTO CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
Alcaldía, carrera 8bis con calle 44, Turín, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,62	\$ -	\$ 7.301.765,75	\$ 7.301.765,75
Alcaldía, Reparcheo carrera 6 con Av. Del río, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,38	\$ -	\$ 7.071.788,87	\$ 7.071.788,87
Alcaldía, Resaltos sector Palo de Agua, San Joaquín	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,05	\$ -	\$ 6.755.570,67	\$ 6.755.570,67
Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector calle 72 Panadería Los Sauces. El Oso	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,49	\$ -	\$ 7.177.194,94	\$ 7.177.194,94
Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector estación de policía Mundo Nuevo, La Bella	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,71	\$ -	\$ 7.388.007,08	\$ 7.388.007,08
Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	1648,77	\$ 208.504.031,27	\$ 1.579.912.376,92	\$ 1.788.416.408,19
Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	1425,8	\$ 183.316.531,80	\$ 1.366.254.278,66	\$ 1.549.570.810,46
Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	228,74	\$ 29.985.984,08	\$ 219.187.125,61	\$ 249.173.109,69
Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,09	\$ 1.523.944,50	\$ 11.585.085,03	\$ 13.109.029,53
Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	32,66	\$ 4.775.479,88	\$ 31.296.019,60	\$ 36.071.499,48
Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	185,27	\$ 24.754.480,51	\$ 177.532.564,32	\$ 202.287.044,83
Escuela Leningrado, calle 82, Leningrado II, San Joaquín	Mezcla Asfáltica MDC-19	22,04	\$ 2.833.704,84	\$ 21.119.542,92	\$ 23.953.247,76
Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	30,04	\$ 3.862.272,84	\$ 28.785.438,72	\$ 32.647.711,56
Reparación sector terminal, calle 17 con 19, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,05	\$ 2.018.942,85	\$ 13.463.229,50	\$ 15.482.172,35
Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	96	\$ 12.826.848,00	\$ 91.990.749,58	\$ 104.817.597,58
Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	176,87	\$ 22.740.352,77	\$ 169.483.373,73	\$ 192.223.726,50
Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	86,23	\$ 11.086.677,33	\$ 82.628.774,34	\$ 93.715.451,67
Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	254,24	\$ 31.532.988,04	\$ 243.622.168,47	\$ 275.155.156,51
Emulsión para todas las obras	Emulsión Asfáltica CRL-1	3850	\$ -	\$ 107.130.292,50	\$ 107.130.292,50
Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	4124	\$ -	102431149,6	\$ 102.431.150
Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	3550	\$ -	\$ 46.012.773,11	\$ 46.012.773,11
Total asfalto MDC-10 m³	0	Subtotal	\$ 539.762.239	\$ 4.328.129.271	\$ 4.867.891.511
Total asfalto MDC-19 m³	4250,05	I.V.A	\$ 102.554.825	\$ 822.344.562	\$ 924.899.386
Total Emulsión gal	3850	Total	\$ 642.317.064	\$ 5.150.473.833	\$ 5.792.790.897
Total Cemento Asfáltico kg	3550				
Total Geomalla Biaxial m²	4124				

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

La siguiente tabla muestra los frentes de obra intervenidos con material subbase granular para este periodo.

EJECUCIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR POR OBRA – CUARTO CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	255	\$ 33.428.460,00	\$ 28.056.214,29	\$ 61.484.674,29
Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Base Granular	46	\$ 5.798.300,00	\$ 5.061.121,01	\$ 10.859.421,01
Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Base Granular	51	\$ 7.457.118,00	\$ 5.611.242,86	\$ 13.068.360,86
Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	101	\$ 13.494.913,00	\$ 11.112.461,34	\$ 24.607.374,34
Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Base Granular	61	\$ 7.842.831,00	\$ 6.711.486,55	\$ 14.554.317,55
Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	Base Granular	29	\$ 3.728.559,00	\$ 3.190.706,72	\$ 6.919.265,72
Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	154	\$ 20.576.402,00	\$ 16.943.752,94	\$ 37.520.154,94
Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	331	\$ 42.557.001,00	\$ 36.418.066,39	\$ 78.975.067,39
Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	99	\$ 12.728.529,00	\$ 10.892.412,61	\$ 23.620.941,61
Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	428	\$ 53.084.168,04	\$ 47.090.430,25	\$ 100.174.598,29
<i>Total Base Granular</i>	<i>1555</i>	<i>Subtotal</i>	\$ 200.696.281,04	\$ 171.087.894,96	\$ 371.784.176,00
		<i>I.V.A</i>	\$ 38.132.293,40	\$ 32.506.700,04	\$ 70.638.993,44
		<i>Total</i>	\$ 238.828.574,44	\$ 203.594.595,00	\$ 442.423.169,44

La siguiente tabla muestra los frentes de obra intervenidos con material subbase para este periodo.

EJECUCIÓN DE MATERIAL SUB-BASE GRANULAR POR OBRA – CUARTO CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Sub-Base Granular	14	\$ 1.764.700,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.088.958,82
Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Sub-Base Granular	51	\$ 7.457.118,00	\$ 4.824.085,71	\$ 12.281.203,71
Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	105	\$ 14.029.365,00	\$ 9.931.941,18	\$ 23.961.306,18
Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Sub-Base Granular	59	\$ 7.585.689,00	\$ 5.580.805,04	\$ 13.166.494,04
Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	150	\$ 20.041.950,00	\$ 14.188.487,39	\$ 34.230.437,39
Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	368	\$ 47.314.128,00	\$ 34.809.089,08	\$ 82.123.217,08
Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	529	\$ 65.611.039,47	\$ 50.038.065,55	\$ 115.649.105,02

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

<i>Total Sub-Base Granular</i>	1276	<i>Subtotal</i>	\$ 163.803.989,47	\$ 120.696.732,77	\$ 284.500.722,24
		<i>I.V.A</i>	\$ 31.122.758,00	\$ 22.932.379,23	\$ 54.055.137,23
		<i>Total</i>	\$ 194.926.747,47	\$ 143.629.112,00	\$ 338.555.859,47

La siguiente tabla muestra la distribución de material asfáltico por obra:

ÁREA INTERVENIDA - VOLÚMENES DE MEZCLA ASFALTICA MDC 19 - VOLUMEN EMULSIÓN - CUARTO CORTE					
FRENTE DE OBRA	Área (m²)	Espesor promedio (cm)	Expansión	Volumen suelto (m³)	Emulsión (Gal)
Alcaldía, carrera 8bis con calle 44, Turín, Centro	174,3	0,0350	1,25	7,62	24,53
Alcaldía, Reparcheo carrera 6 con Av. Del río, Oriente	55,2	0,1070	1,25	7,38	7,77
Alcaldía, Resaltos sector Palo de Agua, San Joaquín	47,0	0,1200	1,25	7,05	6,61
Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector calle 72 Panadería Los Sauces. El Oso	66,6	0,0900	1,25	7,49	9,37
Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector estación de policía Mundo Nuevo, La Bella	51,4	0,1200	1,25	7,71	7,24
Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	9691,0	0,1361	1,25	1648,77	1364,41
Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	8707,2	0,1310	1,25	1425,8	1225,89
Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	1794,1	0,1020	1,25	228,74	252,59
Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	120,9	0,0800	1,25	12,09	17,02
Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	261,3	0,1000	1,25	32,66	36,78
Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	1195,3	0,1240	1,25	185,27	168,29
Escuela Leningrado, calle 82, Leningrado II, San Joaquín	263,2	0,0670	1,25	22,04	37,06
Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	253,0	0,0950	1,25	30,04	35,62
Reparación sector terminal, calle 17 con 19, Boston	74,9	0,1500	1,25	14,05	10,55
Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	745,6	0,1030	1,25	96	104,98
Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	1322,4	0,1070	1,25	176,87	186,18
Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	689,9	0,1000	1,25	86,23	97,13
Vía, La Siria, Combia Baja	1832,4	0,1110	1,25	254,24	257,98
Total área	27345,43		Total	4250,05	3850,00

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Las siguientes tablas muestran dimensiones por obra y uso de material asfáltico suelto por obra:

1	Alcaldía, carrera 8bis con calle 44, Turín, Centro				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
25	6,35	158,75	0,035	1,25	6,95
3,4	2,5	8,50	0,035	1,25	0,37
2,5	2,8	7,00	0,035	1,25	0,31
		174,25			7,62

2	Alcaldía, Reparcheo carrera 6 con Av. Del río, Oriente				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
7,88	7	55,16	0,107	1,25	7,38
		55,16			7,38

3	Alcaldía, Resaltos sector Palo de Agua, San Joaquín				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
6,52	3,6	23,47	0,12	1,25	3,52
6,53	3,6	23,51	0,12	1,25	3,53
		46,98			7,05

4	Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector calle 72 Panadería Los Sauces. El Oso				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
9,5	4,5	42,75	0,09	1,25	4,81
15,5	3,1	48,05	0,09	1,25	5,41
8,21	2,9	23,81	0,09	1,25	2,68
		66,56			7,49

5	Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector estación de policía Mundo Nuevo, La Bella				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

6	3,6	21,60	0,12	1,25	3,24
5,5	5,42	29,81	0,12	1,25	4,47
		0,00	0,12	1,25	0,00
		51,41			7,71

7	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
48,3	10,2	492,66	0,131	1,25	80,67
305,3	13	3968,90	0,131	1,25	649,91
47	14	658,00	0,131	1,25	107,75
117,3	7,8	914,94	0,131	1,25	149,82
120	6	720,00	0,131	1,25	117,90
3,42	3,2	10,94	0,131	1,25	1,79
288,2	6,6	1902,12	0,131	1,25	311,47
22	1,8	39,60	0,131	1,25	6,48
		8707,16			1425,80

8	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
168,1	8,28	1391,87	0,102	1,25	177,46
17	1,2	20,40	0,102	1,25	2,60
12,8	4,5	57,60	0,102	1,25	7,34
8,5	4	34,00	0,102	1,25	4,34
8	4,4	35,20	0,102	1,25	4,49
18,4	2	36,80	0,102	1,25	4,69
7,45	1	7,45	0,102	1,25	0,95
20,1	1,8	36,18	0,102	1,25	4,61
7,8	3,2	24,96	0,102	1,25	3,18
20	5,6	112,00	0,102	1,25	14,28
9,4	4	37,60	0,102	1,25	4,79
		1794,06			228,74

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

9	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
22,2	5	111,00	0,08	1,25	11,10
2,8	1,1	3,08	0,08	1,25	0,31
4	1,7	6,80	0,08	1,25	0,68
		120,88			12,09

10	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
42,5	6	255,00	0,1	1,25	31,88
2,5	2,5	6,25	0,1	1,25	0,78
		261,25			32,66

11	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
93,27	12,36	1152,82	0,124	1,25	178,69
11,8	3,6	42,48	0,124	1,25	6,58
		1195,30			185,27

12	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
39,5	5	197,50	0,067	1,25	16,54
10,95	6	65,70	0,067	1,25	5,50
		263,20			22,04

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

13	Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
60,4	3,2	193,28	0,095	1,25	22,95
6,22	9,6	59,71	0,095	1,25	7,09
		252,99			30,04

14	Reparación sector terminal, calle 17 con 19, Boston				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
18,28	4,1	74,95	0,15	1,25	14,05
		74,95			14,05

15	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
90,4	5,2	470,08	0,103	1,25	60,52
6,45	6,5	41,93	0,103	1,25	5,40
38,94	6	233,64	0,103	1,25	30,08
		745,65			96,00

16	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
152,1	3,72	565,81	0,107	1,25	75,68
137	5,45	746,65	0,107	1,25	99,86
4,74	2,1	9,95	0,107	1,25	1,33
		1322,42			176,87

17	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
108,3	6,2	671,46	0,1	1,25	83,93

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

5,5	1,8	9,90	0,1	1,25	1,24
2,84	3	8,52	0,1	1,25	1,07
		689,88			86,24

18	Vía, La Siria, Combia Baja				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
300	6,03	1809,00	0,111	1,25	251,00
7,08	3,3	23,36	0,111	1,25	3,24
		1832,36			254,24

Las siguientes tablas muestran dimensiones por obra y uso de material Base y Subbase suelto, por obra:

8	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
1794,06	0,1137	255,00	0,000	0,00
9	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
120,88	0,3044	46,00	0,093	14,00

10	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
689,88	0,0591	51,00	0,059	51,00

11	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
1195,30	0,0676	101,00	0,070	105,00

12	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
263,20	0,1875	61,68	0,179	59,00

13	Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
252,99	0,0917	29,00	0,000	0,00

5	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
745,65	0,1652	154,00	0,161	150,00

16	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
1322,42	0,2002	331,00	0,223	368,00

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

17	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
689,88	0,1148	99,00	0,000	0,00

18	Vía, La Siria, Combia Baja			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
1832,36	0,1869	428,00	0,231	529,00

Las siguientes tablas muestran la localización de las obras con coordenadas *Google Maps*

PROYECTOS ASFALTO 2026			
	OBRAS	COORDENADAS	LINK DE ACCESO
1	Alcaldía, carrera 8bis con calle 44, Turín, Centro	4°48'57.27"N 75°42'55.19"W	https://maps.app.goo.gl/QJPtiT41XAUWY8EX7
2	Alcaldía, Reparcheo carrera 6 con Av. Del río, Oriente	4°48'52.60"N 75°40'59.85"W	https://maps.app.goo.gl/tFSM5n6cTyiC8kAH8
3	Alcaldía, Resaltos sector Palo de Agua, San Joaquín	4°47'33.68"N 75°45'01.60"W	https://maps.app.goo.gl/M3e3GggafHRnn7oWA
4	Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector calle 72 Panadería Los Sauces. El Oso	4°48'07.45"N 75°44'00.04"W	https://maps.app.goo.gl/N2PsPnuxP2mZXJG47
5	Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector estación de policía Mundo Nuevo, La Bella	4°47'12.17"N 75°41'02.02"W	https://maps.app.goo.gl/PZueCyPMZup1jJRK7
6	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	4°48'40.9"N 75°46'20.4"W	https://maps.app.goo.gl/1jZ6VkuXWhdf5FycA
7	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	4°48'47.68"N 75°44'01.01"W	https://maps.app.goo.gl/U4Qc7ZKtZLQ1KzxV6

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

8	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	4°48'48.41"N 75°42'28.57"W	https://maps.app.goo.gl/Vw8zvNdx7qnv4E88
9	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	4°47'50.67"N 75°44'44.37"W	https://maps.app.goo.gl/baNZxp3GvRYgoUVh9
10	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	4°48'14.32"N 75°39'57.82"W	https://maps.app.goo.gl/1cLiPCd2VZ9N9HrW7
11	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	4°47'55.18"N 75°41'30.70"W	https://maps.app.goo.gl/9pgxx8f7bCjTuDrK6
12	Escuela Leningrado, calle 82, Leningrado II, San Joaquín	4°47'55.77"N 75°44'17.16"W	https://maps.app.goo.gl/xKyvu8t6M3ci2raE8
13	Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	4°48'01.01"N 75°43'35.12"W	https://maps.app.goo.gl/8kpQYjiFPzJVKAtN7
14	Reparación sector terminal, calle 17 con 19, Boston	4°48'13.50"N 75°41'37.36"W	https://maps.app.goo.gl/gYroN34no4ojxXWs7
15	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	4°48'18.35"N 75°43'06.25"W	https://maps.app.goo.gl/mURzJJmDaLrRAFvXA
16	Sector d, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	4°49'10.68"N 75°43'42.52"W	https://maps.app.goo.gl/BhM6FFAHfgeBiQv19
17	Sector d, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	4°49'11.70"N 75°43'49.58"W	https://maps.app.goo.gl/nam4tiHJj9uMZH1i7
18	Vía, La Siria, Combia Baja	4°49'17.6"N 75°45'22.8"W	https://maps.app.goo.gl/LzwhJ7djut1Y1LhV6

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

La siguiente tabla muestra la ejecución del CUARTO corte de material asfáltico y geomalla del contrato No. 4347 de 2026

EJECUCIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO POR OBRA – CUARTO CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026						
FECHA	FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
21/05/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	890	\$ -	\$ 11.535.596,64	\$ 11.535.596,64
21/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,26	\$ 1.929.784,94	\$ 14.622.696,24	\$ 16.552.481,18
21/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,87	\$ 1.880.465,40	\$ 14.248.983,82	\$ 16.129.449,22
21/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,94	\$ 1.889.317,63	\$ 14.316.060,40	\$ 16.205.378,03
21/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,87	\$ 1.880.465,40	\$ 14.248.983,82	\$ 16.129.449,22
26/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15	\$ 1.896.905,25	\$ 14.373.554,62	\$ 16.270.459,87
26/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,43	\$ 1.951.283,20	\$ 14.785.596,52	\$ 16.736.879,72
26/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,28	\$ 1.932.314,15	\$ 14.641.860,97	\$ 16.574.175,12
26/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,31	\$ 1.936.107,96	\$ 14.670.608,08	\$ 16.606.716,04
26/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,59	\$ 1.845.056,51	\$ 13.980.677,46	\$ 15.825.733,97
26/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,69	\$ 1.857.702,54	\$ 14.076.501,16	\$ 15.934.203,70
27/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,59	\$ 1.971.516,86	\$ 14.938.914,44	\$ 16.910.431,29
27/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.913.345,10	\$ 14.498.125,43	\$ 16.411.470,52
27/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,52	\$ 1.962.664,63	\$ 14.871.837,85	\$ 16.834.502,48
27/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,14	\$ 1.914.609,70	\$ 14.507.707,80	\$ 16.422.317,50
27/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,65	\$ 1.852.644,13	\$ 14.038.171,68	\$ 15.890.815,81
27/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 1.770.444,90	\$ 13.415.317,65	\$ 15.185.762,55
28/05/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	120	\$ -	\$ 1.555.361,34	\$ 1.555.361,34
28/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 1.928.520,34	\$ 14.613.113,87	\$ 16.541.634,20
28/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,74	\$ 1.864.025,56	\$ 14.124.413,01	\$ 15.988.438,57
28/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15	\$ 1.896.905,25	\$ 14.373.554,62	\$ 16.270.459,87
28/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,97	\$ 1.893.111,44	\$ 14.344.807,51	\$ 16.237.918,95
28/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,33	\$ 1.938.637,17	\$ 14.689.772,82	\$ 16.628.409,99
28/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,76	\$ 1.866.554,77	\$ 14.143.577,75	\$ 16.010.132,51

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

29/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,17	\$ 1.918.403,51	\$ 14.536.454,91	\$ 16.454.858,42
29/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,34	\$ 1.939.901,77	\$ 14.699.355,19	\$ 16.639.256,96
29/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,23	\$ 1.925.991,13	\$ 14.593.949,13	\$ 16.519.940,26
29/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 1.908.286,68	\$ 14.459.795,95	\$ 16.368.082,63
29/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,7	\$ 1.858.967,15	\$ 14.086.083,53	\$ 15.945.050,67
29/05/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,7	\$ 1.858.967,15	\$ 14.086.083,53	\$ 15.945.050,67
4/06/2026	Emulsión para todas las obras	Emulsión Asfáltica CRL-1	1925	\$ -	\$ 53.565.146,25	\$ 53.565.146,25
5/06/2026	Emulsión para todas las obras	Emulsión Asfáltica CRL-1	275	\$ -	\$ 7.652.163,75	\$ 7.652.163,75
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,46	\$ 1.828.616,66	\$ 13.856.106,66	\$ 15.684.723,32
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,46	\$ 1.955.077,01	\$ 14.814.343,63	\$ 16.769.420,64
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 1.908.286,68	\$ 14.459.795,95	\$ 16.368.082,63
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,23	\$ 1.925.991,13	\$ 14.593.949,13	\$ 16.519.940,26
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,53	\$ 1.963.929,24	\$ 14.881.420,22	\$ 16.845.349,45
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,8	\$ 1.871.613,18	\$ 14.181.907,23	\$ 16.053.520,41
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,14	\$ 1.914.609,70	\$ 14.507.707,80	\$ 16.422.317,50
5/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,64	\$ 1.851.379,52	\$ 14.028.589,31	\$ 15.879.968,83
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,37	\$ 1.943.695,58	\$ 14.728.102,30	\$ 16.671.797,88
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,34	\$ 1.813.441,42	\$ 13.741.118,22	\$ 15.554.559,64
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,5	\$ 1.833.675,08	\$ 13.894.436,13	\$ 15.728.111,21
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,58	\$ 1.970.252,25	\$ 14.929.332,07	\$ 16.899.584,32
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,66	\$ 1.980.369,08	\$ 15.005.991,03	\$ 16.986.360,11
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,86	\$ 2.005.661,15	\$ 15.197.638,42	\$ 17.203.299,57
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,99	\$ 1.769.180,30	\$ 13.405.735,28	\$ 15.174.915,57
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,33	\$ 1.812.176,82	\$ 13.731.535,85	\$ 15.543.712,66
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 1.928.520,34	\$ 14.613.113,87	\$ 16.541.634,20
6/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,89	\$ 1.882.994,61	\$ 14.268.148,55	\$ 16.151.143,17
9/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,7	\$ 1.858.967,15	\$ 14.086.083,53	\$ 15.945.050,67
9/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,98	\$ 2.020.836,39	\$ 15.312.626,86	\$ 17.333.463,25

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

9/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.900.699,06	\$ 14.402.301,73	\$ 16.303.000,79
9/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,22	\$ 1.924.726,53	\$ 14.584.366,76	\$ 16.509.093,28
9/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,71	\$ 1.860.231,75	\$ 14.095.665,90	\$ 15.955.897,65
9/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,8	\$ 1.871.613,18	\$ 14.181.907,23	\$ 16.053.520,41
10/06/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	812	\$ -	\$ 20.168.305,88	\$ 20.168.305,88
10/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,18	\$ 1.823.136,78	\$ 13.587.800,30	\$ 15.410.937,08
10/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,91	\$ 1.788.422,61	\$ 13.329.076,32	\$ 15.117.498,93
10/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,08	\$ 1.810.279,68	\$ 13.491.976,61	\$ 15.302.256,29
10/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,83	\$ 1.778.136,93	\$ 13.252.417,36	\$ 15.030.554,29
10/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 1.799.994,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.215.311,65
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15	\$ 1.896.905,25	\$ 14.373.554,62	\$ 16.270.459,87
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 1.898.169,85	\$ 14.383.136,99	\$ 16.281.306,85
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,18	\$ 1.919.668,11	\$ 14.546.037,28	\$ 16.465.705,39
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,83	\$ 1.875.406,99	\$ 14.210.654,34	\$ 16.086.061,33
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,96	\$ 1.891.846,84	\$ 14.335.225,14	\$ 16.227.071,98
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,93	\$ 1.888.053,03	\$ 14.306.478,03	\$ 16.194.531,06
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.900.699,06	\$ 14.402.301,73	\$ 16.303.000,79
10/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,5	\$ 1.580.754,38	\$ 11.977.962,18	\$ 13.558.716,56
10/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	8,12	\$ 1.043.996,52	\$ 7.780.884,24	\$ 8.824.880,76
10/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	8,11	\$ 1.042.710,81	\$ 7.771.301,87	\$ 8.814.012,68
11/06/2026	Cemento Asfáltico - Sello de de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	500	\$ -	\$ 6.480.672,27	\$ 6.480.672,27
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,05	\$ 1.903.228,27	\$ 14.421.466,47	\$ 16.324.694,74
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,7	\$ 1.761.422,70	\$ 13.127.846,55	\$ 14.889.269,25
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,14	\$ 1.817.993,94	\$ 13.549.470,82	\$ 15.367.464,76
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,98	\$ 1.797.422,58	\$ 13.396.152,91	\$ 15.193.575,49
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,15	\$ 1.819.279,65	\$ 13.559.053,19	\$ 15.378.332,84
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,25	\$ 1.832.136,75	\$ 13.654.876,89	\$ 15.487.013,64
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,35	\$ 1.941.166,37	\$ 14.708.937,56	\$ 16.650.103,94

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,26	\$ 1.676.864,24	\$ 12.706.222,29	\$ 14.383.086,53
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,54	\$ 1.712.273,14	\$ 12.974.528,64	\$ 14.686.801,78
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13	\$ 1.643.984,55	\$ 12.457.080,67	\$ 14.101.065,22
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,77	\$ 1.741.359,02	\$ 13.194.923,14	\$ 14.936.282,16
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,46	\$ 1.702.156,31	\$ 12.897.869,68	\$ 14.600.025,99
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,22	\$ 1.798.266,18	\$ 13.626.129,78	\$ 15.424.395,96
11/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,45	\$ 1.700.891,71	\$ 12.888.287,31	\$ 14.589.179,02
16/06/2026	Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector calle 72 Panadería Los Sauces. El Oso	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,49	\$ -	\$ 7.177.194,94	\$ 7.177.194,94
17/06/2026	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,09	\$ 1.523.944,50	\$ 11.585.085,03	\$ 13.109.029,53
17/06/2026	Alcaldía, Resaltos sector Palo de Agua, San Joaquín	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,05	\$ -	\$ 6.755.570,67	\$ 6.755.570,67
17/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,02	\$ 1.416.852,42	\$ 10.559.771,46	\$ 11.976.623,88
17/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,02	\$ 1.416.852,42	\$ 10.559.771,46	\$ 11.976.623,88
17/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,87	\$ 2.006.925,75	\$ 15.207.220,79	\$ 17.214.146,54
17/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,69	\$ 1.984.162,89	\$ 15.034.738,13	\$ 17.018.901,03
17/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,87	\$ 2.006.925,75	\$ 15.207.220,79	\$ 17.214.146,54
17/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16,11	\$ 2.037.276,24	\$ 15.437.197,66	\$ 17.474.473,90
17/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16,03	\$ 2.027.159,41	\$ 15.360.538,71	\$ 17.387.698,12
17/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,54	\$ 1.965.193,84	\$ 14.891.002,59	\$ 16.856.196,43
18/06/2026	Alcaldía, Reparcheo carrera 6 con Av. Del río, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,38	\$ -	\$ 7.071.788,87	\$ 7.071.788,87
18/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,19	\$ 1.920.932,72	\$ 14.555.619,65	\$ 16.476.552,36
18/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,95	\$ 2.017.042,58	\$ 15.283.879,75	\$ 17.300.922,33
18/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,57	\$ 1.968.987,65	\$ 14.919.749,70	\$ 16.888.737,35
18/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,4	\$ 1.947.489,39	\$ 14.756.849,41	\$ 16.704.338,80
18/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,25	\$ 1.802.059,99	\$ 13.654.876,89	\$ 15.456.936,88
18/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,66	\$ 1.727.448,38	\$ 13.089.517,08	\$ 14.816.965,46
19/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,5	\$ 1.973.943,00	\$ 12.936.199,16	\$ 14.910.142,16

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

19/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,5	\$ 1.973.943,00	\$ 12.936.199,16	\$ 14.910.142,16
19/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,22	\$ 1.924.726,53	\$ 14.584.366,76	\$ 16.509.093,28
19/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,17	\$ 1.918.403,51	\$ 14.536.454,91	\$ 16.454.858,42
19/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.900.699,06	\$ 14.402.301,73	\$ 16.303.000,79
19/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,15	\$ 1.915.874,30	\$ 14.517.290,17	\$ 16.433.164,47
19/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,95	\$ 1.890.582,23	\$ 14.325.642,77	\$ 16.216.225,01
19/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,69	\$ 1.857.702,54	\$ 14.076.501,16	\$ 15.934.203,70
19/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	5,66	\$ 827.593,88	\$ 5.423.621,28	\$ 6.251.215,16
20/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,33	\$ 1.970.993,43	\$ 14.689.772,82	\$ 16.660.766,25
20/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,81	\$ 2.032.707,51	\$ 15.149.726,57	\$ 17.182.434,08
20/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,69	\$ 2.017.278,99	\$ 15.034.738,13	\$ 17.052.017,12
20/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,2	\$ 1.954.279,20	\$ 14.565.202,02	\$ 16.519.481,22
20/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.913.345,10	\$ 14.498.125,43	\$ 16.411.470,52
20/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,49	\$ 1.958.870,82	\$ 14.843.090,74	\$ 16.801.961,56
20/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,4	\$ 1.947.489,39	\$ 14.756.849,41	\$ 16.704.338,80
20/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,73	\$ 1.862.760,96	\$ 14.114.830,64	\$ 15.977.591,59
20/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,23	\$ 1.799.530,78	\$ 13.635.712,15	\$ 15.435.242,93
22/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	9,02	\$ 1.159.710,42	\$ 8.643.297,51	\$ 9.803.007,93
22/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,07	\$ 2.013.547,91	\$ 14.440.631,21	\$ 16.454.179,12
22/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,54	\$ 1.942.733,02	\$ 13.932.765,61	\$ 15.875.498,63
22/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,1	\$ 2.017.556,30	\$ 14.469.378,32	\$ 16.486.934,62
22/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,39	\$ 2.056.304,07	\$ 14.747.267,04	\$ 16.803.571,11
22/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 2.037.598,25	\$ 14.613.113,87	\$ 16.650.712,12
22/06/2026	Reparación sector terminal, calle 17 con 19, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,05	\$ 2.018.942,85	\$ 13.463.229,50	\$ 15.482.172,35

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

22/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
22/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
22/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
22/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,88	\$ 1.527.423,48	\$ 11.383.855,26	\$ 12.911.278,74
22/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,07	\$ 1.808.993,97	\$ 13.482.394,24	\$ 15.291.388,21
22/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	9,65	\$ 1.240.710,15	\$ 9.246.986,81	\$ 10.487.696,96
22/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	9,71	\$ 1.297.382,23	\$ 9.304.481,03	\$ 10.601.863,26
22/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	10,94	\$ 1.461.726,22	\$ 10.483.112,50	\$ 11.944.838,72
23/06/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	1830	\$ -	\$ 45.453.201,68	\$ 45.453.201,68
23/06/2026	Alcaldía, Resaltos y reparcheo sector estación de policía Mundo Nuevo, La Bella	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,71	\$ -	\$ 7.388.007,08	\$ 7.388.007,08
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,23	\$ 1.996.531,16	\$ 14.593.949,13	\$ 16.590.480,29
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,41	\$ 2.020.127,72	\$ 14.766.431,78	\$ 16.786.559,50
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,86	\$ 1.948.027,12	\$ 14.239.401,45	\$ 16.187.428,57
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,61	\$ 1.915.254,12	\$ 13.999.842,20	\$ 15.915.096,32
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.970.312,76	\$ 14.402.301,73	\$ 16.372.614,49
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,88	\$ 1.950.648,96	\$ 14.258.566,18	\$ 16.209.215,14
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,73	\$ 1.989.221,31	\$ 15.073.067,61	\$ 17.062.288,92
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,4	\$ 1.441.647,99	\$ 10.923.901,51	\$ 12.365.549,50
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,48	\$ 1.578.225,17	\$ 11.958.797,45	\$ 13.537.022,61
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,64	\$ 1.471.998,47	\$ 11.153.878,39	\$ 12.625.876,86
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,7	\$ 1.985.427,50	\$ 15.044.320,50	\$ 17.029.748,00
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,99	\$ 2.022.101,00	\$ 15.322.209,23	\$ 17.344.310,22
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,99	\$ 2.022.101,00	\$ 15.322.209,23	\$ 17.344.310,22
23/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

24/06/2026	Cemento Asfáltico - Sello de de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	410	\$ -	\$ 5.314.151,26	\$ 5.314.151,26
24/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,97	\$ 1.962.447,24	\$ 14.344.807,51	\$ 16.307.254,75
24/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,61	\$ 1.915.254,12	\$ 13.999.842,20	\$ 15.915.096,32
24/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,91	\$ 1.823.489,72	\$ 13.329.076,32	\$ 15.152.566,04
24/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,42	\$ 1.890.346,64	\$ 13.817.777,18	\$ 15.708.123,82
24/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,07	\$ 1.844.464,44	\$ 13.482.394,24	\$ 15.326.858,68
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.945.279,23	\$ 14.498.125,43	\$ 16.443.404,66
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,71	\$ 1.891.279,41	\$ 14.095.665,90	\$ 15.986.945,31
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,04	\$ 1.933.707,84	\$ 14.411.884,10	\$ 16.345.591,94
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,22	\$ 1.956.850,62	\$ 14.584.366,76	\$ 16.541.217,38
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,18	\$ 1.951.707,78	\$ 14.546.037,28	\$ 16.497.745,06
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,88	\$ 1.913.136,48	\$ 14.258.566,18	\$ 16.171.702,66
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,91	\$ 2.011.984,17	\$ 15.245.550,27	\$ 17.257.534,44
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,96	\$ 2.018.307,19	\$ 15.293.462,12	\$ 17.311.769,30
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
24/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EDS Don Ernesto, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.023.365,60	\$ 15.331.791,60	\$ 17.355.157,20
25/06/2026	Emulsión para todas las obras	Emulsión Asfáltica CRL-1	1650	\$ -	\$ 45.912.982,50	\$ 45.912.982,50
25/06/2026	Alcaldía, carrera 8bis con calle 44, Turín, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,62	\$ -	\$ 7.301.765,75	\$ 7.301.765,75
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 1.891.433,56	\$ 14.613.113,87	\$ 16.504.547,42
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,98	\$ 1.857.945,88	\$ 14.354.389,88	\$ 16.212.335,76
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,1	\$ 1.872.829,29	\$ 14.469.378,32	\$ 16.342.207,61
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,89	\$ 1.846.783,32	\$ 14.268.148,55	\$ 16.114.931,88
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,71	\$ 1.824.458,21	\$ 14.095.665,90	\$ 15.920.124,10
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,22	\$ 1.887.712,70	\$ 14.584.366,76	\$ 16.472.079,46
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,81	\$ 1.836.861,05	\$ 14.191.489,60	\$ 16.028.350,64
26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,51	\$ 1.994.136,21	\$ 14.862.255,48	\$ 16.856.391,69
26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,41	\$ 1.852.708,11	\$ 13.808.194,81	\$ 15.660.902,92

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 1.940.136,39	\$ 14.459.795,95	\$ 16.399.932,34
26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,87	\$ 1.911.850,77	\$ 14.248.983,82	\$ 16.160.834,59
26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,06	\$ 1.936.279,26	\$ 14.431.048,84	\$ 16.367.328,10
26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,11	\$ 1.942.707,81	\$ 14.478.960,69	\$ 16.421.668,50
26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,55	\$ 1.870.708,05	\$ 13.942.347,98	\$ 15.813.056,03
26/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,42	\$ 1.982.564,82	\$ 14.776.014,15	\$ 16.758.578,97
26/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,31	\$ 1.898.875,26	\$ 14.670.608,08	\$ 16.569.483,35
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,15	\$ 1.879.030,71	\$ 14.517.290,17	\$ 16.396.320,88
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,88	\$ 1.845.543,04	\$ 14.258.566,18	\$ 16.104.109,22
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15	\$ 1.860.426,45	\$ 14.373.554,62	\$ 16.233.981,07
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,87	\$ 1.844.302,75	\$ 14.248.983,82	\$ 16.093.286,57
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 1.861.666,73	\$ 14.383.136,99	\$ 16.244.803,73
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,9	\$ 1.848.023,61	\$ 14.277.730,92	\$ 16.125.754,53
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,11	\$ 1.874.069,58	\$ 14.478.960,69	\$ 16.353.030,27
27/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.945.279,23	\$ 14.498.125,43	\$ 16.443.404,66
27/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,55	\$ 1.999.279,05	\$ 14.900.584,96	\$ 16.899.864,01
27/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,22	\$ 1.956.850,62	\$ 14.584.366,76	\$ 16.541.217,38
27/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,65	\$ 2.012.136,15	\$ 14.996.408,66	\$ 17.008.544,81
27/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,49	\$ 1.862.993,79	\$ 13.884.853,76	\$ 15.747.847,55
27/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,46	\$ 1.987.707,66	\$ 14.814.343,63	\$ 16.802.051,29
27/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 1.799.994,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.215.311,65
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,78	\$ 1.709.111,77	\$ 13.204.505,51	\$ 14.913.617,28
27/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,27	\$ 1.893.914,13	\$ 14.632.278,61	\$ 16.526.192,73
30/06/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	730	\$ -	\$ 9.461.781,51	\$ 9.461.781,51
30/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,28	\$ 2.003.085,76	\$ 14.641.860,97	\$ 16.644.946,73
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,22	\$ 1.956.850,62	\$ 14.584.366,76	\$ 16.541.217,38
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,3	\$ 1.967.136,30	\$ 14.661.025,71	\$ 16.628.162,01
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,77	\$ 1.898.993,67	\$ 14.153.160,12	\$ 16.052.153,79

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,65	\$ 2.012.136,15	\$ 14.996.408,66	\$ 17.008.544,81
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,86	\$ 1.910.565,06	\$ 14.239.401,45	\$ 16.149.966,51
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,92	\$ 1.918.279,32	\$ 14.296.895,66	\$ 16.215.174,98
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,07	\$ 1.937.564,97	\$ 14.440.631,21	\$ 16.378.196,18
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 1.929.850,71	\$ 14.383.136,99	\$ 16.312.987,70
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,3	\$ 1.967.136,30	\$ 14.661.025,71	\$ 16.628.162,01
30/06/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,49	\$ 1.734.422,79	\$ 12.926.616,79	\$ 14.661.039,58
30/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,06	\$ 1.843.153,52	\$ 13.472.811,87	\$ 15.315.965,39
30/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,18	\$ 1.727.792,56	\$ 12.629.563,33	\$ 14.357.355,89
30/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	10,01	\$ 1.312.230,92	\$ 9.591.952,12	\$ 10.904.183,04
30/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,21	\$ 1.862.817,32	\$ 13.616.547,41	\$ 15.479.364,73
1/07/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	900	\$ -	\$ 11.665.210,08	\$ 11.665.210,08
1/07/2026	Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,06	\$ 1.936.279,26	\$ 14.431.048,84	\$ 16.367.328,10
1/07/2026	Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,98	\$ 1.925.993,58	\$ 14.354.389,88	\$ 16.280.383,46
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,24	\$ 1.959.422,04	\$ 14.603.531,50	\$ 16.562.953,54
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 1.931.136,42	\$ 14.392.719,36	\$ 16.323.855,78
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,7	\$ 1.889.993,70	\$ 14.086.083,53	\$ 15.976.077,23
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,99	\$ 1.927.279,29	\$ 14.363.972,25	\$ 16.291.251,54
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.932.422,13	\$ 14.402.301,73	\$ 16.334.723,86
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,1	\$ 1.941.422,10	\$ 14.469.378,32	\$ 16.410.800,42
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,97	\$ 1.924.707,87	\$ 14.344.807,51	\$ 16.269.515,38
1/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 1.929.850,71	\$ 14.383.136,99	\$ 16.312.987,70
1/07/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	246	\$ -	\$ 6.110.102,52	\$ 6.110.102,52
2/07/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	1236	\$ -	\$ 30.699.539,50	\$ 30.699.539,50
2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,91	\$ 1.992.169,83	\$ 14.287.313,29	\$ 16.279.483,12
2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,22	\$ 1.899.976,86	\$ 13.626.129,78	\$ 15.526.106,64

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,62	\$ 1.953.422,06	\$ 14.009.424,57	\$ 15.962.846,63
2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,62	\$ 1.953.422,06	\$ 14.009.424,57	\$ 15.962.846,63
2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,61	\$ 1.952.085,93	\$ 13.999.842,20	\$ 15.951.928,13
2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,58	\$ 1.948.077,54	\$ 13.971.095,09	\$ 15.919.172,63
2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,04	\$ 2.009.539,52	\$ 14.411.884,10	\$ 16.421.423,62
2/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,58	\$ 1.948.077,54	\$ 13.971.095,09	\$ 15.919.172,63
2/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,51	\$ 1.865.565,21	\$ 13.904.018,50	\$ 15.769.583,71
2/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,46	\$ 1.859.136,66	\$ 13.856.106,66	\$ 15.715.243,32
2/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,22	\$ 1.828.279,62	\$ 13.626.129,78	\$ 15.454.409,40
2/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,17	\$ 1.821.851,07	\$ 13.578.217,93	\$ 15.400.069,00
2/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,65	\$ 1.883.565,15	\$ 14.038.171,68	\$ 15.921.736,83
2/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,15	\$ 1.819.279,65	\$ 13.559.053,19	\$ 15.378.332,84
2/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,17	\$ 1.821.851,07	\$ 13.578.217,93	\$ 15.400.069,00
3/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,29	\$ 2.042.942,77	\$ 14.651.443,34	\$ 16.694.386,11
3/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,14	\$ 2.022.900,82	\$ 14.507.707,80	\$ 16.530.608,62
3/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.932.422,13	\$ 14.402.301,73	\$ 16.334.723,86
3/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,86	\$ 1.910.565,06	\$ 14.239.401,45	\$ 16.149.966,51
3/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.932.422,13	\$ 14.402.301,73	\$ 16.334.723,86
3/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,1	\$ 1.941.422,10	\$ 14.469.378,32	\$ 16.410.800,42
3/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,79	\$ 1.901.565,09	\$ 14.172.324,86	\$ 16.073.889,95
3/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,14	\$ 1.946.564,94	\$ 14.507.707,80	\$ 16.454.272,74
4/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,9	\$ 1.915.707,90	\$ 14.277.730,92	\$ 16.193.438,82
4/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,06	\$ 1.936.279,26	\$ 14.431.048,84	\$ 16.367.328,10
4/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,4	\$ 1.979.993,40	\$ 14.756.849,41	\$ 16.736.842,81

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

4/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,67	\$ 1.886.136,57	\$ 14.057.336,42	\$ 15.943.472,99
4/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.945.279,23	\$ 14.498.125,43	\$ 16.443.404,66
4/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,88	\$ 1.913.136,48	\$ 14.258.566,18	\$ 16.171.702,66
4/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,12	\$ 1.886.615,56	\$ 13.530.306,08	\$ 15.416.921,64
4/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,98	\$ 1.734.296,74	\$ 12.437.915,93	\$ 14.172.212,67
4/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Mezcla Asfáltica MDC-19	10,56	\$ 1.410.953,28	\$ 10.118.982,45	\$ 11.529.935,73
6/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,3	\$ 1.838.565,30	\$ 13.702.788,74	\$ 15.541.354,04
6/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,43	\$ 1.983.850,53	\$ 14.785.596,52	\$ 16.769.447,05
6/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.057.136,00	\$ 15.331.791,60	\$ 17.388.927,60
6/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.057.136,00	\$ 15.331.791,60	\$ 17.388.927,60
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,02	\$ 1.673.994,42	\$ 12.476.245,41	\$ 14.150.239,83
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,05	\$ 1.677.851,55	\$ 12.504.992,52	\$ 14.182.844,07
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,1	\$ 1.684.280,10	\$ 12.552.904,37	\$ 14.237.184,47
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,99	\$ 1.670.137,29	\$ 12.447.498,30	\$ 14.117.635,59
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,98	\$ 1.668.851,58	\$ 12.437.915,93	\$ 14.106.767,51
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,78	\$ 2.028.850,38	\$ 15.120.979,46	\$ 17.149.829,84
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,66	\$ 2.013.421,86	\$ 15.005.991,03	\$ 17.019.412,89
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,85	\$ 2.037.850,35	\$ 15.188.056,05	\$ 17.225.906,40
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,98	\$ 2.054.564,58	\$ 15.312.626,86	\$ 17.367.191,44
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.057.136,00	\$ 15.331.791,60	\$ 17.388.927,60
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.057.136,00	\$ 15.331.791,60	\$ 17.388.927,60
7/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	16	\$ 2.057.136,00	\$ 15.331.791,60	\$ 17.388.927,60
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,64	\$ 1.753.708,44	\$ 13.070.352,34	\$ 14.824.060,78
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13	\$ 1.671.423,00	\$ 12.457.080,67	\$ 14.128.503,67
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13	\$ 1.671.423,00	\$ 12.457.080,67	\$ 14.128.503,67
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,22	\$ 1.699.708,62	\$ 12.667.892,81	\$ 14.367.601,43

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,17	\$ 1.693.280,07	\$ 12.619.980,96	\$ 14.313.261,03
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,13	\$ 1.816.708,23	\$ 13.539.888,45	\$ 15.356.596,68
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,33	\$ 1.842.422,43	\$ 13.731.535,85	\$ 15.573.958,28
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,01	\$ 1.801.279,71	\$ 13.424.900,02	\$ 15.226.179,73
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,54	\$ 1.612.280,34	\$ 12.016.291,66	\$ 13.628.572,00
8/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	10,86	\$ 1.396.281,06	\$ 10.406.453,55	\$ 11.802.734,61
9/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,11	\$ 1.942.707,81	\$ 14.478.960,69	\$ 16.421.668,50
9/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,9	\$ 1.915.707,90	\$ 14.277.730,92	\$ 16.193.438,82
9/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,06	\$ 1.936.279,26	\$ 14.431.048,84	\$ 16.367.328,10
9/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,92	\$ 1.918.279,32	\$ 14.296.895,66	\$ 16.215.174,98
9/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 1.931.136,42	\$ 14.392.719,36	\$ 16.323.855,78
9/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 1.940.136,39	\$ 14.459.795,95	\$ 16.399.932,34
10/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,37	\$ 1.847.565,27	\$ 13.769.865,33	\$ 15.617.430,60
10/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,25	\$ 1.832.136,75	\$ 13.654.876,89	\$ 15.487.013,64
10/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,2	\$ 1.825.708,20	\$ 13.606.965,04	\$ 15.432.673,24
10/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,37	\$ 1.847.565,27	\$ 13.769.865,33	\$ 15.617.430,60
10/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,1	\$ 1.812.851,10	\$ 13.511.141,34	\$ 15.323.992,44
10/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,27	\$ 1.834.708,17	\$ 13.674.041,63	\$ 15.508.749,80
10/07/2026	Avenida 30 de Agosto sector EL Viajero, El Jardín	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,45	\$ 1.857.850,95	\$ 13.846.524,29	\$ 15.704.375,24
Total asfalto MDC-10 m ³		0	Subtotal	\$ 539.762.239	\$ 4.328.129.271	\$ 4.867.891.511
Total asfalto MDC-19 m ³		4250,05	I.V.A	\$ 102.554.825	\$ 822.344.562	\$ 924.899.386
Total Emulsión gal		3850	Total	\$ 642.317.064	\$ 5.150.473.833	\$ 5.792.790.897
Total Cemento Asfáltico kg		3550				
Total Geomalla Biaxial m ²		4124				

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

La siguiente tabla muestra la ejecución de material granular por obra – CUARTO corte contrato No. 4347 de 2026

EJECUCIÓN DE MATERIAL BASE Y SUB BASE GRANULAR POR OBRA – CUARTO CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026						
FECHA	FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
1/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.418.848,74	\$ 3.279.275,19
1/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.418.848,74	\$ 3.279.275,19
1/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
1/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
1/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
1/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Sub-Base Granular	11	\$ 1.414.281,00	\$ 1.040.489,08	\$ 2.454.770,08
3/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
3/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
3/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
3/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18
3/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
4/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18
4/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
4/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18
4/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
4/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
4/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
4/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
4/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18
4/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
5/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18
5/06/2026	Escuela Leningrado, calle 82 , Leningrado II, San Joaquín	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
5/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

5/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
5/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18
6/06/2026	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Sub-Base Granular	14	\$ 1.764.700,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.088.958,82
6/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Sub-Base Granular	7	\$ 1.023.526,00	\$ 662.129,41	\$ 1.685.655,41
6/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
6/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
6/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
6/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
6/06/2026	Sector D, Manzanas 6, Paz Verde, Del Café	Base Granular	7	\$ 899.997,00	\$ 770.170,59	\$ 1.670.167,59
6/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Sub-Base Granular	16	\$ 2.339.488,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.852.926,66
6/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Sub-Base Granular	16	\$ 2.339.488,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.852.926,66
6/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Sub-Base Granular	12	\$ 1.754.616,00	\$ 1.135.078,99	\$ 2.889.694,99
7/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Base Granular	16	\$ 2.339.488,00	\$ 1.760.389,92	\$ 4.099.877,92
7/06/2026	Carrera 14 entre calles 12B Este y 13 este, Simón Bolívar, Oriente	Base Granular	7	\$ 1.023.526,00	\$ 770.170,59	\$ 1.793.696,59
9/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
9/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
10/06/2026	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Base Granular	16	\$ 2.016.800,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.777.189,92
10/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
10/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
10/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
10/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
11/06/2026	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Base Granular	14	\$ 1.764.700,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.305.041,18
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
11/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
11/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
11/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
12/06/2026	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Base Granular	8	\$ 1.008.400,00	\$ 880.194,96	\$ 1.888.594,96
12/06/2026	Calle 80B entre carreras 30 y 31, Atenas, San Joaquín	Base Granular	8	\$ 1.008.400,00	\$ 880.194,96	\$ 1.888.594,96
12/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
12/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
12/06/2026	Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
12/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
12/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
12/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	15	\$ 1.928.565,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.578.930,55
12/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
12/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
12/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
12/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
12/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
12/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Sub-Base Granular	6	\$ 801.678,00	\$ 567.539,50	\$ 1.369.217,50
13/06/2026	Manzana 6 Quintas de Panorama II, Consota	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

13/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
13/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
13/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
13/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
13/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
13/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
14/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
14/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
15/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
15/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
16/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
16/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
16/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.817.525,92
16/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
16/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.799.994,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.340.335,18
16/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
17/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
17/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
17/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
17/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
17/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.418.848,74	\$ 3.279.275,19
17/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
17/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
17/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
17/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

17/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
18/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	14	\$ 1.835.288,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.375.629,18
18/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
18/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
18/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
18/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.418.848,74	\$ 3.279.275,19
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.418.848,74	\$ 3.279.275,19
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.324.258,82	\$ 3.060.656,84
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.418.848,74	\$ 3.279.275,19
18/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.418.848,74	\$ 3.279.275,19
18/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
18/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
18/06/2026	Sector D, Manzana 12, Paz Verde, Del Café	Sub-Base Granular	16	\$ 2.057.136,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.570.574,66
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	15	\$ 1.966.380,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.616.745,55
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.650.365,55	\$ 3.510.792,00
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	14	\$ 1.835.288,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.375.629,18

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.760.389,92	\$ 3.744.844,80
19/06/2026	Reparación Vías internas Meper, Convenio Ponal-Infraestructura, El Jardín	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
19/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.760.389,92	\$ 3.744.844,80
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
20/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	3	\$ 372.085,29	\$ 283.769,75	\$ 655.855,04
21/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
21/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
21/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	15	\$ 1.966.380,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.616.745,55
22/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.423.043,74
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.650.365,55	\$ 3.510.792,00
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.650.365,55	\$ 3.510.792,00
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
22/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
22/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
22/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
23/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
23/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
23/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
23/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	15	\$ 1.860.426,45	\$ 1.650.365,55	\$ 3.510.792,00
23/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
23/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.423.043,74
23/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.651.246,66
23/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.194.840,82
23/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.423.043,74
23/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.423.043,74
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
23/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
24/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
24/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Sub-Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.423.043,74
24/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
24/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.654.560,55
24/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
24/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
24/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
24/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

24/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	5	\$ 655.460,00	\$ 550.121,85	\$ 1.205.581,85
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	7	\$ 868.199,01	\$ 662.129,41	\$ 1.530.328,42
25/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Base Granular	14	\$ 1.736.398,02	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.739,20
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
25/06/2026	Vía, La Siria, Combia Baja	Sub-Base Granular	16	\$ 1.984.454,88	\$ 1.513.438,66	\$ 3.497.893,54
27/06/2026	Calle 35 entre Av. 30 de Agosto y carrera 12, Las Garzas, Centro	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
30/06/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
1/07/2026	Don Quijote, Calle 14 tramo entre 23 y 24, Los Ángeles, Universidad	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
Total Base Granular		1555	Subtotal	\$ 364.500.270,51	\$ 291.784.627,73	\$ 656.284.898,24
Total Sub Base Granular		1276	I.V.A	\$ 69.255.051,40	\$ 55.439.079,27	\$ 124.694.130,67
			Total	\$ 433.755.321,91	\$ 347.223.707,00	\$ 780.979.028,91

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S Nit. 900.188.750-8, representada legalmente por Juan Sebastián García Henao identificado con cedula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira, durante el tiempo de ejecución del contrato conforme lo ordena el Artículo 50 de la Ley 789 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ, identificado con C.C: No. 1.053.829.394 de Pereira y, con Tarjeta Profesional No. 254066-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad HT ASESORES – AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S en mi condición de Revisor Fiscal de AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. identificada con NIT. 900.188.750-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se anexa soportes.


VERIFICACIÓN DE DISEÑOS DE MEZCLA Y CALIDAD DE MATERIALES SUMINISTRADOS.

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S Nit. 900.188.750-8, representada legalmente por Juan Sebastián García Henao identificado con cedula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira, manifiesta que los materiales suministrados son idóneos para construcción de vías y cumplen con estándares de calidad para lo cual suministra diseño de mezcla asfáltica y resultados de ensayos de laboratorio para el control de calidad. Se anexan soportes.

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017


Apoyo a la Supervisión
Juan Carlos Márquez S


JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Supervisor del contrato 4347-2026

Anexos

1. Facturas
2. Informe fotográfico ejecución de material asfáltico, geomalla y granulares
3. Actas y solicitud de materiales
4. Parafiscales y planillas de pago seguridad social
5. Ensayos de laboratorio – Calidad de materiales

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

ANEXOS



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	8145	21/05/2026	RI186	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	890	kg	\$ 12.961,34	\$ 11.535.596,64	12 MEDIAS CANECAS DE CEMENTO ASFÁLTICO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9645	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,26	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.622.696,24	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9646	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,87	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.248.983,82	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9647	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,94	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.316.060,40	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9648	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,87	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.248.983,82	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9667	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.373.554,62	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9668	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,43	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.785.596,52	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9669	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,28	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.641.860,97	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9670	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,31	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.670.608,08	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9671	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,59	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.980.677,46	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9672	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,69	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.076.501,16	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9685	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,59	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.938.914,44	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9686	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9687	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,52	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.871.837,85	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9688	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.507.707,80	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9689	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.038.171,68	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9690	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	8199	28/05/2026	RI186	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	120	kg	\$ 12.961,34	\$ 1.555.361,34	2 MEDIAS CANECAS DE CEMENTO ASFÁLTICO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9698	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9699	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,74	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.124.413,01	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9700	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.373.554,62	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9701	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,97	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.344.807,51	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9702	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,33	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.689.772,82	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
OFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9703	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,76	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.143.577,75	PLACA ESU-881 - 5 MEDIAS CANEAS	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9707	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,17	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.536.454,91	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9708	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,34	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.699.355,19	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9709	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.593.949,13	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9710	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9711	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,7	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.086.083,53	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9712	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,7	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.086.083,53	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9745	4/06/2026	OT02	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO-	1925	gl	\$ 27.826,05	\$ 53.565.147,06	TEMPERATURA 152*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9754	5/06/2026	OT02	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO-	275	gl	\$ 27.826,05	\$ 7.652.163,87	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9755	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,46	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.856.106,66	TEMPERATURA 152*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9756	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,46	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.814.343,63	TEMPERATURA 150*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9757	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9758	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.593.949,13	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9759	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,53	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.881.420,22	TEMPERATURA 150*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9760	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,8	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.181.907,23	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9763	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.507.707,80	TEMPERATURA 152*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9764	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,64	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.028.589,31	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9761	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,37	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.728.102,30	TEMPERATURA 152*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9762	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,34	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.741.118,22	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9765	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,5	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.894.436,13	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9766	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,58	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.929.332,07	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9767	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,66	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.005.991,03	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9768	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.197.638,42	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9769	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.405.735,28	TEMPERATURA 152*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9770	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,33	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.731.535,85	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9771	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9772	6/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,89	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.268.148,55	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9781	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,7	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.086.083,53	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9782	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.312.626,86	TEMPERATURA 152*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9783	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9784	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.584.366,76	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9785	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,71	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.095.665,90	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9786	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,8	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.181.907,23	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9135	10/06/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	812	M2	\$ 24.837,82	\$ 20.168.305,88	GEOMALLA PARA PAVIMENTO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9787	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.587.800,30	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9788	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.329.076,32	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9789	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,08	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.491.976,61	TEMPERATURA 160*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9790	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,83	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.252.417,36	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9791	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9792	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.373.554,62	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9793	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9794	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.546.037,28	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9795	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,83	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.210.654,34	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9796	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,96	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.335.225,14	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9797	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,93	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.306.478,03	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9798	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 150°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9800	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,5	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.977.962,18	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10116	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	8,12	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.760.884,24	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10209	10/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	8,11	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.771.301,87	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	8759	11/06/2026	RI186	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	500	kg	\$ 12.961,34	\$ 6.480.672,27	7 MEDIAS CANECAS DE CEMENTO ASFÁLTICO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9799	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,05	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.421.466,47	PLACA ESU-881 - 10 MEDIAS CANECAS	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9802	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,7	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.127.846,55	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9804	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.549.470,82	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9807	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.396.152,91	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9810	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,15	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.559.053,19	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9811	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.654.876,89	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9814	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,35	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.708.937,56	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9815	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,26	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.706.222,29	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9816	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,54	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.974.528,64	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9817	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.457.080,67	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9818	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,77	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.194.923,14	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9819	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,46	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.897.869,68	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9820	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.626.129,78	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9821	11/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,45	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.888.287,31	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9826	16/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.177.194,94	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9831	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.585.085,03	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9832	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,05	M3	\$ 958.236,97	\$ 6.755.570,67	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9833	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.559.771,46	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9834	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.559.771,46	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9836	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,87	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.207.220,79	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9837	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,69	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.034.738,13	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9838	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,87	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.207.220,79	TEMPERATURA 158 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9839	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16,11	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.437.197,66	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9840	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.360.538,71	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9841	17/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,54	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.891.002,59	TEMPERATURA 158 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9842	18/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,38	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.071.788,87	TEMPERATURA 158 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9845	18/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,19	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.555.619,65	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9846	18/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.283.879,75	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9847	18/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,57	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.919.749,70	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9848	18/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,4	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.756.849,41	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9849	18/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.654.876,89	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9850	18/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,66	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.089.517,08	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9851	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,5	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.936.199,16	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9852	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,5	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.936.199,16	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9854	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.584.366,76	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9855	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,17	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.536.454,91	PLACA OVE-469 TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9856	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9857	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,15	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.517.290,17	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9858	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.325.642,77	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9861	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,69	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.076.501,16	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10127	19/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	5,66	M3	\$ 958.236,97	\$ 5.423.621,28	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9862	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,33	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.689.772,82	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9864	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,81	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.149.726,57	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9866	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,69	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.034.738,13	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9867	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,2	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.565.202,02	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9870	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9871	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.843.090,74	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9872	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,4	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.756.849,41	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9873	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,73	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.114.830,64	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9874	20/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.635.712,15	PLACA OVE-469 TEMPERATURA 152 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9875	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	9,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 8.643.297,51	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9876	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,07	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.440.631,21	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9877	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,54	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.932.765,61	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9878	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,1	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.469.378,32	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9879	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,39	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.747.267,04	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9880	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9881	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,05	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.463.229,50	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10692	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA-156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10854	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10856	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10078	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,88	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.383.855,26	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10121	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,07	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.482.394,24	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10129	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	9,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.246.986,81	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10038	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	9,71	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.304.481,03	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10128	22/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	10,94	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.483.112,50	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9143	23/06/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	1830	M2	\$ 24.837,82	\$ 45.453.201,68	GEOMALLA PARA PAVIMENTO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9882	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,71	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.388.007,08	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9883	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.593.949,13		
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9886	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,41	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.766.431,78	TEMPERATURA 165 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9889	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.239.401,45	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9891	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.999.842,20	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9892	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9893	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,88	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.258.566,18	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10130	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,73	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.073.067,61	PLACA TAI-810 TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10146	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,4	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.923.901,51	TEMPERATURA 170°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10149	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,48	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.958.797,45	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10197	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,64	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.153.878,39	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10294	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,7	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.044.320,50	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10408	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10502	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10581	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.322.209,23	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10603	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.322.209,23	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10918	23/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9169	24/06/2026	RI186	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	410	kg	\$ 12.961,34	\$ 5.314.151,26	6 MEDIAS CANECAS DE CEMENTO ASFÁLTICO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9895	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,97	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.344.807,51	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9897	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.999.842,20	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9900	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.329.076,32	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9902	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,42	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.817.777,18	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9903	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,07	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.482.394,24	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9904	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9905	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,71	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.095.665,90	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9906	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,04	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.411.884,10	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9907	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.584.366,76	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9908	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.546.037,28	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9909	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,88	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.258.566,18	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10212	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.245.550,27	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10366	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,96	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.293.462,12	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10627	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10651	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10765	24/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9910	25/06/2026	OT02	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO-	1650	gl	\$ 27.826,05	\$ 45.912.983,19	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9911	25/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,62	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.301.765,75	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9920	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9921	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.354.389,88	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9922	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,1	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.469.378,32	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9923	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,89	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.268.148,55	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9924	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,71	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.095.665,90	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9925	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.584.366,76	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9926	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,81	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.191.489,60	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9927	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,51	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.862.255,48	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9928	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,41	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.808.194,81	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9929	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9930	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,87	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.248.983,82	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9931	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.431.048,84	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9932	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,11	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.478.960,69	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9933	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,55	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.942.347,98	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9934	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,42	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.776.014,15	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10258	26/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,31	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.670.608,08	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9936	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,15	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.517.290,17	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9938	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,88	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.258.566,18	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9941	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.373.554,62	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9942	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,87	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.248.983,82	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9943	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9944	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,9	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.277.730,92	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9946	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,11	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.478.960,69	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9947	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9948	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,55	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.900.584,96	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9949	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.584.366,76	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9950	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.996.408,66	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9951	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.884.853,76	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9952	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,46	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.814.343,63	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9953	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10063	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,78	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.204.505,51	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10161	27/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,27	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.632.278,61	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9313	30/06/2026	RI186	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	730	kg	\$ 12.961,34	\$ 9.461.781,51	10 MEDIAS CANECAS DE CEMENTO ASFÁLTICO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9954	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,28	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.641.860,97	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9957	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.584.366,76	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9958	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,3	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.661.025,71	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9959	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,77	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.153.160,12	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9960	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.996.408,66	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9961	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.239.401,45	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9962	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,92	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.296.895,66	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9963	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,07	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.440.631,21	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9964	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9965	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,3	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.661.025,71	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9966	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.926.616,79	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10061	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.472.811,87	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10072	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.629.563,33	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10151	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	10,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.591.952,12	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10240	30/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,21	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.616.547,41	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	8029	1/07/2026	RI186	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	900	kg	\$ 12.961,34	\$ 11.665.210,08	15 MEDIAS CANECAS DE CEMENTO ASFÁLTICO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9967	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.431.048,84	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9968	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.354.389,88	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9969	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,24	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.603.531,50	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9970	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9971	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,7	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.086.083,53	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9972	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.363.972,25	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9973	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9974	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,1	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.469.378,32	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9975	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,97	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.344.807,51	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9976	1/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9152	1/07/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	246	M2	\$ 24.837,82	\$ 6.110.102,52	GEOMALLA PARA PAVIMENTO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9153	2/07/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	1236	M2	\$ 24.837,82	\$ 30.699.539,50	GEOMALLA PARA PAVIMENTO	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9977	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.287.313,29	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9978	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.626.129,78	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9979	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,62	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.009.424,57	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9980	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,62	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.009.424,57	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9981	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.999.842,20	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9982	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,58	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.971.095,09	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9983	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,04	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.411.884,10	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9984	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,58	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.971.095,09	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9985	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,51	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.904.018,50	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9986	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,46	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.856.106,66	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9987	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.626.129,78	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9988	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,17	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.578.217,93	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9989	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.038.171,68	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9990	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,15	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.559.053,19	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9991	2/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,17	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.578.217,93	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9992	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,29	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.651.443,34	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9995	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.507.707,80	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10001	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10002	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.239.401,45	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10003	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10004	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,1	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.469.378,32	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10005	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,79	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.172.324,86	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10006	3/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.507.707,80	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10016	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,9	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.277.730,92	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10017	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.431.048,84	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10018	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,4	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.756.849,41	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10019	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,67	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.057.336,42	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10020	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10021	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,88	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.258.566,18	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10066	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,12	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.530.306,08	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10093	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.437.915,93	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10118	4/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	10,56	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.118.982,45	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10104	6/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,3	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.702.788,74	TEMPERATURA 154*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10127	6/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,43	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.785.596,52	TEMPERATURA 156*	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 004

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10390	6/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10450	6/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10031	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.476.245,41	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10032	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,05	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.504.992,52	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10033	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,1	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.552.904,37	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10034	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.447.498,30	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10035	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.437.915,93	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10173	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,78	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.120.979,46	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10258	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,66	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.005.991,03	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10270	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,85	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.188.056,05	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10320	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.312.626,86	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10402	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10539	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10605	7/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	16	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.331.791,60	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10048	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,64	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.070.352,34	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10049	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.457.080,67	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10050	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.457.080,67	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10051	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.667.892,81	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10052	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,17	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.619.980,96	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10618	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.539.888,45	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10619	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,33	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.731.535,85	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10620	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.424.900,02	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10621	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,54	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.016.291,66	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10622	8/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	10,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.406.453,55	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10065	9/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,11	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.478.960,69	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10066	9/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,9	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.277.730,92	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10067	9/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.431.048,84	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10068	9/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,92	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.296.895,66	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10069	9/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No


4347-2026

RELACION No 004


DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10070	9/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10075	10/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,37	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.769.865,33	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10076	10/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.654.876,89	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10077	10/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,2	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.606.965,04	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10078	10/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,37	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.769.865,33	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10079	10/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,1	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.511.141,34	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10080	10/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,27	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.674.041,63	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	10081	10/07/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,45	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.846.524,29	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL

SUB-TOTAL	\$	4.328.129.271,51
I.V.A	\$	822.344.561,59
TOTAL	\$	5.150.473.833,10


JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE PEREIRA


JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
Representante Legal
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA


JUAN CARLOS MARQUEZ
REVISADO



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144349	1/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144352	1/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	10100	1/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	10192	1/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	10214	1/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	10274	1/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	11	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.040.489,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144422	3/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144423	3/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144434	3/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144437	3/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144441	3/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144460	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144482	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144484	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144485	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144489	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144492	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144496	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144500	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144501	4/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144518	5/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144521	5/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144527	5/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144528	5/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144537	5/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	141641	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144538	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	7	M3	\$ 94.589,92	\$ 662.129,41	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145513	6/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145525	6/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145601	6/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145676	6/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145742	6/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	7	M3	\$ 110.024,37	\$ 770.170,59	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145491	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145585	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145594	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	12	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.135.078,99	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145523	7/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145528	7/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	7	M3	\$ 110.024,37	\$ 770.170,59	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145939	9/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145727	9/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144600	10/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145803	10/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146039	10/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146170	10/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146375	10/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144676	11/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144677	11/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144681	11/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144688	11/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144690	11/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145642	11/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145654	11/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145866	11/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145501	11/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145867	11/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144702	12/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	8	M3	\$ 110.024,37	\$ 880.194,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144702	12/06/2026	MP05	BASE GRANULAR-	8	M3	\$ 110.024,37	\$ 880.194,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144703	12/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144704	12/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144711	12/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144727	12/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144729	12/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144738	12/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145576	12/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145626	12/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145628	12/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145826	12/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145837	12/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145871	12/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145972	12/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	6	M3	\$ 94.589,92	\$ 567.539,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144756	13/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145548	13/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145752	13/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146020	13/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146110	13/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146294	13/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146317	13/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146023	14/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146226	14/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146079	15/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146513	15/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144785	16/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144792	16/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144798	16/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144804	16/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144814	16/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146647	16/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144825	17/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144826	17/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144827	17/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144828	17/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144829	17/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144836	17/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144855	17/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144858	17/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144863	17/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146066	17/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144878	18/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144883	18/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144884	18/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144885	18/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144894	18/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144896	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144898	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144899	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144902	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144904	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144908	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144912	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144913	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144914	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144915	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146405	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146444	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146563	18/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144930	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144936	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144938	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144939	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144940	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144944	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144948	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144951	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144957	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144961	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144963	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144964	19/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144971	19/06/2026	MP63	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146446	19/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144993	20/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144994	20/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144995	20/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144996	20/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145002	20/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145003	20/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145868	20/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146219	20/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146483	20/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	3	M3	\$ 94.589,92	\$ 283.769,75	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145764	21/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145774	21/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146167	21/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145013	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145014	22/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145016	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145018	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145019	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145042	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145043	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145051	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145053	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145731	22/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146382	22/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145506	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145551	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145699	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145853	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145896	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146008	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146011	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146047	22/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145085	23/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145086	23/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145090	23/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145096	23/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145115	23/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145119	23/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145120	23/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145123	23/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145127	23/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145128	23/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145797	23/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145961	23/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145133	24/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145134	24/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145135	24/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145137	24/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145138	24/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145183	24/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145596	24/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145632	24/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146023	24/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145619	24/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146111	24/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	5	M3	\$ 110.024,37	\$ 550.121,85	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145184	25/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	7	M3	\$ 94.589,92	\$ 662.129,41	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145190	25/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145191	25/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145542	25/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145958	25/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146108	25/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146278	25/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	146321	25/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145280	27/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145297	30/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145341	1/07/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL

SUB-TOTAL	\$	291.784.627,73
I.V.A	\$	55.439.079,27
TOTAL	\$	347.223.707,00

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE PEREIRA

JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO
Representante Legal
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA

JUAN CARLOS MARQUEZ
REVISADO



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112549	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,26	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.929.784,94	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112550	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,87	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.880.465,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112551	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,94	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.889.317,63	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112552	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,87	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.880.465,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112753	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.896.905,25	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112754	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,43	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.951.283,20	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112755	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,28	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.932.314,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112756	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,31	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.936.107,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112757	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,59	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.845.056,51	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112758	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,69	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.857.702,54	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112829	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,59	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.971.516,86	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112830	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.913.345,10	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112831	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,52	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.962.664,63	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112832	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,14	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.914.609,70	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112833	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,65	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.852.644,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112834	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.770.444,90	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112893	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.928.520,34	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112897	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,74	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.864.025,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112898	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.896.905,25	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112899	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,97	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.893.111,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112901	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,33	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.938.637,17	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112902	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,76	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.866.554,77	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112951	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,17	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.918.403,51	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112952	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,34	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.939.901,77	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112953	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,23	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.925.991,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112958	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.908.286,68	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112959	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,7	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.858.967,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112960	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,7	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.858.967,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112993	1/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113009	1/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114902	1/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114917	1/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114945	1/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114973	1/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	11	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.414.281,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113119	3/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113120	3/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113140	3/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113143	3/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113149	3/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113181	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113210	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113213	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113214	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113217	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113218	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113222	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113224	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113225	4/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113268	5/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113274	5/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113276	5/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113277	5/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113294	5/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113295	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,46	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.828.616,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113297	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,46	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.955.077,01	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113300	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.908.286,68	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113301	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,23	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.925.991,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113302	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,53	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.963.929,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113303	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,8	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.871.613,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113306	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,14	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.914.609,70	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113307	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,64	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.851.379,52	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	108986	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.764.700,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113304	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,37	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.943.695,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113305	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,34	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.813.441,42	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113308	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	7	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.023.526,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113359	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,5	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.833.675,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113360	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,58	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.970.252,25	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113361	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,66	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.980.369,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113362	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,86	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.005.661,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113363	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,99	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.769.180,30	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113364	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,33	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.812.176,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113365	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.928.520,34	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113366	6/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,89	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.882.994,61	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114933	6/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114952	6/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114996	6/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115091	6/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115182	6/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	7	M3	\$ 128.571,00	\$ 899.997,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114883	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.339.488,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114927	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.339.488,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114977	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	12	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.754.616,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114835	7/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.339.488,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114841	7/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	7	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.023.526,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113424	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,7	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.858.967,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113425	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,98	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.020.836,39	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113426	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.900.699,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113427	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,22	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.924.726,53	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113428	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,71	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.860.231,75	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113429	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,8	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.871.613,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115227	9/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115048	9/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113434	10/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 126.050,00	\$ 2.016.800,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113464	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,18	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.823.136,78	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113469	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,91	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.788.422,61	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113474	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,08	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.810.279,68	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113498	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,83	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.778.136,93	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113502	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113508	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.896.905,25	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113509	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.898.169,85	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113510	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,18	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.919.668,11	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113511	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,83	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.875.406,99	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113512	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,96	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.891.846,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113513	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,93	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.888.053,03	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113514	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.900.699,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113516	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,5	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.580.754,38	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114858	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	8,12	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.043.996,52	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114861	10/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	8,11	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.042.710,81	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115132	10/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115394	10/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115476	10/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115755	10/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113515	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,05	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.903.228,27	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113528	11/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113531	11/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.764.700,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113533	11/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113543	11/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113544	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,7	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.761.422,70	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113546	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.817.993,94	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113547	11/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113552	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,98	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.797.422,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113556	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.819.279,65	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113559	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,25	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.832.136,75	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113570	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,35	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.941.166,37	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113571	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,26	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.676.864,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113572	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,54	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.712.273,14	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113573	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.643.984,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113574	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,77	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.741.359,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113575	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,46	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.702.156,31	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113576	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,22	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.798.266,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113577	11/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,45	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.700.891,71	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114962	11/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115060	11/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115180	11/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114834	11/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115215	11/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113580	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	8	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.008.400,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113580	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	8	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.008.400,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113583	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113584	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113592	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113611	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113613	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113621	12/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114907	12/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114911	12/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115012	12/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115110	12/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115151	12/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115241	12/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115300	12/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	6	M3	\$ 133.613,00	\$ 801.678,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113640	13/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114872	13/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115081	13/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115289	13/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115453	13/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115595	13/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115690	13/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115301	14/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115556	14/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115446	15/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115939	15/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113674	16/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113687	16/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113689	16/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113694	16/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113709	16/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	116017	16/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113741	17/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113743	17/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113745	17/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113747	17/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113748	17/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113755	17/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113765	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,09	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.523.944,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113766	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,02	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.416.852,42	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113767	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,02	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.416.852,42	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113777	17/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113779	17/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113783	17/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113811	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,87	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.006.925,75	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113812	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,69	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.984.162,89	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113813	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,87	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.006.925,75	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113814	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16,11	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.037.276,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113815	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16,03	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.027.159,41	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113816	17/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,54	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.965.193,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115398	17/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113817	18/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.835.288,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113827	18/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113829	18/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113830	18/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113835	18/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113837	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113844	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113849	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113853	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113854	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113857	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113860	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113861	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113862	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113864	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113879	18/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,19	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.920.932,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113880	18/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,95	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.017.042,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113881	18/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,57	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.968.987,65	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113882	18/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,4	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.947.489,39	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113883	18/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,25	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.802.059,99	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113884	18/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,66	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.727.448,38	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115840	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115871	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115969	18/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113887	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113896	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.966.380,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113898	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113899	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113900	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113902	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113907	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,5	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.973.943,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113908	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113911	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,5	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.973.943,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113917	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113921	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.835.288,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113924	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113926	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113928	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113934	19/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113946	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,22	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.924.726,53	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113947	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,17	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.918.403,51	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113948	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.900.699,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113957	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,15	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.915.874,30	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113958	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,95	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.890.582,23	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113959	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,69	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.857.702,54	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115629	19/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114899	19/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	5,66	M3	\$ 146.218,00	\$ 827.593,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113962	20/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113963	20/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113966	20/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113967	20/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113970	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,33	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.970.993,43	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113974	20/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113975	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,81	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.032.707,51	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113976	20/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113978	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,69	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.017.278,99	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113981	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,2	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.954.279,20	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113984	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.913.345,10	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113985	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,49	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.958.870,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113986	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,4	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.947.489,39	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113987	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,73	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.862.760,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113988	20/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,23	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.799.530,78	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115068	20/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115300	20/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115708	20/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	3	M3	\$ 124.028,43	\$ 372.085,29	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114956	21/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115022	21/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115239	21/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113989	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.966.380,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113990	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	9,02	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.159.710,42	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113992	22/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113996	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,07	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.013.547,91	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113997	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113999	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114000	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114002	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,54	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.942.733,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114003	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,1	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.017.556,30	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114004	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,39	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.056.304,07	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114006	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.037.598,25	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114023	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114025	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114043	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114052	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114086	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,05	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.018.942,85	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115383	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115446	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115493	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114886	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,88	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.527.423,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114971	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,07	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.808.993,97	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114986	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	9,65	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.240.710,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114913	22/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115534	22/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114929	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114939	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115085	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115244	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115260	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115297	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115355	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115442	22/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114864	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	9,71	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.297.382,23	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114939	22/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	10,94	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.461.726,22	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114094	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,23	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.996.531,16	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114098	23/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114099	23/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114100	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,41	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.020.127,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114103	23/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114104	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,86	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.948.027,12	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114107	23/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114111	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,61	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.915.254,12	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114114	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.970.312,76	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114115	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,88	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.950.648,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114124	23/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114129	23/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114130	23/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114133	23/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114144	23/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114147	23/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114849	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,73	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.989.221,31	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114947	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,4	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.441.647,99	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114963	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,48	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.578.225,17	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114980	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,64	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.471.998,47	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115058	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,7	M3	\$ 126.460,35	\$ 1.985.427,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115116	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115179	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115204	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,99	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.022.101,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115225	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,99	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.022.101,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115558	23/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115155	23/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115295	23/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114158	24/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114159	24/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114160	24/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114163	24/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114165	24/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114178	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,97	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.962.447,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114190	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,61	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.915.254,12	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114195	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,91	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.823.489,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114201	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,42	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.890.346,64	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114207	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,07	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.844.464,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114227	24/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114229	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.945.279,23	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114230	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,71	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.891.279,41	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114231	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,04	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.933.707,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114232	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,22	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.956.850,62	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114233	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,18	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.951.707,78	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114234	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,88	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.913.136,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114998	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,91	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.011.984,17	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115088	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,96	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.018.307,19	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115252	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115289	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115435	24/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 126.460,35	\$ 2.023.365,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114904	24/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114911	24/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115113	24/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115011	24/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115526	24/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	5	M3	\$ 131.092,00	\$ 655.460,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114235	25/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	7	M3	\$ 124.028,43	\$ 868.199,01	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114245	25/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114246	25/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.736.398,02	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114868	25/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115082	25/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115150	25/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115382	25/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115445	25/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.984.454,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114331	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.891.433,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114332	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,98	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.857.945,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114338	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,1	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.872.829,29	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114342	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,89	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.846.783,32	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114344	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,71	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.824.458,21	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114346	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,22	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.887.712,70	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114347	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,81	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.836.861,05	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114378	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,51	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.994.136,21	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114379	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,41	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.852.708,11	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114380	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.940.136,39	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114381	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,87	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.911.850,77	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114382	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,06	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.936.279,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114383	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,11	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.942.707,81	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114384	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,55	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.870.708,05	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114385	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,42	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.982.564,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114949	26/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,31	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.898.875,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114387	27/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114399	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.879.030,71	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114403	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,88	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.845.543,04	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114405	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.860.426,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114409	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,87	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.844.302,75	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114410	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.861.666,73	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114422	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,9	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.848.023,61	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114427	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,11	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.874.069,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114432	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,55	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.999.279,05	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114433	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,22	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.956.850,62	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114434	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,65	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.012.136,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114435	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,49	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.862.993,79	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114436	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,46	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.987.707,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114437	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.799.994,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114453	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.945.279,23	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114874	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,78	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.709.111,77	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114889	27/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,27	M3	\$ 124.028,43	\$ 1.893.914,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114440	30/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114461	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,28	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.003.085,76	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114492	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,22	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.956.850,62	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114497	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,3	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.967.136,30	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114499	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,77	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.898.993,67	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114500	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,65	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.012.136,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114501	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,86	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.910.565,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114502	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,92	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.918.279,32	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114503	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,07	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.937.564,97	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114504	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.929.850,71	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114505	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,3	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.967.136,30	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114506	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,49	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.734.422,79	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114930	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,06	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.843.153,52	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115028	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,18	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.727.792,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115087	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	10,01	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.312.230,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115136	30/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,21	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.862.817,32	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114509	1/07/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114518	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,06	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.936.279,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114519	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,98	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.925.993,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114577	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,24	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.959.422,04	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114578	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.931.136,42	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114579	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,7	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.889.993,70	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114580	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,99	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.927.279,29	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114581	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.932.422,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114582	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,1	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.941.422,10	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114583	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,97	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.924.707,87	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114584	1/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.929.850,71	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114601	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,91	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.992.169,83	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114604	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,22	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.899.976,86	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114606	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,62	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.953.422,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114607	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,62	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.953.422,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114617	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,61	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.952.085,93	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114619	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,58	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.948.077,54	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114639	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,04	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.009.539,52	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114641	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,58	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.948.077,54	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114655	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,51	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.865.565,21	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114656	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,46	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.859.136,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114657	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,22	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.828.279,62	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114658	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,17	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.821.851,07	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114659	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,65	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.883.565,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114660	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,15	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.819.279,65	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114661	2/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,17	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.821.851,07	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114687	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,29	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.042.942,77	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114696	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,14	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.022.900,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114730	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.932.422,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114736	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,86	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.910.565,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114742	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.932.422,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114743	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,1	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.941.422,10	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114744	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,79	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.901.565,09	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114745	3/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,14	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.946.564,94	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114774	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,9	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.915.707,90	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114775	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,06	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.936.279,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114776	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,4	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.979.993,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114777	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,67	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.886.136,57	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114778	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.945.279,23	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114779	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,88	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.913.136,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114879	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,12	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.886.615,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114913	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,98	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.734.296,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114944	4/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	10,56	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.410.953,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114893	6/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,3	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.838.565,30	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114980	6/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,43	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.983.850,53	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115319	6/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115439	6/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114890	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,02	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.673.994,42	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114891	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,05	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.677.851,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114892	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,1	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.684.280,10	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114893	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,99	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.670.137,29	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114894	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,98	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.668.851,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115038	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,78	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.028.850,38	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115055	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,66	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.013.421,86	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115148	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,85	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.037.850,35	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115231	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,98	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.054.564,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115369	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115533	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115600	7/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	16	M3	\$ 128.571,00	\$ 2.057.136,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114953	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,64	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.753.708,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114954	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.671.423,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114955	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.671.423,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114956	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,22	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.699.708,62	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114957	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,17	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.693.280,07	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115621	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,13	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.816.708,23	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115622	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,33	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.842.422,43	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115623	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,01	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.801.279,71	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115624	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,54	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.612.280,34	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115625	8/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	10,86	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.396.281,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115006	9/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,11	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.942.707,81	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115007	9/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,9	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.915.707,90	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115008	9/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,06	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.936.279,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115009	9/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,92	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.918.279,32	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115010	9/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.931.136,42	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115011	9/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.940.136,39	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115074	10/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,37	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.847.565,27	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115075	10/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,25	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.832.136,75	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115076	10/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,2	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.825.708,20	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115077	10/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,37	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.847.565,27	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115078	10/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,1	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.812.851,10	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115079	10/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,27	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.834.708,17	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA


CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 04

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	115080	10/07/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,45	M3	\$ 128.571,00	\$ 1.857.850,95	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
										- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
								SUB-TOTAL	\$ 904.262.509,22	
								I.V.A	\$ 171.809.876,75	
								TOTAL	\$ 1.076.072.385,98	


JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE PEREIRA


JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
Representante Legal
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA


JUAN CARLOS MARQUEZ
REVISADO



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:001

FECHA:
21/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	59.94
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	890

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:002

FECHA:
26/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	90,3

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:003

FECHA:
27/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	90,3

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:004

FECHA:
28/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	90,05
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	120

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:005

FECHA:
29/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	90,23

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:006

FECHA:
01/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	89

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:007

FECHA:
03/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	74

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:008

FECHA:
04/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	134
8	Emulsión asfáltica CRL-1	Galón	1925

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



ORDEN No:009

FECHA:
05/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	73
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	120,35
8	Emulsión asfáltica CRL-1	Galón	275

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



ORDEN No:010

FECHA:
06/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	71
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	144,77
5	Subbase tipo A	M3	65

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



ORDEN No:011

FECHA:
07/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	23				

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:012

FECHA:
09/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	32
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	90,44

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:013

FECHA:
27/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.		ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	16					
5	Subbase tipo A	M3	64					
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	203,67					
7	Geomalla biaxial	M2	812					

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:014

FECHA:
11/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	75				
5	Subbase tipo A	M3	80				
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	195,32				
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	500				

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

SOLICITUD DE MATERIALES A PROVEEDORES

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:015

FECHA:
12/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	107
5	Subbase tipo A	M3	102

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:016

FECHA:
13/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	14
5	Subbase tipo A	M3	96

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:017

FECHA:
14/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	32

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:018

FECHA:
15/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	32

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:019

FECHA:
16/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	7,49
6	Base tipo A	M3	72
5	Subbase tipo A	M3	16

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

**Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA
SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:020

FECHA:
17/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	136,29
5	Subbase tipo A	M3	105
6	Base tipo A	M3	42

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:021

FECHA:
18/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	97,4
5	Subbase tipo A	M3	192
6	Base tipo A	M3	70

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:022

FECHA:
19/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	122,87
5	Subbase tipo A	M3	16
6	Base tipo A	M3	186

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:023

FECHA:
20/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	137,01
5	Subbase tipo A	M3	35
6	Base tipo A	M3	86

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:024

FECHA:
21/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	48

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:025

FECHA:
22/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	202,67
5	Subbase tipo A	M3	47
6	Base tipo A	M3	243

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:026

FECHA:
23/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	244,66
7	Geomalla biaxial	M2	1830
6	Base tipo A	M3	103
5	Subbase tipo A	M3	75

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:027

FECHA:
24/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	242,01
5	Subbase tipo A	M3	63
6	Base tipo A	M3	94
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	410

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

**Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA
SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:028

FECHA:
25/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	7,62
5	Subbase tipo A	M3	87
6	Base tipo A	M3	28
8	Emulsión asfáltica CRL-1	Galón	1650

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:029

FECHA:
26/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	240,29

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:030

FECHA:
27/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	239,47
6	Base tipo A	M3	16

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:031

FECHA:
30/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	216,33
6	Base tipo A	M3	14
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	730

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:032

FECHA:
01/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	150,1
7	Geomalla biaxial	M2	246
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	900
6	Base tipo A	M3	14

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:033

FECHA:
02/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	217,51
7	Geomalla biaxial	M2	1236

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:034

FECHA:
03/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	120,38

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:035

FECHA:
04/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	127,7

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:036

FECHA:
06/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	61,73

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:037

FECHA:
07/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	176,41

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:038

FECHA:
08/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	131,9

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:039

FECHA:
09/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	90,1

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:040

FECHA:
10/07/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	100,01

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21582		
Obra:	TOKIO								
Material:	MDC-19	Viaje No	6	WEB-	WLC-113	Fecha de Ensayo:	1-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	1-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,41	0,93	536,0	1250,0	717,0	1253,0	2,332				83,5	4,4	12,1	16,5	73,5		1566	1457	3,29
2		0,93	539,0	1253,0	717,0	1256,0	2,325		2000		83,2	4,7	12,1	16,8	72,1		1597	1485	3,26
3		0,93	539,0	1254,0	718,0	1257,0	2,327		7416		83,3	4,6	12,1	16,7	72,4		1575	1465	3,32
4		0,93	539,0	1253,0	716,0	1255,0	2,325		8596		83,2	4,7	12,1	16,8	72,1		1589	1477	3,30
PROMEDIO							2,327	2,434	2,439	0,10	83,3	4,6	12,1	16,7	72,5	5,32		1471,1	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3385,5											
		PESO FINAL:(g) 3171,8											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3579,0	gr
12,7	1/2"	341,7	10,1	10,1	89,9	95	80	94	86		P ₂	3383,0	gr
9,50	3/8"	368,8	10,9	21,0	79,0	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	724,5	21,4	42,4	57,6	65	49	62	54	P ₁	20,7	gr	
2,00	10	754,6	22,3	64,7	35,3	45	29	38	32		P ₂	23,2	gr
0,43	40	652,6	19,3	84,0	16,0	25	14	22	16	5,41			
0,18	80	204,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	125,0	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,19		Vacios en agreg %					15	
Relacion Estabilidad -Flujo					446,8		ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5	
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,93								

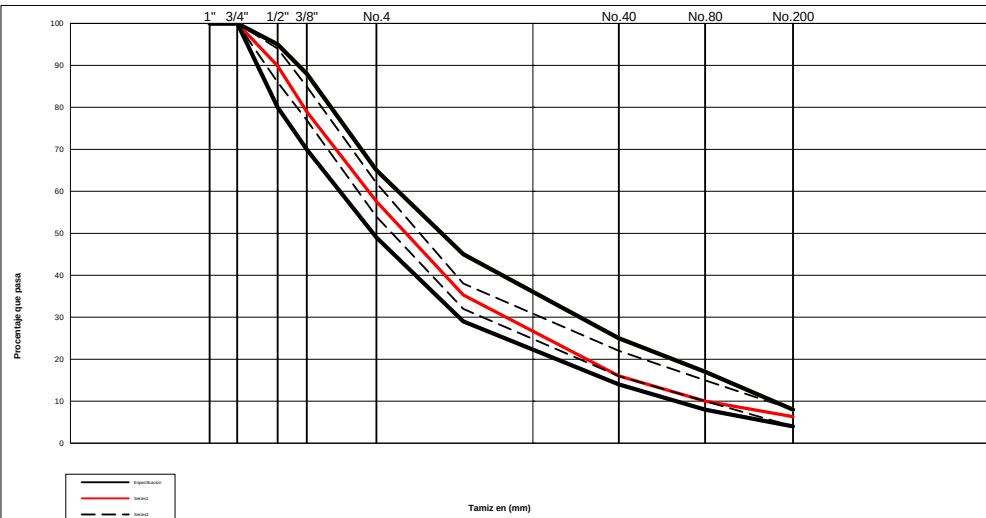

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21583
Fecha de Toma: 1/06/2026

Fecha de Ensayo: 1/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia


Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,4	2,5	2,5
Lectura de arcilla (B)	3,2	3,3	3,3
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	75	76	76
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			76

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	9

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:

21583

Fecha:

1/06/2026

Fecha:

1/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producto terminado

Peso del Cilindro (g):	268	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos V: Volumen del Cilindro F: Masa Neta G: Gravedad Específica
Volumen del Cilindro (cm³):	100,3		
Gravedad Específica Bulk:	2,623		

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba Nº	Masa Neta, g
Pasa Nº 8	Reten Nº 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,2	132,2
Pasa Nº 16	Reten Nº 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,3	132,3
Pasa Nº 30	Reten Nº 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,2	132,2
Pasa Nº 50	Reten Nº 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	132,233333
Total			190,0	Us	49,7

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1 Masa Neta, g	Prueba Nº 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa Nº 8		Reten Nº 16	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 16		Reten Nº 30	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 30		Reten Nº 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1	Prueba Nº 2	Promedio	% Vacíos
Pasa Nº 4			190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21583
Fecha de Toma: 1/06/2026

Fecha de Ensayo: 1/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

DESCRIPCION

ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA - BT-9

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZCION PLANTA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia

Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.	1	2	3
Lectura de Arena (A)	2,6	2,6	2,5
Lectura de Arcilla (B)	3,1	3,1	3,0
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	83,9	83,9	83,3
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =		84	

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	8

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:	21583		
Fecha:	1/06/2026	Fecha:	1/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION
DESCRIPCION	ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA COLOR AMAILLO BT-9
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control	☐	Procedencia	☐	Producción	☐	Producto terminado
-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------------

Peso del Cilindro (g):	268		
Volumen del Cilindro (cm ³):	100,3	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos
Gravedad Especifica Bulk:	2,55	V: Volumen del Cilindro	F: Masa Neta
		G: Gravedad Especifica	



METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N°	Masa Neta, g
Pasa N° 8	Reten N° 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,2	132,2
Pasa N° 16	Reten N° 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,0	132,0
Pasa N° 30	Reten N° 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,0	132
Pasa N° 50	Reten N° 100	17 ± 0,2 g	17,0	Promedio	132
Total			190,0	Us	48,4

METODO B						
Fracción Tamaño Individual			Masa, g		Prueba N° 1 Masa Neta, g	Prueba N° 2 Masa Neta, g
Pasa N° 8	Reten N° 16	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 16	Reten N° 30	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 30	Reten N° 50	190 ± 1,0 g				
					Promedio	Um

METODO C					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N° 1	Prueba N° 2
Pasa N° 4		190 ± 1,0 g	190,0		
				Promedio	U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A	45% min (Rodadura)
Mezcla Asfáltica	40% min (Intermedia)
Bases Granulares	35% min (Base)
	35 min

OBSERVACIONES	

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21585	Fecha:	1/06/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 2 o más Caras F	Peso Partículas con Caras Q	
2"	1 1/2"			N	
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1800,5	1782,0	0,0	18,5
1/2"	3/8"	1000,6	980,3	0,0	20,3
3/8"	4	200,0	189,8	0,0	10,2
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =		97

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g) F	Peso Partículas con Caras Dudosas (g) Q	
2"	1 1/2"			N	
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1800,5	1793,0	0,0	8
1/2"	3/8"	1000,6	992,9	0,0	7,7
3/8"	4	200,0	195,8	0,0	4,2
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =		99

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código:	PMA-INF-002
	FORMATO				Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIAS INV E 240-13				FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1					

N° Muestra: 21585 0

Fecha de toma: 1/06/2026 0

Fecha de ensayo: 1/06/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado



TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	3.741,9	46,9	53,1
3/8"	2.978,5	37,3	62,7
#4	1.230,5	15,4	84,6
Pasa 1/4"	33,1	0,4	99,6
Peso Seco	7984,0	100,0	

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	46,9	47,1	100	1800,5	5,6	1794,9	0,3	0,15
1/2"	3/8"	37,3	37,5	100	1000,6	8	992,6	0,8	0,30
3/8"	N° 4	15,4	15,5	100	200,0	9,0	191,0	4,5	0,70
TOTALES		99,6	100,0	400,0	3001,1	4,0	2978,5	5,6	1,1

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:	
Firma 	Firma 	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-FOR-010
	FORMATO		Versión:	1
	IMPUREZAS EN AGREGADOS GRUESOS -NORMA INVIAS 237- 2013		FECHA	15/02/2019
				Página 1 de 1

N. de Muestra: 21585

Fecha: 1/06/2026

Fecha: 1/06/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

Descripción :

Agregado Triturado TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZACION PLANTA

K 15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producción

ENSAYO HUMEDAD		
Masa muestra húmeda (Mh) (g)		3000,0
Masa muestra seca (Ms) (g)		2980,8
Humedad (w)		0,644
ENSAYO LIMPIEZA SUPERFICIAL		
Masa húmeda muestra (Mhe) (g)		3000,0
Masa muestra seca después de lavado sobre tamiz No. 35 (m) (g)		2968,5
Masa seca muestra (Mse) (g)		2980,8
Impurezas (g)		12
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL		0,4
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL PROMEDIO	0,4	
ESPECIFICACION MÁXIMO (%)	0,5	
CUMPLE	SI	

OBSERVACION:

MUESTRA TOMADA EN ACOPIO PLANTA

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21588		
Obra:	TOKIO								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	STH-081	Fecha de Ensayo:	2-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	2-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,36	0,96	533,0	1243,0	712,0	1245,0	2,332				83,5	4,4	12,1	16,5	73,4		1482	1422	3,28
2		0,96	532,0	1242,0	713,0	1245,0	2,335		2000		83,6	4,3	12,1	16,4	73,9		1509	1449	3,26
3		0,96	533,0	1237,0	707,0	1240,0	2,321		7416		83,1	4,8	12,1	16,9	71,3		1508	1448	3,24
4		0,96	534,0	1242,0	710,0	1244,0	2,326		8596		83,3	4,6	12,1	16,7	72,2		1485	1425	3,23
PROMEDIO							2,328	2,435	2,439	0,07	83,4	4,5	12,1	16,6	72,7	5,30		1436,1	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3239,2							
		PESO FINAL:(g)				3032,5							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P₁3422,7gr P₂3236,6gr Filtro P₁20,8gr P₂23,4gr 5,36			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	293,9	9,1	9,1	90,9	95	80	94	86				
9,50	3/8"	378,6	11,7	20,8	79,2	88	70	85	77				
4,75	No 4	669,2	20,7	41,4	58,6	65	49	62	54				
2,00	10	672,0	20,7	62,2	37,8	45	29	38	32				
0,43	40	707,6	21,8	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	192,5	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	118,7	3,7	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %			15
Relacion Estabilidad -Flujo					441,5					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO			7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,89								

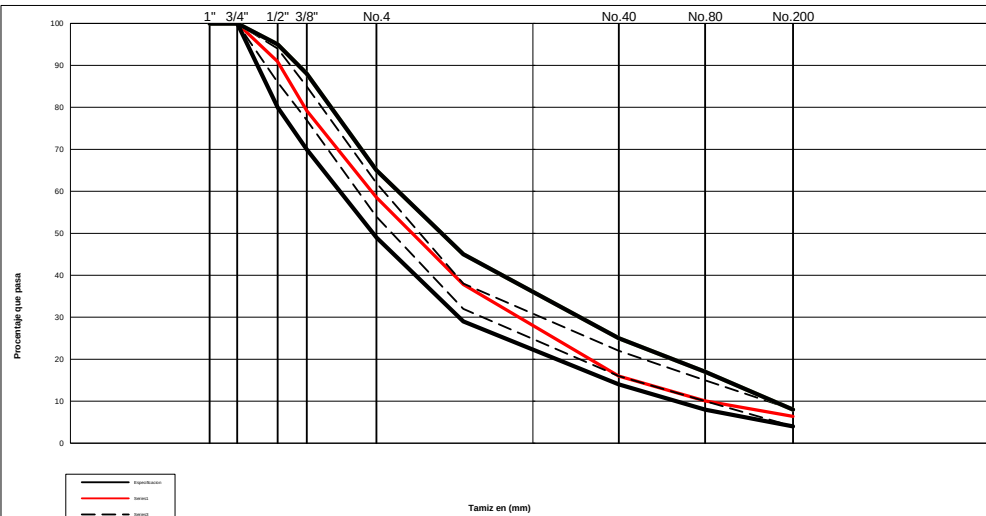

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ


Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21589	Fecha:	3/06/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Peso Partículas con 2 o más Caras	Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1801,0	1790,4	0,0	10,6	99
1/2"	3/8"	1000,2	992,0	0,0	8,2	99
3/8"	4	200,4	193,5	0,0	6,9	97
MASA TOTAL USADA (g):		3002	PROMEDIO =			98

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1801,0	1797,1	0,0	4	100
1/2"	3/8"	1000,2	997,7	0,0	2,5	100
3/8"	4	200,0	196,0	0,0	4,0	98
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =			99

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21593		
Obra:	CANCELES								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	WEB-	WLC-113	Fecha de Ensayo:	3-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	3-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,46	0,93	538,0	1251,0	716,0	1254,0	2,325				83,2	4,7	12,2	16,8	72,3		1524	1418	3,27
2		0,93	542,0	1261,0	722,0	1264,0	2,327		2000		83,2	4,6	12,2	16,8	72,5		1522	1416	3,30
3		0,96	523,0	1215,0	695,0	1218,0	2,323		7416		83,1	4,8	12,1	16,9	71,9		1507	1447	3,26
4		0,93	540,0	1255,0	718,0	1258,0	2,324		8596		83,1	4,7	12,2	16,9	72,1		1574	1464	3,35
PROMEDIO							2,325	2,432	2,439	0,13	83,2	4,7	12,2	16,8	72,2	5,34		1436,2	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3189,7							
		PESO FINAL:(g)				2985,0							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3373,9 gr P ₂ 3188,7 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	270,3	8,5	8,5	91,5	95	80	94	86	Filtro P ₁ 23,7 gr P ₂ 24,7 gr			
9,50	3/8"	348,0	10,9	19,4	80,6	88	70	85	77				
4,75	No 4	720,9	22,6	42,0	58,0	65	49	62	54	5,46			
2,00	10	726,3	22,8	64,8	35,2	45	29	38	32				
0,43	40	614,7	19,3	84,0	16,0	25	14	22	16	Estabilidad min 100 918			
0,18	80	190,5	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10				
0,08	200	114,3	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					435,9					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,98								

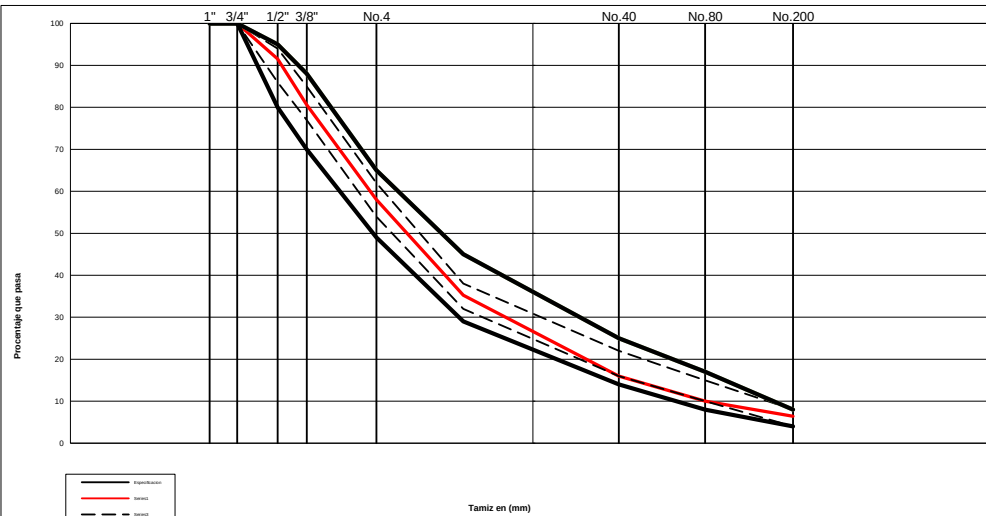

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21595	Fecha:	4/06/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 31/2" PARA MEZCLA ASFALTICA BT-12		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

MÉTODO DE CALCULO					
		CONTEO	MASA		
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No
Pasa	Retiene		F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1336,1	1071,4	0,0	264,7
1/2"	3/8"	1463,9	1080,4	0,0	383,5
3/8"	4	200,0	156,7	0,0	43,3
MASA TOTAL USADA (g):		3000	PROMEDIO =		77

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

MÉTODO DE CALCULO					
		CONTEO	MASA		
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)
Pasa	Retiene		F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1336,1	1119,8	0,0	216
1/2"	3/8"	1463,9	1192,2	0,0	271,7
3/8"	4	200,0	196,0	0,0	4,0
MASA TOTAL USADA (g):		3000	PROMEDIO =		88

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21600		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	2	WEB-	WLC-113	Fecha de Ensayo:	4-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	4-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,20	0,96	532,0	1239,0	710,0	1242,0	2,329				83,5	4,7	11,7	16,5	71,2		1481	1421	3,18
2		0,93	537,0	1252,0	718,0	1255,0	2,331		2000		83,6	4,6	11,7	16,4	71,6		1523	1417	3,20
3		1,00	519,0	1211,0	694,0	1213,0	2,333		7416		83,7	4,6	11,7	16,3	72,0		1426	1426	3,15
4		0,93	543,0	1266,0	725,0	1268,0	2,331		8598		83,6	4,6	11,7	16,4	71,6		1518	1412	3,15
PROMEDIO							2,331	2,441	2,445	0,07	83,6	4,6	11,7	16,4	71,6	5,13		1418,9	3,2

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3382,0											
		PESO FINAL:(g) 3173,8											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂		3567,4
12,7	1/2"	350,7	10,4	10,4	89,6	95	80	94	86		P ₂		3380,8
9,50	3/8"	248,1	7,3	17,7	82,3	88	70	85	77	P ₁	Filtro	gr	
4,75	No 4	786,2	23,2	41,0	59,0	65	49	62	54		P ₁		21,9
2,00	10	792,3	23,4	64,4	35,6	45	29	38	32		P ₂		23,1
0,43	40	662,3	19,6	84,0	16,0	25	14	22	16	5,20			
0,18	80	205,3	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	128,9	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante				1,20				Vacios en agreg %				15	
Relacion Estabilidad -Flujo				447,6				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				9,57									

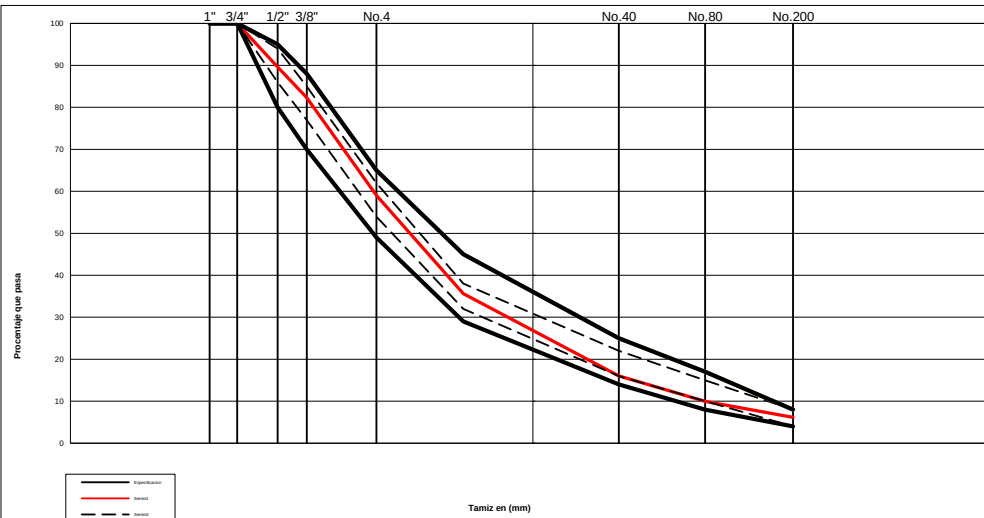

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21602		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WLC-135	Fecha de Ensayo:	5-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	5-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,45																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3439,9							
		PESO FINAL:(g)				3224,5							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3638,1 gr P ₂ 3438,0 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	317,1	9,2	9,2	90,8	95	80	94	86	Filtro P ₁ 23,5 gr P ₂ 25,4 gr			
9,50	3/8"	404,2	11,8	21,0	79,0	88	70	85	77				
4,75	No 4	798,4	23,2	44,2	55,8	65	49	62	54				
2,00	10	765,8	22,3	66,4	33,6	45	29	38	32				
0,43	40	602,3	17,5	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	206,5	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918
0,08	200	130,2	3,8	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

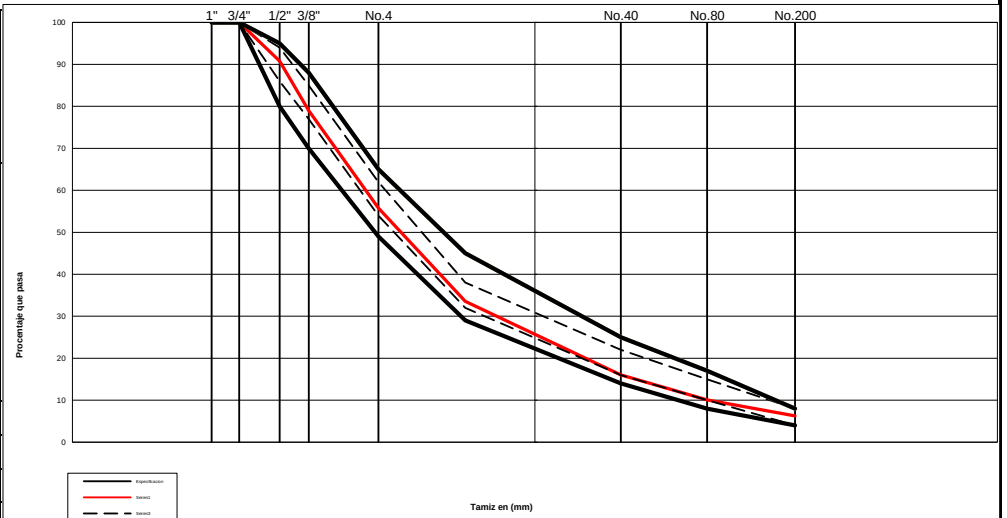

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21603		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	8	WEB-	WEB-093	Fecha de Ensayo:	5-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	5-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,40	0,96	525,0	1230,0	708,0	1233,0	2,343				83,9	4,1	12,1	16,1	74,8		1485	1425	3,35
2		0,96	524,0	1225,0	704,0	1228,0	2,338		2000		83,7	4,3	12,1	16,3	73,9		1479	1419	3,33
3		0,96	530,0	1236,0	709,0	1239,0	2,332		7416		83,5	4,5	12,0	16,5	72,8		1550	1488	3,32
4		0,96	528,0	1234,0	710,0	1238,0	2,337		8597		83,7	4,3	12,1	16,3	73,7		1518	1458	3,34
PROMEDIO							2,337	2,434	2,442	0,14	83,7	4,3	12,1	16,3	73,8	5,26		1447,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3371,5							
		PESO FINAL:(g)				3162,4							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3563,9 gr P ₂ 3370,0 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	351,8	10,4	10,4	89,6	95	80	94	86	Filtro P ₁ 21,8 gr P ₂ 23,3 gr			
9,50	3/8"	345,9	10,3	20,7	79,3	88	70	85	77				
4,75	No 4	718,7	21,3	42,0	58,0	65	49	62	54	5,40			
2,00	10	767,9	22,8	64,8	35,2	45	29	38	32				
0,43	40	648,5	19,2	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	200,3	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	129,3	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,18					Vacios en agreg %			15
Relacion Estabilidad -Flujo					434,1					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO			7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,83								

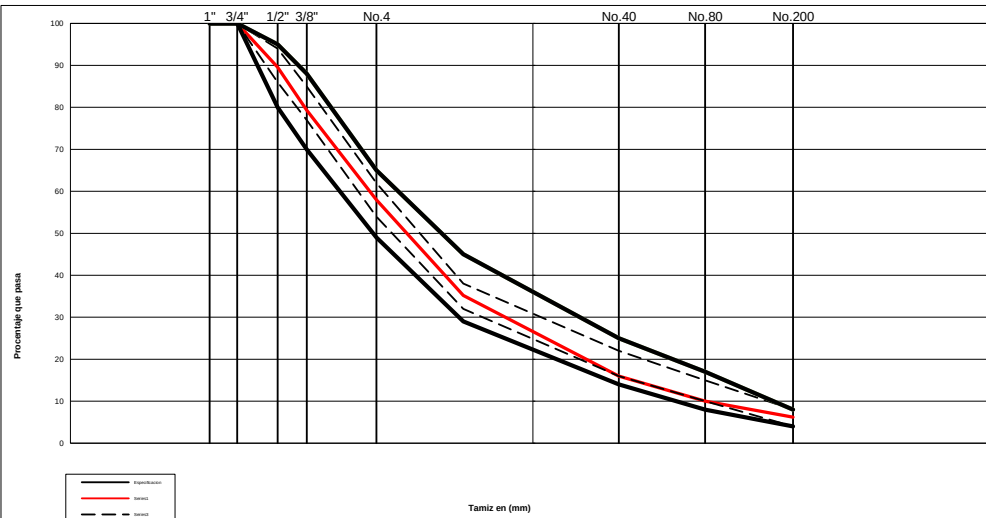

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21604		
Obra:	AVENIDA 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WLC-135	Fecha de Ensayo:	5-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	5-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,30	0,96	535,0	1247,0	715,0	1250,0	2,331				83,5	4,6	11,9	16,5	72,4		1516	1456	3,26
2		0,96	534,0	1244,0	714,0	1248,0	2,330		2000		83,5	4,6	11,9	16,5	72,1		1490	1430	3,22
3		0,93	536,0	1248,0	716,0	1252,0	2,328		7416		83,4	4,7	11,9	16,6	71,9		1553	1444	3,18
4		0,96	534,0	1246,0	713,0	1247,0	2,333		8597		83,6	4,5	11,9	16,4	72,9		1519	1459	3,21
PROMEDIO							2,331	2,436	2,442	0,10	83,5	4,6	11,9	16,5	72,3	5,20		1447,2	3,2

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3337,4							
		PESO FINAL:(g)				3130,3							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3524,1	gr
12,7	1/2"	433,5	13,0	13,0	87,0	95	80	94	86		P ₂	3334,9	gr
9,50	3/8"	364,9	10,9	23,9	76,1	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	644,5	19,3	43,2	56,8	65	49	62	54		P ₁	21,7	gr
2,00	10	717,4	21,5	64,7	35,3	45	29	38	32		P ₂	24,2	gr
0,43	40	642,2	19,2	84,0	16,0	25	14	22	16	5,30			
0,18	80	200,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	127,5	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,19		Vacios en agreg %		15				
Relacion Estabilidad -Flujo					449,8		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5				
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,71								

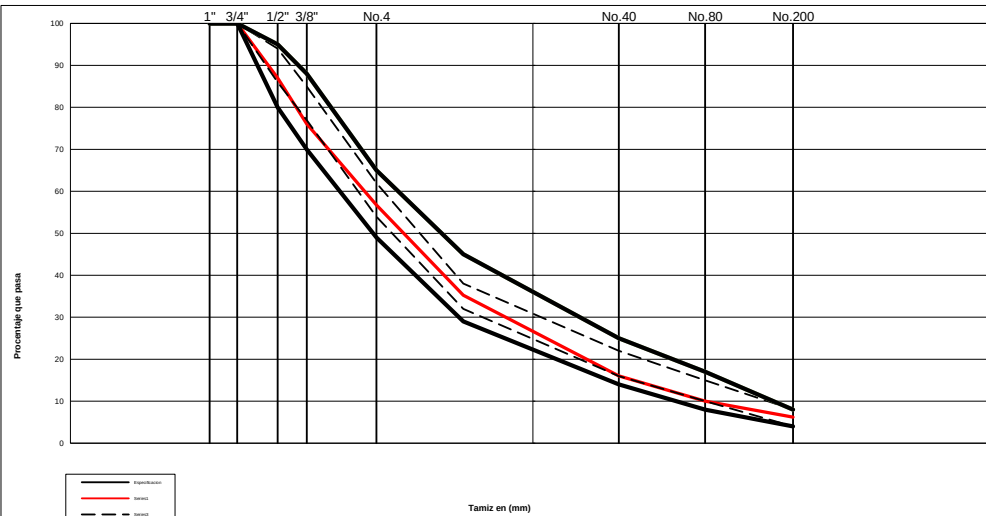

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21606		
Obra:	AVNIDA 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	WEB-	WLC-135	Fecha de Ensayo:	6-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	6-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,31	0,96	532,0	1239,0	710,0	1242,0	2,329				83,4	4,7	11,8	16,6	71,3		1526	1465	3,36
2		0,93	537,0	1250,0	716,0	1253,0	2,328		2000		83,4	4,8	11,8	16,6	71,1		1516	1410	3,33
3		0,96	534,0	1244,0	714,0	1248,0	2,330		7416		83,5	4,7	11,8	16,5	71,5		1503	1443	3,25
4		0,93	539,0	1253,0	716,0	1255,0	2,325		8598		83,3	4,9	11,8	16,7	70,6		1519	1413	3,32
PROMEDIO							2,328	2,436	2,445	0,16	83,4	4,8	11,8	16,6	71,1	5,16		1432,9	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g) 3301,6													
		PESO FINAL:(g) 3100,0													
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3486,9	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100						
12,7	1/2"	452,5	13,7	13,7	86,3	95	80	94	86	Filtro	P ₂	3299,2	gr		
9,50	3/8"	332,9	10,1	23,8	76,2	88	70	85	77						
4,75	No 4	702,3	21,3	45,1	54,9	65	49	62	54	P ₁	22,0	gr			
2,00	10	651,2	19,7	64,8	35,2	45	29	38	32						
0,43	40	635,3	19,2	84,0	16,0	25	14	22	16	P ₂	24,4	gr			
0,18	80	197,2	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10						
0,08	200	128,6	3,9	93,9	6,1	8	4	8	4	Estabilidad min		100	918		
	P200		0,0							Flujo mm		2-3,5			
Relacion Llenante - ligante				1,18		Vacios con aire %				4-6					
Relacion Estabilidad -Flujo				432,2		Vacios en agreg %				15					
ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						9,63				ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5	

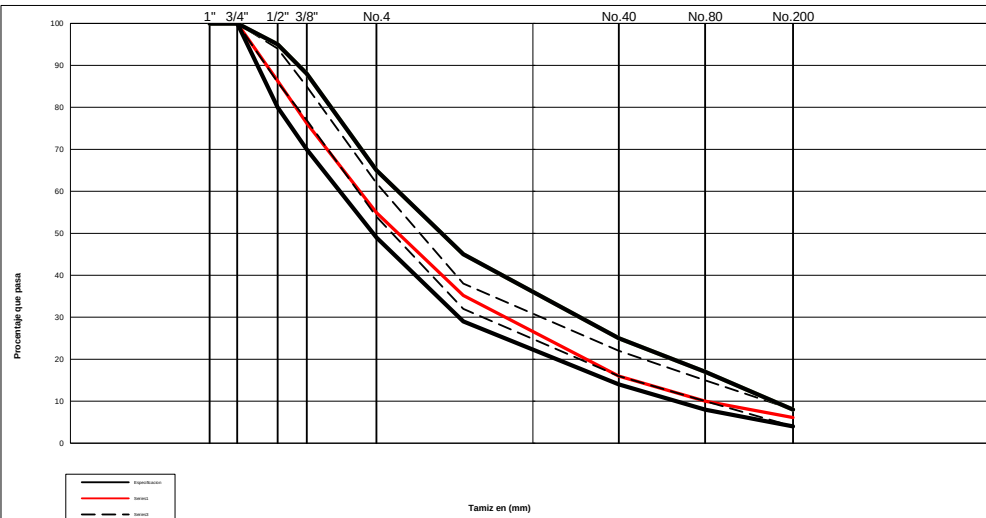

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21610		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	ESV-252	Fecha de Ensayo:	9-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	9-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,48	0,96	530,0	1236,0	709,0	1239,0	2,332				83,4	4,4	12,2	16,6	73,6		1493	1433	3,25
2		0,93	543,0	1263,0	723,0	1266,0	2,326		2000		83,2	4,6	12,2	16,8	72,4		1518	1412	3,38
3		0,93	538,0	1253,0	717,0	1255,0	2,329		7416		83,3	4,5	12,2	16,7	73,0		1514	1408	3,25
4		0,96	530,0	1236,0	708,0	1238,0	2,332		8596		83,4	4,4	12,2	16,6	73,6		1529	1467	3,38
PROMEDIO							2,330	2,429	2,439	0,18	83,3	4,5	12,2	16,7	73,2	5,31		1430,2	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)						3346,3					
		PESO FINAL:(g)						3132,5					
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3540,4	gr	
12,7	1/2"	380,0	11,4	11,4	88,6	95	80	94	86		P ₂	3345,2	gr
9,50	3/8"	388,4	11,6	23,0	77,0	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	730,7	21,8	44,8	55,2	65	49	62	54		25,0	gr	
2,00	10	688,4	20,6	65,4	34,6	45	29	38	32		P ₂	26,1	gr
0,43	40	622,3	18,6	84,0	16,0	25	14	22	16				5,48
0,18	80	197,1	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	125,6	3,8	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20				Vacios en agreg %		15		
Relacion Estabilidad -Flujo					431,4				ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5		
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,93								

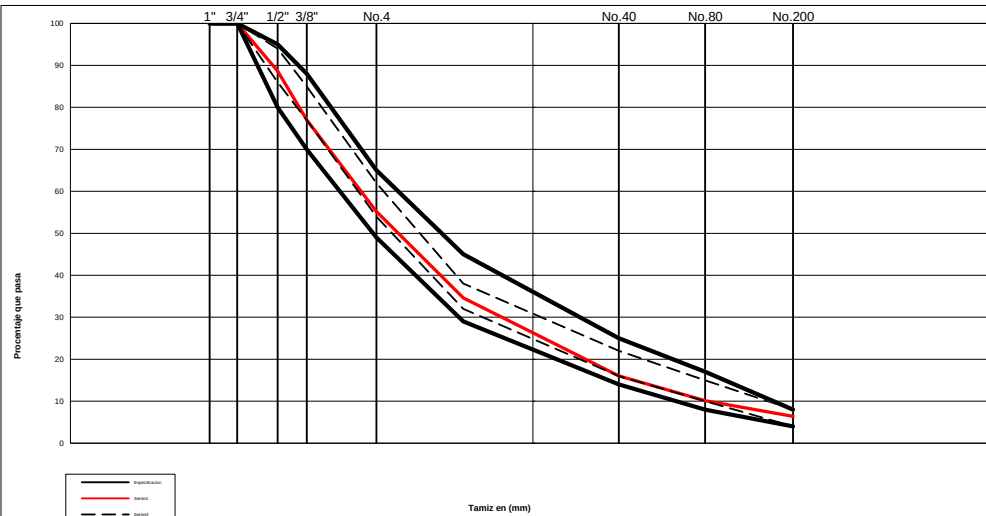

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21612		
Obra:	AVENIDA 30DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	WEB-	SXF-624	Fecha de Ensayo:	9-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	9-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,44	0,96	528,0	1227,0	702,0	1230,0	2,324				83,1	4,7	12,1	16,9	72,0		1493	1433	3,25
2		0,96	528,0	1226,0	701,0	1229,0	2,322		2000		83,1	4,8	12,1	16,9	71,6		1518	1458	3,38
3		0,93	544,0	1263,0	721,0	1265,0	2,322		7416		83,1	4,8	12,1	16,9	71,6		1514	1408	3,25
4		0,89	549,0	1277,0	731,0	1280,0	2,326		8596		83,2	4,6	12,1	16,8	72,4		1529	1360	3,38
PROMEDIO							2,323	2,430	2,439	0,15	83,1	4,7	12,1	16,9	71,9	5,29	1414,8	3,3	

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO						
		PESO INICIAL:(g)				3357,3										
		PESO FINAL:(g)				3144,0										
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO								
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3550,3	gr		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100							
12,7	1/2"	329,0	9,8	9,8	90,2	95	80	94	86			P ₂	3355,8	gr		
9,50	3/8"	453,8	13,5	23,3	76,7	88	70	85	77							
4,75	No 4	723,6	21,6	44,9	55,1	65	49	62	54	P ₁	23,9	gr				
2,00	10	681,3	20,3	65,2	34,8	45	29	38	32							
0,43	40	632,7	18,8	84,0	16,0	25	14	22	16	P ₂	25,4	gr				
0,18	80	200,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10							
0,08	200	123,0	3,7	93,6	6,4	8	4	8	4	5,44		Estabilidad min		100	918	
	P200		0,0							Flujo mm		2-3,5				
Relacion Llenante - ligante				1,20				Vacios con aire %				4-6				
Relacion Estabilidad -Flujo				426,8				Vacios en agreg %				15				
ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						9,89				ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5		

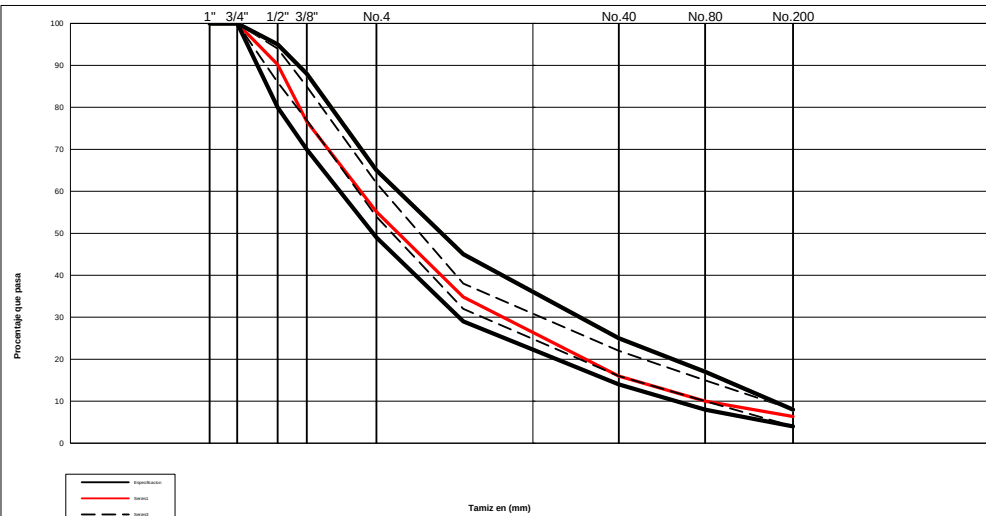

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:	PMA-FOR-010
	FORMATO	Versión:	1
	IMPUREZAS EN AGREGADOS GRUESOS -NORMA INVIAS 237- 2013	FECHA	15/02/2019
Página 1 de 1			

N. de Muestra: 21613

Fecha: 10/06/2026

Fecha: 10/06/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

Descripción :

Agregado Triturado TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZACION PLANTA

K 15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producción

ENSAYO HUMEDAD		
Masa muestra húmeda (Mh) (g)		3000,0
Masa muestra seca (Ms) (g)		2979,3
Humedad (w)		0,695
ENSAYO LIMPIEZA SUPERFICIAL		
Masa húmeda muestra (Mhe) (g)		3000,0
Masa muestra seca después de lavado sobre tamiz No. 35 (m) (g)		2964,9
Masa seca muestra (Mse) (g)		2979,3
Impurezas (g)		14
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL		0,5
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL PROMEDIO		0,5
ESPECIFICACION MÁXIMO (%)		0,5
CUMPLE		SI

OBSERVACION:

MUESTRA TOMADA EN ACOPIO PLANTA

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21616
Fecha de Toma: 10/06/2026

Fecha de Ensayo: 10/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia


Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,5	2,4	2,5
Lectura de arcilla (B)	3,7	3,6	3,7
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	68	67	68
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			67

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	7

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:

21616

Fecha:

10/06/2026

Fecha:

10/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producto terminado

Peso del Cilindro (g):	268	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos V: Volumen del Cilindro F: Masa Neta G: Gravedad Específica
Volumen del Cilindro (cm³):	100,3		
Gravedad Específica Bulk:	2,623		

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba Nº	Masa Neta, g
Pasa Nº 8	Reten Nº 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,1	132,1
Pasa Nº 16	Reten Nº 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,3	132,3
Pasa Nº 30	Reten Nº 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,1	132,1
Pasa Nº 50	Reten Nº 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	132,166667
Total			190,0	Us	49,8

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1 Masa Neta, g	Prueba Nº 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa Nº 8		Reten Nº 16	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 16		Reten Nº 30	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 30		Reten Nº 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1	Prueba Nº 2	Promedio	% Vacíos
Pasa Nº 4			190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21617		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	WEB-	ESV-252	Fecha de Ensayo:	10-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	10-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,31																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3401,8							
		PESO FINAL:(g)				3190,1							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3592,7	gr
12,7	1/2"	316,4	9,3	9,3	90,7	95	80	94	86		P ₂	3398,1	gr
9,50	3/8"	363,0	10,7	20,0	80,0	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	816,5	24,0	44,0	56,0	65	49	62	54		P ₁	20,9	gr
2,00	10	771,4	22,7	66,7	33,3	45	29	38	32		P ₂	24,6	gr
0,43	40	589,4	17,3	84,0	16,0	25	14	22	16			5,31	
0,18	80	203,4	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	130,0	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

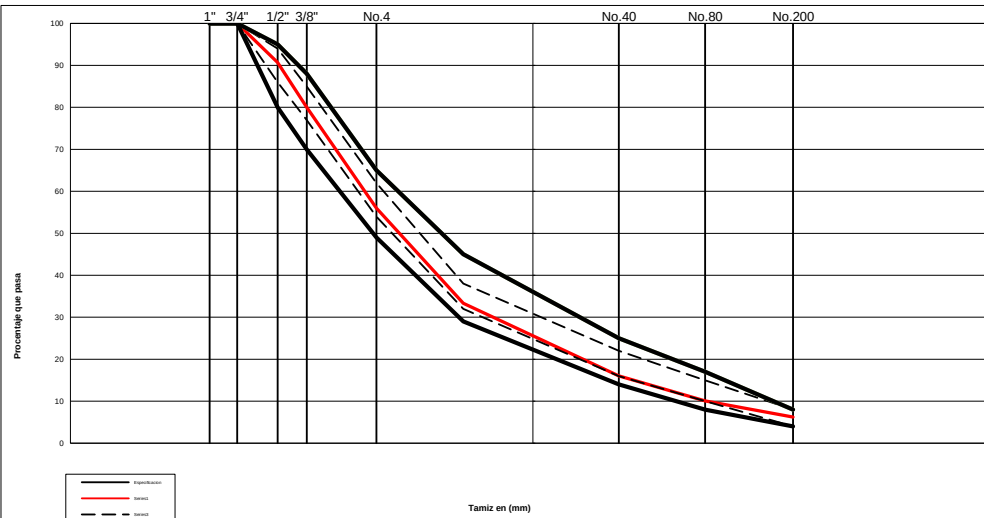

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21618		
Obra:	AVENIDA 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	6	WEB-	WLC-135	Fecha de Ensayo:	10-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	10-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,39	0,96	535,0	1244,0	712,0	1247,0	2,325				83,2	4,7	12,1	16,8	72,2		1511	1451	3,29
2		0,93	536,0	1248,0	715,0	1251,0	2,328		2000		83,3	4,5	12,1	16,7	72,8		1512	1406	3,26
3		0,96	535,0	1247,0	714,0	1249,0	2,331		7416		83,4	4,4	12,1	16,6	73,2		1474	1416	3,25
4		0,96	535,0	1246,0	713,0	1248,0	2,329		8596		83,4	4,5	12,1	16,6	72,9		1504	1444	3,30
PROMEDIO							2,328	2,433	2,439	0,11	83,3	4,5	12,1	16,7	72,8	5,29		1429,1	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3375,9								
		PESO FINAL:(g)				3162,5								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3568,3	gr
12,7	1/2"	324,5	9,6	9,6	90,4	95	80	94	86	P ₂	3375,1	gr		
9,50	3/8"	370,1	11,0	20,6	79,4	88	70	85	77	Filtro				
4,75	No 4	756,3	22,4	43,0	57,0	65	49	62	54			P ₁	24,7	gr
2,00	10	679,2	20,1	63,1	36,9	45	29	38	32	P ₂	25,5	gr		
0,43	40	705,2	20,9	84,0	16,0	25	14	22	16			5,39		
0,18	80	201,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	125,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6			
Relacion Llenante - ligante				1,20				Vacios en agreg %				15		
Relacion Estabilidad -Flujo				436,4				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5		
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				9,88										

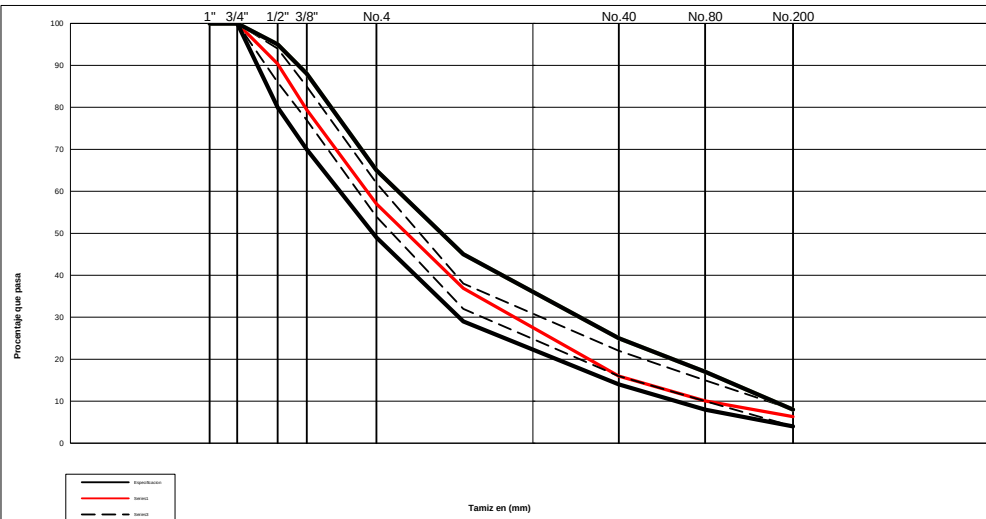

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21619		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	9	WEB-	SXF-782	Fecha de Ensayo:	10-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	10-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,38																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3295,3							
		PESO FINAL:(g)				3086,3							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3482,6 gr P ₂ 3291,7 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	204,8	6,2	6,2	93,8	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,9 gr P ₂ 24,5 gr			
9,50	3/8"	387,3	11,8	18,0	82,0	88	70	85	77				
4,75	No 4	846,6	25,7	43,7	56,3	65	49	62	54	5,38			
2,00	10	769,4	23,3	67,0	33,0	45	29	38	32				
0,43	40	560,8	17,0	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	198,0	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	119,4	3,6	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg % 15			
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5			
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

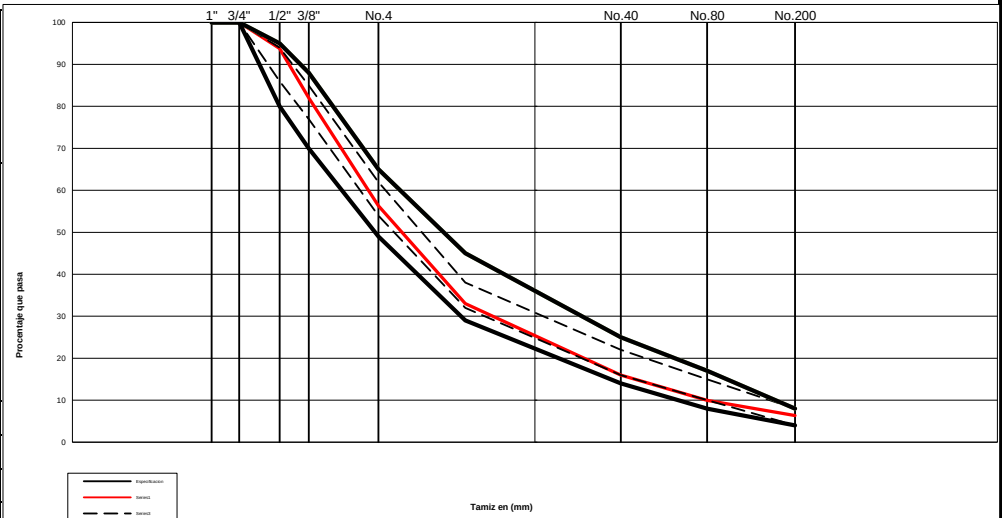

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21626		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	PLACA	ESV-486	Fecha de Ensayo:	11-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	11-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,33	0,93	545,0	1264,0	722,0	1267,0	2,319				83,1	4,9	12,0	16,9	71,0		1513	1407	3,22
2		0,93	537,0	1251,0	716,0	1253,0	2,330		2000		83,4	4,5	12,1	16,6	72,9		1510	1404	3,21
3		0,93	538,0	1256,0	720,0	1258,0	2,335		7416		83,6	4,3	12,1	16,4	73,9		1513	1407	3,20
4		0,96	531,0	1238,0	709,0	1240,0	2,331		8596		83,5	4,4	12,1	16,5	73,3		1493	1433	3,25
PROMEDIO							2,329	2,435	2,439	0,07	83,4	4,5	12,1	16,6	72,7	5,26		1413,1	3,2

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3294,8								
		PESO FINAL:(g)				3086,1								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3480,3 gr P ₂ 3294,0 gr				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					
12,7	1/2"	322,2	9,8	9,8	90,2	95	80	94	86	Filtro P ₁ 24,7 gr P ₂ 25,5 gr				
9,50	3/8"	411,9	12,5	22,3	77,7	88	70	85	77					
4,75	No 4	736,8	22,4	44,6	55,4	65	49	62	54					
2,00	10	701,7	21,3	65,9	34,1	45	29	38	32					
0,43	40	596,5	18,1	84,0	16,0	25	14	22	16			5,33		
0,18	80	195,4	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min 100		918		
0,08	200	121,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20			Vacios en agreg %					15	
Relacion Estabilidad -Flujo					438,8			ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,83									

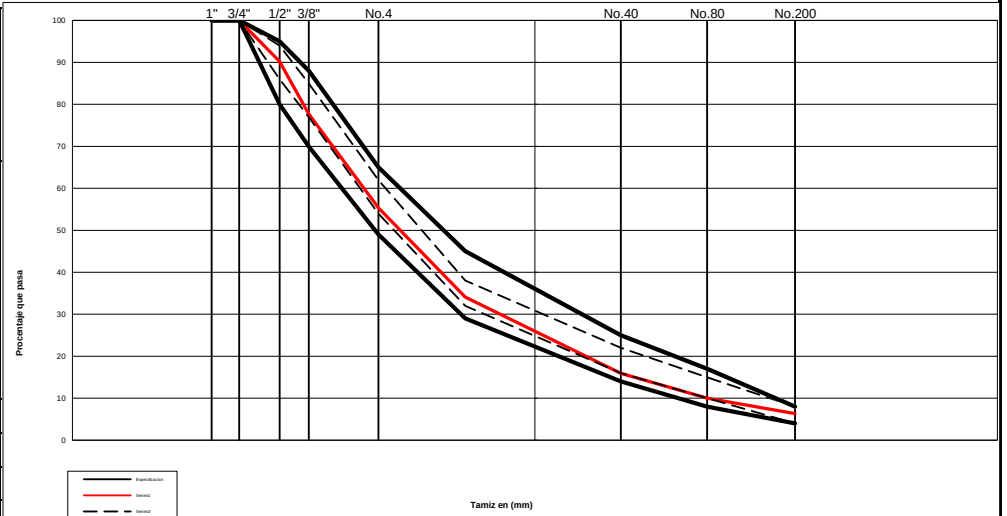

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21627		
Obra:	AVENIDA 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	PLACA	ESV-181	Fecha de Ensayo:	11-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	11-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,48	0,89	555,0	1287,0	735,0	1290,0	2,319				82,9	4,9	12,1	17,1	71,1		1591	1416	3,36
2		0,93	543,0	1261,0	720,0	1263,0	2,322		2000		83,1	4,8	12,2	16,9	71,8		1516	1410	3,35
3		0,96	526,0	1226,0	703,0	1229,0	2,331		7416		83,4	4,4	12,2	16,6	73,3		1503	1443	3,34
4		0,96	533,0	1241,0	710,0	1243,0	2,328		8596		83,3	4,5	12,2	16,7	72,9		1495	1435	3,35
PROMEDIO							2,325	2,430	2,439	0,16	83,2	4,7	12,2	16,8	72,3	5,32		1426,0	3,4

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3337,3							
		PESO FINAL:(g)				3130,0							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3530,7		
12,7	1/2"	325,3	9,7	9,7	90,3	95	80	94	86		P ₂	3336,0	gr
9,50	3/8"	377,6	11,3	21,1	78,9	88	70	85	77	P ₁	Filtro	gr	
4,75	No 4	776,4	23,3	44,3	55,7	65	49	62	54		23,5		
2,00	10	732,3	21,9	66,3	33,7	45	29	38	32		P ₂	24,8	gr
0,43	40	589,2	17,7	83,9	16,1	25	14	22	16	5,48			
0,18	80	199,3	6,0	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	129,9	3,9	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante				1,17				Vacios en agreg %				15	
Relacion Estabilidad -Flujo				425,7				ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5	
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				9,95									

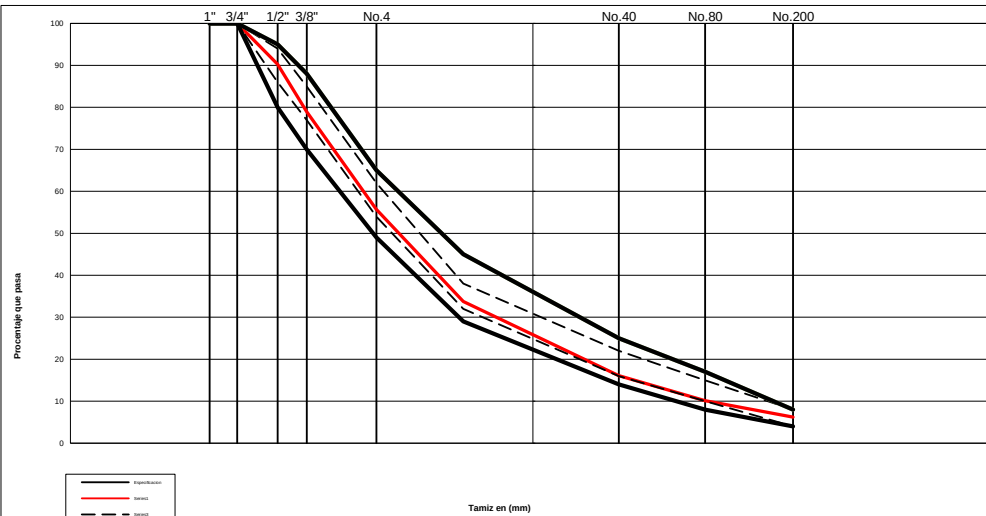

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ


Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21628	Fecha:	12/06/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 1" PARA MEZCLA ASFALTICA* LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO			Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No	
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1806,1	1771,4	0,0	34,7	98
1/2"	3/8"	1008,4	986,5	0,0	21,9	98
3/8"	4	216,5	208,4	0,0	8,1	96
MASA TOTAL USADA (g):		3031	PROMEDIO =			97

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO			Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1806,1	1782,8	0,0	23	99
1/2"	3/8"	1008,4	992,8	0,0	15,6	98
3/8"	4	216,5	212,0	0,0	4,5	98
MASA TOTAL USADA (g):		3031	PROMEDIO =			98

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21634		
Obra:	SAMARIA								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	ESV-181	Fecha de Ensayo:	12-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	12-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34	0,96	524,0	1218,0	697,0	1221,0	2,324				83,3	4,7	12,1	16,7	71,9		1499	1439	3,25
2		0,96	533,0	1237,0	707,0	1240,0	2,321		2000		83,1	4,8	12,0	16,9	71,3		1510	1450	3,34
3		0,96	532,0	1238,0	710,0	1242,0	2,327		7416		83,3	4,6	12,1	16,7	72,4		1514	1454	3,35
4		0,96	529,0	1231,0	706,0	1235,0	2,327		8596		83,3	4,6	12,1	16,7	72,4		1458	1400	3,34
PROMEDIO							2,325	2,434	2,439	0,09	83,3	4,7	12,1	16,7	72,0	5,25	1435,6	1435,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g)				3251,1									
		PESO FINAL:(g)				3046,4									
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra	3434,5	gr		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂			3250,0	gr
12,7	1/2"	259,5	8,0	8,0	92,0	95	80	94	86						
9,50	3/8"	329,4	10,1	18,1	81,9	88	70	85	77	P ₁	Filtro	24,4	gr		
4,75	No 4	838,1	25,8	43,9	56,1	65	49	62	54		P ₂			25,5	gr
2,00	10	710,5	21,9	65,7	34,3	45	29	38	32						
0,43	40	592,3	18,2	84,0	16,0	25	14	22	16			5,34			
0,18	80	195,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918		
0,08	200	121,0	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm			2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %			4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20				Vacios en agreg %			15			
Relacion Estabilidad -Flujo					432,4				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO			7,5			
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,81										

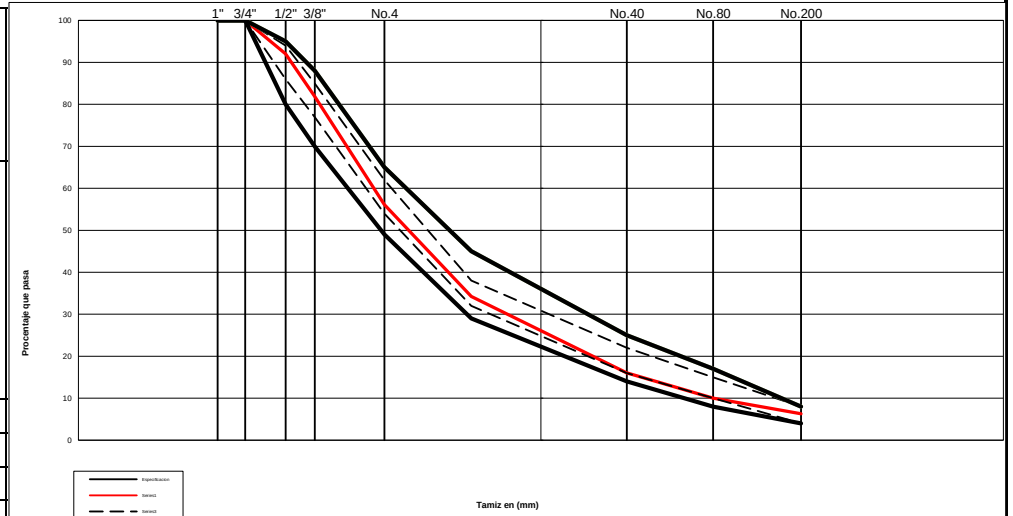

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

CODIGO

PMA-FOR-018

VERSION

0

FECHA

3/09/2019

PÁGINA

1

N° Muestra 21637
Fecha de Toma: 16/06/2026

Fecha de Ensayo: 16/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia


Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,5	2,4	2,6
Lectura de arcilla (B)	3,4	3,2	3,5
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	74	75	74
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			74

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	5

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:	<u>21637</u>			
Fecha:	<u>16/06/2026</u>	Fecha:	<u>16/06/2026</u>	

LOCALIZACION MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION
DESCRIPCION	ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control	☐ Procedencia	☐ Producción	☐ Producto terminado
-----------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

Peso del Cilindro (g):	268		
Volumen del Cilindro (cm ³):	100,3	%U=V-(F/G)/V*100	%U: Porcentaje de Vacíos
Gravedad Específica Bulk:	2,623	V: Volumen del Cilindro	F: Masa Neta
		G: Gravedad Específica	

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N°	Masa Neta, g
Pasa N° 8	Reten N° 16	44 ± 0,2 g	44,0	401,3	133,3
Pasa N° 16	Reten N° 30	57 ± 0,2 g	57,0	401,3	133,3
Pasa N° 30	Reten N° 50	72 ± 0,2 g	72,0	401,2	133,2
Pasa N° 50	Reten N° 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	133,266667
Total		190,0		Us	49,3

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba N° 1 Masa Neta, g	Prueba N° 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa N° 8		Reten N° 16	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 16		Reten N° 30	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 30		Reten N° 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C						
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g	Prueba N° 1	Prueba N° 2	Promedio	% Vacíos
Pasa N° 4		190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES	

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21641		
Obra:	SAMARIA								
Material:	MDC-19	Viaje No	1	PLACA	ESV-251	Fecha de Ensayo:	16-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	16-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,36																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3335,8							
		PESO FINAL:(g)				3124,3							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3524,6 gr P ₂ 3332,9 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	371,8	11,1	11,1	88,9	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,5 gr P ₂ 23,4 gr			
9,50	3/8"	353,2	10,6	21,7	78,3	88	70	85	77				
4,75	No 4	750,3	22,5	44,2	55,8	65	49	62	54	5,36			
2,00	10	675,5	20,3	64,5	35,5	45	29	38	32				
0,43	40	652,6	19,6	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	198,0	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918
0,08	200	122,9	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante						Vacios en agreg %						15	
Relacion Estabilidad -Flujo						ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

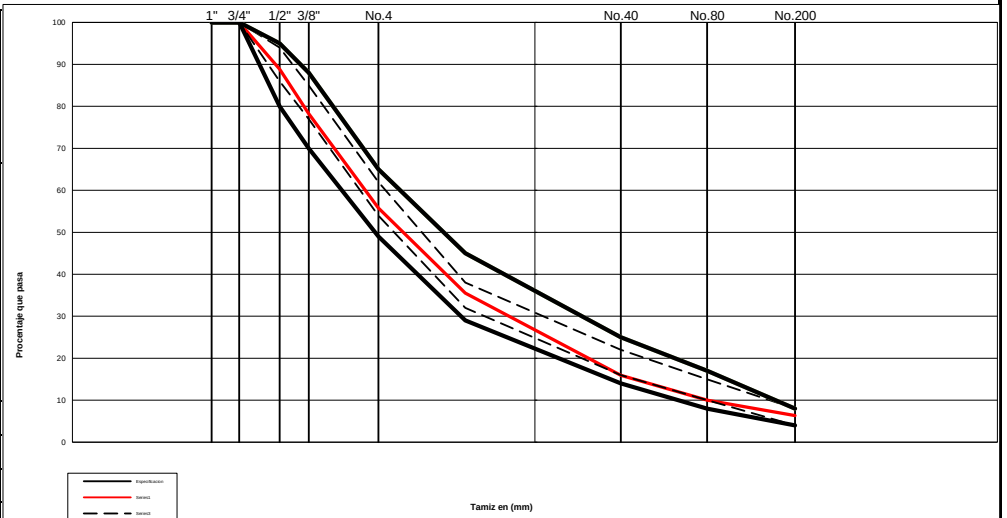

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21642		
Obra:	SAMARIA								
Material:	MDC-19	Viaje No	1	PLACA	ESV-181	Fecha de Ensayo:	16-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	16-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,38	0,96	535,0	1247,0	715,0	1250,0	2,331				83,4	4,4	12,1	16,6	73,2		1493	1433	3,33
2		0,93	537,0	1249,0	716,0	1253,0	2,326		2000		83,3	4,6	12,1	16,7	72,3		1518	1412	3,32
3		0,93	536,0	1245,0	712,0	1248,0	2,323		7416		83,2	4,8	12,1	16,8	71,7		1550	1441	3,27
4		0,93	537,0	1250,0	716,0	1253,0	2,328		8596		83,3	4,6	12,1	16,7	72,6		1560	1451	3,30
PROMEDIO							2,327	2,433	2,439	0,12	83,3	4,6	12,1	16,7	72,4	5,27		1434,4	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3276,4							
		PESO FINAL:(g)				3071,6							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3462,6
12,7	1/2"	264,1	8,1	8,1	91,9	95	80	94	86	P ₂	3273,9	gr	
9,50	3/8"	382,1	11,7	19,7	80,3	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	786,3	24,0	43,7	56,3	65	49	62	54			P ₁	23,4
2,00	10	706,7	21,6	65,3	34,7	45	29	38	32	P ₂	25,9	gr	
0,43	40	612,0	18,7	84,0	16,0	25	14	22	16			5,38	
0,18	80	198,1	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918
0,08	200	122,3	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					434,0					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,84								

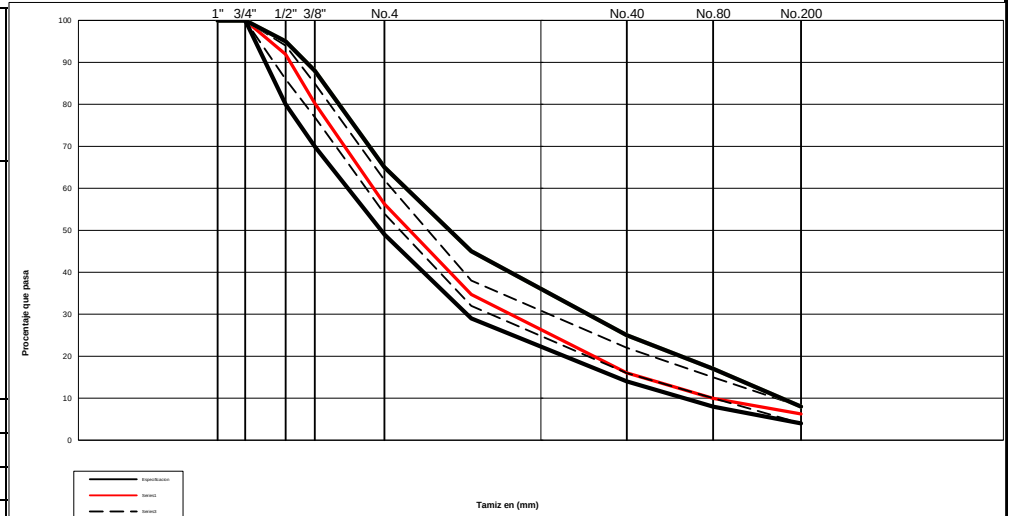

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21646		
Obra:	LENINGRADO								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	ESV-181	Fecha de Ensayo:	17-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	17-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,26	0,93	536,0	1253,0	720,0	1256,0	2,338				83,8	4,2	12,1	16,2	74,4		0	0	
2		0,96	524,0	1222,0	702,0	1226,0	2,332		2000		83,6	4,4	12,0	16,4	73,3		0	0	
3		0,96	533,0	1242,0	712,0	1245,0	2,330		7416		83,5	4,5	12,0	16,5	72,9		0	0	
4		0,89	555,0	1290,0	737,0	1292,0	2,324		8596		83,3	4,7	12,0	16,7	71,8		0	0	
PROMEDIO							2,331	2,438	2,439	0,02	83,6	4,4	12,0	16,4	73,1	5,24		0,0	#iDIV/0!

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3329,7							
		PESO FINAL:(g)				3119,8							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3514,6 gr P ₂ 3328,3 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	367,6	11,0	11,0	89,0	95	80	94	86	Filtro P ₁ 24,5 gr P ₂ 25,9 gr			
9,50	3/8"	352,2	10,6	21,6	78,4	88	70	85	77				
4,75	No 4	778,6	23,4	45,0	55,0	65	49	62	54	5,26			
2,00	10	715,5	21,5	66,5	33,5	45	29	38	32				
0,43	40	580,3	17,4	83,9	16,1	25	14	22	16	Estabilidad min 100 918			
0,18	80	200,3	6,0	89,9	10,1	17	8	15	10				
0,08	200	125,3	3,8	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					#iDIV/0!					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,77								

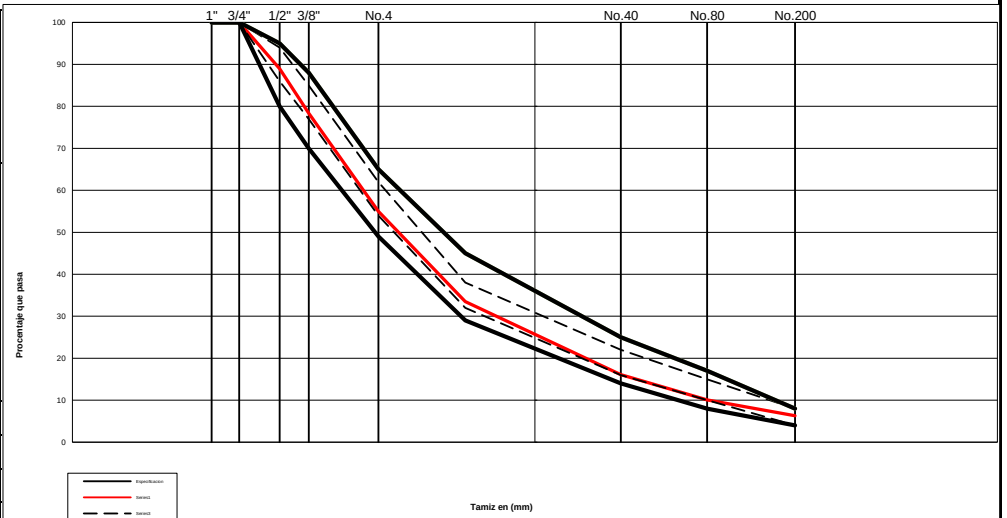

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21651		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	2	PLACA	SXF-624	Fecha de Ensayo:	17-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	17-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,33																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3372,2											
		PESO FINAL:(g) 3166,6											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3562,0	gr
12,7	1/2"	298,1	8,8	8,8	91,2	95	80	94	86		P ₂	3369,0	gr
9,50	3/8"	524,6	15,6	24,4	75,6	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	652,3	19,3	43,7	56,3	65	49	62	54		P ₁	20,2	gr
2,00	10	646,3	19,2	62,9	37,1	45	29	38	32		P ₂	23,4	gr
0,43	40	712,6	21,1	84,0	16,0	25	14	22	16			5,33	
0,18	80	200,3	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	132,4	3,9	93,9	6,1	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,16		Vacios en agreg %		15				
Relacion Estabilidad -Flujo					#N/D		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5				
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,83								

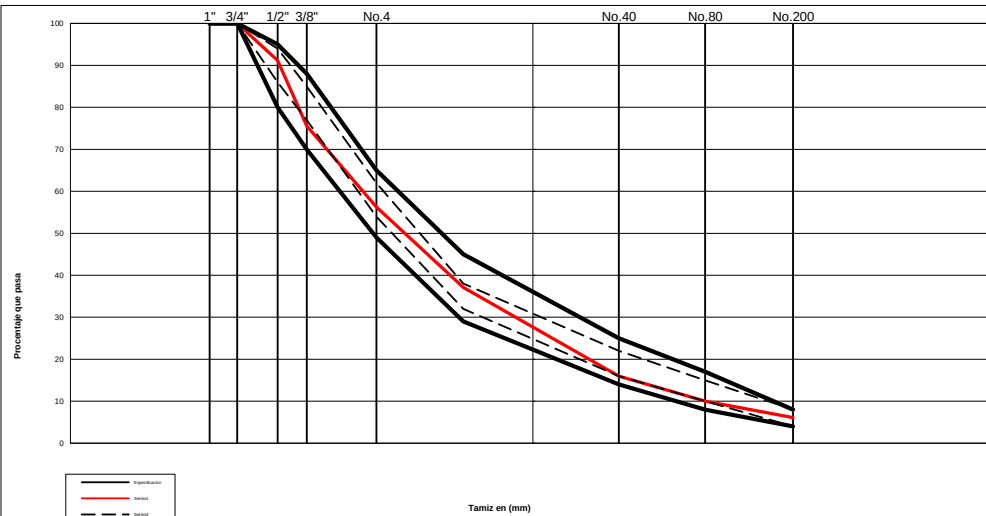

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21652		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	1	PLACA	SXF-782	Fecha de Ensayo:	17-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	17-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,26	0,93	542,0	1265,0	726,0	1268,0	2,334				83,7	4,3	12,0	16,3	73,6		1506	1401	3,18
2		0,93	546,0	1274,0	730,0	1276,0	2,333		2000		83,6	4,3	12,0	16,4	73,5		1528	1421	3,20
3		0,93	538,0	1251,0	715,0	1253,0	2,325		7416		83,3	4,7	12,0	16,7	72,0		1515	1409	3,15
4		0,93	538,0	1253,0	718,0	1256,0	2,329		8596		83,5	4,5	12,0	16,5	72,7		1522	1416	3,12
PROMEDIO							2,330	2,438	2,439	0,03	83,5	4,5	12,0	16,5	73,0	5,24	1411,6	1411,6	3,2

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3629,0							
		PESO FINAL:(g)				3364,2							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3830,6
12,7	1/2"	438,8	12,1	12,1	87,9	95	80	94	86	P ₂	3627,0	gr	
9,50	3/8"	512,4	14,1	26,2	73,8	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	675,3	18,6	44,8	55,2	65	49	62	54			P ₁	23,4
2,00	10	674,3	18,6	63,4	36,6	45	29	38	32	P ₂	25,4	gr	
0,43	40	745,2	20,5	83,9	16,1	25	14	22	16			5,26	
0,18	80	202,6	5,6	89,5	10,5	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	115,6	3,2	92,7	7,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacíos con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante						1,39				Vacíos en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo						446,3				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						9,77							

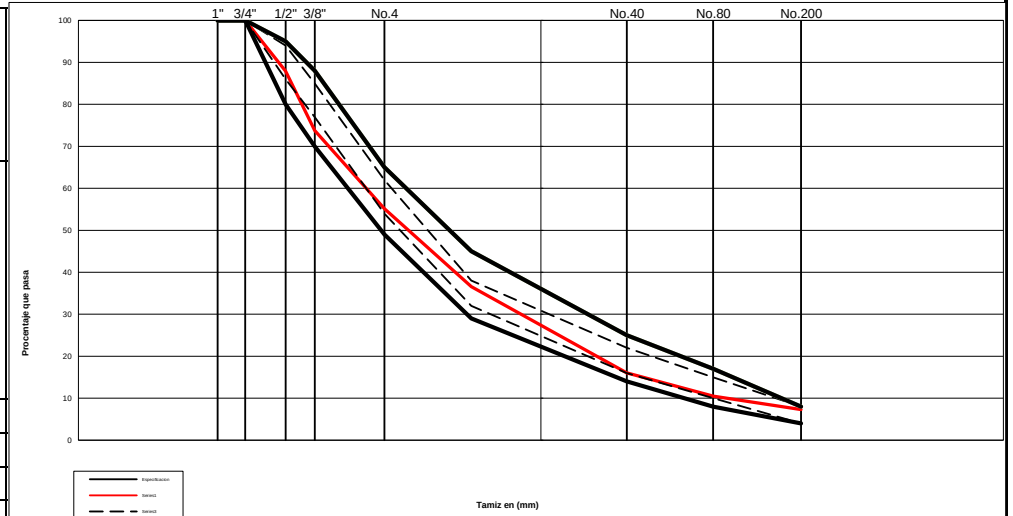

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21653	Fecha:	18/06/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 1" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1800,5	1759,6	0,0	40,9
1/2"	3/8"	1000,5	977,6	0,0	22,9
3/8"	4	200,2	189,9	0,0	10,3
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =		97

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1800,5	1786,2	0,0	14
1/2"	3/8"	1000,5	986,2	0,0	14,3
3/8"	4	200,0	194,2	0,0	5,8
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =		98

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21661		
Obra:	AVENIDA 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	2	PLACA	ESV-251	Fecha de Ensayo:	18-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	18-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,47	0,89	551,0	1280,0	732,0	1283,0	2,323				83,1	4,8	12,2	16,9	71,9		1629	1450	3,35
2		0,96	534,0	1240,0	709,0	1243,0	2,322		2000		83,1	4,8	12,2	16,9	71,7		1495	1435	3,34
3		0,89	556,0	1289,0	736,0	1292,0	2,318		7416		82,9	4,9	12,1	17,1	71,0		1617	1439	3,35
4		0,96	530,0	1232,0	705,0	1235,0	2,325		8596		83,1	4,7	12,2	16,9	72,2		1469	1411	3,34
PROMEDIO							2,322	2,430	2,439	0,16	83,0	4,8	12,2	17,0	71,7	5,32		1433,8	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3044,2								
		PESO FINAL:(g)				2851,9								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3220,4	gr
12,7	1/2"	278,2	9,1	9,1	90,9	95	80	94	86	P ₂	3042,8	gr		
9,50	3/8"	354,8	11,7	20,8	79,2	88	70	85	77	Filtro				
4,75	No 4	715,3	23,5	44,3	55,7	65	49	62	54			P ₁	24,1	gr
2,00	10	577,6	19,0	63,3	36,7	45	29	38	32	P ₂	25,5	gr		
0,43	40	630,2	20,7	84,0	16,0	25	14	22	16			5,47		
0,18	80	180,2	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	115,6	3,8	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,19			Vacios en agreg %					15	
Relacion Estabilidad -Flujo					428,6			ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5	
ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,95									

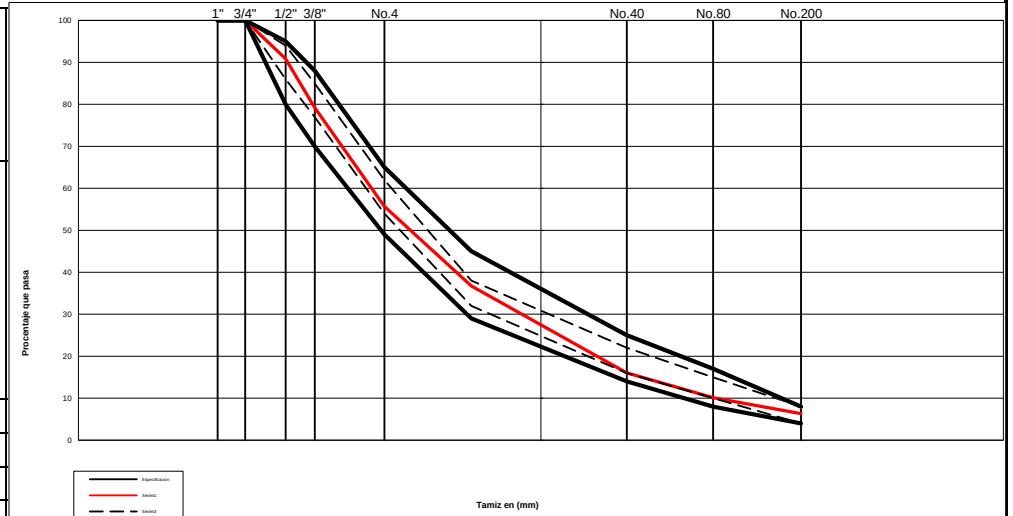

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
21662


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía: AGREGADOS DEL OCCIDENTE MUESTRA No. 21661
Obra: AVENIDA 30 DE AGOSTO
Material: MDC-19 Viaje No 6 PLACA TZO-815 Fecha de Ensayo: 18-jun-26 Fecha de Toma Muestra: 18-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,54																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3259,7							
		PESO FINAL:(g)				3056,2							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3450,7 gr P ₂ 3258,6 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	375,1	11,5	11,5	88,5	95	80	94	86	Filtro P ₁ 25,5 gr P ₂ 26,6 gr			
9,50	3/8"	328,6	10,1	21,6	78,4	88	70	85	77				
4,75	No 4	756,3	23,2	44,8	55,2	65	49	62	54	5,54			
2,00	10	672,0	20,6	65,4	34,6	45	29	38	32				
0,43	40	605,3	18,6	84,0	16,0	25	14	22	16	Estabilidad min 100 918			
0,18	80	197,6	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10				
0,08	200	121,3	3,7	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante						Vacios en agreg %						15	
Relacion Estabilidad -Flujo						ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

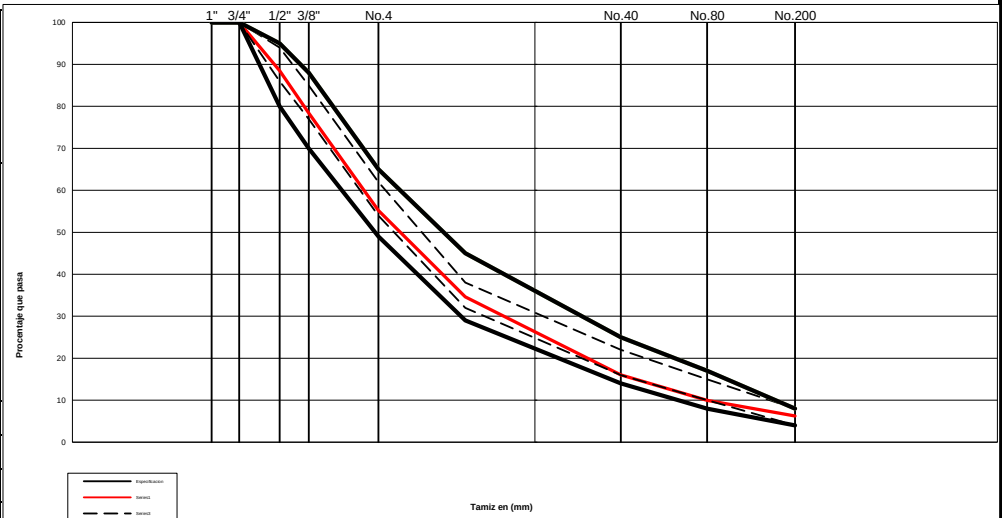

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21667		
Obra:	CORALES, SIMON BOLIVAR								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	SVE-234	Fecha de Ensayo:	19-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	19-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,48	0,96	525,0	1221,0	698,0	1223,0	2,326				83,2	4,6	12,2	16,8	72,4		1520	1460	3,35
2		0,93	540,0	1253,0	715,0	1255,0	2,320		2000		83,0	4,9	12,2	17,0	71,4		1553	1444	3,34
3		0,89	550,0	1277,0	730,0	1280,0	2,322		7416		83,0	4,8	12,2	17,0	71,7		1591	1416	3,35
4		0,93	536,0	1243,0	710,0	1246,0	2,319		8596		82,9	4,9	12,1	17,1	71,2		1528	1421	3,34
PROMEDIO							2,322	2,430	2,439	0,16	83,0	4,8	12,2	17,0	71,7	5,32		1435,0	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO								
		PESO INICIAL:(g)				3422,4												
		PESO FINAL:(g)				3203,0												
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO										
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3620,7	gr				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100						P ₂	3420,6	gr	
12,7	1/2"	322,9	9,4	9,4	90,6	95	80	94	86	Filtro	P ₁	20,6	gr					
9,50	3/8"	350,7	10,2	19,7	80,3	88	70	85	77					P ₂	22,4	gr		
4,75	No 4	745,3	21,8	41,5	58,5	65	49	62	54	Estabilidad min	100	918						
2,00	10	762,3	22,3	63,7	36,3	45	29	38	32				Flujo mm		2-3,5			
0,43	40	695,2	20,3	84,0	16,0	25	14	22	16							Vacios con aire %		4-6
0,18	80	202,6	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10									
0,08	200	124,0	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5						
	P200		0,0										Relacion Llenante - ligante		1,20			
																Relacion Estabilidad -Flujo		429,0

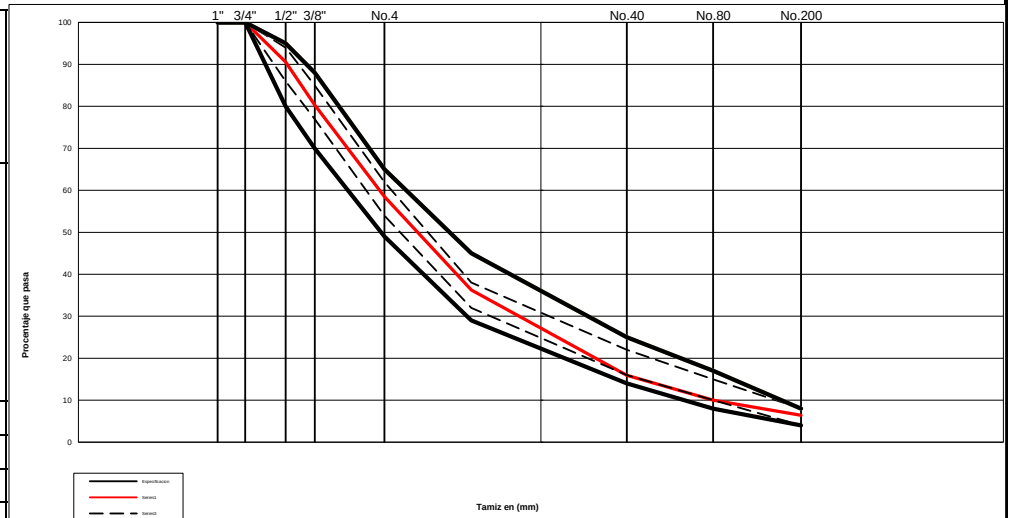

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía: AGREGADOS DEL OCCIDENTE MUESTRA No. 21668
Obra: AV 30 DE AGOSTO
Material: MDC-19 Viaje No 4 PLACA SVE-234 Fecha de Ensayo: 19-jun-26 Fecha de Toma Muestra: 19-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,33	0,93	539,0	1251,0	715,0	1254,0	2,321				83,1	4,8	12,0	16,9	71,3		1520	1414	3,35
2		0,93	538,0	1249,0	714,0	1252,0	2,322		2000		83,2	4,8	12,0	16,8	71,4		1553	1444	3,34
3		0,96	528,0	1228,0	703,0	1231,0	2,326		7416		83,3	4,6	12,1	16,7	72,2		1591	1527	3,35
4		0,93	542,0	1260,0	720,0	1262,0	2,325		8596		83,3	4,7	12,0	16,7	72,0		1528	1421	3,34
PROMEDIO							2,323	2,435	2,439	0,07	83,2	4,7	12,0	16,8	71,7	5,27	1451,5	3,3	

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3446,9							
		PESO FINAL:(g)				3232,2							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P₁3641,1gr P₂3445,1gr Filtro P₁22,8gr P₂24,6gr 5,33 Estabilidad min100918 Flujo mm2-3,5 Vacios con aire %4-6 Vacios en agreg %15 ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO7,5			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	363,2	10,5	10,5	89,5	95	80	94	86				
9,50	3/8"	404,2	11,7	22,3	77,7	88	70	85	77				
4,75	No 4	756,3	21,9	44,2	55,8	65	49	62	54				
2,00	10	749,8	21,8	66,0	34,0	45	29	38	32				
0,43	40	621,2	18,0	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	206,9	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10				
0,08	200	130,6	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4				
	P200		0,0										
Relacion Llenante - ligante					1,18								
Relacion Estabilidad -Flujo					433,9								
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,83								

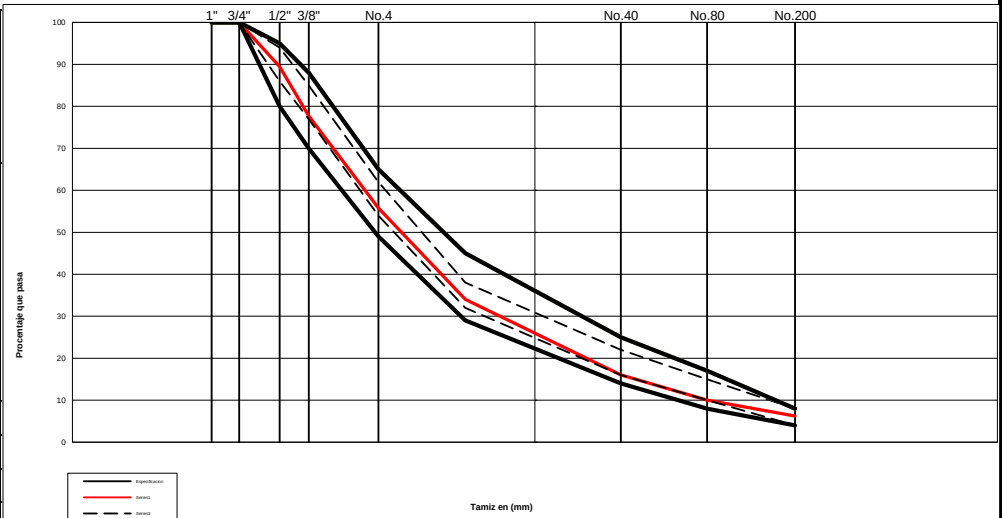

PREPARADO POR:

Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ
Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma
Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21671		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	ESV-181	Fecha de Ensayo:	20-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	20-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,40																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3568,2							
		PESO FINAL:(g)				3342,2							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3771,7 gr P ₂ 3566,0 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	344,2	9,6	9,6	90,4	95	80	94	86				
9,50	3/8"	380,7	10,7	20,3	79,7	88	70	85	77	Filtro P ₁ 20,6 gr P ₂ 22,8 gr			
4,75	No 4	856,3	24,0	44,3	55,7	65	49	62	54				
2,00	10	755,9	21,2	65,5	34,5	45	29	38	32				
0,43	40	660,3	18,5	84,0	16,0	25	14	22	16			5,40	
0,18	80	212,3	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	132,5	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante						Vacios en agreg %						15	
Relacion Estabilidad -Flujo						ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

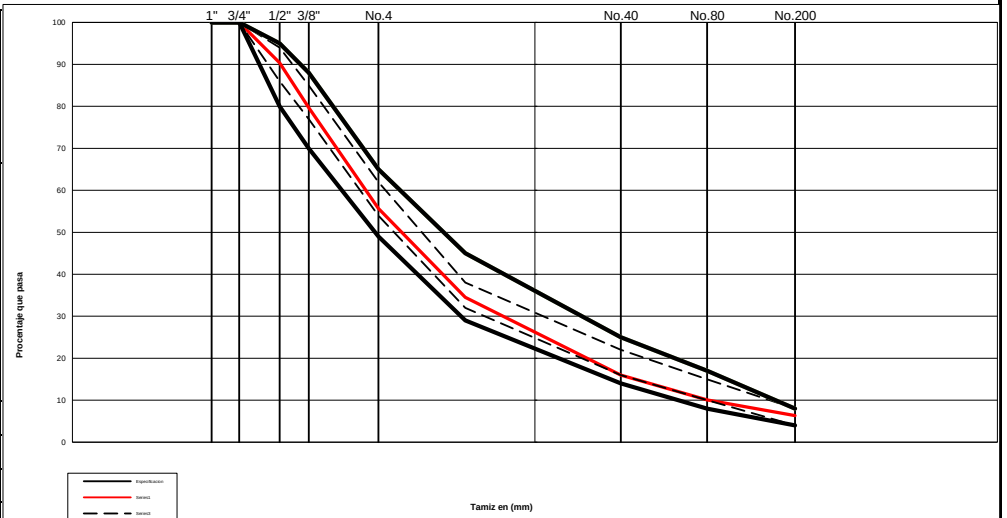

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1

Compañía: AGREGADOS DEL OCCIDENTE MUESTRA No. 21672

Obra: PARQUE INDUSTRIAL


Material: MDC-19 Viaje No 3 PLACA WEB-096 Fecha de Ensayo: 20-jun-26 Fecha de Toma Muestra: 20-jun-26

7

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,45	0,96	525,0	1221,0	698,0	1223,0	2,326				83,2	4,6	12,2	16,8	72,3		1489	1429	3,34
2		0,96	523,0	1215,0	695,0	1218,0	2,323		2000		83,1	4,8	12,1	16,9	71,9		1507	1447	3,32
3		0,89	552,0	1286,0	738,0	1290,0	2,330		7416		83,3	4,5	12,2	16,7	73,1		1615	1438	3,35
4		0,93	538,0	1252,0	715,0	1253,0	2,327		8596		83,3	4,6	12,2	16,7	72,6		1600	1488	3,31
PROMEDIO							2,326	2,431	2,439	0,15	83,2	4,6	12,2	16,8	72,5	5,31	1450,4	1450,4	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3339,4							
		PESO FINAL:(g)				3132,6							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3531,9 gr P ₂ 3337,3 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	302,8	9,1	9,1	90,9	95	80	94	86	Filtro P ₁ 22,8 gr P ₂ 24,9 gr			
9,50	3/8"	376,7	11,3	20,3	79,7	88	70	85	77				
4,75	No 4	756,3	22,6	43,0	57,0	65	49	62	54				
2,00	10	742,3	22,2	65,2	34,8	45	29	38	32				
0,43	40	628,2	18,8	84,0	16,0	25	14	22	16			5,45	
0,18	80	198,9	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918
0,08	200	127,4	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,17					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					435,5					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,93								

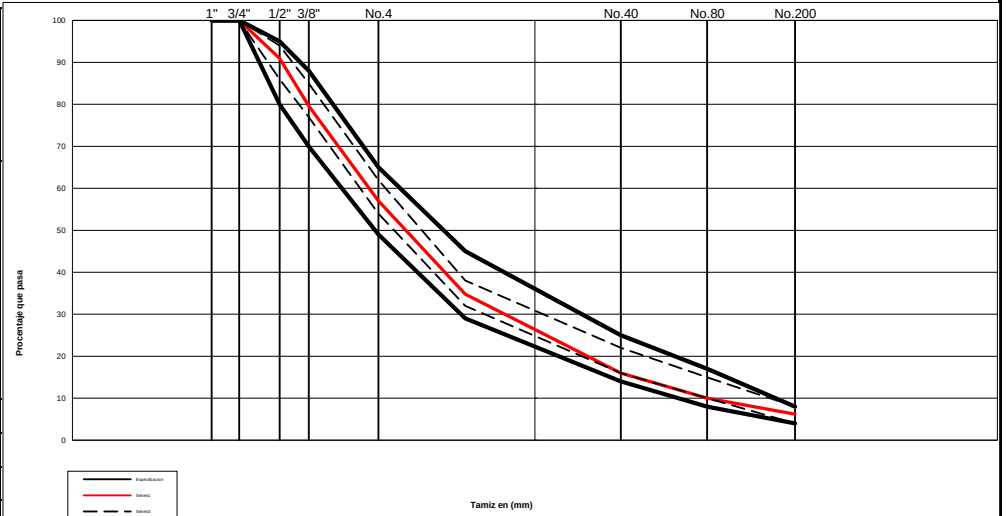

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21673		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	ESV-846	Fecha de Ensayo:	20-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	20-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,43	0,96	535,0	1238,0	706,0	1241,0	2,314				82,8	5,1	12,1	17,2	70,2		1499	1439	3,34
2		0,93	539,0	1246,0	710,0	1249,0	2,312		2000		82,7	5,2	12,1	17,3	69,8		1512	1406	3,32
3		0,89	548,0	1270,0	726,0	1274,0	2,318		7416		82,9	5,0	12,1	17,1	70,8		1595	1419	3,35
4		0,93	543,0	1257,0	718,0	1261,0	2,315		8596		82,8	5,1	12,1	17,2	70,4		1591	1479	3,31
PROMEDIO							2,315	2,432	2,439	0,13	82,8	5,1	12,1	17,2	70,3	5,30		1436,0	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3435,7							
		PESO FINAL:(g)				3217,7							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3633,0 gr P ₂ 3432,8 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	403,2	11,7	11,7	88,3	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,8 gr P ₂ 23,7 gr			
9,50	3/8"	326,6	9,5	21,2	78,8	88	70	85	77				
4,75	No 4	802,3	23,4	44,6	55,4	65	49	62	54				
2,00	10	783,6	22,8	67,4	32,6	45	29	38	32				
0,43	40	570,1	16,6	84,0	16,0	25	14	22	16			5,43	
0,18	80	206,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918
0,08	200	125,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					431,2					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,91								

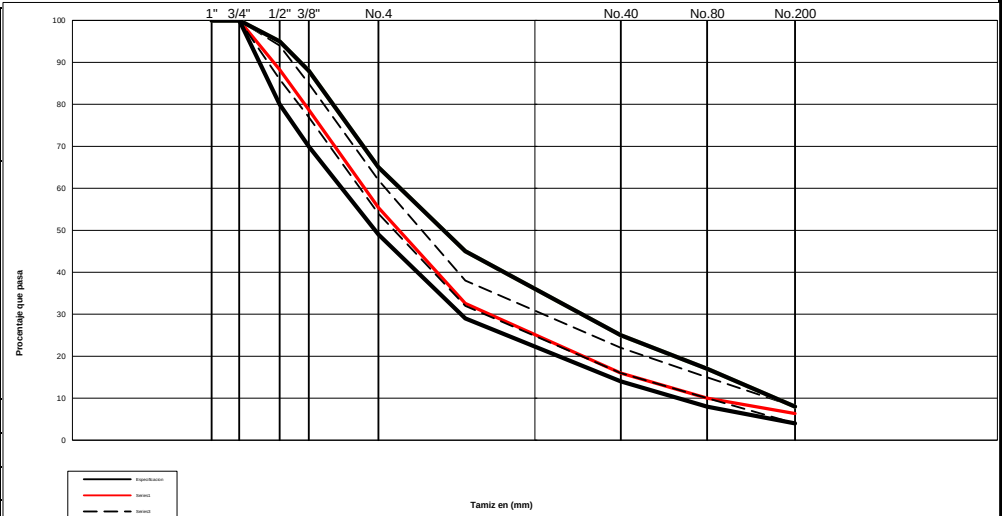

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:	PMA-FOR-010
	FORMATO	Versión:	1
	IMPUREZAS EN AGREGADOS GRUESOS -NORMA INVIAS 237- 2013	FECHA	15/02/2019
Página 1 de 1			

N. de Muestra: 21674

Fecha: 22/06/2026

Fecha: 22/06/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

Descripción :

Agregado Triturado TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZACION PLANTA

K 15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producción

ENSAYO HUMEDAD		
Masa muestra húmeda (Mh) (g)		3000,0
Masa muestra seca (Ms) (g)		2989,7
Humedad (w)		0,345
ENSAYO LIMPIEZA SUPERFICIAL		
Masa húmeda muestra (Mhe) (g)		3000,0
Masa muestra seca después de lavado sobre tamiz No. 35 (m) (g)		2980,5
Masa seca muestra (Mse) (g)		2989,7
Impurezas (g)		9
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL		0,3
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL PROMEDIO	0,31	
ESPECIFICACION MÁXIMO (%)	0,5	
CUMPLE	SI	

OBSERVACION:

MUESTRA TOMADA EN ACOPIO PLANTA

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

CODIGO

PMA-FOR-018

VERSION

0

FECHA

3/09/2019

PÁGINA

1

N° Muestra 21675
Fecha de Toma: 22/06/2026

Fecha de Ensayo: 22/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia


Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,4	2,3	2,3
Lectura de arcilla (B)	3,4	3,4	3,4
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	71	68	68
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			69

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	9

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:

21675

Fecha:

22/06/2026

Fecha:

22/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producto terminado

Peso del Cilindro (g):	268	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos V: Volumen del Cilindro F: Masa Neta G: Gravedad Específica
Volumen del Cilindro (cm³):	100,3		
Gravedad Específica Bulk:	2,623		

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba Nº	Masa Neta, g
Pasa Nº 8	Reten Nº 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,1	132,1
Pasa Nº 16	Reten Nº 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,0	132
Pasa Nº 30	Reten Nº 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,0	132
Pasa Nº 50	Reten Nº 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	132,033333
Total			190,0	Us	49,8

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1 Masa Neta, g	Prueba Nº 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa Nº 8		Reten Nº 16	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 16		Reten Nº 30	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 30		Reten Nº 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1	Prueba Nº 2	Promedio	% Vacíos
Pasa Nº 4			190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21676		
Obra:	POLICIA REGIONAL- PARQUE INDUSTRIAL- TERMINAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	TSY-073	Fecha de Ensayo:	22-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	22-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,54	1,00	519,0	1209,0	693,0	1212,0	2,329				83,3	4,5	12,3	16,7	73,2		1499	1499	3,35
2		0,96	533,0	1238,0	708,0	1241,0	2,323		2000		83,0	4,8	12,2	17,0	71,9		1519	1459	3,34
3		0,89	550,0	1281,0	733,0	1283,0	2,329		7416		83,2	4,5	12,3	16,8	73,1		1629	1450	3,32
4		0,96	533,0	1241,0	710,0	1243,0	2,328		8596		83,2	4,5	12,3	16,8	73,0		1485	1425	3,35
PROMEDIO							2,327	2,427	2,439	0,21	83,2	4,6	12,2	16,8	72,8	5,35		1458,3	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3276,0							
		PESO FINAL:(g)				3066,7							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3468,3
12,7	1/2"	346,5	10,6	10,6	89,4	95	80	94	86	P ₂	3274,8	gr	
9,50	3/8"	269,5	8,2	18,8	81,2	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	774,1	23,6	42,4	57,6	65	49	62	54			P ₁	24,9
2,00	10	779,2	23,8	66,2	33,8	45	29	38	32	P ₂	26,1	gr	
0,43	40	582,3	17,8	84,0	16,0	25	14	22	16			5,54	
0,18	80	195,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	119,5	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante						1,19				Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo						436,6				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						10,01							

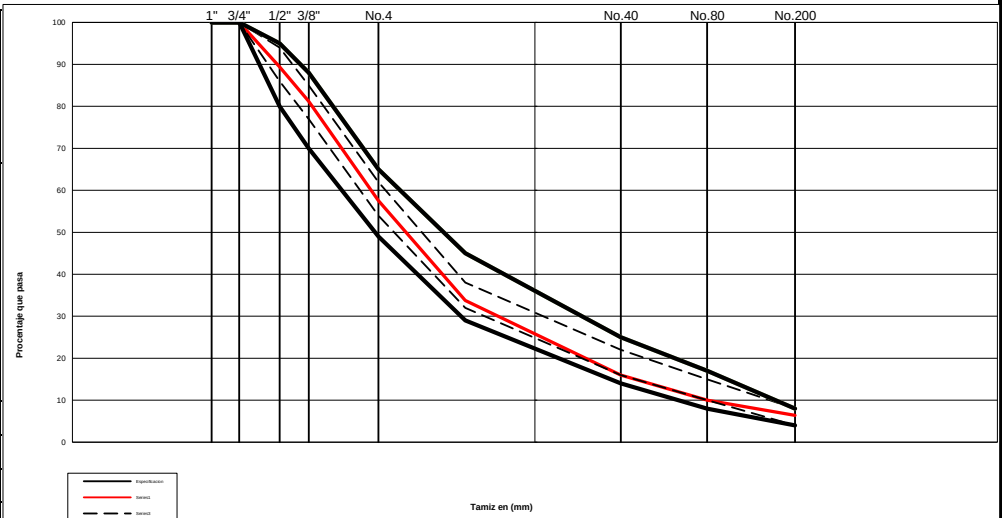

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21683
Fecha de Toma: 23/06/2026

Fecha de Ensayo: 23/06/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA - BT-9

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia

Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.	1	2	3
Lectura de Arena (A)	2,7	2,5	2,6
Lectura de Arcilla (B)	3,1	3,0	3,0
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	87,1	83,3	86,7
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			86

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,5
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	10

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:	<u>21683</u>			
Fecha:	<u>23/06/2026</u>	Fecha:	<u>23/06/2026</u>	

LOCALIZACION MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION
DESCRIPCION	ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA COLOR AMAILLO BT-9
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control	☐ Procedencia	☐ Producción	☐ Producto terminado
-----------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

Peso del Cilindro (g):	268		
Volumen del Cilindro (cm ³):	100,3	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos
Gravedad Especifica Bulk:	2,55		V: Volumen del Cilindro
			F: Masa Neta
			G: Gravedad Especifica



METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N°	Masa Neta, g
Pasa N° 8	Reten N° 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,0	132
Pasa N° 16	Reten N° 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,1	132,1
Pasa N° 30	Reten N° 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,0	132
Pasa N° 50	Reten N° 100	17 ± 0,2 g	17,0	Promedio	132
Total			190,0	Us	48,4

METODO B								
Fracción Tamaño Individual			Masa, g		Prueba N° 1 Masa Neta, g	Prueba N° 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa N° 8	Reten N° 16	190 ± 1,0 g						
Pasa N° 16	Reten N° 30	190 ± 1,0 g						
Pasa N° 30	Reten N° 50	190 ± 1,0 g						
Promedio							Um	

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N° 1	Prueba N° 2	Promedio	% Vacíos
Pasa N° 4		190 ± 1,0 g	190,0				U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A	45% min (Rodadura)
Mezcla Asfáltica	40% min (Intermedia)
Bases Granulares	35% min (Base)
	35 min

OBSERVACIONES	

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21684		
Obra:	CALLE 35								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	ESV-970	Fecha de Ensayo:	23-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	23-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,33																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3425,4											
		PESO FINAL:(g) 3209,6											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3618,3	gr
12,7	1/2"	274,3	8,0	8,0	92,0	95	80	94	86		P ₂	3424,4	gr
9,50	3/8"	351,2	10,3	18,3	81,7	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	869,9	25,4	43,7	56,3	65	49	62	54		P ₁	21,1	gr
2,00	10	703,0	20,5	64,2	35,8	45	29	38	32		P ₂	22,1	gr
0,43	40	679,0	19,8	84,0	16,0	25	14	22	16	5,33			
0,18	80	204,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	127,9	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20		Vacios en agreg %		15				
Relacion Estabilidad -Flujo					#N/D		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5				
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,83								

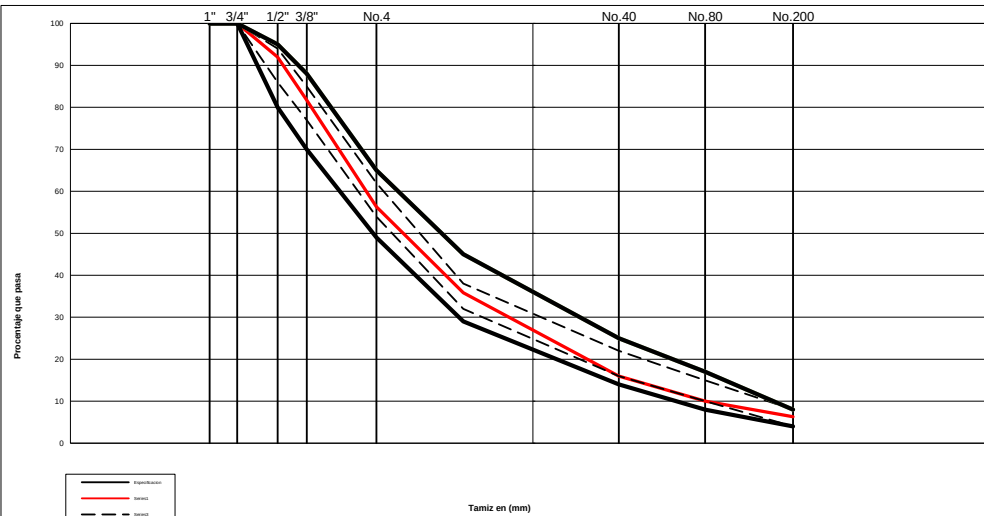

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21685		
Obra:	CALLE 35								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	PLACA	ESV-250	Fecha de Ensayo:	23-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	23-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,32	0,96	526,0	1220,0	697,0	1223,0	2,319				83,1	4,9	12,0	16,9	71,0		1501	1441	3,29
2		0,96	525,0	1218,0	696,0	1221,0	2,320		2000		83,1	4,9	12,0	16,9	71,1		1489	1429	3,28
3		0,96	530,0	1234,0	706,0	1236,0	2,328		7416		83,4	4,5	12,1	16,6	72,6		1492	1432	3,24
4		0,89	550,0	1280,0	734,0	1284,0	2,327		8596		83,4	4,6	12,0	16,6	72,4		1587	1412	3,25
PROMEDIO							2,324	2,435	2,439	0,06	83,2	4,7	12,0	16,8	71,8	5,26		1428,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3233,3							
		PESO FINAL:(g)				3030,3							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	3415,0	gr	
12,7	1/2"	286,7	8,9	8,9	91,1	95	80	94	86	P ₂	3232,1	gr	
9,50	3/8"	309,0	9,6	18,4	81,6	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	921,5	28,5	46,9	53,1	65	49	62	54	P ₁	22,4	gr	
2,00	10	649,6	20,1	67,0	33,0	45	29	38	32	P ₂	23,6	gr	
0,43	40	548,6	17,0	84,0	16,0	25	14	22	16	5,32			
0,18	80	195,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	119,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante				1,19				Vacios en agreg %				15	
Relacion Estabilidad -Flujo				437,6				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				9,82									

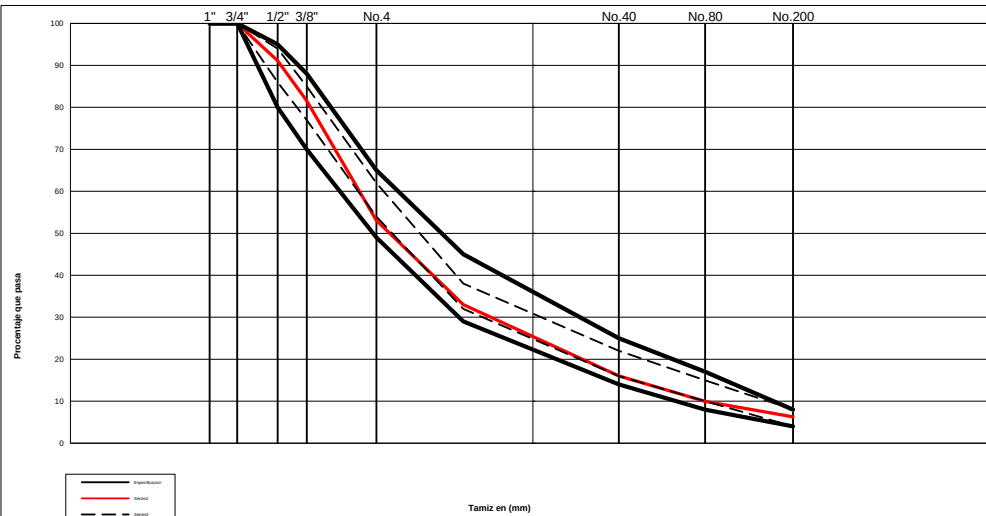

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21687	Fecha:	24/06/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 1" PARA MEZCLA ASFALTICA* LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1801,5	1781,2	0,0	20,3
1/2"	3/8"	1000,4	990,3	0,0	10,1
3/8"	4	200,9	197,3	0,0	3,6
MASA TOTAL USADA (g):		3003	PROMEDIO =		99

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1801,5	1792,0	0,0	10
1/2"	3/8"	1000,4	996,6	0,0	3,8
3/8"	4	200,0	199,1	0,0	0,9
MASA TOTAL USADA (g):		3002	PROMEDIO =		100

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía: AGREGADOS DEL OCCIDENTE MUESTRA No. 21691
Obra: CALLE 35
Material: MDC-19 Viaje No 7 PLACA TZO-815 Fecha de Ensayo: 24-jun-26 Fecha de Toma Muestra: 24-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,36	0,93	540,0	1255,0	718,0	1258,0	2,324				83,2	4,7	12,1	16,8	71,9		1522	1416	3,25
2		0,96	531,0	1235,0	706,0	1237,0	2,326		2000		83,3	4,6	12,1	16,7	72,2		1460	1402	3,21
3		1,00	516,0	1202,0	688,0	1204,0	2,329		7416		83,4	4,5	12,1	16,6	72,9		1413	1413	3,35
4		0,96	527,0	1228,0	704,0	1231,0	2,330		8596		83,4	4,5	12,1	16,6	73,1		1500	1440	3,34
PROMEDIO							2,327	2,436	2,439	0,06	83,3	4,6	12,1	16,7	72,5	5,31		1417,7	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3389,3								
		PESO FINAL:(g)				3174,2								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3581,4	gr
12,7	1/2"	326,2	9,6	9,6	90,4	95	80	94	86	P ₂	3386,7	gr		
9,50	3/8"	403,4	11,9	21,5	78,5	88	70	85	77	Filtro				
4,75	No 4	782,3	23,1	44,6	55,4	65	49	62	54			P ₁	20,6	gr
2,00	10	712,2	21,0	65,6	34,4	45	29	38	32	P ₂	23,2	gr		
0,43	40	624,3	18,4	84,0	16,0	25	14	22	16			5,36		
0,18	80	201,3	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918	
0,08	200	124,5	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20			Vacios en agreg %		15				
Relacion Estabilidad -Flujo					431,2			ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5				
ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,92									

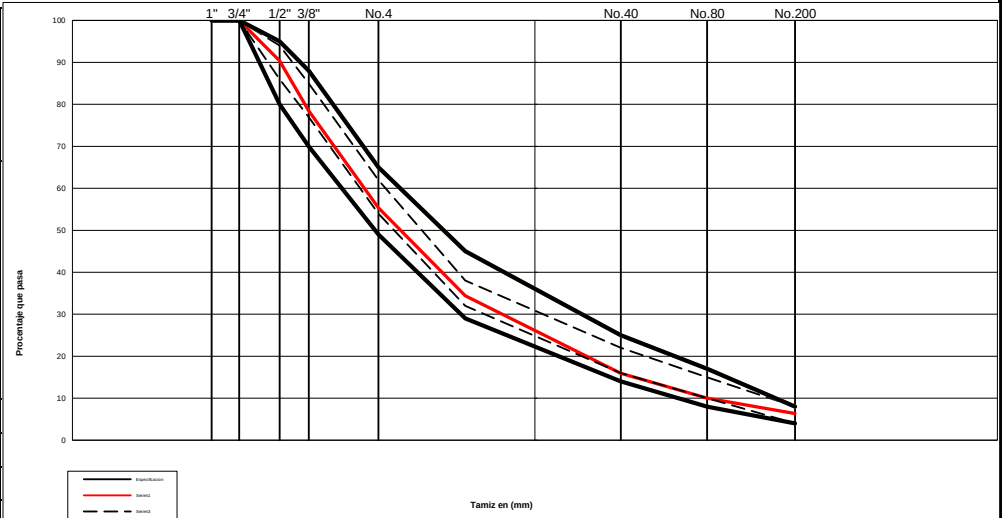

PREPARADO POR:

Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ
Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma
Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21692		
Obra:	AVENIDA 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	PLACA	TSY-073	Fecha de Ensayo:	24-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	24-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,37	0,93	538,0	1252,0	716,0	1254,0	2,327				83,3	4,6	12,1	16,7	72,5		1519	1413	3,35
2		0,96	534,0	1243,0	712,0	1246,0	2,328		2000		83,3	4,6	12,1	16,7	72,6		1546	1484	3,34
3		0,96	534,0	1242,0	710,0	1244,0	2,326		7416		83,3	4,6	12,1	16,7	72,3		1479	1419	3,32
4		0,96	533,0	1243,0	714,0	1247,0	2,332		8596		83,5	4,4	12,1	16,5	73,4		1499	1439	3,29
PROMEDIO							2,328	2,436	2,439	0,06	83,4	4,5	12,1	16,6	72,7	5,31		1438,9	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3313,5								
		PESO FINAL:(g)				3103,0								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3501,5	gr
12,7	1/2"	276,1	8,3	8,3	91,7	95	80	94	86	P ₂	3310,8	gr		
9,50	3/8"	350,1	10,6	18,9	81,1	88	70	85	77	Filtro				
4,75	No 4	814,6	24,6	43,5	56,5	65	49	62	54			P ₁	23,7	gr
2,00	10	707,2	21,3	64,8	35,2	45	29	38	32	P ₂	26,4	gr		
0,43	40	635,4	19,2	84,0	16,0	25	14	22	16			5,37		
0,18	80	195,2	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	124,4	3,8	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,20						Vacios en agreg %	15		
Relacion Estabilidad -Flujo					432,7						ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,92									

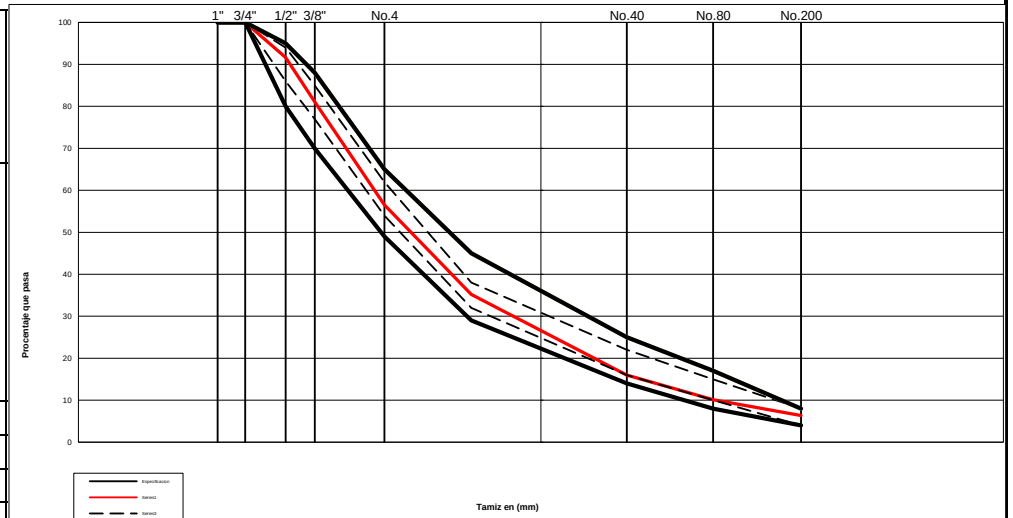

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía: AGREGADOS DEL OCCIDENTE MUESTRA No. 21698
Obra: LA REBECA
Material: MDC-19 Viaje No 5 PLACA TTP*432 Fecha de Ensayo: 25-jun-26 Fecha de Toma Muestra: 25-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,33	0,89	553,0	1288,0	738,0	1291,0	2,329				83,4	4,5	12,1	16,6	72,8		1600	1424	3,30
2		0,96	529,0	1231,0	704,0	1233,0	2,327		2000		83,4	4,6	12,1	16,6	72,4		1496	1436	3,32
3		0,96	532,0	1237,0	708,0	1240,0	2,325		7416		83,3	4,7	12,0	16,7	72,1		1469	1411	3,31
4		0,96	529,0	1236,0	705,0	1234,0	2,336		8596		83,7	4,2	12,1	16,3	74,2		1465	1407	3,20
PROMEDIO							2,329	2,437	2,439	0,03	83,4	4,5	12,1	16,6	72,9	5,29		1419,3	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3224,5								
		PESO FINAL:(g)				3020,6								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P₁3405,9gr P₂3222,1gr Filtro P₁20,3gr P₂22,7gr 5,33				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					
12,7	1/2"	248,7	7,7	7,7	92,3	95	80	94	86					
9,50	3/8"	374,7	11,6	19,3	80,7	88	70	85	77					
4,75	No 4	795,0	24,7	44,0	56,0	65	49	62	54					
2,00	10	699,6	21,7	65,7	34,3	45	29	38	32					
0,43	40	587,1	18,2	83,9	16,1	25	14	22	16					
0,18	80	195,7	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	119,8	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg %				15
Relacion Estabilidad -Flujo					432,4					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,88									

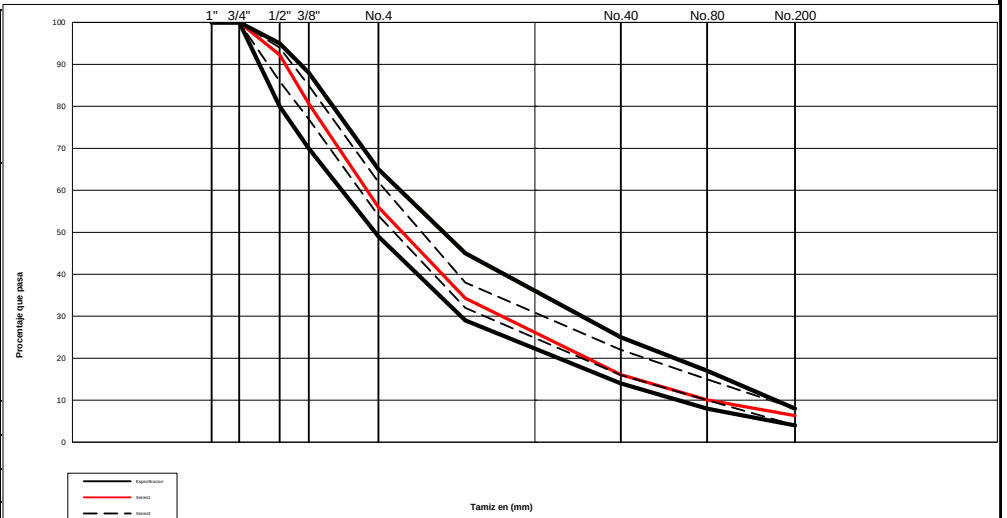

PREPARADO POR:

Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ
Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma
Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21702		
Obra:	LA SIRIA (COMBIA)								
Material:	MDC-19	Viaje No	2	PLACA	ESU-846	Fecha de Ensayo:	26-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	26-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,47																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g) 3408,2													
		PESO FINAL:(g) 3190,8													
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3605,6	gr			
12,7	1/2"	288,1	8,5	8,5	91,5	95	80	94	86	P ₂	3405,5	gr			
9,50	3/8"	359,5	10,5	19,0	81,0	88	70	85	77	Filtro					
4,75	No 4	768,9	22,6	41,6	58,4	65	49	62	54	P ₁	21,1	gr			
2,00	10	789,3	23,2	64,7	35,3	45	29	38	32	P ₂	23,8	gr			
0,43	40	652,3	19,1	83,9	16,1	25	14	22	16		25,2	5,47			
0,18	80	206,7	6,1	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918		
0,08	200	126,0	3,7	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6			
Relacion Llenante - ligante												Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo												ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO															

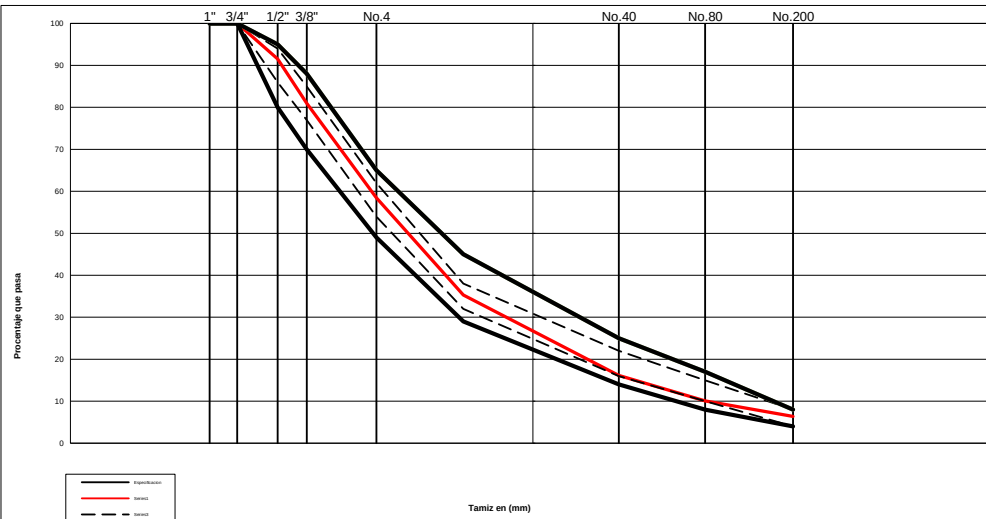

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21703		
Obra:	LA SIRIA (combia)								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	PLACA	TTP-432	Fecha de Ensayo:	26-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	26-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,016 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,49	0,93	536,0	1243,0	710,0	1246,0	2,319				82,9	4,8	12,3	17,1	71,9		1512	1406	3,25
2		0,96	534,0	1244,0	713,0	1247,0	2,330		2000		83,3	4,4	12,3	16,7	73,8		1503	1443	3,22
3		0,93	545,0	1269,0	726,0	1271,0	2,328		7416		83,3	4,4	12,3	16,7	73,6		1514	1408	3,37
4		0,96	533,0	1236,0	705,0	1238,0	2,319		8595		82,9	4,8	12,3	17,1	71,9		1489	1429	3,32
PROMEDIO							2,324	2,429	2,436	0,12	83,1	4,6	12,3	16,9	72,8	5,38		1421,7	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3370,0							
		PESO FINAL:(g)				3154,5							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂		3565,8
12,7	1/2"	326,3	9,7	9,7	90,3	95	80	94	86		3368,9		gr
9,50	3/8"	316,4	9,4	19,1	80,9	88	70	85	77	P ₁	Filtro	gr	
4,75	No 4	838,6	24,9	44,0	56,0	65	49	62	54		P ₂		25,2
2,00	10	768,9	22,8	66,8	33,2	45	29	38	32		26,3		gr
0,43	40	580,4	17,2	84,0	16,0	25	14	22	16	5,49			
0,18	80	201,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	122,6	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					432,1					ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					10,06								

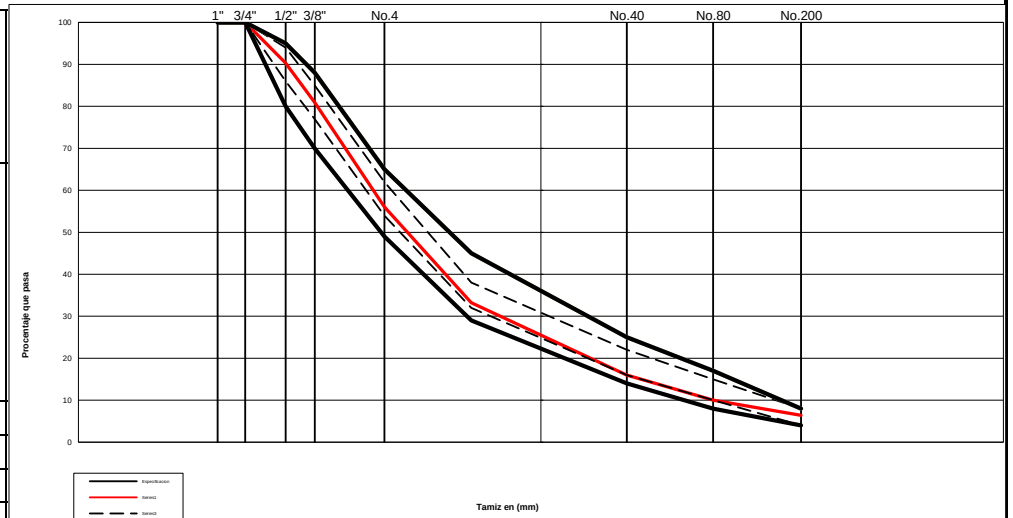

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21706		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO EL VIAJERO								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	PLACA	TSY-073	Fecha de Ensayo:	25-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	25-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,55	0,89	547,0	1274,0	730,0	1277,0	2,329				83,2	4,5	12,3	16,8	73,1		1620	1442	3,35
2		1,00	521,0	1214,0	696,0	1217,0	2,330		2000		83,3	4,5	12,3	16,7	73,3		1494	1494	3,34
3		0,96	523,0	1217,0	696,0	1219,0	2,327		7416		83,2	4,6	12,2	16,8	72,7		1496	1436	3,35
4		1,00	522,0	1212,0	692,0	1214,0	2,322		8596		83,0	4,8	12,2	17,0	71,8		1443	1443	3,38
PROMEDIO							2,327	2,429	2,439	0,18	83,2	4,6	12,2	16,8	72,7	5,38		1453,7	3,4

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)						3552,1					
		PESO FINAL:(g)						3325,0					
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra	P ₁	3760,8	gr
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	259,8	7,3	7,3	92,7	95	80	94	86		Filtro	P ₁	20,4
9,50	3/8"	355,5	10,0	17,3	82,7	88	70	85	77	P ₂			
4,75	No 4	909,5	25,6	42,9	57,1	65	49	62	54			5,55	
2,00	10	823,3	23,2	66,1	33,9	45	29	38	32				
0,43	40	636,6	17,9	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	198,0	5,6	89,6	10,4	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	142,3	4,0	93,6	6,4	8	4	8	4				
	P200		0,0							Flujo mm	2-3,5		
Relacion Llenante - ligante				1,19		Vacios con aire %				4-6			
Relacion Estabilidad -Flujo				433,3		Vacios en agreg %				15			
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				10,07		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5			

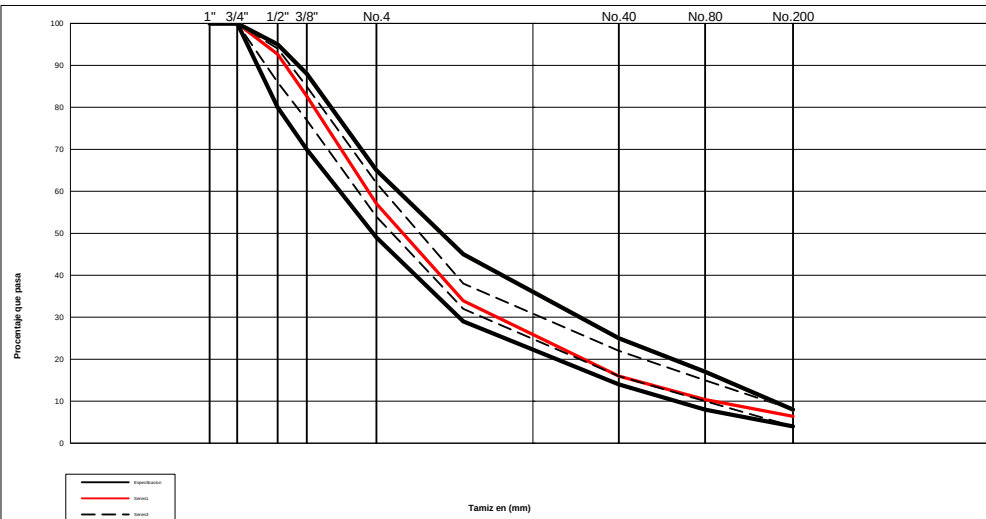

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma


Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21707	Fecha:	27/06/2026	Fecha:	27/06/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS				
DESCRIPCION	TRITURADO TM 1" PARA MEZCLA ASFALTICA* LT-2				
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA				
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA				
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado				


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

MÉTODO DE CALCULO						
		CONTEO	MASA			
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No	Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1800,2	1765,4	0,0	34,8	98
1/2"	3/8"	1000,5	986,3	0,0	14,2	99
3/8"	4	200,9	179,5	0,0	21,4	89
MASA TOTAL USADA (g):		3002	PROMEDIO =		95	

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

MÉTODO DE CALCULO						
		CONTEO	MASA			
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1800,2	1778,3	0,0	22	99
1/2"	3/8"	1000,5	994,7	0,0	5,8	99
3/8"	4	200,0	184,1	0,0	15,9	92
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =		97	

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21709		
Obra:	LA SIRIA (COMBIA)								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	PLACA	ESV-252	Fecha de Ensayo:	27-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	27-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,26																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)						3396,5					
		PESO FINAL:(g)						3185,0					
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3584,9	gr	
12,7	1/2"	318,7	9,4	9,4	90,6	95	80	94	86		P ₂	3395,3	gr
9,50	3/8"	355,7	10,5	19,9	80,1	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	789,6	23,2	43,1	56,9	65	49	62	54		23,5	gr	
2,00	10	759,8	22,4	65,5	34,5	45	29	38	32		P ₂	24,7	gr
0,43	40	629,3	18,5	84,0	16,0	25	14	22	16	5,26			
0,18	80	199,3	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	132,6	3,9	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

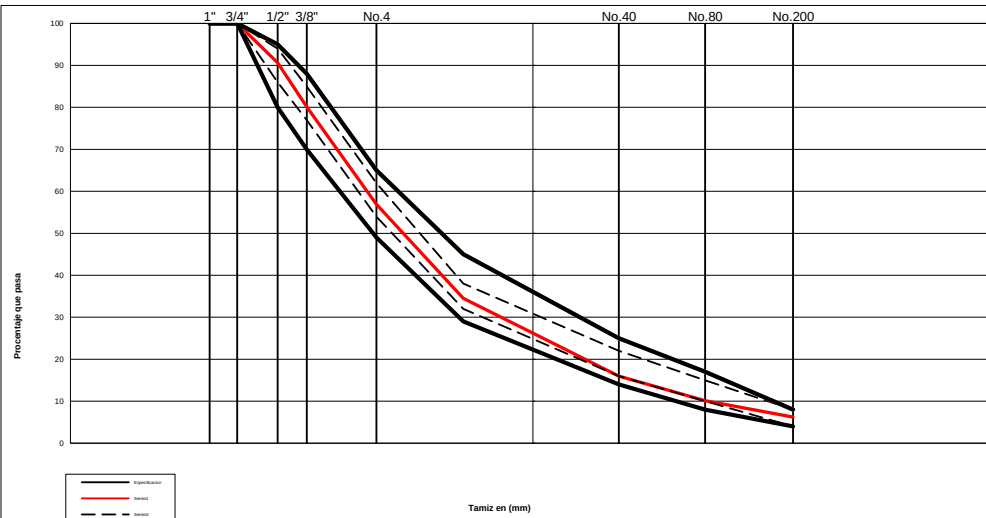

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21710		
Obra:	LA SIRIA (combia)								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	PLACA	TTP-432	Fecha de Ensayo:	26-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	26-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,27	0,93	536,0	1243,0	710,0	1246,0	2,319				83,1	4,8	12,1	16,9	71,5		1512	1406	3,25
2		0,96	534,0	1244,0	713,0	1247,0	2,330		2000		83,5	4,4	12,1	16,5	73,5		1503	1443	3,22
3		0,93	545,0	1269,0	726,0	1271,0	2,328		7416		83,5	4,4	12,1	16,5	73,3		1514	1408	3,37
4		0,96	533,0	1236,0	705,0	1238,0	2,319		8595		83,1	4,8	12,1	16,9	71,5		1489	1429	3,32
PROMEDIO							2,324	2,439	2,436	-0,06	83,3	4,6	12,1	16,7	72,5	5,32		1421,7	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g) 3185,4												
		PESO FINAL:(g) 2985,6												
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra	P ₁	3362,5	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					P ₂
12,7	1/2"	325,8	10,2	10,2	89,8	95	80	94	86		Filtro	P ₁	20,8	
9,50	3/8"	338,7	10,6	20,9	79,1	88	70	85	77	P ₂				23,0
4,75	No 4	731,0	22,9	43,8	56,2	65	49	62	54			5,27		
2,00	10	682,6	21,4	65,2	34,8	45	29	38	32	Estabilidad min 100	918			
0,43	40	598,7	18,8	84,0	16,0	25	14	22	16				Flujo mm	2-3,5
0,18	80	190,2	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10			Vacios con aire %		
0,08	200	118,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Vacios en agreg %	15			
	P200		0,0										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO	7,5
Relacion Llenante - ligante					1,18									
Relacion Estabilidad -Flujo					432,1									
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						9,93								

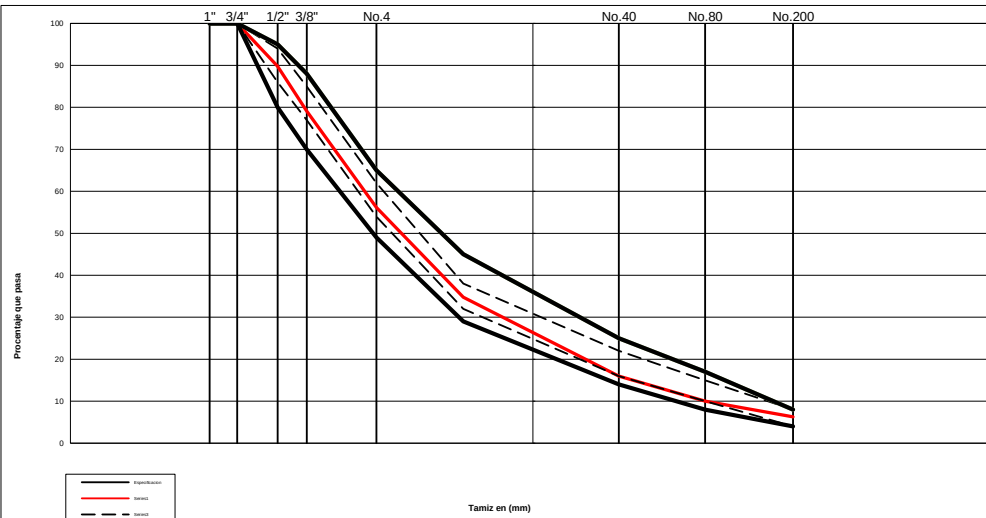

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21711		
Obra:	LA SIRIA (COMBIA)								
Material:	MDC-19	Viaje No	11	PLACA	ESU-846	Fecha de Ensayo:	27-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	27-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,30																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3406,3								
		PESO FINAL:(g)				3198,9								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3597,0	gr
12,7	1/2"	347,5	10,2	10,2	89,8	95	80	94	86	P ₂	3404,0	gr		
9,50	3/8"	346,5	10,2	20,4	79,6	88	70	85	77	Filtro				
4,75	No 4	804,2	23,6	44,0	56,0	65	49	62	54			P ₁	23,0	gr
2,00	10	710,7	20,9	64,8	35,2	45	29	38	32	P ₂	25,3	gr		
0,43	40	652,3	19,1	84,0	16,0	25	14	22	16			5,30		
0,18	80	205,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	132,1	3,9	93,9	6,1	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante												Vacios en agreg %		15
Relacion Estabilidad -Flujo												ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO														

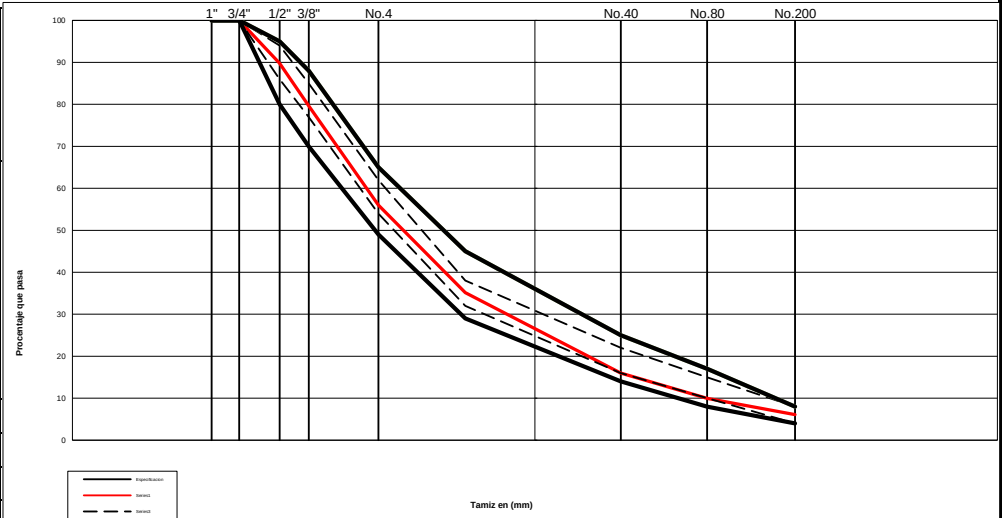

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma:	Firma:
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21712		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO EL VIAJERO								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	PLACA	TSY-073	Fecha de Ensayo:	27-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	27-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,27	0,93	539,0	1253,0	717,0	1256,0	2,325				83,3	4,7	12,0	16,7	71,9		1530	1422	3,24
2		0,96	534,0	1242,0	709,0	1243,0	2,326		2000		83,4	4,6	12,0	16,6	72,1		1469	1411	3,24
3		0,93	536,0	1243,0	710,0	1246,0	2,319		7416		83,1	4,9	12,0	16,9	70,9		1590	1478	3,26
4		0,96	535,0	1244,0	712,0	1247,0	2,325		8596		83,3	4,7	12,0	16,7	72,0		1522	1462	3,28
PROMEDIO							2,324	2,439	2,439	0,00	83,3	4,7	12,0	16,7	71,7	5,27	1443,3	3,3	

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3329,8							
		PESO FINAL:(g)				3119,3							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3514,9 gr P ₂ 3326,4 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	348,5	10,5	10,5	89,5	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,6 gr P ₂ 24,0 gr			
9,50	3/8"	300,7	9,0	19,5	80,5	88	70	85	77				
4,75	No 4	788,1	23,7	43,2	56,8	65	49	62	54				
2,00	10	718,8	21,6	64,8	35,2	45	29	38	32				
0,43	40	642,3	19,3	84,0	16,0	25	14	22	16			5,27	
0,18	80	199,7	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918
0,08	200	121,2	3,6	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					443,4					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,83								

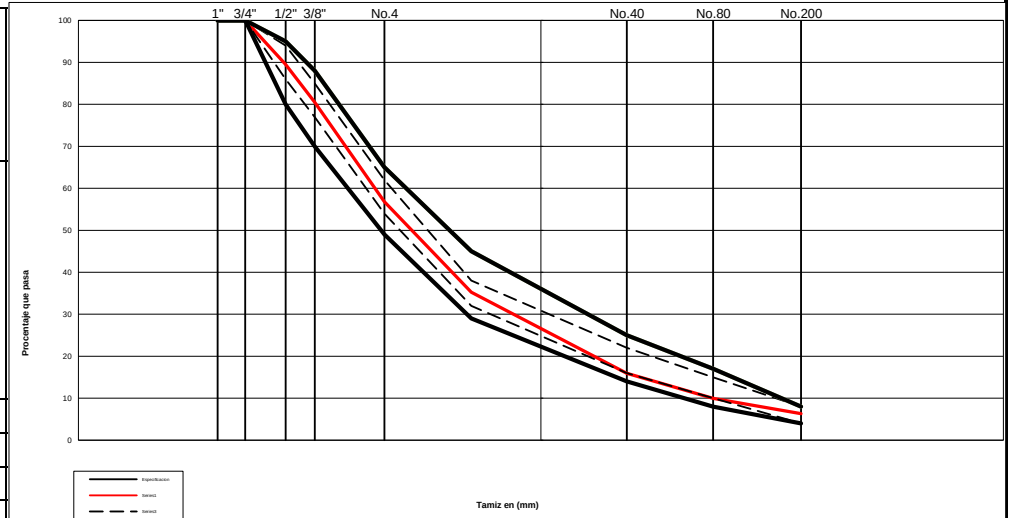

PREPARADO POR:		REVISADO Y APROBO:	
Firma		Firma	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ		Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad		Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21720		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO EL VIAJERO								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	PLACA	ESV-250	Fecha de Ensayo:	30-jun-26	Fecha de Toma Muestra:	30-jun-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,022 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34	0,89	551,0	1283,0	735,0	1286,0	2,328				83,4	4,5	12,1	16,6	72,7		1593	1418	3,27
2		0,96	531,0	1236,0	707,0	1238,0	2,328		2000		83,4	4,6	12,1	16,6	72,6		1529	1467	3,25
3		0,93	545,0	1269,0	728,0	1273,0	2,328		7416		83,4	4,5	12,1	16,6	72,7		1596	1484	3,20
4		0,93	540,0	1254,0	717,0	1257,0	2,322		8596		83,2	4,8	12,0	16,8	71,5		1564	1455	3,24
PROMEDIO							2,327	2,437	2,439	0,04	83,3	4,6	12,1	16,7	72,4	5,30		1456,0	3,2

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3469,3							
		PESO FINAL:(g)				3257,6							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3664,9 gr P ₂ 3466,6 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	310,9	9,0	9,0	91,0	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,8 gr P ₂ 23,5 gr			
9,50	3/8"	377,1	10,9	19,8	80,2	88	70	85	77				
4,75	No 4	771,7	22,2	42,1	57,9	65	49	62	54	5,34			
2,00	10	736,5	21,2	63,3	36,7	45	29	38	32				
0,43	40	718,7	20,7	84,0	16,0	25	14	22	16	Estabilidad min 100 918			
0,18	80	204,7	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10				
0,08	200	138,0	4,0	93,9	6,1	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,15		Vacios en agreg % 15						
Relacion Estabilidad -Flujo					449,4		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5						
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,89								

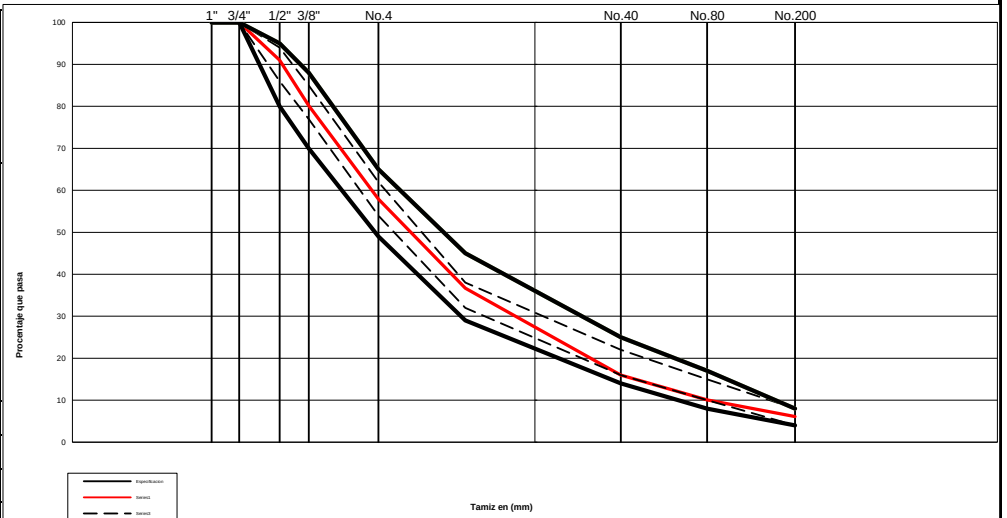

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23305

Remisión: 28939

Fecha de despacho: 01-06-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: 5300077868

Fecha de lote: 01-06-2026

Lote No: 28939

Placa: UZN-371

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	66	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.8	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	2400	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	49	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	278	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.34	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		65.2	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1020	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.467	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	54	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	9.0	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado
digitalmente por
DIVA CRISTINA
TORRES

Fecha: 2026.06.02
16:32:01 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23305

Remisión: 28939

Fecha de despacho: 01-06-2026


Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: 5300077868

Fecha de lote: 01-06-2026

Lote No: 28939

Placa: UZN-371

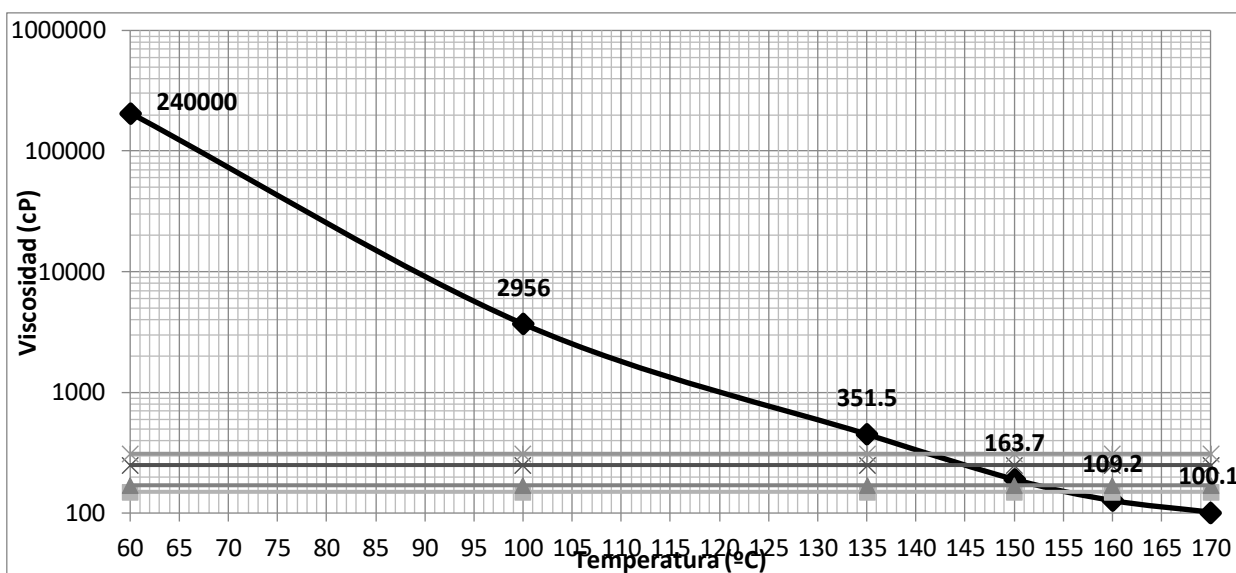

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico

Tec. Química DINA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 N°23319

Remisión: 28961
Fecha de despacho: 02-06-2026
Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA
Pedido: N/A

Fecha de lote: 27-05-2026
Lote No.: 730526
Placa: USC-988

Propiedad	Norma de referencia INV	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Viscosidad a 25°C, sSF	E-763	-	200	24	LOTE
Contenido de Agua, % volumen	E-761	-	43	38	LOTE
Estabilidad al almacenamiento 24 horas, %	E-764	-	1	0.6	LOTE
Sedimentación a los 5 días, %		-	5	2.1	
Destilación, contenido de asfalto residual, %	E-762	57	-	62	LOTE
Contenido de disolventes, %		-	3	0	LOTE
Tamizado, retenido tamiz 20 (850 µm)	E-765	-	0,1	0.03	LOTE
Carga de la Partícula	E-767	Positiva		Positiva	LOTE
Ph	E-768	-	6	2.14	LOTE
ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO DE DESTILACIÓN					
Penetración (25°C, 100 g, 5 s), 0,1 mm	E-706	60	100	92	MENSUAL
- ARD		100	250		
- ARB					
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	E-702	40	--	140	MENSUAL
	E-713	97.0	--		MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno %				99,98	

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado digitalmente
por DIVA CRISTINA
TORRES
Fecha: 2026.06.02
17:59:31 -05'00'

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23643

Remisión: 29329

Fecha de despacho: 22-06-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: 5300079122

Fecha de lote: 22-06-2026

Lote No: 29329

Placa: TDL-454

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	61.5	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.7	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	2590	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	50	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	274	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.39	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		64.4	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1022	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.314	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	60	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	7.7	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado
digitalmente por
DIVA CRISTINA
TORRES

Fecha: 2026.06.22
15:53:57 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23643

Remisión: 29329

Fecha de despacho: 22-06-2026


Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: 5300079122

Fecha de lote: 22-06-2026


Lote No: 29329

Placa: TDL-454

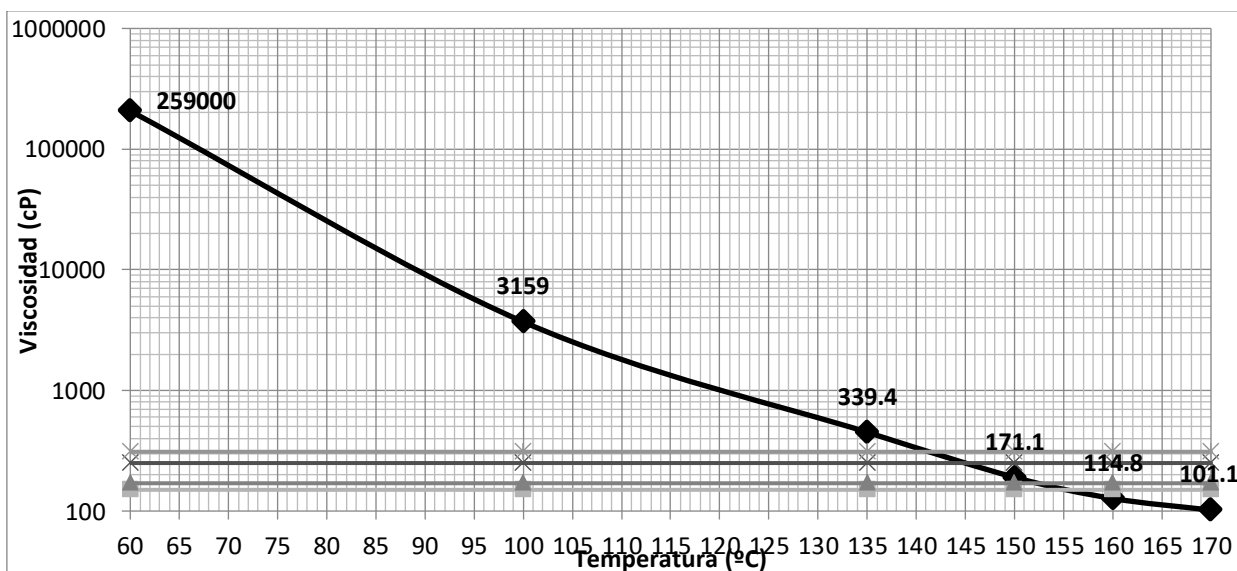

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico



Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 N°23666

Remisión: 29350

Fecha de despacho: 23-06-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: N/A

Fecha de lote: 15-06-2026

Lote No.: 790626

Placa: SUE-472

Propiedad	Norma de referencia INV	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Viscosidad a 25°C, sSF	E-763	-	200	36	LOTE
Contenido de Agua, % volumen	E-761	-	43	38	LOTE
Estabilidad al almacenamiento 24 horas, %	E-764	-	1	0.5	LOTE
Sedimentación a los 5 días, %		-	5	1.5	
Destilación, contenido de asfalto residual, %	E-762	57	-	62	LOTE
Contenido de disolventes, %		-	3	0	LOTE
Tamizado, retenido tamiz 20 (850 µm)	E-765	-	0,1	0.02	LOTE
Carga de la Partícula	E-767	Positiva		Positiva	LOTE
Ph	E-768	-	6	2.07	LOTE
ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO DE DESTILACIÓN					
Penetración (25°C, 100 g, 5 s), 0,1 mm	E-706	60	100	92	MENSUAL
- ARD		100	250		
- ARB					
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	E-702	40	--	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno %	E-713	97.0	--	99,98	MENSUAL

**DIVA
CRISTINA
TORRES**

Firmado digitalmente
por DIVA CRISTINA
TORRES

Fecha: 2026.06.23
11:07:04 -05'00'


Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23712

Remisión: 29384

Fecha de despacho: 25-06-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Pedido: 5300079274

Fecha de lote: 25-06-2026

Lote No: 29384

Placa: SPL-422

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	68	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.6	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	2568	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	50	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	270	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.39	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		64.4	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1022	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.314	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	60	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	7.7	MENSUAL
Índice de envejecido. relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

**DIVA
CRISTINA
TORRES**

Firmado digitalmente por
DIVA CRISTINA TORRES
Fecha: 2026.06.25
11:30:10 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. **MULTINSA S.A.S.** no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23712

Remisión: 29384

Fecha de despacho: 25-06-2026


Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Pedido: 5300079274

Fecha de lote: 25-06-2026

Lote No: 29384

Placa: SPL-422

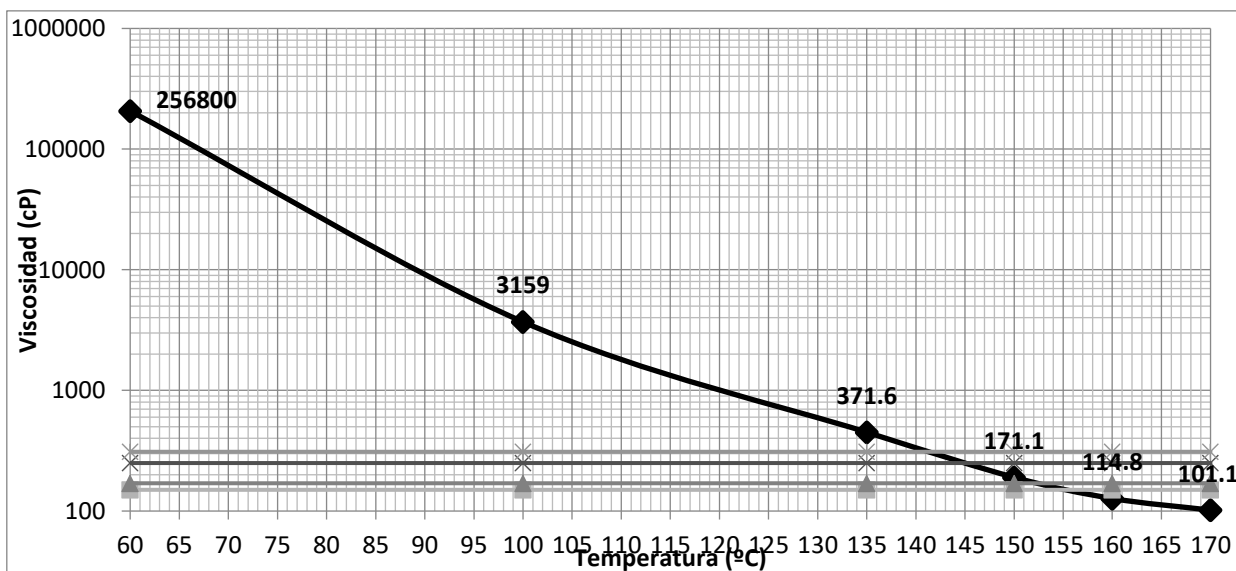

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico

Tec. Química DINA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. **MULTINSA S.A.S.** no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23722

Remisión: 29402

Fecha de despacho: 25-06-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Pedido: 5300079329

Fecha de lote: 25-06-2026

Lote No: 29402

Placa: UZN-371

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	68	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.7	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	2250	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	49	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	280	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.39	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		64.4	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1021	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.314	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	60	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	7.7	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado digitalmente
por DIVA CRISTINA
TORRES

Fecha: 2026.06.26
09:00:36 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23722

Remisión: 29402

Fecha de despacho: 25-06-2026


Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Pedido: 5300079329

Fecha de lote: 25-06-2026


Lote No: 29402

Placa: UZN-371

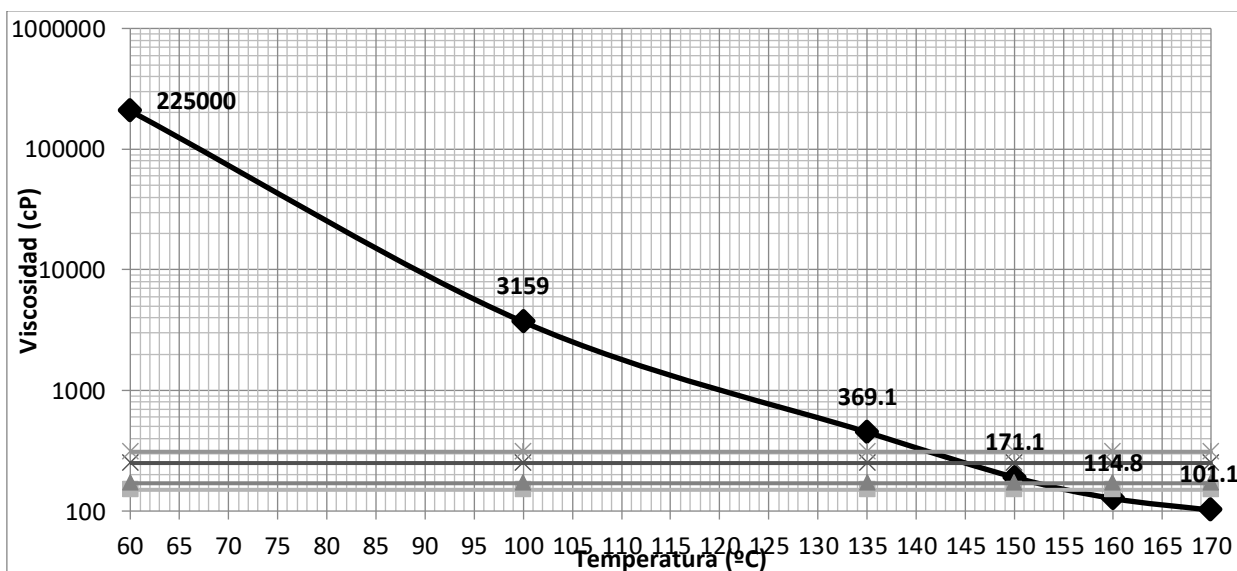

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico



Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

**DIVA CRISTINA
TORRES**

Firmado digitalmente por
DIVA CRISTINA TORRES
Fecha: 2026.06.26
09:00:54 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R- 23

2026-03-30

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

FECHA: JUNIO 03 DE 2026 LOTE No. 343_26

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS DESPACHO No. 38531


TIPO DE ASFALTO: ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO

PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-706	60	70	63	LOTE
Punto de ablandamiento, (°C)	E-712	48	54	50,2	LOTE
Índice de Penetración (P)	E-724	-1,2	+0,6	-0,60	LOTE
Viscosidad Absoluta @ 60°C, (P)	E-716	1500	—	2500	LOTE
Viscosidad @ 135°C, (P)	E-717	4,0	—	4	LOTE
Ductilidad @ 25°C, 5 mínim. (cm)	E-702	100	—	130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	—	—	1,013	MENSUAL
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	—	298	LOTE
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	E-713	99	—	99,54	SEMESTRAL
Contenido de agua, (%)	E-704	—	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-718	—	3,0	2,298	TRIMESTRAL

ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA RTFO (INV E-720)

Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	—	0,8	-0,294	SEMANTAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original	E-706	60	—	58,2	SEMANTAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	—	9	7,0	SEMANTAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 60°C del asfalto residual y el asfalto original	E-717	—	4	-3,3	SEMANTAL
Grado de Desempeño, PG	AASHTO M-320	REPORTAR		64-22	MENSUAL

CURVA REOLOGICA

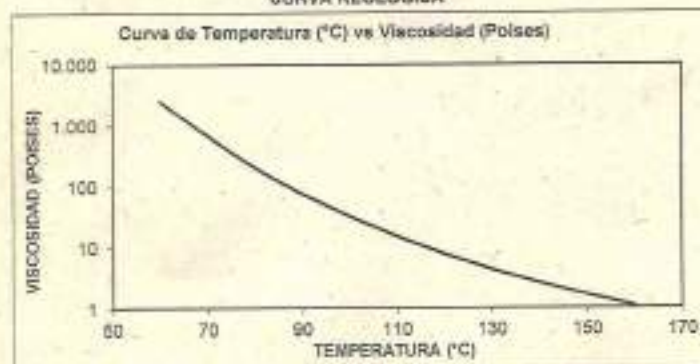

FRECUENCIA ENSAYO:

SEMANTAL

NORMA DE ENSAYO:

ASTM D-4402

Temperaturas	Rango Viscosidad (Pases)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en tanque, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de mezclado, °C	1,5 - 1,9	152	160
Temperatura de compactación, °C	2,5 - 3,1	142	150

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO

ANALISTA LAB.

WARLOCK FONTECHA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD C.I. MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL COORDINADOR SGI

2026 04/2026



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R: 23

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

2025-03-30

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2025

LOTE No. 348 28

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS


DESPACHO No. 38658

TIPO DE ASFALTO:

ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO

PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-706	60	70	66	LOTE
Punto de ablandamiento, (°C)	E-712	48	54	49,4	LOTE
Índice de Penetración (IP)	E-714	-1,2	+0,8	-0,68	LOTE
Viscosidad Absoluta @ 60°C, (P)	E-716	1500	—	2558	LOTE
Viscosidad @ 135°C, (P)	E-717	4,0	—	N.A	LOTE
Ductilidad @ 25°C, 5 mínim. (cm)	E-702	100	—	130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	—	—	1.013	MENSUAL
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	—	288	LOTE
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	E-713	99	—	99,54	SEMESTRAL
Contenido de agua, (%)	E-704	—	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-715	—	3,0	2,286	TRIMESTRAL
ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA RTP (INV E-720)					
Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	—	0,8	0,441	SEMANTAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original	E-706	60	—	58,5	SEMANTAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	—	9	6,7	SEMANTAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 60°C del asfalto residual y al asfalto original	E-717	—	4	4,0	SEMANTAL
Grado de Desempeño, PG	ASHTO M-320	REPORTAR		64-22	MENSUAL

CURVA REOLOGICA

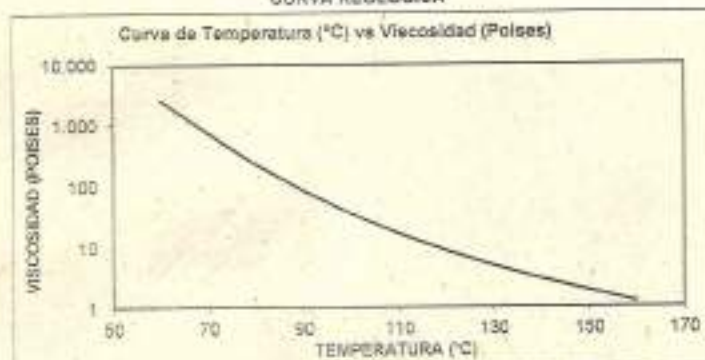

FRECUENCIA ENSAYO:

SEMANTAL

NORMA DE ENSAYO:

ASTM D-4402

Temperatura	Rango Viscosidad (Paises)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en la que, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de inyección, °C	1,5 - 1,8	152	160
Temperatura de compactación, °C	2,0 - 3,1	142	150

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO

ANALISTA LAB.

PAOLA PAYARES

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD C.I. MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL COORDINADOR SGI

2025-06-10/2026



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R: 23

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

2026-03-30

FECHA: JUNIO 09 DE 2026

LOTE No. 351_26

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

DESPACHO No. 36583

TIPO DE ASFALTO:

ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO


PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-706	60	70	67	LOTE
Punto de ablandamiento, (°C)	E-712	46	54	49,6	LOTE
Índice de Penetración (IP)	E-724	-1,2	+0,6	-0,59	LOTE
Viscosidad Absoluta @ 60°C, (P)	E-716	1500	—	2691	LOTE
Viscosidad @ 135°C, (P)	E-717	4,0	—	N.A	LOTE
Ductilidad @ 25°C, 5 cm/min. (cm)	E-702	100	—	130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	—	—	1,016	MESES
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	—	298	LOTE
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	E-713	99	—	99,54	SEMANAL
Contenido de agua, (%)	E-704	—	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-718	—	3,0	2,286	TRIMESTRAL

ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA RTFO (INV E-720)

Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	—	0,8	-0,441	SEMANAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original	E-706	50	—	58,5	SEMANAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	—	9	6,7	SEMANAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 60°C del asfalto residual y el asfalto original	E-717	—	4	4,0	SEMANAL
Grado de Desempeño, PG	AASHTO M-320	REPORTAR		64-22	MESES

CURVA REOLOGICA

Curva de Temperatura (°C) vs Viscosidad (Paises)

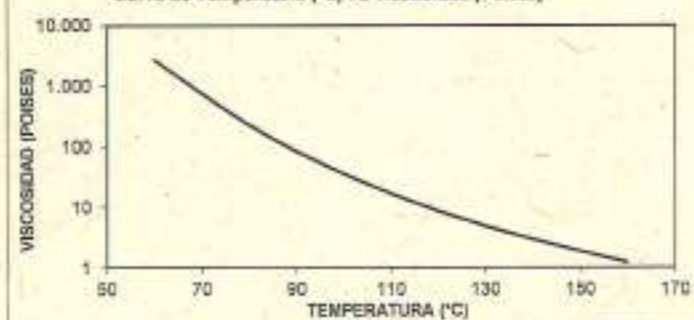

FRECUENCIA ENSAYO:

SEMANAL

NORMA DE ENSAYO:

ASTM D-4402

Temperaturas	Rango Viscosidad (Paises)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en tanques, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de mezclado, °C	1,6 - 1,9	152	160
Temperatura de compactación, °C	2,6 - 3,1	142	150

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO.

ANALISTA LAB.

MELISSA DONADO

JUNIO 10 - 2024



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R: 23

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

2026-03-30

FECHA: JUNIO 11 DE 2026

LOTE No. 358 26

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS


DESPACHO No. 38706

TIPO DE ASFALTO:

ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO

PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-706	60	70	67	LOTE
Punto de ablandamiento, (°C)	E-712	48	54	49,2	LOTE
Índice de Penetración (IP)	E-724	-1,2	+0,6	-0,70	LOTE
Viscosidad Absoluta @ 60°C, (P)	E-716	1500	—	2000	LOTE
Viscosidad @ 135°C, (P)	E-717	4,0	—	N.A	LOTE
Ductilidad @ 25°C, 5 cm/min, (cm)	E-702	100	—	130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	—	—	1,016	MENSUAL
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	—	299	LOTE
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	E-713	99	—	99,54	SEMESTRAL
Contenido de agua, (%)	E-704	—	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-718	—	3,0	2,286	TRIMESTRAL
ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA RTFO (INV E-720)					
Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	—	0,6	-0,441	SEMANTAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original	E-706	50	—	58,5	SEMANTAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	—	9	6,7	SEMANTAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 60°C del asfalto residual y el asfalto original.	E-717	—	4	4,0	SEMANTAL
Grado de Desempeño, PG	ASHTO M-320	REPORTAR		64-22	MENSUAL

CURVA REOLOGICA

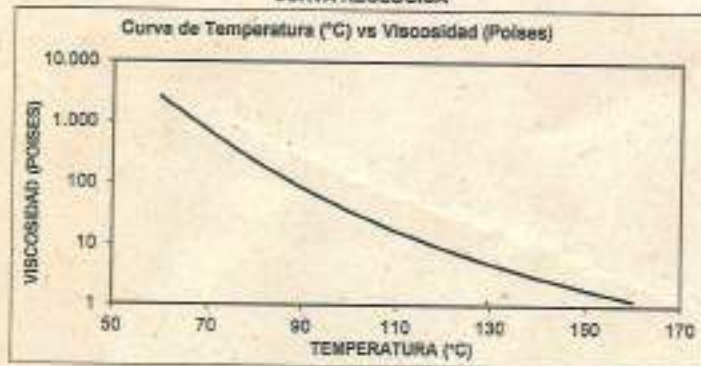

FRECUENCIA ENSAYO:

SEMANTAL

NORMA DE ENSAYO:

ASTM D-4402

Temperaturas	Rango Viscosidad (Pases)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en tanque, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de mezclado, °C	1,5 - 1,8	152	160
Temperatura de compactación, °C	2,5 - 3,1	142	150

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO

ANALISTA LAB.

RICHARD CANTILLO

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD C.I. MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL COORDINADOR SGI

JUN-13-2026



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R: 23

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

2026-03-30

FECHA: JUNIO 12 DE 2026

LOTE No. 365 28

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS


DESPACHO No. 35708

TIPO DE ASFALTO:

ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO

PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-706	60	70	65	LOTE
Punto de ablandamiento (°C)	E-712	45	54	49,8	LOTE
Índice de Penetración (P)	E-724	-1,2	+0,6	-0,68	LOTE
Viscosidad Absoluta @ 60°C, (P)	E-716	1500	—	2768	LOTE
Viscosidad @ 135°C, (P)	E-717	4,0	—	N.A	LOTE
Ductilidad @ 25°C, 5 cm/min, (cm)	E-702	100	—	130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	—	—	1,016	MENSUAL
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	—	296	LOTE
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	E-713	98	—	99,54	SEMANAL
Contenido de agua, (%)	E-704	—	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-718	—	3,0	2,286	TRIMESTRAL
ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA RTFO (INV E-729)					
Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	—	0,8	-0,441	SEMANAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original	E-706	50	—	58,5	SEMANAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	—	9	5,7	SEMANAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 60°C del asfalto residual y el asfalto original	E-717	—	4	4,0	SEMANAL
Grado de Desempeño, PG	AASHTO M-320	REPORTAR		64-22	MENSUAL

CURVA REOLOGICA

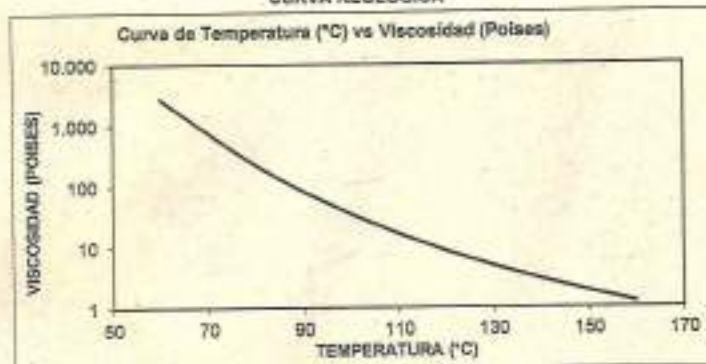

FRECUENCIA ENSAYO:

SEMANAL

NORMA DE ENSAYO:

ASTM D-4462

Temperatura	Rango Viscosidad (Paises)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en tanque, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de mezclado, °C	1,5 - 1,9	152	160
Temperatura de compactación, °C	2,5 - 3,1	142	150

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO:

ANALISTA LAB:

MELISSA DONACO

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD C.I. MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL COORDINADOR SG/

JUNIO 15/2026



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS**

Julio de 2026

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

ALCALDÍA, CRR 8BIS CLL 44, TURIN, CENTRO

UBICACIÓN



REGISTRO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ALCALDÍA, REPARCHEO CRR 6 CON AV DEL RIO, ORIENTE

UBICACIÓN



REGISTRO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ALCALDÍA, RESALTOS SECTOR PALO DE AGUA, SAN JOAQUIN

UBICACIÓN



REGISTRO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ALCALDÍA, RESALTOS Y REPARCHEO SECTOR CLL 72, LOS SAUCES, EL OSO

UBICACIÓN



REGISTRO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ALCALDÍA, RESALTOS Y REPARCHEO ESTACION DE POLICIA MUNDO NUEVO, LA BELLA

UBICACIÓN



REGISTRO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

AV 30 DE AGOSTO SECTOR EDS DON ERNESTO, CERRITOS

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017



FINALIZADO






Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

AV 30 DE AGOSTO SECTOR EL VIAJERO, EL JARDIN

UBICACIÓN

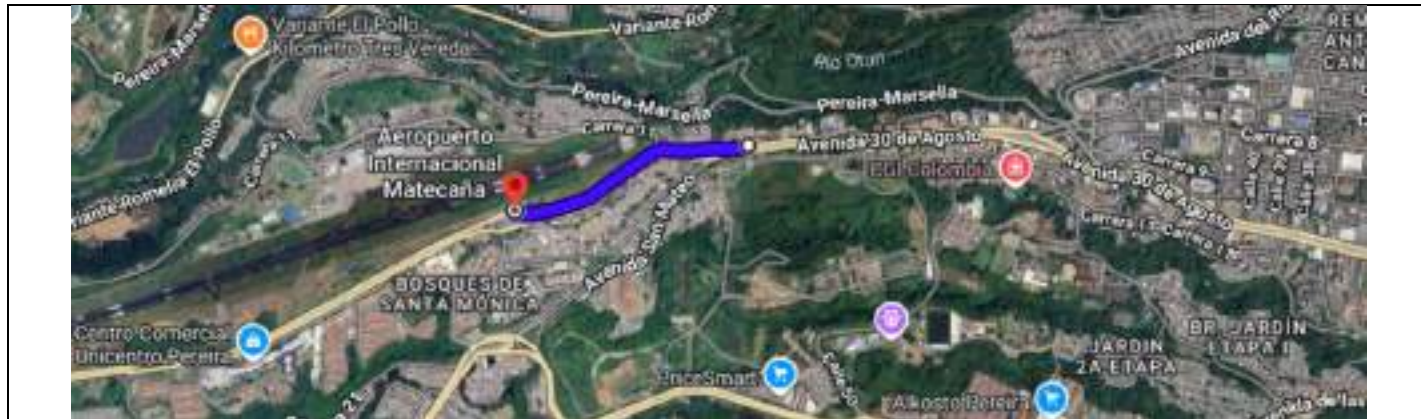

ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CLL 35 ENTRE AV 30 DE AGOSTO Y CRR 12, LAS GARZAS, CENTRO

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES






Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO

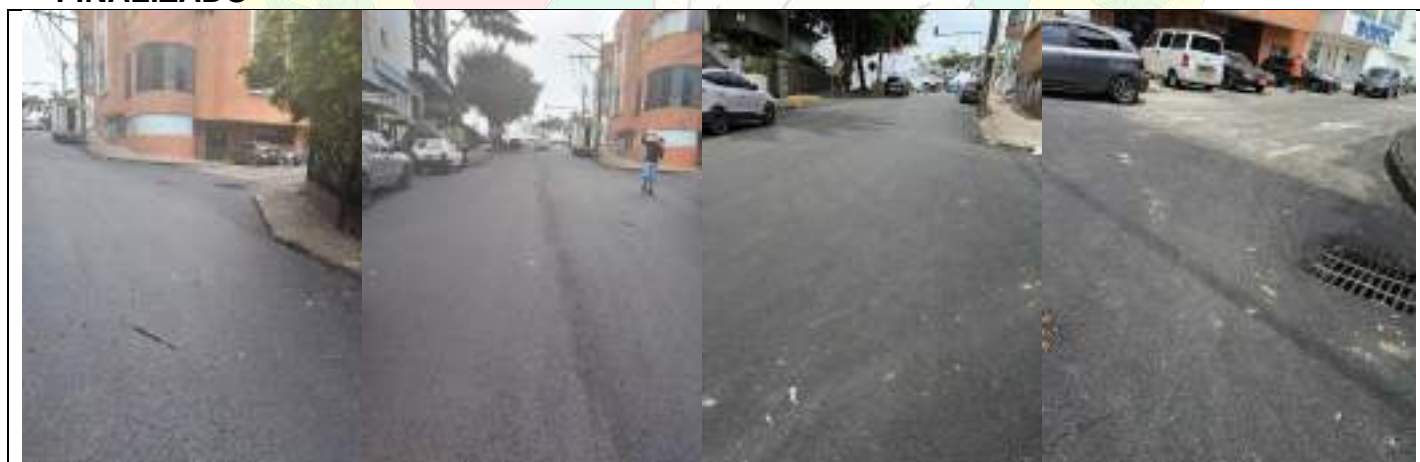



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CLL 80 B ENTRE CRR 30 Y 31, ATENAS, SAN JOAQUIN

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CRR 14 ENTRE CLL 12B E Y 13 E, SIMON BOLIVAR, ORIENTE

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

DON QUIJOTE, CLL 14 TRAMO ENTRE CLL 23-24, LOS ANGELES, UNIVERSIDAD

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ESCUELA LENINGRADO, CLL 82, LENINGRADO II, SAN JOAQUIN

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

MANZANA 6 QUINTAS DE PANORAMA II, CONSOTA

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

REPARACION SECTOR TERMINAL, CLL 17 CON 10, BOSTON

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

REPARACION VIAS INTERNAS MEPER, CONVENIO PONAL-INFRAESTRUCTURA, EL JARDIN

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

SECTOR D, MANZANA, 12 PAZ VERDE, DEL CAFÉ

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

SECTOR D, MANZANA, 6 PAZ VERDE, DEL CAFÉ

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

VIA LA SIRIA COMBIA BAJA

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO



Pereira, 23 de julio de 2026

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICAS**

Yo, **JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO** identificado con C.C. No. 1.088.291.689 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.** identificada con NIT. 900.188.750-8, certifico el pago de aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ**, identificado con C.C: No. 1.053.829.394 de Pereira y, con Tarjeta Profesional No. 254066-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad **HT ASESORES – AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S** en mi condición de Revisor Fiscal de **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.** identificada con NIT. 900.188.750-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pereira, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026.



**JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
REPRESENTANTE LEGAL
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS**



**LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ
REVISOR FISCAL
T.P: 254066-T**



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E7F570B72C02FB07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053829394 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 254066-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



254066-T

**LUISA FERNANDA
QUINTERO RAMIREZ**

C.C. 1053829394

RES. INSCRIPCION 109

DEL 22/02/2019

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262390

282538

Identificación Plástica S.A. 100942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.829.394**
QUINTERO RAMIREZ

APELLIDOS
LUISA FERNANDA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1993**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

27-SEP-2011 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0900100-00350262-F-1053829394-20111214

0028689105A 1

37420697

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900188750	8	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 16 BIS # 8-42 BARRIO PINARES	PEREIRA-RISARALDA	3114374	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385899196	9505950736	E	2026/06/12	2026/06/12	BANCO DE BOGOTA		\$190,885,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No	Identificación	Nombre	in	re	te	ta	de	ta	vs	vs	sl	im	va	av	vc	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado	Total Aportes	
-			g	t	e	p	p	p	p	co	ro	in	a	c	p	te	p	o			o									o								Si	
1	CC 79549132	ACEVEDO ESPINAL ABEL ANTONIO							X	X							230201	30	\$2,305,932	\$369,000	EPS002	30	\$2,305,932	\$92,300	CCF44	30	\$2,305,932	\$92,300	14-23	30	\$2,305,932	6.960%	\$160,500	30	\$0	\$0	Si	\$714,100	
2	CC 9868194	ACOSTA GRAJALES REINALDO								X							230301	30	\$2,678,886	\$428,700	EPS002	30	\$2,678,886	\$107,200	CCF44	30	\$2,678,886	\$107,200	14-23	30	\$2,678,886	6.960%	\$186,500	30	\$0	\$0	Si	\$829,600	
3	CC 1114838941	AGUDELO MEZA JOAN SEBASTIAN								X							230301	30	\$2,134,512	\$341,600	ESSC18	30	\$2,134,512	\$85,400	CCF44	30	\$2,134,512	\$85,400	14-23	30	\$2,134,512	6.960%	\$148,600	30	\$0	\$0	Si	\$661,000	
4	CC 1114088812	AGUDELO CARMONA JOSE LEONARDO								X							230301	30	\$2,430,682	\$389,000	EPS002	30	\$2,430,682	\$97,300	CCF44	30	\$2,430,682	\$97,300	14-23	30	\$2,430,682	6.960%	\$169,200	30	\$0	\$0	Si	\$752,800	
5	CC 1112787105	AGUDELO GALVIS LAURA MARIA															230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF44	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200	
6	CC 1088002015	AGUIRRE ZAPATA DANIEL							X	X							230301	30	\$6,000,000	\$960,000	EPS010	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF44	30	\$6,000,000	\$240,000	14-23	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,857,600	
7	CC 1088266843	AGUIRRE RIOS JUAN SEBASTIAN							X	X							25-14	30	\$3,650,000	\$584,000	EPS037	30	\$3,650,000	\$146,000	CCF44	30	\$3,650,000	\$146,000	14-23	30	\$3,650,000	6.960%	\$254,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,130,100	
8	CC 9958023	ALARCON CLIMACO ANTONIO	X														230301	9	\$525,272	\$84,100	EPS002	9	\$525,272	\$21,100	CCF44	9	\$525,272	\$21,100	14-23	9	\$525,272	6.960%	\$36,600	9	\$0	\$0	Si	\$162,900	
9	CC 1061373100	ALZATE LONDOÑO EDWYER NEIL								X							230301	30	\$2,976,979	\$476,400	EPS037	30	\$2,976,979	\$119,100	CCF44	30	\$2,976,979	\$119,100	14-23	30	\$2,976,979	6.960%	\$207,200	30	\$0	\$0	Si	\$921,800	
10	CC 77186775	AMADOR CANTILLO ROBERTO CARLOS								X							230301	30	\$2,416,250	\$386,600	EPS002	30	\$2,416,250	\$96,700	CCF44	30	\$2,416,250	\$96,700	14-23	30	\$2,416,250	6.960%	\$168,200	30	\$0	\$0	Si	\$748,200	
11	CC 1112623074	ANGEL LOPEZ LUIS HERNANDO								X							230301	30	\$2,011,551	\$321,900	EPS002	30	\$2,011,551	\$80,500	CCF44	30	\$2,011,551	\$80,500	14-23	30	\$2,011,551	6.960%	\$140,100	30	\$0	\$0	Si	\$623,000	
12	CC 10171355	ARAMENDIZ MEDINA ALVARO								X							230301	25	\$3,545,658	\$567,400	EPS037	25	\$3,545,658	\$141,900	CCF44	25	\$3,545,658	\$141,900	14-23	25	\$3,545,658	6.960%	\$246,800	25	\$0	\$0	Si	\$1,098,000	
13	CC 10171355	ARAMENDIZ MEDINA ALVARO											L				230301	5	\$446,250	\$71,400	EPS037	5	\$446,250	\$17,900	CCF44	5	\$446,250	\$17,900	14-23	5	\$446,250	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$107,200	
14	CC 1088032880	ARCILA SANCHEZ MATEO							X	X							230301	30	\$3,584,849	\$573,600	EPS037	30	\$3,584,849	\$143,400	CCF44	30	\$3,584,849	\$143,400	14-23	30	\$3,584,849	6.960%	\$249,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,110,000	
15	CC 1114151905	ARIAS LONDOÑO JUAN MANUEL																0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	0	\$0	\$0	No	\$340,800	
16	CC 6284489	ARREDONDO MARIN NAUDO								X							25-14	30	\$3,390,000	\$542,400	ESSC24	30	\$3,390,000	\$135,600	CCF44	30	\$3,390,000	\$135,600	14-23	30	\$3,390,000	6.960%	\$236,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,049,600	
17	CC 1061788367	ASTUDILLO HERRERA LEYDI VIVIANA															230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF44	30	\$2,300,000	\$92,000	14-23	30	\$2,300,000	6.960%	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100	
18	CC 79241971	AZULA JAIME JUAN CARLOS															25-14	30	\$10,000,000	\$1,700,000	EPS001	30	\$10,000,000	\$400,000	CCF44	30	\$10,000,000	\$400,000	14-23	30	\$10,000,000	6.960%	\$696,000	30	\$0	\$0	Si	\$3,196,000	
19	CC 10050925	BAÑOL MORALES JAMES ADRIAN								X							230301	30	\$3,020,000	\$483,200	EPS002	30	\$3,020,000	\$120,800	CCF44	30	\$3,020,000	\$120,800	14-23	30	\$3,020,000	6.960%	\$210,200	30	\$0	\$0	Si	\$935,000	
20	CC 4514370	BEDOYA GUTIERREZ ALEJANDRO							X	X							230201	30	\$6,200,000	\$992,000	EPS010	30	\$6,200,000	\$248,000	CCF44	30	\$6,200,000	\$248,000	14-23	30	\$6,200,000	6.960%	\$431,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,919,600	
21	CC 75159031	BEDOYA COLORADO JOSE MANUEL								X							230201	30	\$2,459,068	\$393,500	EPS010	30	\$2,459,068	\$98,400	CCF44	30	\$2,459,068	\$98,400	14-23	30	\$2,459,068	6.960%	\$171,200	30	\$0	\$0	Si	\$761,500	
22	CC 1088326509	BEDOYA BEDOYA JUAN GUILLERMO															230301	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS018	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF44	30	\$1,900,000	\$76,000	14-23	30	\$1,900,000	6.960%	\$132,300	30	\$0	\$0	Si	\$588,300	
23	CC 1135199008	BOLIVAR SALAZAR JHON JAIRO								X							230301	29	\$2,702,097	\$432,400	EPS037	29	\$2,702,097	\$108,100	CCF44	29	\$2,702,097	\$108,100	14-23	29	\$2,702,097	6.960%	\$188,100	29	\$0	\$0	Si	\$836,700	
24	CC 1135199008	BOLIVAR SALAZAR JHON JAIRO									X						230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF44	1	\$58,364	\$2,400	14-23	1	\$58,364	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$14,200	
25	CC 1088257999	BOLIVAR CASTAÑO SANDRA MARCELA									X						230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$420,400	
26	CC 18533141	BOLIVAR SALAZAR WILFER ALEXANDER															230201	20	\$1,167,270	\$186,800	EPS002	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF44	20	\$1,167,270	\$46,700	14-23	20	\$1,167,270	6.960%	\$81,300	20	\$0	\$0	Si	\$361,500	

No	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	ta p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	ige	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
27	CC 18533141	BOLIVAR SALAZAR WILFER ALEXANDER									X							230201	10	\$583,635	\$93,400	EPS002	10	\$583,635	\$23,400	CCF44	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$140,200
28	CC 1099550545	BONILLA NARANJO ERIKA NIGLEY								X								230301	30	\$2,385,608	\$381,700	EPS002	30	\$2,385,608	\$95,500	CCF44	30	\$2,385,608	\$95,500	14-23	30	\$2,385,608	6.960%	\$166,100	30	\$0	\$0	Si	\$738,800
29	CC 1088281908	BONILLA ARANGO SEBASTIAN	X							X								230301	26	\$1,547,296	\$247,600	EPS002	26	\$1,547,296	\$61,900	CCF44	26	\$1,547,296	\$61,900	14-23	26	\$1,547,296	6.960%	\$107,700	26	\$0	\$0	Si	\$479,100
30	CC 1087561907	CABAL BEDOYA VALERIA						X		X								230301	30	\$2,050,000	\$328,000	EPS002	30	\$2,050,000	\$82,000	CCF44	30	\$2,050,000	\$82,000	14-23	30	\$2,050,000	6.960%	\$142,700	30	\$0	\$0	Si	\$634,700
31	CC 1123562076	CALDERON VIRGUEZ CAREN DALLANA								X								230201	29	\$2,606,587	\$417,100	EPS002	29	\$2,606,587	\$104,300	CCF44	29	\$2,606,587	\$104,300	14-23	29	\$2,606,587	6.960%	\$181,500	29	\$0	\$0	Si	\$807,200
32	CC 1123562076	CALDERON VIRGUEZ CAREN DALLANA									X							230201	1	\$58,364	\$9,400	EPS002	1	\$58,364	\$2,400	CCF44	1	\$58,364	\$2,400	14-23	1	\$58,364	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$14,200
33	CC 6386082	CAMARGO OSORIO ARVEY								X								25-14	30	\$1,929,975	\$308,800	EPS002	30	\$1,929,975	\$77,200	CCF44	30	\$1,929,975	\$77,200	14-23	30	\$1,929,975	6.960%	\$134,400	30	\$0	\$0	Si	\$597,600
34	CC 1061368715	CANAS LONDOÑO DIEGO ALEXANDER									X							230201	6	\$350,181	\$56,100	EPS037	6	\$350,181	\$14,100	CCF44	6	\$350,181	\$14,100	14-23	6	\$350,181	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$84,300
35	CC 1061368715	CANAS LONDOÑO DIEGO ALEXANDER								X								230201	24	\$1,890,977	\$302,600	EPS037	24	\$1,890,977	\$75,700	CCF44	24	\$1,890,977	\$75,700	14-23	24	\$1,890,977	6.960%	\$131,700	24	\$0	\$0	Si	\$585,700
36	CC 2474452	CANO RESTREPO JOSE DANIEL								X								231001	30	\$2,222,456	\$355,600	EPS037	30	\$2,222,456	\$88,900	CCF44	30	\$2,222,456	\$88,900	14-23	30	\$2,222,456	6.960%	\$154,700	30	\$0	\$0	Si	\$688,100
37	CC 6239846	CANO GIRALDO RENE ALEXANDER	X															230201	12	\$1,140,000	\$182,400	EPS018	12	\$1,140,000	\$45,600	CCF44	12	\$1,140,000	\$45,600	14-23	12	\$1,140,000	6.960%	\$79,400	12	\$0	\$0	Si	\$353,000
38	CC 1088323348	CARDONA RINCON ALEJANDRA						X		X								230201	30	\$6,000,000	\$960,000	EPS002	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF44	30	\$6,000,000	\$240,000	14-23	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,857,600
39	CC 1093739987	CARVAJAL GARCIA JOSE ADOLFO								X								230301	30	\$4,395,829	\$703,400	EPS002	30	\$4,395,829	\$175,900	CCF44	30	\$4,395,829	\$175,900	14-23	30	\$4,395,829	6.960%	\$306,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,361,200
40	CC 1087562129	CASTAÑEDA OROZCO DORA STELLA								X								230201	30	\$2,085,169	\$333,700	ESSC62	30	\$2,085,169	\$83,500	CCF44	30	\$2,085,169	\$83,500	14-23	30	\$2,085,169	6.960%	\$145,200	30	\$0	\$0	Si	\$645,900
41	CC 10116054	CASTAÑEDA JAIRO								X								230201	30	\$2,373,239	\$379,800	EPS005	30	\$2,373,239	\$95,000	CCF44	30	\$2,373,239	\$95,000	14-23	30	\$2,373,239	6.960%	\$165,200	30	\$0	\$0	Si	\$735,000
42	CC 9958225	CASTAÑO VALENCIA ALEJANDRO								X								230201	27	\$2,294,879	\$367,200	EPS002	27	\$2,294,879	\$91,800	CCF44	27	\$2,294,879	\$91,800	14-23	27	\$2,294,879	6.960%	\$159,800	27	\$0	\$0	Si	\$710,600
43	CC 9958225	CASTAÑO VALENCIA ALEJANDRO									X							230201	3	\$175,091	\$28,100	EPS002	3	\$175,091	\$7,100	CCF44	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$42,300
44	CC 18523297	CASTIBLANCO YARON JOSE GUSTAVO								X								230301	30	\$3,053,113	\$488,500	EPS002	30	\$3,053,113	\$122,200	CCF44	30	\$3,053,113	\$122,200	14-23	30	\$3,053,113	6.960%	\$212,500	30	\$0	\$0	Si	\$945,400
45	CC 9817947	CATAÑO CASTRILLON YEHISON								X								230201	30	\$2,974,843	\$476,000	EPS002	30	\$2,974,843	\$119,000	CCF44	30	\$2,974,843	\$119,000	14-23	30	\$2,974,843	6.960%	\$207,100	30	\$0	\$0	Si	\$921,100
46	CC 1001962819	COLON BOCANEGRA RICARDO JULIO								X								230301	30	\$2,604,472	\$416,800	EPS002	30	\$2,604,472	\$104,200	CCF44	30	\$2,604,472	\$104,200	14-23	30	\$2,604,472	6.960%	\$181,300	30	\$0	\$0	Si	\$806,500
47	CC 1089721335	CONTRERAS CASTAÑO CRISTIAN CAMILO								X								230301	30	\$2,082,955	\$333,300	EPS002	30	\$2,082,955	\$83,400	CCF44	30	\$2,082,955	\$83,400	14-23	30	\$2,082,955	6.960%	\$145,000	30	\$0	\$0	Si	\$645,100
48	CC 1090149737	CORRALES MONCADA PAULA ANDREA										X	X					230301	30	\$1,940,400	\$310,500	EPS002	30	\$1,940,400	\$77,700	CCF44	30	\$1,940,400	\$77,700	14-23	30	\$1,940,400	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$465,900
49	CC 1004684006	CORREA RAMIREZ LEIDY TATIANA								X								230301	2	\$116,727	\$14,100	EPS041	2	\$116,727	\$0	CCF44	2	\$116,727	\$0	14-23	2	\$116,727	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$14,100
50	CC 1004684006	CORREA RAMIREZ LEIDY TATIANA								X								230301	28	\$2,101,750	\$336,300	EPS041	28	\$2,101,750	\$84,100	CCF44	28	\$2,101,750	\$84,100	14-23	28	\$2,101,750	6.960%	\$146,300	28	\$0	\$0	Si	\$650,800
51	CC 35198734	CORREDOR VILLARROEL GINNA PAOLA								X								230301	30	\$3,058,883	\$489,500	EPS010	30	\$3,058,883	\$122,400	CCF44	30	\$3,058,883	\$122,400	14-23	30	\$3,058,883	6.960%	\$212,900	30	\$0	\$0	Si	\$947,200
52	CC 1088325776	CRUZ PULGARIN CARLOS MARIO																230301	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS002	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF44	30	\$8,000,000	\$320,000	14-23	30	\$8,000,000	6.960%	\$556,800	30	\$0	\$0	Si	\$2,556,800
53	CC 1090148872	CRUZ PULGARIN HECTOR ALONSO								X								231001	30	\$2,639,092	\$422,300	EPS002	30	\$2,639,092	\$105,600	CCF44	30	\$2,639,092	\$105,600	14-23	30	\$2,639,092	6.960%	\$183,700	30	\$0	\$0	Si	\$817,200
54	CC 18511001	CRUZ RESTREPO JORGE LUIS											L					230201	2	\$116,727	\$18,700	EPS002	2	\$116,727	\$4,700	CCF44	2	\$116,727	\$4,700	14-23	2	\$116,727	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$28,100
55	CC 18511001	CRUZ RESTREPO JORGE LUIS	X															230201	3	\$175,091	\$28,100	EPS002	3	\$175,091	\$7,100	CCF44	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	6.960%	\$12,200	3	\$0	\$0	Si	\$54,500
56	CC 1088007982	CRUZ ARISMENDI NATALIA ANDREA						X		X								230201	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS018	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF44	30	\$2,100,000	\$84,000	14-23	30	\$2,100,000	6.960%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$650,200
57	CC 1088250914	CUERVO GRAJALES ANDRES GEOVANY								X								230301	17	\$1,310,526	\$209,700	EPS002	17	\$1,310,526	\$52,500	CCF44	17	\$1,310,526	\$52,500	14-23	17	\$1,310,526	6.960%	\$91,300	17	\$0	\$0	Si	\$406,000
58	CC 1088250914	CUERVO GRAJALES ANDRES GEOVANY									X							230301	13	\$758,726	\$121,400	EPS002	13	\$758,726	\$30,400	CCF44	13	\$758,726	\$30,400	14-23	13	\$758,726	0.000%	\$0	13	\$0	\$0	Si	\$182,200

No	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	ta p	ta p	vs p	co r	sl n	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
59	CC	1108122228	DAVILA GRISALES NEIDER ADRIAN							X						230301	30	\$2,874,668	\$460,000	EPS002	30	\$2,874,668	\$115,000	CCF44	30	\$2,874,668	\$115,000	14-23	30	\$2,874,668	6.960%	\$200,100	30	\$0	\$0	Si	\$890,100
60	CC	1047334459	DE AVILA PEREZ JUAN DAVID							X						230301	28	\$2,173,378	\$347,800	EPS041	28	\$2,173,378	\$87,000	CCF44	28	\$2,173,378	\$87,000	14-23	28	\$2,173,378	6.960%	\$151,300	28	\$0	\$0	Si	\$673,100
61	CC	1047334459	DE AVILA PEREZ JUAN DAVID							X						230301	2	\$116,727	\$14,100	EPS041	2	\$116,727	\$0	CCF44	2	\$116,727	\$0	14-23	2	\$116,727	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$14,100
62	CC	14891927	DIAZ RAMIREZ MARTIN EMILIO	X						X						25-14	18	\$2,513,636	\$402,200	EPS010	18	\$2,513,636	\$100,600	CCF44	18	\$2,513,636	\$100,600	14-23	18	\$2,513,636	6.960%	\$175,000	18	\$0	\$0	Si	\$778,400
63	CC	18606982	DURANGO RIAZA CARLOS ARTURO							X						230301	30	\$2,506,978	\$401,200	EPS002	30	\$2,506,978	\$100,300	CCF44	30	\$2,506,978	\$100,300	14-23	30	\$2,506,978	6.960%	\$174,500	30	\$0	\$0	Si	\$776,300
64	CC	1192746556	ESCOBAR HOYOS EMERSON DAVID							X						25-14	30	\$1,949,872	\$312,000	EPS005	30	\$1,949,872	\$78,000	CCF44	30	\$1,949,872	\$78,000	14-23	30	\$1,949,872	6.960%	\$135,800	30	\$0	\$0	Si	\$603,800
65	CC	1096644214	ESPINOSA HERRERA ALONSO							X						230301	30	\$2,306,021	\$369,000	EPS002	30	\$2,306,021	\$92,300	CCF44	30	\$2,306,021	\$92,300	14-23	30	\$2,306,021	6.960%	\$160,500	30	\$0	\$0	Si	\$714,100
66	CC	1117814850	FIERRO GUEVARA AIMER MAURICIO													230201	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS002	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF44	30	\$4,500,000	\$180,000	14-23	30	\$4,500,000	6.960%	\$313,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,393,200
67	CC	18609480	FIGUEROA JOHN JENNY							X						230201	26	\$2,158,123	\$345,300	EPS037	26	\$2,158,123	\$86,400	CCF44	26	\$2,158,123	\$86,400	14-23	26	\$2,158,123	6.960%	\$150,300	26	\$0	\$0	Si	\$668,400
68	CC	18609480	FIGUEROA JOHN JENNY											X		230201	4	\$233,454	\$37,400	EPS037	4	\$233,454	\$9,400	CCF44	4	\$233,454	\$0	14-23	4	\$233,454	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$46,800
69	CC	86001956	FORERO LOAIZA DANIEL							X						0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$3,318,365	\$132,800	CCF44	30	\$3,318,365	\$132,800	14-23	30	\$3,318,365	6.960%	\$231,000	30	\$0	\$0	Si	\$496,600
70	CC	1124033054	FUENTES PADILLA JORGE EUECER							X						230301	30	\$1,880,234	\$300,900	ESSC24	30	\$1,880,234	\$75,300	CCF44	30	\$1,880,234	\$75,300	14-23	30	\$1,880,234	6.960%	\$130,900	30	\$0	\$0	Si	\$582,400
71	CC	1112784514	GALLEGO SANCHEZ DAVID STIVEN							X						230301	25	\$2,735,567	\$437,700	EPS005	25	\$2,735,567	\$109,500	CCF44	25	\$2,735,567	\$109,500	14-23	25	\$2,735,567	6.960%	\$190,400	25	\$0	\$0	Si	\$847,100
72	CC	1112784514	GALLEGO SANCHEZ DAVID STIVEN								X					230301	5	\$291,818	\$46,700	EPS005	5	\$291,818	\$11,700	CCF44	5	\$291,818	\$11,700	14-23	5	\$291,818	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$70,100
73	CC	42159832	GARCIA SERNA GLORIA MILENA													0	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	0	\$0	\$0	No	\$340,800
74	CC	1225089430	GARCIA BOCANUMEN NICOLAS							X						230301	30	\$2,306,021	\$369,000	EPS002	30	\$2,306,021	\$92,300	CCF44	30	\$2,306,021	\$92,300	14-23	30	\$2,306,021	6.960%	\$160,500	30	\$0	\$0	Si	\$714,100
75	CC	70811514	GARCIA MONTOYA REINEL DE JESUS							X						25-14	30	\$2,846,016	\$455,400	EPS002	30	\$2,846,016	\$113,900	CCF44	30	\$2,846,016	\$113,900	14-23	30	\$2,846,016	6.960%	\$198,100	30	\$0	\$0	Si	\$881,300
76	CC	1094904031	GARCIA GIRALDO RICARDO ADOLFO							X						230301	30	\$4,067,102	\$650,800	EPS010	30	\$4,067,102	\$162,700	CCF44	30	\$4,067,102	\$162,700	14-23	30	\$4,067,102	6.960%	\$283,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,259,300
77	CC	94422198	GARCIA BOCANUMEN RICARDO ANDRES							X						230301	30	\$2,286,124	\$365,800	EPS002	30	\$2,286,124	\$91,500	CCF44	30	\$2,286,124	\$91,500	14-23	30	\$2,286,124	6.960%	\$159,200	30	\$0	\$0	Si	\$708,000
78	CC	10011710	GARZON ARISMENDIS JOHN CARLOS													230301	30	\$3,355,000	\$536,800	EPS002	30	\$3,355,000	\$134,200	CCF44	30	\$3,355,000	\$134,200	14-23	30	\$3,355,000	6.960%	\$233,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,038,800
79	CC	1088538975	GIRALDO CARDENO DANIEL							X						230301	30	\$3,186,691	\$509,900	EPS002	30	\$3,186,691	\$127,500	CCF44	30	\$3,186,691	\$127,500	14-23	30	\$3,186,691	6.960%	\$221,800	30	\$0	\$0	Si	\$986,700
80	CC	1088326970	GIRALDO GARCIA JHON SEBASTIAN							X						230301	30	\$2,150,430	\$344,100	EPS005	30	\$2,150,430	\$86,100	CCF44	30	\$2,150,430	\$86,100	14-23	30	\$2,150,430	6.960%	\$149,700	30	\$0	\$0	Si	\$666,000
81	CC	1007762639	GOMEZ TABARES DALYLA	X												230301	2	\$333,334	\$53,400	EPS037	2	\$333,334	\$13,400	CCF44	2	\$333,334	\$13,400	14-23	2	\$333,334	6.960%	\$23,300	2	\$0	\$0	Si	\$103,500
82	CC	1087551933	GOMEZ BERRIO DIANA MARIA						X	X						25-14	28	\$2,169,334	\$347,100	EPS018	28	\$2,169,334	\$86,800	CCF44	28	\$2,169,334	\$86,800	14-23	28	\$2,169,334	6.960%	\$151,000	28	\$0	\$0	Si	\$671,700
83	CC	1087551933	GOMEZ BERRIO DIANA MARIA								X					25-14	2	\$116,727	\$18,700	EPS018	2	\$116,727	\$4,700	CCF44	2	\$116,727	\$4,700	14-23	2	\$116,727	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$28,100
84	CC	10263192	GOMEZ OSPINA GERARDO							X						25-14	30	\$6,239,754	\$998,400	EPS010	30	\$6,239,754	\$249,600	CCF44	30	\$6,239,754	\$249,600	14-23	30	\$6,239,754	6.960%	\$434,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,931,900
85	CC	42163133	GOMEZ LAINA JOHANNA							X						230201	30	\$4,748,864	\$759,900	EPS002	30	\$4,748,864	\$190,000	CCF44	30	\$4,748,864	\$190,000	14-23	30	\$4,748,864	6.960%	\$330,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,470,500
86	CC	16111900	GONZALEZ LLANO ALIRIO							X						230201	30	\$2,375,660	\$380,200	EPS002	30	\$2,375,660	\$95,100	CCF44	30	\$2,375,660	\$95,100	14-23	30	\$2,375,660	6.960%	\$165,400	30	\$0	\$0	Si	\$735,800
87	CC	1061656785	GONZALEZ ZULLUAGA CRISTIAN ALIRIO							X						230301	30	\$2,286,124	\$365,800	EPS002	30	\$2,286,124	\$91,500	CCF44	30	\$2,286,124	\$91,500	14-23	30	\$2,286,124	6.960%	\$159,200	30	\$0	\$0	Si	\$708,000
88	CC	4517617	GONZALEZ GOMEZ JUAN PABLO							X						230301	30	\$3,278,994	\$524,700	EPS002	30	\$3,278,994	\$131,200	CCF44	30	\$3,278,994	\$131,200	14-23	30	\$3,278,994	6.960%	\$228,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,015,400
89	CC	9955650	GORDILLO RAMIREZ JOSE REINEL							X						25-14	30	\$2,128,941	\$340,700	EPS037	30	\$2,128,941	\$85,200	CCF44	30	\$2,128,941	\$85,200	14-23	30	\$2,128,941	6.960%	\$148,200	30	\$0	\$0	Si	\$659,300
90	CC	18562244	GRAJALES MOSCOSO HUBERNEY							X						230201	16	\$2,307,274	\$369,200	EPS037	16	\$2,307,274	\$92,300	CCF44	16	\$2,307,274	\$92,300	14-23	16	\$2,307,274	6.960%	\$160,600	16	\$0	\$0	Si	\$714,400
91	CC	18562244	GRAJALES MOSCOSO HUBERNEY								X					230201	14	\$1,111,157	\$177,800	EPS037	14	\$1,111,157	\$44,500	CCF44	14	\$1,111,157	\$44,500	14-23	14	\$1,111,157	0.000%	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$266,800

No	Identificación	Nombre	In g	re t	de e	ta e	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	ige	lm a	va c	av p	vc t	ir l	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
92	CC	94254529	GRAJALES GRAJALES JOSE HAMILTON							X									25-14	30	\$2,688,386	\$430,200	EPS010	30	\$2,688,386	\$107,600	CCF44	30	\$2,688,386	\$107,600	14-23	30	\$2,688,386	6.960%	\$187,200	30	\$0	\$0	Si	\$832,600
93	CC	89003593	GRAJALES FRANCO VICTOR FABIO					X		X									230301	30	\$2,340,023	\$374,500	EPS018	30	\$2,340,023	\$93,700	CCF44	30	\$2,340,023	\$93,700	14-23	30	\$2,340,023	6.960%	\$162,900	30	\$0	\$0	Si	\$724,800
94	CC	9957339	GRISALES OSORIO JAMES FERNANDO								X								25-14	3	\$175,091	\$28,100	EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF44	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$42,300
95	CC	9957339	GRISALES OSORIO JAMES FERNANDO							X									25-14	27	\$2,446,094	\$391,400	EPS037	27	\$2,446,094	\$97,900	CCF44	27	\$2,446,094	\$97,900	14-23	27	\$2,446,094	6.960%	\$170,300	27	\$0	\$0	Si	\$757,500
96	CC	1193141356	GRISALES VALDES RUBEN ADOLFO							X									230301	30	\$3,448,637	\$551,800	EPS002	30	\$3,448,637	\$138,000	CCF44	30	\$3,448,637	\$138,000	14-23	30	\$3,448,637	6.960%	\$240,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,067,900
97	CC	94389698	GRISALES GUERRA RUBEN DARIO							X									230301	30	\$2,975,834	\$476,200	EPS002	30	\$2,975,834	\$119,100	CCF44	30	\$2,975,834	\$119,100	14-23	30	\$2,975,834	6.960%	\$207,200	30	\$0	\$0	Si	\$921,600
98	CC	1117350814	GRISALEZ HORTUA SANTIAGO							X									230301	30	\$2,360,337	\$377,700	EPS018	30	\$2,360,337	\$94,500	CCF44	30	\$2,360,337	\$94,500	14-23	30	\$2,360,337	6.960%	\$164,300	30	\$0	\$0	Si	\$731,000
99	CC	1053862831	GUARIN LONDONO NICOLAS	X						X								X	230201	20	\$3,475,379	\$556,100	EPS010	20	\$3,475,379	\$139,100	CCF44	20	\$3,787,879	\$151,600	14-23	20	\$3,475,379	6.960%	\$241,900	20	\$0	\$0	Si	\$1,088,700
100	CC	1088327203	GUERRERO GUAPACHA DANIEL MAURICIO	X															25-14	9	\$630,000	\$100,800	EPS002	9	\$630,000	\$25,200	CCF44	9	\$630,000	\$25,200	14-23	9	\$630,000	6.960%	\$43,900	9	\$0	\$0	Si	\$195,100
101	CC	80382209	GUERRERO WILLIAM GIOVANI							X									25-14	30	\$2,567,296	\$410,800	EPS005	30	\$2,567,296	\$102,700	CCF44	30	\$2,567,296	\$102,700	14-23	30	\$2,567,296	6.960%	\$178,700	30	\$0	\$0	Si	\$794,900
102	CC	18394548	GUTIERREZ FRANCO CARLOS ENRIQUE																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
103	CC	18533409	GUTIERREZ HOYOS JHON ALEXANDER							X									231001	30	\$2,412,245	\$386,000	EPS002	30	\$2,412,245	\$96,500	CCF44	30	\$2,412,245	\$96,500	14-23	30	\$2,412,245	6.960%	\$167,900	30	\$0	\$0	Si	\$746,900
104	CC	93417491	GUTIERREZ ESCOBAR LUIS ABEL							X									25-14	30	\$2,611,364	\$417,900	EPS017	30	\$2,611,364	\$104,500	CCF44	30	\$2,611,364	\$104,500	14-23	30	\$2,611,364	6.960%	\$181,800	30	\$0	\$0	Si	\$808,700
105	CC	1093559039	GUTIERREZ CATAÑO WILMAR ANTONIO							X									230201	26	\$1,815,901	\$290,600	EPS002	26	\$1,815,901	\$72,700	CCF44	26	\$1,815,901	\$72,700	14-23	26	\$1,815,901	6.960%	\$126,400	26	\$0	\$0	Si	\$562,400
106	CC	1093559039	GUTIERREZ CATAÑO WILMAR ANTONIO								X								230201	4	\$233,454	\$37,400	EPS002	4	\$233,454	\$9,400	CCF44	4	\$233,454	\$9,400	14-23	4	\$233,454	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$56,200
107	CC	18608612	HENAO LARGO ARBEY							X									25-14	30	\$2,776,085	\$444,200	EPS037	30	\$2,776,085	\$111,100	CCF44	30	\$2,776,085	\$111,100	14-23	30	\$2,776,085	6.960%	\$193,300	30	\$0	\$0	Si	\$859,700
108	CC	94462760	HENAO ALUIPO FRAGLIZ							X									231001	30	\$2,556,720	\$409,100	ESSC24	30	\$2,556,720	\$102,300	CCF44	30	\$2,556,720	\$102,300	14-23	30	\$2,556,720	6.960%	\$178,000	30	\$0	\$0	Si	\$791,700
109	CC	1087562412	HENAO QUINTERO JHONIER STIVEN							X									230301	19	\$1,612,293	\$258,000	EPS002	19	\$1,612,293	\$64,500	CCF44	19	\$1,612,293	\$64,500	14-23	19	\$1,612,293	6.960%	\$112,300	19	\$0	\$0	Si	\$499,300
110	CC	1087562412	HENAO QUINTERO JHONIER STIVEN										X						230301	11	\$641,999	\$102,800	EPS002	11	\$641,999	\$25,700	CCF44	11	\$641,999	\$25,700	14-23	11	\$641,999	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$154,200
111	CC	1004700011	HENAO FRANCO JUAN GUILLERMO														X		230201	25	\$1,459,088	\$233,500	EPS018	25	\$1,459,088	\$58,400	CCF44	25	\$1,186,250	\$47,500	14-23	25	\$1,459,088	0.000%	\$0	25	\$0	\$0	Si	\$339,400
112	CC	1004700011	HENAO FRANCO JUAN GUILLERMO																230201	5	\$291,818	\$46,700	EPS018	5	\$291,818	\$11,700	CCF44	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$291,818	6.960%	\$20,400	5	\$0	\$0	Si	\$88,300
113	CC	4512138	HENAO VASQUEZ LUIS EDIER							X									230201	30	\$2,306,021	\$369,000	EPS002	30	\$2,306,021	\$92,300	CCF44	30	\$2,306,021	\$92,300	14-23	30	\$2,306,021	6.960%	\$160,500	30	\$0	\$0	Si	\$714,100
114	CC	52404761	HERNANDEZ MUÑOZ ADRIANA					X		X									230201	30	\$2,124,548	\$340,000	EPS002	30	\$2,124,548	\$85,000	CCF44	30	\$2,124,548	\$85,000	14-23	30	\$2,124,548	6.960%	\$147,900	30	\$0	\$0	Si	\$657,900
115	CC	1105615152	HERNANDEZ PERALTA FREDY FERNEY							X									25-14	30	\$3,978,273	\$636,600	EPS002	30	\$3,978,273	\$159,200	CCF44	30	\$3,978,273	\$159,200	14-23	30	\$3,978,273	6.960%	\$276,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,231,900
116	CC	1006291278	HERRERA VILLA JHOJAN ESTIVEN								X								230301	2	\$126,667	\$15,300	EPS018	2	\$126,667	\$0	CCF44	2	\$126,667	\$0	14-23	2	\$126,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$15,300
117	CC	1006291278	HERRERA VILLA JHOJAN ESTIVEN							X									230301	28	\$2,349,810	\$376,000	EPS018	28	\$2,349,810	\$94,000	CCF44	28	\$2,349,810	\$94,000	14-23	28	\$2,349,810	6.960%	\$163,600	28	\$0	\$0	Si	\$727,600
118	CC	10197740	HERRERA VILLADA WILLIAM ANTONIO							X									230301	27	\$2,232,404	\$357,200	EPS002	27	\$2,232,404	\$89,300	CCF44	27	\$2,232,404	\$89,300	14-23	27	\$2,232,404	6.960%	\$155,400	27	\$0	\$0	Si	\$691,200
119	CC	10197740	HERRERA VILLADA WILLIAM ANTONIO									X							230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS002	3	\$175,091	\$7,100	CCF44	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$42,300
120	CC	1088538912	HIGUITA OLAYA JOHAN DE JESUS							X									230201	30	\$2,210,325	\$353,700	EPS002	30	\$2,210,325	\$88,500	CCF44	30	\$2,210,325	\$88,500	14-23	30	\$2,210,325	6.960%	\$153,900	30	\$0	\$0	Si	\$684,600
121	CC	9868049	HINCAPIE ZAMBRANO LUIS FERNANDO																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
122	CC	1088012585	HURTADO CUARTAS JHONATAN FARID					X		X									230301	30	\$2,450,000	\$392,000	EPS002	30	\$2,450,000	\$98,000	CCF44	30	\$2,450,000	\$98,000	14-23	30	\$2,450,000	6.960%	\$170,600	30	\$0	\$0	Si	\$758,600
123	CC	1111752763	JARAMILLO RUIZ JHOANI	X						X									25-14	26	\$1,547,296	\$247,600	EPS010	26	\$1,547,296	\$61,900	CCF44	26	\$1,547,296	\$61,900	14-23	26	\$1,547,296	6.960%	\$107,700	26	\$0	\$0	Si	\$479,100
124	CC	1002798333	JARAMILLO GARCIA SANTIAGO							X									230201	30	\$2,433,361	\$389,400	EPS041	30	\$2,433,361	\$97,400	CCF44	30	\$2,433,361	\$97,400	14-23	30	\$2,433,361	6.960%	\$169,400	30	\$0	\$0	Si	\$753,600

No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	de	ta	pa	vs	co	sl	lge	lm	va	av	vc	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
125	CC 94407059	JIMENEZ TREJOS ALVARO									X								230301	30	\$2,296,073	\$367,400	EPS002	30	\$2,296,073	\$91,900	CCF44	30	\$2,296,073	\$91,900	14-23	30	\$2,296,073	6.960%	\$159,900	30	\$0	\$0	Si	\$711,100
126	CC 10022217	JIMENEZ GIRALDO JUAN CARLOS													X				25-14	11	\$641,999	\$102,800	EPS002	11	\$641,999	\$25,700	CCF44	11	\$641,999	\$25,700	14-23	11	\$641,999	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$154,200
127	CC 10022217	JIMENEZ GIRALDO JUAN CARLOS									X								25-14	19	\$1,823,596	\$291,800	EPS002	19	\$1,823,596	\$73,000	CCF44	19	\$1,823,596	\$73,000	14-23	19	\$1,823,596	6.960%	\$127,000	19	\$0	\$0	Si	\$564,800
128	CC 9894091	LADINO ARICAPA FAUNIER ANTONIO									X								230201	30	\$2,622,727	\$419,700	EPS002	30	\$2,622,727	\$105,000	CCF44	30	\$2,622,727	\$105,000	14-23	30	\$2,622,727	6.960%	\$182,600	30	\$0	\$0	Si	\$812,300
129	CC 1004682744	LADINO GIL SAMUEL	X																230201	15	\$875,453	\$140,100	EPS002	15	\$875,453	\$35,100	CCF44	15	\$875,453	\$35,100	14-23	15	\$875,453	6.960%	\$61,000	15	\$0	\$0	Si	\$271,300
130	CC 1057756092	LARGO HENAO PAULA ANDREA																	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF44	30	\$2,300,000	\$92,000	14-23	30	\$2,300,000	6.960%	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
131	CC 24688371	LEON GALLO SANDRA BIVIANA							X	X									25-14	30	\$4,250,000	\$680,000	EPS005	30	\$4,250,000	\$170,000	CCF44	30	\$4,250,000	\$170,000	14-23	30	\$4,250,000	6.960%	\$295,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,315,800
132	CC 1111779183	LOPEZ RIOS ANDRES FELIPE									X								230201	30	\$3,687,273	\$590,000	EPS037	30	\$3,687,273	\$147,500	CCF44	30	\$3,687,273	\$147,500	14-23	30	\$3,687,273	6.960%	\$256,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,141,700
133	CC 9957160	LOPEZ PULGARIN DUVAN ANTONIO									X								230301	30	\$2,764,440	\$442,400	EPS002	30	\$2,764,440	\$110,600	CCF44	30	\$2,764,440	\$110,600	14-23	30	\$2,764,440	6.960%	\$192,500	30	\$0	\$0	Si	\$856,100
134	CC 10136585	LOPEZ CARMONA FELIX ROBERTO																	230201	30	\$3,473,776	\$555,900	EPS002	30	\$3,473,776	\$139,000	CCF44	30	\$3,473,776	\$139,000	14-23	30	\$3,473,776	6.960%	\$241,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,075,700
135	CC 10111302	LOPEZ AGUIRRE GUSTAVO									X								0	\$0	\$0	EPS005	30	\$2,296,073	\$91,900	CCF44	30	\$2,296,073	\$91,900	14-23	30	\$2,296,073	6.960%	\$159,900	30	\$0	\$0	Si	\$343,700	
136	CC 10543476	LOPEZ CHICUE HUBERT JOSE										X							0	\$0	\$0	EPS005	4	\$233,454	\$9,400	CCF44	4	\$233,454	\$9,400	14-23	4	\$233,454	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$18,800	
137	CC 10543476	LOPEZ CHICUE HUBERT JOSE									X								0	\$0	\$0	EPS005	26	\$1,760,986	\$70,500	CCF44	26	\$1,760,986	\$70,500	14-23	26	\$1,760,986	6.960%	\$122,600	26	\$0	\$0	Si	\$263,600	
138	CC 1113037102	LOPEZ GALLEGO YEISON DAVID	X								X								230301	26	\$1,577,141	\$252,400	EPS002	26	\$1,577,141	\$63,100	CCF44	26	\$1,577,141	\$63,100	14-23	26	\$1,577,141	6.960%	\$109,800	26	\$0	\$0	Si	\$488,400
139	CC 18505020	LOTERO ALVAREZ RAMIRO ANTONIO									X								230301	30	\$2,821,111	\$451,400	EPS010	30	\$2,821,111	\$112,900	CCF44	30	\$2,821,111	\$112,900	14-23	30	\$2,821,111	6.960%	\$196,400	30	\$0	\$0	Si	\$873,600
140	CC 10198839	MARIN SUAREZ ARLEDY DE JESUS									X								25-14	12	\$1,017,500	\$162,800	EPS037	12	\$1,017,500	\$40,700	CCF44	12	\$1,017,500	\$40,700	14-23	12	\$1,017,500	6.960%	\$70,900	12	\$0	\$0	Si	\$315,100
141	CC 10198839	MARIN SUAREZ ARLEDY DE JESUS													X				25-14	18	\$1,320,000	\$211,200	EPS037	18	\$1,320,000	\$52,800	CCF44	18	\$1,320,000	\$52,800	14-23	18	\$1,320,000	0.000%	\$0	18	\$0	\$0	Si	\$316,800
142	CC 1085796046	MARIN QUEBRADA DIEGO ALEJANDRO									X								230201	30	\$2,578,807	\$412,700	ESSC62	30	\$2,578,807	\$103,200	CCF44	30	\$2,578,807	\$103,200	14-23	30	\$2,578,807	6.960%	\$179,500	30	\$0	\$0	Si	\$798,600
143	CC 9763544	MARIN JIMENEZ DIOMER DE JESUS									X								230301	30	\$2,348,898	\$375,900	EPS002	30	\$2,348,898	\$94,000	CCF44	30	\$2,348,898	\$94,000	14-23	30	\$2,348,898	6.960%	\$163,500	30	\$0	\$0	Si	\$727,400
144	CC 1004528410	MARIN QUEBRADA JHON EDWARD									X								230301	20	\$2,272,332	\$363,600	EPS002	20	\$2,272,332	\$90,900	CCF44	20	\$2,272,332	\$90,900	14-23	20	\$2,272,332	6.960%	\$158,200	20	\$0	\$0	Si	\$703,600
145	CC 1004528410	MARIN QUEBRADA JHON EDWARD															X		230301	10	\$583,635	\$93,400	EPS002	10	\$583,635	\$23,400	CCF44	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$140,200
146	CC 1004681602	MARIN OSORIO JULIO CESAR									X								230201	30	\$2,591,339	\$414,700	EPS002	30	\$2,591,339	\$103,700	CCF44	30	\$2,591,339	\$103,700	14-23	30	\$2,591,339	6.960%	\$180,400	30	\$0	\$0	Si	\$802,500
147	CC 1088002892	MARIN HURTADO LINA MARCELA							X	X									230301	30	\$4,825,000	\$772,000	EPS010	30	\$4,825,000	\$193,000	CCF44	30	\$4,825,000	\$193,000	14-23	30	\$4,825,000	6.960%	\$335,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,493,900
148	CC 1004789646	MARIN SANCHEZ MAURICIO									X								230301	30	\$1,929,975	\$308,800	EPS002	30	\$1,929,975	\$77,200	CCF44	30	\$1,929,975	\$77,200	14-23	30	\$1,929,975	6.960%	\$134,400	30	\$0	\$0	Si	\$597,600
149	CC 1053840830	MARIN SANCHEZ YULY TATIANA	X								X						X	25-14	5	\$470,091	\$75,300	EPS037	5	\$470,091	\$18,900	CCF44	5	\$535,750	\$21,500	14-23	5	\$470,091	6.960%	\$32,800	5	\$0	\$0	Si	\$148,500	
150	CC 71704317	MARTINEZ OSSA JHON FREDY																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
151	CC 1110477819	MARTINEZ LONDONO JULIO CESAR									X								231001	30	\$2,286,124	\$365,800	EPS002	30	\$2,286,124	\$91,500	CCF44	30	\$2,286,124	\$91,500	14-23	30	\$2,286,124	6.960%	\$159,200	30	\$0	\$0	Si	\$708,000
152	CC 1088321280	MARTINEZ CARVAJAL LUISA FERNANDA								X	X								230301	30	\$2,575,000	\$412,000	EPS002	30	\$2,575,000	\$103,000	CCF44	30	\$2,575,000	\$103,000	14-23	30	\$2,575,000	6.960%	\$179,300	30	\$0	\$0	Si	\$797,300
153	CC 18531296	MARULANDA OSORIO PACIFICO ANTONIO									X								230201	30	\$2,332,683	\$373,300	EPS002	30	\$2,332,683	\$93,400	CCF44	30	\$2,332,683	\$93,400	14-23	30	\$2,332,683	6.960%	\$162,400	30	\$0	\$0	Si	\$722,500
154	CC 15986035	MARULANDA ARBELAEZ RUBIEL									X								25-14	30	\$2,336,727	\$373,900	EPS002	30	\$2,336,727	\$93,500	CCF44	30	\$2,336,727	\$93,500	14-23	30	\$2,336,727	6.960%	\$162,700	30	\$0	\$0	Si	\$723,600
155	CC 1088315333	MAZO ARROYAVE JHONATAN									X								230301	30	\$1,979,717	\$316,800	EPS002	30	\$1,979,717	\$79,200	CCF44	30	\$1,979,717	\$79,200	14-23	30	\$1,979,717	6.960%	\$137,800	30	\$0	\$0	Si	\$613,000
156	CC 7318177	MEDINA QUIROGA CARLOS ARTURO									X								230301	30	\$2,945,500	\$471,300	EPS017	30	\$2,945,500	\$117,900	CCF44	30	\$2,945,500	\$117,900	14-23	30	\$2,945,500	6.960%	\$205,100	30	\$0	\$0	Si	\$912,200
157	CC 1088292967	MEDINA ACOSTA STEVEN						</																																

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

No	Identificación	Nombre	In g	re t	de e	ta p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	lm a	va e	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
193	CC	10123330	OTALVARO BETANCUR MILCIADES							X							230201	30	\$2,889,886	\$462,400	EPS005	30	\$2,889,886	\$115,600	CCF44	30	\$2,889,886	\$115,600	14-23	30	\$2,889,886	6.960%	\$201,200	30	\$0	\$0	Si	\$894,800
194	CC	1088283873	PARADA VALENCIA PAOLA ANDREA														230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
195	CC	1088271895	PARRA HERNANDEZ ANDRES FELIPE														230301	26	\$1,646,667	\$263,500	EPS010	26	\$1,646,667	\$65,900	CCF44	26	\$1,646,667	\$65,900	14-23	26	\$1,646,667	6.960%	\$114,700	26	\$0	\$0	Si	\$510,000
196	CC	1088271895	PARRA HERNANDEZ ANDRES FELIPE								X						230301	4	\$233,454	\$37,400	EPS010	4	\$233,454	\$9,400	CCF44	4	\$233,454	\$9,400	14-23	4	\$233,454	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$56,200
197	CC	9730309	PAVA ECHEVERRI HECTOR JULIAN					X	X								25-14	30	\$2,029,800	\$324,800	EPS005	30	\$2,029,800	\$81,200	CCF44	30	\$2,029,800	\$81,200	14-23	30	\$2,029,800	6.960%	\$141,300	30	\$0	\$0	Si	\$628,500
198	CC	1004801559	PELAEZ SUAZA JUAN DANIEL							X							230301	30	\$3,849,432	\$616,000	EPS002	30	\$3,849,432	\$154,000	CCF44	30	\$3,849,432	\$154,000	14-23	30	\$3,849,432	6.960%	\$268,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,192,000
199	CC	31097064	PEÑA CORRALES BELKIS					X	X								25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF44	30	\$2,600,000	\$104,000	14-23	30	\$2,600,000	6.960%	\$181,000	30	\$0	\$0	Si	\$805,000
200	CC	1225090270	PEÑA OSORIO VANESSA	X													230301	2	\$333,334	\$53,400	EPS018	2	\$333,334	\$13,400	CCF44	2	\$333,334	\$13,400	14-23	2	\$333,334	6.960%	\$23,300	2	\$0	\$0	Si	\$103,500
201	CC	1075234044	PERDOMO NASLY YULIETH														230201	30	\$7,000,000	\$1,120,000	EPS010	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF44	30	\$7,000,000	\$280,000	14-23	30	\$7,000,000	6.960%	\$487,200	30	\$0	\$0	Si	\$2,167,200
202	CC	1007214038	PEREA ESCOBAR YEFERSON DAVID							X							230201	30	\$3,946,700	\$631,500	EPS002	30	\$3,946,700	\$157,900	CCF44	30	\$3,946,700	\$157,900	14-23	30	\$3,946,700	6.960%	\$274,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,222,000
203	CC	3513263	PEREZ FRANCISCO JAVIER							X							25-14	28	\$2,810,070	\$449,700	EPS037	28	\$2,810,070	\$112,500	CCF44	28	\$2,810,070	\$112,500	14-23	28	\$2,810,070	6.960%	\$195,600	28	\$0	\$0	Si	\$870,300
204	CC	3513263	PEREZ FRANCISCO JAVIER							X							25-14	2	\$116,727	\$14,100	EPS037	2	\$116,727	\$0	CCF44	2	\$116,727	\$0	14-23	2	\$116,727	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$14,100
205	CC	1039884863	PINO VASQUEZ EDISON DE JESUS							X							230201	29	\$2,733,137	\$437,400	EPS002	29	\$2,733,137	\$109,400	CCF44	29	\$2,733,137	\$109,400	14-23	29	\$2,733,137	6.960%	\$190,300	29	\$0	\$0	Si	\$846,500
206	CC	1039884863	PINO VASQUEZ EDISON DE JESUS								X						230201	1	\$58,364	\$7,100	EPS002	1	\$58,364	\$0	CCF44	1	\$58,364	\$0	14-23	1	\$58,364	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,100
207	CC	24694027	PINO RESTREPO VALNERY ALEJANDRA														25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF44	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800
208	CC	1005933105	PINZON CARDENAS KEVIN ANDRES	X													230301	9	\$525,272	\$84,100	EPS002	9	\$525,272	\$21,100	CCF44	9	\$525,272	\$21,100	14-23	9	\$525,272	6.960%	\$36,600	9	\$0	\$0	Si	\$162,900
209	CC	1006087124	POLANCO LOZANO ROBINSON							X							230301	30	\$2,379,639	\$380,800	EPS002	30	\$2,379,639	\$95,200	CCF44	30	\$2,379,639	\$95,200	14-23	30	\$2,379,639	6.960%	\$165,700	30	\$0	\$0	Si	\$736,900
210	CC	93402803	POLOCHE ANDRADE FREDY							X							230301	30	\$3,135,000	\$501,600	EPS002	30	\$3,135,000	\$125,400	CCF44	30	\$3,135,000	\$125,400	14-23	30	\$3,135,000	6.960%	\$218,200	30	\$0	\$0	Si	\$970,600
211	CC	10193535	PRADA VALENCIA VICTOR JAVIER							X							25-14	30	\$2,631,132	\$421,000	EPS018	30	\$2,631,132	\$105,300	CCF44	30	\$2,631,132	\$105,300	14-23	30	\$2,631,132	6.960%	\$183,200	30	\$0	\$0	Si	\$814,800
212	CC	10128861	PUERTA NARANJO LUIS ERNEY	X						X						X	25-14	1	\$177,744	\$28,500	ESSC62	1	\$177,744	\$7,200	CCF44	1	\$231,244	\$9,300	14-23	1	\$177,744	6.960%	\$12,400	1	\$0	\$0	Si	\$57,400
213	CC	1094911005	PUNI DIAZ JHONATHAN ANDRES	X	X					X						X	230201	12	\$1,200,341	\$192,100	EPS010	12	\$1,200,341	\$48,100	CCF44	12	\$1,235,341	\$49,500	14-23	12	\$1,200,341	6.960%	\$83,600	12	\$0	\$0	Si	\$373,300
214	CC	18533385	QUINTERO SANCHEZ HECTOR FABIO							X							230301	30	\$4,352,727	\$696,500	EPS037	30	\$4,352,727	\$174,200	CCF44	30	\$4,352,727	\$174,200	14-23	30	\$4,352,727	6.960%	\$303,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,347,900
215	CC	42164757	QUINTERO POSADA OLGA LUCIA														25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
216	CC	74302159	QUIROGA ESPEJO HERNANDO ABREY							X							25-14	30	\$2,719,475	\$435,200	ESSC24	30	\$2,719,475	\$108,800	CCF44	30	\$2,719,475	\$108,800	14-23	30	\$2,719,475	6.960%	\$189,300	30	\$0	\$0	Si	\$842,100
217	CC	1097664394	QUIROGA MENJURA STIVEN ALEXANDER							X							230301	30	\$1,890,182	\$302,500	ESSC24	30	\$1,890,182	\$75,700	CCF44	30	\$1,890,182	\$75,700	14-23	30	\$1,890,182	6.960%	\$131,600	30	\$0	\$0	Si	\$585,500
218	CC	5913861	RAMIREZ GONZALO							X							230201	30	\$2,073,231	\$331,800	EPS002	30	\$2,073,231	\$83,000	CCF44	30	\$2,073,231	\$83,000	14-23	30	\$2,073,231	6.960%	\$144,300	30	\$0	\$0	Si	\$642,100
219	CC	18600613	RAMIREZ GUAPACHA JAIRO ALONSO							X							25-14	30	\$4,290,910	\$686,600	EPS037	30	\$4,290,910	\$171,700	CCF44	30	\$4,290,910	\$171,700	14-23	30	\$4,290,910	6.960%	\$298,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,328,700
220	CC	1114151397	RAMIREZ MENA JUAN DIEGO							X							230301	30	\$2,290,105	\$366,500	EPS041	30	\$2,290,105	\$91,700	CCF44	30	\$2,290,105	\$91,700	14-23	30	\$2,290,105	6.960%	\$159,400	30	\$0	\$0	Si	\$709,300
221	CC	1078178390	RENTERIA MOSQUERA MANUEL DE JESUS							X							230301	30	\$2,355,763	\$377,000	EPS002	30	\$2,355,763	\$94,300	CCF44	30	\$2,355,763	\$94,300	14-23	30	\$2,355,763	6.960%	\$164,000	30	\$0	\$0	Si	\$729,600
222	CC	1087554163	RESTREPO ACOSTA JULIAN ANDRES							X							230201	30	\$2,575,772	\$412,200	EPS002	30	\$2,575,772	\$103,100	CCF44	30	\$2,575,772	\$103,100	14-23	30	\$2,575,772	6.960%	\$179,300	30	\$0	\$0	Si	\$797,700
223	CC	1087549842	RIOS MENESES VICTOR HUGO							X							230301	25	\$2,847,666	\$455,700	EPS037	25	\$2,847,666	\$114,000	CCF44	25	\$2,847,666	\$114,000	14-23	25	\$2,847,666	6.960%	\$198,200	25	\$0	\$0	Si	\$881,900
224	CC	1087549842	RIOS MENESES VICTOR HUGO										L				230301	5	\$390,067	\$62,500	EPS037	5	\$390,067	\$15,700	CCF44	5	\$390,067	\$15,700	14-23	5	\$390,067	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$93,900
225	CC	1088314834	RIVERA GRISALES JHONATAN ALBERTO							X							230301	30	\$2,434,000	\$389,500	EPS037	30	\$2,434,000	\$97,400	CCF44	30	\$2,434,000	\$97,400	14-23	30	\$2,434,000	6.960%	\$169,500	30	\$0	\$0	Si	\$753,800

Página 8 de 10

Página 9 de 10

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				224	\$98,045,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$3,954,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	45	\$20,346,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	119	\$51,691,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$22,053,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				229	\$42,141,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	229	\$42,141,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				226	\$24,683,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	226	\$24,683,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				232	\$25,920,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$400,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$307,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$73,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$804,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$85,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	\$3,804,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$222,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	37	\$4,139,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$486,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	16	\$1,665,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	107	\$11,167,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,763,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$57,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$38,000
TOTAL				232	\$190,885,800

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.291.689**

GARCIA HENAO REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS

JUAN SEBASTIAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20 JUN-1991**

SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

19-AGO-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00384679-M-1088291689-20120628 0030349692A 1 4541903449

Certificado Bancario

Martes, 14 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS identificado(a) con NIT 900188750, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	72319445911	2014/02/04	ACTIVA
CUENTA CORRIENTE	11500001683	2021/06/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.




Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141192345696			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900188750		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	
				14. Buzón electrónico 16	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.		36. Nombre comercial	
				37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Risaralda		40. Ciudad/Municipio Santuario	
41. Dirección principal VDA PLAYA RICA		42. Correo electrónico facturacion@agreoccidente.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 6063114271		45. Teléfono 2 3128905408			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4663		47. Fecha inicio actividad 20071130		48. Código 0811	
49. Fecha inicio actividad 20071130		50. Código 1 4290		51. Código	
52. Número establecimientos 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 579101442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 2223			55. Forma 3		
56. Tipo 3			Servicio 1 2 3		
57. Modo 4			58. CPC 82		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2025-07-21 / 10:34:12AM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre GARCIA HENAO JUAN SEBASTIAN			985. Cargo Representante legal Certificado		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141192345696



(415)7707212489984(8020) 000014119234569 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 8 7 5 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 2
73. Fecha	2 0 0 7, 1 1, 3 0	2 0 2 1, 1 1, 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7, 1 1, 3 0	2 0 2 1, 1 1, 0 5
77. No. Matrícula mercantil	1 5 9 0 8 8 1 2	1 5 9 0 8 8 1 2
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia	
80. Desde	2 0 0 7, 1 1, 3 0
81. Hasta	2 0 1 9, 1 1, 2 5

2 0 2 1, 1 1, 0 5

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4, 1 2, 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141192345696



(415)7707212489984(8020) 000014119234569 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 8 7 5 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 3 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 8 8 2 9 1 6 8 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido HENAO	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres SEBASTIAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 3 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 9 5 5 7 4 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido OSORIO	106. Primer nombre WALTER
107. Otros nombres DE JESUS	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141192345696



(415)7707212489984(8020) 000014119234569 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 8 7 5 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

125. Número de identificación

1 0 5 3 8 2 9 3 9 4

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

1

2 5 4 0 6 6 T

128. Primer apellido

QUINTERO

129. Segundo apellido

RAMIREZ

130. Primer nombre

LUISA

131. Otros nombres

FERNANDA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 0 2 6 3 0

133. DV

1

134. Sociedad o firma designada

HT ASESORES - AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S

135. Fecha de nombramiento

2 0 2 3 1 0 1 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

137. Número de identificación

7 5 1 4 3 6 3 6

138. DV

0

139. Número de tarjeta profesional

6 9 2 2 4 T

140. Primer apellido

TABARES

141. Segundo apellido

CARMONA

142. Primer nombre

HUGO

143. Otros nombres

ALBERTO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 0 2 6 3 0

145. DV

1

146. Sociedad o firma designada

HT ASESORES - AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S

147. Fecha de nombramiento

2 0 2 3 1 0 1 0

Contador

148. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

149. Número de identificación

1 0 8 8 0 0 2 8 9 2

150. DV

3

151. Número de tarjeta profesional

1 9 0 4 9 2 T

152. Primer apellido

MARIN

153. Segundo apellido

HURTADO

154. Primer nombre

LINA

155. Otros nombres

MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)


157. DV

1

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 1 7 0 6 0 1

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141192345696			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119234569 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira		14. Buzón electrónico		
					1 6		
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Centro de explotación miner 0 5							
161. Actividad económica Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0 8 1 1							
162. Nombre del establecimiento AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA							
163. Departamento Risaralda 6 6				164. Ciudad/Municipio Santuario 6 8 7			
165. Dirección KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA							
166. Número de matrícula mercantil 1 5 9 0 8 8 1 2				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 1 1 3 0			
168. Teléfono 6 0 6 3 1 1 4 2 7 1				169. Fecha de cierre			
2							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
3							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
