

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU.**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 1622-2025

**INFORME MENSUAL CONTRATO DE OBRA
N.º 1622-2025**

PERIODO: DEL 16 de mayo 2026 al 15 de junio 2026

Contratista: CORSEING SAS

**OBJETO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA**



	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y ÁREA DE INTERVENCIÓN .	7
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	7
1.1.1 Datos generales del contratista	7
1.1.2 Datos generales de la interventoría	8
1.1.3 Datos generales del contratante	8
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	8
1.3 ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN	9
1.4 ENFOQUE TÉCNICO DE EJECUCIÓN.....	9
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES.....	11
2.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR SEMANAS.....	11
2.1.1 Semana 14 (18 de mayo al 24 de mayo de 2026)	11
2.1.2 Semana 15 (25 de mayo al 31 de mayo de 2026)	12
2.1.3 Semana 16 (1 de junio al 7 de junio de 2026)	13
2.1.4 Semana 17 (8 de junio al 14 de junio de 2026)	14
2.2 CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	15
2.2.1 Componente técnico y operativo	15
2.2.2 Componente de Plan de manejo de tránsito	16
2.2.3 Componente ambiental y social	16
2.2.4 Componente de seguridad y salud en el trabajo	16
3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	17
3.1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.....	18



	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

3.2 CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y DE CALIDAD	18
3.3 CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTAL.....	19
3.4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.....	19
3.6 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	21
3.7 CUMPLIMIENTO SOCIAL	21
3.8 CUMPLIMIENTO SST (MEJORADO CON PASAO).....	22
3.9 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	23
3.10 CUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS.	23
3.11 CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO.....	24
4. ESTADO DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN	25
4.1 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	25
4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL CONTRATISTA.....	26
4.3 INVERSIÓN DE OBRA PROGRAMADA.....	28
4.4 INVERSIÓN DE OBRA EJECUTADA	29
4.5 CANTIDADES EJECUTADAS	30
5. RECURSOS DEL CONTRATO	32
5.1 MAQUINARIA Y EQUIPO	32
6. COMPONENTE FINANCIERO	34
6.1 ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	34
7. ANEXOS	36
7.1 ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	36
7.2 ANEXO 2 – BITÁCORA DE OBRA	36





**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

**INFORME MENSUAL No. 4.
16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026**

7.3	ANEXO 3 – PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	37
7.4	ANEXO 4 – INFORMES SEMANALES	37
7.5	ANEXO 5 - LISTAS DE ASISTENCIA CHARLAS SST	37
7.6	ANEXO 6 – CERTIFICADOS DE EQUIPOS.....	37
7.7	ANEXO 7 – CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES	37
8.	CONCLUSIONES	38

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 1622-2025, suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y CORSEING S.A.S., cuyo objeto consiste en la adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura ubicada en el departamento de Cundinamarca, se presenta el Informe Mensual No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026, elaborado en cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el seguimiento, control y reporte de la ejecución del contrato.

Durante el periodo objeto del presente informe se consolidó la transición entre las actividades de planeación y gestión adelantadas en los meses anteriores y el inicio de la ejecución de las actividades constructivas, una vez obtenidas las autorizaciones requeridas para la intervención de los tramos viales priorizados. En este contexto, se dio inicio a la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados y a la ejecución de las actividades de adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura en los tramos viales Mosquera – Funza y Funza – Tres Esquinas, conforme a la programación establecida.

Las actividades ejecutadas durante el periodo comprendieron, entre otras, la instalación de la señalización temporal y adecuación de los frentes de trabajo, el retiro de dispositivos existentes que interferían con la nueva demarcación, la limpieza y preparación de las superficies, la aplicación de imprimante, la ejecución de pintura y demarcación horizontal, así como las correspondientes actividades de inspección, control de calidad y apertura progresiva de los sectores intervenidos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de seguridad requeridas para la adecuada ejecución del proyecto.





**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

**INFORME MENSUAL No. 4.
16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026**

De manera complementaria, se desarrollaron las actividades correspondientes a los componentes ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), mediante la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socioambiental (PASAO), la actualización de actas de vecindad, el seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en los frentes de trabajo, la realización de inspecciones, charlas de seguridad y el control de los riesgos asociados a la ejecución de actividades sobre tramos viales con circulación permanente de usuarios.

Así mismo, durante el periodo se presentaron situaciones operativas asociadas principalmente a condiciones climáticas adversas y a la indisponibilidad temporal de uno de los equipos de demarcación, las cuales fueron atendidas mediante la reprogramación de actividades, la implementación de jornadas nocturnas y de madrugada y la optimización de los frentes de trabajo, permitiendo mantener la continuidad de la ejecución y avanzar conforme a los objetivos previstos para el periodo reportado.

El presente informe consolida el avance físico, técnico, administrativo, ambiental, social y financiero alcanzado durante el periodo evaluado, así como las principales actividades ejecutadas, las cantidades de obra desarrolladas, el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el estado general de la ejecución del proyecto, constituyéndose en el soporte documental del desarrollo del contrato ante la interventoría y la entidad contratante.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y ÁREA DE INTERVENCIÓN

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En cumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 1622-2025, se suscribió el Acta de Inicio No. 1 el día 14 de febrero de 2026, mediante la cual se dio inicio formal a la ejecución del proyecto cuyo objeto corresponde a la adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura ubicada en el departamento de Cundinamarca. En dicha acta se dejó constancia del cumplimiento de los requisitos previos para el inicio del contrato, incluyendo la verificación de las condiciones técnicas, administrativas y financieras, así como la designación del equipo de trabajo y la disponibilidad de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. A partir de la suscripción del acta de inicio, se habilitó la ejecución de las actividades contractuales conforme al plazo establecido y bajo la supervisión de la interventoría designada.

1.1.1 Datos generales del contratista

CONTRATISTA:	CORSEING SAS – NIT 900.278.384-1
OBJETO DEL CONTRATO:	“DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCUTURA DE TRANSPORTE, PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
DIRECTOR DEL CONTRATO:	NELSON DANIEL ORDUZ

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$2.909.090.910
NÚMERO DEL CONTRATO	ICCU-LP-078-2025
RAZON SOCIAL:	CORSEING SAS
NIT	900.278.384-1

1.1.2 Datos generales de la interventoría

RAZON SOCIAL:	CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU-79
NIT	902019920-7
DIRECCIÓN	Carrera 78 N° 17 -57
TELEFONO	(601)6336106
E-MAIL	projecktalda@outlook.com

1.1.3 Datos generales del contratante

RAZON SOCIAL:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
NIT:	900258711
DIRECCIÓN:	Calle 26# 51 – 53
SUPERVISOR:	DANIEL ALVEAR
TELEFONO	NA
E-MAIL	daniel.alvear@cundinamarca.gov.co contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Obra Pública No. 1622-2025 se desarrolla en el departamento de Cundinamarca, en tramos viales estratégicos destinados a la movilidad activa, los cuales hacen parte de la red de cicloinfraestructura priorizada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

El área de intervención definida por el ICCU comprende tramos ubicados en los municipios de Cajicá, Chía, Funza, Mosquera, Bojacá y Madrid, los cuales presentan conectividad entre zonas urbanas y rurales, soportando dinámicas de movilidad asociadas a actividades residenciales, productivas y de servicios.

1.3 ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

El contrato tiene como alcance la ejecución de actividades orientadas a la adecuación, mantenimiento y mejoramiento funcional de la cicloinfraestructura existente, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante.

Las intervenciones contemplan, entre otras, las siguientes actividades:

- Recuperación de la superficie de rodadura mediante bacheo y parcheo
- Limpieza y mantenimiento general de la infraestructura
- Implementación y reposición de señalización horizontal y vertical
- Instalación de dispositivos de seguridad vial
- Mejoramiento de condiciones de drenaje superficial de los tramos El Corzo-Bojacá, Mosquera - Funza, Funza- Tres esquinas y Madrid

1.4 ENFOQUE TÉCNICO DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato se desarrolla mediante un enfoque técnico progresivo que integra las fases de diagnóstico, diseño e implementación de las intervenciones requeridas para la adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura.

Una vez culminada la fase de diagnóstico y definidos los diseños técnicos, durante el período objeto del presente informe las actividades estuvieron enfocadas en la

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

implementación de la señalización horizontal y la adecuación de la infraestructura, de conformidad con los diseños aprobados, las especificaciones técnicas del contrato, el Manual de Señalización Vial vigente y los respectivos Planes de Manejo de Tránsito (PMT).

La ejecución de las actividades se desarrolló mediante frentes de trabajo programados, permitiendo una intervención progresiva de los tramos viales y garantizando la seguridad de los usuarios mediante la implementación permanente del PMT, cerramientos móviles, dispositivos de canalización y señalización temporal.

Las actividades ejecutadas comprendieron principalmente:

- Implementación de señalización horizontal mediante aplicación de imprimante y pintura.
- Ejecución de líneas longitudinales, pictogramas, cebras, flechas y demás marcas viales de acuerdo con los diseños aprobados.
- Adecuación de la infraestructura mediante retiro de hitos, tachas reflectivas, bordillos y demás elementos que interferían con la nueva configuración de la cicloinfraestructura.
- Limpieza y preparación de las superficies de intervención para garantizar la adecuada adherencia y durabilidad de los materiales aplicados.
- Control permanente de calidad, seguimiento técnico y verificación de las actividades ejecutadas conforme a las especificaciones del proyecto.

Este enfoque permitió desarrollar las actividades de manera organizada, optimizando los rendimientos de obra, minimizando las afectaciones a la movilidad y garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad vial y de calidad establecidos contractualmente.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026 se desarrollaron actividades correspondientes al inicio de la fase constructiva del Contrato de Obra Pública No. 1622-2025, una vez obtenidas las autorizaciones requeridas para la intervención de los tramos viales priorizados. Las labores ejecutadas estuvieron orientadas a la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), la adecuación de los frentes de trabajo y la ejecución de actividades de mantenimiento de la cicloinfraestructura, incluyendo limpieza y preparación de superficies, aplicación de imprimante, pintura y demarcación horizontal, así como las actividades de control de calidad, seguimiento ambiental, gestión social y Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación, se presenta el detalle de las actividades desarrolladas durante cada una de las semanas del periodo reportado.

2.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR SEMANAS

2.1.1 Semana 14 (18 de mayo al 24 de mayo de 2026)

Durante la semana 14 se desarrollaron actividades correspondientes al componente socioambiental y de planeación para el inicio de la fase de implementación del proyecto.

Como parte de estas actividades se realizó la actualización de las actas de fachada en los tramos viales Mosquera – Funza y Mosquera – Biblioteca, mediante recorridos de verificación en campo, registro fotográfico e identificación de predios, establecimientos comerciales y demás elementos presentes dentro del área de influencia directa de las intervenciones.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

De igual manera, se efectuó la actualización del Plan de Manejo Socioambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (PASAO), incorporando los ajustes requeridos para armonizar el documento con las condiciones reales de ejecución del proyecto, los frentes de trabajo definidos y la programación establecida para el inicio de las actividades de obra.

Finalmente, se realizó el alistamiento y organización de la señalización temporal, dispositivos de canalización y demás elementos requeridos para la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para el inicio de la fase de implementación.

2.1.2 Semana 15 (25 de mayo al 31 de mayo de 2026)

Durante la semana 15 se dio inicio a la fase de implementación de la señalización horizontal en el corredor Mosquera – Funza.

Las actividades comenzaron con la instalación diaria del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) mediante cerramiento móvil, señalización temporal y dispositivos de canalización, permitiendo el desarrollo seguro de las labores. Como actividades preliminares se ejecutó el retiro de hitos flexibles, bordillos y tachas reflectivas existentes que interferían con la nueva configuración de la cicloinfraestructura.

Posteriormente se desarrollaron actividades de preparación de superficie, aplicación de imprimante, aplicación de pintura azul, demarcación horizontal y ejecución de símbolos y demás marcas viales contempladas en los diseños aprobados para el proyecto.

El día 29 de mayo de 2026 se presentaron precipitaciones que afectaron parcialmente el desarrollo de las actividades programadas. Con el fin de recuperar

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

los rendimientos previstos y minimizar las afectaciones a la movilidad, el 30 de mayo se ejecutaron actividades en jornada nocturna y el 31 de mayo se desarrollaron trabajos en horario de madrugada.

2.1.3 Semana 16 (1 de junio al 7 de junio de 2026)

Durante la semana 16 continuaron las actividades de implementación de señalización horizontal y adecuación de la infraestructura en los tramos viales Mosquera – Funza y Funza – Tres Esquinas.

El 1 de junio de 2026 se dio apertura al nuevo frente de trabajo correspondiente al corredor Funza – Tres Esquinas, iniciando desde el sector del Club San Andrés conforme a la programación establecida.

En el corredor Mosquera – Funza se dio continuidad a las actividades iniciadas durante la semana anterior; sin embargo, el 2 de junio se presentó una falla mecánica en el equipo de demarcación, situación que impidió ejecutar las actividades programadas durante esa jornada.

Durante los días 3 y 4 de junio continuaron las labores en ambos frentes de trabajo. Posteriormente, el 5 de junio, luego del mejoramiento de las condiciones climáticas, se dio inicio a las actividades en el corredor Funza – Tres Esquinas desde el sector Tres Esquinas, ejecutando inicialmente labores de limpieza y retiro de vegetación para adecuar la infraestructura antes de la implementación de la señalización horizontal.

Con el propósito de recuperar el tiempo afectado por la falla mecánica y las precipitaciones registradas durante la semana, el 6 de junio se desarrollaron

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

actividades en horario nocturno en el corredor Mosquera – Funza y el 7 de junio se ejecutaron labores en horario de madrugada sobre el mismo corredor.

Todas las actividades fueron desarrolladas bajo las condiciones establecidas en los Planes de Manejo de Tránsito aprobados, implementando la señalización temporal y las medidas de seguridad requeridas para la protección de los usuarios y del personal de obra.

2.1.4 Semana 17 (8 de junio al 14 de junio de 2026)

Durante la semana 17 continuaron las actividades de implementación de señalización horizontal y adecuación de la infraestructura en los tramos viales Mosquera – Funza y Funza – Tres Esquinas, de conformidad con la programación establecida para la ejecución del contrato.

En el corredor Mosquera – Funza, durante los días 10, 11 y 12 de junio, se desarrollaron actividades de preparación de superficie, aplicación de imprimante, pintura y demarcación horizontal, así como el retiro de hitos existentes requeridos para la adecuación de la infraestructura.

De igual manera, durante los días 11 y 12 de junio se dio continuidad a las actividades en el corredor Funza – Tres Esquinas, ejecutando la preparación de superficie, aplicación de imprimante, pintura y demarcación horizontal conforme a la programación de obra.

El 13 de junio de 2026 se presentaron precipitaciones durante la jornada, condición climática que obligó a suspender las actividades programadas en ambos frentes de trabajo debido a que la humedad de la superficie no permitía garantizar las

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

condiciones técnicas necesarias para la aplicación de los materiales de demarcación horizontal.

Durante todo el período se mantuvo la implementación del Plan de Manejo de Tránsito mediante cerramientos móviles, señalización temporal y dispositivos de canalización, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía y del personal vinculado a la ejecución del proyecto.

2.2 CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026 se consolidó el inicio de la fase constructiva del proyecto, desarrollando actividades orientadas a la adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura en los tramos viales priorizados, conforme a la programación establecida y a los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados. Las actividades ejecutadas durante el periodo se agrupan de la siguiente manera:

2.2.1 Componente técnico y operativo

- Implementación de frentes de trabajo.
- Instalación y mantenimiento de señalización temporal.
- Limpieza y preparación de superficies.
- Retiro de elementos existentes que interferían con la nueva demarcación.
- Aplicación de imprimante.
- Ejecución de pintura y demarcación horizontal.
- Inspección y control de calidad de las actividades ejecutadas.
- Registro fotográfico y consolidación de cantidades de obra.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

2.2.2 Componente de Plan de manejo de tránsito

- Implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados.
- Delimitación y protección de las áreas de intervención.
- Control de la movilidad durante la ejecución de las actividades.
- Verificación permanente de la señalización temporal instalada.

2.2.3 Componente ambiental y social

- Seguimiento a las medidas establecidas en el PASAO.
- Actualización y levantamiento de actas de vecindad.
- Manejo y disposición adecuada de los residuos generados.
- Inspecciones ambientales en los frentes de trabajo.
- Seguimiento a las condiciones del área de influencia del proyecto.

2.2.4 Componente de seguridad y salud en el trabajo

- Charlas diarias de seguridad.
- Inspecciones de seguridad en los frentes de obra.
- Seguimiento al uso de elementos de protección personal.
- Identificación y control de riesgos asociados a las actividades ejecutadas.
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SG-SST.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En cumplimiento de lo establecido en las Cláusulas Novena (Obligaciones Generales) y Décima (Obligaciones Específicas) del Contrato de Obra Pública No. 1622-2025, durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026 el contratista ejecutó las actividades necesarias para el desarrollo del objeto contractual, dando inicio a la fase constructiva del proyecto mediante la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados y la ejecución de las primeras actividades de adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura.

Las actividades desarrolladas durante el periodo comprendieron la adecuación de los frentes de trabajo, implementación de señalización temporal, limpieza y preparación de superficies, aplicación de imprimante, ejecución de pintura y demarcación horizontal, inspecciones de control de calidad, seguimiento ambiental, gestión social y desarrollo de las acciones correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales, administrativas y contractuales establecidas para el proyecto.

De igual manera, se mantuvo el seguimiento permanente por parte de la dirección del proyecto y de la interventoría, efectuando la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de las actividades ejecutadas, el avance físico de la obra y la implementación de las medidas definidas para el manejo de los riesgos operacionales asociados a la ejecución de las actividades sobre los tramos viales intervenidos.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

3.1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026, el contratista dio cumplimiento al objeto del Contrato de Obra Pública No. 1622-2025 mediante la ejecución de las actividades correspondientes al inicio de la fase constructiva del proyecto, desarrollando labores de adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura en los tramos viales priorizados, conforme a la programación establecida y a las especificaciones técnicas del contrato.

Las principales actividades ejecutadas durante el periodo fueron:

- Implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT).
- Adecuación y señalización de los frentes de trabajo.
- Limpieza y preparación de superficies.
- Aplicación de imprimante.
- Ejecución de pintura y demarcación horizontal.
- Inspección y control de calidad de las actividades ejecutadas.
- Consolidación de registros técnicos y fotográficos como soporte de la ejecución.

3.2 CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y DE CALIDAD

Las actividades ejecutadas durante el periodo se desarrollaron de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales y bajo el seguimiento permanente del personal técnico del proyecto. En este sentido:

- Se verificó la adecuada preparación de las superficies previo a la aplicación de imprimante y pintura.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

- Se realizó control de calidad durante la ejecución de la demarcación horizontal, verificando uniformidad, cobertura y adherencia de los materiales.
- Se efectuó seguimiento a los tiempos de secado y habilitación de las áreas intervenidas.
- Se realizaron inspecciones técnicas permanentes para verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas para el proyecto.

3.3 CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTAL

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones administrativas mediante la generación, organización y presentación oportuna de los documentos requeridos para el seguimiento del contrato, entre los cuales se destacan:

- Informes semanales de avance
- Registro fotográfico georreferenciado
- Bitácora de obra debidamente diligenciada
- Soportes técnicos de actividades ejecutadas
- Atención oportuna a requerimientos de la interventoría

Lo anterior garantiza la trazabilidad de la ejecución contractual y permite el adecuado control por parte de la interventoría y la entidad contratante.

3.4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el mes reportado, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la vinculación y protección del personal, evidenciando:

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

- Afiliación del personal al Sistema de Seguridad Social Integral
- Pago oportuno de aportes a salud, pensión y riesgos laborales
- Disponibilidad de soportes documentales correspondientes

Estas acciones garantizan el cumplimiento de la normatividad vigente y de las obligaciones contractuales en materia laboral, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

3.5 CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Durante el desarrollo de las actividades en campo, el contratista implementó medidas básicas de seguridad para la ejecución de actividades, tales como:

- Control de riesgos asociados a la operación en vía
- Inspección de condiciones de seguridad en el frente de trabajo.
- Socialización de riesgos asociados a actividades de pintura y limpieza.
- Seguimiento al uso adecuado de EPP por parte de los trabajadores.
- Identificación y control de actos y condiciones inseguras.
- Orden y aseo permanente en las áreas intervenidas.
- Plan de emergencias y atención de contingencias aplicable al frente de obra.

Lo anterior permitió mitigar riesgos asociados a la interacción con el tránsito vehicular y peatonal, garantizando condiciones seguras para el personal técnico.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

3.6 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

En cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato y en el Plan de Acción Socioambiental (PASAO), durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026 se implementaron las medidas de manejo ambiental requeridas para el desarrollo de las actividades constructivas, procurando prevenir, controlar y mitigar los impactos asociados a la ejecución de las obras. En este sentido:

- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el PASAO durante la ejecución de las actividades.
- Se efectuó el manejo y disposición adecuada de los residuos generados en los frentes de trabajo.
- Se mantuvo el orden y aseo permanente de las áreas intervenidas.
- Se realizaron inspecciones ambientales para verificar el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas para el proyecto.
- Se promovió el uso adecuado de los recursos y las buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades.

En este sentido, el contrato se encuentra en una etapa de impacto ambiental mínimo, en la cual se ha dado cumplimiento a las obligaciones de planificación ambiental, quedando pendiente la implementación de los programas definidos en el PASAO para la fase de ejecución de obra.

3.7 CUMPLIMIENTO SOCIAL

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para el componente social del contrato y de los lineamientos definidos en el Plan de Acción Socioambiental (PASAO), durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas a

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

garantizar una adecuada interacción con la comunidad y los actores presentes en las zonas de intervención.

En este sentido:

- Se realizó seguimiento a las condiciones sociales de los tramos viales intervenidos.
- Se adelantó el levantamiento y actualización de actas de vecindad en los sectores requeridos.
- Se brindó información a los usuarios y residentes sobre el desarrollo de las actividades mediante la implementación de la señalización correspondiente.
- Se atendieron las observaciones presentadas por la comunidad durante la ejecución de las actividades, cuando fue requerido.
- Se mantuvo coordinación permanente con la interventoría para el seguimiento del componente social del proyecto.

3.8 CUMPLIMIENTO SST (MEJORADO CON PASAO)

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de los lineamientos definidos en el Plan de Acción Socioambiental (PASAO), durante el periodo reportado se implementaron las medidas de prevención y control requeridas para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades constructivas.

En este sentido:

- Se realizaron charlas de seguridad previas al inicio de las actividades.
- Se verificó el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal de obra.
- Se efectuaron inspecciones periódicas a los frentes de trabajo para la identificación y control de riesgos.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

- Se verificó la implementación de la señalización preventiva y de las medidas de seguridad establecidas en los PMT.
- Durante el periodo reportado no se presentaron accidentes de trabajo que afectaran el desarrollo normal de las actividades.

3.9 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

Durante el periodo reportado se implementaron los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados para los tramos viales objeto de intervención, garantizando condiciones seguras para la ejecución de las actividades y minimizando las afectaciones a la movilidad de peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía. En este sentido:

- Se implementó la señalización temporal conforme a los PMT autorizados.
- Se realizó la delimitación y protección de los frentes de trabajo mediante dispositivos de control de tránsito.
- Se efectuó seguimiento permanente al estado de la señalización y a las condiciones de seguridad de las áreas intervenidas.
- Se realizaron ajustes operativos a la señalización temporal cuando las condiciones de la ejecución lo requirieron.
- Se dio cumplimiento a las medidas establecidas en los PMT durante el desarrollo de las actividades constructivas.

3.10 CUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026, el contratista dispuso del personal profesional, técnico, administrativo y operativo, así como de los equipos, herramientas y recursos necesarios para el desarrollo de las

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

actividades programadas, garantizando la continuidad de la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este sentido:

- Se contó con el personal requerido para la ejecución de las actividades programadas.
- Se dispuso de la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas.
- Se garantizó el suministro oportuno de los materiales requeridos para la ejecución de las obras.
- Se realizó seguimiento al estado y funcionamiento de los equipos utilizados en los frentes de trabajo.
- Los recursos dispuestos permitieron atender las actividades programadas durante el periodo reportado.

3.11 CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista presenta el informe mensual de avance de obra, el cual consolida la información técnica, administrativa, ambiental y operativa del mes evaluado. Este documento permite:

- Evidenciar el avance del contrato
- Soportar las actividades ejecutadas
- Facilitar el control por parte de la interventoría
- Garantizar la trazabilidad del proceso constructivo

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

4. ESTADO DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

4.1 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026, el Contrato de Obra Pública No. 1622-2025 presentó un avance importante en su ejecución, consolidando el paso de las actividades de planeación y gestión desarrolladas en los periodos anteriores hacia la fase constructiva del proyecto. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, se dio inicio a las intervenciones programadas en los tramos viales priorizados, permitiendo el desarrollo de las actividades contempladas dentro del objeto contractual.

En este periodo se ejecutaron actividades relacionadas con la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), la adecuación de los frentes de trabajo, la limpieza y preparación de superficies, la aplicación de imprimante, la pintura y demarcación horizontal, así como el seguimiento permanente a la calidad de las actividades ejecutadas y al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. De igual manera, se adelantaron las actividades correspondientes a los componentes ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el desarrollo integral de la ejecución contractual.

Durante la ejecución se presentaron algunas novedades operativas, principalmente asociadas a condiciones climáticas y a la indisponibilidad temporal de uno de los equipos de demarcación, situaciones que fueron atendidas mediante la reorganización de los frentes de trabajo, la reprogramación de actividades y la implementación de jornadas de trabajo en horarios de menor flujo vehicular, con el propósito de minimizar su incidencia sobre la programación general del contrato.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

En términos generales, el contrato mantuvo una ejecución acorde con la programación establecida, evidenciando una adecuada coordinación entre los componentes técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad, lo que permitió garantizar la continuidad de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo reportado.

4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para el siguiente periodo de ejecución, el contratista deberá:

- Dar continuidad a las actividades de adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura en los tramos viales priorizados, conforme a la programación aprobada.
- Continuar con la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados, garantizando el adecuado funcionamiento de la señalización temporal y las condiciones de seguridad requeridas para la ejecución de las actividades.
- Avanzar en la ejecución de las actividades de limpieza y preparación de superficies, aplicación de imprimante, pintura y demarcación horizontal, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato.
- Continuar con la instalación de la señalización vertical y demás dispositivos de seguridad vial contemplados dentro del alcance contractual, de acuerdo con la programación establecida.
- Fortalecer los frentes de trabajo con el fin de optimizar los rendimientos y garantizar el cumplimiento de la programación contractual.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

- Continuar con el seguimiento y control de calidad de las actividades ejecutadas, efectuando las verificaciones técnicas requeridas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.
- Mantener la ejecución de las actividades correspondientes a los componentes ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socioambiental (PASAO).
- Consolidar los registros técnicos, fotográficos, preactas de obra y demás soportes documentales requeridos para el seguimiento y control de la ejecución contractual.

Así mismo, teniendo en cuenta que durante el periodo reportado se dio inicio a la fase constructiva del proyecto mediante la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) y la ejecución de las primeras actividades de adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura, las actividades del siguiente periodo estarán enfocadas en la continuidad de la ejecución de las obras, el fortalecimiento de los frentes de trabajo y el cumplimiento de la programación establecida para los diferentes tramos viales objeto del contrato.

De manera complementaria, se continuará con la ejecución de las actividades asociadas a la señalización horizontal y vertical, reposición de elementos de segregación vial, adecuación de la superficie de rodadura y demás intervenciones contempladas dentro del alcance contractual, de conformidad con la programación aprobada y los lineamientos establecidos por la interventoría y la entidad contratante.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

4.3 INVERSIÓN DE OBRA PROGRAMADA

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de junio de 2026, correspondiente al Informe Mensual No. 4 del Contrato de Obra Pública No. ICCU-1622-2025, la inversión programada del contrato estuvo orientada principalmente a la ejecución de las actividades correspondientes al inicio de la fase constructiva del proyecto, alcanzando una programación financiera acumulada del 43,14 % respecto al valor total del contrato.

Las actividades ejecutadas durante el periodo comprendieron la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados, la adecuación de los frentes de trabajo, las actividades de limpieza y preparación de superficies, la aplicación de imprimante, la ejecución de pintura y demarcación horizontal, así como el desarrollo de las actividades de seguimiento técnico, control de calidad, gestión ambiental, gestión social y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, la inversión ejecutada durante el periodo contempló los recursos técnicos, operativos y administrativos asociados al personal profesional y operativo, maquinaria y equipos especializados para demarcación, vehículos de apoyo, materiales de obra, señalización temporal, implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) y demás recursos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas programadas.

Con corte al 15 de junio de 2026, el contrato registra un avance físico acumulado ejecutado del 44,99 %, equivalente a una inversión acumulada de MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$1.309.046.810), frente a un avance programado del 43,14 %, correspondiente a una inversión programada acumulada de MIL DOSCIENTOS

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.255.000.000), lo que representa un adelanto del 1,85 % respecto a la programación establecida.

De igual manera, durante el periodo se efectuó la amortización del anticipo por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$261.809.362), de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y en correspondencia con el avance de las actividades ejecutadas.

Se prevé que para el siguiente periodo contractual la inversión continúe concentrándose en la ejecución de las actividades de mantenimiento y adecuación de la cicloinfraestructura, incluyendo la continuidad de la señalización horizontal y vertical, la instalación de elementos de segregación vial, la intervención de nuevos tramos viales priorizados y el fortalecimiento de los frentes de trabajo, con el propósito de mantener el cumplimiento de la programación contractual y consolidar el avance físico y financiero del proyecto.

4.4 INVERSIÓN DE OBRA EJECUTADA

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de junio de 2026, la inversión de obra ejecutada estuvo orientada al desarrollo de las actividades correspondientes a la fase constructiva del proyecto, conforme a la programación aprobada y al avance de las intervenciones en los tramos viales priorizados.

Con corte al 15 de junio de 2026, el valor acumulado de obra ejecutada asciende a MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$1.309.046.810), equivalente a un avance acumulado del 44,99 % del valor contractual, superando la inversión programada para el periodo,

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

la cual correspondía al 43,14 %, equivalente a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.255.000.000).

El comportamiento de la inversión refleja el cumplimiento de la programación financiera establecida para el contrato, registrando un adelanto del 1,85 % respecto a la línea base de ejecución. Así mismo, durante el periodo se efectuó la amortización del anticipo por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$261.809.362), de conformidad con las condiciones contractuales y el avance de las actividades ejecutadas.

La inversión ejecutada durante el periodo comprende los costos asociados al personal profesional, técnico, administrativo y operativo, suministro de materiales, maquinaria y equipos especializados, implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), ejecución de las actividades de señalización horizontal y demás recursos requeridos para el desarrollo de las obras, evidenciando una adecuada correspondencia entre el avance físico y el avance financiero del contrato.

4.5 CANTIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de junio de 2026 se ejecutaron las cantidades de obra correspondientes a las actividades programadas para la fase constructiva del Contrato de Obra Pública No. ICCU-1622-2025, conforme a las especificaciones técnicas, la programación aprobada y las instrucciones impartidas por la interventoría.

Las cantidades ejecutadas corresponden principalmente a las actividades de implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), preparación de los frentes de trabajo, limpieza y adecuación de superficies, aplicación de imprimante,



**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

**INFORME MENSUAL No. 4.
16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026**

ejecución de señalización horizontal y demás actividades contempladas dentro del alcance contractual, las cuales se encuentran debidamente soportadas mediante los registros de obra, preactas, controles de calidad y demás documentos técnicos que hacen parte del expediente contractual. Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo se presentan a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad ejecutada
1	Aplicación de imprimante	m ²	5.251,10
2	Aplicación de pintura	m ²	5.050,90
3	Demarcación horizontal	ml	13.190,80
4	Limpieza de zona verde	m ²	79,00
5	Retiro de tachas	Und	58
6	Retiro de bordillos	Und	20
7	Retiro de hitos	Und	25

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

5. RECURSOS DEL CONTRATO

5.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de junio de 2026, correspondiente al Informe Mensual No. 4 del Contrato de Obra Pública No. ICCU-1622-2025, se dispuso de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades correspondientes a la fase constructiva del proyecto, relacionadas con la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), adecuación de frentes de trabajo y ejecución de las actividades de mantenimiento de la cicloinfraestructura en los tramos viales priorizados.

Entre los principales equipos y recursos utilizados durante el periodo se destacan:

- Camión para transporte de materiales, herramientas y equipos.
- Máquina demarcadora para aplicación de pintura de señalización horizontal.
- Equipos para limpieza y preparación de superficies.
- Herramientas manuales y equipos menores de construcción.
- Equipos de medición y control para verificación de las actividades ejecutadas.
- Dispositivos de señalización temporal para la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT).

Así mismo, durante el periodo se realizó seguimiento permanente al estado y funcionamiento de la maquinaria y equipos utilizados en los diferentes frentes de trabajo, efectuando las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para garantizar su disponibilidad y adecuado desempeño durante la ejecución de las obras.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

Los recursos dispuestos permitieron desarrollar las actividades programadas conforme a las especificaciones técnicas y a la programación contractual, garantizando la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo reportado.

Se prevé que para el siguiente periodo contractual se continúe utilizando la maquinaria y los equipos requeridos para la ejecución de las actividades de mantenimiento y adecuación de la cicloinfraestructura, fortaleciendo los recursos operativos de acuerdo con la apertura de nuevos frentes de trabajo y las necesidades propias del avance de la ejecución del contrato.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

6. COMPONENTE FINANCIERO

6.1 ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de junio de 2026, la ejecución financiera del contrato corresponde al desarrollo de la fase constructiva del proyecto, registrándose ejecución económica asociada a los ítems contractuales correspondientes a la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), adecuación de los frentes de trabajo, actividades de mantenimiento de la cicloinfraestructura, señalización horizontal y demás actividades contempladas dentro del alcance del contrato.

Durante el periodo se evidencia inversión en obra física, derivada de la ejecución de actividades constructivas, el suministro de materiales, la utilización de maquinaria y equipos, la implementación de señalización temporal y la disposición del personal técnico, operativo y administrativo requerido para el desarrollo de las intervenciones programadas.

La ejecución del periodo se encuentra soportada en las preactas de obra correspondientes, las cuales consolidan las cantidades ejecutadas y su respectivo reconocimiento económico, en concordancia con el avance físico acumulado del 44,99 %.

Al cierre del periodo reportado, se registra una ejecución acumulada de \$1.309.046.810, frente a un valor programado acumulado de \$1.255.000.000, manteniendo coherencia entre la programación financiera y el avance físico del contrato, y evidenciando un adelanto del 1,85 % respecto a la programación establecida.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

Así mismo, respecto al manejo del anticipo, se evidencia una amortización acumulada de \$261.809.362, correspondiente a los recursos asociados al desarrollo de las actividades constructivas, técnicas, operativas y administrativas requeridas para la ejecución del proyecto.

En este sentido, la inversión ejecutada se concentra en los costos asociados al personal profesional, técnico y operativo, adquisición y suministro de materiales, utilización de maquinaria y equipos, implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), ejecución de señalización horizontal y demás recursos necesarios para el desarrollo de la fase constructiva.

Se proyecta que en los siguientes periodos la ejecución financiera continúe incrementándose conforme al avance de las actividades de mantenimiento y adecuación de la cicloinfraestructura, la apertura de nuevos frentes de trabajo y la ejecución de las intervenciones previstas dentro del alcance contractual.



	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

7. ANEXOS

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente informe y constituyen soporte del avance técnico, administrativo y contractual del periodo reportado:

7.1 ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contiene el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo, como implementación del pmt, implementación de la demarcación, limpiezas y retiros.

Las evidencias se encuentran debidamente organizadas, identificadas fecha, ubicación y hora, permitiendo la verificación del desarrollo de las actividades ejecutadas.

7.2 ANEXO 2 – BITÁCORA DE OBRA

Corresponde al registro diario de actividades desarrolladas durante el periodo, en el cual se consignan:

- Actividades ejecutadas
- Condiciones de campo
- Novedades presentadas
- Condiciones climáticas
- Observaciones técnicas

La bitácora se encuentra debidamente diligenciada, foliada y suscrita conforme a los lineamientos contractuales.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

7.3 ANEXO 3 – PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Incluye los soportes correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al contrato, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista.

7.4 ANEXO 4 – INFORMES SEMANALES

Se anexan los informes semanales correspondientes al periodo evaluado, los cuales detallan el desarrollo de las actividades por semana y sirven como soporte del informe mensual consolidado.

7.5 ANEXO 5 - LISTAS DE ASISTENCIA CHARLAS SST

Se incluye listas de asistencia y actas correspondientes a las charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizadas durante el mes objeto del presente informe, como evidencia de la participación de los trabajadores en las actividades de capacitación y sensibilización programadas.

7.6 ANEXO 6 – CERTIFICADOS DE EQUIPOS

Se incluye certificados de mantenimiento y funcionamiento de equipos delineadores y documentos de vehículo transportador.

7.7 ANEXO 7 – CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Se incluye ficha técnica y certificado de calidad de materiales utilizados en obra

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

8. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026 se consolidó el inicio de la fase constructiva del Contrato de Obra Pública No. ICCU-1622-2025, mediante la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados y la ejecución de las primeras actividades de adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura en los tramos viales priorizados, conforme a la programación establecida.

Las actividades desarrolladas permitieron avanzar en la ejecución de los diferentes ítems contractuales, incluyendo la implementación de la señalización temporal, la adecuación de los frentes de trabajo, la preparación de superficies, la aplicación de imprimante, la ejecución de la señalización horizontal y el desarrollo de las actividades de seguimiento técnico, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contractuales.

Con corte al 15 de junio de 2026, el contrato registra un avance físico acumulado del 44,99 %, superior al avance programado del 43,14 %, evidenciando un adelanto del 1,85 % respecto a la programación establecida, situación que refleja un adecuado desempeño técnico, operativo y administrativo durante el periodo reportado.

Así mismo, la ejecución financiera del contrato presenta coherencia con el avance físico alcanzado, registrando una inversión acumulada de \$1.309.046.810 y una amortización acumulada del anticipo por valor de \$261.809.362, de conformidad con las condiciones contractuales y los soportes técnicos correspondientes.

	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
	INFORME MENSUAL No. 4. 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026	

Finalmente, se concluye que las actividades ejecutadas durante el periodo permitieron mantener la continuidad del proyecto y sentar las bases para el desarrollo de las siguientes etapas constructivas, garantizando el cumplimiento de la programación, la adecuada utilización de los recursos y la ejecución de las intervenciones previstas dentro del alcance del Contrato de Obra Pública No. ICCU-1622-2025.



ANEXO 1



#Funza

Funza, Cundinamarca

N 4° 42' 40.702", W 74° 12' 28.659"

12/06/2026, 2:45:10 p.m.

Mapas



#Funza

Funza, Cundinamarca

N 4° 42' 43.056", W 74° 12' 30.419"

12/06/2026, 9:37:26 a.m.



#Funza

Funza, Cundinamarca

N 4° 43' 14.037", W 74° 12' 49.304"

11/06/2026, 3:29:17 p.m.



#Funza
Funza, Cundinamarca
N 4° 43' 23.129", W 74° 12' 54.099"
11/06/2026, 12:43:42 p.m.







#Funza

Funza, Cundinamarca

N 4° 42' 52.279", W 74° 12' 56.973"

9/06/2026, 11:04:52 a.m.





#Funza


Funza, Cundinamarca

N 4° 42' 54.173", W 74° 12' 53.600"

9/06/2026, 9:59:09 a.m.

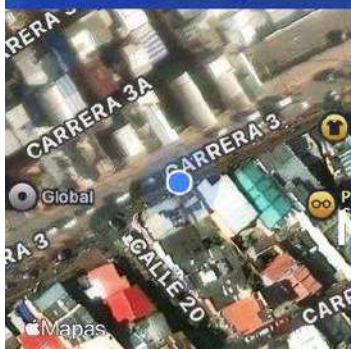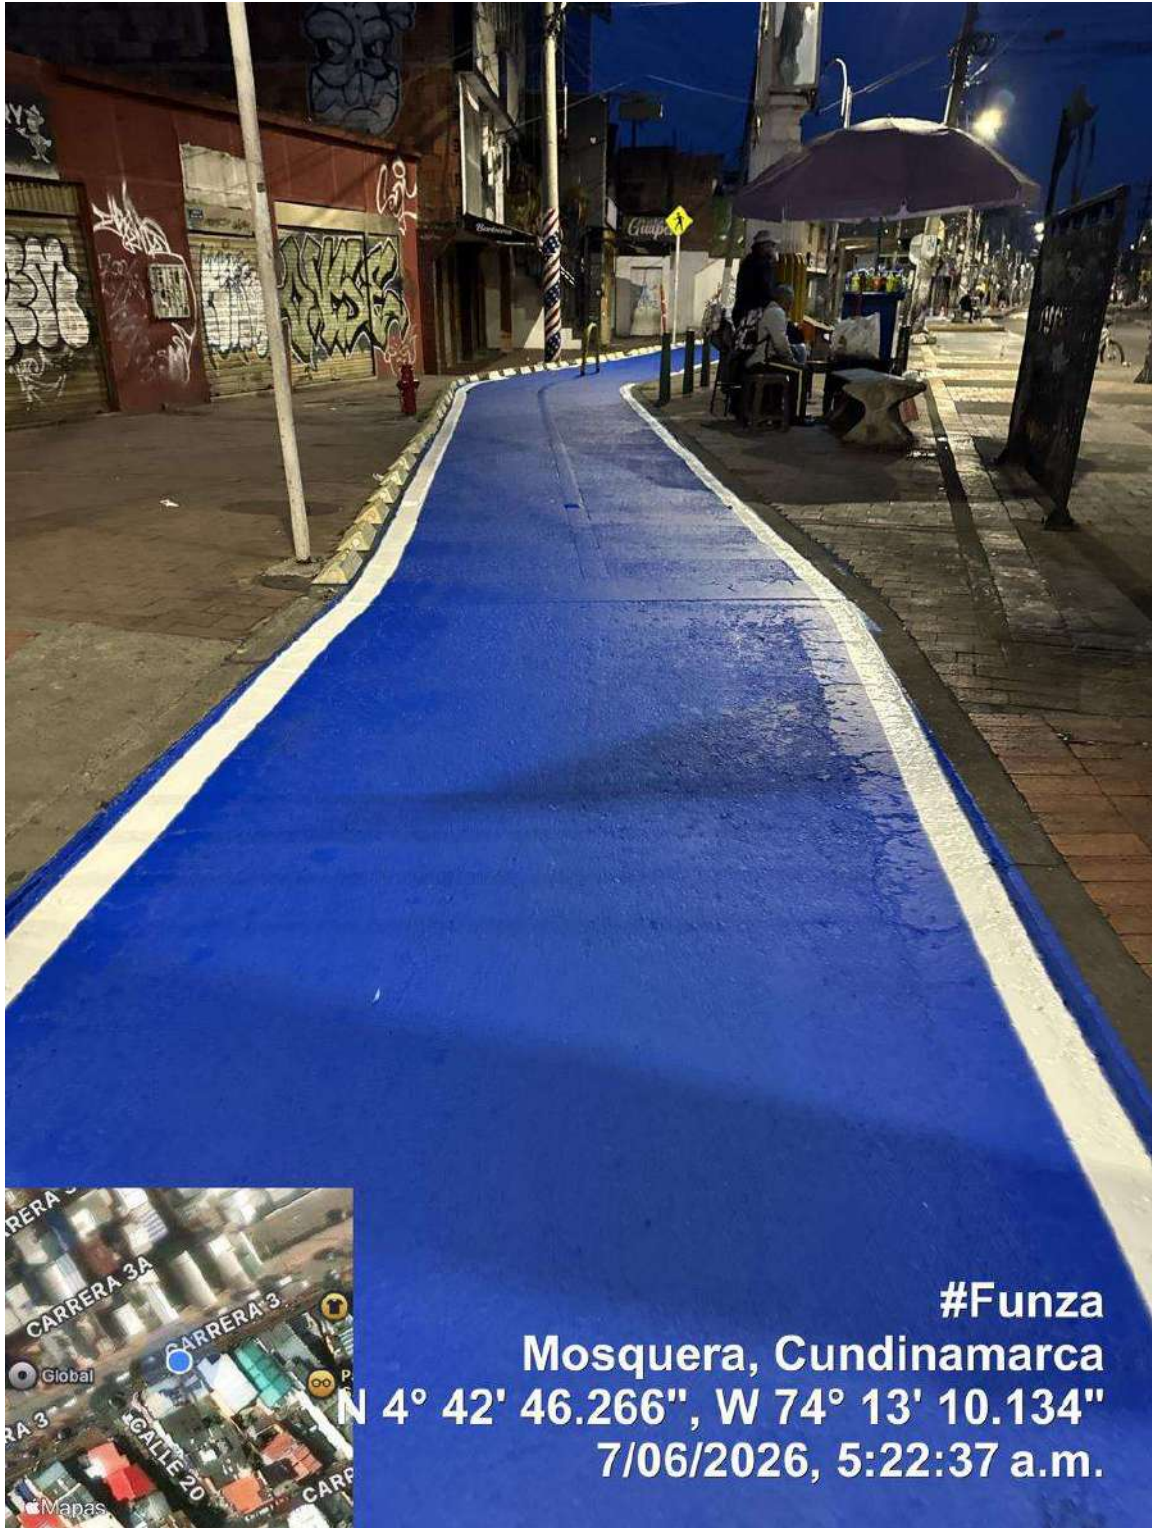

#Funza
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 46.266", W 74° 13' 10.134"
7/06/2026, 5:22:37 a.m.

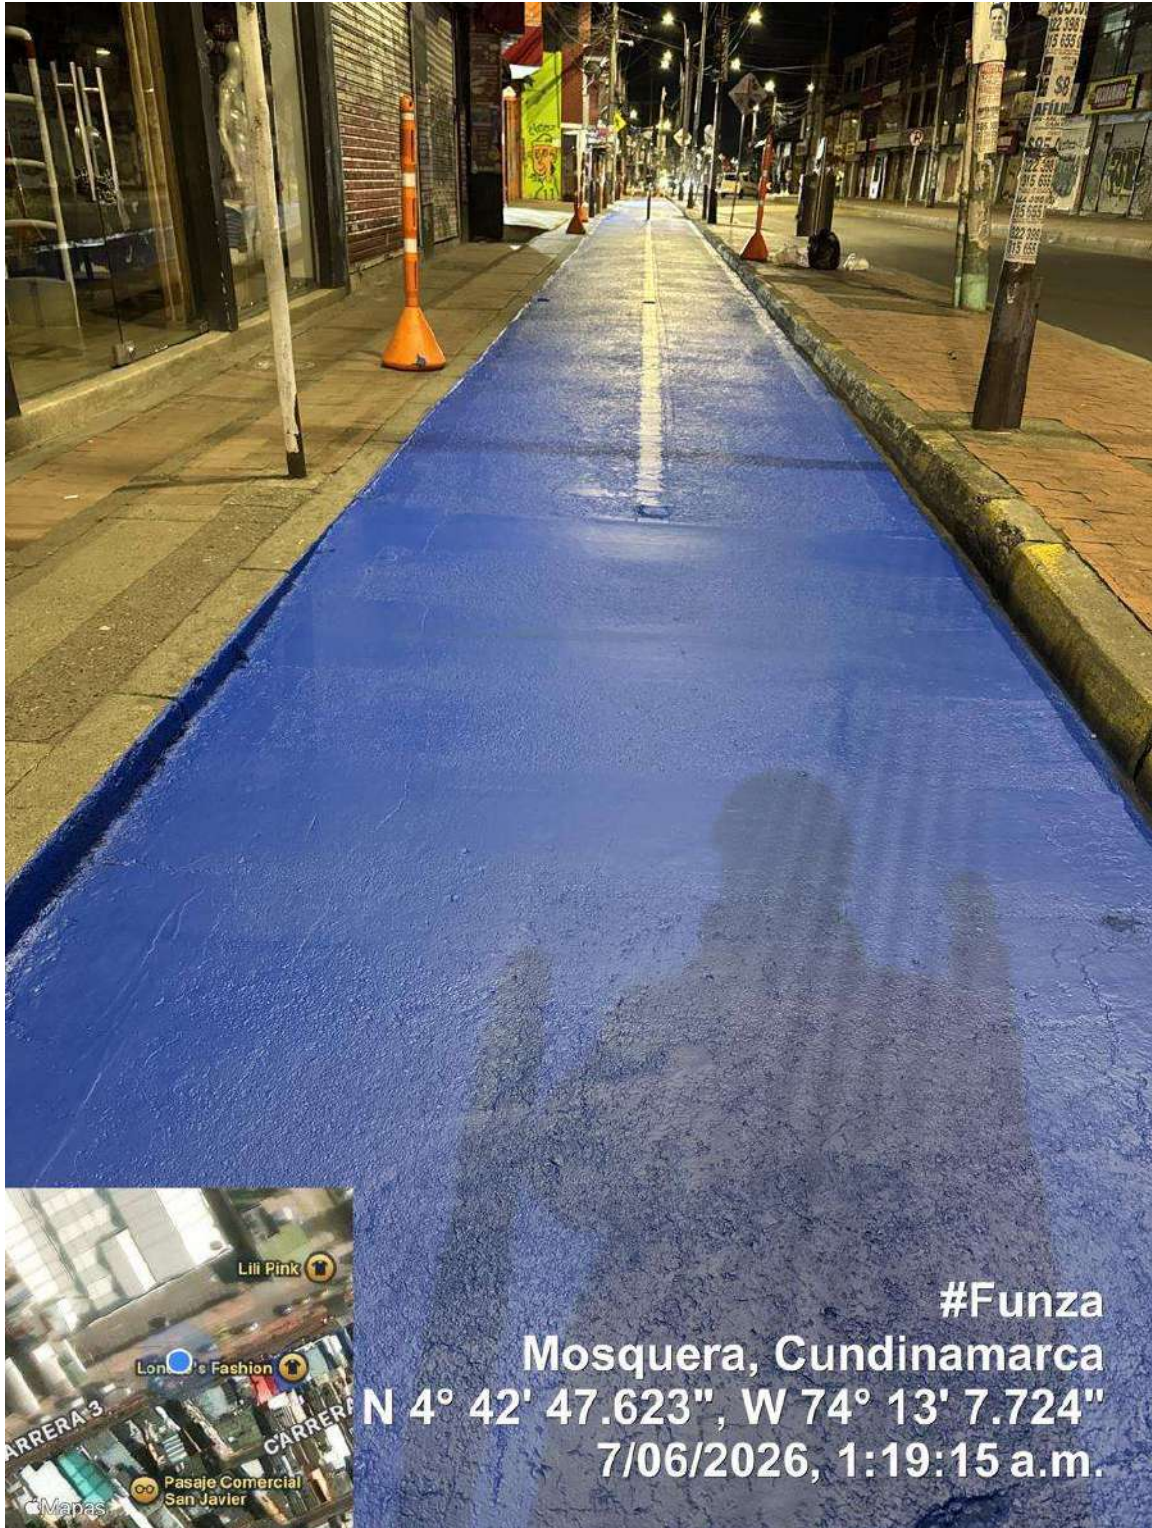

#Funza
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 47.623", W 74° 13' 7.724"
7/06/2026, 1:19:15 a.m.




#Funza

Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 42.599", W 74° 13' 19.566"

6/06/2026, 9:19:48 p.m.

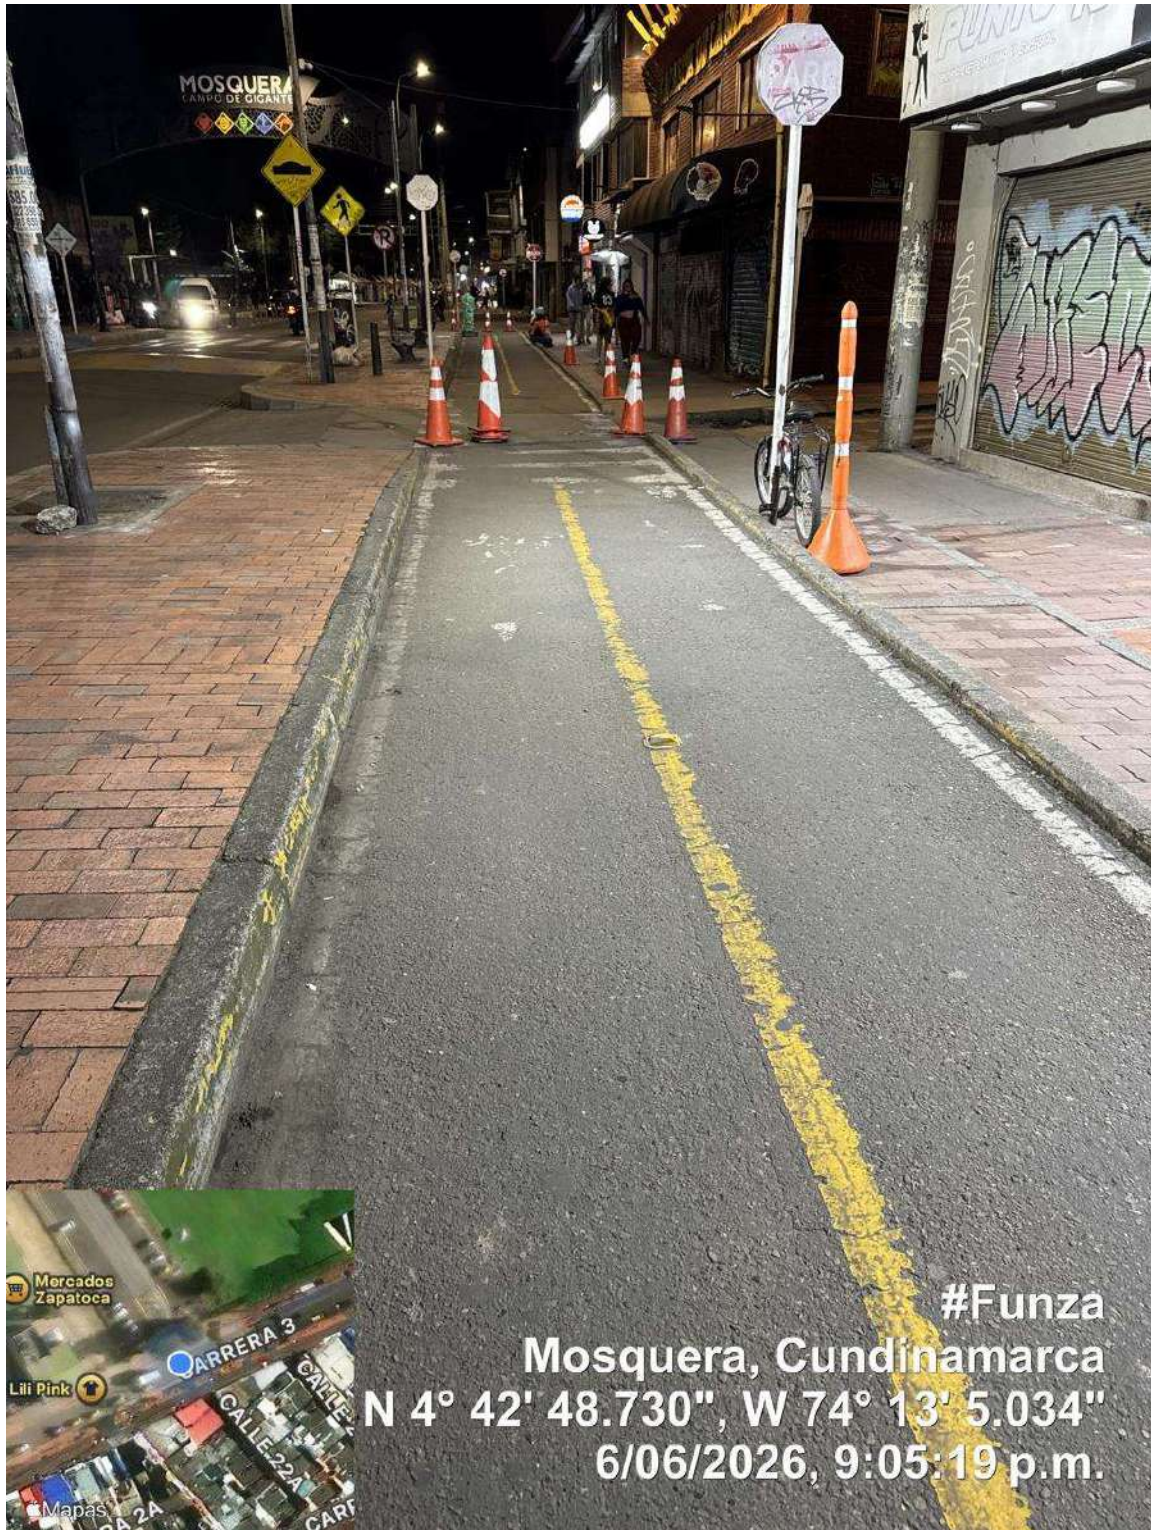

#Funza
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 48.730", W 74° 13' 5.034"
6/06/2026, 9:05:19 p.m.



#Funza
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 45.348", W 74° 13' 12.450"
3/06/2026, 4:15:06 p.m.



#Funza

Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 43.759", W 74° 13' 16.618"

3/06/2026, 12:12:26 p.m.



Cicloruta Funza Tres esquinas
#Funza
Funza, Cundinamarca
N 4° 43' 38.477", W 74° 13' 4.417"
2/06/2026, 2:50:45 p.m.



Cicloruta Funza Tres esquinas
#Funza
Funza, Cundinamarca
N 4° 43' 42.074", W 74° 13' 6.481"
2/06/2026, 11:08:06 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 42.913", W 74° 13' 19.763"
1/06/26, 11:08 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 42.245", W 74° 13' 19.969"
1/06/26, 11:08 a.m.



Cicloruta Mosquera

Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 36.217", W 74° 13' 29.471"

31/05/26, 1:23 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 38.948", W 74° 13' 25.518"
31/05/26, 12:42 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 39.860", W 74° 13' 24.539"
30/05/26, 10:55 p.m.





Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 34.166", W 74° 13' 32.668"
27/05/26, 3:52 p.m.





Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 31.095", W 74° 13' 37.004"
26/05/26, 1:08 p.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 26.725", W 74° 13' 42.198"
26/05/26, 12:59 p.m.



Cicloruta Mosquera Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 26.517", W 74° 13' 42.562"
25/05/26, 11:13 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 25.749", W 74° 13' 43.673"
25/05/26, 11:11 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
N 4° 42' 26.833", W 74° 13' 43.600"
22/05/26, 10:05 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 27.041", W 74° 13' 42.872"

22/05/26, 8:56 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 25.677", W 74° 13' 43.496"
22/05/26, 8:54 a.m.



Cicloruta Mosquera
Mosquera, Cundinamarca

N 4° 42' 25.800", W 74° 13' 43.474"
21/05/26, 1:13 p.m.







ANEXO 2

09-05-2026 Se' culminó la elaboración técnica documental del PMT correspondiente al corredor Mosquera-Funza realizando su respectiva radicación ante la alcaldía Municipal de Mosquera.

Ing: RESIDENTE MARLON QUINTERO
CONTRATISTA

25-05-2026 Se dio inicio a la implementación de la señalización horizontal en el Corredor Mosquera - Funza.
Se instaló el PMT mediante Camarero móvil, Señalización temporal y dispositivos de Canalización.
Se ejecutó el retiro de hilos, bordillos y tornos existentes, seguido de la aplicación de imprimante, pintura y demarcación horizontal incluyendo fondo azul, líneas longitudinales, Pictogramas y demás marcas viales de acuerdo a los tendimientos programados para la jornada.

Ing: RESIDENTE MARLON QUINTERO
CONTRATISTA

26-05-2026

Se Continúo Con la implementación de la señalización horizontal sobre los sectores programados mediante aplicación de imprimante, pintura y demarcación vial. Durante la jornada se avanzo en la ejecución de líneas longitudinales / fondo azul y marcas viales manteniendo el PMT durante toda la intervención.

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

27-05-2026

Continuaron las actividades de preparación de superficie, aplicación de imprimante y pintura para la ejecución de señalización horizontal. Se implementaron líneas de borde, pictogramas cebra y demás marcas viales previstas en los diseños del Proyecto. Logrando los rendimientos programados

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

28-05-2026 Se dio continuidad a las actividades de Señalización horizontal, ejecutando la aplicación de pintura y demarcación sobre nuevos sectores del Corredor. Los labores se desarrollaron normalmente bajo las condiciones establecidas en la PMT aprobada.

ING: RESIDENTE MARLON QUINTERO
CONTRATISTA

2

29-05-2026 Durante la jornada se presentaron precipitaciones que afectaron parcialmente el desarrollo de las actividades programadas. Antes de la suspensión temporal de trabajos fue posible ejecutar parte de la señalización horizontal, sin embargo la aplicación de materiales fue suspendida hasta contar con condiciones adecuadas para garantizar su correcta adherencia.

ING: RESIDENTE MARLON QUINTERO
CONTRATISTA

30-05-2026 Con el fin de recuperar los rendimientos afectados por las lluvias se desarrollo una jornada nocturna en la que se continuo con la aplicacion de imprimante / pintura y demarcación horizontal sobre los sectores programados minimizando las afectaciones a la movilidad.

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

31-05-2026 Se ejecuto jornada de trabajo en horario de madrugada dando continuidad a la implementacion de señalizacion horizontal y finalizando actividades programadas para semana.

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

1-06-2026 Se retomaron las actividades de implementacion en el Corredor Mosquera - Funza ejecutando labores de preparacion de superficie, aplicacion de imprimante y avance en la señalizacion horizontal conforme a lo establecido.

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

2-6-2026 No fue posible desarrollar las actividades programadas debido a la falla mecánica presentada en el equipo de demarcación horizontal. Situación que obligo a suspender la jornada mientras se efectuaban labores de reparación y ajuste del equipo.

ING: RESIDENTE MARLON Q
CONTRATISTA

3-6-2026 Una vez solucionada la falla mecánica, se reanudaron las actividades, de implementación mediante aplicación de imprimante y demarcación horizontal sobre los sectores pendientes dando la continuidad al cronograma.

ING: RESIDENTE MARLON QUINTANA
CONTRATISTA

4-6-2026 Se Continúo Con la ejecución de la Señalización Horizontal mediante aplicación de pintura y demarcación Vial, manteniendo el PMT y el cerramiento durante la jornada

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

5-6-2026 Durante la jornada se registraron precipitaciones que afectaron al normal desarrollo de las actividades limitando la ejecución de la señalización hasta que por las condiciones climáticas permitieron reanudar trabajos.

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

6-6-2026 Con el propósito de recuperar el tiempo perdido por la falla mecánica y las condiciones climáticas, se desarrolló jornada nocturna ejecutando actividades de imprimante, pintura y demarcación horizontal.

ING: RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

7-6-2026 Se realizaron actividades en horario de mañana para mantener el avance previsto del Proyecto y dar continuidad a la implementación de la señalización horizontal

ING. RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

8 y 9-06-2026 No se ejecutaron actividades de acuerdo con la programación establecida.

ING. RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

10-6-2026 Se terminaron actividades de señalización horizontal mediante preparación de superficie, aplicación de imprimante prima y demarcación vial conforme a las especificaciones técnicas del Proyecto.

ING. RESIDENTE MARLON Q.
CONTRATISTA

11-6-2026

Se dio continuidad a la implementación de la señalización horizontal ejecutando líneas longitudinales, fondo azul y demás marcas viales programadas para el corredor.

ING: RESIDENTE MARLON Q
CONTRATISTA

12-6-2026

Continuaron las actividades de demarcación horizontal y se realizó el retiro de 15 (15) hitos existentes como parte de la adecuación de la infraestructura para la nueva señalización

ING: RESIDENTE MARLON Q
CONTRATISTA

13-6-2026

No fue posible ejecutar actividades programadas debido a las precipitaciones registradas durante la jornada, las cuales impidieron garantizar las condiciones técnicas necesarias para la correcta aplicación de los materiales de demarcación horizontal.

ING: RESIDENTE MARLON Q
CONTRATISTA

14-6-2022 No se leizaron actividades de implementación efectuándose la programación y organización de los labores correspondientes a la siguiente semana de intervención.

ING: RESIDENTE MARLOW Q.
CONTRATISTA

30-04-2026 Se realizó organización final del expediente técnico del PMT, incluyendo revisión documental y validación interna de anexos y Soportes gráficos.

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

01-05-2026 Se culminó la elaboración técnica y de Cuentas de PMT correspondiente al Corredor intervenido dejando Consolidado el expediente para su trámite y radicación.

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

1-6-2026 Se dio apertura al nuevo frente de trabajo correspondiente al Corredor funza - Tres espinas. Iniciando desde el sector el Club de golf San Andres. Conforme a la programación establecida. Durante la jornada el plan de manejo de tránsito (PMT) instalando el Cerramiento móvil, la Señalización temporal y los dispositivos de canalización requeridos.

Para el desarrollo seguro de actividades.

ING: DIEGO MALAGON

RESIDENTE CONTRATISTA

2-6-2026 No Se ejecutaron actividades de Implementacion en este corredor, manteniendo el frente programado mientras se desarrollaban actividades en otros Sectores del Proyecto.

ING: DIEGO MALAGON

RESIDENTE CONTRATISTA

3-6-2026 Se realizaron actividades Preliminares de organizacion del frente de trabajo y Preparacion para el inicio de labores de implementacion Conforme a la programacion del Contrato.

ING: DIEGO MALAGON

RESIDENTE CONTRATISTA

4-6-2026 Se Continúo Con el alistamiento del Corredor y la preparacion de los sectores que seran intervenidos durante las siguientes jornadas verificando las condiciones de la Infraestructura y del PMT

INS: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

5-6-2026 Durante la jornada se presentaron precipitaciones sin embargo una vez mejoraron las condiciones climaticas a las 10:03 AM se dio inicio a las actividades desde el sector de tres esquinas. Como labor Preliminar se ejecuto la limpieza y retiro de vegetacion en una franja aproximada de 0,50 m de ancho a lo largo del corredor, permitiendo posteriormente la aplicacion de imprimante pintura y la implementacion de la Señalización horizontal Conforme a los diseños establecidos.

INS: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

6-6-2026 Se Continúo Con las actividades de implementación de la Señalización horizontal, ejecutando la aplicación de Imprimante, Pintura y demarcación Vial Sobre los sectores programados garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del PMT.

ING: DIEGO MALAGON

RESIDENTE CONTRATISTA

7-6-2026 Se desarrollaron actividades de implementación de Señalización horizontal mediante la aplicación de pintura y demarcación Sobre los Sectores intervenidos avanzando conforme a la Programación establecida para el Corredor.

ING: DIEGO MALAGON

RESIDENTE CONTRATISTA

8 y 9 de 6-2026 No se ejecutaron actividades de implementación en el corredor Funza - Tres esquinas de acuerdo con la programación establecida para la semana.

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

5 10-6-2026 Se realizaron labores de preparación de superficie para la aplicación de materiales de demarcación horizontal, dejando el Corredor en condiciones adecuadas para la continuidad de actividades

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

11-6-2026 Se dio continuidad a la implementación de la Señalización horizontal mediante la aplicación de imprimante, pintura y demarcación final ejecutando las marcas establecidas en los diseños del Proyecto y avanzando sobre los proyectos programados.

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

12-6-2026 Continúan las actividades de Señalización horizontal mediante técnicas establecidas y demarcación sobre la Circunferencia manteniendo la implementación permanente de PMT y los dispositivos de Seguridad. (seguimos para la intervención

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

13-6-2026 No fue posible desarrollar las actividades programadas debido a las precipitaciones presentadas durante la jornada con lo que impidió garantizar la adecuada adherencia y calidad de los materiales de demarcación horizontal. Las actividades fueron suspendidas y reprogramadas.

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

14-6-2026 No se ejecutaron actividades de implementación en el corredor reprogramándose la programación de la siguiente semana de intervención.

ING: DIEGO MALAGON
RESIDENTE CONTRATISTA

ANEXO 3

PERSONAL APROBADO

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CC 1018432889			DIEGO ALEJANDRO MALAGON RAMIREZ					INDEPENDIENTE					Principal			Cl. 8 Sur #41-24		BOGOTA-BOGOTA D.E.			1111111		No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Periodo		Clave					Tipo		Fecha				Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2026-05		2026-05		405318095		9506549950		I		2026/06/23		2026/06/19		NEQUI		0		\$499,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcr	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																											\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0</

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$499,100	\$0	\$0	\$499,100

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE ANDRES NAVARRETE GOMEZ identificado(a) con CC 1077033437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JORGE ANDRES NAVARRETE GOMEZ																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504381074	283144583	E	2026-05-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	1													X				
9504381074	283144583	E	2026-05-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	29																	
9504381074	283144583	E	2026-05-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	1													X				
9504381074	283144583	E	2026-05-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	29																	
9504381074	283144583	E	2026-05-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	1													X				
9504381074	283144583	E	2026-05-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	29																	
9504381074	283144583	E	2026-05-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	1													X				
9504381074	283144583	E	2026-05-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	29																	

Este certificado se expide el día 2026-06-01 a las 14:06.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79998951	MARLON ROLANDO QUINTERO GUARIN	CALLE 4 NO 4-71	3112353565	conadepr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89181294	04/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$379.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	153.300	0		0		0	0	0	0	153.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	196.200	0	0	0	0	0	0		196.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	29.900				29.900	0	0	29.900			299	29.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	153.300	153.300
Pensión	1	196.200	196.200
Riesgos Laborales	1	29.900	29.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	379.400	379.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79998951	MARLON ROLANDO QUINTERO GUARIN	CALLE 4 NO 4-71	3112353565	conadepr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89181294	04/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$379.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Económico	INS	RET	TAE	TAE	TAP	TAP	VST	SEN	ISE	LRA	ANR	ANR	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 79998951	QUINTERO GUARIN MARLON ROLANDO	59	0		N		X															25-14	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	21	153.300	14-11	1.225.634	21	3	29.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADO 12/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORSEING SAS			Dirección	CL 14 #42 - 67
Documento	NI900278384			Teléfono	7641754
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	BOYACA
Ciudad	DUITAMA			Identificación	CC 74374900
Representante Legal	ORDUZ PEREZ WILLIAM JAVIER			ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	25				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TAP	TAP	USP	COR	SVN	IGE	UVA	UVA	UVA	UVA	UVA	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001524926	JHONNEIDER TORRES VELASQUEZ	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1002459172	JUAN DIEGO CORREDOR MORALES	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1007305775	MARGETH JULIANA GARCIA NIÑO	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1018432889	DIEGO ALEJANDRO MALAGON RAMIREZ	01	00	X																6,960	\$ 408.545	\$ 28.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 408.545	\$ 16.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.700
CC 1051589154	SERGIO GABRIEL SANDOVAL INFANTE	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1052392943	CLAUDIA ANDREA ORDUZ PEREZ	01	00																	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 1052403483	WILMER FERNANDO NIÑO MARTINEZ	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1052403607	JEFERSON NICOLAS RINCON TORRES	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1052406065	JOAN DANIEL ORDUZ PASACHOA	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1053607670	LUIS FABIAN MACHUCA OJEDA	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1053611137	LINA MARCELA AYALA PINEDA	01	00																	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 1053613774	JORGE ALEJANDRO ALFONSO TIBATA	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1055313598	JHON FREDY GOMEZ ALBARRAN	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 1077033437	JORGE ANDRES NAVARRETE GOMEZ	01	00	X																6,960	\$ 408.545	\$ 28.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 408.545	\$ 16.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.700
CC 7214621	JOSE DANIEL ORDUZ CORREDOR	01	01																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.100
CC 74130936	JUAN CARLOS PACHECO SUAREZ	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 74360188	LUIS HELVER NEIRA ESPINOSA	01	00																	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300
CC 74373062	NELSON DANIEL ORDUZ PEREZ	01	00																	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 74374900	WILLIAM JAVIER ORDUZ PEREZ	01	00																	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200

Pagado: 12/06/2026

Empresa NI900278384 CORSEING
SAS

Planilla Nro: 86041959

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VPT	IGT	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74376096	JAVIER CORREDOR PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300			
CC 74379471	ROMMEL ALEXANDER ORDUZ PEREZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	\$ 992.180	\$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 992.180	\$ 39.700	6,960	\$ 992.180	\$ 69.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 992.180	\$ 39.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.300			
CC 79998951	MARLON ROLANDO QUINTERO GUARIN	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	\$ 408.545	\$ 65.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 408.545	\$ 16.400	6,960	\$ 408.545	\$ 28.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 408.545	\$ 16.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.700			
CC 88224279	ALEXIS ALBERTO DUARTE DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300			
CC 91480797	LUIS GABRIEL YAÑEZ SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300			
PT 5490044	PEDRO LUIS ESPINOZA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300			

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 37.734.105	\$ 39.485.010	\$ 39.485.010	\$ 39.485.010	\$ 6.038.600	\$ 1.580.800	\$ 2.523.700	\$ 1.580.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.723.900	\$ 0	\$ 11.723.900



PERSONAL DE IMPLEMENTACIÓN

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901440690-8	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS	CALLE 38 SUR 72 J 34 CARVAJAL	3107603972	facturaciondobleviasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79063193	04/05/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$24,364,518	\$6.654.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	248.000	0		0		0	11	1.900	0	249.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	11	600	0	70.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	11	600	0	70.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	318.100	0		0		0	11	2.500	0	320.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	11	600	0	70.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	140.200	0		0		0	11	1.100	0	141.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.400	0		0		0	11	500	0	58.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	992.000	0	0	0	0	11	7.600	0	999.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.906.700	0	0	0	0	11	22.100	0	2.928.800	8

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	755.400				755.400	11	5.800	761.200			7.554	761.200	9

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre						NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF22	Colsubsidio						860007336-1	975.000	11
								7.500	
								982.500	
									9

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	975.000	982.800
Pensión	2	3.898.700	3.928.400
Riesgos Laborales	1	755.400	761.200
CCF	1	975.000	982.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.604.100	6.654.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901440690-8	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS	CALLE 38 SUR 72 J 34 CARVAJAL	3107603972	facturaciondobleviasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79063193	04/05/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$24,364,518	\$6.654.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. anterior	Exon. AFP	ING	RET	TRE	TAE	TAP	VSP	VST	SAN	ISE	LRA	AC	AFI	VCT	IRL	CONCORDIA	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1022958126	QUIMBAY APARICIO JOHAN ESTEBAN	1	0			S	X															230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSC34	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF22	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
2	CC 1031145211	BOTERO GIRALDO VANESSA	1	0			S																230201	6.200.000	30	992.000	0	0	0	0	EPS001	6.200.000	30	248.000	14-11	6.200.000	30	2	64.800	CCF22	6.200.000	30	248.000	0	0	0	0	0
3	CC 1033748655	PEREZ VEGA DALLAN YISED	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1061048177	PRIETO HENAO JUAN JOSE	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1099206376	GARCES JIMENEZ MARLIT YINNELA	1	0			S	X															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1099215729	ZEJA SUAREZ MICHAEL STIWAR	1	0			S	X															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 52340408	PRIETO MOYA EDIT YOHANA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80721726	OROZCO HUERFANO LUIS HORMILSON	1	0			S																230301	6.200.000	30	992.000	0	0	0	0	EPS008	6.200.000	30	248.000	14-11	6.200.000	30	2	64.800	CCF22	6.200.000	30	248.000	0	0	0	0	0
9	PT 794621	MORENO NEGRETE MILSON SEGUNDO	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Medellín, 01 de June de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 OPERATIVOS			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C82385369	HERNANDEZ CORDOBA DABER	02/06/2026		373177p2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/06/2026 18:30:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.62.129, 192.230.104.15, 172.16.42.57

Medellín, 01 de June de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 OPERATIVOS			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1119392389	CACERES MARTINEZ YOISMAN JESID	02/06/2026		63142Q18	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/06/2026 17:55:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.62.129, 192.230.104.15, 172.16.42.57

Medellín, 01 de June de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 OPERATIVOS			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1192783694	SOLANO ROMERO JOSE ANDRES	02/06/2026		17427131	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/06/2026 18:03:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.62.129, 192.230.104.15, 172.16.42.57

Medellín, 03 de Junio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - OPERATIVOS, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C82385369	HERNANDEZ CORDOBA DABER	02/06/2026		373177p2	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1192783694	SOLANO ROMERO JOSE ANDRES	02/06/2026		17427131	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1119392389	CACERES MARTINEZ YOISMAN JESID	02/06/2026		63142Q18	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1152943939	POLO MENDOZA JANER	02/06/2026		61981760	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C807217262615439854

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/06/2026 11:04:14 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.85.240.5, 192.230.104.17, 172.16.42.57

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



GRUPO MEDICO INTEGRAL VIVE
Dirección: CRA 1 # 6 -106
Nit: 900924678-3
E-mail: gerencia@viveips.com.co
Teléfonos: 3003430586



Fecha:	22/05/2026	Nombre del Trabajador:	ALAN HIDALGO MARQUEZ ESCOBAR
Ciudad:	Facatativá Cundinamarca	Número de Documento:	1.065.843.640
Tipo de Examen Médico Ocupacional:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	Cargo:	Operario de piso
Datos de la Empresa Donde Labora, Laborará o Laboro el Trabajador o Aspirante:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL		
<u>APTO PARA DESARROLLAR LA LABOR</u>		
Observaciones: NO APLICA		
NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)		
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:		
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL		-----
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ACTIVIDAD FISICA	USO DE EPP	CONSERVAR EL EJERCICIO FISICOY ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

REMISION A EPS: NO

-

REMISION A ARL: NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas por solicitud de la empresa arribamencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional. Recibí copia del concepto médico ocupación de acuerdo con las evaluaciones médicas, estoy informando que el GRUPO MEDICO INTEGRAL IPS tendrá en custodia mi historia clínica ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 1918 de 2009. Así mismo autorizo a la IPS para suministrarle la información requerida para el buen cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica de medicina del trabajo, consignada en el concepto médico y en el diagnóstico de salud (Artículo 9,10,17 y 18 de la Resolución 2346 de 2007).

Médico

Aspirante o Trabajador

Carlos Yesid Garzón Riveros

Médico Cirujano

Especialista SST

TPP 1639 - 85 Lic 3535-2019

DR. Carlos G. Riveros
CC 19273420

ALAN HIDALGO MARQUEZ ESCOBAR
CC. 1.065.843.640

Especialidad. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Registro. 3535-2019

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



GRUPO MEDICO INTEGRAL VIVE

Dirección: CRA 1 # 6 -106
Nit: 900924678-3
E-mail: gerencia@viveips.com.co
Teléfonos: 3003430586



Fecha:	22/05/2026	Nombre del Trabajador:	DAYAN YISED PEREZ VEGA
Ciudad:	Facativá Cundinamarca	Número de Documento:	1.033.748.655
Tipo de Examen Médico Ocupacional:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	Cargo:	Administrativo
Datos de la Empresa Donde Labora, Laborará o Laboro el Trabajador o Aspirante:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL		
<u>APTO PARA DESARROLLAR LA LABOR</u>		
Observaciones: NO APLICA		
NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)		
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:		
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL		-----
		✓
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ACTIVIDAD FISICA	USO DE EPP	CONSERVAR EL EJERCICIO FISICOY ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

REMISION A EPS: NO

-

REMISION A ARL: NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas por solicitud de la empresa arribamencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional. Recibí copia del concepto médico ocupación de acuerdo con las evaluaciones médicas, estoy informando que el GRUPO MEDICO INTEGRAL IPS tendrá en custodia mi historia clínica ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 1918 de 2009. Así mismo autorizo a la IPS para suministrarle la información requerida para el buen cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica de medicina del trabajo, consignada en el concepto médico y en el diagnóstico de salud (Artículo 9,10,17 y 18 de la Resolución 2346 de 2007).

Médico

Aspirante o Trabajador

Carlos Yesid Garzón Riveros

Médico Cirujano

Especialista SST

TPP 1639 - 85 Lic 3535-2019

DR. Carlos G. Riveros
CC 19273420

DAYAN YISED PEREZ VEGA
CC. 1.033.748.655

Especialidad. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Registro. 3535-2019

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



GRUPO MEDICO INTEGRAL VIVE
Dirección: CRA 1 # 6 -106
Nit: 900924678-3
E-mail: gerencia@viveips.com.co
Teléfonos: 3003430586



Fecha:	22/05/2026	Nombre del Trabajador:	HEINER MANUEL VASQUEZ BLANCO
Ciudad:	Facatativá Cundinamarca	Número de Documento:	1.474.95.873
Tipo de Examen Médico Ocupacional:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	Cargo:	Operario de piso
Datos de la Empresa Donde Labora, Laborará o Laboro el Trabajador o Aspirante:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL		
<u>APTO PARA DESARROLLAR LA LABOR</u>		
Observaciones: NO APLICA		
NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)		
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:		
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL		-----
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ACTIVIDAD FISICA	USO DE EPP	CONSERVAR EL EJERCICIO FISICOY ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

REMISION A EPS: NO

-

REMISION A ARL: NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas por solicitud de la empresa arribamencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional. Recibí copia del concepto médico ocupación de acuerdo con las evaluaciones médicas, estoy informando que el GRUPO MEDICO INTEGRAL IPS tendrá en custodia mi historia clínica ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 1918 de 2009. Así mismo autorizo a la IPS para suministrarle la información requerida para el buen cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica de medicina del trabajo, consignada en el concepto médico y en el diagnóstico de salud (Artículo 9,10,17 y 18 de la Resolución 2346 de 2007).

Médico

Aspirante o Trabajador

Carlos Yesid Garzón Riveros

Médico Cirujano

Especialista SST

TPP 1639 - 85 Lic 3535-2019

DR. Carlos G. Riveros
CC 19273420

HEINER MANUEL VASQUEZ BLANCO
CC. 1.474.95.873

Especialidad. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Registro. 3535-2019

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



GRUPO MEDICO INTEGRAL VIVE
Dirección: CRA 1 # 6 -106
Nit: 900924678-3
E-mail: gerencia@viveips.com.co
Teléfonos: 3003430586



Fecha:	22/05/2026	Nombre del Trabajador:	JOHAN ESTEBAN QUIMBAY APARICIO
Ciudad:	Facatativá Cundinamarca	Número de Documento:	1.022.958.126
Tipo de Examen Médico Ocupacional:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	Cargo:	Operario de piso
Datos de la Empresa Donde Labora, Laborará o Laboro el Trabajador o Aspirante:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL		
<u>APTO PARA DESARROLLAR LA LABOR</u>		
Observaciones: NO APLICA		
NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)		
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:		
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL		-----
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ACTIVIDAD FISICA	USO DE EPP	CONSERVAR EL EJERCICIO FISICOY ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

REMISION A EPS: NO

-

REMISION A ARL: NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas por solicitud de la empresa arribamencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional. Recibí copia del concepto médico ocupación de acuerdo con las evaluaciones médicas, estoy informando que el GRUPO MEDICO INTEGRAL IPS tendrá en custodia mi historia clínica ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 1918 de 2009. Así mismo autorizo a la IPS para suministrarle la información requerida para el buen cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica de medicina del trabajo, consignada en el concepto médico y en el diagnóstico de salud (Artículo 9,10,17 y 18 de la Resolución 2346 de 2007).

Médico

Aspirante o Trabajador

Carlos Yesid Garzón Riveros

Médico Cirujano

Especialista SST

TPP 1639 - 85 Lic 3535-2019

DR. Carlos G. Riveros

CC 19273420

JOHAN ESTEBAN QUIMBAY APARICIO

CC. 1.022.958.126

Especialidad. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Registro. 3535-2019

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



GRUPO MEDICO INTEGRAL VIVE

Dirección: CRA 1 # 6 -106
Nit: 900924678-3
E-mail: gerencia@viveips.com.co
Teléfonos: 3003430586



Fecha:	22/05/2026	Nombre del Trabajador:	JUAN JOSE PRIETO HENAO
Ciudad:	Facativá Cundinamarca	Número de Documento:	1.061.048.177
Tipo de Examen Médico Ocupacional:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	Cargo:	Operario de piso
Datos de la Empresa Donde Labora, Laborará o Laboro el Trabajador o Aspirante:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL		
<u>APTO PARA DESARROLLAR LA LABOR</u>		
Observaciones: NO APLICA		
NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)		
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:		
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL		-----
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ACTIVIDAD FISICA	USO DE EPP	CONSERVAR EL EJERCICIO FISICOY ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

REMISION A EPS: NO

-

REMISION A ARL: NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas por solicitud de la empresa arribamencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional. Recibí copia del concepto médico ocupación de acuerdo con las evaluaciones médicas, estoy informando que el GRUPO MEDICO INTEGRAL IPS tendrá en custodia mi historia clínica ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 1918 de 2009. Así mismo autorizo a la IPS para suministrarle la información requerida para el buen cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica de medicina del trabajo, consignada en el concepto médico y en el diagnóstico de salud (Artículo 9,10,17 y 18 de la Resolución 2346 de 2007).

Médico

Aspirante o Trabajador

Carlos Yesid Garzón Riveros

Médico Cirujano

Especialista SST

TPP 1639 - 85 Lic 3535-2019

DR. Carlos G. Riveros
CC 19273420

JUAN JOSE PRIETO HENAO
CC. 1.061.048.177

Especialidad. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Registro. 3535-2019

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



GRUPO MEDICO INTEGRAL VIVE

Dirección: CRA 1 # 6 -106
Nit: 900924678-3
E-mail: gerencia@viveips.com.co
Teléfonos: 3003430586



Fecha:	22/05/2026	Nombre del Trabajador:	LUIS HORMILSON OROZCO HUERFANO
Ciudad:	Facativá Cundinamarca	Número de Documento:	80.721.726
Tipo de Examen Médico Ocupacional:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	Cargo:	Gerente
Datos de la Empresa Donde Labora, Laborará o Laboro el Trabajador o Aspirante:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL		
<u>APTO PARA DESARROLLAR LA LABOR</u>		
Observaciones: NO APLICA		
NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)		
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:		
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL		-----
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ACTIVIDAD FISICA	USO DE EPP	CONSERVAR EL EJERCICIO FISICOY ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

REMISION A EPS: NO

-

REMISION A ARL: NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas por solicitud de la empresa arribamencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional. Recibí copia del concepto médico ocupación de acuerdo con las evaluaciones médicas, estoy informando que el GRUPO MEDICO INTEGRAL IPS tendrá en custodia mi historia clínica ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 1918 de 2009. Así mismo autorizo a la IPS para suministrarle la información requerida para el buen cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica de medicina del trabajo, consignada en el concepto médico y en el diagnóstico de salud (Artículo 9,10,17 y 18 de la Resolución 2346 de 2007).

Médico

Aspirante o Trabajador

Carlos G. Riveros
Médico Cirujano
Especialista SST
TP 1639 - 85 Lic 3535-2019

DR. Carlos G. Riveros
CC 19273420

LUIS HORMILSON OROZCO HUERFANO
CC. 80.721.726

Especialidad. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Registro. 3535-2019

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



GRUPO MEDICO INTEGRAL VIVE

Dirección: CRA 1 # 6 -106
Nit: 900924678-3
E-mail: gerencia@viveips.com.co
Teléfonos: 3003430586



Fecha:	22/05/2026	Nombre del Trabajador:	MILSON SEGUNDO MORENO NEGRETE
Ciudad:	Facatativá Cundinamarca	Número de Documento:	PPT 794621
Tipo de Examen Médico Ocupacional:	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	Cargo:	Operario de piso
Datos de la Empresa Donde Labora, Laborará o Laboro el Trabajador o Aspirante:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS		

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL		
<u>APTO PARA DESARROLLAR LA LABOR</u>		
Observaciones: <i>NO APLICA</i>		
NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)		
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:		
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL		-----
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ACTIVIDAD FISICA	USO DE EPP	CONSERVAR EL EJERCICIO FISICOY ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

REMISION A EPS: NO

-

REMISION A ARL: NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico son verídicas y permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas por solicitud de la empresa arribamencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional. Recibí copia del concepto médico ocupación de acuerdo con las evaluaciones médicas, estoy informando que el GRUPO MEDICO INTEGRAL IPS tendrá en custodia mi historia clínica ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 1918 de 2009. Así mismo autorizo a la IPS para suministrarle la información requerida para el buen cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica de medicina del trabajo, consignada en el concepto médico y en el diagnóstico de salud (Artículo 9,10,17 y 18 de la Resolución 2346 de 2007).

Médico

Aspirante o Trabajador

Carlos G. Riveros

Médico Cirujano

Especialista SST

TP 1639 - 85 Lic 3535-2019


DR. Carlos G. Riveros
CC 19273420

MILSON SEGUNDO MORENO NEGRETE
PPT 794621

Especialidad. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Registro. 3535-2019

ANEXO 4

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 14
FASE
DIAGNOSTICO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/05/2026 AL 24/05/2026

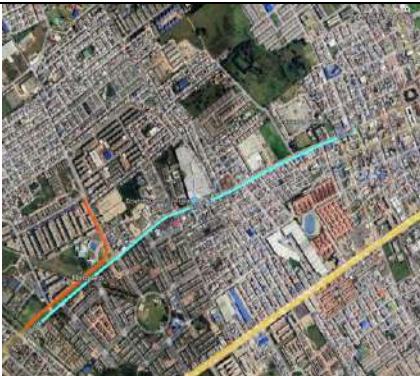Semana número	1	4	Desde:	DD	MM	AA	 <i>Ilustración 1, MOSQUERA – FUNZA y MOSQUERA BIBLIOTECA</i>	
CONTRATO No.				18	05	26		
N.º 1622-2025			Hasta:	DD	MM	AA		
% De Avance Físico				24	05	26		
19,84%			Fecha de informe	DD	MM	AA		
				25	05	26	 <i>Ilustración 2, FUNZA-TRES ESQUINAS</i>	
Población Beneficiada	MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA	Habitantes	307.995 hab.					
OBJETO DEL CONTRATO								
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								Localización Geográfica
								Municipio
MOSQUERA Y FUNZA								
INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA								
Contratista:		CORSEING S.A.S						
Contrato N°:		1622-2025		Fecha de suscripción:		31 de diciembre de 2025		
Valor:		\$ 2.909.090.910		Fecha de iniciación:		16 de febrero de 2026		
Plazo:		6 MESES		Fecha de vencimiento:		15 de agosto de 2026		

Interventor:	CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU79		
Contrato N°:	1607 - 2025	Fecha de suscripción:	31 de diciembre de 2025
Valor:	\$ 290.909.090	Fecha de iniciación:	16 de febrero de 2026
Plazo:	6 MESES	Fecha de vencimiento:	15 de agosto de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 31 de mayo de 2026 se desarrollaron actividades correspondientes al componente socioambiental del proyecto, orientadas a la actualización y consolidación de la información requerida para la fase de implementación de obra.

Como parte de estas actividades se realizó el levantamiento de actas de vecindad para el corredor Mosquera – Funza. sin embargo, para la etapa de implementación es necesario ajustar y complementar la información con base en los frentes de trabajo efectivamente definidos para la ejecución de las obras; por tal motivo se realizaron recorridos de verificación en campo, registro fotográfico, identificación de predios, establecimientos comerciales, equipamientos y demás actores presentes dentro del área de influencia directa de los corredores a intervenir, con el fin de contar con información actualizada para las actividades de atención a la comunidad y seguimiento socioambiental durante la ejecución de las obras.

De manera complementaria, se está realizando la actualización del Plan de Manejo Socioambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (PASAO) para radicarlo a Interventoría incorporando ajustes a los numerales relacionados con la gestión social preliminar, los programas del plan de gestión social y el reglamento de higiene y seguridad industrial.


Estas modificaciones se efectuaron con el propósito de armonizar el documento con las condiciones reales de ejecución de la obra, los frentes de trabajo definidos y las características operativas identificadas durante el inicio de la fase de implementación.

OBSERVACIONES

- Se está efectuando la modificación de algunos componentes del Plan de Manejo Socioambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (PASAO), con el fin de armonizar su contenido con las condiciones reales de ejecución del proyecto.
- Durante la semana se realizó el alistamiento, organización y preparación de las señales temporales, dispositivos de canalización y demás elementos requeridos para la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), garantizando su disponibilidad para el inicio de las actividades de obra y el adecuado manejo de la movilidad en los frentes de trabajo definidos.



Ing. NELSON DANIEL ORDUZ PEREZ
Director de Obra
CONTRATISTA



Ing. JUAN CARLOS MORALES ALBA
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 15

FASE

DIAGNOSTICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/05/2026 AL 31/05/2026

Semana número	1	5	Desde:	DD	MM	AA	
CONTRATO No.				25	05	26	
N.º 1622-2025			Hasta:	DD	MM	AA	
% De Avance Físico				31	05	26	
25,58 %			Fecha de informe	DD	MM	AA	
				1	06	26	
Población Beneficiada	MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA	Habitantes	307.995 hab.				

Ilustración 1, MOSQUERA – FUNZA

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Localización Geográfica

Municipio

MOSQUERA Y FUNZA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CORSEING S.A.S		
Contrato N°:	1622-2025	Fecha de suscripción:	31 de diciembre de 2025
Valor:	\$ 2.909.090.910	Fecha de iniciación:	16 de febrero de 2026
Plazo:	6 MESES	Fecha de vencimiento:	15 de agosto de 2026

Interventor:	CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU79		
Contrato N°:	1607 - 2025	Fecha de suscripción:	31 de diciembre de 2025
Valor:	\$ 290.909.090	Fecha de iniciación:	16 de febrero de 2026
Plazo:	6 MESES	Fecha de vencimiento:	15 de agosto de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana 15 se inició la fase de implementación de obra en el corredor de cicloinfraestructura Funza – Mosquera. Las actividades ejecutadas comenzaron con la instalación del cerramiento móvil de obra, el cual se implementa diariamente al inicio de la jornada y se retira al finalizar las actividades, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios. La

intervención se desarrolla por tramos operativos delimitados entre bocacalles e intersecciones, permitiendo una adecuada gestión del tránsito y control de la ejecución.

Como parte de las actividades preliminares se realizó el retiro de elementos existentes que interferían con la nueva implementación, incluyendo hitos flexibles, bordillos y tachas reflectivas, de acuerdo con los diseños aprobados para el corredor. Posteriormente se inició la ejecución de las actividades de señalización horizontal, comenzando con la aplicación de imprimante sobre las superficies objeto de intervención, medida en metros cuadrados (m^2), seguida de la aplicación de pintura azul en metros cuadrados (m^2), la ejecución de líneas longitudinales en metros lineales (ml) y finalmente la implementación de símbolos, pictogramas y demás marcas viales en metros cuadrados (m^2), conforme a los diseños establecidos para el proyecto.

Es importante señalar que el día 29 de mayo de 2026 se presentaron precipitaciones que generaron afectaciones parciales en el desarrollo de algunas actividades programadas. Así mismo, el día 30 de mayo de 2026 se ejecutaron actividades en jornada nocturna y el día 31 de mayo de 2026 se adelantaron trabajos en jornada de madrugada, con el fin de optimizar los rendimientos de obra, avanzar en la implementación por tramos y minimizar las afectaciones a la movilidad del corredor.

Todas las actividades fueron desarrolladas en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado, implementando la señalización temporal, cerramientos móviles parciales, dispositivos de canalización y demás medidas de seguridad requeridas para garantizar la protección de los usuarios de la vía y del personal de obra.

Al cierre de la semana, el proyecto registra avances de implementación correspondientes a:

Imprimante 2382,2 metros cuadrados (m^2)
Pintura 1295,2 metros cuadrados (m^2)
Pintura 1918,7 metros lineales (ml),
Retiro de tachas 58 unidades
Retiro de bordillos 20 unidades
Retiro de hitos 10 unidades

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

FOTO No. 1



Ilustración 2, Implementación 25 de mayo de 2026

FOTO No. 2



Ilustración 3, Implementación 26 de mayo de 2026

FOTO No. 3



Ilustración 4, Implementación 27 de mayo de 2026

FOTO No. 4



Ilustración 5, Implementación 30 de mayo de 2026

FOTO No. 3

FOTO No. 4



Ilustración 6, Implementación 31 de mayo de 2026

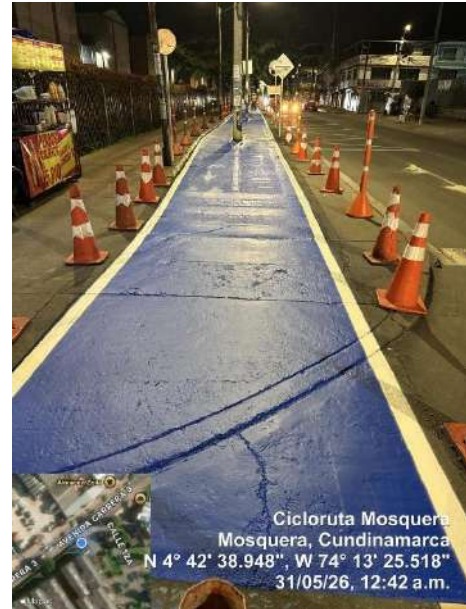


Ilustración 7, Implementación 31 de mayo de 2026


OBSERVACIONES

- El día 29 de mayo de 2026 se presentaron precipitaciones que afectaron parcialmente el desarrollo de las actividades programadas y los rendimientos previstos para la jornada.
- Con el fin de recuperar los rendimientos afectados por las condiciones climáticas y minimizar las afectaciones a la movilidad, se ejecutaron actividades en horario nocturno el día 30 de mayo y en jornada de madrugada el día 31 de mayo de 2026.
- Todas las actividades fueron ejecutadas de conformidad con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado y bajo las condiciones de seguridad establecidas para la intervención.
- Se está Instalando cerramiento con polisombra parcialmente únicamente se colocan conos y delineadores tubulares tipo colomina.

Ing. NELSON DANIEL ORDUZ PEREZ
Director de Obra
CONTRATISTA

Ing. JUAN CARLOS MORALES ALBA
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 16
FASE
DIAGNOSTICO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/05/2026 AL 31/05/2026

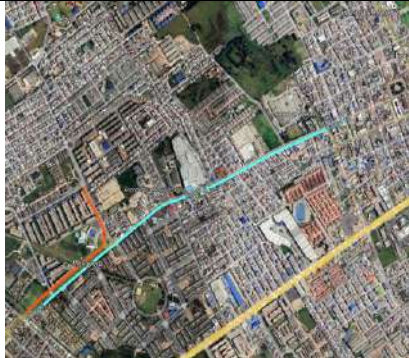Semana número	1	6	Desde:	DD	MM	AA	 <i>Ilustración 1, MOSQUERA – FUNZA y MOSQUERA BIBLIOTECA</i>  <i>Ilustración 2, FUNZA-TRES ESQUINAS</i>
CONTRATO No.				01	06	26	
N.º 1622-2025			Hasta:	DD	MM	AA	
% De Avance Físico				06	06	26	
36,06 %			Fecha de informe	DD	MM	AA	
				06	06	26	
Población Beneficiada	MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA	Habitantes	307.995 hab.				
OBJETO DEL CONTRATO							Localización Geográfica
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							Municipio
							MOSQUERA Y FUNZA
INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA							
Contratista:		CORSEING S.A.S					
Contrato N°:		1622-2025	Fecha de suscripción:		31 de diciembre de 2025		
Valor:		\$ 2.909.090.910	Fecha de iniciación:		16 de febrero de 2026		
Plazo:		6 MESES	Fecha de vencimiento:		15 de agosto de 2026		
Interventor:		CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU79					
Contrato N°:		1607 - 2025	Fecha de suscripción:		31 de diciembre de 2025		
Valor:		\$ 290.909.090	Fecha de iniciación:		16 de febrero de 2026		
Plazo:		6 MESES	Fecha de vencimiento:		15 de agosto de 2026		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana 16 continuaron las actividades de implementación de señalización horizontal y adecuación de la infraestructura así:

El día 1 de junio de 2026 se dio inicio a un nuevo frente de trabajo en el corredor Funza – Club San Andrés, comenzando las actividades desde el sector del Club de Golf San Andrés y avanzando conforme a la programación establecida.

Las actividades en el corredor Mosquera – Funza continuaron a partir de los trabajos iniciados durante la semana anterior; sin embargo, el día 2 de junio de 2026 se presentó una falla mecánica en el equipo de demarcación, situación que impidió la ejecución de las actividades programadas durante dicha jornada.

Durante los días 3 y 4 de junio de 2026 se continuó con la implementación de las actividades previstas en los 2 frentes de trabajo habilitados o tramos.

El día 5 de junio de 2026 se presentaron precipitaciones durante la jornada; no obstante, una vez mejoraron las condiciones climáticas, a las 10:03 a.m. se dio inicio a las actividades en el corredor Funza – Tres Esquinas, comenzando desde el sector de Tres Esquinas. Como actividad preliminar se ejecutaron labores de limpieza y retiro de vegetación en una franja aproximada de 0,50 m de ancho a lo largo de 158 metros lineales, con el fin de adecuar las condiciones de la infraestructura para la implementación de las actividades posteriores.

Con el propósito de mantener los rendimientos de obra y recuperar parte del tiempo afectado por las condiciones climáticas y la falla mecánica presentada durante la semana, el día 6 de junio de 2026 se desarrollaron actividades en jornada nocturna en el corredor Mosquera – Funza, mientras que el día 7 de junio de 2026 se ejecutaron trabajos en horario de madrugada sobre el mismo corredor.

Todas las actividades fueron desarrolladas de conformidad con las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado, implementando la señalización temporal y las medidas de seguridad requeridas para garantizar la adecuada protección de los usuarios de la vía y del personal de obra.

Al cierre de la semana, el proyecto registra avances de implementación correspondientes al tramo Mosquera-Funza:

Imprimante 802,7 metros cuadrados (m²)

Al cierre de la semana, el proyecto registra avances de implementación correspondientes al tramo Funza-Tres Esquinas:

Imprimante 2.076,2 metros cuadrados (m²)

Pintura 2.088,9 metros cuadrados (m²)

Pintura 2.076,2 metros lineales (ml)

Limpieza zona verde 79 metros cuadrados (m²)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

FOTO No. 1



Ilustración 3, Implementación 01 de junio de 2026, Mosquera-Funza

FOTO No. 2



Ilustración 4, Implementación 01 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 3



Ilustración 5, Implementación 02 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 4



Ilustración 6, Implementación 03 de junio de 2026, Mosquera-Funza

FOTO No. 5



Ilustración 7, Implementación 03 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 6



Ilustración 8, Implementación 04 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 7



Ilustración 9, Implementación 05 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 8



Ilustración 10, Implementación 05 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 9



Ilustración 11, Implementación 05 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 10



Ilustración 12, Implementación 05 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 11

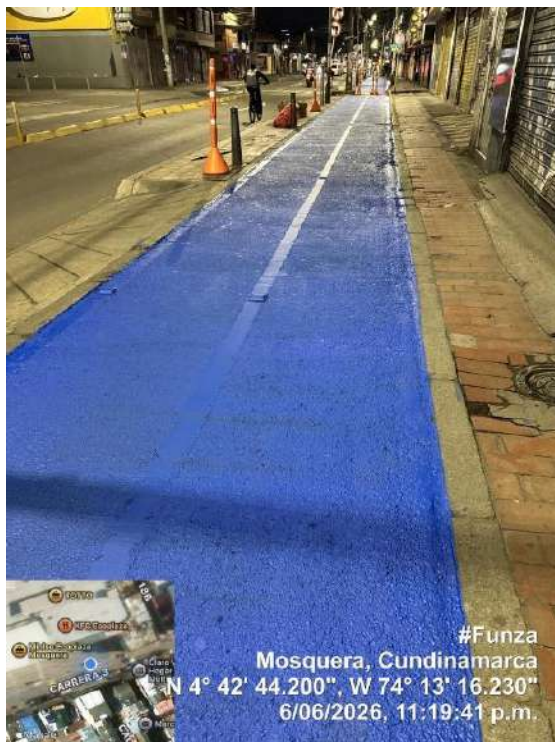


Ilustración 13, Implementación 06 de junio de 2026, Mosquera-Funza

FOTO No. 12




Ilustración 14, Implementación 07 de junio de 2026, Mosquera-Funza

OBSERVACIONES

- El día 2 de junio de 2026 se presentó una falla mecánica en el equipo de demarcación utilizado en el corredor Mosquera – Funza, situación que generó la suspensión temporal de las actividades programadas para dicha jornada y requirió ajustes en la programación de obra.
- El día 5 de junio de 2026 se registraron precipitaciones que afectaron parcialmente el desarrollo normal de las actividades; sin embargo, una vez mejoraron las condiciones climáticas fue posible dar inicio a los trabajos programados en el corredor Funza – Tres Esquinas.
- Con el fin de compensar los retrasos ocasionados por las condiciones climáticas y la falla mecánica presentada, se ejecutaron actividades en horario nocturno el día 6 de junio y en jornada de madrugada el día 7 de junio de 2026 en el corredor Mosquera – Funza.
- Todas las actividades fueron ejecutadas de conformidad con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado y bajo las condiciones de seguridad establecidas para la intervención.


Ing. NELSON DANIEL ORDUZ PEREZ
Director de Obra
CONTRATISTA
Ing. JUAN CARLOS MORALES ALBA
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 17
FASE
DIAGNOSTICO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/06/2026 AL 14/06/2026

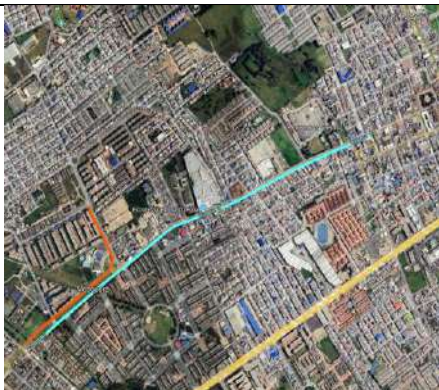Semana número	1	7	Desde:	DD	MM	AA	
CONTRATO No.				08	06	26	
N.º 1622-2025			Hasta:	DD	MM	AA	
% De Avance Físico				14	06	26	
44.99%			Fecha de informe	DD	MM	AA	
				15	06	26	
Población Beneficiada	MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA		Habitantes	307.995 hab.			
OBJETO DEL CONTRATO						Localización Geográfica	
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						Municipio	
						MOSQUERA Y FUNZA	
INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA							
Contratista:		CORSEING S.A.S					
Contrato N°:		1622-2025		Fecha de suscripción:		31 de diciembre de 2025	
Valor:		\$ 2.909.090.910		Fecha de iniciación:		16 de febrero de 2026	
Plazo:		6 MESES		Fecha de vencimiento:		15 de agosto de 2026	

Interventor:	CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU79		
Contrato N°:	1607 - 2025	Fecha de suscripción:	31 de diciembre de 2025
Valor:	\$ 290.909.090	Fecha de iniciación:	16 de febrero de 2026
Plazo:	6 MESES	Fecha de vencimiento:	15 de agosto de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana 17 continuaron las actividades de implementación de señalización horizontal y adecuación de la infraestructura en los corredores Mosquera – Funza y Funza – Tres Esquinas, de conformidad con la programación establecida para la ejecución del contrato.

Durante los días 10, 11 y 12 de junio de 2026 se ejecutaron actividades en el corredor Mosquera – Funza, desarrollando labores de preparación de la superficie, aplicación de 1.665,60 m² de imprimante, aplicación de 1.665,60 m² de pintura y ejecución de 2.002,40 metros lineales de demarcación horizontal, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y el Manual de Señalización Vial vigente. Adicionalmente, el 12 de junio de 2026 se realizó el retiro de quince (15) hitos, como parte de las actividades de adecuación de la infraestructura para la implementación de la nueva señalización.

De igual manera, durante los días 11 y 12 de junio de 2026 se dio continuidad a las actividades en el corredor Funza – Tres Esquinas, donde se ejecutó la preparación de la superficie para la aplicación de materiales, alcanzando la implementación de 411,40 m² de imprimante, 411,40 m² de pintura y 2.248,40 metros lineales de demarcación horizontal, conforme a la programación de obra establecida.

El día 13 de junio de 2026 se presentaron precipitaciones durante la jornada, condición climática que impidió la ejecución de las actividades programadas en ambos frentes de trabajo, debido a que la humedad de la superficie no permitía garantizar la adecuada adherencia y calidad de los materiales de demarcación horizontal. En consecuencia, las actividades fueron suspendidas y reprogramadas para la siguiente jornada de trabajo.

Todas las actividades fueron desarrolladas de conformidad con las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado, implementando la señalización temporal, los cerramientos móviles y las medidas de seguridad requeridas para garantizar la protección de los usuarios de la vía, los ciclistas, los peatones y el personal vinculado a la ejecución de la obra.

Al cierre de la semana, el corredor Mosquera – Funza registró la aplicación de 1.665,60 m² de imprimante, 1.665,60 m² de pintura, 2.002,40 metros lineales de demarcación horizontal y el retiro de 15 hitos. Por su parte, en el corredor Funza – Tres Esquinas se ejecutó la aplicación de 411,40 m² de imprimante, 411,40 m² de pintura y 2.248,40 metros lineales de demarcación horizontal, consolidando el avance programado para ambos frentes de intervención durante la semana.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

FOTO No. 1



Ilustración 3, Implementación 09 de junio de 2026, Mosquera-Funza

FOTO No. 2

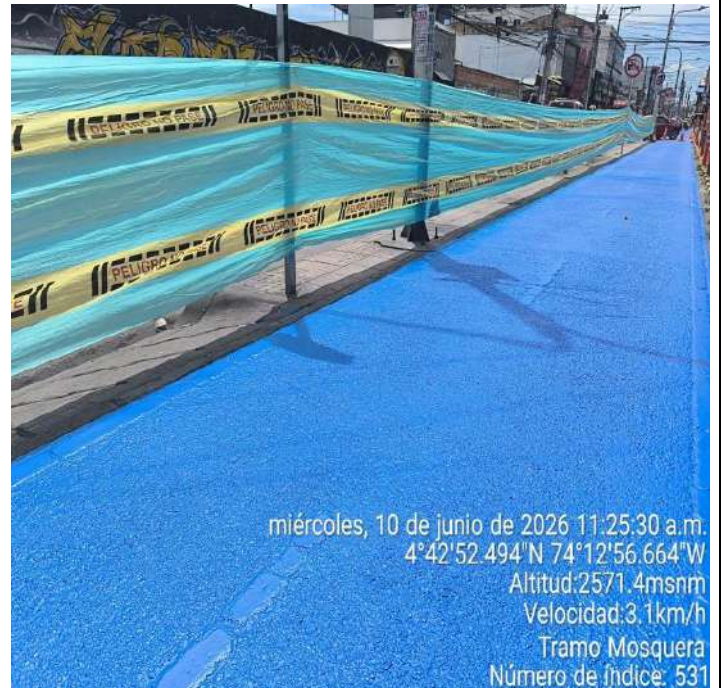


Ilustración 4, Implementación 10 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 3



Ilustración 5, Implementación 11 de junio de 2026, Funza-Tres Esquinas

FOTO No. 4



Ilustración 6, Implementación 12 de junio de 2026, Mosquera-Funza

OBSERVACIONES

- El 13 de junio de 2026 se presentaron precipitaciones durante la jornada, condición climática que obligó a suspender las actividades de aplicación de imprimante y pintura, debido a que la humedad de la superficie no garantizaba las condiciones técnicas necesarias para asegurar la adecuada adherencia, secado y durabilidad de los materiales de demarcación horizontal. En consecuencia, las actividades pendientes fueron reprogramadas para la siguiente jornada de trabajo.
- Las labores ejecutadas durante la semana se desarrollaron sin incidentes que afectaran la seguridad del personal o de los usuarios de la vía, manteniendo en todo momento la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la señalización temporal y los controles operacionales requeridos para la ejecución segura de las intervenciones.



Ing. NELSON DANIEL ORDUZ PEREZ
Director de Obra
CONTRATISTA



Ing. JUAN CARLOS MORALES ALBA
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA

ANEXO 5

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución: Abogera - Cundinamarca 21 de mayo de 2026
 Empresa: Consorcio / Corseing Ingeniería a su servicio NIT: 900.238.384-1
 Tema Capacitación: Inducción Seguridad y salud en el trabajo; Peligros y riesgos Hora Inicio 7:00am Hora Final 7:30am
 Capacitador: Andrés Navarrete Duración Treinta minutos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Wilson Segundo M.	794621	Operario	3186669535	
2	Juan Jose Prieto Hna	1061049772	Jefe operario	3233410177	
3	Alan Marquez Escobar	1065843646	operario	3208743679	
4	Diego Alejandro Malagon	7018432001	Residente	3208741856	
5	Jorge Andres Navarrete	672033437	Instructor	3208699450	
6					
7					
8					
9					
10					

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 5

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

Versión: 01
 Código: SG-SST-PyP-01
 Fecha de elaboración:
 Responsable: Coordinador SG-SST

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 1-06-2026 Fianza Coordinación
 Empresa: Caseng "Ingeniería a su servicio" NIT: 900 218.384-1
 Tema Capacitación: Uso adecuado de EPP Hora Inicio 10:00 Hora Final 10:15
 Capacitador: Jorge Andres Moya Duración 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	*TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Santiago Sanabria Cruz	106593614	Operario	3143370080	Santiago S.
2	Blm martinez Escobar	106581766	Operario	3008743679	
3	Hyron Segundo Mora	794621	Operar.	3186669536	
4	Maikol CENTENO O.	1063957409	Operario	3012146163	Maikol
5	Wlms DOMÍNGUEZ PUHELO	1002409375	Operario	304425376	
6	Alvaro Páez Robles	108418911	Operario	3044596618	
7	Joan Daniel Ojeda	105240663	Ing Apac	3227204130	
8	Juan Jos Pato Hu	106144811	Jefe	323341977	
9					
10					

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 9

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 2-06-2026 Fuzza condina naca
 Empresa: Correing "Ingeniería a su servicio" NIT: 900.278.314-1
 Tema Capacitación: Prevención de caídas a una nivel Hora Inicio 10:00a Hora Final 10:15a
 Capacitador: Jaige Andres xlaquasta Ganez Duración 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Spilago Sanabria Cruz	10659364	operario	3143320080	Spilago S.
2	Alan maxuez Escobar	10658116	operario	3008743679	Alan
3	Luisa Peña Robles	108247041	Operario	3014540615	Luisa
4	Mez dominuez Pacheco	1097409375	operario	3011125326	Mez
5	PAIKOL CENTENO D.	1063957409	operario	3012146163	PAIKOL
6	Marlon Quintana	10999895	Operario	3125910121	Marlon
7	Juan Daniel Pidot	1052406061	Ing Apoyo	3222404530	Juan
8	Juan José Pinto Renu	106104077	jepe opre	3233410178	Juan
9					
10					

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 8

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 3-06-2026 Mosquera - Cundinamarca
 Empresa: Corcing Ingeniería a su servicio NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: manipulación de cargas Hora Inicio 9:00am Hora Final 9:15am
 Capacitador: Jorge Andres Hlavarsky Gonce Duración 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	*TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Jorge Sanchez Cruz	106659364	Operario	3143520080	Jorge S.
2	Alan Marquez Escobar	106584764	Operario	3008743679	Alan
3	Walter Pardo Roldán	106241001	Operario	3014550015	Walter
4	Hugo Domínguez Pacheco	1082409375	Operario	3011095376	Hugo
5	LAIKO CENTENO O.	1063957409	Operario	3012146163	LAIKO
6	MARTIN CASISTERO	79998951	Verificador	3125916171	Martin
7	Juan Daniel Ochoa C.	105906065	Ing Apoy	3222704130	Juan
8	Juan José Prieto Henao	1061048731	Jefe Oper	3133410177	Juan
9					
10					

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 12392 # de asistentes 8

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 4-06-2026 Mosquera - Cundinamarca
 Empresa: Corcing "Ingeniería a su servicio" NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: Riesgos por productos inflamables Hora Inicio 8:00 am Hora Final 8:05 am
 Capacitador: Jaime Andra Novaira ECOMEL Duración 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	*TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	JOSE Solano	1192753694	AUXILIAR	3022251326	JOSE
2	HEINER Peña Robles	1082410941	AUXILIAR	3014590615	HEINER
3	Solano. Cacac Mastriver	119392389	AUXILIAR	3137247525	
4	Alan MARQUEZ ESCOBAR	106584364	AUXILIAR	30087413674	Alan
5	RAIKOL CENTENO	106395740	OPERARIO	3012146163	RAIKOL
6	MARTIN DOMINGUEZ PARRUCIA	1082410933	OPERARIO	3011125326	MARTIN
7	Roben Hernandez	82385369	OPERARIO	3127550659	
8	Heiner manuel Vasquez Blanco	104749823	OPERARIO	32341041677	Heiner
9	Juan Jos Roldan	106040177	JEFE OPER	3233410121	
10	MARLEN GONZALEZ	79998951	Residente	3125916121	MARLEN

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 5-06-2026 Funza cond. normal
 Empresa: Corceing "ingeniería en seguridad" NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: Plan de emergencia Hora inicio 10:00a Hora Final 10:15m
 Capacitador: Jorge Andres Flavanete Gomez Duración 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	JOSÉ SOLANO	1192783694	AUXILIAR	3022251826	JOSÉ
2	MARCELO PEÑA ROBLES	168240944	AUXILIAR	3014540615	MARCELO
3	SOLMAN YISID COCAER MARTÍNEZ	1119392389	AUXILIAR	3137247525	YISID
4	BLANCA MARCELA ESCOBAR	106584106	AUXILIAR	3008747679	BLANCA
5	MAIKOL CENTENO O.	1063957409	OPERARIO	3012146163	MAIKOL
6	MARTÍN DOMÍNGUEZ PECHERO	1082404325	OPERARIO	301125326	MARTÍN
7	DORA HERNÁNDEZ	82385369	OPERARIO	3127550659	DORA
8	HEINER MANUEL VÁSQUEZ BLANCO	104749582	OPERARIO	3234047677	HEINER
9	JUAN JOSÉ PUERTO HERNÁNDEZ	1081045727	JEFE DE EQUIPO	3233410122	JUAN JOSÉ
10	MARCELO AGUIRRE	79998751	RESIDENTE	3125916121	MARCELO

Firma capacitadora: ATD N° Licencia expositor: 72572 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución Mosquera - Coordinadora 6 de junio - 2026
 Empresa: Coising "ingeniería y su servicio" NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: Uso de EPP - Riesgos Hora Inicio 7:00pm Hora Final 7:15pm
 Capacitador: Jorge Andres Alvarado Duración 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Roberto Hernandez	82385369	AUXILIAR	3127550659	Roberto
2	José Salas	1192782674	AUXILIAR	322251376	José
3	Renner Peña Robles	1062410941	AUXILIAR	3014540615	Renner
4	Yolma José Caceres Medina	1193923891	AUXILIAR	3137247327	Yolma
5	Alfonso Martínez Escobar	1065843640	OPERARIO	3008743679	Alfonso
6	Maikel CENTENO O.	1063957409	OPERARIO	3012146163	Maikel
7	MARTÍN DOMÍNGUEZ PALACIOS	108244725	OPERARIO	3011125376	Martin
8	Heinermanuel Vasquez Blanco	1047405873	OPERARIO	3234041677	Heinermanuel
9	Juan José Prieto Irujo	1081040722	OPERARIO	3233410171	Juan José
10	MARLON QUINTERO	7999899	RESIDENTE	3175916121	Marlon

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 72592 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 9-06-2026 Mosquera - Cond. Inga a ca
 Empresa: Co. Geing " Ingenieros en su servicio " NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: Identificación y protección solar Hora Inicio 6:30 am Hora Final 6:45 am
 Capacitador: Jorge Andres Menaletto Gomez Duración 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	JOSÉ SOLANO	1192783694	AUXILIAR	3022251826	JOSÉ
2	LIVIER RAFA ROBLES	1082418944	ALX 11185	314590615	Livier
3	Yolma Yelit Caceres M. J. No.	1119392389	Aux. P. a.	3137247525	Yolma
4	Olga Marcela ESCOBAR	1065843046	AUX. I. E	3008743679	Olga
5	YAILOR CENTENO	1063957409	OPERARIO	3012146163	Yailor
6	MULTI DOMINGUEZ PACHECO	1282410933	OPERARIO	301175326	MULTI
7	DABEN HERNANDEZ	82385369	OPERARIO	3127550659	Daben
8	Heiner manuel VASQUEZ BLANCO	1047495873	OPERARIO	3234047672	Heiner
9	Juan José PULIDO	1081040707	JEFE OPERARIO	3233410172	Juan José
10	MARCON QUINTERO	929978751	RESIDENTE	3175996171	Marcon

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 10-06-2026 Masacua - Cundinamarca
 Empresa: Carceing "Ingeniería a su servicio" NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: Orden y aseo en el área de trabajo Hora Inicio 10:00a Hora Final 10:15a
 Capacitador: Jorge Andres Alvarado Gomez Duración 15 minutos



No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Dian Marquez Escobar	105584790	puj. / or	3008743699	<i>[Signature]</i>
2	Javier Polo morales	115291397	AUI	3227767525	<i>[Signature]</i>
3	Heiner manuel Vasquez Blanco	1067495873	Operario	3234047677	Heiner
4	Yairkel José CENIL ENO	1063957409	Operario	3012146163	Yairkel
5	MARTIN DOMINIQUEZ PUELLO	1082404375	Operario	3028217486	<i>[Signature]</i>
6	WILSON Peña Robles	108241947	Operario	3014342615	Wilson
7	Santiago Sanabria Cruz	106595614	Operario	31143320080	Santiago S.
8	Jose Andres Solano	1192783494	Operario	3022251826	Jose
9	Juan José Prieto Bar	106104872	Jepe operario	3233410177	<i>[Signature]</i>
10	MATHEO GUASTERO	7999895	Residente	3125916021	<i>[Signature]</i>

Firma capacitadora: *[Signature]* N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 11-06-2026 Fuzza - Cundinamarca
 Empresa: Corseing "ingenieros a su servicio" NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: Posturas Seguras durante la aplicación Hora Inicio 10:30a Hora Final 12:45a
 Capacitador: Jorge Andres Navarrete Gance Duración 15 minutos



No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Alan marquez Escobar	10558470610	PUJILLEN	3008743679	
2	Sara Pata mendoza	1152945929	ALUX	3227767525	
3	Heinermanuel vasquez Plancol	1064495873	Operario	3234041677	Heiner
4	Maikol Jose Centeno	1063957409	Operario	3012146163	Maikol
5	MADRID DOMÍNGUEZ PACHECO	1082409375	Operario	301175376	
6	Walter Peña Babler	108246943	Operario	3014590615	Walter
7	Santiago Sanabria Cruz	106593614	Operario	3142320080	Santiago S.
8	Jose Andres splano	1192783694	Operario	322251826	Jose
9	Juan José Prieto Henao	1061043777	Jepe Operario	3233410177	
10	NACION QUINTECO	999985151	Resistente	3125916121	

Firma capacitadora: ATD N° Licencia expositor: 12572 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 12-06-2026 Fuzar Cardinamarca
 Empresa: Corseing Ingeniería a su servicio NIT: 900.278.384-1
 Tema Capacitación: Delimitación áreas de trabajo Hora Inicio 10:00 am Hora Final 10:30 am
 Capacitador: Jorge Andres Mauricio Duración 30 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	*TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Alan Muñoz Escobar	106584360	auxiliar	3028747679	
2	Jorge Polo Mendoza	1152943939	aux	3227767525	
3	Heiner Manuel Vasquez Blanco	1047445873	Operario	3234041672	Heiner
4	PAUL JOSE CENTENO	1063957408	Operario	3012146163	Paul
5	MARTIN DOMINGUEZ	1082404375	Operario	301175376	
6	José Luis Peña Reales	1082470947	Operario	3014590675	Jose
7	Wilson Perena	794621	Operario	3186669555	
8	Santiago Sandoval Cruz	1016592610	Operario	314332008	Santiago S.
9	José Andre Salgado	1192783694	Operario	3222251826	Jose
10	Juan José Prieto Lleras	1061048170	jefe de op	3233410177	

Firma capacitadora:  N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución Mosquera - Cundinamarca 25-05-2026
 Empresa: Coaseing Ingeniería y So. Técnico NIT: 900.278.394-7
 Tema Capacitación: Uso de EPP Hora Inicio 8:00am Hora Final 8:15am
 Capacitador: Jorge Andrés Alvarado Duración 15 minutos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C.	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Heiner manuel Vasquez Blanco	1047493843	Operario	323 4041677	Heiner Blanco
2	Alfonso Marquez Escobar	1065843640	Operario	7008743679	Alfonso
3	Wilson Segura Ocampo	794671	Operario	3186669535	Wilson
4	Juan José Prieto Ruiz	1061048777	Operario	323 3410177	Juan Prieto
5	Santiago Sanabria	1066393614	Operario	3143320080	Santiago Sanabria
6	Juan Diego Oidor P.	108406061	Ing. Apoyo	3122704130	Juan Diego
7	Diego Malagon	1084432884	Presidente	3188603107	Diego Malagon
8	Diana Paola Prieto	35538073	Especialista tránsito	3112353565	Diana Prieto
9					
10					

Firma capacitadora: [Firma] N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 8

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

Versión: 01
 Código: SG-SST-PyP-01
 Fecha de elaboración:
 Responsable: Coordinador SG-SST

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución: Mosquera - Cundinamarca 26 de mayo de 2026
 Empresa: Consorcio / Consorcio Ingeniería a Distancia NIT: 900.277.384-1
 Tema Capacitación: Identificación de riesgos en el área de trabajo Hora Inicio: 8:00 am Hora Final: 8:45 am
 Capacitador: Jorge Andres Mavarete Duración: 15 minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Wilson Moreno	794671	Operario	3186669671	<i>[Firma]</i>
2	Alan Martinez	10684367	Operario	3008743674	<i>[Firma]</i>
3	Héner Vasquez Blanco	1017495843	Operario	3234041677	Héner Blanco
4	Juan José Pineda	1061049777	Jefe operario	3233410172	<i>[Firma]</i>
5	Santiago Sanabria	1016593610	Operario	3103320080	Santiago Sanabria
6	Diego Malagon	1018452809	Presidente	3188663109	<i>[Firma]</i>
7	Joan Daniel Orduz	105240606	Ingeniero Apoyo	3222704530	<i>[Firma]</i>
8	Heiner Manuel Vasquez	104749813	Operario	3234041677	Heiner Blanco
9					
10					

Firma capacitadora: *[Firma]* N° Licencia expositora: 12592 # de asistentes: 8

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

Versión: 01
 Código: SG-SST-PYP-01
 Fecha de elaboración:
 Responsable: Coordinador SG-SST

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución 30/05/2026
 Empresa: Ingeniería y seguridad Vial Poble Vias NIT: 901440640
 Tema Capacitación: Manejo instrumentos seguridad vial Hora Inicio 7:30 pm Hora Final 8:00 pm
 Capacitador: Jaime Andres Marmoreta Gomez Duración 30 min

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	* TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Diego Malagón	1018433889	Residente	3189603002	<i>[Firma]</i>
2	YAIKOL CENTENO	1063957409	Operario	3012146163	<i>[Firma]</i>
3	YAIKOL RIVERA RIVERA	108247814	Operario	3014590675	<i>[Firma]</i>
4	Milen Moreno Negret	794621	Operario	3188864536	<i>[Firma]</i>
5	Maurin DOMINGUEZ RIVERA	1082409375	Operario	31041175376	<i>[Firma]</i>
6	Juan Jose Pineda Hen	1061040211	Operario	3233410177	<i>[Firma]</i>
7	Heiner manuel Vasquez Blanco	104749883	Operario	3234041677	<i>[Firma]</i>
8	Santiago Sandoval	106593414	Operario	3103370080	<i>[Firma]</i>
9	Morlan QUINTERO	99998951	Residente	3175916121	<i>[Firma]</i>
10	Joan Daniel Ordoz	1052406061	Ing Apoyo	3222104530	<i>[Firma]</i>

Firma capacitadora: *[Firma]* N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 10

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

ANEXO 6

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 1

Herramienta maquina	Numero de Inventario 2	Fotografía 
Marca titan	Serie 4900	
Modelo 2021	Color Rojo-negro	
Fecha de compra 3/04/2025	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
preventivo	23/07/2025	Juan jose prieto	Cambio de filtros
reparación	16/08/2025	Gilberto paipilla	Reparación de motor y cambio de empaquetadura
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL		Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Versión:	3
			Página:	1 de 1

Herramienta maquina	Numero de Inventario 1	Fotografía 
Marca titan	Serie 8900	
Modelo 2021	Color Rojo-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2024	Juan jose prieto	Limpieza general
preventivo	23/03/2025	Juan jose prieto	Cambio de filtros
limpieza	16/08/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
reparación	19/09/2025	Gilberto paipilla	Reparación de motor y cambio de empaquetadura
limpieza	26/01/2026	Juan jose prieto	
preventivo	9/04/2026	Juan jose prieto	Cambio de mangueras de succión

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 1

Herramienta maquina	Numero de Inventario 3	Fotografía 
Marca line driver	Serie Hd200	
Modelo 2021	Color azul-negro	
Fecha de compra 3/04/2025	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser:
Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
preventivo	23/07/2025	Juan jose prieto	Cambio de filtros
reparación	16/08/2025	Gilberto paipilla	Reparación de motor
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL		Código: GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Versión: 3
			Página: 1 de 1

Herramienta maquina	Numero de Inventario 4	Fotografía 
Marca bauer	Serie 6500	
Modelo 2021	Color verde-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
preventivo	23/07/2025	Gilberto paipilla	Reparación de motor
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 2

Herramienta SOPLADORA PEQUEÑA	Numero de Inventario 18	Fotografía 
Marca DEWALT	SERIE 815	
Modelo 2021	Color Amarillo-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	23/07/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales

	AREA OPERACIONAL		Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Versión:	3
			Página:	2 de 2

Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato
-------------	---	-------------------	-------------------------------

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 2

Herramienta SOPLADORA	Numero de Inventario 15	Fotografía 
Marca HUSQVARNA	SERIE CH15	
Modelo 2021	Color Naranja-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	23/07/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL		Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Versión:	3
			Página:	2 de 2

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 1

Herramienta rotomartillo	Numero de Inventario 5	Fotografía 
Marca makita	Serie 430	
Modelo 2021	Color verde-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	23/07/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 1

Herramienta rotomartillo	Numero de Inventario 5.1	Fotografía 
Marca makita	Serie 430	
Modelo 2021	Color verde-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser:
Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	23/07/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 1

Herramienta maquina	Numero de Inventario 4	Fotografía 
Marca titan	Serie 440	
Modelo 2021	Color rojo-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
preventivo	23/07/2025	Juan jose prieto	Cambio de filtros y de empaques
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 1

Herramienta maquina	Numero de Inventario 4.1	Fotografía 
Marca titan	Serie 440	
Modelo 2021	Color rojo-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser: Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
preventivo	23/07/2025	Juan jose prieto	Cambio de filtros y de empaques
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

	AREA OPERACIONAL	Código:	GTH-F-63
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Versión:	3
		Página:	1 de 1

Herramienta demoledor	Numero de Inventario 12	Fotografía 
Marca ELITE	Serie DH1654151	
Modelo 2021	Color azul-negro	
Fecha de compra 3/04/2023	Vida Útil 10 años	

Los Mantenimientos para realizar en la maquinaria podrán ser:
Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES
limpieza	14/05/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	23/07/2025	Juan jose prieto	Limpieza general
limpieza	9/04/2026	Juan jose Prieto	Limpieza general

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan José Prieto Henao	Luis Hormilson Orozco	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	ÍTEM	MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	2	Todo el documento	Se revisó y actualizo acorde con el programa para el manejo de herramientas manuales
Agosto 2025	3	Todo el documento	Se revisó y ajusto el formato

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución Yaguajay - Cardenas 21 de mayo de 2026
 Empresa: Consortio / Corseing Ingeniería a su servicio NIT: 900.278.364-1
 Tema Capacitación: Inducción Seguridad y salud en el trabajo Hora inicio 7:00am Hora Final 7:30am
 Capacitador: Andres Navarrete Duración Treinta minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	*TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Alfonso Segundo N.	794621	Operari	3186669535	
2	Juan Jose Prieto Hnos	104104972	Jefe operador	3233410177	
3	Alan Marquez Escobar	106584366	operario	3008743679	
4	Diego Alejandro Malagon	101843281	Presidente	3208741856	
5	Jorge Andres Navarrete	611033437	Inspector	3208699450	
6					
7					
8					
9					
10					

Firma capacitador: [Firma] N° Licencia expositor: 12592 # de asistentes 5

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

Versión: 01
 Código: SG-SST-PyP-01
 Fecha de elaboración:
 Responsable: Coordinador SG-SST

LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS SST

Ciudad y Fecha de ejecución Moquegua - Andarimarra 21 de mayo de 2016
 Empresa: Consorcio / Corseing Ingeniería a su servicio NIT: 900.238.384-1
 Tema Capacitación: Inducción Seguridad y Salud en el trabajo Hora Inicio 7:00am Hora Final 7:30am
 Capacitador: Andrés Navarrete Duración Treinta minutos

No	NOMBRE Y APELLIDO DE ASISTENTE	C.C	CARGO	*TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Wilson Segundo M.	794621	Operario	3186669535	
2	Juan Jose Prieto Hna	10104877	Jefe operador	3233410177	
3	Alan MARQUEZ ESCOBAR	10658464	operario	3008743679	
4	Diego Alejandro Malagon	10184377	Presidente	3208741856	
5	Jorge Andres Navarrete	61633431	Inspedor	3208699450	
6					
7					
8					
9					
10					

Firma capacitador: [Firma] N° licencia expositiva: 12592 # de asistentes 5

*El teléfono a registrar corresponde al trabajador participante de la formación.

Verificar G1
 Cargar SG-SST-P-P-G1
 Fecha de actualización:
 Responsable: Coordinador SG-SST

INGENIERÍA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VÍA S.A.S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)		Código: Version: 1
FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL - MÁQUINA TITAN LINE DRIVER 4900		

Fecha:	21/05/2026	Hora:	7:00
Obra / Frente:	absorción - FURTA	Ubicación:	vehículo
Operador:	Juan Jose Rello	Inspector:	SSI
Equipo / Activo No.:	LineDriver 4900 - Titan 8900	Horómetro:	_____ h

Instrucciones: Marque cada punto como C (Conforme), NC (No conforme) o NA (No aplica). Si existe cualquier NC en seguridad crítica, el equipo se declara NO APTO y no debe operar hasta corregir.

1. Documentación y elementos obligatorios

No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción Inmediata
1	Registro de mantenimiento preventivo disponible y al día	☒	☐	☐	
2	Bitácora / historial de fallas actualizado	☒	☐	☐	
3	Manual de operación del equipo disponible (físico o digital)	☒	☐	☐	
4	SDS (fichas de datos de seguridad) de pintura / solvente disponibles (si aplica)	☒	☐	☐	
5	Plan de manejo de tráfico / permiso de intervención en vía aprobado (si aplica)	☒	☐	☐	
6	Extintor ABC vigente, con manómetro en zona verde	☒	☐	☐	
7	Botiquín completo y accesible	☒	☐	☐	
8	Kit para control de derrames (absorbentes, bolsas, guantes) disponible	☒	☐	☐	
9	Conos, delineadores, cintas y señales portátiles disponibles para aislamiento	☒	☐	☐	

2. EPP del operador y condiciones de la cuadrilla

No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción Inmediata
1	Casco de seguridad en buen estado (si aplica por el frente de obra)	☒	☐	☐	
2	Chaleco reflectivo clase 2 o 3 en buen estado	☒	☐	☐	
3	Gafas de seguridad o careta según tarea	☒	☐	☐	
4	Guantes adecuados (nitrilo/neopreno para solventes; mecánicos para mantenimiento)	☒	☐	☐	
5	Protección respiratoria con cartuchos para vapores orgánicos (OV/Tipo A) cuando aplique	☒	☐	☐	
6	Protección auditiva disponible y en uso cuando aplique	☒	☐	☐	
7	Calzado de seguridad antideslizante	☒	☐	☐	
8	Ropa de trabajo manga larga / overol (sin partes sueltas)	☒	☐	☐	
9	Comunicación definida con la cuadrilla (radios / señales) y roles claros	☒	☐	☐	

3. Seguridad general del equipo

No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción inmediata
1	Estructura general sin fisuras, golpes severos o piezas sueltas	☒	☐	☐	
2	Asiento firme y en buen estado (sin roturas que afecten la postura)	☒	☐	☐	
3	Cinturón de seguridad funcional (si aplica)	☒	☐	☐	
4	Barra antivuelco/ROPS en buen estado (si aplica)	☒	☐	☐	
5	Guardas y protectores instalados en partes móviles (correas, ventilador, transmisión)	☒	☐	☐	
6	Etiquetas/advertencias legibles	☒	☐	☐	
7	Parada de emergencia funciona correctamente	☒	☐	☐	
8	Bocina funcional	☒	☐	☐	
9	Alarma de reversa funcional (si aplica)	☒	☐	☐	
10	Baliza/luces de trabajo operativas (si aplica)	☒	☐	☐	
11	No hay derrames visibles de combustibles, aceites o fluidos	☒	☐	☐	

4. Motor y sistema eléctrico

No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción inmediata
1	Nivel de aceite del motor dentro de rango	☒	☐	☐	
2	Nivel de refrigerante (si aplica) dentro de rango y sin fugas	☒	☐	☐	
3	Filtro de aire limpio y correctamente instalado	☒	☐	☐	
4	No se observan fugas de combustible	☒	☐	☐	
5	Batería sujeta, bornes limpios y sin sulfatación	☒	☐	☐	
6	Cableado sin peladuras, empalmes inadecuados o conexiones sueltas	☒	☐	☐	
7	Arranque normal (sin ruidos anormales) y sin humo excesivo	☒	☐	☐	
8	Indicadores/luces del tablero funcionan	☒	☐	☐	

5. Sistema hidráulico y de tracción

No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción inmediata
1	Nivel de fluido hidráulico dentro de rango (si aplica)	☒	☐	☐	
2	Mangueras hidráulicas sin grietas, abombamientos o rozaduras	☒	☐	☐	
3	Conectores y acoples sin fugas	☒	☐	☐	
4	Respuesta adecuada de avance y retroceso	☒	☐	☐	
5	Dirección responde sin holguras excesivas	☒	☐	☐	
6	Freno de servicio funciona	☒	☐	☐	
7	Freno de estacionamiento sostiene el equipo en pendiente moderada	☒	☐	☐	
8	Control de velocidad responde de forma progresiva	☒	☐	☐	

6. Ruedas y rodaje

No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción inmediata
1	Llantas con presión adecuada y sin cortes/abultamientos	☒	☐	☐	
2	Desgaste uniforme de llantas (sin lona expuesta)	☒	☐	☐	
3	Tuercas/pernos de rueda completos y ajustados	☒	☐	☐	

4	Rines sin fisuras o deformaciones (y llantas sin objetos incrustados)	☒	☐	☐	
---	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

7. Acople con la demarcadora / sistema de arrastre

No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción Inmediata
1	Enganche/barra de tiro sin fisuras, deformaciones o soldaduras fracturadas	☒	☐	☐	
2	Pasador y seguro del enganche instalados y asegurados	☒	☐	☐	
3	Cadena de seguridad instalada (si aplica)	☒	☐	☐	
4	Conectores eléctricos y de control firmes y sin daños	☒	☐	☐	
5	Mangueras/cables (pintura/aire/eléctricos) protegidos, sin rozamiento y sin fugas	☒	☐	☐	
6	Alineación correcta del equipo acoplado (sin torsión)	☒	☐	☐	
7	Prueba de movimiento en zona segura: avance, giro y frenado sin tirones	☒	☐	☐	

8. Condiciones de operación en vía


No.	Punto de verificación	C	NC	NA	Observaciones / Acción Inmediata
1	Zona de trabajo demarcada y aislada antes de iniciar	☒	☐	☐	
2	Conos y señales ubicados según el plan de manejo de tráfico	☒	☐	☐	
3	Existe vehículo escolta / apoyo (si aplica) y está coordinado	☒	☐	☐	
4	Visibilidad adecuada (iluminación, clima) para la actividad	☒	☐	☐	
5	Ruta de evacuación y punto de encuentro definidos (si aplica)	☒	☐	☐	
6	Se verifica ausencia de peatones/vehículos en el área inmediata de maniobra	☒	☐	☐	

9. Hallazgos y acciones correctivas

No.	Hallazgo (descripción)	Acción requerida	Responsable	Fecha compromiso	Estado
1	Ninguno				
2					
3					
4					

10. Dictamen

Resultado de la inspección:	Apto para operar ☒ No apto para operar ☐
Observaciones finales:	

Inspector (Nombre y firma)	Operador (Nombre y firma)	Supervisor / Jefe de cuadrilla
 Cédula: 101703431	Juan Jose Prieto Cédula: 106104847	Juan Jose Prieto Cédula: 106698777

INGENIERÍA Y SEGURIDAD
VIAL
DOBLE VÍA S.A.S.

SG-SST – Formato de Inspección
Preoperacional

INSPECCIÓN
PREOPERACIONAL
TITAN LINEDRIVER 8900

Equipo de demarcación vial
(acompañamiento a demarcadora)

Código:

Versión: 01

Fecha: 2026-02-07

Página: __ de __

Área: Operaciones / Señalización

A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN

Fecha: 21-06-2026	Hora: 7:00	Proyecto / Frente: ^{clayton} TUNTA	Ubicación / Vía: Cra 3 entre calle 5 y 23
Operador(a): Juan Rieto	Cédula: 1061043177	Supervisor / Jefe de cuadrilla: Juan Prieto	Placa vehículo apoyo: P02-655
Equipo: Titan LineDriver 8900	Serial: 8900	Horómetro (inicio): 3:00 h	Horómetro (fin): 5:00 h
Horas del día (fin-inicio): ____ h	Nivel de combustible: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo	Estado general: ☒ Limpio ☐ Sucio ☐ Con fugas	Clima: ☐ Seco ☐ Lluvia ☒ Nublado

B. LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL (MARQUE: C / NC / NA)

#	Punto de Inspección	C	NC	NA	Observaciones / Acción inmediata
1. Seguridad y documentación					
1	Se cuenta con permiso/plan de manejo de tránsito (PMT) y señalización preventiva disponible.	☒	☐	☐	
2	EPP obligatorio disponible y en buen estado (casco, gafas, guantes, chaleco reflectivo, botas, protección auditiva/respiratoria según pintura).	☒	☐	☐	
3	Extintor vigente y accesible (en el vehículo/equipo).	☒	☐	☐	
4	Kit de derrames disponible (absorbente, paños, bolsa para residuos).	☒	☐	☐	
2. Inspección visual general					
5	Estructura, plataforma, guardas y carenados sin fisuras ni piezas sueltas.	☒	☐	☐	
6	No hay fugas visibles (aceite, combustible, hidráulico) bajo el equipo.	☒	☐	☐	

7	Tornillería, pasadores, abrazaderas y acoples firmes.	☒	☐	☐
8	Etiquetas de advertencia/seguridad legibles (cuando aplique).	☒	☐	☐

3. Motor y fluidos

9	Nivel de aceite del motor dentro del rango.	☒	☐	☐
10	Nivel de combustible suficiente para la jornada.	☒	☐	☐
11	Filtro de aire en buen estado (sin obstrucción evidente).	☒	☐	☐
12	Sistema de escape íntegro, sin fugas y con protector térmico (si aplica).	☒	☐	☐

4. Sistema hidráulico / transmisión

13	Nivel de fluido hidráulico dentro del rango (si aplica).	☒	☐	☐
14	Mangueras hidráulicas sin grietas, abultamientos ni fugas en conexiones.	☒	☐	☐
15	Acoples rápidos sin fugas, con seguros completos.	☒	☐	☐
16	Transmisión/tracción responde sin ruidos anormales.	☒	☐	☐

5. Dirección, frenos y rodadura

17	Dirección opera suave, sin juego excesivo.	☒	☐	☐
18	Freno de parqueo funciona y retiene el equipo.	☒	☐	☐
19	Frenado operacional responde (prueba a baja velocidad).	☒	☐	☐
20	Llantas en buen estado: presión/huella, sin cortes o deformaciones.	☒	☐	☐

6. Controles y dispositivos de seguridad

21	Interruptor general / apagado de emergencia opera correctamente (si aplica).	☒	☐	☐
22	Acelerador y controles de avance/retroceso	☒	☐	☐

funcionan sin trabas.

- | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23 | Bloqueo de seguridad (deadman) funcional cuando aplique. | ☒ | ☐ | ☐ |
| 24 | Bocina/alarma/reversa/luz estroboscópica funcional (si el equipo cuenta con ellas). | ☒ | ☐ | ☐ |

7. Acople y operación con equipo de pintura

- | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 25 | Acople/enganche al equipo de pintura seguro (pasador, seguro, cadena). | ☒ | ☐ | ☐ |
| 26 | Mangueras de pintura/solvente sin fugas, sin rozamiento con partes móviles. | ☒ | ☐ | ☐ |
| 27 | Soportes/porta manguera y guía de línea ajustados y firmes. | ☒ | ☐ | ☐ |
| 28 | Prueba de operación en vacío: arranque, avance, giro y detención controlada. | ☒ | ☐ | ☐ |

8. Orden, aseo y ambiente

- | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 29 | Zona de trabajo despejada; sin objetos sueltos que puedan caer a la vía. | ☒ | ☐ | ☐ |
| 30 | Recipientes de pintura/solvente cerrados y correctamente rotulados. | ☒ | ☐ | ☐ |
| 31 | Residuos (trapos, envases, filtros) dispuestos en bolsa/ recipiente designado. | ☒ | ☐ | ☐ |

C. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo / Descripción	Acción inmediata	Responsable	Fecha compromiso	Cierre (Sí/No)
------------------------	------------------	-------------	------------------	----------------

Ninguno

D. DICTAMEN DE LA INSPECCIÓN

☒ APTO PARA OPERAR

☐ NO APTO (BLOQUEAR EQUIPO)

Observaciones / Restricciones: _____

E. FIRMAS

Operador(a): Juan Jose Prieto Firma: _____ Supervisor / Jefe de cuadrilla: _____
1061 018 113 Fecha: 21 / 05 / 23 Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Nota: Si algun item critico resulta NC (frenos, dirección, fugas, dispositivos de seguridad, acople), el equipo debe marcarse como NO APTO y reportarse a mantenimiento antes de operar en vía.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código
Versión 1
Fecha 2026-02-07

Página 1 de 2


Fecha Inicio: 21-05-2026 Fecha Fin: 21-05-2026 Placa Vehículo: P02-655 Inspección No: 01
Nombre del conductor: Juan José Prieto Hencio N° de Documento: 1061 MB 1H
Kilometraje Inicial Kilometraje Final

I. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR

ID	DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	ID	DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	Licencia de tránsito (Tarjeta de propiedad del vehículo)	1003430091 SB	5	Certificación en manejo Defensivo	
2	SOAT	5131100962601	6	Afiliación a EPS, ARP	
3	Revisión Tecno mecánica y de Gases	NH	7	Pasado Judicial Vigente	
4	Póliza contra todo riesgo del vehículo		8	GPS	
5	Licencia de Conducción Legal y Vigente	0701-2026	9	Inducción del Conductor	

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DÍA DE LA SEMANA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ID	A. GENERAL	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado general de latonería y Pintura							X							
2	Puertas en buen estado de Cierre y Bloqueo							X							
3	Espejos Laterales							X							
4	Tanques de Combustible (Sujeción y estado sin goteo)							X							
5	Vidrio Frontal y limpia brisas *							X							
6	Cinturón de seguridad en todos los asientos							X							
7	Estado de la tapicería							X							
8	Luz de techo							X							
ID	B. ESTADO MECÁNICO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Sistema dirección							X							
2	Sistema de admisión							X							
3	Sistema de enfriamiento							X							
4	Sistema de alimentación							X							
5	Sistema de lubricación							X							
6	Sistema de escape							X							
ID	C. SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Alternador							X							
2	Arranque							X							
3	Estado y sujeción de las baterías (bornes y cables)							X							
4	Luces Frontales							X							
5	Cocuyos							X							
6	Luces Direccionales							X							
7	Luces Estacionarias							X							
8	Luz de reverso							X							
9	Luz interior cabina							X							
10	Luz tablero de instrumentos							X							
11	Stops							X							
12	Alarma de Reverso							X							
ID	D. SISTEMA DE FRENOS	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Freno de Servicio, Emergencia							X							
2	Estado de Asbestos							X							
ID	E. LLANTAS (Sin Cortaduras Profundas, Sin Abultamientos y Labrado Min 5 mm)	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Direccionales							X							
2	Tracción							X							
3	Repuesto con aire							X							
ID	F. KIT DE CARRETERA	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Linterna con pilas anti chispa							X							
2	Conos Reflectivos							X							
3	Chaleco Reflectivo							X							
4	Gato con Palanca							X							
5	Kit de llaves							X							

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS														Código		Versión		Fecha	
																1		2026-02-07	
														Página 1 de 2					
6. ELEMENTOS DE EMERGENCIA				LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
ID	REQUISITO	FECHA DE VENCIMIENTO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Botiquín										X								
2	Curios										X								
3	Vendas Elásticas 4 x 5 yardas										X								
4	Antor Quirúrgica e Yodopovidona										X								
5	Esterilizador										X								
6	Guantes Quirúrgicos										X								
7	Aplicadores e bálsamos										X								
8	Tijeras										X								
9	Apósitos, curitas e microscopio										X								
10	Alcohol antiséptico										X								
ID	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	FECHA DE VENCIMIENTO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Extintor de 10 lb.										X								
2	Kit de contingencia										X								
OBSERVACIONES POR DIA																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
 																			
INSPECCIONADO POR FIRMA DEL CONDUCTOR:																			



INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Código:

Fecha:

Versión

1

Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:	Andrés Navarro
CARGO:	Inspector SST
FECHA DE INSPECCIÓN:	2 de mayo del 2016
ÁREA:	Área control de obra hongo abogador - JARA
UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN:	Verdejo

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO DEL ELEMENTO			FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	
1 ESTADO DEL BOTIQUÍN	✓			
2 MANUAL DE USO DEL BOTIQUÍN	✓			
3 COLLAR CERVICAL	✓			
4 GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	✓			
5 SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	✓			
6 GASAS LIMPIAS PAQUETE	✓			
7 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	✓			
8 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	✓			
9 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	✓			
10 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	✓			
11 VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	✓			
12 TAPABOCOS QUIRÚRGICOS	✓			
13 ESPALMADO DE TELA PÓLVO de 4"	✓			
14 BAJALINGÜAS (2 Paquetes por 20)	✓			
15 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	✓			
16 LINTERNA	✓			
17 TIJERAS ANTIPLAUMA	✓			
18 YODOPROVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	✓			
19 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml (2 UNIDAD)	✓			
20 OTRO ¿CUAL?	✓			
21 OTRO ¿CUAL?	✓			
22 OTRO ¿CUAL?	✓			

INSPECCIÓN DE CAMILLA

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1 INSTALACIÓN (SITO DE UBICACIÓN)	✓		
2 SEÑALIZACIÓN	✓		
3 ESTADO DEL SOPORTE	✓		
4 CORREAS DE SEGURIDAD	✓		
5 SUJETADORES PARA AGARRAR	✓		
6 LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓		

OBSERVACIONES:

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO MES DÍA
2025 05 13

VIGENCIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL
AÑO MES DÍA
2025 05 14

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO MES DÍA
2026 05 13



SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR



Seguros Comerciales Bolívar S.A.

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
5131100762601	POZ655	CAMIONETA	PÚBLICO	2771	2026
PASAJEROS	MARCA	JMC	CARROCERÍA		
3	LÍNEA VEHÍCULO	JX1044TC6			
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
JX493ZLQ6A-RC066377	LEFYEDC26THN01202	LEFYEDC26THN01202	2.4		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR	
INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE VIA SAS	3107603972	NT	901440690	BOGOTA D.C.	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
36547	5131	36547	5131100762601	BOGOTA	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
310	\$580,700.00	\$301,900.00	\$2,100.00	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹
				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 ²
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180
					750
					SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
TOTAL A PAGAR					
\$884,700.00					

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Autorizada]

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
²Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde verificar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 14, Decreto Ley 163 de 1993). Una vez contratado, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesarias, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10034303958

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
POZ655	JMC	JX1044TC6	2026
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.771	BLANCO	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	DIESEL	2.420
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
JX493ZLQ6A-RC066377	N	LEFYEDC26THN01202	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	LEFYEDC26THN01202	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL DOBLE

IDENTIFICACIÓN

NIT 901440690

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

121

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE

352025000848501

I

FECHA IMPORT.

12/03/2025

PUERTAS

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINANZAUTO S.A. BIC

FECHA MATRÍCULA

14/05/2025


FECHA EXP. LIC TTO.

14/05/2025

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA



LT03008820857

ANEXO 7



NTC 1360:2011
Pinturas para demarcación
de pavimentos

FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE PREMIUM ORBITEX®, FT-G.LAB-11

DESCRIPCIÓN:

Pintura para demarcación de pavimentos, base solvente, mono componente, a base de resinas acrílicas que le confieren excelentes propiedades de adherencia, rápido secado, resistencia a la abrasión, al agua y a gran variedad de contaminantes. Acabado Semimate. Cuenta con la certificación, SELLO DE CALIDAD ICONTEC, bajo la Norma Técnica Colombiana, NTC 1360 (2011), PINTURAS PARA DEMARCACION DE PAVIMENTOS.

USOS:

La PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE PREMIUM ORBITEX® es ideal para la señalización y demarcación de todo tipo de vías, pisos de fábricas, áreas de trabajo, canchas deportivas, bodegas, etc.

ESPECIFICACIONES:

Peso neto por galón	5.30 – 5.60 Kg/galón
Viscosidad	80-90 UK
Acabado	Semimate
Número de manos recomendadas	1 a 2 manos dependiendo de la porosidad de la superficie
Método de aplicación	El equipo de aplicación se selecciona según el tipo de extensión de la superficie: • Brocha • Rodillo resistente a solventes • Máquina aplicadora (Consultar con el fabricante del equipo)
Ajustador para dilución	No recomendada. Xilol o thinner acrílico si es necesario.
Rendimiento práctico aproximado	Depende de la técnica de aplicación, tipo de superficie a cubrir y seguimiento de las recomendaciones suministradas sobre preparación de superficie.
Espesor de película seca de 1 mils (25 micrones)	65 – 75 m ² /galón
Espesor de película seca de 7 mils (175 micrones)	10 – 12 m ² /galón
Para líneas de 12 cm de ancho a un espesor de película seca de 7 mils (175 micrones)	90 – 105 m/galón
Condiciones de aplicación	• Temperatura del sustrato: Entre 10°C y 35°C • Temperatura mínima de aplicación: 3°C por encima del punto de rocío. • Humedad relativa: Inferior a 85% • La presencia de humedad o lluvia durante la aplicación o durante el secado afectan la adherencia y retardan el secado.
Tiempo de secamiento a 25°C y 85% humedad relativa	• Para pasar sin detenerse: 1 h • Para vías tráfico pesado: 1.5 h
Secamiento no (pick up) 25°C.	7-15 minutos
COV(g/l)	387
Intemperismo Acelerado Q-UV/SE	$\Delta E \leq 10.0$ unidades CIELAB. Amarillo $\Delta E \leq 6.0$ unidades CIELAB. Blanco
Resistencia al agua	No presenta ampollamiento ni decoloración.
Resistencia al álcali NaOH al 10%	No presenta ampollamiento ni decoloración.
Resistencia a la abrasión.	> 80 dm ³



NTC 1360:2011
Pinturas para demarcación
de pavimentos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y material extraño.
- La limpieza se hace utilizando agua o aire a presión, escobas manuales o mecánicas.
- Para usar sobre concreto, se debe tener un tiempo de curado mínimo de 30 días y neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido muriático diluido al 10% en agua, dejar actuar durante 15 minutos máximo, luego enjuagar con abundante agua, dejar secar muy bien y limpiar nuevamente antes de aplicar la pintura (para evitar problemas de adherencia o decoloración).

APLICACIÓN:

Agitar el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

- Si el equipo de aplicación o las condiciones ambientales lo requieren diluir un galón de pintura con 5% de xilol o thinner acrílico y agitar con espátula limpia hasta alcanzar la consistencia adecuada.
- Aplicar una mano para obtener un espesor de película seca de 175 a 225 micrones.
- En cruces y áreas peatonales se recomienda aplicar dos manos para obtener un espesor de película seca de 400 micrones.
- El tiempo de secamiento varía con la temperatura del ambiente y el espesor de película aplicado, en condiciones normales el tiempo de secado al servicio es de 60 – 90 minutos aproximadamente, dependiendo del tráfico.
- Si se requiere que la pintura sea reflectiva, sobre la película húmeda recién aplicada rociar microesferas tipo Drop – On en una cantidad de 300 a 400 gramos por metro cuadrado. El producto posee excelente retención de microesferas.
- Para evitar que las señalizaciones se dañen con el tráfico, se deben proteger con vallas o conos hasta que hayan secado bien.
- El producto no debe diluirse con otros disolventes ni mezclarse con esmaltes, lacas u otros productos.
- Se recomienda adicionar sin agitar, una pequeña cantidad de thinner al sobrante de producto para prevenir la formación de nata.
- Los equipos de aplicación se pueden limpiar con thinner.

PRESENTACIÓN:

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE PREMIUM ORBITEX® se encuentra disponible en:

- Tambor de 50 galones
- Cuñete de 5 galones

SEGURIDAD Y AMBIENTE:

- Para ampliar información, consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse en los recipientes originales cerrados, en posición vertical; en sitios ventilados, protegidos de humedad excesiva, así como de altas temperaturas y alejado de toda fuente de calor, chispa o llama.

- No apilar más de 4 cuñetes.
- Consérvese máximo 18 meses a partir de la fecha de fabricación. Es muy importante que se roten las existencias de producto

¡En Pintuflex S.A.S estamos comprometidos con el planeta!

La información contenida en esta Ficha Técnica es proporcionada de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Pintuflex S.A.S. respecto a sus productos. La información se refiere únicamente al material especificado, y no es válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o bajo condiciones diferentes a las expresadas.

Pintuflex S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto más no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Por lo tanto, la información suministrada no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto. Pintuflex S.A.S. no asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Para más información se recomienda consultar al Departamento Técnico – Comercial de Pintuflex S.A.S.

FICHA TÉCNICA MICROESFERA, FT-G.LAB-93

Designación del Producto: EHOSTAR 5

Características técnicas del producto:

1 Naturaleza del producto.

Microesferas de vidrio

2 Naturaleza de los constituyentes:

Vidrio sílico-sódico-cálcico

3 Granulometría (UNE-EN-1423/A1):

Se expresa en porcentaje pasante acumulado:

Tamiz	% pasante acumulado
Abertura nominal	
1000 micras	98-100%
710 micras	90-100 %
600 micras	60-95 %
355 micras	20-60 %
212 micras	0-30 %
125 micras	0-5 %

4 Esfericidad (UNE-EN-1423/A1):

Se determina por conteo visual y se expresa en porcentaje de esferas buenas

Porcentaje de microesferas buenas < 1000 micras:	>= 82 %
Porcentaje de grano < 1000 micras:	<= 3 %
Porcentaje de microesferas buenas >= 1000 micras:	>= 72 %
Porcentaje de grano >=1000 micras:	<= 3 %

5 Tratamiento de superficie (UNE-EN-1423/A1):

Adherencia

6 Índice de refracción (UNE-EN-1423/A1):

Clase A >= 1,5

7 Resistencia al Agua, Ácido clorhídrico, Cloruro de Calcio y Sulfuro de Sodio (UNE-EN-1423/A1):

Agua, ácido clorhídrico, Cloruro calcio: Sin alteraciones superficiales
Sulfuro de Sodio: Sin oscurecimiento

¡En Pintuflex S.A.S estamos comprometidos con el planeta!

La información contenida en esta Ficha Técnica es proporcionada de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Pintuflex S.A.S. respecto a sus productos. La información se refiere únicamente al material especificado, y no es válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o bajo condiciones diferentes a las expresadas.

Pintuflex S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto más no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Por lo tanto, la información suministrada no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto. Pintuflex S.A.S. no asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Para más información se recomienda consultar al Departamento Técnico – Comercial de Pintuflex S.A.S.

COPIA CONTROLADA



Esquema de certificación tipo 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

PINTURAS PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

Fabricado por **PINTUFLEX S.A.S** en la Km 27 vía Madrid-Facatativá, vereda Potrero Grande, Parcelación El Pedregal, Colombia, identificada con número de NIT 830.006.833-7

Manufactured by **PINTUFLEX S.A.S** in the Km 27 vía Madrid-Facatativá, vereda Potrero Grande, Parcelación El Pedregal, Colombia, identified with NIT number 830.006.833-7

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1360 (2011)

Pinturas para demarcación de pavimentos

Paints for pavement mark

SECTOR ICS: 87.040

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-CER1079030

Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-12-11

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2030-12-10

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002




Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

F-PS-0628
Versión 01
