



Al Contenedor c/c: Radicado: 2026-1300-012213-R Id: 115284
Fecha: 2026-08-05 13:40
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

CONECTA

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4

CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA

MEDELLÍN

TEL- 4440568

FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE12

Documento Ref.:

Código CIIU / Actividad Económica: 4210

Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	Fecha Documento :	3 - Aug - 2026
NIT:	901387801-2	Hora Documento:	09:10:30-05:00
Dirección:	CL 35 SUR 40 35 - Envigado - Antioquia	Fecha Vencimiento:	2 - Sep - 2026
Teléfono:	6044801300	Condición Pago:	Crédito
		Lugar de Pago:	MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANOGRAMADA	ACTA DE OBRA NO GRABADA	1	3,069,780,118.00	3,069,780,118.00	

ACTA N°5 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24" lfs17	Sub Total: 3,069,780,118.00 Amortización: 948,947,238.00 IVA: 0.00 Retención: 0.00 Retención AMB: 0.00 Retención ICA: 24,558,240.94 Valor Total: 2,096,274,639.00
---	---

Firma Digital : d4342c57a395108b86f52e4a238208cde04fe507f045dc280b144b2638fbd6397246e52c3b2e1ff91cbdc89a9c84a748
Cufe : f1f22be003bca649b5082921659f35791fa3bb568dddfef745e0bade3cfb236077f6be0639bea61af27ddbe4d90e2e6

SON : TRES MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS Y CINCO CENTAVOS M/L

Documento Ref.: -
Esta Factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio
Resolución No. 18764100452377 Fecha: 22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000


ELABORADO POR	APROBADO	FECHA RECIBIDO:
---------------	----------	-----------------


RECEIVED

.....

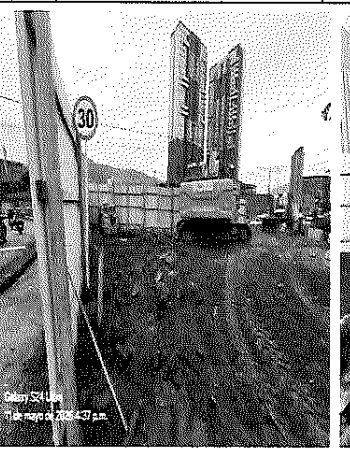
[illegible]

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	540.00	
1.1												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)											Cant. Total	540.00	
dia												Saldo por Ejecutar	426.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	114.00	
10/02/2026	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026										
29.00	20.00	21.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
5	10/06/2026	Localizacion, trazado y replanteo.				Levantamiento general del proyecto				25.00				25.00
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5													25.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 1.1														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,500.00	
2.1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISORIO en una verde polietileno de alta densidad y resistencia al grito con una altura de 2,10 m, estacaes de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación, carga, transporte y botada de											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	1,500.00	
m												Saldo por Ejecutar	1,298.04	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	201.97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			10/05/2026	10/06/2026										
0.00	0.00	0.00	91.11	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 1 - costado occidental (norte sur)		1.00	10.00			10.00					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 1		1.00	14.10			14.10					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 5		1.00	12.50			12.50					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 6		1.00	10.16			10.16					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 1		1.00	14.10			14.10					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 5		1.00	12.50			12.50					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 6		1.00	12.50			12.50					
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 5 - 6		1.00	25.00			25.00					
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5										110.86				
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 2.1														
 CONSORCIO MAYORIA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA					 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA									

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA												
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°S DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	100.00	
2.2	Instalación de CERRAMIENTO EN SUPERBOARD calibre 8, con una altura de 2.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la placa de superboard, estructura metálica cada 1.00m, larguero horizontal en la parte intermedia y superior, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura, vientos en madera cada 3m, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.											Cant. Adicional	239.86	
Unidad												Cant. Total	339.86	
m												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	339.86
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10/02/2026			10/05/2026	10/06/2026										
218.36		0.00	91.78	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Registro Fotográfico /Plano / Esquema									
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 5 - costado norte	1.00	7.32			7.32	
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 5 - costado norte	1.00	6.10			6.10	
5	10/06/2026	Cerramiento	Eje 5	1.00	18.30			18.30	


TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												31.72
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 2.2												

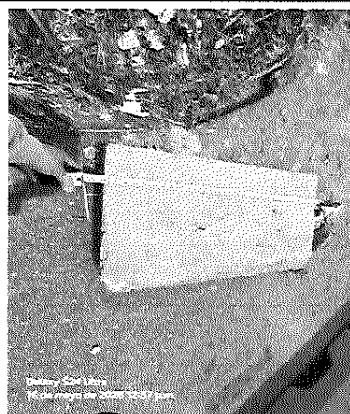


CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

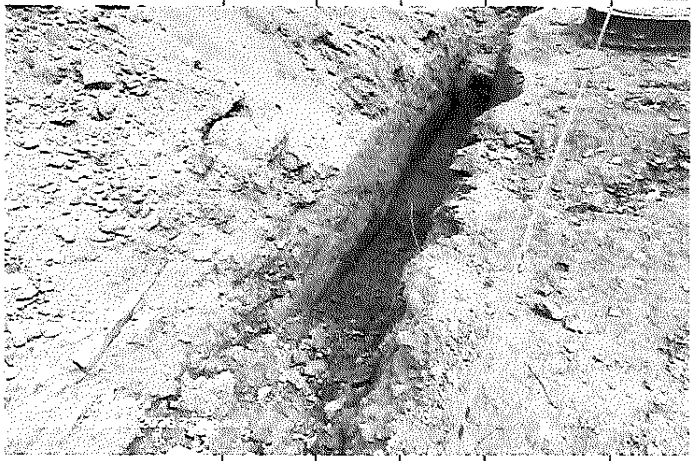




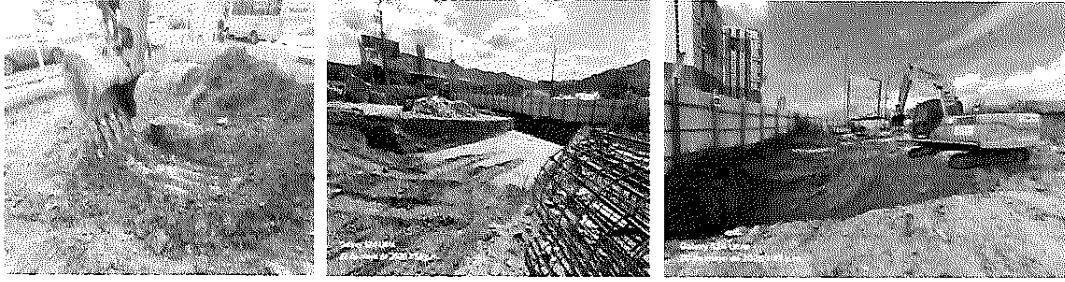

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

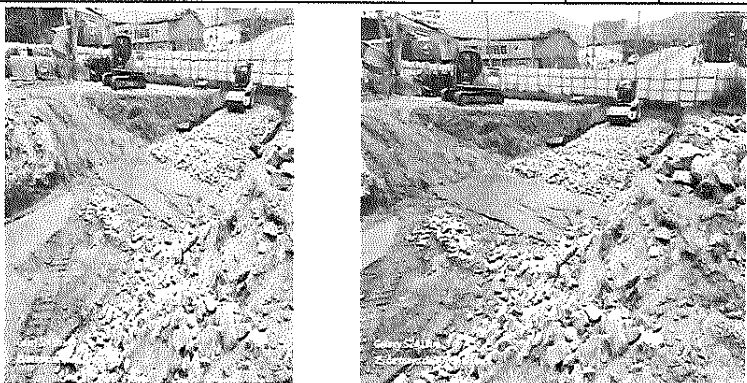
Anso		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN										Cant. Contractual	1.606.00			
2.5											Cant. Adicional	0.00			
Unidad	Desmonte y retiro de cordones en concreto o bordillos existentes 0.15x0.10 m. Manual o mecánico. Incluye cargue, transporte, botada y disposición de los escombros a sitios definidos por la interventoría.										Cant. Total	1.606.00			
m											Saldo por Ejecutar	1,541.34			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	64.66		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026											
0.00	0.00	4.80	26.00	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte		12.00	0.80			9.60						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte		1.00	0.56			0.56						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte - anden peatonal		9.00	0.80			7.20						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte - anden peatonal		1.00	0.40			0.40						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte - anden peatonal		9.00	0.80			7.20						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte - anden peatonal		1.00	0.60			0.60						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte		10.00	0.80			8.00						
5	10/06/2026	Retiro de cordoneria	Eje 5 - costado norte		1.00	0.30			0.30						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												33.86			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 item 2.5															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															




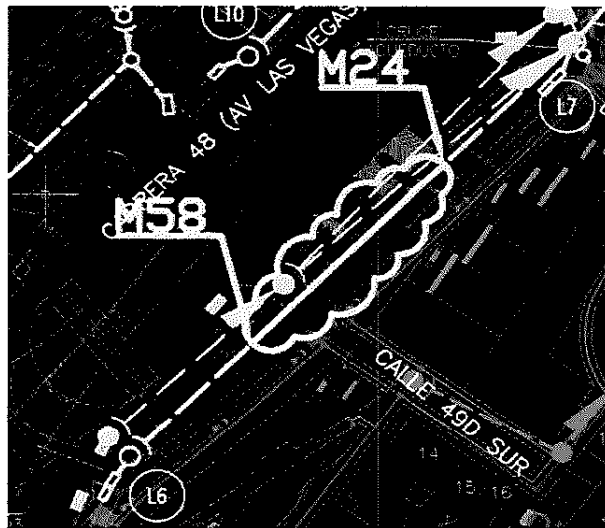
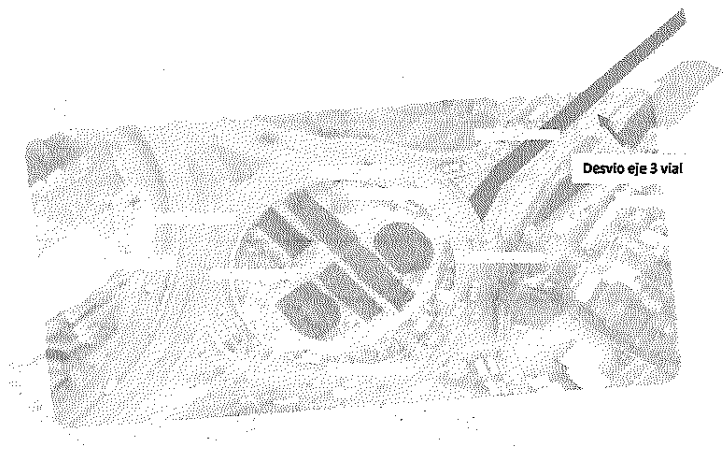
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8,160.00
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	8,160.00
m3												Saldo por Ejecutar	8,052.82
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	107.18
0.00	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026									
0.00	2.60	5.28	45.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Largo	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Demolicion de concreto			Eje 3 vial - Eje 4 - Eje 1			54.15				54.15	
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												54.15	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 2.8													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	3,384.00	
3.1	Excavación manual en tierra de 0 a 2m bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	3,384.00	
m3												Saldo por Ejecutar	3,365.81	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	18.19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	10/03/2026	10/04/2026		10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	17.65	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
5	10/06/2026	Excavaciones				Traslado de redes - eje 5				0.54	1.80	0.50	0.60	0.54
 														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												5	0.54	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 ítem 3.1														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	10,878.00	
3.12	Excavación mecánica hasta 4,00m de profundidad, incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	10,878.00	
m3												Saldo por Ejecutar	7,340.90	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	3537.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	195.03	645.28	928.53	1768.26										
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Año	Total						
5	10/06/2026	Excavacion	Eje 11 - vial	602.01				602.01						
5	10/06/2026	Excavacion	Eje 12 - vial	531.61				531.61						
5	10/06/2026	Excavacion	Eje 5 - 6 - separador central	634.64				634.64						
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5													1768.26	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 ítem 3.12														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							



CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	5,387.00		
4.3	Instalación de GEOTEXTIL tipo TR 3000 tipo Pavco o equivalente muro en tierra armada, muro de contención o actividades similares. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapes, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.											Cant. Adicional	0.00		
Unidad m2												Cant. Total	5,387.00		
												Saldo por Ejecutar	5,192.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	195.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total			
5	10/06/2026	Instalacion			Eje 12			1.00	26.00	7.50		195.00			
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												195.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 4.3															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

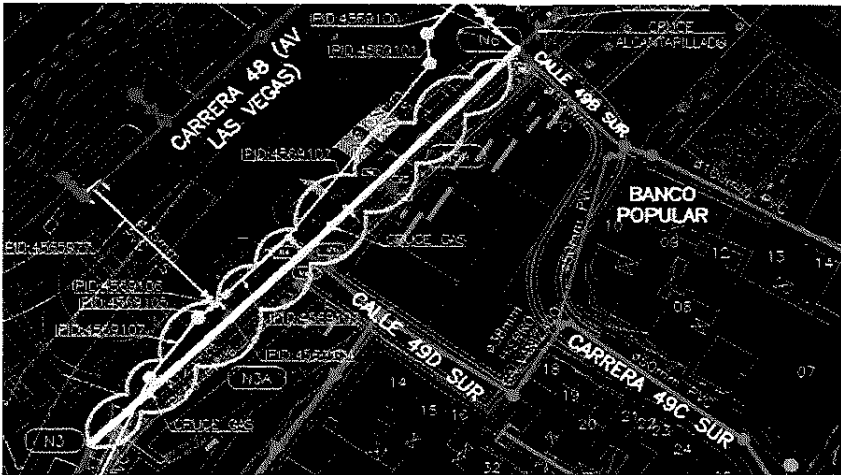

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,704.00
5.3												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Suministro, transporte, instalación y compactación sub base granular tipo C (Art. 320 INVIAS) compactada al 95% del p.m.											Cant. Total	1,704.00
m3												Saldo por Ejecutar	1,508.58
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	195.42
0.00	0.00		0.00	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 12 - 18	12.96	6.00	1.20	1.80	12.96					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 18 - 24	14.10	6.00	1.23	1.91	14.10					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 24 - 30	15.23	6.00	1.45	1.75	15.23					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 30 - 36	13.03	6.00	1.20	1.81	13.03					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 36 - 42	12.41	6.00	1.10	1.88	12.41					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 42 - 48	9.82	6.00	1.33	1.23	9.82					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 48-52	11.66	4.00	1.24	2.35	11.66					
5	10/06/2026	Lleno - redes humedas	Tubería Novafort 12" Abcisa 52-58	16.01	6.00	1.57	1.70	16.01					
5	10/06/2026	Lleno - Desvio PMT	Desvio eje 3 vial	668.22			0.14	90.21					
    													

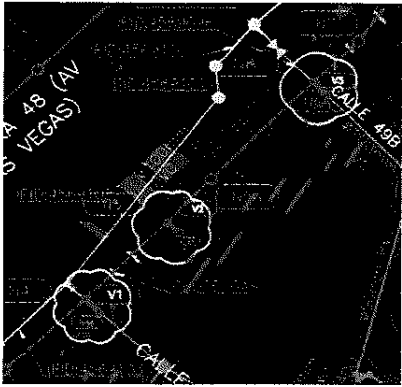





TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5		195.42
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 5.3		
#2 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA		

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	9.00
9.9												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Transplante de árboles de 0 a 5m											Cant. Total	9.00
un												Saldo por Ejecutar	6.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 2.00	10/05/2026 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
5	10/05/2026	Transplante	Mango - Sector cuerdas telefonía restaurante maluma					1.00			3.80	1.00	
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												1.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 9.9													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

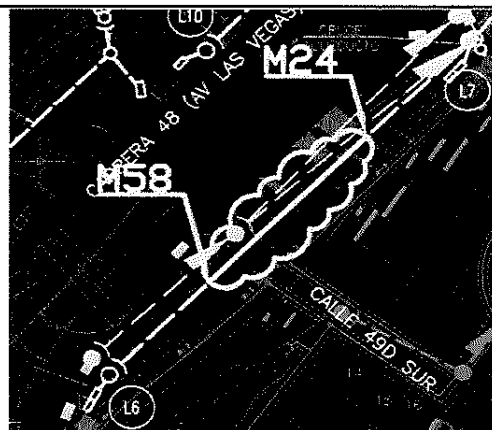
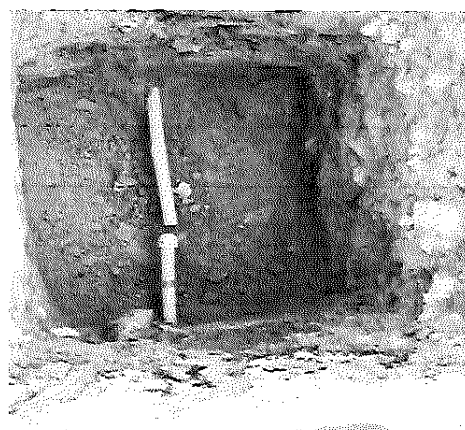
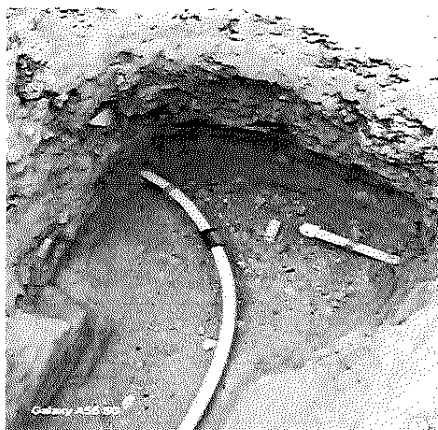
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-03-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	9.00	
9.10												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Transplante de árboles de 5 a 10m											Cant. Total	9.00	
un												Saldo por Ejecutar	1.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	8.00	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 3.00	10/06/2026 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/06/2026	Transplante	Piñon de oreja - separador restaurante maluma				1.00			6.37	1.00			
5	10/06/2026	Transplante	Piñon de oreja - obra en general				1.00			8.88	1.00			
5	10/06/2026	Transplante	Guayacan amarillo - obra general				1.00			5.81	1.00			
5	10/06/2026	Transplante	Corozo - Registro forestal de palmeras				1.00			5.55	1.00			
5	10/06/2026	Transplante	Corozo - Registro forestal de palmeras				1.00			6.93	1.00			
  												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5		5.00
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 9.10														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	188.00	
11.5												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Suministro, transporte y colocación de tubería 125mm PEAD, PE 100, PN 16. Incluye termofusión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento											Cant. Total	188.00	
m												Saldo por Ejecutar	98.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	90.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total
5	10/06/2026	Instalacion				Tuberia Acueducto - Eje 3 vial				90.00				90.00
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												90.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 2026010 Item 11.5														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-03-1418-24.												DESUR-IA-163-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
11.7	Suministro, transporte y colocación de válvula de 125mm. Incluye Brida, Porta Brida y todo lo necesario para su correcto funcionamiento											Cant. Adicional	2.00
Unidad												Cant. Total	3.00
un												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Colocacion	Instalacion de Válvula 125 mm - Eje 3 vial NODO 4-5-6				3.00					3.00	
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												3.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 ítem 11.7													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hemando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2.00
11.9	Suministro, transporte y colocación de tee 125mm x 90mm PEAD. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación											Cant. Adicional	1.00
Unidad												Cant. Total	3.00
un												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Colocacion	Instalacion de T - Eje 3 vial NODO 4-5-6				3.00				3.00		
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5											3.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 11.9													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	890.74	
12.2												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Excavación material común húmedo<2m mecanica. Retiro, cargue y botada de material											Cant. Total	890.74	
m3												Saldo por Ejecutar	711.62	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	179.13	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 76.92	10/06/2026 102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
5	10/06/2026	Excavacion de nichos				Nicho 1 - Eje 3				0.46	1.10	0.65	0.65	0.46
5	10/06/2026	Excavacion de nichos				Nicho 2 - Eje 3				0.20	0.90	0.30	0.75	0.20
5	10/06/2026	Excavacion de nichos				Nicho 2 - Eje 3				0.83	3.45	0.30	0.80	0.83
5	10/06/2026	Excavacion de nichos				Nicho 2 - Eje 3				0.51	0.80	0.80	0.80	0.51
5	10/06/2026	Excavacion de nichos				Nicho 3 - Eje 3				0.37	0.73	0.73	0.70	0.37
5	10/06/2026	Excavacion de nichos				Nicho 4 - Eje 3				0.50	1.20	0.75	0.55	0.50
5	10/06/2026	Excavacion de nichos				Nicho 5 - Eje 3				0.48	0.80	0.75	0.80	0.48
5	10/06/2026	Excavacion				Tuberia Novafort 12" Abscisa 24 - 30				18.85	6.50	1.45	2.00	18.85
5	10/06/2026	Excavacion				Tuberia Novafort 12" Abscisa 30 - 36				15.60	6.50	1.20	2.00	15.60
5	10/06/2026	Excavacion				Tuberia Novafort 12" Abscisa36 - 42				14.30	6.50	1.10	2.00	14.30
5	10/06/2026	Excavacion				Tuberia Novafort 12" Abscisa 46 - 48				17.29	6.50	1.33	2.00	17.29
5	10/06/2026	Excavacion				Tuberia Novafort 12" Abscisa 48 - 52				12.40	5.00	1.24	2.00	12.40
5	10/06/2026	Excavacion				Tuberia Novafort 12" Abscisa 52-58				20.41	6.50	1.57	2.00	20.41

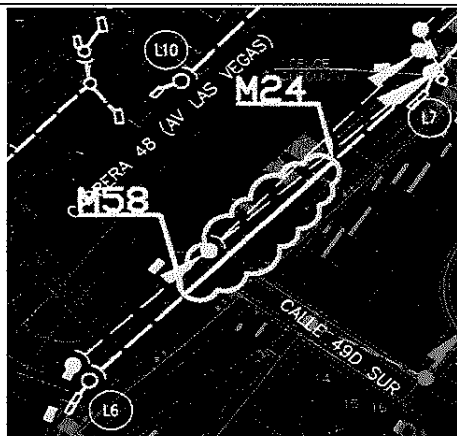


OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 12.2

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	333.40
12.3	Excavación mecánica material común húmedo 2 - 4 m. Retiro, cargue y botada de material											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	333.40
m3												Saldo por Ejecutar	254.87
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	78.53
			10/05/2026 23.14	10/06/2026 55.39									
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Largo	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Eje 3			Tubería Novafort 12" Abscisa 24 - 30			8.48	6.50	1.45	0.90	8.48	
5	10/06/2026	Eje 3			Tubería Novafort 12" Abscisa 30 - 36			7.49	6.50	1.20	0.96	7.49	
5	10/06/2026	Eje 3			Tubería Novafort 12" Abscisa36 - 42			7.72	6.50	1.10	1.08	7.72	
5	10/06/2026	Eje 3			Tubería Novafort 12" Abscisa 46 - 48			9.77	6.50	1.33	1.13	9.77	
5	10/06/2026	Eje 3			Tubería Novafort 12" Abscisa 48 - 52			7.13	5.00	1.24	1.15	7.13	
5	10/06/2026	Excavacion			Tubería Novafort 12" Abscisa 52-58			14.80	6.50	1.57	1.45	14.80	



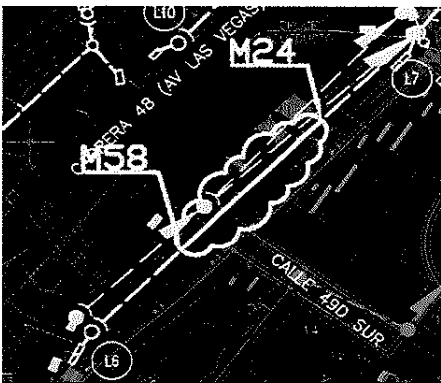
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 12.3

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 6

55.39

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORCA CONECTA		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2,521.00	
12.4												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Entibados o trinchos en madera temporal											Cant. Total	2,521.00	
m2												Saldo por Ejecutar	2,259.88	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	261.12	
0.00	0.00	0.00	93.72	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total						
5	10/06/2026	Entibados eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 24 - 30	25.20	14.00	0.60	3.00	25.20						
5	10/06/2026	Entibados eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 30 - 36	25.20	14.00	0.60	3.00	25.20						
5	10/06/2026	Entibados eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 36 - 42	32.40	18.00	0.60	3.00	32.40						
5	10/06/2026	Entibados eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 46 - 48	32.40	18.00	0.60	3.00	32.40						
5	10/06/2026	Entibados eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 48 - 52	27.00	15.00	0.60	3.00	27.00						
5	10/06/2026	Entibados eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 52-58	25.20	14.00	0.60	3.00	25.20						
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												167.40		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 12.4														
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA											
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	

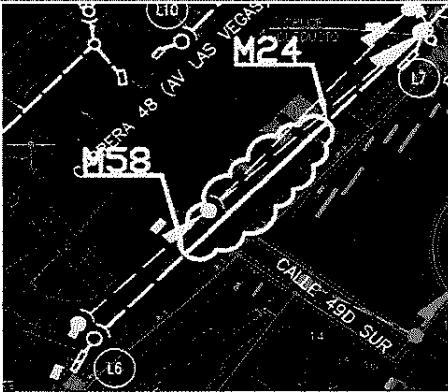
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	183.00
12.5	Material granular con mezcla de arena y gravas para cimentación y relleno inicial de alcantarillas compactado al 98% del p.m.												Cant. Adicional	0.00
Unidad													Cant. Total	183.00
m3													Saldo por Ejecutar	152.79
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	30.21	
0.00	0.00	0.00	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

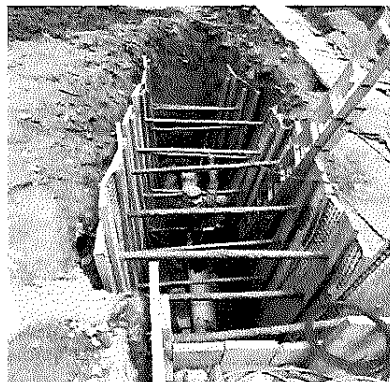
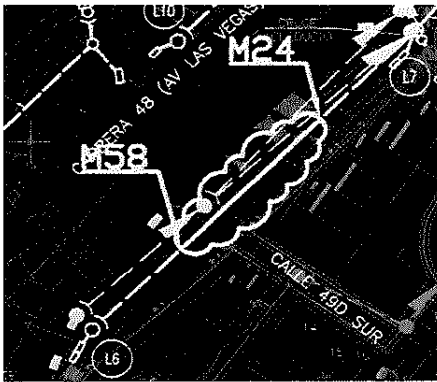

Registro Fotográfico /Plano / Esquema									
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 6 - 12	2.46	6.00	1.50	0.25	2.46	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 12 - 18	4.02	6.00	1.20	0.50	4.02	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 18 - 24	4.11	6.00	1.23	0.50	4.11	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 24 - 30	3.88	6.00	1.45	0.50	3.88	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 30 - 36	3.13	6.00	1.20	0.50	3.13	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 36 - 42	2.83	6.00	1.10	0.50	2.83	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 46 - 48	3.52	6.00	1.33	0.50	3.52	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 48 - 52	2.01	4.00	1.24	0.50	2.01	
5	10/06/2026	Relleno triturado eje 3	Tubería Novafort 12" Abcisa 52-58	4.24	6.00	1.57	0.50	4.24	



TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5				30.21
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 12.5				

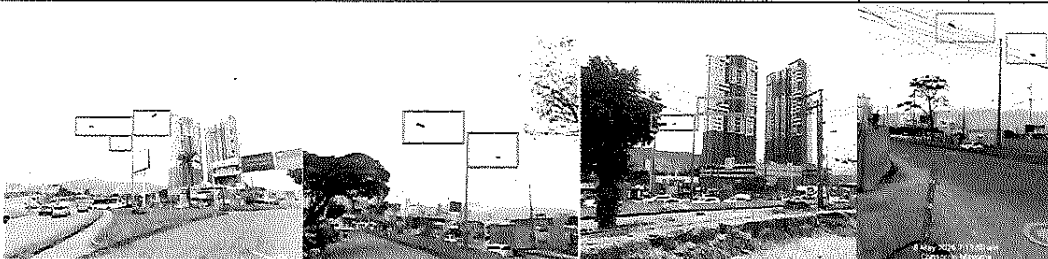
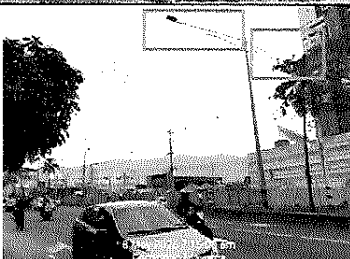
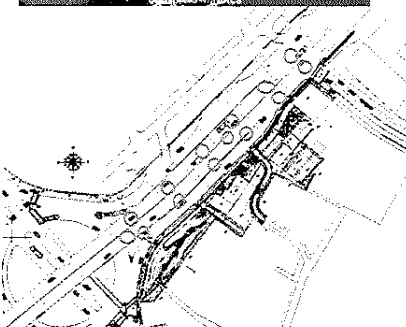
CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA

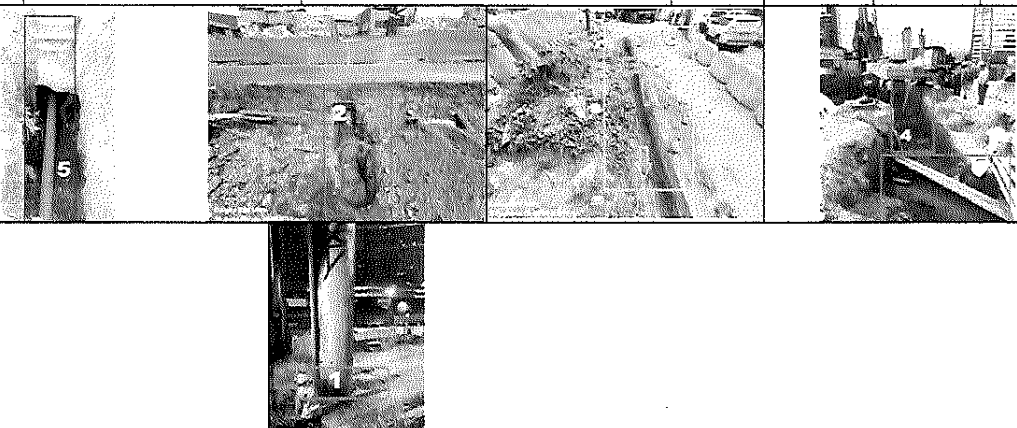
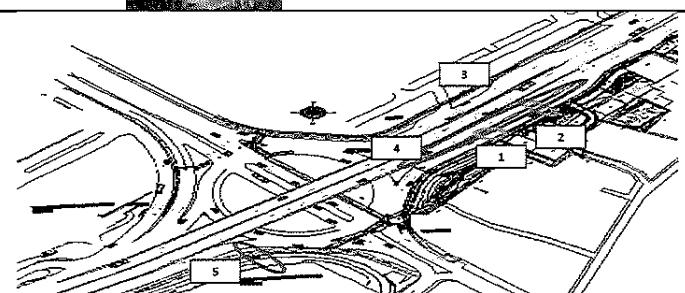

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA




CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	457.00		
12.6	Lleno final de alcantarillas y apisonado zanjas y apiques en recebo, según norma INVIAS, Art. 610, (CBR>10%). Incluye suministro, transporte interno y compactación con densidad seca igual o mayor al 95% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.											Cant. Adicional	0.00		
Unidad												Cant. Total	457.00		
m3												Saldo por Ejecutar	418.07		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	38.93		
0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 6 - 12				20.25	6.00	1.50	2.25	20.25				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 12 - 18				2.58	6.00	1.20	0.30	2.58				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 18 - 24				2.64	6.00	1.23	0.30	2.64				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 24 - 30				2.61	6.00	1.45	0.30	2.61				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 30 - 36				2.16	6.00	1.20	0.30	2.16				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 36 - 42				1.98	6.00	1.10	0.30	1.98				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 46 - 48				2.39	6.00	1.33	0.30	2.39				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 48 - 52				1.49	4.00	1.24	0.30	1.49				
5	10/06/2026	Relleno eje 3	Tubería Novafort 12" Abscisa 52-58				2.83	6.00	1.57	0.30	2.83				
															
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												38.93			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 12.6															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			



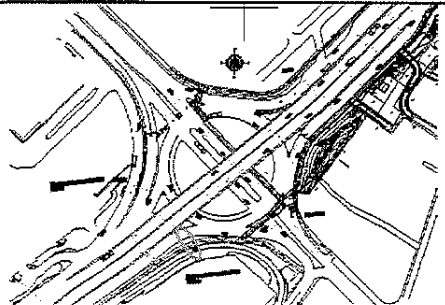
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	95,70	
12.7												Cant. Adicional	0,00	
Unidad	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC Novafort S8 315mm 12" Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.											Cant. Total	95,70	
m												Saldo por Ejecutar	43,70	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	52,00	
0,00	0,00	0,00	18,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total						
5	10/06/2026	Instalacion de tubería	Tubería Novafort 12" Abcisa 24 - 30	1,00	6,00			6,00						
5	10/06/2026	Instalacion de tubería	Tubería Novafort 12" Abcisa 30 - 36	1,00	6,00			6,00						
5	10/06/2026	Instalacion de tubería	Tubería Novafort 12" Abcisa 36 - 42	1,00	6,00			6,00						
5	10/06/2026	Instalacion de tubería	Tubería Novafort 12" Abcisa 46 - 48	1,00	6,00			6,00						
5	10/06/2026	Instalacion de tubería	Tubería Novafort 12" Abcisa 48 - 52	1,00	4,00			4,00						
5	10/06/2026	Instalacion de tubería	Tubería Novafort 12" Abcisa 52-58	1,00	6,00			6,00						
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												34,00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 ítem 12.7														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA		



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	743.00
13.1	Excavación mecánica material común húmedo < 2m mecánica. Retiro, cargue y botada de material.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	743.00
m3												Saldo por Ejecutar	727.70
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	15.30
0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Excavacion	Eje 5 - redes secas- cámara				15.30	3.00	3.00	1.70	15.30		
 													
													
DISEÑO: AREA DE CALIDAD EN AREA DE DESARROLLO													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												15.30	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 13.1													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	51.00
14.1	Retiro y reintegro de luminarias propiedad de EPM											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	51.00
un												Saldo por Ejecutar	37.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	14.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Desmonte	Retiro luminarias					14.00				14.00	
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												14.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.1													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						


CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	25.00			
14.4												Cant. Adicional	99.93			
Unidad	Excavación de material común húmedo<2m manual. Retiro, cargue y botada de material											Cant. Total	124.93			
un												Saldo por Ejecutar	0.00			
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	124.93			
0.00	0.00	0.00		10/06/2026	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico /Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Total								
5	10/06/2026	Excavacion	Brecha de comunicaciones eje 3 (1)	2.40	1.60	1.50	1.00	2.40								
5	10/06/2026	Excavacion	Para encontrar por donde pasa tubería circuit eje3 (2)	0.48	1	0.50	0.80	0.48								
5	10/06/2026	Excavacion	excavacion semaforos (3)	7.88	50.00	0.35	0.45	7.88								
5	10/06/2026	Excavacion	Brecha traslado tubería circuito 13.2Kv (4)	112.61	38.50	1.95	1.50	112.61								
5	10/06/2026	Excavacion	Brecha salida de circuito mayorca (5)	1.56	2.60	0.50	1.20	1.56								
																
																
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5													124.93			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.4																
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA									

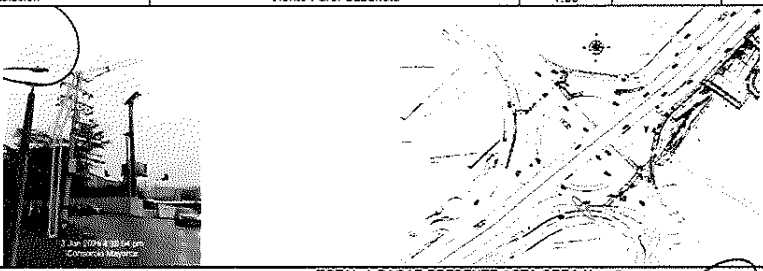
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	100.00	
14.6	Lleno y apisonado zanjas y apiques con arenilla											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												m3	Cant. Total	100.00
													Saldo por Ejecutar	98.96
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.04	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro. 5	Fecha Corte 10/05/2026	Actividad Lleno	Detalle arenilla para canalización traslado mayorca en m3					Cant 1.04	Diametro	Ancho	Alto	Total 1.04		
 														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												1.04		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.6														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

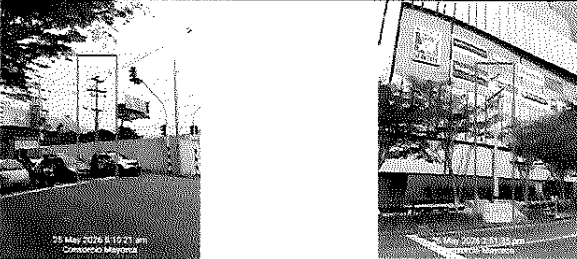

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2,550.00	
14.9	Suministro y montaje canalización en tubería PVC de 4", para red de media tensión. Incluye brecha, tela peligro alta tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												ml	Cant. Total	2,550.00
												Saldo por Ejecutar	2,547.40	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.60	
0.00	0.00	0.00	0.00	10082026	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro. 5	Fecha Corte 10/06/2026	Actividad Instalacion	Detalle					Cant 2.60	Diametro	Ancho	Alto	Total 2.60		
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												2.60		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.9														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA							



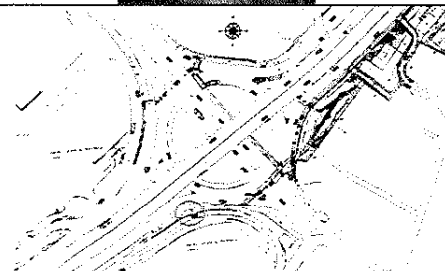

CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	8.00		
14.16													Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-003 de EPM												Cant. Total	8.00		
un													Saldo por Ejecutar	5.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00			
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico / Plano / Esquema																
Acta Nro. 5	Fecha Corte 10/06/2025	Actividad Vestida	Detalle Vestida primaria salida circuito terminal				Cant 1.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 1.00					
																
																
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5													1.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.16																
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA									

CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO METROPOLITANO ILA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	2.00		
14.21													Cant. Adicional	2.00		
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-304 de EPM												Cant. Total	4.00		
un													Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	4.00			
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 3.00	10/06/2026 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico / Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
5	10/06/2026	Instalacion	Vestida en referencia					1.00				1.00				
																
																
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.21													TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5	1.00		
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA													CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			

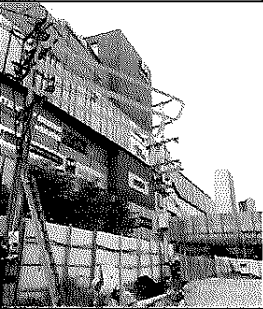

CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCION												Cant. Contractual	6.00		
14.24													Cant. Adicional	4.00		
Unidad	Viento convencional según norma RA6-001 para 13.2KV												Cant. Total	10.00		
un													Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	10.00			
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026												
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico / Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
5	10/06/2026	Instalacion	Instalacion viento convencional					1.00				1.00				
																
																
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5													1.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.24																
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA																



CONTROL CANTIDADES DE OBRA													
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
DESur													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN													
DESUR-IA-168-2025													
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	6.00
14.25												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Viento Farol según norma RA6-002 para 13.2KV de EPM											Cant. Total	6.00
un												Saldo por Ejecutar	2.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	4.00
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Instalacion	Viento Farol Sabaneta					1.00				1.00	
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												1.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.25													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA						


CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2.00			
14.29												Cant. Adicional	0.00			
Unidad	Traslado salida de cto según norma RA2-019 de EPM, incluye puesta tierra, tomillería, cinta bandil y demás elementos para su correcto funcionamiento.											Cant. Total	2.00			
un												Saldo por Ejecutar	1.00			
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico / Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Totál				
5	10/06/2025	Traslado	Traslado salida circuito					1.00				1.00				
																
																
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												1.00				
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.29																
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA									




		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	15.00	
14.35	Suministro, transporte y montaje premoldeado para cable 350MCM XLPE 133% de aislamiento 15KV por fase tipo exterior, incluye borna y demás elementos para su correcto funcionamiento											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	15.00	
un												Saldo por Ejecutar	12.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/06/2026	Suministro	Conos para salida de circuito				3.00					3.00		
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												3.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.35														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

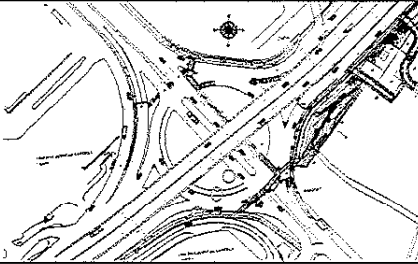

CONTROL CANTIDADES DE OBRA		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										DESUR		CONSEJO DE VIVIENDA	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	60.00		
14.37	Suministro, transporte y montaje línea primaria aérea trifásica 3No.266.8 ecológico+1/0 AWAC ó 4/0 ACSR											Cant. Adicional	162.00		
Unidad												mi	Cant. Total	222.00	
												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1												Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5
0.00	0.00	0.00	200.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/06/2026	Instalación	Suministro de cable compacto					22.00				22.00			
															
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												22.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.37															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA								





CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,180.00		
14.46												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Retiro (incluye reintegro) linea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv											Cant. Total	1,180.00		
ml												Saldo por Ejecutar	1,118.50		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	61.50		
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
5	10/06/2026	Retiro	Retiro linea primaria				31.50					31.50			
															
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												31.50			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.46															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA								

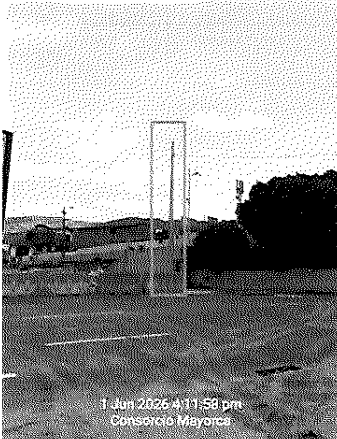
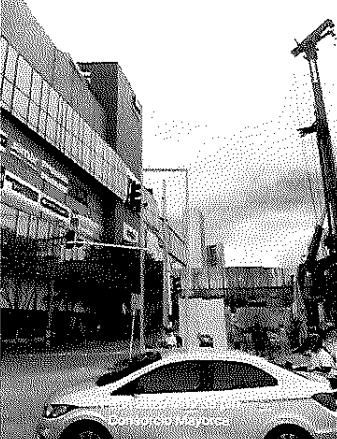

CONTROL CANTIDADES DE OBRA														
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN														
DESUR-IA-168-2025														
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	25.00	
14.47												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Retiro (incluye reintegro) vestidas primarias trifasicas 13.2 y/o 44Kv											Cant. Total	25.00	
ml												Saldo por Ejecutar	18.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	7.00	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/05/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/06/2026	Retiro de vestida	Retiro de vestida en Eje 2				2.00					2.00		
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												2.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.47														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	20.00
14.48												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro (incluye reintegro) de vientos primarios											Cant. Total	20.00
un												Saldo por Ejecutar	10.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	10.00
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro. 5	Fecha Corte 10/06/2026	Actividad Retiro	Detalle Retiro viento				Cant 2.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 2.00		
													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												2.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.48													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

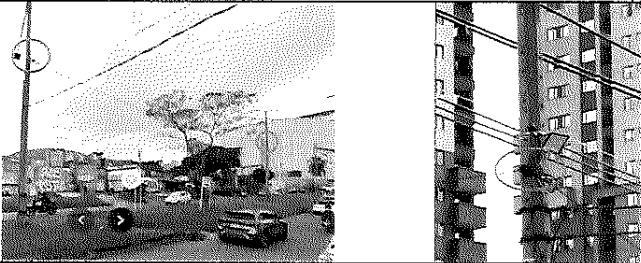

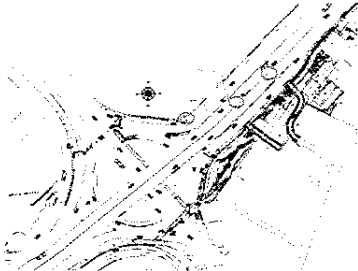
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	70.00	
14.50												Cant. Adicional	352.00	
Unidad	Traslado línea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv											Cant. Total	422.00	
ml												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	422.00	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 398.00	10/05/2026 24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/06/2026	Traslado	Traslado línea primaria				24.00					24.00		
		 												
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												24.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.50														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														


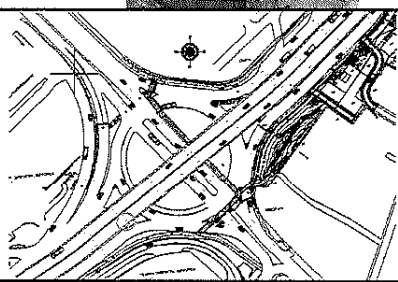

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	7.00	
14.52												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Traslado espaciadores para 13.2 y/o 44KV											Cant. Total	7.00	
un												Saldo por Ejecutar	4.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/05/2025	Traslado	Traslado de patos, espaciadores				3.00					3.00		
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												3.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20250610 Item 14.52														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

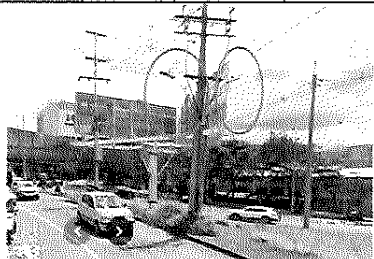
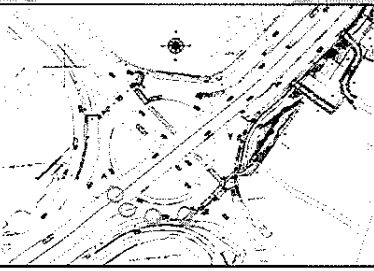
CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	25.00			
14.57												Cant. Adicional	0.00			
Unidad	Retiro (incluye reintegro) postes de concreto de 12m y/o 14m											Cant. Total	25.00			
un												Saldo por Ejecutar	13.00			
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	12.00			
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico / Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
5	10/06/2026	Retiro de postes	Retiro					9.00				9.00				
																
																
																
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.57												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5		9.00		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA																

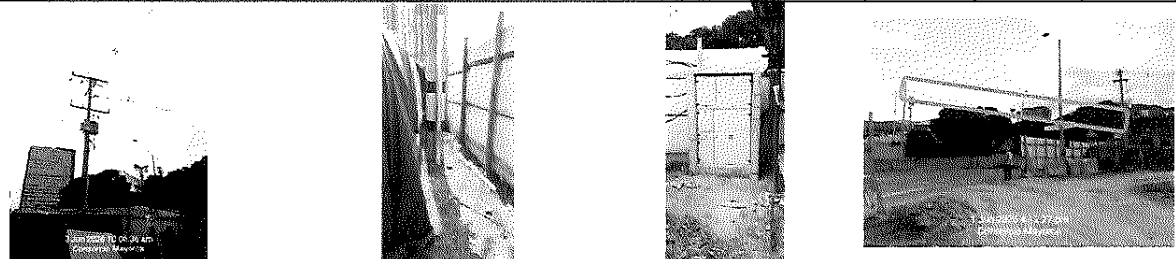
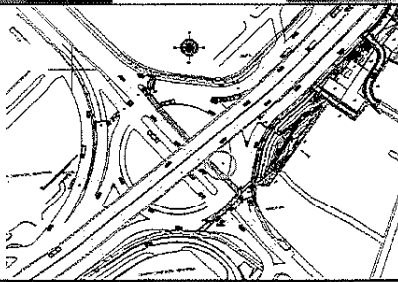
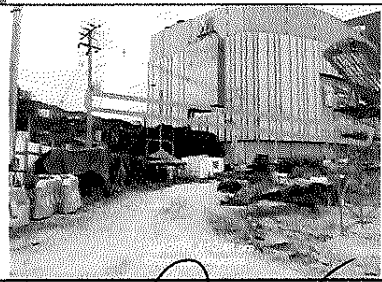

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA													
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	26.00		
14.66	Suministro, transporte y montaje poste en fibra de vidrio de 10m, 510 kgfr, según norma alumbrado público de EPM, incluye grua, hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento											Cant. Adicional	0.00		
Unidad												Cant. Total	26.00		
un												Saldo por Ejecutar	24.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	10082026 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro. 5	Fecha Corte 10/06/2026	Actividad Instalacion	Detalle Poste de fibra					Cant 2.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 2.00			
 1 Jun 2026 4:11:58 pm Consorcio Mayorca															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												2.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.66															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA								


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-05-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	400.00
14.91												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro (incluye reintegro) de triplex No.4 hasta 1/0 XLPE											Cant. Total	400.00
mi												Saldo por Ejecutar	258.50
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	141.50
0.00	0.00	0.00	0.00	10062026	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro. 5	Fecha Corte 10/06/2026	Actividad Retiro	Detalle Retiro cableado triplex					Cant 141.50	Diametro	Ancho	Alto	Total 141.50	
													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												141.50	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.91													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						


CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	4.00		
14.92													Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Retiro (incluye reintegro) de adecuaciones secundarias RA4-001, o RA4-002, RA4-003, y/o RA4-004. Incluye reintegro												Cant. Total	4.00		
un													Saldo por Ejecutar	1.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico / Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Retiro				retiro yoyo de postes				3.00				3.00		
																
																
																
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5													3.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.92																
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA																

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°S DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	16.00	
14.93	Retiro (incluye reintegro) postes metálicos, y reintegro											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	16.00	
un												Saldo por Ejecutar	15.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/05/2026	Retiro	Poste Metalico				1.00					1.00		
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												1.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.93														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	51.00
14.94	Retiro de luminarias 70, o 150, o 250 y/o 400W, incluye retiro de brazo y reintegro											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	51.00
un												Saldo por Ejecutar	47.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	4.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
5	10/05/2025	Desmonte			Retiro luminarias			4.00				4.00	
 													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												4.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 14.94													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-03-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
14.108	Suministro e instalación de provisional eléctrica. Incluye montaje de transformador Tri fasico, gabinetes de medida y protección, acometidas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye supervisión, interventoría y todo lo necesario para su ejecución.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	1.00
un												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Provisional						1.00				1.00	
													
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												1.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 item 14.108													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	612.00
15.2	Colocación de concreto de 4000 PSI para pilas de fundación. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para pilas de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	612.00
m3												Saldo por Ejecutar	84.36
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	527.64
0.00	0.00	10/04/2026 14.70	10/05/2026 301.21	10/06/2026 211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 5 - Eje 2				17.19	1.20		15.20	17.19		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 24 - Eje 5				12.44	1.20		11.00	12.44		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 25 - Eje 5				12.44	1.20		11.00	12.44		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 26 - Eje 5				12.44	1.20		11.00	12.44		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 27 - Eje 5				12.44	1.20		11.00	12.44		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 28 - Eje 5				12.44	1.20		11.00	12.44		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 29 - Eje 5				12.44	1.20		11.00	12.44		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 30 - Eje 6				19.46	1.20		17.21	19.46		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 31 - Eje 6				19.15	1.20		16.93	19.15		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 32 - Eje 6				19.25	1.20		17.02	19.25		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 33 - Eje 6				15.83	1.20		14.00	15.83		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 34 - Eje 6				23.81	1.20		21.05	23.81		
5	10/06/2026	Concreto	Pila 8 - Eje 2				22.39	1.20		19.80	22.39		
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												211.73	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 15.2													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	580.00	
15.4	Construcción de DADOS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad m3												Cant. Total	580.00	
												Saldo por Ejecutar	400.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	180.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total						
5	10/06/2026	Concreto	Zapata - eje 4	90.0	10.0	6.0	1.5	90.0						
5	10/06/2026	Concreto	Zapata - eje 3	90.0	10.0	6.0	1.5	90.0						
														
Gallery 524 Ultra 23 de mayo de 2026 8:59 a.m.				Gallery 524 Ultra 17 de mayo de 2026 8:27 a.m.										
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 15.4												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5		180.00
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO IILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	

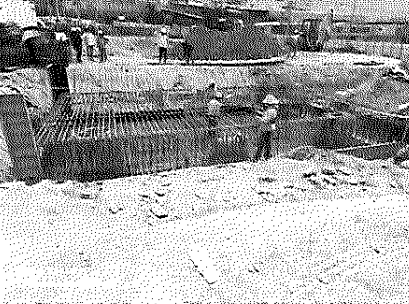
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	861,540.00
16.1	Acero de refuerzo de fy=60.000 psi. Suministro, transporte e instalación. Acero según especificaciones particulares y de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero pdr-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos (herramienta menor), transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. Incluye separadores que garanticen el recubrimiento mínimo especificado.												Cant. Adicional	0.00
Unidad													Cant. Total	861,540.00
kg													Saldo por Ejecutar	722,985.09

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	138554.91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	6680.72	17410.19	36502.00	77962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Registro Fotográfico /Plano / Esquema									
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
5	10/06/2026	Acero de refuerzo	Eje 3 - 4 - 5 - 6	77962.00				77962.00	







TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.				5	77962.00
---------------------------------------	--	--	--	---	----------



OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item 16.1




CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA



CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°S DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00	
OE1	Suministro, transporte e instalación de piedra Rajón											Cant. Adicional	155.00	
Unidad												Cant. Total	155.00	
m3												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	155.00	
0.00	0.00	10/04/2026 155.00	0.00	10/06/2026 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
5	10/06/2026	Lleno	Eje 12				96.44				96.44			
 														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.											5	96.44		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item OE1														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												 	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
OE6	Excavación de pilote de cimentación profunda de 1.20 m de diámetro mediante perforación mecánica con piloteadora, uso de camisa metálica recuperable. Incluye personal especializado, equipos mayores y menores, herramientas, maniobras de izaje, transporte de equipos, plataforma y/o terraplenes para el posicionamiento de equipos y tanques para manejo polímeros o lodos bentoníticos.											Cant. Adicional	469.86
Unidad m												Cant. Total	469.86
												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	469.86
0.00	0.00	0.00	249.63	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diámetro	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 5 - Eje 1				19.00			19.00	19.00		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 24 - Eje 1				13.30			13.30	13.30		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 25 - Eje 1				13.33			13.33	13.33		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 26 - Eje 1				13.30			13.30	13.30		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 27 - Eje 1				13.30			13.30	13.30		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 28 - Eje 1				13.40			13.40	13.40		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 29 - Eje 1				13.30			13.30	13.30		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 30 - Eje 6				18.81			18.81	18.81		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 31 - Eje 7				18.53			18.53	18.53		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 33 - Eje 8				18.42			18.42	18.42		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 34 - Eje 9				19.59			19.59	19.59		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 32 - Eje 10				23.65			23.65	23.65		
5	10/06/2026	Excavación con piloteadora	Pila 6 - Eje 2				22.30			22.30	22.30		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												220.23	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item OE6													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
OE9	Retiro y transporte a sitio autorizado de pasamanos junto a sendero peatonal: Incluye corte con herramientas manuales o equipo de oxicoorte según condición en sitio, cargue y transporte y disposición en sitio autorizado											Cant. Adicional	64.91
Unidad												Cant. Total	64.91
m												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	64.91
0.00	0.00	0.00	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Retiro de pasamanos	Eje 3 vial				1.00	64.91		0.90	64.91		
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5											64.91		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 ítem OE9													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA						 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00	
OE12												Cant. Adicional	180.00	
Unidad	Adiciones para manejo de concreto masivo.											Cant. Total	180.00	
m3												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	180.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total					
5	10/06/2026	Concreto	Zapata - eje 4		90.0	10.0	6.0	1.5	90.0					
5	10/06/2026	Concreto	Zapata - eje 3		90.0	10.0	6.0	1.5	90.0					
 														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												180.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260610 Item OE12														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR1												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Ensayos de laboratorio (Ver anexo "Ens. Lab. + póliza")											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.95
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.05
		10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026									
0.00	0.00	0.010	0.0128	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Laboratorio	Actividades de Mayo				0.0251					0.0251	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5												0.03	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR2												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación Social (Ver anexo "Subanálisis AU")											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.92
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.08
0.00	0.00	0.0774	0.0008	0.0059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Implementación actividades social	Actividades de Mayo				0.0059	5				0.0059	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												5	0.0059
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR3												Cant. Adicional	0.00
Unidad GL	Implementación Plan de Manejo Ambiental (Ver anexo PMA)											Cant. Total	1.00
												Saldo por Ejecutar	0.91
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.09
0.00	0.00	0.0867	0.0026	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Implementación Plan manejo ambiental	Actividades de Mayo				0.0031					0.0031	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.							5				0.0031		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00	
GR4												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Implementación Plan de Manejo de Tránsito (Ver anexo PMT)											Cant. Total	1.00	
GL												Saldo por Ejecutar	0.80	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.20	
0.00	0.00	0.0689	0.0408	0.095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total						
5	10/06/2026	Implementación Plan manejo de tránsito	Actividades de Mayo	0.0946				0.0946						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5														
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR5												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación SST (Ver anexo "Subanálisis AU")											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.88
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.12
0.00	0.00	10/04/2026 0.0316	10/05/2026 0.0072	10/06/2026 0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
5	10/06/2026	Implementación SST	Actividades de Mayo				0.084	5				0.0838	0.0072
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 5													
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

[illegible]

J. SEBASTIAN CAÑIZALES A.
CONSORCIO MAYORCA CONECTA
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025
JUAN CAMILO PÉREZ GONZÁLEZ
INTERVENTORIA

MEMORIA CÁLCULO		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		DESUR	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.					
ACTIVIDADES					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Total
5	10/06/2026	Resistencia a la compresión cilindros 4" (Ensayo Acreditado)	Resistencia a la compresión cilindros 4"	176	176
Registro Fotográfico /Soporte					
					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Total
5	10/06/2026	Transporte (recolección de cilindros)	Transporte y recolección de cilindros para ensayo	4	4
Registro Fotográfico /Soporte					
					
OBSERVACIONES:					
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA J. SEBASTIAN CAÑIZALES A. CONTRATISTA			 CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2026 JUAN CAMILO PÉREZ GONZÁLEZ INTERVENTORIA		

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (ANEXO PMA)				
DESGASTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, MANEJO DE DEMOLICIONES, RECONSTRUCCIÓN Y DEFENSA DE CONSTRUCCIÓN				
Demarcación de zona de trabajo temporal de excavación con 3 líneas de cinta de señalización	m ²	12 000.00	\$	220.00
Permisos de tránsito para el transporte de material (resultado de las licitas)	m	2 000.00	\$	160.00
MANEJO DE CAMPAÑAMENTO E INSTALACIONES TEMPORALES				
Campanario	un	2.00	\$	3 600 000.00
Cubierta metálica de 25 pilones	un	24.00	\$	35 000.00
Bolsas plásticas pesadas pz 50	paquete	102.00	\$	15 500.00
Cinta de lona	un	500.00	\$	300.00
Exterior tipo Ecolon de 3 kilos	un	4.00	\$	324 800.00
MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE				
Gas para tracción de detritores (litos 25 a 35 pilones)	un	1.00	\$	450 000.00
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS				
Construcción piscinas de almacenamiento	un	1.00	\$	2 500 000.00
Construcción tanques de almacenamiento	un	2.00	\$	620 800.00
Adquisición zona de acopio de combustibles	pl	1.00	\$	250 000.00
Manejo de residuos peligrosos en la obra	pl	1.00	\$	10 000 000.00
MANEJO DE ENTUBAMIENTOS Y ASBO DE LA OBRA				
Búlgate de asbo (compuesto por 3 personas) Incluye implementación	mes bígula	6.00	\$	6 648 770.00
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				
Protección de surtidores - Instalación de malla de protección tipo protección (juchile surtidores de coneros 100cc/seg)	m ²	1 500.00	\$	1 850.00
Carretamiento de las zonas cercanas a la grabación y señalización	m	200.00	\$	1 850.00
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO				
Homologación Vial, incluye señalización y conducir durante todo el tiempo de ejecución de la obra y las licitas que la intervenga la construcción necesaria	m ⁴	18.00	\$	5 000 000.00
Monitoreo de Calidad del aire, parámetro PM10, proyecto en operación	un	2.00	\$	3 700 000.00
Monitoreo de la calidad del aire, parámetros ruidos ambiental	un	2.00	\$	2 400 000.00
Monitoreo de la calidad del aire, parámetros ruido operacional	un	2.00	\$	2 400 000.00
Monitoreo de la calidad del agua	un	2.00	\$	2 200 000.00
MANEJO DE FAUNA (Abayelenlanto, Resaca y Resaca)				
Especies amenazadas	GHSA	1	\$	700 000.00
Resaca de campo	GHSA	1	\$	500 000.00
Resaca	Msa	1	\$	2 700 000.00
Resaca	GHSA	1	\$	2 000 000.00
SISTEMA DEL ARBOL URBANO SAU				
Elaboración del inventario forestal al operativo del Sistema del Arbol urbano - SAU, de acuerdo con las exigencias del Municipio de Medellín	pl	1.00	\$	6 000 000.00
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN				
La empresa adquirirá una copia de las propuestas de divulgación mencionadas en el PMA, y dispondrá de sus recursos humanos y logísticos para la fin. El equipo de arqueología realizará el acompañamiento científico y la socialización de resultados (Se valoró recurso humano)	mes	1	\$	4 800 000.00
TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				\$ 68 316 880.00

[illegible]

INTERVENTORIA

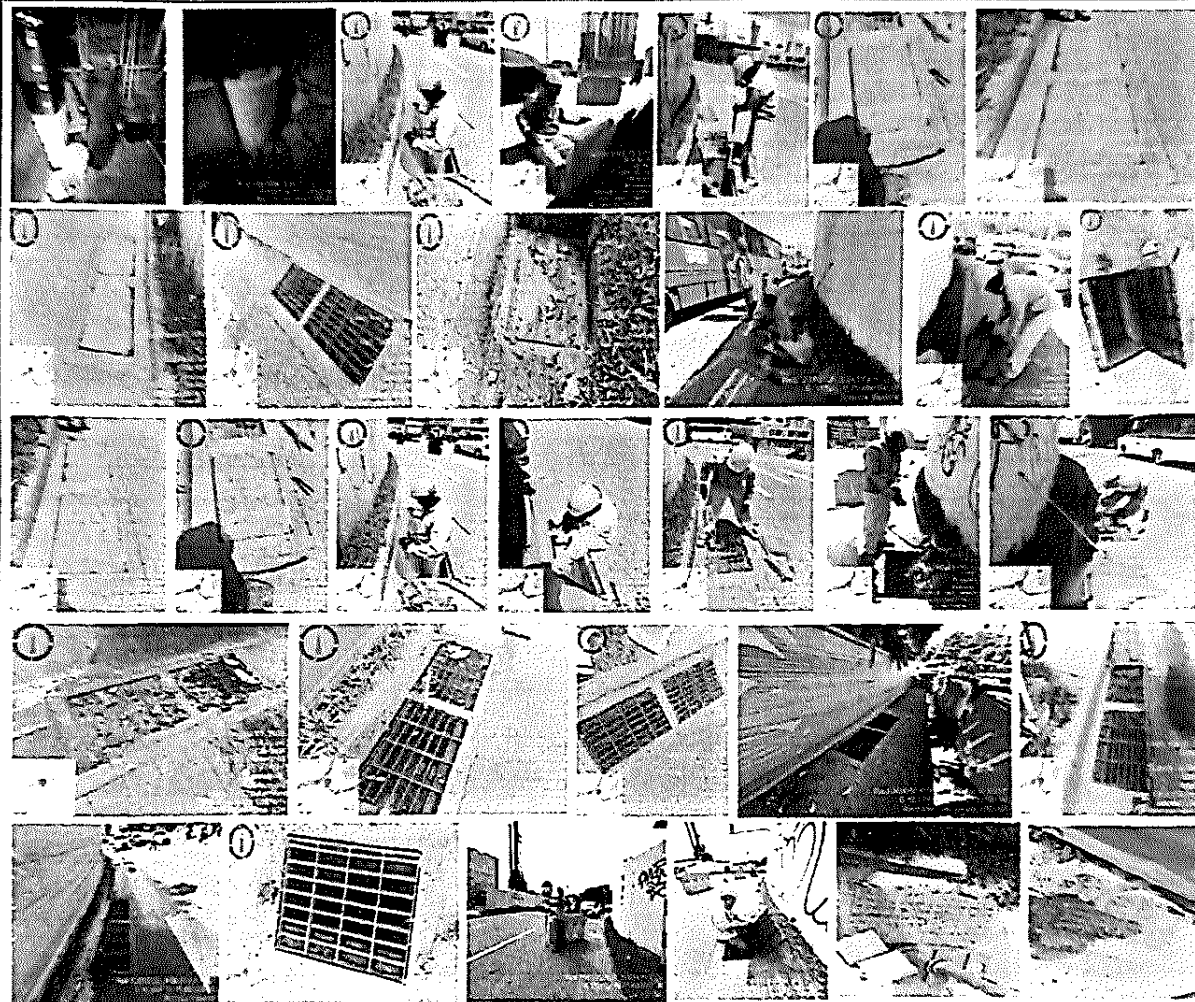
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

		MEMORIA CÁLCULO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO					
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 60 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad	Cant	Total	
5	31/05/2026	Cubrimiento de escombros con plástico calibre 4. Se paga 1 sola vez	Se implementa plástico para casi todos los programas del plan de manejo ambiental.	m2	600,00	600,00	
Registro Fotográfico /Soporte							
							

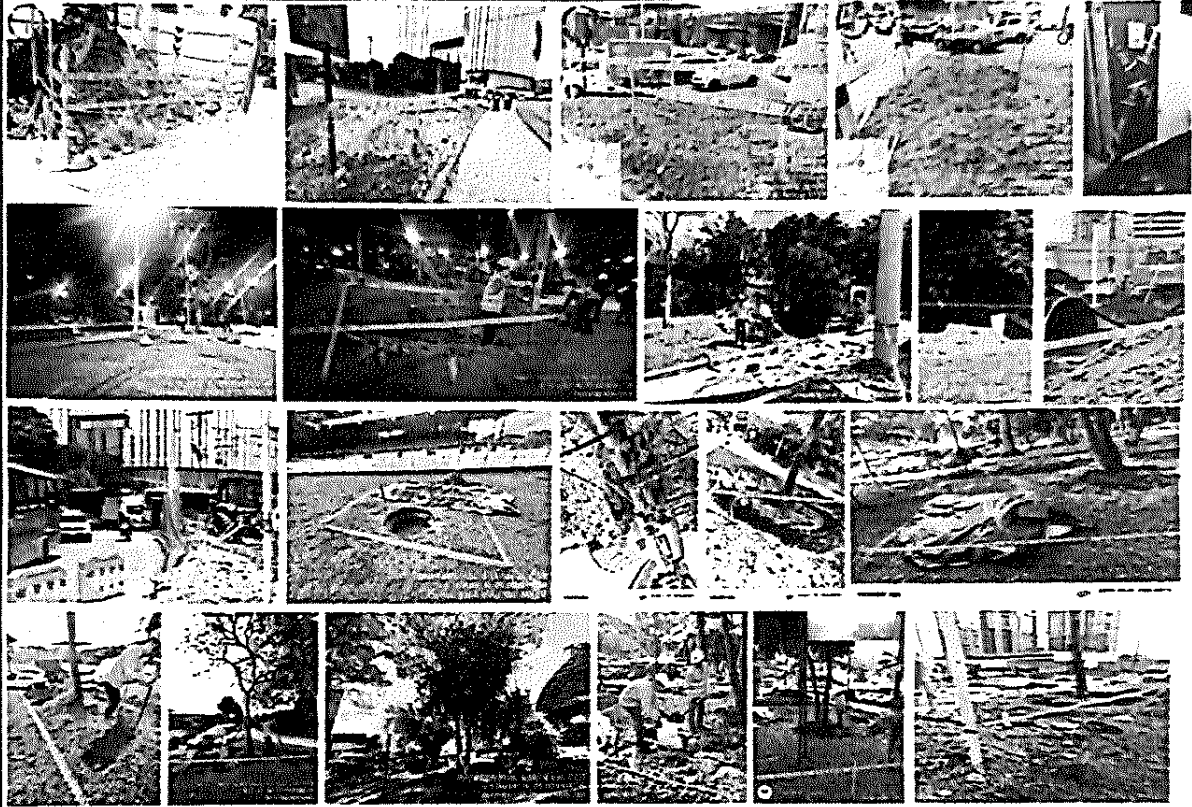
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cent	Total
5	31/05/2026	Protección de sumideros - Instalación de malla de protección tipo polisombra (Incluye sumideros del corredor y bocacalles)		m2	265,00	265,00

Registro Fotográfico / Soporte



Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Total
8	31/05/2026	Demarcación de zona de acopio temporal de escombros con 3 líneas de cinta de señalización	Se implementa Cinta de Demarcación Amb para casi todos los programas del plan de manejo ambiental	m2	20.00	20.00

Registro Fotográfico (Soporte



OBSERVACIONES: Facturas


 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 CONTRATISTA


 CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025
 INTERVENTORIA

Implementación Plan de Manejo de Tránsito (Anexo PMT)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total
Depositos y Planos de divulgación a la Comunidad				\$ 697.844.840,00		\$ 21.283.840,00		\$ 81.827.840,00		\$ 488.416.260,00		\$ 488.416.260,00
Expositores de PMT y banderines	un	22,00	\$ 8.000.000,00	\$ 176.000.000,00	1,00	6.000.000,00	5,00	30.000.000,00	17,00	137.000.000,00		137.000.000,00
Indicativo	un	22,00	\$ 5.000.000,00	\$ 110.000.000,00	1,00	3.000.000,00	5,00	15.000.000,00	17,00	102.000.000,00		102.000.000,00
Apoyantes Banderines (bando 10x)	un	132,00	\$ 2.215.890,00	\$ 292.507.560,00	0,00	13.283.040,00	21,00	46.527.240,00	111,00	245.900.400,00		245.900.400,00
Banda de señalización	un	44,00	\$ 2.215.890,00	\$ 97.499.560,00					44,00	97.499.560,00		97.499.560,00
Señalización vial y canalización del tránsito				\$ 110.478.000,00		\$ 51.613.300,00		\$ 87.340.200,00		\$ 122.088.200,00		\$ 122.088.200,00
Suministro, transporte, instalación y desinstalación de señales	und	80,00	\$ 368.800,00	\$ 29.504.000,00	21,00	7.744.800,00	33,00	12.170.400,00	47,00	17.333.800,00		17.333.800,00
replanificación, informáticas o preventivas según PMT, estructura de soporte tubular y pedales.	und	12,00	\$ 420.000,00	\$ 5.040.000,00	1,00	420.000,00	1,00	420.000,00	11,00	4.620.000,00		4.620.000,00
Banderines con señal	und	300,00	\$ 288.000,00	\$ 86.400.000,00	143,00	42.883.700,00	176,00	50.400.000,00	124,00	35.136.000,00		35.136.000,00
Máquinas (2.051x1.05 m)	und	100,00	\$ 30.800,00	\$ 3.080.000,00	2,00	73.600,00	4,00	147.200,00	96,00	2.959.200,00		2.959.200,00
Cinta de demarcación (rolo de 500 m)	und	700,00	\$ 48.900,00	\$ 34.230.000,00	10,00	489.000,00	32,00	1.564.800,00	668,00	32.965.200,00		32.965.200,00
Señalizadores tubulares (Bulbas)	und	20,00	\$ 55.000,00	\$ 1.100.000,00			6,00	330.000,00	14,00	770.000,00		770.000,00
Placa de pare y siga				\$ 1.100.000,00								
Aplicación pintura asfáltica con base agua o base solvente en la construcción de líneas de 0.40 m continua en Cebras, zona peatonal, líneas de Pare, Líneas de señalamiento, Líneas anticolisión, líneas logotípicas, cruces, Aquilas y otros. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	300,00	\$ 14.280,00	\$ 4.284.000,00					300,00	4.284.000,00		4.284.000,00
Aplicación de pintura asfáltica con base agua o base solvente en la construcción de líneas de 0.12 m para líneas centrales, líneas de carril, líneas de borde de pavimento entre otras. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	300,00	\$ 6.820,00	\$ 2.076.000,00					300,00	2.076.000,00		2.076.000,00
Aplicación de pintura asfáltica con base agua o base solvente en la construcción de marcas viales para flechas direccionales, flechas de fin de carril, arcos, pases, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, entre otros. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	300,00	\$ 22.360,00	\$ 6.708.000,00					300,00	6.708.000,00		6.708.000,00
Suministro y colocación de M20 para desechos de tránsito	un	100,00	\$ 58.240,00	\$ 5.824.000,00					100,00	5.824.000,00		5.824.000,00
Retiro y traslado de material semáforos, donde lo indique la intervención	onice	4,00	\$ 2.000.000,00	\$ 8.000.000,00					4,00	8.000.000,00		8.000.000,00
Permisos de cierre de vías.				\$ 6.300.000,00		\$ 350.000,00		\$ 1.400.000,00		\$ 4.900.000,00		\$ 4.900.000,00
Permiso para el cierre de vías en los momentos en que se requiere, ante la autoridad competente en los Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí.	un	16,00	\$ 350.000,00	\$ 5.600.000,00	1,00	350.000,00	4,00	1.400.000,00	14,00	4.900.000,00		4.900.000,00
TOTAL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO				\$ 784.889.840,00		\$ 74.286.840,00	0	\$ 160.287.960,00	0	\$ 824.392.280,00		\$ 824.392.280,00

TOTAL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO

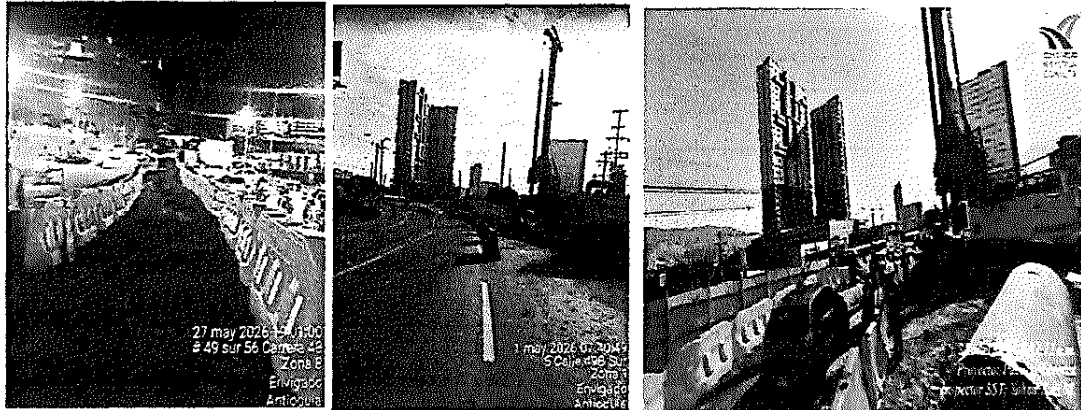
[Firma]
 Gerardo Ramírez Restrepo
 CONTRATISTA



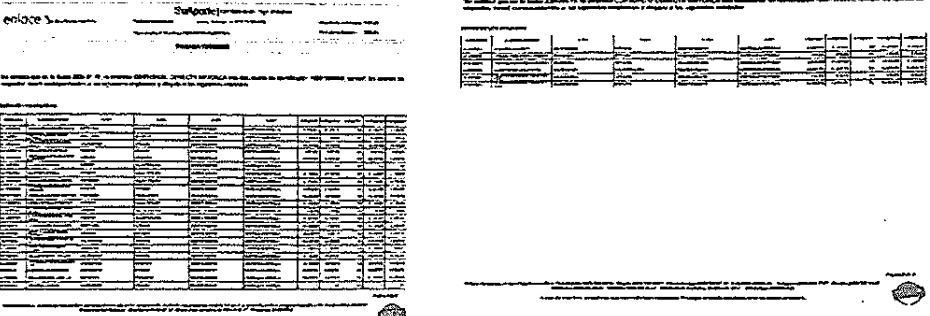

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Germán Alonso Ramírez Restrepo
 CONTRATISTA


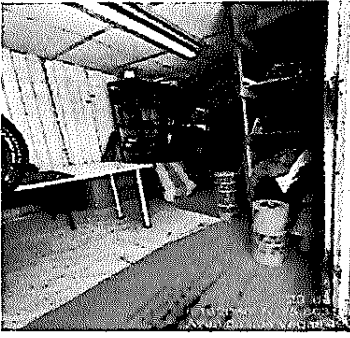
[Firma]
 CONSORCIO METROPOLITANA
 Santiago Zuluaga
 INTERVENTORIA

		MEMORIA CÁLCULO					
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO							
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°S DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.							
ACTIVIDADES							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Total		
5	30/05/2026	Ayudantes bandereros	CONTROL TRANSITO DE OBRA PMT	6,00	6,00		
Registro Fotográfico /Soporte							
  							

//////

MEMORIA CÁLCULO		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		DESUR	COMISIÓN
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°S DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
5	30/05/2026	Barricada con Señal	PMT Y CIERRES	1,00	1,00
 27 may 2026, 2:19:57 p.m. Proyecto: Puerto Maroma Inspección SST: John Ruiz, M.					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
5	30/05/2026	Maletines (2,05x1x 0,5 m)	PMT/CIERRES VIALES	143,00	143,00
Registro Fotográfico /Soporte					
 27 may 2026, 2:19:00 # 49 sur 56 Camacol Zona B Envigado Antioquia 1 may 2026, 0:20:44 5 Calle 49 Sur Zona B Envigado Antioquia 27 may 2026, 2:19:00 # 49 sur 56 Camacol Zona B Envigado Antioquia					

		MEMORIA CÁLCULO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
5	30/05/2026	Ingeniero PMT	Se anexa seguridad social	1,00	1,00
					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
5	30/05/2026	Inspector PMT	Se anexa seguridad social	1,00	1,00
					
OBSERVACIONES:					
 GERMÁN ALONSO RAMÍREZ RESTREPO CONTRATISTA			 SANTIAGO ZULUAGA INTERVENTORIA		

		MEMORIA CÁLCULO					
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO					
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total		
5	30/05/2026	Suministro, transporte, instalación y desinstalación de señales reglamentaria, informativas o preventivas según PMT, estructura de soporte tubular y pedestal.	Cierre parciales de vías por proceso constructivo	21,00	21,00		
Registro Fotográfico /Soporte							
							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total		
5	30/05/2026	Cinta de demarcación (rollo de 500 m)		2,00	2,00		
Registro Fotográfico /Soporte							
							

S

Implementación Social (Anexo Social)

FECHA 30/04/2016

Acción Social	Programa al cual pertenece en el PASAO	COMPONENTE SOCIAL				ACTAS			ACUMULADO			SALDO	
		Detalle	Cant	Unid	Valor Unitario	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	
SOCIALIZACION						\$ 16.300.000		\$ 500.000		\$ 1.500.000		\$ 15.000.000	
SOCIALIZACION	Programa de participación ciudadana	Reuniones con comunidad inicio, avance, y fin de obra. Incluye refrigerio, salidas, medio audiovisual requerido. (100 Personas)	11,00	reunión	\$ 500.000	\$ 5.500.000		\$ -	1,00	\$ 500.000	\$ 10	\$ 6.000.000	
		Reuniones y expediciones comite ciudadano de obra. Esto incluye refrigerio, alto de reunión, salidas y medio audiovisual requerido.	22,00	reunión	\$ 500.000	\$ 11.000.000	1	\$ 500.000	2,00	\$ 1.000.000	\$ 20	\$ 10.000.000	
INFORMACION Y DIVULGACION						\$ 42.185.000		\$ 266.448		\$ 2.643.648		\$ 40.111.968	
INFORMACION Y DIVULGACION	Programa de información y comunicación a la comunidad	Volantes de obra: papel propalado mate de 50 gramos, impreso por ambas caras a cuatro líneas, reflicto, en tamaño media carta	20.000,00	un	\$ 520	\$ 10.400.000	147	\$ 76.440	352,00	\$ 183.040	\$ 19.648	\$ 10.210.960	
		Buzón PQRS	5,00	un	\$ 50.000	\$ 250.000		\$ -	2,00	\$ 100.000	\$ 4	\$ 200.000	
		Cartelinas Informativas: madera o corcho de 1 metro x 90 cms.	8,00	un	\$ 140.000	\$ 1.120.000		\$ -	1,00	\$ 140.000	\$ 7	\$ 980.000	
		Pendones Informativos para volantes. (De 2 x 1 metro)	24,00	un	\$ 90.000	\$ 2.160.000	2	\$ 180.000	18,00	\$ 1.620.000	\$ 6	\$ 540.000	
		Publicaciones impresas en periódicos en pagina par, en tamaño cuarto de pagina a blanco y negro con el velo bueno del Area de Comunicaciones.	5,00	un	\$ 5.635.000	\$ 28.175.000		\$ -	0,00	\$ -	\$ 6	\$ 28.175.000	
ACTAS DE VICINIDAD Y DE ENTORNO						\$ 60.000.000		\$ -		\$ 7.200.000		\$ 22.800.000	
ACTAS DE VICINIDAD Y DE ENTORNO	Programa restitución de bienes afectados	Actas de vecindad y cierre (Area de influencia directa y cuando se requiera realizar en el Area de influencia indirecta). Incluye registro fotografico, video, fotos y digital.	200,00	un	\$ 300.000	\$ 60.000.000		\$ -	24,00	\$ 7.200.000	\$ 176	\$ 62.800.000	
EVENTO DE ENTREGA DE OBRA						\$ 9.000.000		\$ -		\$ -		\$ 9.000.000	
EVENTO DE ENTREGA DE OBRA	Sociedi	Tarima 4x4 con cabalotes, masas cement y alba (6 personas), micrófonos, alimentación, pila con micrófono, sonido Miniraudón (500 personas), cinta y ligeros para dar apertura simbólica en la Vía entre otros. Incluye placa conmemorativa y pedales para la placa conmemorativa	2,00	un	\$ 4.500.000	\$ 9.000.000		\$ -	0,00	\$ -	\$ 2	\$ 9.000.000	
TOTAL COMPONENTE SOCIAL						\$ 127.455.000,00		\$ 766.448,00		\$ 10.743.240,00		\$ 118.511.968,00	



CONSORCIO MAYORCA CONECTA

CONTRATISTA



CONSORCIO METROPOLITANO SA

INTERVENTORIA



MEMORIA CÁLCULO

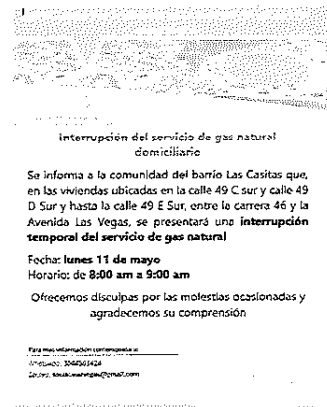

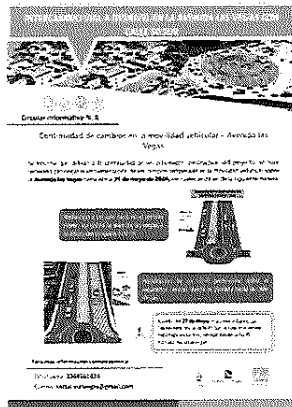
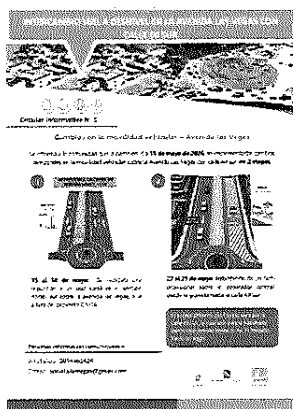
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTIVIDADES

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
5	30/05/2026	Volantes de obra: papel propalcote mate de 90 gramos, impreso por ambas caras a cuatro tintas, refilados, en tamaño media carta	* 1 impresión de la notificación 3 de las actas de vecindad (tramo demoliciones) * 1 impresión de la notificación 2 de las actas de vecindad iniciales (tramo demoliciones) * 44 impresiones de la circular de PMT * 39 impresiones de la circular de prórroga PMT * 12 impresiones de circular informativa de cierre calle 49 d sur * 50 impresiones de circular informativa de interrupción de gas	147.00	147.00

Registro Fotográfico /Soporte





MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL

ACTIVIDADES

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
5	30/05/2026	Reuniones y capacitaciones comité ciudadano de obra. Esto incluye refrigerio, sitio de reunión, silletería y medio audiovisual requerido.	Reunión con el Comité Ciudadano de obra	1.00	1.00

Registro Fotográfico /Soporte



OBSERVACIONES:

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

INTERVENTORIA



CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 5

En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de MAYO de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GRAVIRA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO, representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de MAYO de 2026:

JUSTIFICACION

ITEMS 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 – Excavación manual para caissons (diferentes profundidades)

Una vez ejecutadas en su totalidad las pilas de cimentación contempladas en el proyecto y efectuadas las mediciones definitivas de obra, se estableció que las cantidades realmente requeridas para la excavación fueron inferiores a las cantidades previstas en el presupuesto contractual. Por lo anterior, las cantidades indicadas corresponden a obra no ejecutada, toda vez que la totalidad de las pilas proyectadas fueron construidas satisfactoriamente y no se requiere la ejecución de mayores volúmenes de excavación para la culminación del objeto contractual.

ITEM 3.11 – Excavación de roca en pilas con cemento demoledor

Finalizada la construcción de todas las pilas de cimentación previstas en el proyecto, se verificó que el volumen de excavación en roca efectivamente requerido fue inferior al estimado inicialmente.

ITEM 6.1 – Construcción de carpeta asfáltica a máquina con mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25

Las cantidades menores se deben a que la estructura de pavimento inicialmente prevista será ajustada mediante la implementación de una mezcla asfáltica de alto módulo tipo MAM-25, en reemplazo de la mezcla semidensa en caliente MSC-25 contemplada en el contrato. La definición de las especificaciones técnicas, espesores y cantidades definitivas de la nueva mezcla será realizada posteriormente.

ITEM 18.1 – Apoyo elastomérico reforzado 0,80 x 0,80 x 0,08 m

Durante el desarrollo del proyecto se efectuó una revisión de los requerimientos estructurales de la superestructura, concluyéndose que las dimensiones y características inicialmente previstas para los apoyos elastoméricos debían ser modificadas para satisfacer adecuadamente las cargas y desplazamientos de diseño. En consecuencia, este elemento fue sustituido por apoyos elastoméricos de mayores dimensiones y capacidad, definidos en el ítem OE7.

ITEM 18.2 – Apoyo elastomérico sin refuerzo 60 x 12 x 1 cm

Como parte de la actualización de los elementos de apoyo y control sísmico de la estructura, se redefinieron las dimensiones de los topes elastoméricos requeridos para el proyecto. En consecuencia, el elemento originalmente previsto fue reemplazado por apoyos con dimensiones acordes a las necesidades estructurales definitivas, correspondientes al ítem OE8.

ITEM OE2 – Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas

Las cantidades menores se deben a que las pilas de cimentación contempladas en el proyecto ya fueron ejecutadas en su totalidad y las cantidades finales requeridas para las actividades de excavación resultaron inferiores a las inicialmente estimadas.

ITEM 11.7 – Válvula de 125 mm

Justificación:

Durante la ejecución de las obras hidráulicas se identificó la necesidad de incorporar válvulas de control adicionales para garantizar la correcta operación, sectorización y mantenimiento de la red intervenida. Esta actividad no estaba contemplada en las cantidades iniciales del contrato, pero resultó indispensable para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, razón por la cual fue necesario ejecutar esta obra adicional.

ITEM 11.9 – Tee 125 mm x 90 mm PEAD

Como resultado de los ajustes realizados en campo a la red proyectada, fue necesario incorporar una conexión tipo tee de 125 mm x 90 mm adicional para garantizar la correcta articulación de los ramales y el adecuado funcionamiento hidráulico del sistema.

ITEM OE6 – Excavación de pilote de cimentación profunda de 1,20 m de diámetro mediante perforación mecánica con piloteadora

Durante la ejecución de las cimentaciones profundas se evidenció la necesidad de incrementar las profundidades de excavación inicialmente previstas en el diseño, con el fin de alcanzar los estratos competentes requeridos para garantizar la capacidad portante y el adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado de las condiciones geotécnicas encontradas en campo y de las profundidades finalmente aprobadas para los pilotes, fue necesario ejecutar una mayor longitud de perforación mediante piloteadora respecto a la contemplada inicialmente.

ITEM OE7 – Apoyo elastomérico reforzado 0,90 x 0,90 x 0,10 m

Como resultado de la revisión estructural del proyecto y de las cargas reales de servicio de la superestructura, se determinó la necesidad de utilizar apoyos elastoméricos de mayores dimensiones y capacidad respecto a los inicialmente contemplados. La nueva especificación garantiza el adecuado comportamiento estructural de la obra frente a cargas verticales, desplazamientos y acciones sísmicas, motivo por el cual fue necesario incorporar este ítem como obra extra.

ITEM OE8 – Apoyo elastomérico sin refuerzo 0,50 x 0,30 x 0,02 m

En concordancia con las modificaciones efectuadas al sistema de apoyos y control sísmico de la estructura, se requirió la instalación de elementos elastoméricos con dimensiones diferentes a las originalmente previstas. Esta actividad permite garantizar el correcto funcionamiento de los topes sísmicos y el adecuado desempeño de la estructura bajo las condiciones de diseño definitivas.

ITEM OE9 – Retiro y transporte de pasamanos junto a sendero peatonal

Durante la ejecución de las obras fue necesario realizar el retiro de los pasamanos existentes localizados en el área de intervención. Esta labor no se encontraba contemplada dentro del alcance contractual inicial, por lo que se reconoce como obra extra.

ITEM OE12 – Adiciones para manejo de concreto masivo

Durante la ejecución de las cimentaciones se requirió la implementación de medidas especiales para el manejo de concreto masivo, debido a los volúmenes de concreto colocados en los elementos estructurales. Con el fin de controlar la temperatura del concreto durante su colocación y fraguado, así como minimizar el riesgo de fisuración por efectos térmicos, fue necesario incorporar actividades complementarias de control y monitoreo de temperatura.

Estas actividades incluyeron el uso de hielo para el control de la temperatura del concreto fresco y la instrumentación para el seguimiento de la evolución térmica del elemento durante el proceso de endurecimiento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de la estructura construida.

Dado que estas actividades no se encontraban contempladas dentro de los ítems contractuales originales y fueron requeridas para asegurar el adecuado comportamiento del concreto masivo ejecutado en obra, se hace necesario su reconocimiento mediante el presente ítem de obra extra.

CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 5

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3.3	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (0-2,5 m)	m3	-4.04	\$ 358,176.00	-\$ 1,447,031.00
3.4	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2.5-5 m)	m3	-7.83	\$ 447,704.00	-\$ 3,505,522.00
3.5	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (5-7,5 m)	m3	-9.42	\$ 485,376.00	-\$ 4,572,242.00
3.6	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (7.5-10 m)	m3	-11.81	\$ 570,636.00	-\$ 6,739,211.00
3.7	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (10-12,5 m)	m3	-18.26	\$ 643,998.00	-\$ 11,759,403.00
3.8	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (12.5-15 m)	m3	-18.26	\$ 729,256.00	-\$ 13,316,215.00
3.9	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (15-17,5 m)	m3	-6.47	\$ 814,515.00	-\$ 5,269,912.00
3.10	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (17,5-20 m)	m3	-7.16	\$ 899,774.00	-\$ 6,442,382.00
3.11	EXCAVACIÓN DE ROCA EN PILAS con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo tipo CRAS o equivalente con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe, extracción del material de la pila y acarreo interno y acopio donde lo indique la interventoría. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA.	m3	-150.00	\$ 464,480.00	-\$ 69,672,000.00
6.1	Construcción de carpeta asfáltica a máquina con mezcla semidensa en caliente tipo msc-25, compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIA. Incluye suministro, transporte y colocación de material tipo capa de rodadura.	m3	-142.40	\$ 1,210,640.00	-\$ 172,396,928.00
18.1	Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico en neopreno reforzado dureza 60 para apoyo superestructura Dim 0.80x0.80x0.08 m. reforzado con 2 platinas de 1/8" en acero A36, o equivalente, de acuerdo con los planos y especificaciones del fabricante.	un	-24.00	\$ 3,250,950.00	-\$ 78,022,800.00
18.2	Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico sin refuerzo medidas 60x12x1 cm dureza 60 para topes sísmicos.	un	-12.00	\$ 676,502.00	-\$ 8,118,024.00
OE2	Excavación con cuña manual, incluye manejo de aguas.	Pulg	-2000.00	\$ 7,693.00	-\$ 15,386,000.00
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					-\$ 396,647,670.00



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



CONTRATO N° DESur-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 5

OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11.7	Suministro, transporte y colocación de válvula de 125mm. Incluye Brida, Porta Brida y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	2.00	\$ 2,906,312.00	\$ 5,812,624.00
11.9	Suministro, transporte y colocación de tee 125mm x 90mm PEAD. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	un	1.00	\$ 447,202.00	\$ 447,202.00
TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA					\$ 6,259,826

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
OE6	Excavación de pilote de cimentación profunda de 1.20 m de diámetro mediante perforación mecánica con piloteadora, uso de camisa metálica recuperable. Incluye personal especializado, equipos mayores y menores, herramientas, maniobras de izaje, transporte de equipos, plataforma y/o terraplenes para el posicionamiento de equipos y tanques para manejo polímeros o lodos bentoníticos.	m	54.86	\$ 4,139,063.00	\$ 227,068,996.00
OE7	Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico en neopreno reforzado dureza 60 para apoyo superestructura Dim 0,90x0,90x0,10 m. reforzado con 3 platinas de (3mm) 1/8" en acero A36, o equivalente, de acuerdo con los planos y especificaciones del fabricante.	Und	24.00	\$ 5,939,379.00	\$ 142,545,096.00
OE8	Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico sin refuerzo medidas 0.50x0.30x0.02 m dureza 60 para topes sísmicos.	Und	12.00	\$ 272,183.00	\$ 3,266,196.00
OE9	Retiro y transporte a sitio autorizado de pasamanos junto a sendero peatonal. Incluye corte con herramientas manuales o equipo de oxicorte según condición en sitio, cargue y transporte y disposición en sitio autorizado	m	64.91	\$ 55,046.00	\$ 3,573,036.00
OE12	Adiciones para manejo de concreto masivo.	m3	180.00	\$ 77,414.00	\$ 13,934,520.00
TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA					\$ 390,387,844.00

TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA

\$ 396,647,670.00

DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA

\$ -

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empresa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESur-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESur

JESUS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

LAURA QUINTERO GRAVIRA
Supervisora del Contrato
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO DESur

ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoria
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025



ACTA DE OBRA EXTRA



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24

ACTA N°2 - APROBACIÓN OBRA EXTRA

En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de mayo de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GRAVIRIA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO, representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025; con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 2026:

OBRAS EXTRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO UNITARIO	FECHA
OE7	Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico en neopreno reforzado dureza 60 para apoyo superestructura Dim 0,90x0,90x0,10 m. reforzado con 3 platinas de (3mm) 1/8" en acero A36, o equivalente, de acuerdo con los planos y especificaciones del fabricante.	Und	\$ 5,939,379.00	may-26
OE8	Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico sin refuerzo medidas 0.50x0.30x0.02 m dureza 60 para topes sísmicos.	Und	\$ 272,183.00	may-26
OE9	Retiro y transporte a sitio autorizado de pasamanos junto a sendero peatonal: Incluye corte con herramientas manuales o equipo de oxicorte según condición en sitio, cargue y transporte y disposición en sitio autorizado	m	\$ 55,046.00	may-26
OE12	Adiciones para manejo de concreto masivo.	m3	\$ 77,414.00	may-26

OBSERVACIONES:

La construcción de estas obras extras se realizarán de acuerdo a las indicaciones del supervisor asignado por DESUR; y deben cumplir con las normas y especificaciones generales de construcción.

Se anexan los A.P.U de Obras Extras revisados y aprobados.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Los precios unitarios de Obra Extra fueron aprobados por la interventoría y representantes de la Empresa DESUR.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESUR-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

LAURA QUINTERO GRAVIRIA
SupervisorA del Contrato
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

JESUS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoria
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:	15/04/2026	
Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico en neopreno reforzado dureza 60 para apoyo superestructura Dim 0,90x0,90x0,10 m. reforzado con 3 platinas de (3mm) 1/8" en acero A36, o equivalente, de acuerdo con los planos y especificaciones del fabricante.			UNIDAD:	Und	
			CANTIDAD:	24.00	
			ITEM:	OE7	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 78,837.50	\$ 3,942.00
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 3,942.00
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Apoyo elastomérico en neopreno reforzado dureza 60 para apoyo superestructura Dim 0,90x0,90x0,10 m. reforzado con 3 platinas de (3mm) 1/8"	Und	1.00	\$ 4,803,144	\$ 4,803,144.00
	Mortero tipo grout cementicio sin contracción, de alta resistencia, tipo SikaGrout 212 o equivalente	Kg	107.00	\$ 9,833.37	\$ 1,052,170.00
					\$ -
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 5,855,314.00
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Acarreo interno	m3	0.081	\$ 15,862.00	\$ 1,285.00
					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 1,285.00
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla 1 Of + 1 Ayu	jor	0.250	315,350	\$ 78,837.50
					\$ -
					\$ -
OBSERVACIONES					\$ 78,837.50
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 78,837.50
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 5,939,379.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA: 15/04/2026		
Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico sin refuerzo medidas (0.50x0.30x0.02 m) dureza 60 para topes sísmicos.			UNIDAD: Und		
			CANTIDAD: 12.00		
			ITEM: 008		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 78,837.50	\$ 3,942.00
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 3,942.00
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Apoyo elastomérico sin refuerzo medidas 0.50x0.30x0.02 m dureza 60 para topes sísmicos.	Und	1.00	\$ 189,355.25	\$ 189,355.00
					\$ -
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 189,355.00
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Acarreo interno	m3	0.003	\$ 15,862.00	\$ 48.00
					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 48.00
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla 1 Of + 1 Ayu	jor	0.250	315,350	\$ 78,837.50
					\$ -
					\$ -
OBSERVACIONES					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 78,837.50
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 272,183.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:	15/04/2026	
Retiro y transporte a sitio autorizado de pasamanos junto a sendero peatonal: Incluye corte con herramientas manuales o equipo de oxicorte según condición en sitio, cargue y transporte y disposición en sitio autorizado			UNIDAD:	ml	
			CANTIDAD:	91.00	
			ITEM:	OE9	
ITEM	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Pulidora manual eléctrica con disco	día	0.100	\$ 41,650.00	\$ 4,165.00
	Equipo de oxicorte	día	0.100	\$ 120,000.00	\$ 12,000.00
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 31,535.00	\$ 1,577.00
	SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA				\$ 17,742.00
ITEM	MATERIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
					\$ -
	SUBTOTAL MATERIALES				\$ -
ITEM	TRANSPORTES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Transporte de material a sitio autorizado	ml	1.05	\$ 5,494.51	\$ 5,769.23
					\$ -
	SUBTOTAL TRANSPORTES				\$ 5,769.23
ITEM	MANO DE OBRA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla soldadura 1 Of + 1 Ayu	jor	0.100	315,350	\$ 31,535.00
OBSERVACIONES		SUBTOTAL MANO DE OBRA			\$ 31,535.00
		TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 55,046.00


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:	11/05/2026	
			UNIDAD:	m3	
Adiciones para manejo de concreto masivo.			CANTIDAD:	1.00	
			ITEM:	OE12	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ -
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Instrumentación temperatura	Mes	0.01	\$ 2,288,290.5	\$ 15,891.00
	Hielo	Kg	80.00	\$ 769.0	\$ 61,523.00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 77,414.00
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ -
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
OBSERVACIONES					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 77,414.00

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saldo Cotizante	Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
				CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	
CC 7830365	JORGE LUIS DORIA HERNANDEZ	01	00																																	\$ 394.500
CC 7830365	JORGE LUIS DORIA HERNANDEZ	01	00																																	\$ 325.000
CC 8647899	JESUS MARIA OCHOA TORRES	01	00																																	\$ 25.200
CC 8647899	JESUS MARIA OCHOA TORRES	01	00																																	\$ 822.600
CC 8657809	LUIS EDUARDO ORTIZ ECHAVARRIA	01	00																																	\$ 874.400
CC 9961826	FRANCISCO FIDEL TRIVERDIA BRANDEZ	01	00																																	\$ 1.075.600
PT 5481664	ANGEL DIONICIO MONTES	01	00																																	\$ 19.400
PT 5481664	ANGEL DIONICIO MONTES	01	00																																	\$ 823.100
PT 7124292	ALEXANDER JOSE REINIEL	01	00																																	\$ 955.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sin	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos y Faltas EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 136.519.787	\$ 136.519.787	\$ 136.519.787	\$ 133.178.933	\$ 21.928.400	\$ 5.431.600	\$ 9.141.800	\$ 5.297.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.799.700	\$ 0	\$ 41.799.700



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito revisor fiscal de **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, identificada con **NIT 900.240.169-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al personal vinculado y contratado por Servicios Profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la firma de dicha certificación, y a la fecha de este certificado se encuentra al día en sus pagos y respectivos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 3 días del mes de agosto del 2026. ✓

JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C 98.578.337
T.P 106587-T



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A identificada con NIT 800.014.246-8, declaro bajo la gravedad de juramento, que la sociedad ha cumplido en los últimos meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Medellín Antioquia, a los tres (03) día de agosto de 2026. ✓

Cordialmente,

Raúl A. Menco V.

Revisor fiscal designado por Auren Consultores Medellín

Tarjeta Profesional No. 66200-T

C.C. 19.872.348 de Magangué Bolívar

Medellín, 03 de agosto de 2026. ✓

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.


Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6. certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,



Daniel Flórez Osorio

Revisor fiscal

T.P. 237007-T

Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A



+57 604 266 6474
+57 301 208 5777



www.ochgroup.co



Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscriptor representante legal del **Consorcio Mayorca Conecta** identificado con nit 901.999.695 - 4, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089**, y el suscrito contador público, **CARLOS MARIO ALVAREZ CANO** identificado con cédula de ciudadanía **1.152.185.206**, certifican que el consorcio en mención se encuentra al día a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (3) tres días del mes de agosto de 2026. —

Cordialmente,

Camilo Angel Machado.
Representante legal.
Consorcio Mayorca Conecta

Carlos Mario Alvarez Cano.
Contador Público.
T.P 207249 – T

**FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO identificada con C.C. 42.961.311 de Medellín y con Tarjeta Profesional No 9622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. identificada con Nit 811006928-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ABURRÁ SUR, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en el Municipio de Envigado a los tres (03) días del mes agosto del año 2026. ✓

Atentamente,



NOMBRE: MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO
CARGO: REVISOR FISCAL de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. en
nombre de FM CONASESORES S.A.S
C.C. 42.961.311 de Medellín
Tarjeta Profesional No 9622-T

Certificación Bancaria

Señores


CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/07/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefania Niño Piza

 **Bancolombia**
