

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO		103		
		SERIE Y SUBSERIE		36		
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN		1		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORMES		20	01	2021	


Programas de Desarrollo
Entoqué Territorial

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026
PERIODO DEL 5 DE MAYO DEL 2026 AL 5 JUNIO DEL 2026
OBJETO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS CON
MANDATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA "OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN
CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO
PARTES:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. NIT N° 800252922-9 JOSE JAIRO LOPEZ MELO ALCALDE MUNICIPAL SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS NIT N° 800252922-9 RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 7.172.488 de Tunja – Boyacá
OBJETO:	contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos con mandato para la: "OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DE SIEC SEM SAS.	\$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Uno (1) MES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE MAYO DE 2026
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
FECHA PRESENTE ACTA:	29 DE MAYO DE 2026

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	36			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORMES		20	01	2021	

TABLA DE CONTENIDO

	pág.
1. INTRODUCCION	
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	3
2.1. Localización.	3
2.2. Estado actual de proyecto.	3
2.3. Características técnicas del proyecto.	3
2.4. Información del contrato.	3
2.5. Cronograma de ejecución real.	5
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	5
3.1. Garantías	5
3.2. Seguimiento a la ejecución del presupuesto pagos realizados	7
3.3. Prestaciones sociales	7
3.4. Control administrativo y financiero de los contratos de obra	8
3.5. Conclusiones y recomendaciones	8
4. ANEXOS	
Registro fotográfico	9

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas – Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9		SERIE Y SUBSERIE		36			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN		1			
	INFORMES		FECHA DEL FORMATO		D	M	A	
					20	01	2021	

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe de supervisión final, se encuentran resumidas las actividades ejecutadas por la SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS bajo el CONTRATO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026 que tiene por objeto contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos con mandato para la: “OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” Desarrollado entre el 05 de mayo de 2026 y el 05 de junio de 2026

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Dentro de las actividades ejecutadas bajo el CONTRATO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026, cuyo objeto es unir esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar el proyecto denominado “**OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**”, se encuentran actividades correspondientes de preliminares y mantenimiento general.

2.1. Localización: vereda San Carlos Municipio de San Miguel Putumayo Colombia.



2.2. Estado actual del proyecto

Actualmente, el contrato presenta un avance de ejecución del 100% conforme a las especificaciones técnicas y cantidades estimadas.

2.3. Características técnicas del proyecto.

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	36			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORMES		20	01	2021	

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 6,735,157.86
1.1	Localización y replanteo	ML	254.00	\$ 3,663.00	\$ 930,402.00
1.2	Cerramiento tela fibra tejida Alta calidad H=2,10m	ML	254.00	\$ 22,521.00	\$ 5,720,334.00
1.3	Demolición de muro E= 0.15m (Inc. retiro de sobrantes)	M2	2.76	\$ 30,587.63	\$ 84,421.86
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				\$ 15,134,073.47
2.1	Excavación manual en Material Mixto	M3	151.56	\$ 57,641.38	\$ 8,736,127.55
2.2	Rellenó en material seleccionado proveniente de la excavación	M3	133.92	\$ 27,422.00	\$ 3,672,354.24
2.3	Suministro, instalación y compactación con material recebo.	M3	17.64	\$ 154,512.00	\$ 2,725,591.68
3	RED DE DISTRIBUCIÓN				\$ 12,383,227.40
3.1	Suministro e instalación de Manguera PF + UAD Dim=1/2"	ML	40.00	\$ 13,509.56	\$ 540,382.40
3.2	Suministro e instalación de tubería Dim=2" RDE 21 Unión Mecánica	ML	305.00	\$ 38,829.00	\$ 11,842,845.00
4	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO				\$ 13,509,200.92
4.1	Suministro e instalación de ángulo de 1 1/4"X3/16 Pulgadas. Para la escalera metálica de	ML	43.16	\$ 81,455.83	\$ 3,515,633.62

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
			SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO	D	M	A		
	INFORMES			20	01	2021		

	apoyo. (Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte 2 manos)					
4.2	Suministro e instalación de Platina de 6m ½"X3/16 Pulgadas, Platina de 6m ½"X1/8 Pulgadas. Para la escalera metálica de apoyo. (Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte 2 manos)	ML	104.90	\$	49,648.72	\$ 5,208,150.73
4.3	Suministro e instalación de Línea de vida. (Incluye Guaya alma de acero de 3/8", Perros tipo pesados 3/8", Anticaídas deslizante, Anclajes en acero inoxidable y Arnés de seguridad para trabajo en alturas)	UND	1.00	\$	4,785,416.57	\$ 4,785,416.57
5	MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO					\$ 17,383,726.78
5.1	Pañete sobre muro en mortero 1:4, E=2cm.	M2	57.60	\$	79,425.75	\$ 4,574,923.20
5.2	Alistado de piso con mortero nivelación 1:4, E= 5 cm	M2	23.04	\$	38,586.65	\$ 889,036.42
5.3	Suministro e instalación de cerámica para piso antideslizante.	M2	23.04	\$	164,537.88	\$ 3,790,952.76
5.4	Suministro e instalación de cerámica para pared.	M2	57.60	\$	141,125.25	\$ 8,128,814.40

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
			SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO	D	M	A		
	INFORMES			20	01	2021		

6	MANTENIMIENTO PUNTO DE CAPTACIÓN DE AGUA				\$	5,726,160.00
6.1	Mantenimiento de pozo de agua 48 ml de profundidad	ML	48.00	\$	119,295.00	\$ 5,726,160.00
7	MEJORAMIENTO CUARTO DE CONTROL SISTEMA FOTOVOLTAICO				\$	11,801,854.62
7.1	Placa de E=0,12m concreto 210 kg/cm ² (3.000 psi)	M2	11.28	\$	628,315.00	\$ 7,087,393.20
7.2	Pintura vinilo tipo 1, de 3 manos de pintura	M2	26.82	\$	20,200.00	\$ 541,764.00
7.3	Pintura tipo Koraza	M2	26.82	\$	25,306.00	\$ 678,706.92
7.4	Suministro e instalación de triturado ¾" para mejoramiento del andén	M2	23.66	\$	147,675.00	\$ 3,493,990.50
8	REDES ELECTRICAS CUARTO DE CONTROL SISTEMA FOTOVOLTAICO				\$	23,838,709.78
8.1	Suministro instalación y transporte de sistema de generación de energía solar fotovoltaica, incluye protección, gabinete de seguridad, accesorios de instalación y estructura metálica como soporte.	UND	1.00	\$	18,160,307.01	\$ 18,160,307.01
8.2	Suministro e instalación de Luminaria Led 50w Luz Blanca. Incluye accesorios.	UND	2.00	\$	246,206.01	\$ 492,412.02
8.3	Suministro e instalación de acometida Cu 3 No. 10 THW	ML	13.00	\$	61,398.51	\$ 798,180.63

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas – Desarrollo Enfoque Territorial
			SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO		D	M	A	
	INFORMES				20	01	2021	

	AWG, incluye tubería EMT 1/2", curvas y uniones de 1/2", caja EMT octogonal.					
8.4	Suministro e instalación de acometida Cu 3 No. 10 THW AWG, incluye tubería Conduit PVC 1/2", curvas y uniones de 1/2", caja octogonal.	ML	10.00	\$ 38,115.01	\$ 381,150.10	
8.5	Suministro e instalación de tablero monofásico 6 cto con interruptores, incluye accesorios.	UND	1.00	\$ 286,620.01	\$ 286,620.01	
8.6	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para bajantes y tablero	UND	1.00	\$ 763,645.01	\$ 763,645.01	
8.7	Suministro e instalación de Bomba solar Tipo Lapicero. Incluye accesorios.	UND	1.00	\$ 2,956,395.00	\$ 2,956,395.00	
9	ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL				\$ 7,308,927.65	
9.1	Suministro e Instalación de válvula HD de compuerta elástica Dim=2" para sectorización. Incluye caja de inspección reforzada E=0,10m, SH= (0,60m X0,60m), H=(0,00m-1,50m), Concreto de 3000 Psi, Acero PDR 60	UND	2.00	\$ 2,065,677.60	\$ 4,131,355.20	
9.2	Suministro e Instalación de unión rápida PVC Dim=2"	UND	3.00	\$ 157,319.20	\$ 471,957.60	

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO		103			
		SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORMES			20	01	2021	



Programas - Desarrollo
Enfoque Territorial



9.3	Suministro e Instalación de Tapón HD Dim=2"	UND	1.00	\$ 141,616.20	\$ 141,616.20
9.4	Suministro e Instalación de Codo HD EL X 90° PVC Dim=2"	UND	10.00	\$ 202,591.20	\$ 2,025,912.00
9.5	Suministro e Instalación de Centro de Medición Domiciliaria	UND	1.00	\$ 392,805.45	\$ 392,805.45
9.6	Suministro e Instalación de Collar HD para PVC 2" X 1/2". Incluye válvula de incorporación	UND	1.00	\$ 145,281.20	\$ 145,281.20
TOTAL, COSTO DIRECTO:					\$ 113,821,038.48
ADMINISTRACIÓN				27.0%	\$ 30,731,680.39
IMPREVISTOS				3.0%	\$ 3,414,631.15
UTILIDAD				2.0%	\$ 2,276,420.77
TOTAL, COSTO INDIRECTO: (32%)					\$ 36,422,732.31
IMPLEMENTACIÓN DEL PMA					UND \$ 19,592,500.00
COSTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA:					\$ 169,836,270.79
TOTAL, PROYECTO:					\$ 169,836,270.79

2.4. Información del contrato.

A continuación, se relaciona la información del proceso CONTRATO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026

pág. 8

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	36			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORMES		20	01	2021	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO
PARTES:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. NIT N° 800252922-9 JOSE JAIRO LOPEZ MELO ALCALDE MUNICIPAL SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS NIT N° 800252922-9 RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 7.172.488 de Tunja – Boyacá
OBJETO:	contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos con mandato para la: "OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DE SIEC SEM SAS.	\$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Uno (1) MES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE MAYO DE 2026
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
FECHA PRESENTE ACTA:	29 DE MAYO DE 2026

2.5. Seguimiento al cronograma de ejecución y del presupuesto de obra:

Actualmente, el Proceso CONTRATO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026, presenta un avance de ejecución del 100%

Se puede evidenciar en el cronograma de ejecución actualizado, que el tiempo transcurrido desde la suscripción del acta de inicio el 30 de abril de 2026 hasta la fecha del presente informe de supervisión final del 29 de mayo de 2026, fue uno (01).

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.1. Garantías

GARANTÍAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA

Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del contrato suscrito, se constituyó a costa del contratista y a favor de EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL en una compañía de seguros legalmente establecida en el país, una póliza única que cubre los siguientes amparos, como se indica en proceso precontractual:

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
			SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO		D	M	A	
	INFORMES				20	01	2021	

AMPAROS	TIPO DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	SI	NO
Cumplimiento General	Póliza de seguros	igual o superior 10% del valor del contrato	Deberá extenderse por el termino de ejecución del contrato interadministrativo para la administración delégala de recursos con mandato y cuatro meses más.	X	
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES	Póliza de seguros	Igual o superior 5% del valor del contrato	Deberá extenderse por el termino de ejecución del contrato interadministrativo para la administración delégala de recursos con mandato y tres años mas	X	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de seguros	Igual o superior al 100% del valor del contrato	Vigencia igual al plazo del contrato interadministrativo para la administración delégala de recursos con mandato y cuatro meses más.	X	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Póliza de seguros	Diez por ciento 10% del valor del contrato	Cinco años (5) contados a partir del recibido de las obras		
RCE	Póliza de seguros	Doscientos (200) SMMLV	Deberá extenderse por el termino de ejecución del contrato interadministrativo para la administración delégala de recursos con mandato	X	

Para el desarrollo del contrato se suscribió la póliza No. 45-44-101167257 de Cumplimiento de Entidad Estatal, con la firma SEGUROS DEL ESTADO S.A., expedida el 27/06/2025; con los siguientes amparos:

ANEXO 0. póliza No. 45-44-101167257 expedida el 27/06/2025

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO		103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A		
	INFORMES		20	01	2021		

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 12.148.976,39	25/06/2025	25/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 6.074.488,20	25/0/2025	25/08/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 59.994.881,97	25/06/2025	25/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 12.148.976,39	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

ANEXO 0. póliza 45-40-101101008 expedida el 07-06-2025

AMPAROS	DEDUCIBLE	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10,00 DEL VALOR DE LA PERDIDA-mínimo: 1SMMLV	25/06/2025	25/08/2025	\$ 284.700.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10,00 DEL VALOR DE LA PERDIDA-mínimo: 1SMMLV	25/06/2025	25/08/2025	\$ 284.700.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	10,00 DEL VALOR DE LA PERDIDA-mínimo: 1SMMLV	25/06/2025	25/08/2025	\$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10,00 DEL VALOR DE LA PERDIDA-mínimo: 1SMMLV	25/06/2025	25/08/2025	\$ 284.700.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10,00 DEL VALOR DE LA PERDIDA-mínimo: 1SMMLV	25/06/2025	25/08/2025	\$ 284.700.000,00

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103		 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial	
			SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO		D	M		A
					20	01		2021
INFORMES								

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10,00 DEL VALOR DE LA PERDIDA-mínimo: 1SMMLV	25/06/2025	25/08/2025	\$ 284.700.000,00
----------------------------------	--	------------	------------	-------------------

3.2. Seguimiento a la ejecución del presupuesto

El proceso inicio labores a los ocho (08) días del mes de julio de 2025, luego de levantarse acta de inicio en las instalaciones de la alcaldía del Municipio de San Miguel en presencia del secretario de planeación y obras públicas, el arquitecto GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES designado como supervisor del contrato, y, la SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS en presencia del representante legal, RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES representada legalmente por el señor RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES, contratista del presente contrato de obra; posteriormente, transcurrido un (01) mes y veintiún días; el día veintiocho (28) de agosto de 2025, se recibe a satisfacción teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el proceso contractual y se procede a la suscripción del acta de entrega y recibo final y se anexa este informe de supervisión final como parte integral del acta de entrega y recibo final del convenio interadministrativo.

Pagos realizados

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026	
PORCENTAJE DEL AVANCE DE CONTRATO DE OBRA	100,00%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 169.836.270,79
VALOR ADICIONADO	\$0,00
VALOR TOTAL	\$ 169.836.270,79
VALOR TOTAL EJECUTADO.	\$ 169.836.270,79
VALOR ANTICIPO	\$ 84.918.135,4
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 84.918.135,4
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 84.918.135,39

3.3. Prestaciones sociales

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS cumplió durante el proceso con el trámite legal y actualizado de las prestaciones sociales, para el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2026 y el 29 de mayo de 2026.

Se anexa el correspondiente soporte documental en el expediente del proyecto.
Planillas de seguridad social en general WORCING SAS

3.4. Control administrativo y financiero de los contratos de obra.

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			
			SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO		D	M	A	
					20	01	2021	
INFORMES								

En el periodo comprendido entre el 04 de mayo de 2026 y el 05 de junio de 2026, el contratista y supervisión suscribieron los siguientes actos administrativos, atendiendo las obligaciones del proceso y las solicitudes por parte del contratista.

- proceso CP-PR-2026-034
- acta de inicio, del 04 de mayo de 2026.


3.5. Conclusiones y recomendaciones

- Se logro reformar el cuarto de control fotovoltaico, siendo así con una fundición de placa para el montaje de los paneles solares totalmente un proceso exitoso, dándole mayor durabilidad al sistema de control bajo techo
- Mejora de la Distribución del agua en la parte interna del colegio: Se monta un sistema totalmente independiente al de la comunidad en general, dando así un buen rendimiento por separado a la institución y la comunidad. Los nuevos materiales son más resistentes a las condiciones ambientales y al uso constante.
- Se cambio totalmente la tubería de distribución del agua en cuanto a los tanques de la institución como al tanque principal para que esta así funcione por separado.
- Impacto en la comunidad: La finalización de este proyecto ha tenido un impacto directo y positivo en la vereda San Carlos, facilitando el manejo y distribución interna del agua en el colegio. La rehabilitación del acueducto a la institución fue de valor agregado, contribuyendo al bienestar y desarrollo local. En general, el proyecto se considera exitoso, ya que cumplió con sus objetivos técnicos y satisfizo las necesidades de la comunidad beneficiada.
- Se sugiere llevar a cabo a cabo una jornada de capacitación o socialización con los líderes de la institución y la vereda San Carlos, comunidad en general. El objetivo es que la población conozca los cuidados básicos que debe tener el Sistema de abastecimiento de agua, como evitar el uso de objetos cortantes o pesados o mala manipulación de las llaves de paso, que puedan dañar el cuarto de control o red de distribución del agua. Recomienda reportar cualquier anomalía que detecte.


ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAIDES
Secretario de Planeación Y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	36			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORMES		20	01	2021	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

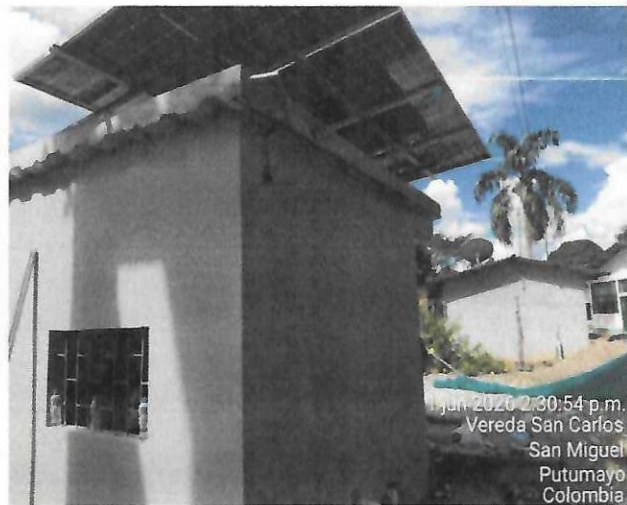

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
			SERIE Y SUBSERIE		36			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO		D	M	A	
	INFORMES				20	01	2021	

