

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA			CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
				VERSIÓN	0		
				PÁGINA	1	DE	12

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO 1316 DE 2020

"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

INTERVENTOR: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA
CONTRATO: 2320 DE 2019

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	--	--

Carrera 5 # 5-08
Cel: 321-4521739; 322-8562347
Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com
nicolasredondom@live.com
La Palma, Cundinamarca

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA</p>		CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
			VERSIÓN	0		
			PÁGINA	2	DE	12

1. INTRODUCCION


Mediante oficio DT-CUN - 41870 del 22 de octubre de 2020, Orden de Inicio del contrato número 1316 de 2020.

Este informe contiene la descripción de las actividades realizadas de interventoría delegada por la dirección territorial CUNDINAMARCA, mediante contrato No. 2320 de 2019, cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, MODULO 2, GRUPO 2.

Durante el PERIODO del 26 de octubre de 2020 al 30 de noviembre de 2020, a través del seguimiento y la observación visual del estado de las obras realizadas en la vía y sus necesidades, así como la supervisión a las obras que se desarrollan en ella; y la ejecución de labores a cargo del contratista.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

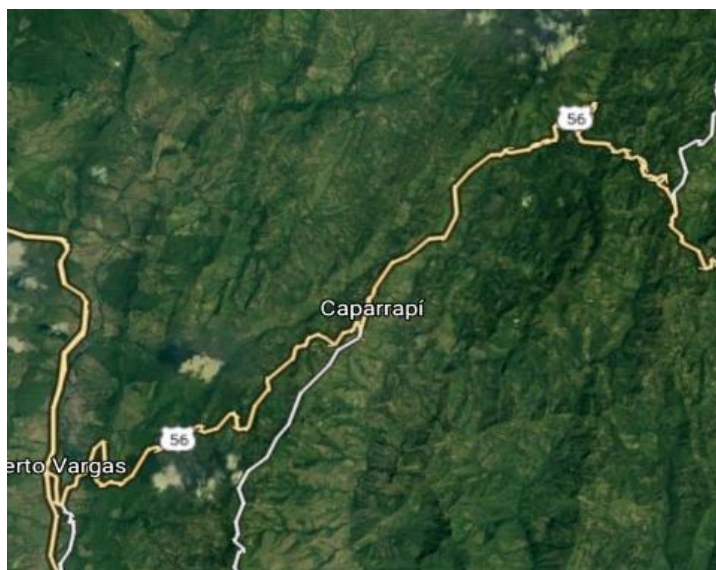

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	--	--

Carrera 5 # 5-08
Cel: 321-4521739; 322-8562347
Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com
nicolasredondom@live.com
La Palma, Cundinamarca

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	3	DE	12

SE REALIZARÁ EL PROYECTO EN LA VIA NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DE INVIAS.

GRUPO 2: 50CN01 DINDAL - CAPARRAPÍ, PR 0+0000 AL PR 14+0000

2.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:

Las obras objeto del contrato están localizadas en jurisdicción del municipio de CAPARRAPÍ del departamento de Cundinamarca, básicamente el contrato consiste en EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA para atenderla realizando parcheo de sitios críticos en la vía 50CN01 Dindal-Caparrapí. Que han afectado el estado de las vías y se realizara las actividades descritas en el contrato 1316 de 2020, el cual se ha suscrito entre INVIAS, territorial CUNDINAMARCA, y SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S el cual debe desarrollar las siguientes actividades:

- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC19-INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y DESCARGUE EN CADA BACHE QUE SE VAYA A RELLENAR A LO LARGO DE LA VÍA)
- SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR-1
- SUMINISTRO DE COMPACTADOR VIBRATORIO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE, OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
- SUMINISTRO DE TERMINADORA DE ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)
- SUMINISTRO DE FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE
- SUMINISTRO DE CORTADORA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE Y DISCO DE CAMBIO
- TRANSPORTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y FRESADOS

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	---	--

Carrera 5 # 5-08

Cel: 321-4521739; 322-8562347

Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com

nicolasredondom@live.com

La Palma, Cundinamarca

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	4	DE	12

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL

Contrato No.: 1316 de 2020

Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S.

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

Objeto: “**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL-CAPARRAPI- LA AGUADA SECTOR EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000-PR14+0000**”.

Plazo inicial: Dos meses

Fecha de iniciación: octubre 26 de 2020

Fecha de Terminación: diciembre 25 de 2020

Valor Total Inicial: \$75.164.995,00

3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo se ha ejecutado el 100% de las actividades de "SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

INFORME DE AVANCE

Se desarrolló en un 100% de las siguientes actividades:

- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC19-INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	---	--

Carrera 5 # 5-08

Cel: 321-4521739; 322-8562347

Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com

nicolasredondom@live.com

La Palma, Cundinamarca

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	5	DE	12

DESCARGUE EN CADA BACHE QUE SE VAYA A RELLENAR A LO LARGO DE LA VÍA)

- SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR-1
- SUMINISTRO DE COMPACTADOR VIBRATORIO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE, OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
- SUMINISTRO DE TERMINADORA DE ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)
- SUMINISTRO DE FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE
- SUMINISTRO DE CORTADORA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE Y DISCO DE CAMBIO
- TRANSPORTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y FRESADOS

3.3.1. AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS

El resultado se obtuvo siguiendo el plan de Inversión que presento el contratista para el mes de 26 de octubre a 25 de diciembre, según programa de inversiones que se adjunta al presente informe.

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA

Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2, le corresponde la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, MODULO 2, GRUPO 2.

Para la ejecución de las actividades laboraron las siguientes personas y el siguiente apoyo logístico:

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	--	--

Carrera 5 # 5-08

Cel: 321-4521739; 322-8562347

Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com

nicolasredondom@live.com

La Palma, Cundinamarca

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	6	DE	12

4.2 PROFESIONALES.

Ingeniero Residente: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRÍGUEZ.
 MP 25202177615. CND

Inspector vial: MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA

Inspector SST: WENDY JULIETH ROMERO HERNANDEZ

4.3. ASISTENTES.

Conductor: CARLOS LEANDRO BRAUSION OSMA

4.4. OFICINA. CARRERA 5 N° 5 –08 La palma - Cundinamarca.

TELÉFONOS:

Celulares: 321-4782817, 321-4521739, 320-4960894

4.5. VEHÍCULOS.

Camioneta CHEVROLET TRAKER modelo 2017 Placa: DOS 991

4.6. ASPECTOS TECNICOS

Por delegación de la DTCUN, CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA ejecuta la interventoría al contrato de obra 1316 de 2020, cuyo objeto es: **“SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000”**.

Entre las principales actividades que realiza la interventoría, se encuentran:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades del contratista, según las cantidades contractuales objeto del contrato.

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
---	---	---

Carrera 5 # 5-08
 Cel: 321-4521739; 322-8562347
 Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com
nicolasredondom@live.com
 La Palma, Cundinamarca

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	7	DE	12

- Se participó en las reuniones de coordinación programadas por la Dirección Territorial.
- Se participa en reuniones de carácter técnico relacionadas con los contratos tanto de interventoría como de obra.
- Se encuentra al día con los pagos de aportes de ley y de parafiscales.

4.7. ACTIVIDADES MENSUALES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

- **Visitas de Rutina a las vías DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA:** Se realizan visitas periódicas a la vía para verificar su estado, y establecer y priorizar necesidad de las actividades programadas para realizar el proyecto de SUMINISTRO DE MEZCLA y atender los sitios previamente seleccionados por la interventoría.
- **Programación Actividades:** Se realizó programación mensual de actividades según el programa de inversiones aprobado al contratista.
- **Visitas Técnicas:** Se efectúa acompañamiento y se brinda apoyo a funcionarios de las diferentes Entidades que participan en la ejecución del Proyecto.

4.8. ASPECTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS:

- Se revisó y remitió el acta de cobro mensual de la interventoría, correspondiente al mes de noviembre de 2020. Y también se revisó, aprobó y Se remite acta parcial de Recibo de Obra Final, al contratista por valor de **\$75.164.995 (SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE).**
- SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S. El contratista se encuentra al día con los pagos de aportes de ley y de parafiscales.

4.9. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORIA

4.10. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	--	--

Carrera 5 # 5-08

Cel: 321-4521739; 322-8562347

Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com

nicolasredondom@live.com

La Palma, Cundinamarca

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	8	DE	12

- 4.11. **INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
- 4.12. **INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (No aplica)**
- 4.13. **REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DEL GESTOR TECNICO.**

5. **ASPECTOS DE GESTION SOCIO-AMBIENTAL:**

En cuanto a los aspectos de gestión social, se tiene:

- Se realiza el debido acompañamiento a los funcionarios involucrados en el proyecto a los recorridos a la vía.

6. **CUADRO RESUMEN AVANCE FISICO-FINANCIERO (No aplica)**

7. **RELACION CORRESPONDENCIA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA**

Se envió vía E-mail, whatsapp y llamadas telefónicas los compromisos pactados para la ejecución del contrato, también se le solicita que inicie lo antes posible a ejecutar.

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	--	--

Carrera 5 # 5-08
Cel: 321-4521739; 322-8562347
Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com
nicolasredondom@live.com
La Palma, Cundinamarca

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA</p>		CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
			VERSIÓN	0		
			PÁGINA	9	DE	12

8. REGISTRO FOTOGRAFICO Anexo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000.
	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	---	--

Carrera 5 # 5-08
Cel: 321-4521739; 322-8562347
Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com
nicolasredondom@live.com
La Palma, Cundinamarca

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA</p>	CÓDIGO	INV-425-INF-001-12		
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	10	DE	12



**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01
EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000**

**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01
EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000**



**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01
EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000**

**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01
EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000**

ELABORADO POR: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	REVISADO POR: ERIKA J. URIBE NAVARRO GESTORA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	APROBADO POR: ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS L. DIRECTOR INVIAS DT-CUNDINAMARCA
--	--	--

Carrera 5 # 5-08
Cel: 321-4521739; 322-8562347
Correos: amvconsorciociviles144@gmail.com
nicolasredondom@live.com
La Palma, Cundinamarca

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO		MSE-FR-21	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		1	DE

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	2	11	20
-------------------	------------------------------------	-------	---	----	----

DIRECCION TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No:	1316 de 2020
-----------------------	--------------	--------------	--------------

Semana Número:	1	Del:	26 DE OCTUBRE DE 2020	Al:	01 DE NOVIEMBRE DE 2020
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 Días			
Supervisor del Contrato de interventoría		ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO			

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.
"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

<table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td style="text-align: center;">11,67</td> <td style="text-align: center;">11,67</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$ 8.769.249</td> <td style="text-align: center;">\$ 8.769.249</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	11,67	11,67	Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 8.769.249	<table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	0	0	Valor básico de la Obra	\$	\$
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	11,67	11,67																	
Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 8.769.249																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	0	0																	
Valor básico de la Obra	\$	\$																	

CONTRATO DE OBRA: Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S Contrato No. 1316 de 2020 Valor Inicial: \$ 75.164.995,00 Valor Actualizado: \$ 75.164.995,00 Plazo Inicial: 2 MESES Plazo Actualizado: 2 MESES Fecha de Iniciación: 26 DE OCTUBRE DE 2020 Fecha de Vencimiento: 25 DE DICIEMBRE DE 2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA: Interventor: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA Contrato No. 2320 de 2019 Valor Inicial: \$ 1.276.989.590,00 Valor Actualizado: \$ 1.276.989.590,00 Plazo Inicial: Treinta y dos (32) Meses Plazo Actualizado: Treinta y dos (32) Meses Fecha de Iniciación: 27 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de Vencimiento: 31 DE JULIO DE 2022
---	--

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA PROTOCOÑO DE BIOSEGURIDAD PARA SU APROBACION

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
VISITA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA A LA VIA 50CN1 DINDAL - CAPARRAPI DEL PR 0+0000 AL PR 14+0000

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div>	<div style="text-align: center;">  Firma Nombre: WILLIAM CASASBUENAS RODRIGUEZ Matrícula No. : 25202-177615CND </div>

REGISTRO FOTOGRAFICO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	9	11	20
--	-------	---	----	----

DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	CONTRATO No: 1316 de 2020
------------------------------------	---------------------------

Semana Número: 2	Del: 02 DE NOVIEMBRE DE 2020	Al: 08 DE NOVIEMBRE DE 2020
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días		
Supervisor del Contrato de interventoría: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO		

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.
"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PRO+000 - PR 14+000"

<table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td style="text-align: center;">11,67</td> <td style="text-align: center;">23,33</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$ 8.769.249</td> <td style="text-align: center;">\$ 17.538.499</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	11,67	23,33	Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 17.538.499	<table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	0	0	Valor básico de la Obra	\$	\$
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	11,67	23,33																	
Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 17.538.499																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	0	0																	
Valor básico de la Obra	\$	\$																	

CONTRATO DE OBRA: Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S Contrato No. 1316 de 2020 Valor Inicial: \$ 75.164.995,00 Valor Actualizado: \$ 75.164.995,00 Plazo Inicial: 2 MESES Plazo Actualizado: 2 MESES Fecha de Iniciación: 26 DE OCTUBRE DE 2020 Fecha de Vencimiento: 25 DE DICIEMBRE DE 2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA: Interventor: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA Contrato No. 2320 de 2019 Valor Inicial: \$ 1.276.989.590,00 Valor Actualizado: \$ 1.276.989.590,00 Plazo Inicial: Treinta y dos (32) Meses Plazo Actualizado: Treinta y dos (32) Meses Fecha de Iniciación: 27 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de Vencimiento: 31 DE JULIO DE 2022
--	---

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, VISITA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA A LA VIA 50CN01 DINDAL - CAPARRAPI PR 0+0000 AL PR 14+0000

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
REUNION VIRTUAL CON SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y INTERVENTORIA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 10px; width: 100%;"></div>	<div style="text-align: center;">  Firma Nombre: WILLIAM CASASBUENAS RODRIGUEZ Matrícula No. : 25202-177615CND </div>

REGISTRO FOTOGRAFICO

[illegible]

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	23	11	20
--	-------	----	----	----

DIRECCION TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No: 1316 de 2020
-----------------------	--------------	---------------------------

Semana Número: 4	Del: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020	Al: 22 DE NOVIEMBRE DE 2020
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 28 Días		
Supervisor del Contrato de interventoría: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO		

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.
"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td style="text-align: center;">11,67</td> <td style="text-align: center;">46,67</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$ 8.769.249</td> <td style="text-align: center;">\$ 35.076.998</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	11,67	46,67	Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 35.076.998	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	0	0	Valor básico de la Obra	\$	\$
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	11,67	46,67																	
Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 35.076.998																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	0	0																	
Valor básico de la Obra	\$	\$																	

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S Contrato No. 1316 de 2020 Valor Inicial: \$ 75.164.995,00 Valor Actualizado: \$ 75.164.995,00 Plazo Inicial: 2 MESES Plazo Actualizado: 2 MESES Fecha de Iniciación: 26 DE OCTUBRE DE 2020 Fecha de Vencimiento: 25 DE DICIEMBRE DE 2020	Interventor: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA Contrato No. 2320 de 2019 Valor Inicial: \$ 1.276.989.590,00 Valor Actualizado: \$ 1.276.989.590,00 Plazo Inicial: Treinta y dos (32) Meses Plazo Actualizado: Treinta y dos (32) Meses Fecha de Iniciación: 27 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de Vencimiento: 31 DE JULIO DE 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
•SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC19-INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y DESCARGUE EN CADA BACHE QUE SE VAYA A RELLENAR A LO LARGO DE LA VÍA) •SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR-1 •SUMINISTRO DE COMPACTADOR VIBRATORIO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE, OPERADOR Y COMBUSTIBLE) •SUMINISTRO DE TERMINADORA DE ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE) •SUMINISTRO DE FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE) •SUMINISTRO DE CORTADORA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE Y DISCO DE CAMBIO) •TRANSPORTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y FRESADOS

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 	<div style="text-align: center;">  Firma Nombre: WILLIAM CASASBUENAS RODRIGUEZ Matrícula No. : 25202-177615CND </div>

REGISTRO FOTOGRAFICO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MSE-FR-21		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	30	11	20
--	-------	----	----	----

DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	CONTRATO No: 1316 de 2020
------------------------------------	---------------------------

Semana Número: 5	Del: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	Al: 29 DE NOVIEMBRE DE 2020
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 Días		
Supervisor del Contrato de interventoría: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO		

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.
"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">SEMANAL</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td style="text-align: center;">11,67</td> <td style="text-align: center;">58,33</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$ 8.769.249</td> <td style="text-align: center;">\$ 43.846.247</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	11,67	58,33	Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 43.846.247	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">SEMANAL</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$ 75.164.995</td> <td style="text-align: center;">\$ 75.164.995</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	100	100	Valor básico de la Obra	\$ 75.164.995	\$ 75.164.995
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	11,67	58,33																	
Valor básico de la Obra	\$ 8.769.249	\$ 43.846.247																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	100	100																	
Valor básico de la Obra	\$ 75.164.995	\$ 75.164.995																	

CONTRATO DE OBRA: Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S Contrato No. 1316 de 2020 Valor Inicial: \$ 75.164.995,00 Valor Actualizado: \$ 75.164.995,00 Plazo Inicial: 2 MESES Plazo Actualizado: 2 MESES Fecha de Iniciación: 26 DE OCTUBRE DE 2020 Fecha de Vencimiento: 25 DE DICIEMBRE DE 2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA: Interventor: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA Contrato No. 2320 de 2019 Valor Inicial: \$ 1.276.989.590,00 Valor Actualizado: \$ 1.276.989.590,00 Plazo Inicial: Treinta y dos (32) Meses Plazo Actualizado: Treinta y dos (32) Meses Fecha de Iniciación: 27 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de Vencimiento: 31 DE JULIO DE 2022
---	--

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
•SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC19-INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y DESCARGUE EN CADA BACHE QUE SE VAYA A RELLENAR A LO LARGO DE LA VÍA) •SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR-1 •SUMINISTRO DE COMPACTADOR VIBRATORIO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE, OPERADOR Y COMBUSTIBLE) •SUMINISTRO DE TERMINADORA DE ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE) •SUMINISTRO DE FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE) •SUMINISTRO DE CORTADORA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE Y DISCO DE CAMBIO) •TRANSPORTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y FRESADOS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 	<div style="text-align: center;">  Firma Nombre: WILLIAM CASASBUENAS RODRIGUEZ Matrícula No. : 25202-177615CND </div>

REGISTRO FOTOGRAFICO



SUMINISTRO DE MEZCLA



SUMINISTRO DE MEZCLA



SUMINISTRO DE MEZCLA



SUMINISTRO DE MEZCLA
