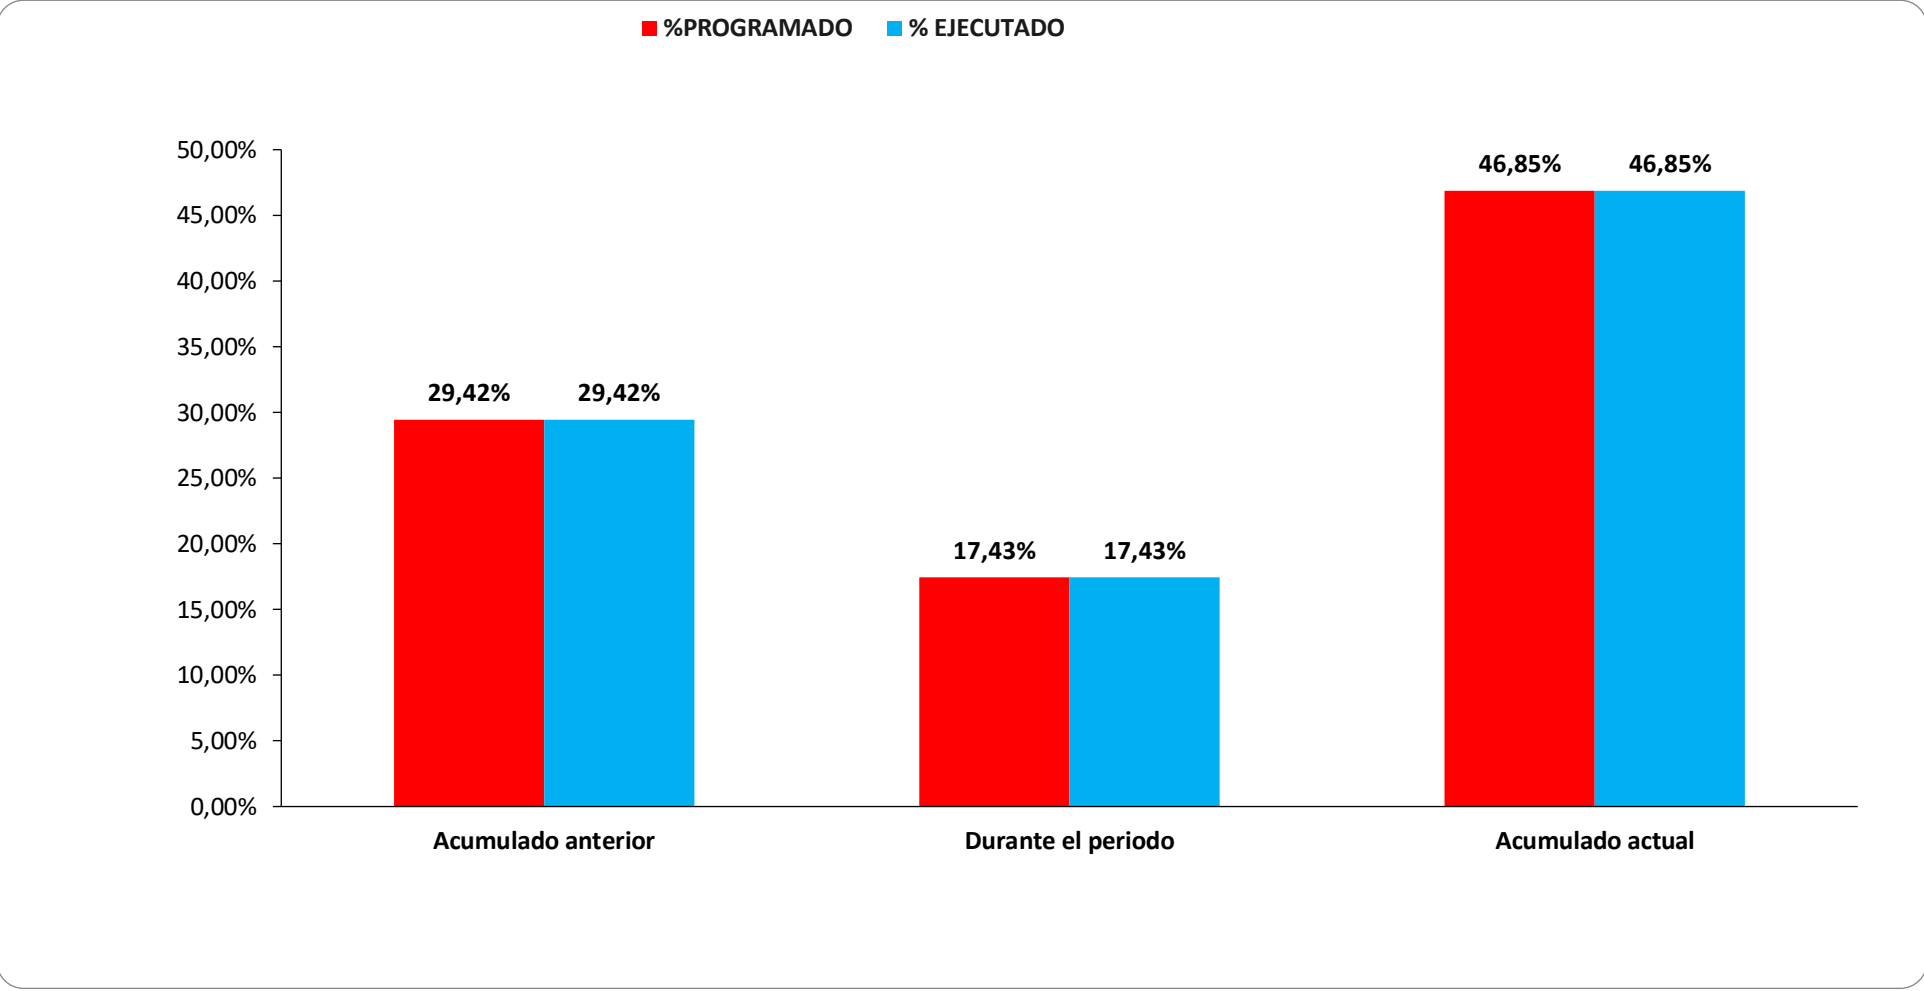



	INFORME SEMANAL No. 6		INTERVENTORIA - OBRA															
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		Código Formato:															
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA															
Interventoría	DONALDO DEL TORO Y CIA SAS		Constructor	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.														
Representante Legal	DONALDO DEL TORO PEREZ		Representante Legal	Jaime Alberto Suárez urquijo														
Contrato No.	642 del 2 de Diciembre del 2025		Contrato No.	609 del 20 de noviembre del 2025														
Objeto	INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA		Objeto	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA														
Valor inicial:	\$ 42.000.000,00		Valor inicial:	\$ 386.868.038,00														
Valor total:	\$ 42.000.000,00		Valor total:	\$ 386.868.038,00														
Plazo inicial:	31/12/2025		Plazo inicial:	31-dic-25														
Fecha de inicio:	12/12/2025		Fecha de inicio:	12/12/2025														
Fecha de terminación inicial:	31/12/2025		Fecha de terminación del contrato:	23/4/2026														
Semana Número: 6 Del: 23/3/2026 Al: 29/3/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 108 días																		
Nombre del Supervisor																		
AVANCE DEL CONVENIO																		
Obra programada (%) SEMANAL 17,43% ACUMULADO 100,00% Valor de la Obra programada: \$ 67.413.060,26			Obra Física Ejecutada (%) SEMANAL 17,43% ACUMULADO 46,85% Valor de la Obra Ejecutada: \$ 67.413.060,26 \$ 181.230.463,65															
GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO			REGISTRO FOTOGRÁFICO															
<table><thead><tr><th></th><th>%PROGRAMADO</th><th>% EJEUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acumulado anterior</td><td>29,42%</td><td>29,42%</td><td rowspan="3">0,00%</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>17,43%</td><td>17,43%</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>46,85%</td><td>46,85%</td></tr></tbody></table> <p>Nota: Ver cuadro de observaciones</p> 				%PROGRAMADO	% EJEUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	29,42%	29,42%	0,00%	Durante el periodo	17,43%	17,43%	Acumulado actual	46,85%	46,85%	ESTADO ACTUAL DE LOS FRENTE DE OBRA	
	%PROGRAMADO	% EJEUTADO	DIFERENCIA															
Acumulado anterior	29,42%	29,42%	0,00%															
Durante el periodo	17,43%	17,43%																
Acumulado actual	46,85%	46,85%																
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																		
SST: Actividades realizadas : Se realiza verificación de permisos preoperacionales, Se recibe documentos del equipo trabajoprofesionales Se realiza revisión de documentos para ingreso de nuevo personal. Se realiza la revisión de listados de personal activo. Se revisa orden y aseo, señalización																		
Técnico: se inician labores de desmonte de listones de madera completamente invadidos por plaga comejen. se hacen cambio de listones afectado y se refuerzan los que estan en buen estado. se hace desmonte de tejas de cubiertas para reacomodarlas. Se hacen desmontes varios de elementos de oficvina para entrega pra custodia a personal de seguridad se hace nivelación de cubierta por medio de refuerzos de listones de madera. se refuerza la estructura de madera de la cubierta correspondiente a la oficina 4 y 2 (asesoria jurídica y alimentos) Se realiza desmonte de cuadrícula de madera de cielo raso anterior. se realiza desmonte de ducteria en icopor de AA.																		
Administrativo: Durante la semana comprendida entre el 23 de marzo al 29 de marzo de 2026. Se realizaron las siguientes actividades administrativas:																		
RECIBIDOS: - Se recibe Prórroga No. 01 del contrato																		

ENVIADOS:
- Solicitud de ingreso de personal, mediante correo
- Solicitud de ampliación y/o prórroga del contrato

- Personal en obra:
- SISO: 1
 - Residente técnico : 1
 - Oficiales :2
 - Ayudantes: 7

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA			AVANCE TIEMPO CONTRATO DE OBRA			ESTADO POLIZA CONTRATO DE OBRA		
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA		\$ 386.868.038,00	DOCUMENTO	TIEMPO		ASEGURADORA CESCE	POLIZA No. CUMPLIMIENTO No.	174649
TOTAL ADICIONES		\$ 0.00		ADICIONADO	ACUMULADO		VIGENCIA	
VALOR ACTUALIZADO		\$ 386.868.038,00	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO					DESDE
	PAGADO	SALDO						
VALOR ANTICIPO (N/A)	\$ 0.00	\$ 386.868.038,00						
VALOR CORTE 01	\$ 91.882.075,00							
TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 91.882.075							
SUMAS IGUALES	\$ 294.985.963	\$ 294.985.963		DIAS SUSP	DIAS PRORROGADOS			
			TIEMPO TOTAL	73	40			

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO									
INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO -	INDICADOR TIEMPO	DIAS DE ATRASO	RETRASO	INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	46,85%	46,85%	% ADELANDO + 0,00%					\$ 91.882.075,00	\$ 91.882.075,00

OBSERVACIONES	FIRMAS
<div> DONALDO DEL TORO Y CIA SAS Ing Civil Donaldo Del Toro perez</div>	<div> SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS NOMBRE DE DIRECTOR Ing Civil Diego Abril DIRECTOR DE OBRA</div>
Revisado y aprobado por:	ELABORÓ:

INFORME SEMANAL No. 6





FORMATO DE CONTROL TÉCNICO DE ACTIVIDADES INVIMA	
642 del 2 de Diciembre del 2025	
CONTRATO INTERVENTORIA :	INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA
609 del 20 de noviembre del 2025	
CONTRATO OBRA :	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA

ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 6 DEL 23 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2026.




ajuste de tejas de cubierta

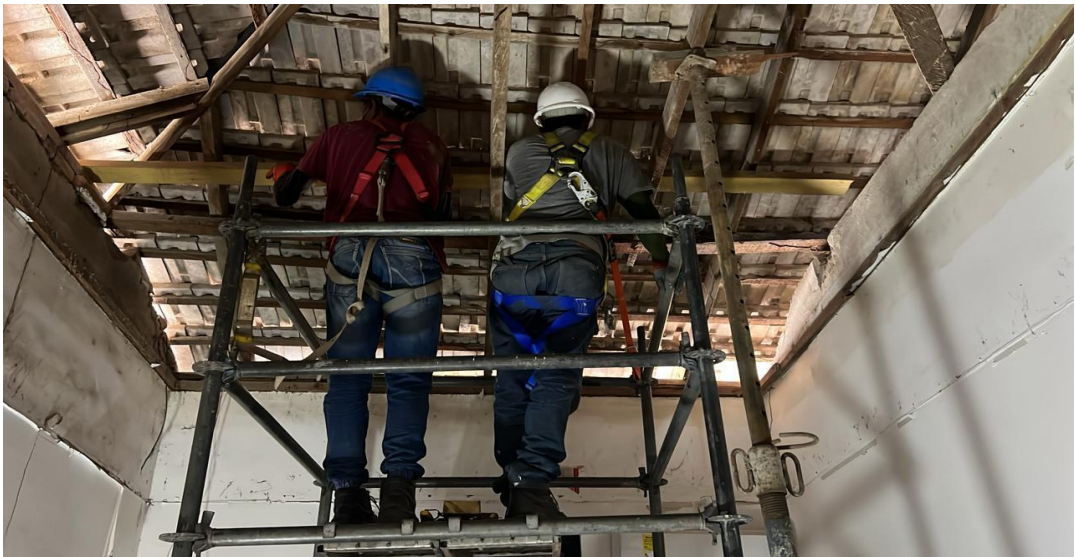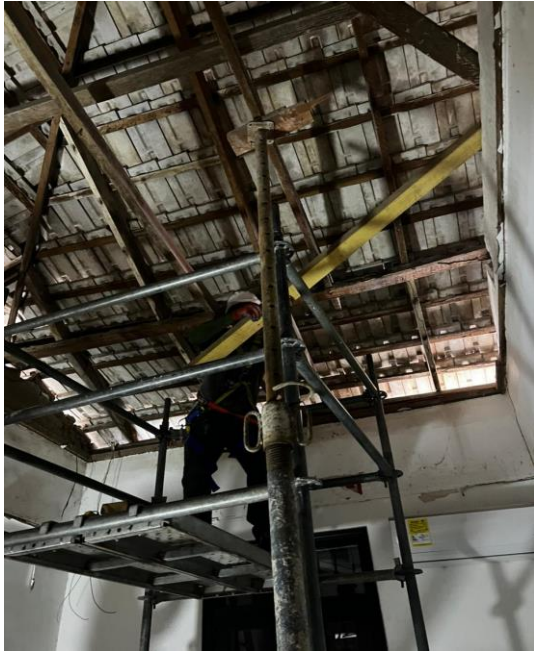


reforzamiento de estructura de mandera y desmonte de madera dañada



reforzamiento estructural de la cubierta, instalacion de sistemas de apuntalamiento y nivelacion de la cubierta



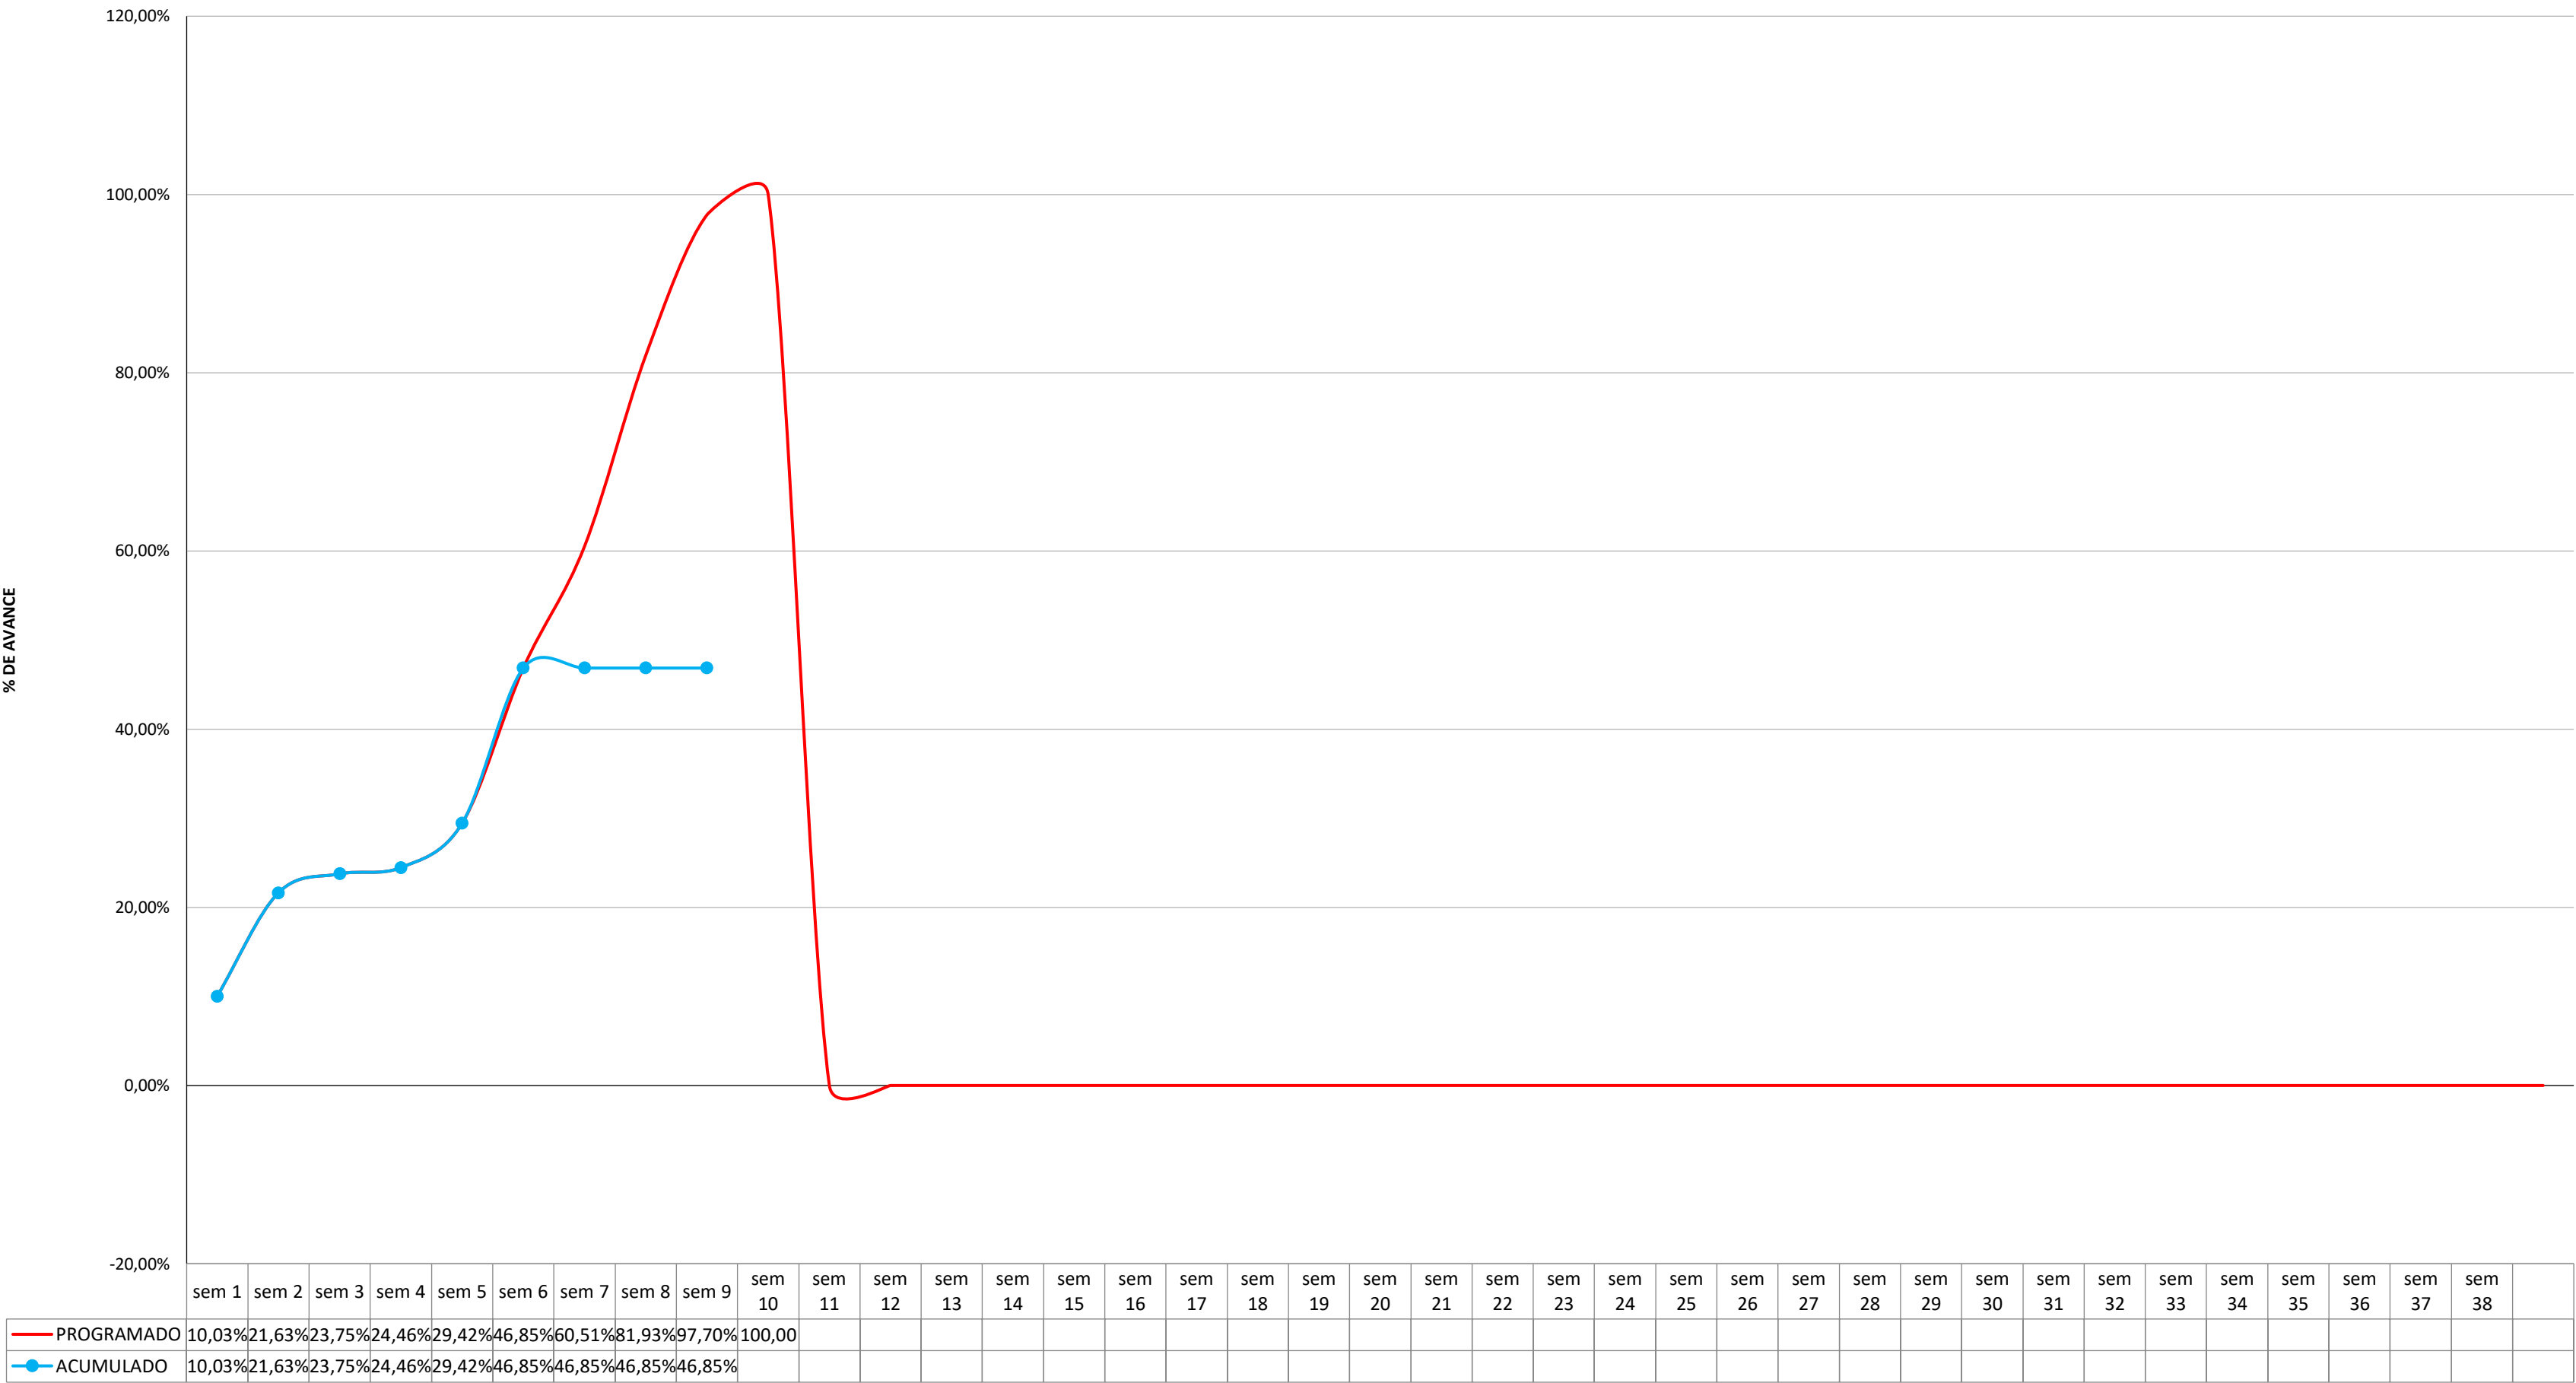

					INFORME SEMANAL No. 6			INTERVENTORIA			
					INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS			Código Formato:			
	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
1	sem 1	14-dic-25	\$ 38.809.530,40	10,03%	10,03%	\$ 38.809.530,40	\$ 0,00	10,03%	\$38.809.530,40	10,03%	\$38.809.530,40
2	sem 2	21-dic-25	\$ 44.871.805,07	11,60%	11,60%	\$ 44.871.805,07	\$ 0,00	21,63%	\$83.681.335,47	21,63%	\$83.681.335,47
3	sem 3	28-dic-25	\$ 8.200.738,92	2,12%	2,12%	\$ 8.200.738,92	\$ 0,00	23,75%	\$91.882.074,40	23,75%	\$91.882.074,40
4	sem 4	9-mar-26	\$ 2.726.504,73	0,70%	0,70%	\$ 2.726.504,73	\$ 0,00	24,46%	\$94.608.579,13	24,46%	\$94.608.579,13
5	sem 5	16-mar-26	\$ 19.208.824,26	4,97%	4,97%	\$ 19.208.824,26	\$ 0,00	29,42%	\$113.817.403,39	29,42%	\$113.817.403,39
6	sem 6	23-mar-26	\$ 67.413.060,26	17,43%	17,43%	\$ 67.413.060,26	\$ 0,00	46,85%	\$181.230.463,65	46,85%	
7	sem 7	30-mar-26	\$ 52.846.918,09	13,66%			-\$ 52.846.918,09	60,51%	\$234.077.381,73	46,85%	
8	sem 8	6-abr-26	\$ 82.866.487,29	21,42%			-\$ 82.866.487,29	81,93%	\$316.943.869,02	46,85%	
9	sem 9	13-abr-26	\$ 61.036.922,92	15,78%			-\$ 61.036.922,92	97,70%	\$377.980.791,93	46,85%	
10	sem 10	20-abr-26	\$ 8.887.246,96	2,30%			-\$ 8.887.246,96	100,00%	\$386.868.038,89	46,85%	
11	sem 11										
12	sem 12										
13	sem 13										
14	sem 14										
15	sem 15										
16	sem 16										
17	sem 17										
18	sem 18										
19	sem 19										
20	sem 20										
21	sem 21										
22	sem 22										
23	sem 23										
24	sem 24										
25	sem 25										
26	sem 26										
27	sem 27										
28	sem 28										
29	sem 29										
30	sem 30										
31	sem 31										
32	sem 32										
33	sem 33										
34	sem 34										
35	sem 35										
36	sem 36										
37	sem 37										
38	sem 38										
			\$ 386.868.038,89	100,00%		\$ 113.817.403,39					
TOTAL			\$ 386.868.038,00				29,42%				
