

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	1 de 14

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA No. 087-2023

1. INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	24 de julio de 2026
Informe de Supervisión:	010
Periodo de Seguimiento:	Del 26 de marzo de 2026 al 14 de julio de 2026
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT	901.740.580 - 3
Representante legal:	Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto
C.C:	Cc # 91.273.201
Fecha de inicio:	04 de Septiembre de 2023
Fecha de finalización:	03 de Septiembre de 2026
Valor del Contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor de adición:	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 // 28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas:	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del Anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****H**ospital **R**egional **G**arcía **R**ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	2 de 14

Pago de seguridad social:

Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de Paz y Salvo de aportes parafiscales, de fecha 10 de julio de 2026; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondiente al período del 26 de marzo de 2026 al 25 de junio de 2026, así:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO
9504724897	Pensión, ARL y CC - abril de 2026 Salud – mayo de 2026 	29/05/2026
9506361890	Pensión, ARL y CC - mayo de 2026 Salud – junio de 2026 	14/07/2026

3. REVISION TECNICA:**Descripción del alcance del contrato:**

Obligación: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación:

Dentro de las Actividades Ejecutadas en el Período de esta supervisión están:

Del 26 de marzo de 2025 al 25 de abril de 2026.

Avance programado: 78,75%

Avance ejecutado: 66,06%

En el módulo A -

se continuaron actividades de instalación de estructura metálica y estructura para cubierta por medio de la fabricación e instalación de elementos como columnas

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 3 de 14

- a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud)
- b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU'S (Según proyecto radicado ante Minsalud)
- c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra
- d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud)
- e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos
- f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales
- g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos
- h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios
- i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios
- j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases
- k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado

compuestas y vigas, así mismo se adelantaron actividades de construcción de mamposterías, elementos de confinamiento, disposición de pases y regatas para la instalación de redes hidrosanitarias.

En el módulo D

Se continúan realizando actividades correspondientes con la construcción de elementos de estructura metálica para punto fijo del módulo, paralelamente se desarrollaron actividades de acabados arquitectónicos en el interior del módulo.

Del 26 de abril de 2026 al 25 de mayo de 2026

Avance programado: 81,88%

Avance ejecutado: 67,00%

En el módulo A -

-Se continúa con la fabricación e instalación de estructura del módulo y cubierta.

-Se desarrollan actividades de mampostería e instalaciones elementos de confinamiento, así como redes embebidas en muros.

-Se inician las actividades correspondientes con las demoliciones de las zonas donde será ubicado el punto fijo del módulo A

En el módulo D

-Se continúan realizando actividades correspondientes con la construcción de elementos de estructura metálica para punto fijo del módulo, paralelamente se desarrollaron actividades de acabados arquitectónicos en el interior del módulo.

Del 26 de mayo de 2026 al 25 de junio de 2026

Avance programado: 87,63%

Avance ejecutado: 67,34%

En el módulo A

-Se desarrollan actividades de fabricación e instalación de elementos de arriostramiento para estructura metálica

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

A-GJ-FTO-08

VERSIÓN

1

FECHA

06/02/2025

PÁG

4 de 14

-Se desarrollan actividades de mampostería e instalaciones elementos de confinamiento, así como redes embebidas en muros.

Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:

Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 26 de marzo de 2026 a 14 de julio de 2026; soportadas por el Apoyo de la Supervisión Ingeniero José Alejandro Sandoval Medina con Informe Técnico de fecha 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el plazo de ejecución contractual el avance de las actividades ejecutadas fue del 67.34%, siendo este avance físico del proyecto, y el avance financiero del 62.71%, a 14 de julio de 2026 respectivamente.

Además, se realizan seguimientos semanales al avance físico del proyecto, y se realizan comité de Obra.

El 8 de mayo de 2026 se realizó mesa técnica con el Ministerio de Salud y Protección Social

El 01 de junio de 2026 se realizó mesa técnica con el Ministerio de Salud y Protección Social



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

A-GJ-FTO-08

VERSIÓN

1

FECHA

06/02/2025

PÁG

6 de 14

Para finalizar se firmó los compromisos descritos a continuación, con el objetivo de mejorar el desarrollo del proyecto y/o generar alternativas de soluciones a las diferentes problemáticas.

COMPROMISOS ESE

1. Dar estricto cumplimiento a los estándares técnicos establecidos en el Consejo Técnico de Salud y/o en caso de modificar el plan o la seguridad sanitaria, presentar la debida justificación, técnica, jurídica y financiera.
2. Enviar el avance semanal de obra al día miércoles de cada semana.
3. Realizar cargo de la información del proyecto en la plataforma PISIS dentro de los primeros 20 días hábiles de cada mes.

COMPROMISOS MINISALUD

1. Continuar realizando el seguimiento conforme a las competencias y misión institucional.

FIRMAS:

NOMBRE Camilo Andrés Cifuentes Rincón

FIRMA

NOMBRE Cesar Augusto Becerra Correa

FIRMA

Se anexa listado de asistencia con las firmas de los demás asistentes.

Carrera 12 No.32-76 - Ciudad Portal 2025, Bogotá D.C.

El día 21 de abril de 2026 se realizó mesa técnica con la Contraloría general de la Republica



ACTA DE REUNIÓN

MESES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
PROYECTO: ADQUISICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA - MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER - CONTRATO No. 987-2022

FECHA: 21 de abril de 2026
Hora: 08:00 AM
Modalidad: Virtual

OBJETIVO: Realizar mesa de caracterización y seguimiento al proyecto de adquisición y ampliación del Hospital Regional García Rovira, con el fin de verificar el estado actual de ejecución física, financiera y contractual, revisar el avance frente a la programación, identificar problemáticas estructurales del proyecto y definir acciones de atención institucional para su viabilización y culminación.

ESTADO ACTUAL

Durante la mesa de seguimiento se presentaron los avances actualizados del proyecto son como el 20 de febrero de 2026, informándose lo siguiente:

Avance físico: 54.42%
Avance financiero: 28.73%
Avance programático: 75.52%
Duración: 36 meses
Inicio de obra: 4 de septiembre de 2022
Fecha estimada de finalización: 3 de septiembre de 2025

Se evidencia un retraso en la ejecución del proyecto frente a la programación, lo cual genera preocupación en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas.

El siguiente continúa en ejecución con ajustes permanentes derivados de consultas técnicas, modificaciones contractuales y revisión de su alcance.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión fue instalada por la Contraloría General de la República, quien indicó que el proyecto continúa en seguimiento, debido a su importancia regional y a las situaciones evidenciadas en mesas anteriores.

Se procedió a la verificación de asistencia con participación del Hospital, interventor, contratista y representantes del Ministerio de Salud.

Posteriormente, la Contraloría solicitó la actualización del avance del proyecto, siendo informado por la interventoría que el avance físico actual es del 54.42%, mientras que el avance programático es del 75.52%, evidenciando un retraso en la ejecución.

Durante la reunión, la entidad hospitalaria expuso el contenido del proyecto, señalando que la actual administración no recibió un soporte formal, lo que generó situaciones en la ejecución de la información técnica, financiera y contractual del proyecto.

Adicionalmente, se indicó que el proyecto ha tenido múltiples modificaciones desde su formalización, pasando de una intervención de adquisición a la ejecución de infraestructura prácticamente nueva, lo cual ha impactado de manera significativa los costos y el avance físico.

Se evidenció que actualmente se adelanta la consolidación de un balance técnico, jurídico y financiero, el cual ha sido solicitado por el Ministerio de Salud como requisito para avanzar en la ejecución del proyecto y su viabilidad final.

En este sentido, se manifestó que el proyecto presenta una posible insuficiencia presupuestal, estimándose que, frente a un valor cercano a los \$7.500 millones, podrían requerirse aproximadamente \$5.000 millones adicionales para su culminación.

La Contraloría y el Ministerio de Salud insistieron en la necesidad de ordenar la información del proyecto, señalando que existen vacíos en la trazabilidad de las modificaciones y en la articulación entre los actores, lo que ha dificultado la toma de decisiones.

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

Durante la mesa se evidenciaron problemáticas estructurales del proyecto:

Se identifican deficiencias en la planeación inicial, lo que ha generado múltiples modificaciones en cantidades, plazos y alcance del proyecto.

Existe desarticulación entre los actores del proyecto, especialmente en la consolidación y manejo de la información técnica y contractual.

Se evidencia falta de trazabilidad clara frente a las modificaciones contractuales, lo que dificulta la validación del estado real del proyecto.

Se presenta una posible insuficiencia de recursos, que pone en riesgo la culminación total del proyecto. Adicionalmente, se evidencia un retraso en la ejecución frente al avance programático, lo cual puede impactar el cumplimiento de los tiempos contractuales.

COMPROMISOS ACTUALES

Durante la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

ESE Hospital Regional García Rovira: Revisar y actualizar el Balance Técnico, Jurídico y Financiero del proyecto, incluyendo la justificación de las modificaciones realizadas y el estado real de ejecución.

Ministerio de Salud: Participar en mesa técnica para revisión del proyecto y definición de ruta de viabilización.

Contratista e Interventoría: Participar en la actualización técnica del proyecto, suministrando información requerida para la consolidación del balance y generando coherencia en las respuestas.

Contraloría General de la República: Coordinar mesas interinstitucionales con Gobernación, Ministerio de Salud y demás actores para sustituir una ruta de trabajo clara que permita desbloquear el proyecto.

Actores del proyecto

Realizar mesa técnica presencial en el municipio de Málaga, con participación de todos los participantes, con el fin de actualizar la información y avanzar en la articulación de las problemáticas identificadas.

CONCLUSIONES

- La mesa permitió evidenciar que, aunque el proyecto presenta avances en su ejecución, enfrenta problemas estructurales de planeación, articulación y financiación que comprometen su culminación.
- Se concluye que el principal reto del proyecto no es únicamente constructivo, sino de organización técnica, jurídica y financiera, siendo necesario consolidar un balance integral que permita saber si dispone real, los recursos requeridos y la ruta para su finalización.
- La Contraloría continuará con el seguimiento preventivo, orientando la articulación interinstitucional para garantizar la culminación del proyecto en condiciones adecuadas para la prestación del servicio de salud.

CIERRE

Se da por finalizada la mesa de caracterización y seguimiento, dejando constancia de los compromisos adquiridos y de la necesidad de realizar mesas técnicas adicionales para el análisis y solución de las problemáticas identificadas.

ASISTENTES: Hacer parte integral de la presente acta, la lista de asistentes y grabación de la reunión en plataforma TEAMS.

OLGA LUCÍA PINOCH FLOREDO
Coordinadora de Gestión - Contraloría General de la República

BRIAN JHONATAN VARGAS CASTAÑO
Procurador - Contraloría General de la República

CESAR ALONSO BEDARRA CORREA
Gerente de la ESE Hospital Regional de García Rovira

ZAYDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
Supervisora administrativa y supervisora del contrato ESE Hospital Regional de García

JOSÉ SANCHEZ
Apoyo a la atención ESE Hospital Regional de García

CRISTIAN EDUARDO GONZALEZ
Directo de obra, Contratista

DIEGO AFRANANDO PÉREZ
Interventoría, Unión Temporal Inter Hospital

CARLOS ANDRÉS ORTIZ
Ministerio de Salud y Procuración Social

El 21 de mayo de 2026 se asistió de manera presencial a mesa técnica con la Contraloría

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrg.gov.co

Pag web: <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO


CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	7 de 14

CONTRALORÍA Gerencia de la Asesoría						
Registro de participantes, conclusiones y compromisos de reuniones						
El presente documento tiene como finalidad registrar la asistencia de los participantes en las reuniones de seguimiento y ejecución de obra, así como las conclusiones y compromisos de las mismas. Este registro es de carácter informativo y no tiene efectos jurídicos. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada al público en general.						
Fecha: 06/02/2025						
Lugar: Hospital Regional García Rovira						
Reunión: 03/02/2025						
No.	Nombre y Apellido	Celular	E-mail	Centro de Asesoría	Cargo	Firma
1	Pedro A. Páez	3165 541	mpaez@hrgr.gov.co	Gerencia	Gerente	[Firma]
2	Andrés B. Rodríguez	10222000	arodriguez@hrgr.gov.co	Gerencia	Gerente	[Firma]
3	Carlos Gutiérrez	912320	cgutierrez@hrgr.gov.co	Gerencia	Gerente	[Firma]
4	Andrés B. Rodríguez	3290306	arodriguez@hrgr.gov.co	Gerencia	Gerente	[Firma]
5	Andrés B. Rodríguez	3165 541	mpaez@hrgr.gov.co	Gerencia	Gerente	[Firma]
6	Andrés B. Rodríguez	3165 541	mpaez@hrgr.gov.co	Gerencia	Gerente	[Firma]

Observaciones Adicionales:

Durante el periodo de esta supervisión se realizaron Comités de Seguimiento y ejecución de obra, Supervisión del Contrato, Apoyo a la Supervisión, Contratista de Obra e Interventoría.

Registro Fotográfico:

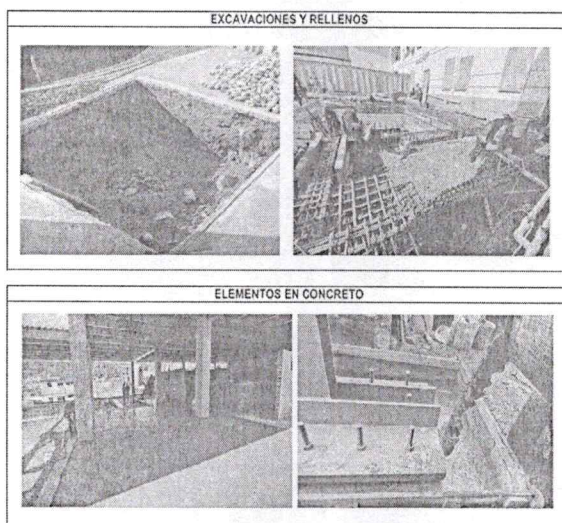



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

*H*ospital *R*egional *G*arcía *R*ovira


Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9


FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	8 de 14


ELEMENTOS EN CONCRETO




ESTRUCTURA METÁLICA




MAMPOSTERÍA



INSTALACIONES HIDRAULICAS



RED CONTRA INCENDIO





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira



Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9



FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	9 de 14



INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

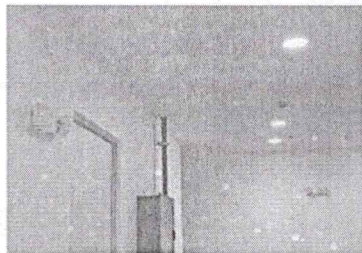

CARPINTERÍA

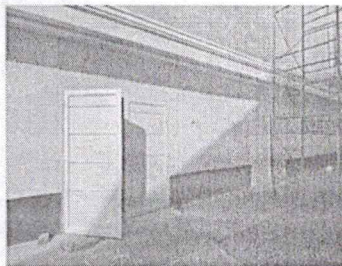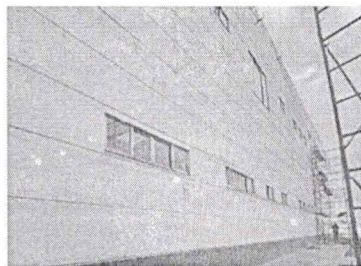

PAÑETES

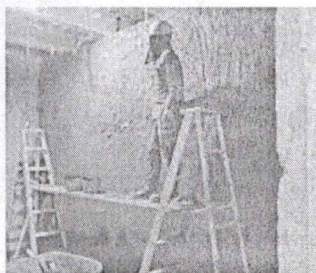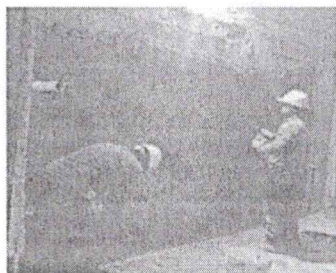

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



*H*ospital *R*egional *G*arcía *R*ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	10 de 14

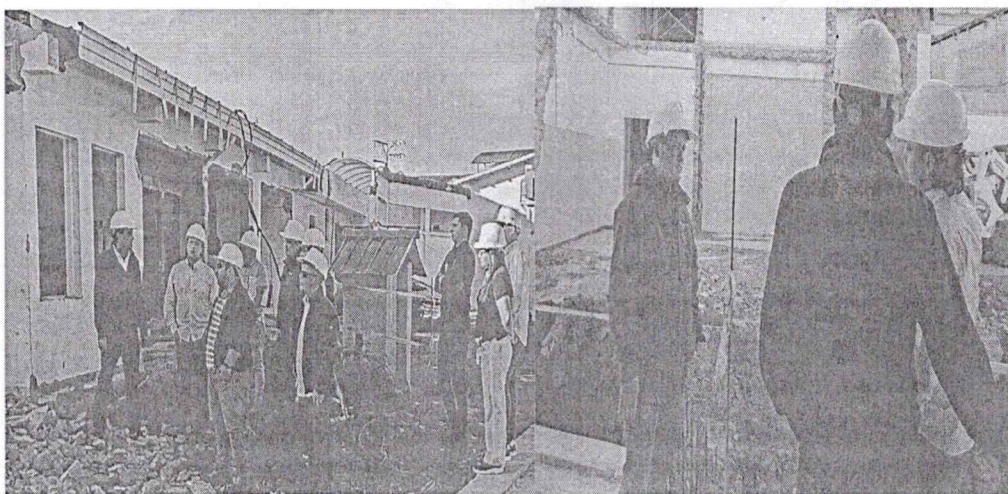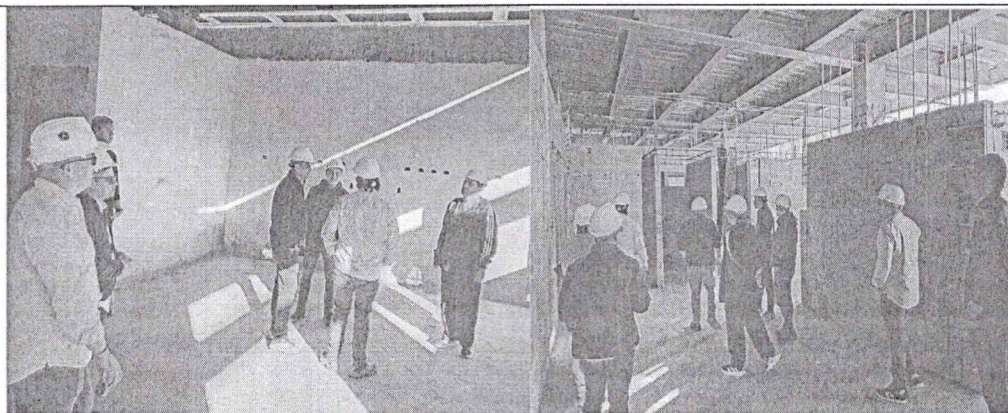



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	11 de 14

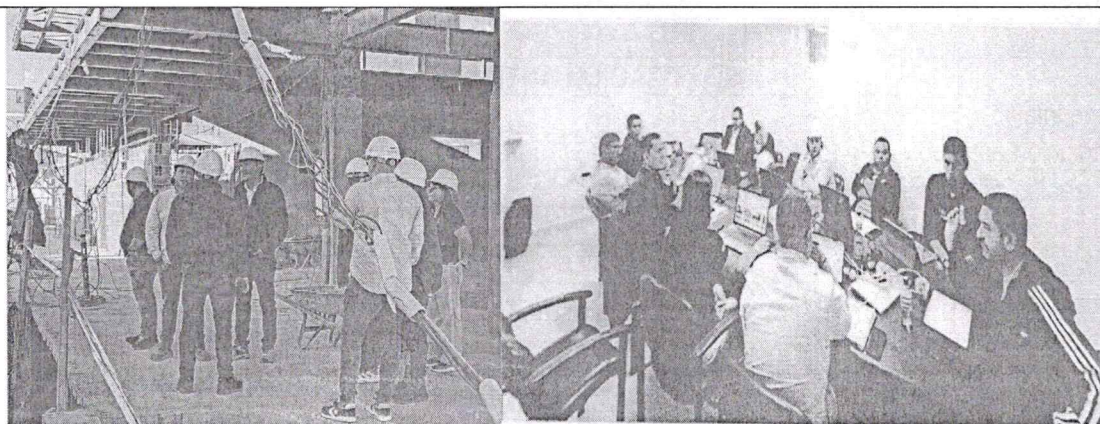

Documentos verificados para el pago:

- Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos:
 - Del 26 de marzo de 2026 al 25 de junio de 2026.
- Factura Electrónica No. CGR 14.
- Planillas de pago de Seguridad Social No. 9504724897, 9506361890 del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 26 de marzo de 2026 a 25 de junio de 2026 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 del presente informe.
- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales.
- Informe escrito de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.

Nota: Esta información reposa en la Oficina de contratación de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****H**ospital **R**egional **G**arcía **R**ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 12 de 14

4. REVISION FINANCIERA:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
Anticipo inicial:	\$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	\$ 4.272.477.426,75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	\$ 1.221.709.404,61
Amortización anticipo en Pago No. 003:	\$ 1.779.384.020,81
Amortización anticipo en Pago No. 004:	\$ 561.386.543,51
Amortización anticipo en Pago No. 005:	\$ 1.272.067.449,44
Amortización anticipo en Pago No. 006:	\$ 1.722.217.462,18
Amortización anticipo en Pago No. 007:	\$ 1.501.630.671,45
Amortización anticipo en Pago No. 008:	\$ 696.622.833,56
Amortización anticipo en Pago No. 009:	\$ 1.393.442.968,83
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 14 (40%): Pago No.10	\$ 1.805.780.174,42
Total Amortizado a 14 de julio de 2025:	\$ 16.226.718.955,56

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	\$ 4.514.450.436,04
TOTAL GENERAL	\$ 4.514.450.436,04

Valor del contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	\$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores desde al Acta No. 001 al Acta No. 009	\$ 14.420.938.781,14
Valor anticipo a amortizar en la presente Acta No. 010 (Factura CGR 14)	\$ 1.805.780.174,42
Valor Total Amortizado del Acta No. 001 al Acta No. 010	\$ 16.226.718.955,56
Saldo anticipo después de amortizaciones	\$ 9.384.514.124,12
Valor Pagado en Actas	
Valor Pagado Acta No. 001	\$ 10.681.193.566,88

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****Hospital Regional García Rovira**

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 13 de 14

Valor Pagado Acta No. 002	\$ 3.054.273.511,53
Valor Pagado Acta No. 003	\$ 4.448.460.052,02
Valor Pagado Acta No. 004	\$ 1.403.466.358,77
Valor Pagado Acta No. 005	\$ 3.180.168.623,59
Valor Pagado Acta No. 006	\$ 4.305.543.655,45
Valor Pagado Acta No. 007	\$ 3.754.076.678,63
Valor Pagado Acta No. 008	\$ 1.741.557.083,91
Valor Pagado Acta No. 009	\$ 3.483.607.422,08
Valor pagado a la fecha:	\$ 36.052.346.952,86
Valor de la presente factura Acta No. 010	\$ 4.514.450.436,04
Descuentos a realizar Amortización Factura CRG 14	\$ 1.805.780.174,42
Valor a Pagar después de descuentos	\$ 2.708.670.261,62
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 24.126.674.468,45

5. RADICACION PARA PAGO

FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
24 de julio de 2026	- Informe Técnico de Apoyo a la supervisión - Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas del 26 de marzo de 2026 al 25 de junio de 2026. - Factura Electrónica No. CGR 14. - Planillas de pago de Seguridad Social No. 9504724897, 9506361890 del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 26 de marzo de 2026 a 25 de junio de 2026 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 del presente informe. - Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales.

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital **R**egional **G**arcía **R**ovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	14 de 14

- Informe escrito de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	ZAYDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
Cargo:	Supervisora
Firma:	

Elaborado por: Zayda Milena Pereira Gutiérrez – Subgerente Administrativo	Fecha: 24-07-2026	Firma:
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 24-07-2026	Firma:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional De García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA
CONTABILIDAD Y PAGOS**

CODIGO	A-GAF-FTO-12
VERSION	1
FECHA	30/09/2025
PAG	1 de 1

BENEFICIARIO

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CONCEPTO

ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

PERIODO

DEL 26 DE MARZO DE 2026 AL 14 JULIO DE 2026

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR

	DOCUMENTOS	SI	NO	NA	RESPONSABLE
FECHA DE RECIBIDO	1. Factura/Cuenta de Cobro/Resolución	X			VB PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
	2.Documento Equivalente				
	3. Verificar Valor No del RP del cual debe hacerse la acusación de los valores.	X			
	4. Entrada a Farmacia o Almacén en el caso de suministros				
	5. Tiquetes de Viaje en caso de Viáticos				
	6. Certificación para Efectos de la Retención				
ELABORADO POR	7. Informe de Supervisión/Interventor	X			
	8. Planilla, recibo de pago y certificación pago aportes parafiscales	X			
	9. Rut para contratistas nuevos				
	10. Orden de compra de almacén donde conste el recibido a satisfacción				
	11. Formato de Declaración juramentada primer pago				
	12. Certificación Bancaria primer pago				
	13. Acto administrativo de Asignación de Supervisor				

REQUISITOS PARA PAGO

	DOCUMENTOS	SI	NO	NA	RESPONSABLE
Vo. Bo Supervisor	14. Comprobante de Contabilización de la cuenta	X			CONTABILIDAD
	15. Recibo de Estampillas Departamentales visadas por Contabilidad				BENEFICIARIO
	16. Invitación o citación de entidad Pública/Privada informe de actividades o certificado de permanencia en caso de viáticos				BENEFICIARIO
	17. Acta Inicial o acta final				BENEFICIARIO Y SUPERVISOR

CARGO

FIRMA

REVISÓ:

Profesional Universitario de Contabilidad

Área de Tesorería

Subgerente Administrativo

Aprobación Gerencia

[Firma]
Karen Almeida
[Firma]
[Firma]



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA
ROVIRA
N.I.T.: 900067169

BANTE DE EGRESO GENERAL : CE-1131
FECHA DOCUMENTO : 24/07/2026

GARCIA ROVIRA DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

Pag: 1

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580

LA SUMA DE: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO
CON DIEZ COP M/L

CONCEPTO: PAGO N 10 - CONTRATO 087-2023- ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HRGR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FACTURA	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	ANTICI/DCTO
240101.01	Bienes y Servicios	CGR-14	FCS 573	2,392,658,731	
				2,392,658,731	0

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
113210.01	CTA AHORROS 312-00001408 ADECUACION	2,392,658,731

ELABORADO POR
ALMEIDA DUARTE KAREN YULIANA

REVISADO POR

APROBADO POR
C. C. o NIT



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

DEFINITIVA DE PAGO No 603

FECHA: 24/07/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO FACTURA CGR14 DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 389 DEL 24/07/2026


CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :


RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	4,514,450,436.04
TOTAL A PAGAR :		4,514,450,436.04

VIGENCIA : 2026

VALOR : CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


CÉSAR AUGUSTO BECERRA CORREA
GERENTE ESE HRGR



GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA


URA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-573


FECHA DOCUMENTO : 24/07/2026

Pag: 1

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580**SOPORTE:** CGR-14**LA SUMA DE:** CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON**CONCEPTO:** CUATRO COP M/I
ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HRGR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
161590.01	otras construcciones en curso		4,514,450,436.04	
243626.01	contratos de obra			90,289,008.72
244023.01	Contribucion contratos de obra publica 5%			225,722,521.80
443005.01	Nacional			1,805,780,174.42
240101.01	Bienes y Servicios			2,392,658,731.10
		TOTALES IGUALES	\$ 4,514,450,436.04	\$ 4,514,450,436.04

REVISADO POR

Mabel Calderón Aceros

APROBADO POR

CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA GERENTE

ELABORADO POR: Anaya Osorio Ruthby Jazmín



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 405

FECHA: 24/07/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO HACEN CONSTAR:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EXISTE SALDO DE DISPONIBILIDAD PARA RESPALDAR EL SIQUIENTE COMPROMISO:

PAGO FACTURA CGR14 DELC ONTRATO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	4,514,450,436.04
		4,514,450,436.04

VIGENCIA : 2026


VALOR : CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUATRO


SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE/HRGR



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

REGISTRO PRESUPUESTAL No 389

FECHA: 24/07/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO FACTURA CGR14 DELC ONTRATO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

DISPONIBILIDAD : 405 DEL 24/07/2026


CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	4,514,450,436.04
		4,514,450,436.04

VIGENCIA : 2026

VALOR : CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUATRO PESOS

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

GARCIA ROVIRA

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

TA DE CONTABILIDAD OBRA : NC02-6

FECHA DOCUMENTO : 24/07/2026

Página: 1

RECIBIDO DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - 900474727

LA SUMA DE: CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON

CONCEPTO: CUATRO COP M/L
TRASLADO DE PAGO A REALIZAR POR CONTRATO DE OBRA EN ESE HRGR, REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2026 CGR14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
299003.01	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		4,514,450,436	
443005.01	Nacional			4,514,450,436
TOTALES IGUALES			\$ 4,514,450,436	\$ 4,514,450,436

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ALMEIDA DUARTE KAREN YULIANA		C. C. o NIT N/A°

Número del registro

1

Fecha de aplicación

24 Jul 2026

Nombre del destinatario

Consortio De Garci

Identificación destinatario

9017405803

Producto destino

466 - 699972 - 34

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Banco Davivienda

Valor

COP \$ 2.392.658.731,10

Estado del pago

Exitoso

Código

OKB

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.
