

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S BIC

CONTRATO No. SI-CMA-007-2024

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES
OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**

576

CONTIENE: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 11

**PERÍODO DE EJECUCIÓN: 9 DE FEBRERO DE 2026 - 11 DE MARZO
DE 2026**

MONTERÍA - CÓRDOBA

Tabla de contenido.

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	5
2.1	LOCALIZACIÓN. 5	
2.2	ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS.....	6
2.3	CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO	11
3	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	22
3.1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.....	22
	ACTAS SUSCRITAS PARA EL CONTRATO DE OBRA	25
3.2	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	25
3.3	INFORME DE AVANCE27	
3.4	CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA	29
3.5	CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....	29
3.6	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.....	30
3.7	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	31
3.8	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA 33	
3.9	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS ..34	
3.10	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.....	34
4	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	35
4.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	35
	ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	36
4.2	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	37
4.3	CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA	38
4.4	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA	38
4.5	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	39
4.6	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	40
4.7	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	40
5	INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL	40
6	INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD	41
7	CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO - FINANCIERO).....	41
8	REGISTRO FOTOGRAFICO.....	44
9	INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA	45
10	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	45

Imágenes.

Ilustración 1. Localización del proyecto.....	5
Ilustración 2. Cocina existente - Cereté.....	6
Ilustración 3. Área de comedor existente - Cereté.....	6
Ilustración 5. Área de comedor existente - San Pelayo.....	7
Ilustración 4. Cocina - San Pelayo.....	7
Ilustración 6. Cocina existente - CdO.....	7
Ilustración 7. Área de comedor existente - CdO.....	7
Ilustración 8. Cocina existente - Moñitos.....	8
Ilustración 9. Área de comedor existente - Moñitos.....	8
Ilustración 11. Área de comedor existente - Tierralta.....	8
Ilustración 10. Cocina existente - Tierralta.....	8
Ilustración 12. Cocina existente - Planeta Rica.....	9
Ilustración 13. Área de comedor - Planeta Rica.....	9
Ilustración 15. Área de comedor existente - SBDV.....	9
Ilustración 14. Cocina existente SBDV.....	9
Ilustración 17. Área de comedor existente - Canalete.....	10
Ilustración 16. Cocina existente - Canalete.....	10
Ilustración 19. Área de comedor existente - SADS.....	10
Ilustración 18. Cocina existente - SADS.....	10
Ilustración 21. Área de comedor - Los Córdoba.....	11
Ilustración 20. Cocina - Los Córdoba.....	11
Ilustración 22. Render comedor - vista 1.....	12
Ilustración 23. Render comedor - vista 2.....	12
Ilustración 24. Porcentaje (%) de avance físico semanal del proyecto.....	27
Ilustración 25. Relación de desembolsos al contratista.....	31
Ilustración 26. Gráfico de avance físico semanal.....	42
Ilustración 27. Gráfico de avance físico mensual.....	43
Ilustración 28. Avance financiero semanal.....	43
Ilustración 29. Avance financiero mensual.....	44

Tablas.

Tabla 1. Información general contrato de obra.....	22
Tabla 2. Seguimiento a garantías contractuales del contrato de obra.....	24
Tabla 3. Actas del contrato.....	25
Tabla 4. Avance programado vs Avance ejecutado.....	27
Tabla 5. Relación de Personal del Contratista de Obra.....	29
Tabla 6. Estado del tiempo.....	32
Tabla 7. Información de contrato de Interventoría.....	35
Tabla 8. Seguimiento a garantías contractuales de interventoría.....	36
Tabla 9. Actas del Contrato de Interventoría.....	37
Tabla 10. Personal de interventoría.....	38



1 INTRODUCCIÓN.

El presente documento corresponde al UNDECIMO informe mensual de interventoría, en el que se relacionan las actividades desarrolladas en el noveno mes contractual comprendido entre el 9 de febrero de 2026 – 11 de marzo de 2026

Este informe exhibe la Interventoría realizada al contrato de obra N° SI-LP-002-2024, cuyo objeto es ***"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"***, el cual reviste una importancia fundamental para la administración departamental, al buscar impactar positivamente la calidad de vida de la población estudiantil.

La creación y optimización de estos espacios no solo proporcionarán áreas dignas y confortables para que los alumnos disfruten de sus alimentos bajo los más altos estándares de comodidad y ventilación, sino que también se conciben como lugares de esparcimiento y recreación. Se espera que estas pausas en la jornada académica, desarrolladas en estos comedores, contribuyan a renovar el entusiasmo y la motivación de los estudiantes, fortaleciendo así su proceso de aprendizaje y su interacción con la comunidad educativa.

579

El informe contiene las actividades desarrolladas por el Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, representado legalmente por MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ bajo el Contrato N° SI-LP-002-2024, el cual cuenta con un plazo de OCHO (8) meses y un valor total de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.135.056.075,00).

Esta interventoría es realizada por ANTICA S.A.S BIC, representada legalmente por JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ bajo el Contrato No. SI-CMA-007-2024 con un plazo de OCHO (8) meses y un valor total de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$350.649.999,00).

El seguimiento y control de la ejecución de esta obra, detallado en el presente informe, se orienta a garantizar que los objetivos pactados se cumplan a cabalidad, entregando a la comunidad educativa espacios que fomenten su bienestar integral.

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, Departamento de Córdoba. Específicamente en los municipios de Cereté (I.E. Marceliano Polo), San Pelayo (I.E. Santa Teresita sede general Santander), Ciénaga de Oro (I.E. Marco Fidel Suarez), Moñitos (I.E. San José de Moñitos sede principal), Tierralta (I.E. Junín), Planeta Rica (I.E. Plaza bonita), San Bernardo del Viento (I.E. El Castillo), Canalete (I.E. San José de Canalete), San Andrés de Sotavento (I.E. San Simón sede sagrado corazón de Jesús) y Los Córdoba (I.E. El Ébano).



Ilustración 1. Localización del proyecto.

2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS.

De acuerdo a las solicitudes presentadas por parte de rectores y representantes de las diferentes instituciones educativas, se realizaron visitas técnicas a cada una de ellas, con el fin de verificar sus condiciones iniciales y establecer un diagnóstico preliminar, identificando las necesidades de cada Institución. En las cuales se encontró lo siguiente:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 3. Área de comedor existente - Cereté



Ilustración 2. Cocina existente - Cereté

581

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.

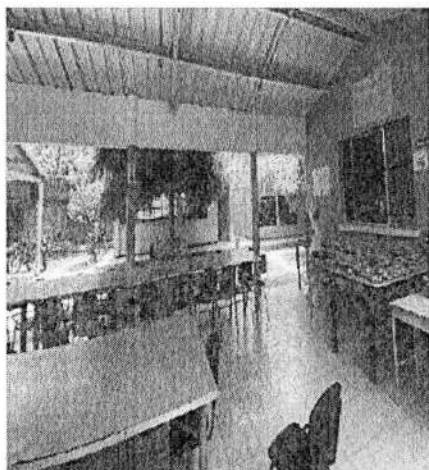


Ilustración 5. Área de comedor existente - San Pelayo

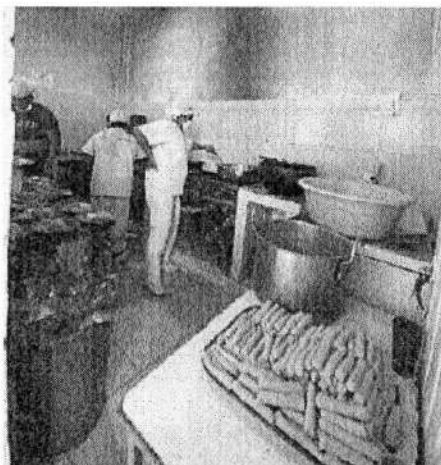


Ilustración 4. Cocina - San Pelayo

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.

582



Ilustración 7. Área de comedor existente - CdO

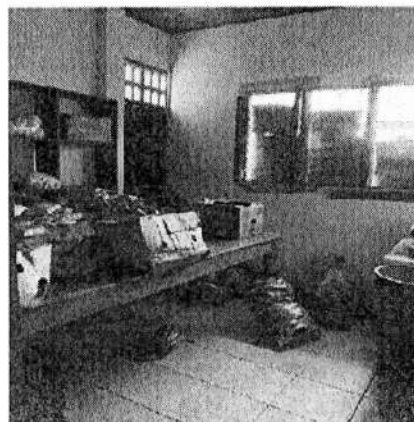


Ilustración 6. Cocina existente - CdO

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la

institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 9. Área de comedor existente - Moñitos



Ilustración 8. Cocina existente - Moñitos

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNIN

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.

583

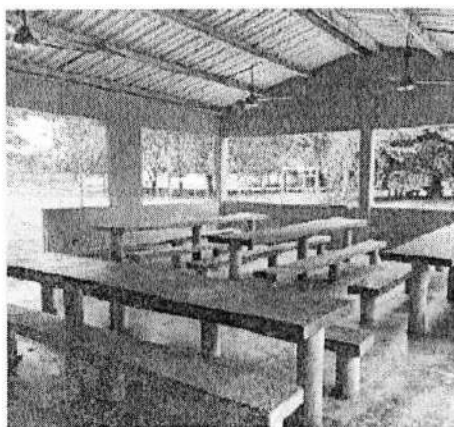


Ilustración 11. Área de comedor existente - Tierralta

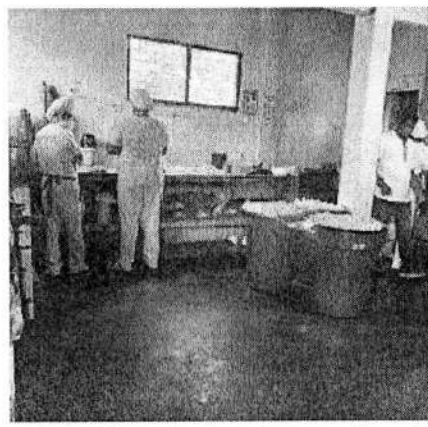


Ilustración 10. Cocina existente - Tierralta

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 13. Área de comedor - Planeta Rica



Ilustración 12. Cocina existente - Planeta Rica

584

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.

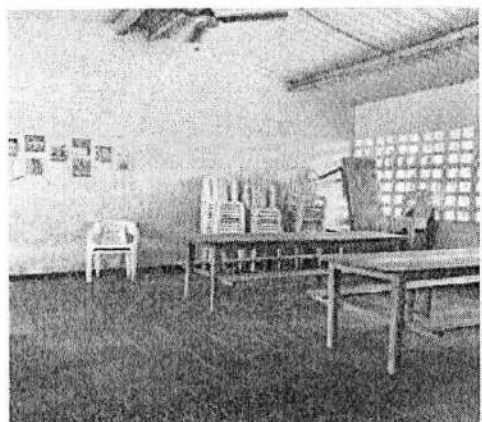


Ilustración 15. Área de comedor existente - SBDV

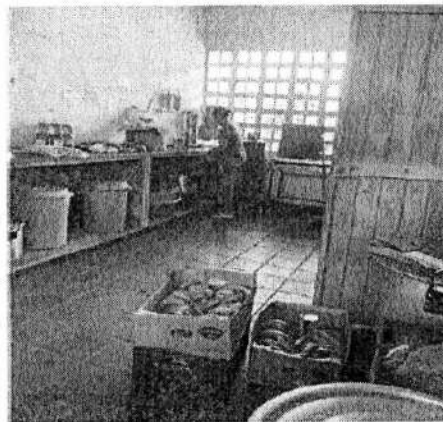


Ilustración 14. Cocina existente SBDV

8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 17. Área de comedor existente - Canalete

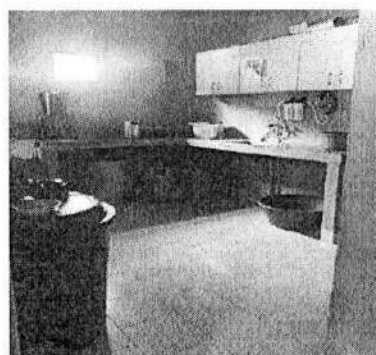


Ilustración 16. Cocina existente - Canalete

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMON SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.

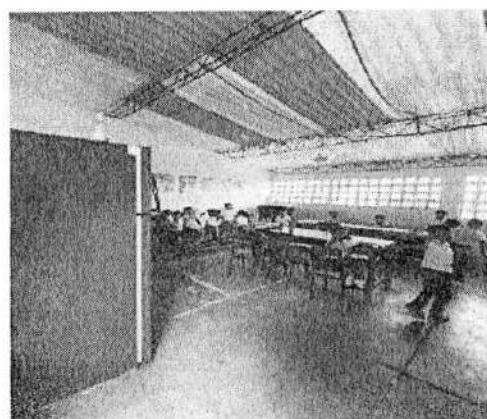


Ilustración 19. Área de comedor existente - SADS

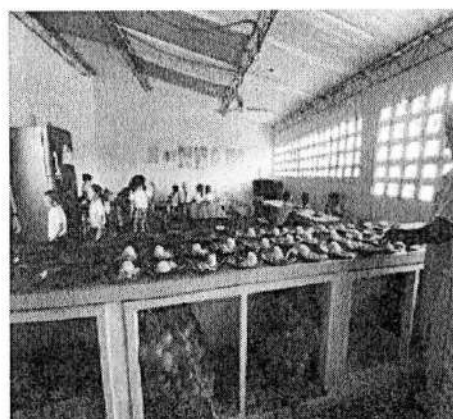


Ilustración 18. Cocina existente - SADS

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.

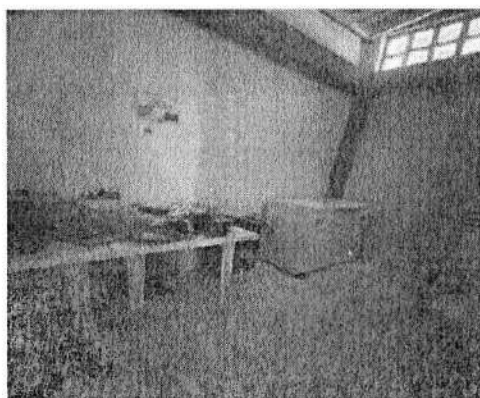


Ilustración 21. Área de comedor - Los Córdoba

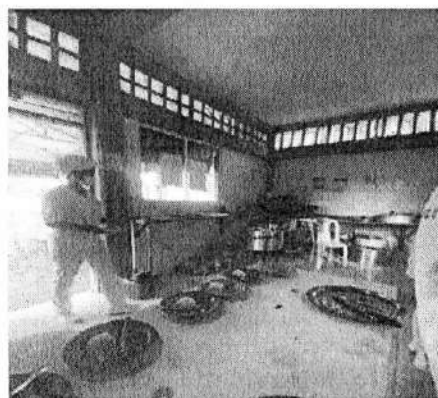


Ilustración 20. Cocina - Los Córdoba

586

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la construcción y adecuación de diez (10) comedores institucionales en diferentes municipios del departamento de Córdoba, con el objetivo primordial de optimizar la infraestructura destinada a la alimentación escolar y, consecuentemente, mejorar el bienestar de la comunidad educativa. De estos diez comedores, se realizará la construcción de seis (6) comedores completamente nuevos en los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Moñitos, Planeta Rica y Tierralta.

Cada uno de estos comedores institucionales de nueva construcción representarán un espacio moderno y funcional, diseñado para cumplir con los más altos estándares de este tipo de infraestructura educativa, pues estos contarán con áreas especializadas como: Cuarto de Bombas, Depósito de Basuras, Zonas de Preparación de Alimentos (incluyendo cocina fría y cocina caliente), Zona de Lavado, Zona de Refrigeración, Zona de Selección y Recibo. Asimismo, dispondrá de espacios dedicados para la entrega y recibo de bandejas, depósitos específicos para el menaje de la cocina, y un baño exclusivo para el personal que labore en estas instalaciones.

Adicionalmente, se contará con un amplio y adecuado espacio destinado al comedor, donde los estudiantes podrán recibir sus alimentos en un ambiente con los más altos estándares de comodidad y ventilación, propiciando un disfrute pleno durante sus comidas. Es importante destacar que estos comedores nuevos serán completamente dotados con el mobiliario necesario, incluyendo sillas y mesas, así como también los electrodomésticos necesarios en beneficio población estudiantil. Por otra parte, el proyecto contempla la adecuación de cuatro (4) comedores existentes, ubicados en las diferentes instituciones educativas de los municipios de Canalete, San Bernardo del Viento, San Andrés de Sotavento y Los Córdoba.

En estas instituciones, las obras a ejecutar serán específicas y estarán adaptadas a las necesidades particulares que presente cada comedor, priorizando las intervenciones que garanticen que el espacio sea completamente funcional, seguro y estructuralmente estable para el beneficio de la comunidad educativa. Cabe resaltar que estos comedores también serán dotados de igual manera con sillas, mesas, electrodomésticos y el menaje correspondiente.

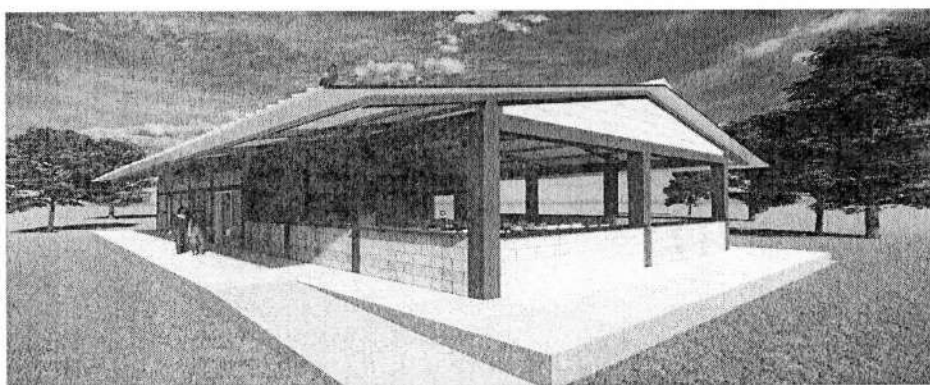


Ilustración 22. Render comedor – vista 1.

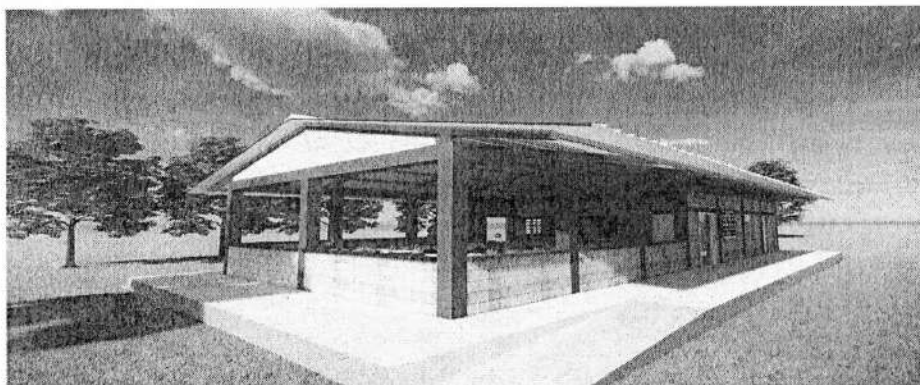


Ilustración 23. Render comedor – vista 2.

El proyecto consiste en la intervención de diez instituciones educativas, en diferentes municipios del Departamento de Córdoba, de la siguiente manera:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO
Municipio: Cereté
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER
Municipio: San Pelayo
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ
Municipio: Ciénaga de Oro
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL
Municipio: Moñitos
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN
Municipio: Tierralta
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA
Municipio: Planeta Rica
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO
Municipio: San Bernardo del Viento
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 75,0 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE
Municipio: Canalete

Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 130,40 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Municipio: San Andrés de Sotavento
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 48,00 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).
10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO
Municipio: Los Córdoba
Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 80,96 m2 (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

Las actividades y el alcance a ejecutar para este proyecto se relacionan a continuación:

					Formulario 1 - Propuesta económica		
					Código: 001		Versión: 1
GOVERNACIÓN DE CÓRDOBA PRESUPUESTO OFICIAL							
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA							
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR CORREGIDO	VALOR TOTAL
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.872,00	\$ 4.287,00	\$ 4.287,00	\$ 8.025.264,00
	1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	1.872,00	\$ 7.514,00	\$ 7.514,00	\$ 14.066.208,00
	1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	444,00	\$ 21.007,00	\$ 21.007,00	\$ 9.327.108,00
Subtotal							\$ 31.418.580,00
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	171,00	\$ 39.259,00	\$ 39.259,00	\$ 6.713.289,00
	2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	409,00	\$ 6.543,00	\$ 6.543,00	\$ 2.676.087,00
	2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	57,00	\$ 206.382,00	\$ 206.382,00	\$ 11.763.774,00
	2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	730,20	\$ 200.140,00	\$ 200.140,00	\$ 146.142.228,00
	2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	270,15	\$ 22.830,00	\$ 22.830,00	\$ 6.167.525,00
Subtotal							\$ 173.462.903,00

3. CIMENTACIÓN (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	5,70	\$ 890.152,00	\$ 890.152,00	\$ 5.073.866,00
	3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	34,20	\$ 1.020.946,00	\$ 1.020.946,00	\$ 34.916.353,00
	3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	365,40	\$ 124.557,00	\$ 124.557,00	\$ 45.513.128,00
	3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	7.173,00	\$ 9.658,00	\$ 9.658,00	\$ 69.276.834,00
	3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	596,40	\$ 40.066,00	\$ 40.066,00	\$ 23.895.362,00
Subt	total						\$ 178.675.543,00
4. ESTRUCTURAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	438,00	\$ 135.680,00	\$ 135.680,00	\$ 59.427.840,00
	4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	318,00	\$ 135.759,00	\$ 135.759,00	\$ 43.171.362,00
	4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	12.107,40	\$ 9.658,00	\$ 9.658,00	\$ 116.933.269,00
	4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	131,00	\$ 60.002,00	\$ 60.002,00	\$ 7.860.262,00
	4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	108,00	\$ 157.726,00	\$ 157.726,00	\$ 17.034.408,00
	4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @ .15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	9,60	\$ 160.024,00	\$ 160.024,00	\$ 1.536.230,00
Subt	total						\$ 245.963.371,00
5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	1.236,00	\$ 99.267,00	\$ 99.267,00	\$ 122.694.012,00
	5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	2.662,00	\$ 56.791,00	\$ 56.791,00	\$ 151.177.642,00
	5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	2.362,00	\$ 22.172,00	\$ 22.172,00	\$ 52.370.264,00
	5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	2.362,00	\$ 23.045,00	\$ 23.045,00	\$ 54.432.290,00
Subtotal							\$ 380.674.208,00
6. ESTRUCTURA - CUBIERTA (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	1.304,00	\$ 281.430,00	\$ 281.430,00	\$ 366.984.720,00
	6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	7.925,30	\$ 22.867,00	\$ 22.867,00	\$ 181.227.835,00
	6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	4.379,96	\$ 18.468,00	\$ 18.468,00	\$ 80.889.101,00
Subtotal							\$ 629.101.656,00

59

7. PISOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA, - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	985,80	\$ 127.857,00	127.857,00	\$ 126.041.431,00
	7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	985,80	\$ 163.779,00	163.779,00	\$ 161.453.338,00
	7,03	ENCHAPE CERÁMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	266,40	\$ 172.440,00	172.440,00	\$ 45.938.016,00
	7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	707,40	\$ 35.593,00	35.593,00	\$ 25.178.488,00
Subtotal							\$ 358.611.273,00
8. CARPINTERIA							
	8,01	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	42,00	\$ 805.968,00	805.968,00	\$ 33.850.656,00
	8,02	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	12,00	\$ 729.435,00	729.435,00	\$ 8.753.220,00
	8,03	S/I PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, DE 1,50 X 2,20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJAS DE 30 CMS EN AMBAS PUERTAS Y POR AMBOS LADOS.	UN	12,00	\$ 1.717.152,00	1.717.152,00	\$ 20.605.824,00
	8,04	S/I CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO DE 0,6 MM ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS, APERTURA MANUAL.	M2	21,60	\$ 429.923,00	429.923,00	\$ 9.286.337,00
	8,05	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	42,72	\$ 356.243,00	356.243,00	\$ 15.218.701,00
	8,06	S/I PROTECTOR DE VENTANAS EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	62,16	\$ 175.448,00	175.448,00	\$ 10.905.848,00
Subtotal							\$ 98.620.586,00
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS(I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA, - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
TUBERIAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE							
	9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	246,00	\$ 2.798,00	2.798,00	\$ 688.308,00
	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	105,00	\$ 12.259,00	12.259,00	\$ 1.287.195,00
	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	54,00	\$ 15.603,00	15.603,00	\$ 842.562,00
	9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	87,00	\$ 14.626,00	14.626,00	\$ 1.272.462,00
	9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO	UN	42,00	\$ 33.494,00	33.494,00	\$ 1.406.748,00
	9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UN	18,00	\$ 116.469,00	116.469,00	\$ 2.096.442,00
	9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UN	24,00	\$ 33.322,00	33.322,00	\$ 799.728,00
	9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UN	6,00	\$ 57.277,00	57.277,00	\$ 343.662,00
	9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UN	6,00	\$ 46.500,00	46.500,00	\$ 279.000,00
	9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UN	12,00	\$ 27.150,00	27.150,00	\$ 325.800,00
	9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UN	6,00	\$ 18.049,00	18.049,00	\$ 108.294,00
	9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UN	12,00	\$ 76.785,00	76.785,00	\$ 921.420,00
	9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UN	12,00	\$ 76.785,00	76.785,00	\$ 921.420,00
	9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	42,00	\$ 57.691,00	57.691,00	\$ 2.423.022,00
	9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	18,00	\$ 59.062,00	59.062,00	\$ 1.063.116,00

9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERÍA SANITARIA	ML	351,00	\$ 2.798,00	\$ 2.798,00	\$ 982.098,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	108,00	\$ 34.840,00	\$ 34.840,00	\$ 3.762.720,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	45,00	\$ 46.441,00	\$ 46.441,00	\$ 2.089.845,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	114,00	\$ 62.212,00	\$ 62.212,00	\$ 7.092.168,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	72,00	\$ 57.990,00	\$ 57.990,00	\$ 4.175.280,00
9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	84,00	\$ 66.284,00	\$ 66.284,00	\$ 5.567.856,00
9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00	\$ 82.396,00	\$ 82.396,00	\$ 494.376,00
9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	18,00	\$ 618.920,00	\$ 618.920,00	\$ 11.140.560,00
EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO						
9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)	UN	12,00	\$ 1.416.032,00	\$ 1.416.032,00	\$ 16.992.384,00
9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	6,00	\$ 1.075.173,00	\$ 1.075.173,00	\$ 6.451.038,00
APARATOS SANITARIOS						
9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UN	6,00	\$ 616.099,00	\$ 616.099,00	\$ 3.696.594,00
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	12,00	\$ 683.223,00	\$ 683.223,00	\$ 8.198.676,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UN	12,00	\$ 1.019.878,00	\$ 1.019.878,00	\$ 12.238.536,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UN	54,00	\$ 104.607,00	\$ 104.607,00	\$ 5.648.778,00
9,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADOS METÁLICOS	UN	12,00	\$ 1.058.191,00	\$ 1.058.191,00	\$ 12.698.292,00
9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	12,00	\$ 616.694,00	\$ 616.694,00	\$ 7.400.328,00
TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE						
9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	36,00	\$ 39.259,00	\$ 39.259,00	\$ 1.413.324,00
9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	12,00	\$ 206.382,00	\$ 206.382,00	\$ 2.476.584,00
9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13,82	\$ 200.188,00	\$ 200.188,00	\$ 2.766.598,00
9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	\$ 890.152,00	\$ 890.152,00	\$ 1.068.182,00
9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	8,40	\$ 1.020.946,00	\$ 1.020.946,00	\$ 8.575.946,00
9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	28,98	\$ 177.056,00	\$ 177.056,00	\$ 5.131.083,00
9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	24,00	\$ 403.099,00	\$ 403.099,00	\$ 9.674.376,00
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	1.615,80	\$ 9.658,00	\$ 9.658,00	\$ 15.605.396,00
TANQUE AGUA POTABLE						
9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20	\$ 39.259,00	\$ 39.259,00	\$ 5.935.961,00
9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00	\$ 206.382,00	\$ 206.382,00	\$ 5.572.314,00
9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56	\$ 22.831,00	\$ 22.831,00	\$ 4.487.661,00
9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	\$ 890.152,00	\$ 890.152,00	\$ 1.068.182,00
9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	10,80	\$ 1.195.256,00	\$ 1.195.256,00	\$ 12.908.765,00
9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	117,60	\$ 106.274,00	\$ 106.274,00	\$ 12.497.822,00

	9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20	\$ 1.270.097,00	\$ 1.270.097,00	\$ 54.868.190,00
	9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20	\$ 9.658,00	\$ 9.658,00	\$ 29.970.706,00
TANQUE DE AGUAS RESIDUALES							
	9,48	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20	\$ 39.259,00	\$ 39.259,00	\$ 5.935.961,00
	9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00	\$ 206.382,00	\$ 206.382,00	\$ 5.572.314,00
	9,50	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56	\$ 22.831,00	\$ 22.831,00	\$ 4.487.661,00
	9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0,05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	\$ 765.656,00	\$ 765.656,00	\$ 918.787,00
	9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20	\$ 905.605,00	\$ 905.605,00	\$ 39.122.136,00
	9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20	\$ 9.658,00	\$ 9.658,00	\$ 29.970.706,00
Subtotal							\$ 383.437.363,00
10. INSTALACIONES ELECTRICAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	42,00	\$ 251.975,00	\$ 251.975,00	\$ 10.582.950,00
	10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	18,00	\$ 254.729,00	\$ 254.729,00	\$ 4.585.122,00
	10,03	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UN	72,00	\$ 1.246.819,00	\$ 1.246.819,00	\$ 89.770.968,00
	10,04	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W-Wallpack LED 30W)	UN	234,00	\$ 624.202,00	\$ 624.202,00	\$ 146.063.268,00
	10,05	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	UN	60,00	\$ 945.986,00	\$ 945.986,00	\$ 56.759.160,00
	10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCl, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	126,00	\$ 203.416,00	\$ 203.416,00	\$ 25.630.416,00
	10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00	\$ 1.282.734,00	\$ 1.282.734,00	\$ 7.696.404,00
	10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UN	6,00	\$ 1.914.256,00	\$ 1.914.256,00	\$ 11.485.536,00
	10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tubería PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	25,00	\$ 147.633,00	\$ 147.633,00	\$ 3.690.825,00
	10,10	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE MEDIDA Y ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE PROTECCIONES (incluye	UN	6,00	\$ 2.526.991,00	\$ 2.526.991,00	\$ 15.161.946,00

		Tubería PVC, Tubería IMC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)					
10,11		SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UN	12,00	\$ 202.067,00	\$ 202.067,00	\$ 2.424.804,00
10,12		CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final	UN	6,00	\$ 2.873.894,00	\$ 2.873.894,00	\$ 17.243.364,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR							
10,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	UND	6,00	\$ 3.599.955,00	\$ 3.599.955,00	\$ 21.599.730,00
10,14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	6,00	\$10.471.226,00	\$ 10.471.226,00	\$ 62.827.356,00
10,15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	6,00	\$ 4.413.427,00	\$ 4.413.427,00	\$ 26.480.562,00
10,16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	48,00	\$ 1.502.974,00	\$ 1.502.974,00	\$ 72.142.752,00
10,17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES	UND	48,00	\$ 1.104.924,00	\$ 1.104.924,00	\$ 53.036.352,00
10,18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	18,00	\$16.125.303,00	\$ 16.125.303,00	\$ 290.255.454,00
Subtotal							\$ 917.436.969,00
11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN JOSE CANALETE							
ACTIVIDADES PRELIMINARES							
11,01		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	1,00	\$ 817.173,00	\$ 817.173,00	\$ 817.173,00
11,02		ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	102,00	\$ 7.514,00	\$ 7.514,00	\$ 766.428,00
11,03		S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	55,00	\$ 21.007,00	\$ 21.007,00	\$ 1.155.385,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
11,04		EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	18,00	\$ 39.259,00	\$ 39.259,00	\$ 706.662,00
11,05		EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	41,60	\$ 6.543,00	\$ 6.543,00	\$ 272.189,00
11,06		REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	6,00	\$ 206.382,00	\$ 206.382,00	\$ 1.238.292,00
11,07		RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	66,80	\$ 200.140,00	\$ 200.140,00	\$ 13.369.352,00
11,08		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	28,27	\$ 22.827,00	\$ 22.827,00	\$ 645.319,00
CIMENTACIÓN							
11,09		SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,60	\$ 890.152,00	\$ 890.152,00	\$ 534.091,00
11,10		ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,60	\$ 1.020.946,00	\$ 1.020.946,00	\$ 3.675.406,00
11,11		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	36,20	\$ 124.557,00	\$ 124.557,00	\$ 4.508.963,00
11,12		ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	856,20	\$ 9.658,00	\$ 9.658,00	\$ 8.269.180,00
11,13		SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	40,00	\$ 40.066,00	\$ 40.066,00	\$ 1.602.640,00
ESTRUCTURAS							
11,14		COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	40,00	\$ 135.860,00	\$ 135.860,00	\$ 5.434.400,00
11,15		VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	21,60	\$ 135.759,00	\$ 135.759,00	\$ 2.932.394,00
11,16		ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1.241,80	\$ 9.658,00	\$ 9.658,00	\$ 11.993.304,00

 ANTICA S.A.S BIC	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°11	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
---	--	---

11,17	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI (PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	18,00	\$ 157.726,00	\$ 157.726,00	\$ 2.839.068,00
ESTRUCTURA - CUBIERTA						
11,18	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	130,40	\$ 281.430,00	\$ 281.430,00	\$ 36.698.472,00
11,19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	825,55	\$ 22.867,00	\$ 22.867,00	\$ 18.877.852,00
11,20	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	417,14	\$ 18.468,00	\$ 18.468,00	\$ 7.703.742,00
PISOS						
11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	98,60	\$ 127.857,00	\$ 127.857,00	\$ 12.606.700,00
11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	98,60	\$ 163.779,00	\$ 163.779,00	\$ 16.148.609,00
11,25	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	12,00	\$ 35.593,00	\$ 35.593,00	\$ 427.116,00
PINTURA COCINA EXISTENTE						
11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	124,30	\$ 5.611,00	\$ 5.611,00	\$ 697.447,00
11,27	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	124,30	\$ 21.227,00	\$ 21.227,00	\$ 2.638.516,00
Subtotal						\$ 156.558.700,00
12. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL CASTILLO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO						
12,01	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO E= 0.10 MTS DE CONCRETO Y SOPORTE EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Und	1,00	\$ 196.292,00	\$ 196.292,00	\$ 196.292,00
12,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	75,00	\$ 21.455,00	\$ 21.455,00	\$ 1.609.125,00
12,03	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	70,70	\$ 5.611,00	\$ 5.611,00	\$ 396.698,00
12,04	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,00	\$ 127.857,00	\$ 127.857,00	\$ 9.589.275,00
12,05	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	75,00	\$ 163.779,00	\$ 163.779,00	\$ 12.283.425,00
12,06	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	48,38	\$ 35.593,00	\$ 35.593,00	\$ 1.721.989,00
12,07	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	41,60	\$ 11.404,00	\$ 11.404,00	\$ 474.406,00
12,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	70,70	\$ 21.227,00	\$ 21.227,00	\$ 1.500.749,00
Subtotal						\$ 27.771.959,00
13. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS - MUNICIPIO SAN ANDRES DE SOTAVENTO						
13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	48,00	\$ 21.455,00	\$ 21.455,00	\$ 1.029.840,00
13,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE ENTRAMADO EN CERCHAS METALICAS	M2	48,00	\$ 21.256,00	\$ 21.256,00	\$ 1.020.288,00
13,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	171,40	\$ 18.469,00	\$ 18.469,00	\$ 3.165.587,00
13,04	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	48,00	\$ 281.430,00	\$ 281.430,00	\$ 13.508.640,00
13,05	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	48,00	\$ 127.857,00	\$ 127.857,00	\$ 6.137.136,00

	13,06	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	48,00	\$ 163.779,00	\$ 163.779,00	\$ 7.861.392,00
	13,07	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	47,00	\$ 35.593,00	\$ 35.593,00	\$ 1.672.871,00
	13,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	57,80	\$ 21.227,00	\$ 21.227,00	\$ 1.226.921,00
Subtotal							\$ 35.622.675,00
14. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL EBANO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS							
	14,01	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	46,46	\$ 5.611,00	\$ 5.611,00	\$ 260.687,00
	14,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON ROJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	80,96	\$ 21.455,00	\$ 21.455,00	\$ 1.736.997,00
	14,03	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	80,96	\$ 163.779,00	\$ 163.779,00	\$ 13.259.548,00
	14,04	IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOSION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	28,30	\$ 31.021,00	\$ 31.021,00	\$ 877.894,00
	14,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	46,46	\$ 21.455,00	\$ 21.455,00	\$ 996.799,00
	14,06	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	40,40	\$ 11.404,00	\$ 11.404,00	\$ 460.722,00
	14,07	DESMONTE DE VENTILADORES EN MAL ESTADO	UND	4,00	\$ 21.865,00	\$ 21.865,00	\$ 87.460,00
	14,08	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	4,00	\$ 1.246.819,00	\$ 1.246.819,00	\$ 4.987.276,00
Subtotal							\$ 22.667.383,00
SUBTOTAL OBRAS CIVILES							\$ 3.640.023.169,00

596

DOTACIÓN DE MENAJE PARA COMEDOR - COCINA DE LAS DIFERENTES SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA							
15. SUMINISTRO PARA COCINAS Y COMEDORES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MONITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA - I.E EL EBANO, LOS CORDOBAS - I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO - I.E EL CASTILLO, SAN BERNARDO DEL VIENTO - DE LA I.E SAN JOSE CANALETE)							
	15,01	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS	UND	10,00	\$30.264.373,00	\$ 30.264.373,00	\$ 302.643.730,00
	15,02	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES	UND	10,00	\$ 5.004.363,00	\$ 5.004.363,00	\$ 50.043.630,00
	15,03	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES	UND	10,00	\$ 6.843.299,00	\$ 6.843.299,00	\$ 68.432.990,00
	15,04	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA	UND	10,00	\$ 659.785,00	\$ 659.785,00	\$ 6.597.850,00
SUBTOTAL SUMINISTROS							\$ 427.718.200,00
SUBTOTAL PROYECTO							\$ 4.067.741.369,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS							\$ 4.067.741.369,00
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO							\$ 67.314.706,00
VALOR TOTAL PROYECTO OBRA + SUMINISTRO							\$ 4.135.056.075,00

Tabla 1. Presupuesto oficial de Obra

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.

NÚMERO DEL CONTRATO	SI-LP-002-2024
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002. NIT N°: 901.915.670-0 Rep. Legal MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ. C.C. N°: 1.010.007.099
NIT	901915670-0
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 4.135.056.075,00).
CDP:	4625 DE 11 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORÍA	ANTICA S.A.S BIC
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N°1	9 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°1	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 DE MARZO DE 2026

Tabla 2. Información general contrato de obra

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NB-100369947
		ANEXO No.	0
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2024	\$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2024	\$ 1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	\$ 413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/02/2025	12/10/2030	\$ 398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	\$ 41.226.771,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	NB - 100095688
		ANEXO No.	0
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

598

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/02/2025	12/10/2025	\$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUNCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	\$ 569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	\$ 569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	\$ 569.400.000,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NB-100369947
		ANEXO No.	3
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	2 DE ABRIL DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

 ANTICA S.A.S BIC	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°11	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
--	--	--

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/05/2026	\$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	17/03/2025	17/05/2026	\$ 1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	17/11/2028	\$ 413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/03/2025	17/11/2030	\$ 398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/03/2025	17/05/2026	\$ 41.226.771,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	NB-100095688
		ANEXO No.	3
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

599

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	17/11/2025	\$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	17/11/2025	\$ 569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	17/11/2025	\$ 569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	17/11/2025	\$ 569.400.000,00

Tabla 3. Seguimiento a garantías contractuales del contrato de obra

- CONTROL DE GARANTIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.
VER ANEXO N°1

ACTAS SUSCRITAS PARA EL CONTRATO DE OBRA

TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD	14 DE MARZO DE 2025
CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA DEL PROYECTO:	14 DE MARZO DE 2025
ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO N°1	9 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°1 (3 MESES)	11 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla 4. Actas del contrato

- ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA.
VER ANEXO N°2

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Para el mes del que trata el presente informe, se lograron realizar las siguientes actividades:

600

- S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE :62,00 m2
- GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS :25,00 ML
- S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. :4,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE :1,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS :2,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS :2,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE :7,00 UND
- SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial) :12,00 UND
- SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA) :3,00 UND
- CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final :6,00 UND



ANTICA S.A.S BIC

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°11**


**GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS :1,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W :1,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS :1,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO :8,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES : 8,00 UND
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH) : 3,00 UND
- GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS : 28,40 ML
- PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS) : 81,17 M2
- REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO : 81,16 M2
- SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA : 4,00 UND
- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO A (I.E DE CERETÉ, SAN PELAYO, CIENAGA DE ORO, MOÑITOS Y PLANETA RICA) : 1,00 UND
- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO D (I.E SAN BERNARDO DEL VIENTO) : 1,00 UND
- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS TIPO E (I.E SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO) : 1,00 UND
- SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES TIPO A (I.E DE CERETÉ, SAN PELAYO, CIENAGA DE ORO, MOÑITOS, PLANETA RICA Y TIERRALTA) : 1,00 UND
- SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES TIPO D (I.E DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO) : 1,00 UND
- SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES TIPO A (I.E DE CERETÉ, SAN PELAYO, CIENAGA DE ORO, MOÑITOS, PLANETA RICA Y TIERRALTA) : 2,00 UND
- SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES TIPO C (I.E DE SAN BERNARDO DEL VIENTO) : 1,00 UND
- SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES TIPO D (I.E DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO) : 1,00 UND

3.3 INFORME DE AVANCE

3.3.1 AVANCE DE OBRA PROGRAMADA, EJECUTADA Y ACUMULADA DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre la semana 45 y semana 49 del presente informe mensual, el seguimiento al avance de obra programado y ejecutado arrojó los siguientes resultados:

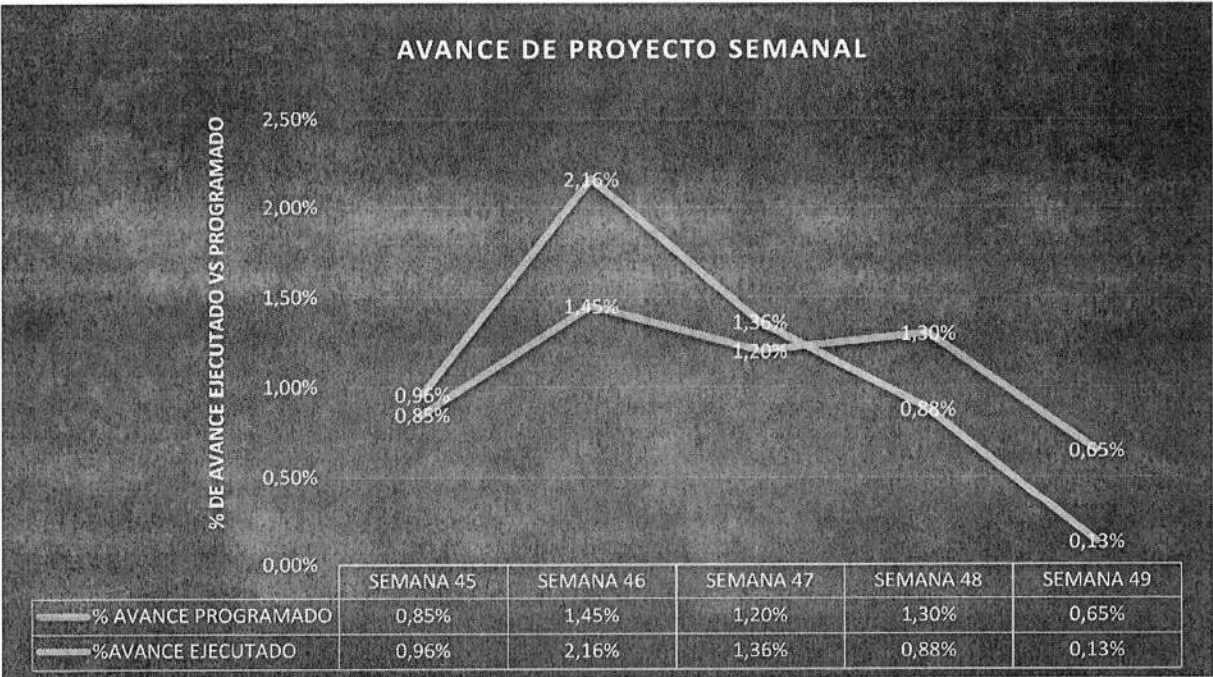

602

Ilustración 24. Porcentaje (%) de avance físico semanal del proyecto

AVANCE	SEMANA 41	SEMANA 42	SEMANA 43	SEMANA 44	ACUMULADO
AVANCE PROGRAMADO (%)	0,20%	1,10%	0,90%	1,10%	100%
AVANCE EJECUTADO (%)	0,19%	1,17%	0,85%	0,89%	100%

Tabla 5. Avance programado vs Avance ejecutado

A continuación, se presenta el avance de Obra ejecutado acumulado por Institución Educativa en cada Municipio:

INTERVENTORÍA A COMEDORES ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA						
N°	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MUNICIPIO	INTERVENCIÓN	ÁREA A INTERVENIR (M2)	% DE AVANCE EJECUTADO	VALOR DE AVANCE EJECUTADO
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO	CERETE	CONSTRUCCIÓN NUEVA	312.00	100,00%	\$ 692.463.337,39
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER	SAN PELAYO		312.00	100,00%	\$ 692.463.337,39
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ	CIENAGA DE ORO		312.00	100,00%	\$ 692.463.337,39
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE MONITOS SEDE PRINCIPAL	MONITOS		312.00	100,00%	\$ 692.463.337,39
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNIN	TERRALTA		312.00	100,00%	\$ 692.463.337,39
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA	PLANETA RICA		20150	100,00%	\$ 692.463.337,39
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE	CANALETE	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN	102.00	100,00%	\$ 198.047.754,70
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO	SAN BERNARDO DEL VIENTO		75,00	100,00%	\$ 123.050.247,00
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS	SAN ANDRES DE SOTAVIENTO		48.00	100,00%	\$ 80.161.644,10
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO	LOS CORDOBAS		81,00	100,00%	\$ 151.949.999,90
TOTAL AREA A INTERVENIR EN EL PROYECTO				2067,00		\$ 4.430.805.864,29
						% de Avance Total de la obra
						100,00%
						Fecha de Corte
						domingo, 8 de febrero de 2026
						Informe Semanal N°
						49

Ilustración 25. Avance de Obra por Institución Educativa

3.3.2 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, esta Interventoría elaboró y remitió a la Supervisión del Contrato y a la Secretaría de Infraestructura Departamental un total de cinco (5) informes semanales. Estos documentos, enviados vía correo electrónico, detallaron el seguimiento de todas las actividades de construcción ejecutadas durante cada semana comprendida en el periodo.

En cada informe semanal se plasmó el avance físico de las obras, las novedades relevantes, el estado de cumplimiento del cronograma, el control de calidad, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y cualquier otra información pertinente para el adecuado seguimiento del proyecto en cada uno de los frentes en intervención.

- INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA
VER ANEXO N°3

3.3.3 ACTAS DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

En el marco del seguimiento y control del programa de obra, se llevaron a cabo tres (3) comités técnicos de obra realizados en la oficina de esta interventoría. En estos espacios, conjunto con el contratista, se abordaron temas relevantes para el desarrollo del proyecto, incluyendo el seguimiento, control y calidad de la ejecución

de las actividades en curso, la necesidad de un plan de acción que permita mitigar los atrasos presentados en obra y suministros de materiales en obra.

- COMITES Y VISITAS
VER ANEXO N°4

3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo objeto del presente informe, se ha verificado de manera constante la presencia y operatividad de los equipos mínimos requeridos en el anexo técnico del contratista en los diferentes frentes de trabajo. Se constata que el contratista ha mantenido en obra los equipos esenciales para llevar a cabo todas las actividades pertinentes, tales como el vibrador de aguja para concreto, el compactador tipo rana, el mezclador de concreto y el equipo de oxicorte.

Es importante destacar que, dada la naturaleza del proyecto y su distribución en diez (10) instituciones educativas, estos equipos han mantenido una dinámica de rotación entre las diez (10) diferentes sedes donde se desarrollan actividades actualmente. Para garantizar la continuidad y optimización de los trabajos sin generar retrasos por la disponibilidad de los equipos, los responsables de cada frente siguen la coordinación planeada inicialmente para la programación y utilización de los mismos, acordando horarios que permiten su uso oportuno cada vez que se requiere en las diferentes tareas constructivas.

- EQUIPOS DE CONTRATISTA DE OBRA
VER ANEXO N°5

3.5 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ	100%
DIRECTOR DE OBRA	KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNANDEZ	50%
RESIDENTE DE OBRA 1	ANDY MIGUEL AGÁMEZ GENEY	100%
RESIDENTE DE OBRA 2	RICARDO JAVIER CASTRO ESCOBAR	100%
RESIDENTE DE OBRA 3	JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA	100%
INGENIERO ELÉCTRICO	HÉCTOR RAMÍREZ LIBREROS	50%
INGENIERO SANITARIO	SHARON MELISA CORRALES MARTINEZ	50%
SECRETARIO	JOHAN VERGARA	100%

Tabla 6. Relación de Personal del Contratista de Obra



Durante el periodo de este informe, se observó que los profesionales designados por el contratista para la ejecución del proyecto demostraron la dedicación requerida y atendieron de manera diligente las responsabilidades inherentes a sus respectivos cargos.

Por su parte, el personal de obra, mantuvo la conformación de las cuadrillas de trabajo en cada uno de los frentes activos, en concordancia con la planificación establecida para las diferentes actividades constructivas. Adicionalmente, se destaca la disposición del personal técnico y administrativo del contratista para atender las solicitudes de información y coordinación por parte de la Interventoría, lo cual ha facilitado el seguimiento y la resolución de aspectos técnicos y operativos del proyecto.

3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra de N° SI-LP-002-2024 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**. Valor del contrato correspondiente a CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 4.135.056.075,00). El contrato cuenta con un anticipo del 30%.

605

FORMA DE PAGO:

- **ANTICIPO:** Para este proyecto, a la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato. Este porcentaje se determinó con el objetivo de generar un apalancamiento financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten oportunamente y sin contratiempos. **PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO:** Para el manejo de los recursos entregado a título de anticipo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato.
- El Departamento de Córdoba cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.- **PAGOS PARCIALES**, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 30% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo. 2.- **PAGO FINAL**, equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual.

A continuación, se relacionan los desembolsos que se le han realizado al contratista hasta la fecha de corte del presente informe:

VALOR DEL CONTRATO SI-LP-002-2024			\$ 4.450.805.954,00				
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA - COMEDORES INSTITUCIONALES DE CÓRDOBA							
DESEMBOLSOS				AMORTIZACIONES			
#	CONCEPTO	VALOR	% DE AVANCE	% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DEL ACTA AMORTIZADA (NETO PAGADO)	% DE AVANCE REAL
1	ANTICIPO	\$ 1.240.516.822,00	27,87%	N.A	\$ -	\$ 1.240.516.822,00	27,87%
2	ACTA PARCIAL 1	\$ 1.261.079.816,77	28,33%	30,00%	\$ 378.323.945,03	\$ 882.755.871,74	19,83%
3	ACTA PARCIAL 2	\$ 510.223.260,83	11,46%	30,00%	\$ 153.066.978,25	\$ 357.156.282,58	8,02%
4	ACTA PARCIAL 3	\$ 1.099.788.019,67	24,71%	30,00%	\$ 329.936.405,90	\$ 769.851.613,77	17,30%
5	ACTA PARCIAL 4	\$ 1.134.634.261,33	25,49%	30,00%	\$ 340.390.278,40	\$ 794.243.982,93	17,84%
TOTALES		\$ 2.871.091.097,27	90,00%		\$ 861.327.329,18	\$ 2.009.763.768,09	63,00%

Ilustración 26. Relación de desembolsos al contratista

3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

3.7.1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (SAN ANDRES DE SOTAVENTO)

A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

ESTADO DEL TIEMPO (SAN ANDRES DE SOTAVENTO)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
9 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
10 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
11 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
12 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
13 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
14 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE LLUVIOSA
15 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE SOLEADA
16 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
17 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE SOLEADA
18 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
19 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
20 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE SOLEADA
21 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE SOLEADA
22 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
23 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
24 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
25 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
26 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
27 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
28 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
1 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
2 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
3 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
4 DE MARZO DE 2026	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE SOLEADA

ESTADO DEL TIEMPO (SAN ANDRES DE SOTAVENTO)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
5 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
6 DE MARZO DE 2026	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE SOLEADA
7 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
8 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
9 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
10 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
11 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA

Tabla 7. Estado del tiempo; San Andrés de Sotavento

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se registraron un total de siete (7) días con precipitaciones pluviales en estos tres frentes del proyecto.

3.7.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (TIERRALTA – PLANETA RICA)

A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

ESTADO DEL TIEMPO (TIERRALTA – PLANETA RICA)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
9 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
10 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
11 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
12 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
13 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE LLUVIOSA
14 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
15 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
16 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE LLUVIOSA
17 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
18 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE LLUVIOSA
19 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
20 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE LLUVIOSA
21 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
22 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
23 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE LLUVIOSA
24 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
25 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
26 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
27 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA SOLEADA/TARDE LLUVIOSA
28 DE FEBRERO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE LLUVIOSA
1 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
2 DE MARZO DE 2026	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE LLUVIOSA
3 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA

ESTADO DEL TIEMPO (TIERRALTA - PLANETA RICA)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
4 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
5 DE MARZO DE 2026	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE SOLEADA
6 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
7 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
8 DE MARZO DE 2026	MAÑANA LLUVIOSA/TARDE LLUVIOSA
9 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
10 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA
11 DE MARZO DE 2026	MAÑANA SOLEADA/TARDE SOLEADA

Tabla 11. Estado del tiempo (Tierralta - Planeta Rica).

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se registraron un total de diez (10) días con precipitaciones pluviales en este frente del proyecto.

- REGISTRO IDEAM
VER ANEXO N°6

3.8 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO
ANTICIPADO DEL CONTRATISTA

608

En relación con el anticipo estipulado para el presente Contrato de Obra, se informa que se tramitó una cuenta por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$1.240.516.822,00), lo que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

De este monto, el contratista recibió un desembolso final de \$1.178.490.981,50, luego de la aplicación de una retención por contribución especial de obra pública correspondiente a un valor de \$62.025.841,00, que equivale al 5% del valor del anticipo.

Del valor desembolsado, se ha verificado que el contratista destinó el 22.50% a la adquisición de materiales de construcción, el 25% al transporte de dichos materiales, el 45% a la subcontratación de obra, y el 7.50% restante como avance para el pago de mano de obra.

La Interventoría verificó la correcta inversión y el buen manejo de los recursos del anticipo en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
VER ANEXO N°7

3.9 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, se llevaron a cabo ensayos de resistencia a la compresión en probetas de concreto extraídas de los elementos estructurales fundidos en obra.

El objetivo de estas pruebas es verificar el cumplimiento de la resistencia especificada en los diseños y garantizar la calidad estructural de las construcciones.

Los resultados detallados de estos ensayos, incluyendo las fechas de muestreo, los elementos evaluados, las resistencias obtenidas a diferentes edades (ej. 7, 14 y 28 días) y su comparación con los valores de diseño, se anexan en el presente informe.

El análisis de estos resultados es fundamental para esta Interventoría en su labor de control de calidad y para asegurar la durabilidad y seguridad de las edificaciones.

- ENSAYOS DE LABORATORIO
VER ANEXO N°8

609

3.10 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

En cumplimiento de las labores de supervisión y control, se procedió a la revisión de los pagos de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) correspondientes al personal del contratista de obra que labora en el proyecto durante el periodo evaluado.

La documentación soporte de estos pagos, proporcionada por el contratista, se adjunta al presente informe para su debida verificación y archivo.

- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA
VER ANEXO N°9

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	SI-CMA-007-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	ANTICA S.A.S BIC
NIT	901823241-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ C.C. N° 1.067.958.787 de Montería
CDP N°	4725 DE 11 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$350.649.999,00).
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL - CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	14 DE NVOIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N°1	9 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°1	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 DE MARZO DE 2026

Tabla 8. Información de contrato de Interventoría

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA No. CUMPLIMIENTO	CMT-100015007
		ANEXO N°	0
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/02/2025	17/04/2024	\$ 35.064.999,90
PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2025	17/10/2028	\$ 35.064.999,90
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2025	17/04/2030	\$ 35.064.999,90

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA No. CUMPLIMIENTO	CMT-100015007
		ANEXO N°	2
FECHA DE EXPEDICIÓN:	28 DE MARZO DE 2025	FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/03/2025	21/05/2026	\$ 35.064.999,90
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	21/11/2028	\$ 35.064.999,90
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2030	\$ 35.064.999,90

611

Tabla 9. Seguimiento a garantías contractuales de interventoría

- GARANTÍAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
VER ANEXO N°10

ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CIENAGA DE ORO, SAN PELAYO Y CERETÉ	14 DE MARZO DE 2025
ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MOÑITOS	16 DE MAYO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CANALETE	19 DE MAYO DE 2025

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TIERRALTA	29 DE JULIO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PLANETA RICA	31 DE JULIO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ÉBANO, LOS CÓRDOBAS	12 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO N°1	9 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°1 (3 MESES)	11 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla 10. Actas del Contrato de Interventoría

ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
- VER ANEXO N°11

4.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la labor de esta Interventoría se centró en el seguimiento integral de las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el marco del Contrato N° SI-CMA-007-2024. Esta supervisión incluyó el control y verificación del avance de las actividades constructivas realizadas, tal como se detalla en el literal 3.2 “DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES” del presente documento, a través de visitas periódicas a los diferentes frentes de trabajo y la revisión de la documentación de soporte. Para el presente periodo se encuentra en ejecución 9 frentes de trabajo, estos se encuentran ubicados en las instituciones educativas de los municipios de: Ciénaga de Oro, Cereté, San Pelayo, Canalete, Moñitos, Tierralta, San Bernardo del Viento, Los Córdoba y Planeta Rica.

De manera regular, se informó a la entidad contratante sobre el progreso de la obra mediante la elaboración y envío de informes semanales, los cuales incluyeron registros fotográficos que evidenciaron el estado de las actividades. Asimismo, se convocaron y realizaron los comités técnicos necesarios para abordar aspectos específicos del proyecto.

Esta Interventoría mantuvo una presencia activa en el proyecto, buscando identificar de manera oportuna cualquier novedad o situación que pudiera afectar el normal desarrollo del objeto contractual, para así informar de inmediato a la entidad contratante para su conocimiento y toma de decisiones.

Para este periodo en cuestión, se pudo verificar que no se presentó ninguna anomalía que pudiera afectar el desarrollo normal del proyecto. El objetivo primordial de estas acciones es garantizar un control total de la obra en todas sus etapas y asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato para lograr el resultado esperado.

4.3 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Para el adecuado desempeño de las labores de supervisión e inspección en los diversos frentes de trabajo del proyecto, esta Interventoría dispuso de un vehículo tipo camioneta 4x4 de manera permanente.

Este recurso móvil resultó esencial para garantizar la presencia oportuna del equipo de interventoría en las diferentes sedes de las instituciones educativas en ejecución, facilitando el seguimiento diario de las actividades, la verificación en sitio de la calidad de los trabajos y la atención eficiente a cualquier requerimiento o eventualidad que surgiera durante la ejecución de la obra.

El vehículo se mantuvo operativo y en condiciones óptimas para cumplir con las exigencias de desplazamiento inherentes a la naturaleza dispersa geográficamente del proyecto.

4.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ	100%
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES	20%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NAYALIBE ELJACH MANJARREZ	100%
PROFESIONAL SG-SST	JOHAN SEBASTIAN BARRERA GONZÁLEZ	15%
ABOGADO	EDER LUIS MACHADO SOTO	0%
CONTADOR	ELI JOSÉ CUAVAS VEGA	0%
SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	OLINDA ESTHER MANAJARREZ MARTINEZ	0%
INSPECTOR SG-SST	ALVARO JAVIER GOMEZ RAMOS	0%

Tabla 11. Personal de interventoría.

4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría de N° SI-CMA-007-2024 cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*. El valor del contrato corresponde a TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$350.649.999,00).

FORMA DE PAGO:

- El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución del contrato objeto de interventoría, para lo cual será requerido cuenta de cobro o factura informe parcial de ejecución, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás requeridos por la entidad para los trámites de las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago final será requerido cuenta de cobro o factura, informe final de interventoría, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, acta de liquidación, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo, la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y demás requeridos por la entidad para los trámites de las cuentas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra. PARÁGRAFO TERCERO. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

A la fecha de presentación del presente informe, estos han sido los desembolsos efectuados a la interventoría:

VALOR DEL CONTRATO SI-CMA-007-2024			\$				350.649.999,00	
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA - COMEDORES INSTITUCIONALES DE CÓRDOBA								
DESEMBOLSOS				AMORTIZACIONES				
#	CONCEPTO	VALOR	% DE AVANCE	% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DEL ACTA AMORTIZADA (NETO PAGADO)	% DE AVANCE REAL	
1	ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	\$ -	N.A	N.A	
2	ACTA PARCIAL 1	\$ 158.318.474,47	45,15%	N.A	\$ -	\$ 158.318.474,47	45,15%	
3	ACTA PARCIAL 2	\$ 85.137.819,71	24,28%	N.A	\$ -	\$ 85.137.819,71	24,28%	
4	ACTA PARCIAL 3	\$ 72.128.704,76	20,57%	N.A	\$ -	\$ 72.128.704,76	20,57%	
TOTALES		\$ 315.584.998,94	90,00%		\$ -	\$ 315.584.998,94	90,00%	



4.6 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado

4.7 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y normativos, se adjunta al presente informe la documentación soporte de los pagos correspondientes a los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, si aplica) del personal de la Interventoría asignado al seguimiento y control del Contrato respectivo durante el periodo evaluado.

- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA
VER ANEXO N°12

5 INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Durante el periodo del presente informe, la gestión socio-ambiental del proyecto se centró en el seguimiento del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO). Se verificó la implementación de las medidas tomadas en materia ambiental con el objetivo de minimizar los impactos negativos.

El contratista demuestra compromiso con el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental del proyecto. Se ha constatado la correcta implementación de todas las medidas estipuladas, haciendo un uso eficiente de las prácticas ambientales para el desarrollo de la obra. Esto incluye un manejo adecuado de residuos sólidos, control de emisiones de polvo y ruido, y la protección de la naturaleza y vegetación presentes en algunos de los frentes en ejecución. Esta interventoría destaca que el contratista, no solo cumple con la normativa, sino que también fomenta una cultura de respeto por el entorno, lo que garantiza una ejecución sostenible y responsable.

En cuanto al componente social, se mantuvo comunicación con las comunidades de las diferentes instituciones educativas intervenidas a través de los canales establecidos, para informarlos acerca del avance de la obra, para que estos a su vez, desarrollen un sentido de pertenencia con el proyecto y cuiden el entorno en el cual se está desarrollando el mismo.

Es de anotar que durante el presente periodo, se registraron precipitaciones intensas y recurrentes en la región, asociadas al tránsito de un frente frío. Si bien estos eventos climáticos generaron afectaciones marginales en el cronograma de actividades, la integridad estructural de los comedores ejecutados se mantuvo intacta. Únicamente se reportó una inundación puntual en la sede del municipio de Los Córdoba, donde la pluviosidad superó los promedios regionales, sin que esto derivara en daños de consideración para la infraestructura. Ante esta situación climática, el contratista, en conjunto con la interventoría y la entidad contratante, procedieron a realizar un diagnóstico técnico integral en cada uno de los comedores con el fin de verificar su estado y funcionalidad.

6 INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD

En el periodo cubierto por este informe, la prioridad de la Interventoría fue asegurar que la ejecución del proyecto cumpliera con los altos estándares de calidad definidos en el Plan de Gestión Integral de Obra y el Plan de Calidad. Para ello, se llevaron a cabo ensayos de laboratorio de los materiales y se realizó un monitoreo constante de los procedimientos constructivos a través de visitas técnicas.

Los resultados, plasmados en los reportes semanales, muestran un desempeño satisfactorio del contratista, que ha logrado cumplir con los requisitos de calidad.

En base a lo anterior el porcentaje ejecutado acumulado en relación al PGIO ya cubre el 100%, lo que corresponde a un valor ejecutado de \$67.314.706,00.

La Interventoría mantendrá su compromiso de vigilancia para asegurar que todos los procesos y recursos empleados sigan las normas técnicas colombianas vigentes

- INFORME DE SEGUIMIENTO SST Y AL PGIO
VER ANEXO N°13

7 CUADRO RESUMEN (AVANCE FÍSICO - FINANCIERO)

Durante el periodo del presente informe, el avance físico acumulado del proyecto se sitúa en un 100% de ejecución, en relación con la programación establecida que representa un 100%.

El avance financiero a la fecha, con respecto a los pagos parciales amortizados recibidos por parte del contratista, considerando el acta parcial N°1, 2, 3 y 4 corresponde a un 63.00% del valor del contrato.

A continuación, se presenta un cuadro detallado que representa el avance físico y financiero general de la ejecución de las actividades contractuales del proyecto, permitiendo una visión integral del estado actual de la ejecución presupuestal y del progreso constructivo.

VALOR DEL CONTRATO SI-LP-002-2024				\$	4.450.805.954,00		
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA - COMEDORES INSTITUCIONALES DE CORDOBA							
DESEMBOLSOS				AMORTIZACIONES			
#	CONCEPTO	VALOR	% DE AVANCE	% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DEL ACTA AMORTIZADA (NETO PAGADO)	% DE AVANCE REAL
1	ANTICIPO	\$ 1.240.516.822,00	27,87%	N.A	\$ -	\$ 1.240.516.822,00	27,87%
2	ACTA PARCIAL 1	\$ 1.261.079.816,77	28,33%	30,00%	\$ 378.323.945,03	\$ 882.755.871,74	19,83%
3	ACTA PARCIAL 2	\$ 510.223.260,83	11,46%	30,00%	\$ 153.066.978,25	\$ 357.156.282,58	8,02%
4	ACTA PARCIAL 3	\$ 1.099.788.019,67	24,71%	30,00%	\$ 329.936.405,90	\$ 769.851.613,77	17,30%
5	ACTA PARCIAL 4	\$ 1.134.634.261,33	25,49%	30,00%	\$ 340.390.278,40	\$ 794.243.982,93	17,84%
TOTALES		\$ 4.005.725.358,60	90,00%		\$ 1.201.717.607,58	\$ 2.804.007.751,02	63,00%

Ilustración 27. Avance Financiero y actas pagas del Contrato de Obra

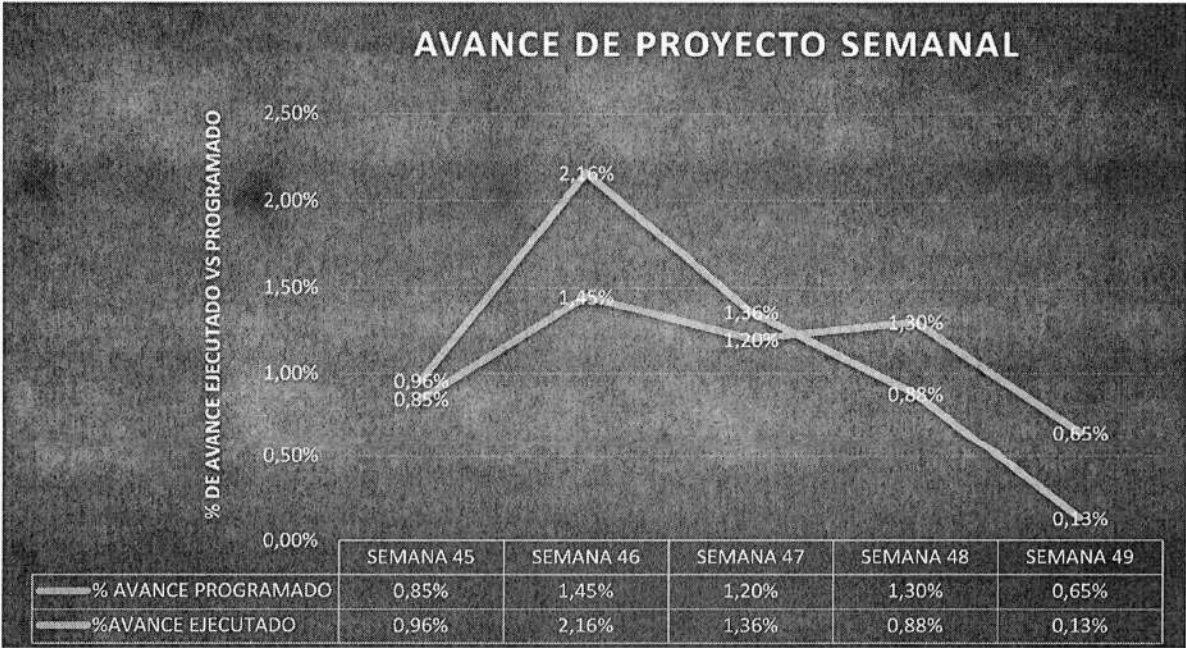


Ilustración 28. Gráfico de avance físico semanal

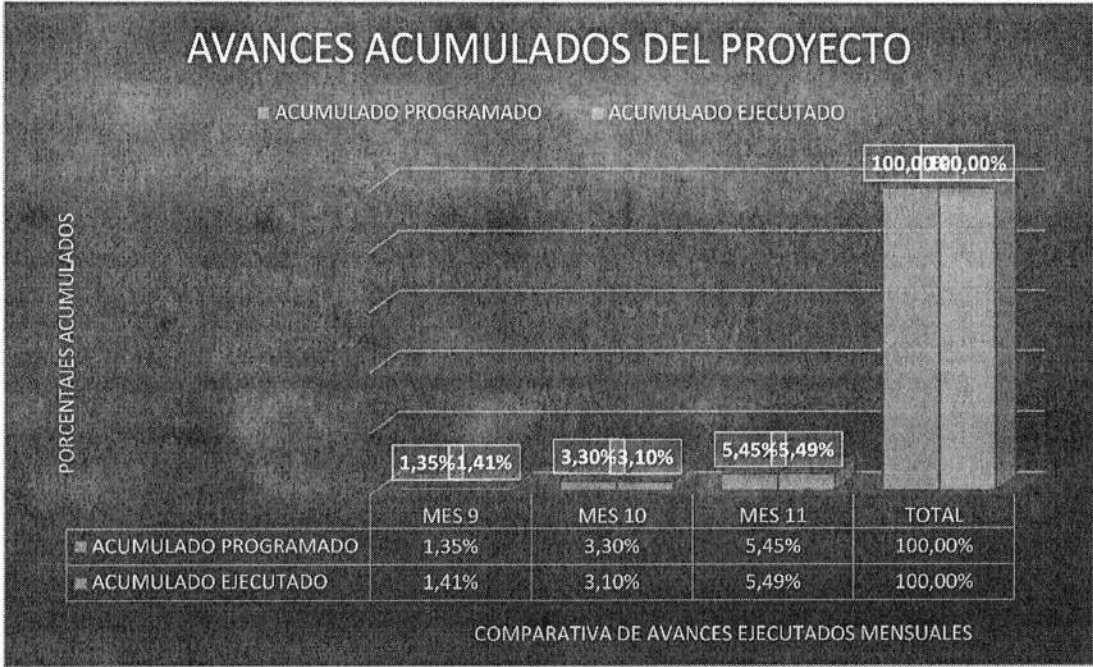


Ilustración 29. Gráfico de avance físico mensual

618

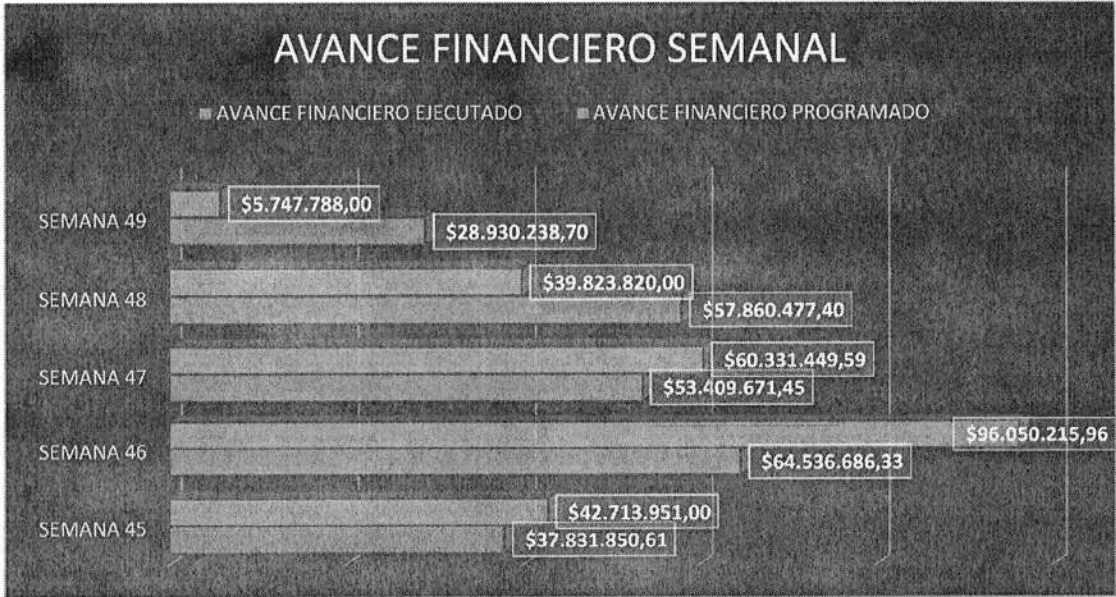


Ilustración 30. Avance financiero semanal



Ilustración 31. Avance financiero mensual

8 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta al presente informe mensual un registro fotográfico que documenta el avance de las actividades constructivas desarrolladas durante el periodo respectivo en los diferentes frentes de trabajo del proyecto.

Este material visual anexo al presente documento complementa la información detallada en los apartados anteriores del informe, permitiendo una mejor comprensión del progreso físico de la obra y evidenciando las condiciones de ejecución en sitio.

El registro fotográfico se organiza por institución educativa y actividad, facilitando la identificación y el seguimiento del avance en cada una de las localizaciones del proyecto.

- REGISTRO FOTOGRAFICO
VER ANEXO N°14

9 INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA

Durante el undécimo mes (final) de ejecución de la obra, la Dirección de Interventoría desplegó una gestión integral orientada al cumplimiento técnico del objeto contractual, certificando el avance y la correcta ejecución de las actividades iniciales conforme a los requerimientos técnicos pertinentes.

En esta etapa constructiva correspondiente a las diez (10) sedes en intervención, se realizó la respectiva revisión, verificación, control y seguimiento a las actividades en ejecución con respecto a la estructura de la edificación – comedor.

Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y un seguimiento proactivo del proyecto, se programaron y coordinaron con el contratista las reuniones y comités de seguimiento periódico, asegurando así un flujo constante de información con la Supervisión. Adicionalmente, se verificó la existencia y suficiencia de los planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones técnicas indispensables para el inicio y la correcta ejecución de las obras pactadas.

La Dirección de Interventoría ha establecido y mantiene un sistema de archivo organizado y actualizado de toda la documentación relevante del proyecto. Este archivo incluye la correspondencia oficial, la información preliminar, los informes técnicos detallados, las actas de los comités de obra, los planos constructivos y cualquier otro documento esencial para el control del desarrollo del proyecto.

Esta gestión documental garantiza la disponibilidad de la información necesaria para determinar las características completas de la obra ejecutada y facilita la toma de decisiones oportuna por parte de la entidad contratante.

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado, esta interventoría concluye que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contractuales en las diez (10) sedes intervenidas.

Se certifica la culminación física del 100% de las obras civiles y la entrega total de la dotación y menaje de cocina proyectados para cada municipio.

Es pertinente destacar que, ante los eventos hidrometeorológicos derivados del reciente frente frío, las estructuras demostraron un comportamiento mecánico óptimo y una adecuada gestión de escorrentías, manteniéndose sin afectaciones estructurales pese a la intensidad de las precipitaciones en la región.

En términos de calidad, los ensayos de resistencia de concreto validaron el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, asegurando la estabilidad de los elementos estructurales.

Asimismo, el contratista evidenció una gestión ambiental y social sobresaliente a través del cumplimiento del PGIO y el PMA, garantizando un manejo eficiente de residuos y una relación armónica con las comunidades educativas.

Finalmente, con un avance financiero del 90% tanto en la obra como en la interventoría —acorde a las etapas de cierre administrativo—, se deja constancia de que el proyecto se encuentra en condiciones técnicas y jurídicas óptimas para su puesta en funcionamiento y el inicio del periodo de estabilidad de obra.

Como punto adicional de relevancia, la interventoría destaca que el proyecto se entrega con los Manuales de Operación y Mantenimiento socializados, lo cual garantiza que la comunidad educativa cuenta con las herramientas para preservar la inversión. Se da paso así a la suscripción del Acta de Recibo Final, activando formalmente las Pólizas de Estabilidad y calidad de la obra, asegurando la protección del patrimonio departamental.

621

Sin otro particular, se adjuntan la documentación descrita en los acápites del presente documento.



JUAN PABLO BANQUEZ GONZÁLEZ
Representante legal
ANTICA S.A.S BIC
Interventor
