

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS



CONTRATO 1922 DE 2025

**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

INFORME MENSUAL No. 5

INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS



ABRIL 01 AL 30 DE 2026, BARRANQUILLA

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	7
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	9
2.1	Localización de los proyectos.	9
2.1.1	Lote 1 Consorcio Inprobrain Fluvial.	9
2.1.2	Lote 2 Consorcio Navegabilidad.	16
2.1.3	Lote 3 Consorcio Vía Fluvial.	21
2.1.4	Lote 4 Torres y Asociados SAS.	25
2.1.5	Lote 5 Consorcio MNF.	28
2.1.6	Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.	31
2.2.	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.....	32
2.3.	Inventario y estado inicial de la vía	35
2.4.	Características técnicas del proyecto.	35
3.	INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA.....	38
3.1	Información General del Contrato de Consultoría	38
3.1.1	Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.	39
3.1.2	Lote 2. Consorcio Navegabilidad.....	40
3.1.3	Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.....	41
3.1.4	Lote 4. Torres y Asociados SAS.....	42
3.1.5	Lote 5. Consorcio MNF.....	43
3.1.6	Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.....	44
3.2.	Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes	45
3.2.1	Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.	45
3.2.2	Lote 2. Consorcio Navegabilidad.	46
3.2.3	Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.	48
3.2.4	Lote 4. Torres y Asociados SAS.	49
3.2.5	Lote 5. Consorcio MNF.	51
3.2.6	Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.	52
3.3.	Seguimiento Ítems no previstos.....	52
3.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.....	52
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA.....	54

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

4.1.	Informes Semanales.....	54
4.2.	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría.....	57
4.3.	Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría.	60
4.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	71
4.5.	Estado general del Tiempo.....	76
4.6.	Resumen Ensayos de laboratorio	79
4.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	81
4.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	91
4.9.	Otros documentos seguimiento mensual.....	91
4.9.1.	Seguimiento a la inversión del Anticipo	92
4.9.2.	Seguimiento al programa de inversiones	95
4.9.3.	Actas de comité y reunión	95
5	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	95
5.1.	Información general del contrato	95
5.2.	Descripción de las actividades realizadas por el interventor.	97
5.3.	Informes de especialistas y profesionales	97
5.4.	Informe del Programa Anual de Caja – PAC	98
5.5.	Informe matriz de riesgos.	98
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría.....	98
6	REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	99
6.1.	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	99
6.2.	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.	100
	100	
6.3.	Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.	101
6.4.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría	102
6.5.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	103
6.6.	Otros documentos seguimiento mensual.....	103
6.6.1.	Seguimiento a la inversión del Anticipo	103
6.7.	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.....	104

7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	104
8	ANEXOS.....	105
8.1	RELACION DE CORRESPONDENCIA	105
8.2	INFORMES SEMANALES.....	105
8.3	INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DEL COORDINADOR Y DE LOS INGENIEROS RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS, Y DEL INGENIERO AUXILIAR.	105
8.4	PRESENTACIÓN COMITES DE SEGUIMIENTO.....	105

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1	Localización del Hito 1 Puracon	10
Figura 2	Localización del Hito 1 Pucarón	10
Figura 3	Localización del Hito 2 Taraira.....	11
Figura 4	Localización del Hito 2 Taraira.....	12
Figura 5	Localización del Hito 3 Pacoa	13
Figura 6	Localización del Hito 3 Pacoa	13
Figura 7	Localización del Hito 4 Mirití- Parana.....	14
Figura 8	Localización del Hito 4 Mirití- Parana.....	14
Figura 9	Localización del Hito 5 La Victoria	15
Figura 10	Localización del Hito 5 La Victoria	15
Figura 11	Localización del Hito 1 La Guadalupe	17
Figura 12	Localización del Hito 1 La Guadalupe.....	17
Figura 13	Localización del Hito 2 Puerto Colombia.....	18
Figura 14	Localización del Hito 2 Puerto Colombia.....	19
Figura 15	Localización del Hito 3 Cacahual.	20
Figura 16	Localización del Hito 3 Cacahual.	21
Figura 17	Localización del Hito 1 Mapiripana.....	22
Figura 18	Localización del Hito 1 Mapiripana.....	22
Figura 19	Localización del Hito 2 Morichal.....	23
Figura 20	Localización del Hito 3 Papanahua	24
Figura 21	Localización del Hito 3 Papanahua	24
Figura 22	Localización del Hito 1 Unguía.....	25
Figura 23	Localización del Hito 1 Unguía.....	26
Figura 24	Localización del Hito 2 Pavasá	27
Figura 25	Localización del Hito 2 Pavasá	27
Figura 26	Localización del Hito 1 Solita	28
Figura 27	Localización del Hito 1 Solita	29
Figura 28	Localización del Hito 2 Solano	30
Figura 29	Localización del Hito 2 Solano	30

Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño	31
Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño	32
Figura 32 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 1	57
Figure 33 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 4.	58
Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 5.	59
Figura 35 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 1.	66
Figura 36 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 2.	67
Figura 37 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 3.	68
Figure 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 4.	69
Figura 39 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 5.	70
Figura 40 Informe financiero lote 1.....	71
Figura 41. Informe financiero lote 2.....	72
Figura 43 Informe financiero lote 3.....	73
Figura 42 Informe financiero lote 4.....	74
Figura 43 Informe financiero lote 5.....	75
Figura 44 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 3.	76
Figura 45 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 4.	77
Figura 46 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 5.	78
Figura 47 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 1.....	79
Figura 48 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 4.....	80
Figura 49 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.	81
Figura 50 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.	83
Figura 51 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3.	85
Figura 52 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4.	87
Figura 54 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5.	89
Figura 55 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6.	91
Figura 54 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de consultoría, LOTE 2.....	92
Figura 55 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de consultoría, LOTE 4.....	93
Figura 56 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de consultoría, LOTE 5.....	94

Figura 57 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	100
Figura 58 MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.	101
Figura 59 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento y seguros contrato de interventoría.....	102

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional	33
Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025.	39
Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025.	40
Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025.	41
Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025.	42
Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025	43
Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025.	44
Tabla 8 listado informes semanales, periodo abril. Lote 1.	55
Tabla 9 listado informes semanales, periodo abril. Lote 2.	55
Tabla 10 listado informes semanales, periodo abril. Lote 3.	55
Tabla 11 listado informes semanales, periodo abril. Lote 4.	56
Tabla 12 listado informes semanales, periodo abril. Lote 5.	56
Tabla 13 listado informes semanales, periodo abril. Lote 6.	56
Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 1.....	60
Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 2.....	61
Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 3.....	62
Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 4.....	63
Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 5.....	64
Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 6.....	65
Tabla 20 Resumen reuniones y comités de seguimiento, periodo abril.	95
Tabla 21 Información del contrato de Interventoría.	95
Tabla 22 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS.....	97
Table 23 Relación equipos de la Interventoría.	97

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

1. INTRODUCCION

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establece la promoción y desarrollo del modo fluvial y el transporte Intermodal, el cual elevará el nivel de los servicios que se prestan en la red fluvial; con el fin de generar una mayor accesibilidad de los territorios y mayor movilidad de la población de la Colombia profunda.

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra la estructuración de proyectos para la contratación de estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a su cargo, incluyendo los componentes técnico, jurídico, ambiental, social, predial y financiero. En desarrollo de dichas funciones, el INVIAS adelantó los procesos CMA-DTE-SPI-044-2025 y CMA-DTE-SPI-046-2025.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a través de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, incorpora dentro de su gestión el proyecto denominado **“Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS”**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y la operatividad de la infraestructura fluvial asociada a los muelles ubicados en la red navegable a cargo de la Entidad.

El proyecto objeto de interventoría corresponde a los **“Estudios y Diseños para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lotes 1 al 6”**, mediante el cual se contempla la ejecución de estudios para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de **Fase II – Factibilidad**, y para el Lote 6 a nivel de **Fase III – Estudios y Diseños Definitivos**.

Por lo que el Instituto Nacional de Vías suscribió con **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.)** el contrato número 1922 DE 2025, cuyo objeto es la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL”**

Y se suscribieron los siguientes contratos cuyo objeto son:

- El contrato 1914 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL**, cuyo objeto es **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.”**

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- El contrato 1915 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO NAVEGABILIDAD**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.**”
- El contrato 1892 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO VÍA FLUVIAL**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.**”
- El contrato 1882 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **TORRES Y ASOCIADOS**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**”. LOTE 4.”
- El contrato 1957 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5**”.
- El contrato 1968 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.**”.

Las órdenes de inicio de los contratos de Consultoría se suscribieron:

- Lote No 1 el 16 de diciembre de 2025.
- Lote No 2 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 3 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 4 el 19 de diciembre de 2025
- Lote No 5 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 6 el 16 de diciembre de 2025

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

La orden de inicio del contrato de Interventoría se suscribió el 16 de diciembre del 2025.

Se realizó reunión presencial en la oficina de Invias en la ciudad de Bogotá el día 16 de diciembre del 2025.

El informe mensual No. 5 de Interventoría, corresponde al período comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 31 de abril de 2026. En este informe se presenta el alcance del proyecto, la información básica de los contratos de Consultoría e Interventoría y las principales actividades ejecutadas por la consultoría y la Interventoría durante este período.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización de los proyectos.

2.1.1 Lote 1 Consorcio Inprobrain Fluvial.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL se tiene la siguiente localización de los sus respectivos hitos:

HITO 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE ALTERNO PUCARÓN

El caserío de Pucarón se localiza al suroccidente del municipio de Mitú, en el departamento del Vaupés, en inmediaciones de los sectores de San Luis y Matapí. El área objeto de intervención corresponde a un punto estratégico del corredor fluvial del río Vaupés, el cual constituye un eje fundamental para el transporte de pasajeros, carga general y víveres desde el interior del país hacia el municipio de Mitú.

En este sector, la presencia de raudales genera una discontinuidad en la navegabilidad del tramo comprendido entre Calamar y Mitú, lo que obliga a la implementación de un trasbordo terrestre de aproximadamente 5,45 km. Dicho trasbordo se realiza a través de dos tramos viales: i) un tramo pavimentado en concreto, en adecuado estado de servicio, con una longitud aproximada de 2,40 km,

que conecta con los muelles de Yuruparí; y ii) un tramo carretable no pavimentado, de aproximadamente 2,45 km, que conduce al sector de Piraybaroca, desde donde se restablece la continuidad del transporte fluvial hacia el municipio de Mitú. Adicionalmente, este punto presenta una alta importancia funcional y social, al constituirse en un nodo de conectividad utilizado por comunidades indígenas para el acceso a servicios de educación y salud

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pucarón:

Figura 1 Localización del Hito 1 Puracon



Fuente: Google earth

Figura 2 Localización del Hito 1 Pucarón



Fuente: Google earth


EL HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE TARAIRA

Taraira es un municipio situado en el extremo suroriente del departamento del Vaupés, en Colombia. Se localiza en la frontera con Brasil al oriente y limita al sur y occidente con el departamento del Amazonas. Forma parte de la cuenca baja del río Apaporis, en una zona de alta riqueza hídrica y selvática.

El área municipal es de 6.619 Km², equivalente al 12,23% del área departamental, y limita por el norte con el corregimiento departamental de Pacoa y la República del Brasil (municipio de Japurá); por el oriente, con la República del Brasil (municipio de Japurá); por el sur y el occidente, con el departamento del Amazonas (corregimiento departamental de La Pedrera).

En las siguientes figura se presenta la localización general de Taraira:

Figura 3 Localización del Hito 2 Taraira

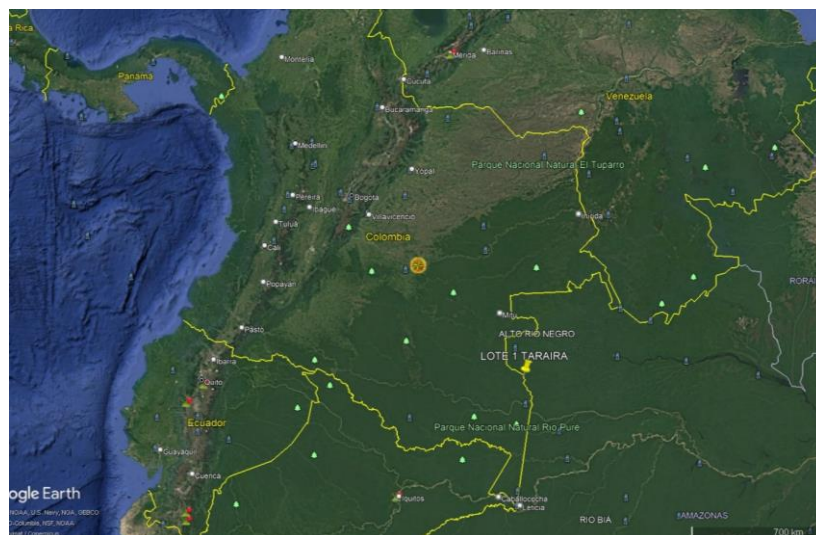

Fuente: Google earth

Figura 4 Localización del Hito 2 Taraira



Fuente: Google earth


EL HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PACOA

Pacoa es una de las tres áreas no municipalizadas del departamento de Vaupés en Colombia. Su cabecera municipal es Buenos Aires de Lérída, se encuentra a una altitud de 200 m.s.n.m. Cuenta con una superficie de 14.108 km² y tiene una población de 5709 habitantes. En este se encuentra el raudal de Jirijirimo, Río Apaporis.

Limita al norte con el corregimiento de Papunagua, partiendo del raudal Sabana; sobre el río Paraná Pichuna, siguiendo en línea recta en dirección noroeste hasta encontrar los nacimientos del caño Siringa; luego por el este aguas abajo hasta su desembocadura en el caño Aceite, punto de concurso del departamento del Guaviare y el municipio de Carurú y el corregimiento de Papunagua.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pacoa

Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa

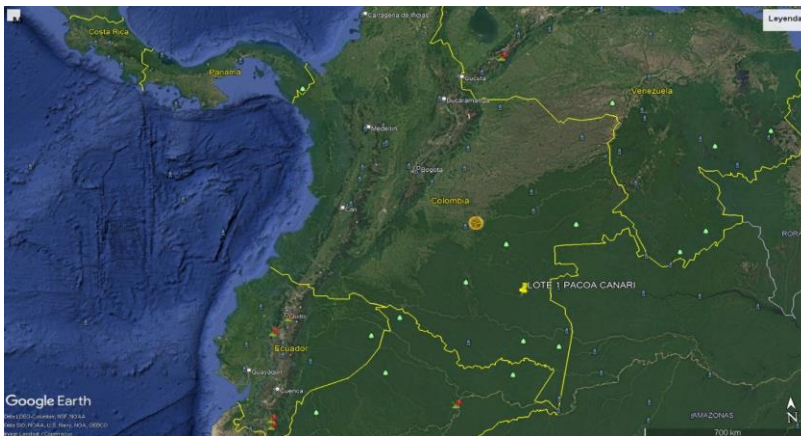

Fuente: Google earth

Figura 6 Localización del Hito 3 Pacoa



Fuente: Google earth

EL HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ

Localizado en Miriti-Paraná es un área no municipalizada colombiana, cuyo territorio se localiza en la cuenca del río del mismo nombre, y se encuentra ubicado al norte del departamento de Amazonas. Limita al norte con el departamento del Caquetá, el área no municipalizada de La Victoria y el departamento de Vaupés;

al este con el área no municipalizada de La Pedrera y al sur y oeste con el área no municipalizada de Puerto Santander.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Mirití Parana:

Figura 7 Localización del Hito 4 Mirití- Parana



Fuente: Google earth

Figura 8 Localización del Hito 4 Mirití- Parana




Fuente: Google earth

EI HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE LA VICTORIA

La Victoria es un área no municipalizada ubicada en el departamento colombiano de Amazonas. Limita al este con Pacoa, al noroeste con Solano y al sur con Mirití-Paraná. Fue fundado por Fidel Wilyhes. Este se localiza sobre el margen del rio Apaporis, su extensión es de 1443 km.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Victoria:

Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria

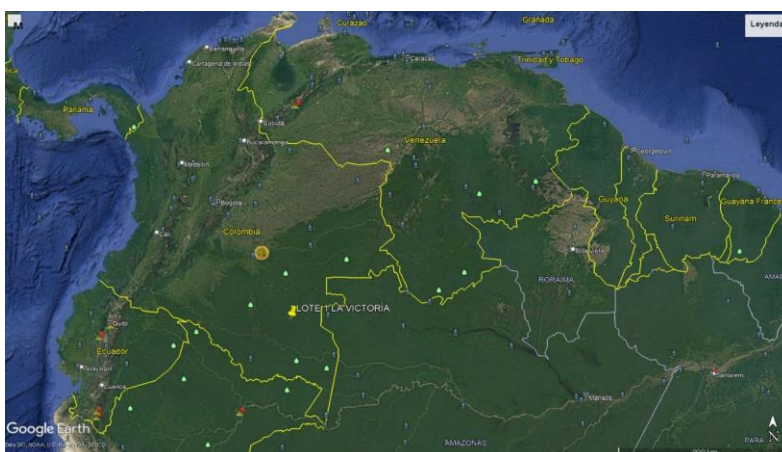

Fuente: Google earth

Figura 10 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Elaboración diagnósticos muelles fluviales a cargo del invias (Taraira, Miriti Parana, La Victoria) en los Departamentos de Vaupés y Amazonas. (INVIAS, 2023)

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

2.1.2 Lote 2 Consorcio Navegabilidad.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE.

La Guadalupe Está ubicado a los 01° 15´ 19” de latitud Norte y 66° 52´56” de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está ubicada en la margen derecha del río Negro, a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido entre los 27° y 32° y una precipitación media anual de 3.000 mm.. El Corregimiento tiene un área de 1.167 km², representando el 1,61% del total departamental. Limita por el norte con el corregimiento de San Felipe, por el oriente con la República de Venezuela y por el sur y el occidente con la República de Brasil.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Guadalupe:

Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

Figura 12 Localización del Hito 1 La Guadalupe




Fuente: Google earth

HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA.

Puerto Colombia es un área no municipalizada colombiana del departamento de Guainía, ubicada a 186 km por vía fluvial de Inírida, Limita al norte con el corregimiento departamental de Cacahual y el municipio de Puerto Inírida, al oriente con la República de Venezuela, por el sur con los corregimientos de San Felipe y Panamá Panamá y con Brasil y por el occidente con el corregimiento de Morichal y el municipio de Inírida

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Puerto Colombia:

Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.

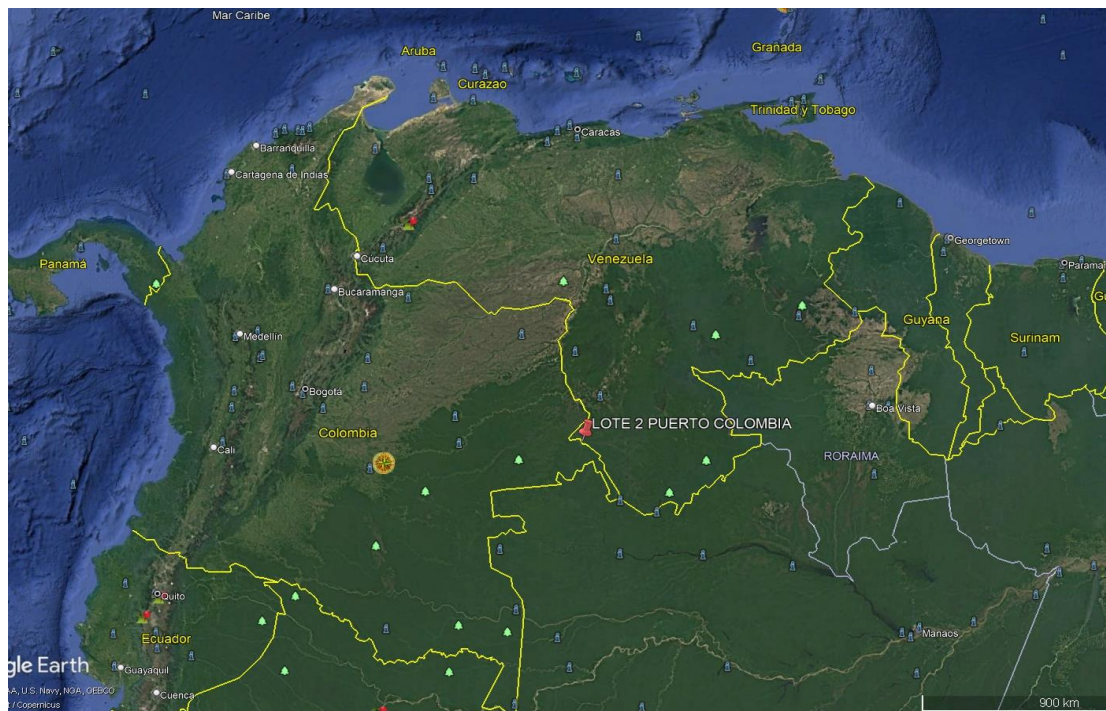

Fuente: Google earth

Figura 14 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.



Fuente: Google earth

HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CACAHUAL

Cacahual es una área no municipalizada de Colombia, situado en el departamento de Guainía, al este del país. Compuesto por los centros poblados: *Cacahual*, *Merey* y *San Juan*. Limita al oeste y norte con la capital departamental, Inírida, al sur con Puerto Colombia, y al este con Venezuela. Se encuentra a una distancia de 68 km de Inírida.

Las vías de comunicación son principalmente fluviales y aéreas. Dista de Inírida la capital departamental 186 km por vía fluvial.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Cacahual:

Figura 15 Localización del Hito 3 Cacahual.



Fuente: Google earth

Figura 16 Localización del Hito 3 Cacahual.



Fuente: Google earth

2.1.3 Lote 3 Consorcio Vía Fluvial.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA.

Mapiripana es un municipio colombiano situado en el departamento del GUAINIA a orillas del río Guaviare. Dista 116 km de San José del Guaviare al norte, 324 km de Villavicencio y 417 km de Bogotá al sur respectivamente.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Mapiripana:

Figura 17 Localización del Hito 1 Mapiripana.



Fuente: Google earth

Figura 18 Localización del Hito 1 Mapiripana.



Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL.

Es denominado también Garza Morichal y se halla ubicado a los 02° 14' 34" de latitud Norte y 70° 01'04" de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está

ubicada en el río Inírida, a una altura de 163 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido promedio de 27° y una precipitación media anual de 3.000 mm.

En la siguiente figura se presenta la localización general de Morichal:

Figura 19 Localización del Hito 2 Morichal.



Fuente: Google earth

HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PAPANAHUA.

se encuentra localizada en el corregimiento del Papanaua, en el área no municipalizada del departamento de Vaupés, colindante con el Rio Papanaua. Limita por el norte con los departamentos de Guaviare (municipio El Retorno) y Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el oriente, con el departamento de Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el sur con los municipios de Mitú y Carurú y por el occidente con el municipio de Carurú y el de Guaviare (municipio Miraflores).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Papanahua:

A satellite map of the northern Amazon region, primarily showing Colombia and Venezuela. The map is bounded by a yellow line. Key locations labeled include Bogotá, Medellín, Cali, and Guayaquil in Colombia; and Caracas, Barranquilla, Cartagena de Indias, and Cucuta in Venezuela. A yellow circle with a sun icon marks the location of 'LOTE 3 MORICHAL' in central Colombia. Other labels include 'Panamá', 'Costa Rica', 'Ecuador', 'Guayquil', 'Cuenca', 'RORAIMA', 'Bosquillo', 'Guyana', 'Venezuela', 'Curacao', 'Granada', 'Trinidad y Tobago', 'Managua', 'Nicaragua', and 'Amazonas'. A scale bar at the bottom right indicates 900 km. The map is credited to 'Google Earth' and lists data sources: NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Columbia, NSF, NOAA, and SRTM30 PLUS / Copernicus.

This aerial photograph shows the study area in the Papunahua region. The Rio Papunahua flows through the upper portion of the image. Below the river, Lot 3 Papunahua is clearly marked. The surrounding landscape is predominantly forested, with some cleared areas and structures visible near the riverbank. A scale bar indicating 200 meters and a north arrow are located in the bottom right corner. The Google Earth logo is visible in the bottom left corner.

pág. 24

2.1.4 Lote 4 Torres y Asociados SAS.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA

El municipio de Unguía se encuentra localizado en el Urabá chocoano, en la parte noroccidental de Colombia. Tiene una extensión total de 1.190 km². La principal cuenca hidrográfica es la del Golfo de Urabá, que pertenece al río Atrato, al cual confluyen los ríos Arquía, Unguía, Tigre y Tanela. Sobre el mar Caribe se destacan la playa Tarena y la bahía de Titumate. También hay ciénagas como la de Unguía, Marriaga y Hornos.

El municipio de Unguía limita al norte con Acandí y el Golfo de Urabá, al oriente con el Río Atrato, que lo separa de Turbo (Antioquia), al sur con Riosucio, y al occidente con la Comarca Emberá-Wounaan y la Provincia de Darién, (ambas en Panamá).


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Unguía:

Figura 22 Localización del Hito 1 Unguía



Fuente: Google earth

Figura 23 Localización del Hito 1 Unguía

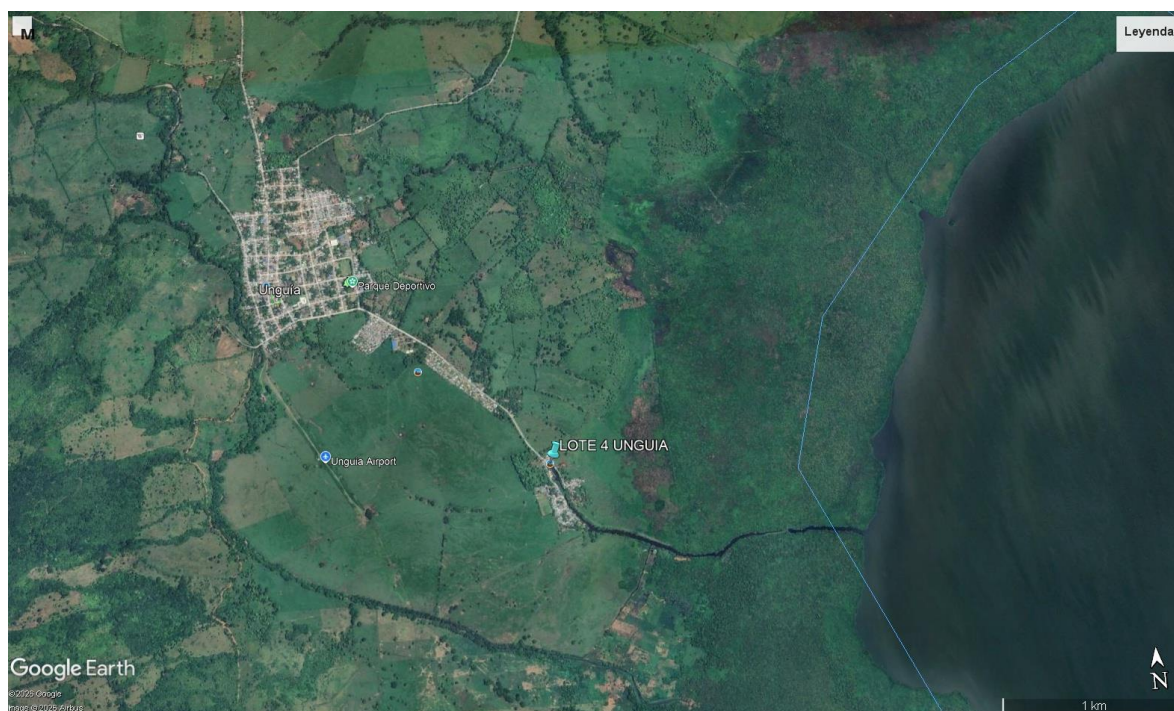

Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ.

Bajo Baudó es un municipio costero ubicado al sur del departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Su cabecera municipal es **Pizarro**. Se caracteriza por su ubicación entre la serranía del Baudó y el océano Pacífico.


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Pavasá:

Figura 24 Localización del Hito 2 Pavasá



Fuente: Google earth

Figura 25 Localización del Hito 2 Pavasá

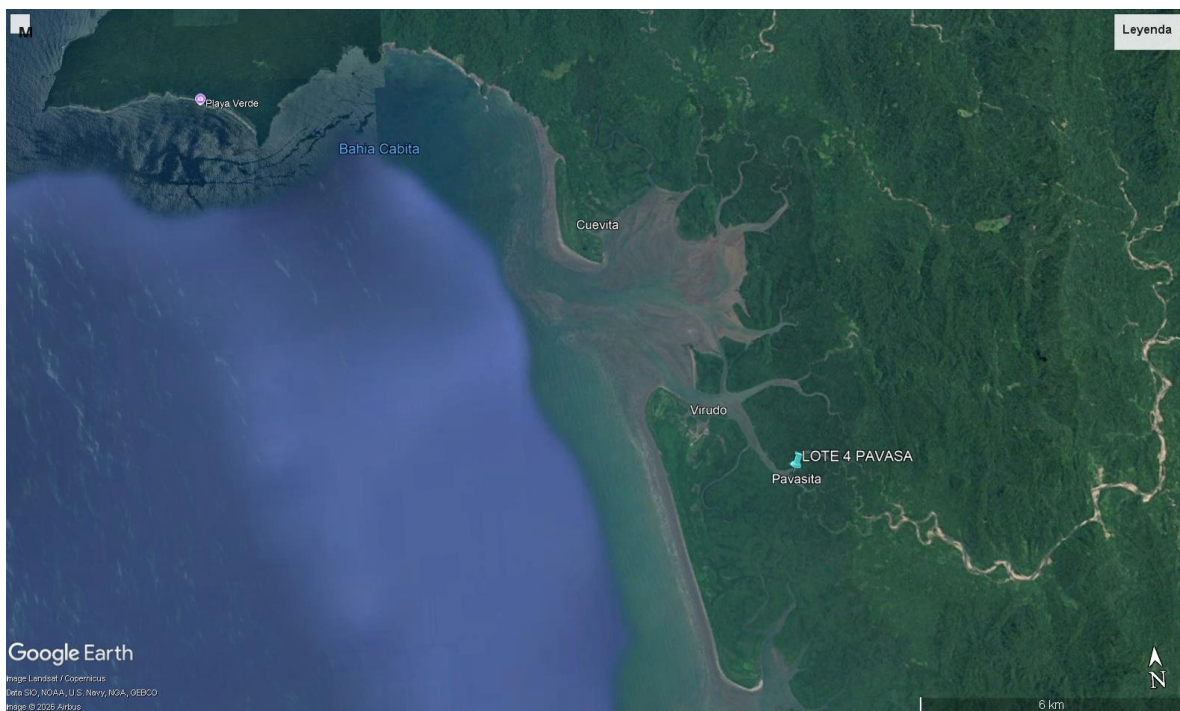

Fuente: Google earth

2.1.5 Lote 5 Consorcio MNF.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA.

El municipio de Solita está ubicado en el suroccidente del departamento del Caquetá, a una distancia de 110 km de Florencia, capital del Departamento. Se encuentra sobre la margen izquierda del río Caquetá, en límites con el departamento del Putumayo. Su temperatura promedio es de 26 °C. y cuenta aproximadamente con 6,480 habitantes, distribuidos en un 61% en el área rural y un 39% en la zona urbana; y su economía principalmente está basada en la minería de oro, agricultura (arroz, plátano, yuca, maíz), ganadería (levante y leche) y pesca.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solita:

Figura 26 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

Figura 27 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE SOLANO

La cabecera municipal se localiza aproximadamente a 150 km al sureste de Florencia, desde donde se llega por vía terrestre Florencia – La Montañita – San Antonio de Getucha, y desde allí por vía fluvial por el río Orteguaza; o vía terrestre Florencia – Valparaíso – Solita, y fluvial por el río Caquetá desde Solita hasta Solano.

El municipio de Solano limita con los siguientes territorios: Al norte con: Solita, Valparaíso, Milán, Montañita, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, los municipios de Calamar y Miraflores del Guaviare. Al este: Con el corregimiento departamental de Pacoa del Vaupés y los Corregimientos departamentales de Mirití, Paraná y la Victoria del Amazonas. Al sur: Con los corregimientos departamentales de Santander y la Chorrera, del Amazonas. Al oeste: Con los municipios de Puerto Leguizamó y Puerto Guzmán, del Putumayo. (Plan De Desarrollo 2020 – 2023. Por un Solano, Más Humano, Productivo y Sostenible y en Paz).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solano:

Figura 28 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

Figura 29 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

2.1.6 Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

El Municipio de la Tola, en el Departamento de Nariño, está ubicado a 460 km al noroccidente de Pasto. El suelo entre ondulado y plano, corresponde a la llanura del Pacífico. Tiene una población de 7.321 habitantes; una Latitud Norte 2° 24` 39", y una Longitud Oeste 78° 14` 34"; y una altitud 20 m.s.n.m; tiene una superficie de 459 kms2, con una temperatura promedio de 28°C. Limita al Norte con el Océano Pacífico; Por el Sur con el municipio de Roberto Payán; por el Oriente con el municipio de El Charco; y por el Occidente con el Municipio de Olaya Herrera


En las siguientes figuras se presenta la localización general del municipio de La Tola:

Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño



Fuente: Google earth

Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño

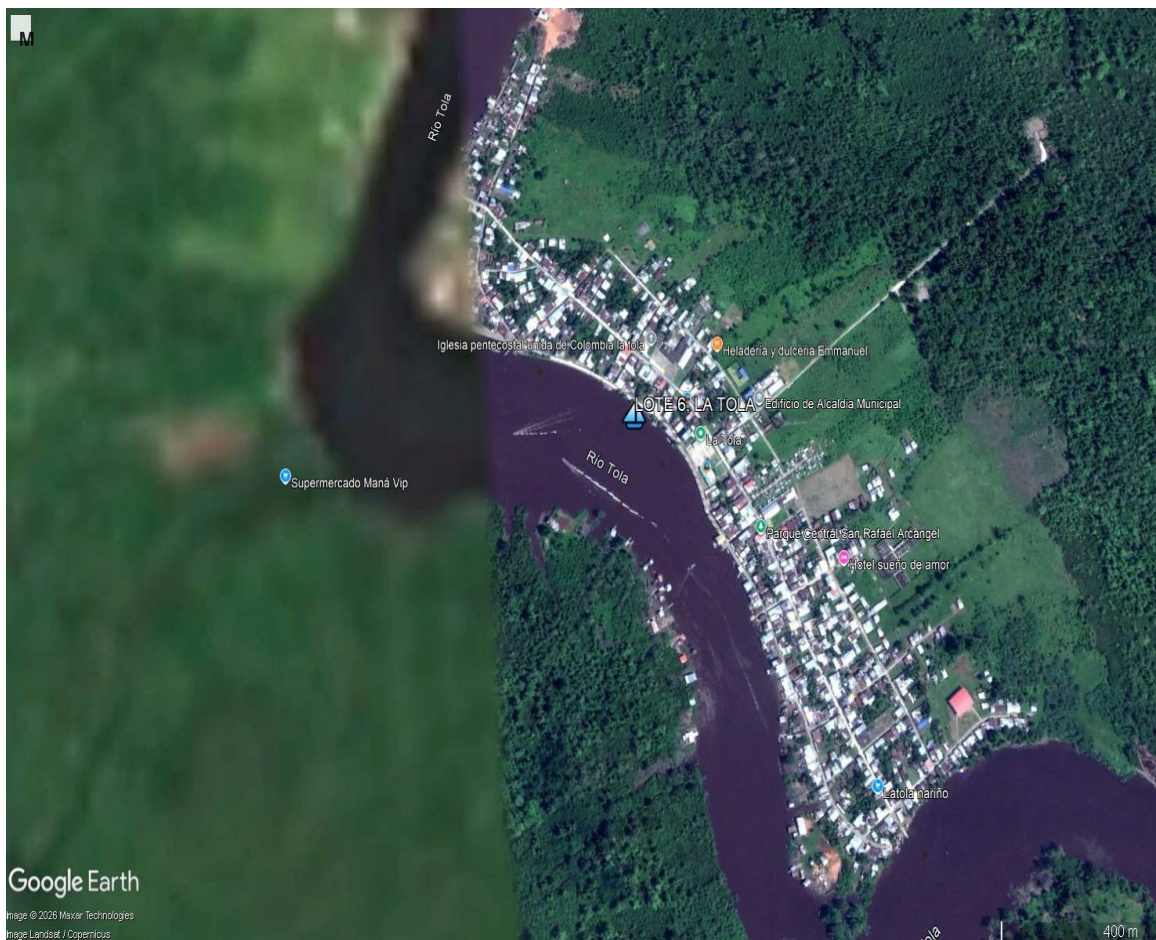

Fuente: Google earth

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Las zonas de influencia del proyecto “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6**” se presentan a continuación en la Tabla 1.

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
1	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN	Río Vaupés	Mitú	Vaupés
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA	Río Apaporis	Taraira	Vaupés
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA	Río Cananarí	Pacoa	Vaupés
		HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ	Río Miriti - Paraná	Miriti - Paraná	Amazonas
		HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA	Río Apaporis	La Victoria	Amazonas
2	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE	Río Negro	La Guadalupe	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA	Río Negro	Puerto Colombia	Guainía
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CACAHUAL	Río Atabapo	Cacahual	Guainía

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
3	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA	Río Guaviare	Mapiripana	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL	Río Inirida	Morichal	Guainía
4	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA	Quebrada Ipeti - Río Unguia	Unguía	Chocó
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ	Río Baudó	Bajo Baudó	Chocó
5	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA	Río Caquetá	Solita	Caquetá
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE SOLANO	Río Caquetá	Solano	Caquetá

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
6	Estudios y Diseños para las obras de protección del casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DENAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	Río Tola	La Tola	Nariño

Con la ejecución del proyecto, se presentan los siguientes beneficios:

- Generación de empleos directos e indirectos.
- El proyecto permitirá mejorar la conectividad de territorios en los que el transporte fluvial constituye el único medio de acceso, integrándolos con las principales vías de conexión regional y nacional. Esta intervención generará beneficios socioeconómicos al aumentar la accesibilidad y la movilidad de la población, facilitar el acceso oportuno a bienes, servicios básicos y mercados, reducir costos y tiempos de transporte, y dinamizar las economías locales. Asimismo, contribuirá a disminuir las brechas territoriales de productividad, competitividad y equidad, fortaleciendo la articulación entre las zonas rurales y los centros urbanos, en concordancia con los objetivos de desarrollo regional y cierre de brechas.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No Aplica.

2.4. Características técnicas del proyecto.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

Los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 deberán ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase II para la construcción de un terminal o muelle fluvial de pasajeros y/o carga. Estas actividades comprenden la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, geotécnica, operativa y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización del muelle y la determinación de la embarcación tipo de diseño.

Los estudios y diseños deberán incluir la definición de las áreas funcionales y de servicio, el diseño de accesos y facilidades para la accesibilidad universal, el diseño del acceso acuático y las condiciones de atraque para las embarcaciones, considerando escenarios de expansión futura. Así mismo, se deberán desarrollar los estudios y diseños de las obras civiles, la evaluación e incorporación del equipamiento requerido para la manipulación de carga conforme a la capacidad de la embarcación tipo definida, el diseño de los sistemas hidrosanitarios, redes secas, señalización, y las obras de dragado necesarias para garantizar la operatividad del muelle.

Adicionalmente, los consultores deberán evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad para la atención de emergencias en el muelle, incluyendo, entre otros, extintores, botiquines y camillas, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.

Los consultores deberán ejecutar todas las actividades adicionales requeridas por las Entidades involucradas, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase II, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables.

Las principales actividades a desarrollar por los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, y a Supervisar y hacer seguimiento por la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO
- VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO
- VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- VOLUMEN IX. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE
- VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
- VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL
- VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
- VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO
- VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO

El consultor del Lote 6 deberá ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III para la construcción de obras de protección de márgenes fluviales. Estas actividades comprenderán, entre otros aspectos, la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, hidrológica, geotécnica y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización de las obras de protección de orilla, la determinación de la embarcación tipo de diseño y la evaluación de las condiciones de navegabilidad.

Así mismo, los estudios y diseños deberán incluir el diseño de las obras civiles asociadas, las obras de dragado, la señalización fluvial y todas aquellas intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de las márgenes y la seguridad de la navegación.

Adicionalmente, el consultor deberá evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad náutica requerido para atender los requerimientos de navegabilidad, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.

El consultor seleccionado deberá adelantar todas las actividades adicionales que sean requeridas por las Entidades involucradas en el proyecto, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase III, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables, los cuales se presentarán en los volúmenes establecidos contractualmente y que son los siguientes:

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO.
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA.
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DEFINITIVA
- VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
- VOLUMEN VIII. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN IX. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.
- VOLUMEN X. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN XI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO

Todas las Actividades realmente ejecutadas por las Consultorías del estudio deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad de los Consultores del estudio y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la interventoría.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

3.1 Información General del Contrato de Consultoría

En la tabla No 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se presenta la información básica de los Contratos de Consultoría para el proyecto **Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS.**

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

3.1.1 Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1914 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Inprobrain Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$2.932.226.232,00
Anticipo	\$ 1.232.027.829,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	6 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 448.675.101,00
% Ejecutado	15.3%

Fuente: Propia

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

3.1.2 Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1915 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.934.142.682,00
Anticipo	\$ 812.664.992,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4.5 meses
Fecha actualizada de terminación	15 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 292.060.724,00
% Ejecutado	15.2%

Fuente: Propia

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

3.1.3 Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1892 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Vía Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.860.124.682,00
Anticipo	\$ 781.564.992,50
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	5 meses
Fecha actualizada de terminación	31 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 334.822.442,76
% Ejecutado	18%

Fuente: Propia

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

3.1.4 Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1882 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	19 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Torres y Asociados SAS
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.362.265.442,00
Anticipo	\$ 572.380.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	19 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 171.645.445,69
% Ejecutado	12.6%

Fuente: Propia

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

3.1.5 Lote 5. Consorcio MNF.

Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1957 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio MNF
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.277.180.442,00
Anticipo	\$ 536630.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 340.044.166,00
% Ejecutado	26.62%

Fuente: Propia

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

3.1.6 Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.

Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1968 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para las obras de protección de casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad Projesy
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$934.498.770,00
Anticipo	\$392.646.542,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 137.279.329,00
% Ejecutado	14.7%

Fuente: Propia

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes

En el período comprendido entre 01 al 30 de abril de 2026, los contratistas de consultoría ejecutaron:

3.2.1 Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Informes Administrativos y Seguimiento

Se cumplió con la entrega de los reportes periódicos de gestión y el seguimiento técnico del proyecto:

- Informes Semanales: Se radicaron los informes No. 16, 17, 18, 19 y 20, cubriendo la gestión desde el 27 de marzo hasta el 30 de abril.
- Informe Mensual: Se entregó el informe mensual No. 4 correspondiente al mes de marzo.
- Comités de Seguimiento: Se llevaron a cabo cuatro comités (6, 13, 20 y 27 de abril) para verificar el cumplimiento de productos, cronogramas y temas financieros.
- Actas de Costos: Se presentó el Acta de costos No. 4 y sus respectivas subsanaciones tras las observaciones recibidas.

Componente Técnico y de Ingeniería

Se avanzó significativamente en la entrega de productos de diagnóstico y estudios básicos:

- Volumen I (Identificación y Diagnóstico): Se remitieron o subsanaron los estudios de identificación de necesidades y diagnóstico de los muelles de Buenos Aires, Pucaron, Taraira, Miriti-Paraná y La Victoria.
- Trabajos de Campo: El 8 de abril se notificó el inicio de la exploración geotécnica en campo, partiendo desde San José del Guaviare hacia Pucarón.
- Geología y Geomorfología: Se entregaron informes de avance para los muelles de Pucaron, Taraira, Pacoa y La Victoria.
- Estudios Topográficos y Batimétricos: Se radicaron los estudios cartográficos, topográficos y batimétricos para los muelles de Pucaron, Taraira, Buenos Aires, Miriti-Paraná y La Victoria.
- Estudios de Transporte: Se presentaron los estudios de transporte de carga/pasajeros y caracterización de embarcación tipo para todos los muelles del Lote 1.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- Otros: Se remitió la matriz multicriterio para la selección de alternativas en el muelle de Pucarón.

Gestión Ambiental, Social y Predial

Este componente tuvo una intensa actividad jurídica y de planificación:

- Consultas y Derechos de Petición: Se elevaron consultas al Ministerio de Ambiente sobre la Reserva Forestal Ley 2ª de 1959 y el uso de material de arrastre. Asimismo, se reiteraron solicitudes al Ministerio del Interior sobre la procedencia de Consulta Previa para los muelles de Taraira, Pucarón, La Victoria y Miriti-Paraná.
- Arqueología: Se solicitó concepto técnico sobre la necesidad de programas de arqueología preventiva.
- Sostenibilidad y SIG: Se entregó la metodología del programa de sostenibilidad y el informe de incorporación de información predial en el Sistema de Información Geográfica (SIG).

Gestión Financiera

Se gestionaron los recursos necesarios para la ejecución del contrato:

- Desembolsos: Se radicaron las solicitudes de desembolso No. 1 y No. 2 del anticipo, junto con sus soportes y el Plan de Inversión actualizado.
- Rendimientos: Se solicitó al INVIAS el instructivo para el pago de rendimientos financieros del anticipo.

Gestión de Personal

- Se tramitó y solicitó el cambio de hoja de vida para el cargo de Profesional Naval del Lote 1

3.2.2 Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Avances en Ingeniería y Diseño (Volúmenes Técnicos)

El consultor avanzó significativamente en la estructuración de los productos técnicos del proyecto:

- Desarrollo de Volúmenes: Se trabajó en los Volúmenes II, III, IV, V y VII. Específicamente, se avanzó en la definición de esquemas de alternativas de diseño para los muelles, los cuales están sujetos a la validación de los informes geotécnicos.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- Sectores específicos: Se continuó con el desarrollo del Volumen V en los sectores de Puerto Colombia y La Guadalupe, y se avanzó en la elaboración del Volumen VII sobre el estudio de alternativas para los tres sectores del proyecto.
- Matriz Multicriterio: Se trabajó en la estructuración del esquema preliminar de la matriz multicriterio para la infraestructura fluvial.
- Entregas: Se remitieron versiones preliminares del Volumen V (Hito III) y del Volumen II (Hitos I, II y actualización del Hito III).

Trabajo de Campo y Geotecnia

- Finalización de labores: Se ha completado la totalidad de los trabajos de campo referentes a topografía, batimetría, aforos líquidos y sólidos, reconocimiento geológico y exploración geotécnica.
- Laboratorio: Las muestras obtenidas de la exploración geotécnica (realizada entre el 17 de marzo y el 2 de abril en La Guadalupe, Puerto Colombia y Cacahual) fueron trasladadas a laboratorio durante abril para la ejecución de los ensayos respectivos.
- Construcción de informes: Se inició la construcción de los Volúmenes III (geología) y IV (geotecnia) en concordancia con los resultados de laboratorio que están en proceso de finalización.

Gestión Ambiental y Social

- Componente Ambiental: Se evidencia un avance del 20% en este rubro. El consultor presentó el cronograma ambiental y los primeros avances del Plan de Adaptación y Gestión Ambiental (PAGA) para los Hitos I, II y III.
- Socialización: Entre el 3 y 5 de marzo, se realizó la socialización inicial y ejercicios de cartografía social con las comunidades de La Guadalupe, Puerto Colombia y Cacahual.

Gestión Contractual y Administrativa

- Comités de Seguimiento: El consultor participó en los Comités No. 10, 11, 12 y 13 junto a INVIAS y la Interventoría, donde se revisaron los avances y el cronograma ambiental.
- Trámites contractuales: Se presentó formalmente la solicitud de prórroga No. 2 del contrato, justificada por los retrasos en las actividades de campo y la exploración geotécnica. Además, se tramitó la solicitud del primer giro del anticipo.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- Informes de seguimiento: Se entregaron los informes semanales de gestión, abarcando desde el reporte No. 16 hasta el No. 20, cubriendo todo el mes de abril

3.2.3 Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica

Durante el mes de abril, se avanzó significativamente en la entrega de productos técnicos y la ejecución de trabajos de campo:

- Estudios de Hidrología, Hidráulica y Dinámica Fluvial (Volumen V): Se finalizó y entregó el documento para el Hito II (Morichal) el 10 de abril (con otra mención el 14 de abril). Asimismo, el informe para el Hito III (Papunahua) se completó y entregó el 24 de abril. Se trabaja actualmente en las observaciones del Hito I (Mapiripana).
- Investigación de Campo (Sismicidad y Geotecnia): Se realizaron líneas sísmicas en Papunahua y Morichal entre el 7 y el 9 de abril. Los resultados están en proceso de elaboración para generar los informes finales. El Volumen de Geotecnia presenta avances en el Hito I, pero su versión final depende de estos resultados sísmicos.
- Transporte y Embarcación Tipo (Volumen VI): Se realizaron las entregas para los tres hitos: Mapiripana, Morichal (10 de abril) y Papunahua (11 de abril).
- Estudio de Alternativas (Volumen VII): El documento que contempla la selección de alternativas para los tres hitos fue entregado a la interventoría el 14 de abril.
- Actualización de Diagnóstico y Cartografía: Se entregó la actualización del Volumen I (Identificación de necesidades) el 10 de abril y del Volumen II (Cartografía y Topografía) el 14 de abril para todos los hitos. El 29 de abril se recibieron nuevas observaciones de topografía y batimetría que están siendo atendidas.
- Geología y Geomorfología (Volumen III): El 24 de abril se remitieron las respuestas a las observaciones de los tres hitos, incluyendo los informes ajustados.
- Gestión Predial (Volumen XI): Aunque no se han identificado áreas que requieran adquisición predial inmediata según las alternativas actuales, se

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

entregaron los informes de gestión para Mapiripana (21 de abril) y para Morichal y Papunahua (22 de abril).

- Diseños Arquitectónicos: Se iniciaron labores para los muelles de Mapiripana y Morichal, a la espera de la aprobación oficial de las alternativas para evitar reprocesos.

Área Ambiental, Social y Sostenibilidad

Las actividades se centraron en el cumplimiento normativo y la estructuración de planes de manejo:

- Trámites ante Autoridades: Se dio respuesta a requerimientos de la interventoría y se realizaron reiteraciones de trámites ante la CDA y el Ministerio de Ambiente sobre la ubicación de muelles en reserva forestal.
- Elaboración de PAGAS: Se continúa con la elaboración de los Planes de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). El 24 de abril, tras una mesa de trabajo con INVIAS, se ajustaron los documentos correspondientes a los tres hitos.
- Gestión Social: El 30 de abril se llevó a cabo una mesa de trabajo con la interventoría para socializar observaciones a los documentos de línea base social, las cuales serán atendidas por el consultor.
- Componente Ambiental: Se entregaron los informes de avance del Volumen X (Gestión Ambiental y Social) para Mapiripana el 21 de abril, y para Morichal y Papunahua el 22 de abril. También se recibió el mapa de amenazas por inundación de Papunahua para su integración en el PAGA.

3.2.4 Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Durante el período, el Consultor ejecutó las siguientes actividades

Actividades por Componente Técnico

Componente Geotécnico:

- Sector Pavasá: Se dio continuidad a la exploración del suelo mediante perforaciones, sondeos y apiques para obtener muestras representativas. A pesar de retrasos iniciales por condiciones de orden público en la movilización de maquinaria desde Quibdó y afectaciones climáticas, se logró retomar el ritmo de trabajo.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- Sector Unguía: Se enfocó en el análisis e interpretación de resultados de laboratorio (humedad, granulometría, límites de consistencia, compresión, entre otros) para definir las propiedades mecánicas del suelo.
- Entregables: Se avanzó en la estructuración y entrega del Volumen IV – Estudio de geotecnia.

Componente Topográfico y Batimétrico:

- Se consolidaron los levantamientos realizados en Unguía y Pavasá, generando modelos digitales del terreno y del fondo del canal navegable.
- Se realizó la entrega del Volumen II – Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico.

Componente Hidráulico e Hidrológico:

- Se integró la información topobatimétrica con el análisis de niveles hidráulicos y dinámica fluvial.
- Se realizó la entrega del Volumen V – Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial (particularmente para el hito Unguía) y el estudio hidráulico para el hito II.

Componente de Transporte Fluvial:

- Se entregó el Volumen VI – Estudio de transporte de pasajeros y/o carga, definiendo los criterios funcionales para la operación y capacidad del muelle.

Gestión Social, Ambiental y Sostenibilidad

- Se avanzó en la estructuración de la línea base ambiental y social para el Volumen X.
- Se realizaron jornadas de socialización presenciales y virtuales en los municipios de Unguía y Pavasá para presentar avances y recopilar observaciones de la comunidad.

Gestión Técnica y Documental

- Se atendieron los requerimientos y observaciones de la interventoría, realizando ajustes para garantizar la calidad y coherencia de los documentos según los lineamientos de INVIAS.
- Se elaboraron y enviaron los informes semanales No. 16 al 19, cubriendo todo el mes de abril.

Entregables Destacados del Mes

Se completó la entrega de los siguientes volúmenes técnicos:

- Volumen I: Diagnóstico de necesidades.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- Volumen II: Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico.
- Volumen III: Estudio de geología y geomorfología.
- Volumen IV: Estudio de geotecnia.
- Volumen V: Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial.
- Volumen VI: Estudio de transporte de pasajeros y/o carga.
- Componentes del Volumen X: Gestión ambiental, social y sostenibilidad.

3.2.5 Lote 5. Consorcio MNF.

Durante el período, el Consultor ejecutó las siguientes actividades

Actividades Técnicas y de Oficina

Tras la finalización de las campañas de campo en marzo de 2026, el consultor se enfocó en el procesamiento, validación e integración de la información recolectada. Las labores principales incluyeron:

- Geotecnia: Análisis de perforaciones exploratorias, revisión de resultados de laboratorio y consolidación de perfiles estratigráficos y parámetros de diseño.
- Batimetría y Aerofotogrametría: Procesamiento de datos para la generación de modelos digitales, análisis topográficos y caracterización geomorfológica de las zonas de intervención.
- Estructuración de Documentos: Avance en la consolidación de los volúmenes técnicos del proyecto siguiendo los lineamientos de la Interventoría y el contrato.

Coordinación y Seguimiento

El consultor mantuvo una articulación constante entre las diferentes disciplinas (técnica, ambiental, social y predial) mediante reuniones internas para integrar la información de campo. Además, participó activamente en los Comités de Seguimiento Técnico con Inviás y la Interventoría en las siguientes fechas:

- Comité No. 10: 7 de abril de 2026.
- Comité No. 11: 14 de abril de 2026.
- Comité No. 12: 21 de abril de 2026.

Componente Social

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

Se adelantaron gestiones administrativas y metodológicas clave, entre las que destacan:

- Remisión del oficio No. CINP–573 043-0437, que contiene la propuesta metodológica de socialización, modelos de invitación, canales de difusión digital y la base de datos de actores institucionales y comunitarios.
- Atención y ajuste de las observaciones realizadas por la Interventoría a las presentaciones institucionales del proyecto.

Componente Ambiental

Durante el mes de abril de 2026, las actividades se centraron en:

- Consolidación y análisis de la información de monitoreo recopilada en campo.
- Entrega a la Interventoría de los informes de avance del Volumen X (Gestión ambiental, social y sostenibilidad) para los Hitos I y II, con el fin de avanzar hacia la entrega final de estos productos

3.2.6 Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Durante el mes de abril de 2026, las actividades se centraron en:

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

No aplica

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A continuación, se presenta el informe detallado del estado de avance y las acciones de la interventoría

Seguimiento Técnico y de Ingeniería

La Interventoría tiene la responsabilidad primordial de validar la información técnica recolectada en campo y asegurar que los diseños se ajusten a la realidad del terreno:

- Validación de Geotecnia y Diseños: Para el Lote 2, la Interventoría debe validar los informes geotécnicos para poder aprobar los esquemas de alternativas de diseño de los muelles. En el Lote 3, es crucial revisar los

resultados de las líneas sísmicas en Papunahua y Morichal para finalizar el volumen de geotecnia.

- **Revisión de Alternativas:** Se debe dar aprobación oficial a las alternativas del Lote 3 (Volumen VII) para permitir que los diseños arquitectónicos avancen sin riesgo de reprocesos. En el Lote 1, se debe supervisar la selección de alternativas para el muelle de Pucarón mediante la matriz multicriterio entregada.
- **Control de Calidad de Entregables:** La Interventoría debe continuar con la revisión y subsanación de observaciones en múltiples productos:
 - Lote 1: Estudios de identificación y diagnóstico de muelles como Buenos Aires y La Victoria.
 - Lote 3: Atender y verificar la corrección de las observaciones de topografía y batimetría recibidas a finales de abril.
 - Lote 4: Garantizar la coherencia de los seis volúmenes técnicos entregados (I al VI) frente a los lineamientos de INVIAS.
- **Supervisión de Trabajos de Campo:** En el Lote 1, se debe realizar el seguimiento a la exploración geotécnica iniciada desde San José del Guaviare hacia Pucarón. Para el Lote 4, es vital monitorear el ritmo de las perforaciones en Pavasá, que han sufrido retrasos por orden público y clima.

Gestión Ambiental, Social y Predial

La Interventoría actúa como puente y supervisor del cumplimiento normativo y comunitario:

- **Trámites ante Autoridades:** Debe hacer seguimiento riguroso a las consultas elevadas al Ministerio de Ambiente sobre la Reserva Forestal Ley 2ª de 1959 y al Ministerio del Interior sobre la Consulta Previa (Lotes 1 y 3).
- **Aprobación de Planes (PAGA):** Se requiere la revisión y ajuste final de los Planes de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) en los Lotes 2 y 3.
- **Gestión Social:** En el Lote 5, la Interventoría debe validar la propuesta metodológica de socialización y las bases de datos de actores institucionales. En el Lote 3, debe supervisar que el consultor atienda las observaciones realizadas a los documentos de línea base social.

Gestión Administrativa y Financiera

Acciones necesarias para garantizar la viabilidad operativa de los contratos:

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

- Evaluación de Prórrogas: La Interventoría debe analizar y emitir concepto sobre la solicitud de prórroga No. 2 del Lote 2, justificada por retrasos en actividades de campo.
- Control de Pagos y Anticipos:
 - Tramitar la solicitud del primer giro del anticipo para el Lote 2.
 - Gestionar con INVIAS el instructivo para el pago de rendimientos financieros del anticipo en el Lote 1.
- Gestión de Personal: Finalizar el trámite de cambio de hoja de vida para el Profesional Naval del Lote 1.

Coordinación y Comités

- Se debe mantener la periodicidad de los Comités de Seguimiento (como los realizados los abriles 6, 13, 20 y 27) para verificar el cumplimiento de cronogramas y temas financieros de manera transversal a todos los lotes.
- Para el Lote 5, tras finalizar el trabajo de campo, la Interventoría debe supervisar la integración de todas las disciplinas (técnica, ambiental y social) en los volúmenes finales

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. Informes Semanales

A continuación, se relacionan los informes semanales recibidos de los consultores, correspondientes al período comprendido del 1 al 30 de abril de 2026:

Los informes por Lotes se adjuntan en Anexo.

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Tabla 8 listado informes semanales, periodo abril. Lote 1.

No. SEMANA		PERIODO	
16	27	Marzo / Abril	2
17	3	Abril / Abril	9
18	10	Abril / Abril	16
19	17	Abril / Abril	23
20	24	Abril / Abril	30

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Tabla 9 listado informes semanales, periodo abril. Lote 2.

No. SEMANA		PERIODO	
16	27	Marzo / Abril	2
17	3	Abril / Abril	9
18	10	Abril / Abril	16
19	17	Abril / Abril	23
20	24	Abril / Abril	30

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Tabla 10 listado informes semanales, periodo abril. Lote 3.

No. SEMANA		PERIODO	
16	27	Marzo / Abril	2
17	3	Abril / Abril	9
18	10	Abril / Abril	16
19	17	Abril / Abril	23
20	24	Abril / Abril	30

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Tabla 11 listado informes semanales, periodo abril. Lote 4.

No. SEMANA	PERIODO		
15	27	Marzo / Abril	2
16	3	Abril / Abril	9
17	10	Abril / Abril	16
18	17	Abril / Abril	23
19	24	Abril / Abril	30

Lote 5. Consorcio MNF.

Tabla 12 listado informes semanales, periodo abril. Lote 5.

No. SEMANA	PERIODO		
15	26	Marzo / Abril	1
16	2	Abril / Abril	8
17	9	Abril / Abril	15
18	16	Abril / Abril	22
19	23	Abril / Abril	30

Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Tabla 13 listado informes semanales, periodo abril. Lote 6.

No. SEMANA	PERIODO		
16	27	Marzo / Abril	2
17	3	Abril / Abril	9
18	10	Abril / Abril	16
19	17	Abril / Abril	23
20	24	Abril / Abril	30

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría.
LOTE 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA:																																																																																																																																																																																																																																																					
	FECHA: 05/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																							
	UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura	DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cagueta																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																								
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-26		PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAGUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 5.																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATO No. 1957 DE 2025		CONTRATISTA: CONSORCIO MNF																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025		INTERVENTORÍA: CONCEP S.A.S.																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPO</th> <th colspan="31">DÍAS DEL MES</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA / MODELO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>LOCALIZACIÓN</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.A</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL ACTIVO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL EN REPARACIÓN</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL INACTIVO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	N.A	N.A	N.A	N.A																																TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																			TOTAL ACTIVO																																			TOTAL EN REPARACIÓN																																			TOTAL INACTIVO																																		
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																																																																																																																																																																																																																																				
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																						
N.A	N.A	N.A	N.A																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL EN REPARACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL INACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMEN PERIODO / MES</th> <th>No.</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																																																																																																																																																																																																																								
RESUMEN PERIODO / MES	No.	%																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																																																																																																																																																																																																																																								
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I																																																																																																																																																																																																																																																								
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "inactivo" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Durante el periodo de reporte no se contó con maquinaria en el área de estudio debido a que ya se culminaron los trabajos de campo.																																																																																																																																																																																																																																																								
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																																																																																																																																																																																																																																								
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																																																																																																																																																																																																																																								
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																																																																																																																																																																																																																																								
Firma:  Nombre: CARLOS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ Residente de Consultoría Matrícula Profesional No.: 08202091678 ATL		Firma: _____ Nombre: _____ Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____																																																																																																																																																																																																																																																						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																																																																								

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría.

A continuación, se muestra el personal presentado por la Consultoría y aprobado por la Interventoría para ejecutar cada uno de los proyectos:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 1.**”

Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 1

CONSULTORÍA LOTE 1 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL CONTRATO 1914 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA	X		9/3/2026	APROBADO II-871-L1-032-2025 [09-03-26]
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025 [02-12-25]
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 1	RICARDO ANDRÉS BLANCO CASTAÑEDA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
4	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 2	LEONARDO PACHECO NIÑO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
5	INGENIERO AUXILIAR 1	LINA DANIELA GUTIERREZ TIBADUIZA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
6	INGENIERO AUXILIAR 2	CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
7	INGENIERO AUXILIAR 3	ANDRES FELIPE PRIETO LÓPEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
8	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	RICARDO BOLIVAR TIBOCHA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
9	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	PAOLA ANDREA LLANES VEGA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
10	GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
11	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	WILLIAM ALFONSO CAÑAS PRATO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
12	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
13	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
14	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JORGE ANDRES ROA ROMERO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
15	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
16	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
17	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
18	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
19	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
20	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	DANIEL CAMILO SÁNCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
21	PROFESIONAL SOCIAL 1	GEORGINA ELIZABETH QUINTANA GONZALEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
22	PROFESIONAL SOCIAL 2	CLAUDIA PATRICIA GALINDO SUAREZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
23	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	MARIA DEL PILAR CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
24	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	DANIEL CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
25	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	NELSON JAVIER MORALES MELO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
26	PROFESIONAL SIG	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
27	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ BERNAL	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
28	PROFESIONAL NAVAL	EDWIN GIOVANNY PAIPA SANABRIA	X		22/4/2026	OFICIO CON APROBACION II-871-L1-041-2026
29	DIBUJANTE 1	WILLIAM NICOLAS PRIETO SANCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
30	DIBUJANTE 2	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
31	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 2.**

Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 2.

CONSULTORÍA LOTE 2 CONSORCIO NAVEGABILIDAD - CONTRATO 1915 DE 2025					
PERSONAL CLAVE					
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO	
1	DIRECTOR CONSULTORIA	CARLOS ORAMAS	X		APROBADO OFICIO L2-051-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ALLEN BATEMAN	X		APROBADO OFICIO L2-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE					
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO	
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CAROLINA ISABEL GARZON BUITRAGO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
4	INGENIERO AUXILIAR 1	DIEGO ALEJANDRO GARCÍA ARIZALA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
5	INGENIERO AUXILIAR 2	LINA GARCES RAVELO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-025-2025 CAMBIO
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FRANCISCO DE PAULA PEREZ AMAYA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	URIEL GUERRERO FARFÁN	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
8	GEOLOGO	JOSE HEYLEY VERGARA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	DORIS XIOMARA CASTAÑEDA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALEXANDER GÓMEZ CASSAB	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	YOHOLIMA MARTINEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	YOLIMA MARTINEZ GUERRERO	x		OFICIO APROBACIÓN II-87-L2-008-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	ASTRID BLANCO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	WALTER GIL	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	OLGA TORRES CAMARGO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	PABLO GARCIA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	FELISA ARIZALA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	LUZ ESTELLA GUTIERREZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	NATALIA ARCILA CORTES	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIANA CATALINA BLANCO FIGUEROA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-006-2026
24	PROFESIONAL SIG	JOHNATAN CRHISTIAN PAZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	PAOLA GALINDO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
26	PROFESIONAL NAVAL	CARLOS ORAMAS	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
27	DIBUJANTE 1	MICHAEL ANDRÉS TELLO ENCISO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
28	DIBUJANTE2	JENY VANESSA FANDIÑO SARMIENTO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 3.**

Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 3.

CONSULTORÍA LOTE 3 CONSORCIO VIA FLUVIAL CONTRATO 1892 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO	X		09-04-26	OFICIO APROBACION II-871-L3-055-2026
4	INGENIERO AUXILIAR 1	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
5	INGENIERO AUXILIAR 2	PABLO ENRIQUE SEGURA ACEVEDO	X		09-04-26	OFICIO APROBACION II-871-L3-056-2026
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR SANCHEZ	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO	DAVID RENGIFO SAAVEDRA	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
8	GEOLOGO	VICTOR ERNESTO SEDIEL	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JUAN MANUEL CEPEDA SUAREZ	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS GERMAN BULLA CAICEDO	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	PRISCILA RAMOS OCAMPO	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	ALEXANDRA BERNAL SANCHEZ	X			OFICIO CON OBSERVACIONES II-871-L3-008-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	DANIELA BRICEÑO QUINTERO	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALEXANDER BARON AVILA	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	SANDRA MILENA ALVAREZ ABRIL	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	MELANY LISETH BUSTOS RUIZ	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CARLOS ARLEY PORTILLA OSORIO	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
24	PROFESIONAL SIG	JAIRO ROJAS LEAL	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
26	PROFESIONAL NAVAL	HECTOR ALFONSO ESCOBAR ACOSTA	X			OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
27	DIBUJANTE 1	DORIAN ZUSETTE SANTANA GOM	X		09-04-26	OFICIO APROBACION II-871-L3-056-2026
28	DIBUJANTE2	LAURA CATALINA RODRIGUEZ MC	X		09/04/26	OFICIO APROBACION II-871-L3-056-2027

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 4.**

Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 4.

CONSULTORÍA LOTE 4 TORRES Y ASOCIADOS SAS - CONTRATO 1882 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	X		4/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	X		9/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	MARLON MOGOLLO ROMERO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	CLAUDIA MARCELA FORERO CASTRO	X		9/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-008-2026
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	LORENA PRASCA RAMIREZ	X		27/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-014-2026
7	GEÓLOGO	DIANA CAROLINA CHAPARRO PIRAJON	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	YEIMI GARCIA MORENO	X		10/2/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	CARLOS MAURICIO FONSECA GAMBA	X		10/2/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-025-2026
10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JAIME ECHEVERRIA RODRIGUEZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	NESTOR CAMILO SIERRA RODRIGUEZ	X		9/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-008-2026
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JULIANA HERRERA MACIAS	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ	X		16/2/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-028-2026
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FRANCY DANIELA DUARTE	X		10/2/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-025-2026
16	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
17	PROFESIONAL SOCIAL	EDNA RUTH GARZON ROJAS	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JUAN SEBASTIAN PALMA MORENO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	LAURA MAHECHA BUITRAGO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-020-2026
21	PROFESIONAL SIG	IBETH MURCIA PEÑA	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
22	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-020-2026
23	PROFESIONAL NAVAL	EDUARDO CUBAQUE BERNAL	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-020-2026
24	DIBUJANTE	SEBASTIAN HERNANDEZ CHAVEZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 5.**

Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 5.

CONSULTORÍA LOTE 5 CONSORCIO MNF CONTRATO 1957 DE 2025					
PERSONAL CLAVE					
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	DIRECTOR CONSULTORIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-003-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE					
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CARLOS ANDRES MARTINEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
4	INGENIERO AUXILIAR	LARRY GONZALEZ BARRERA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-005-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	JORGE IGNACIO VELEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	MARCELO BEDOYA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
7	GEOLOGO	MARIO ALBERTO VARGAS	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-008-2025
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	EDWIN DOMIGUEZ MORENO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-009-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE MANUEL ALVAREZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-008-2025
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-008-2025
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MARIA EULALIA ARTETA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-008-2025
16	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALBA LINARES TAFUR	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
17	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-008-2025
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	SANDRA MURILLO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CATALINA MOLINA LOZAN	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-008-2025
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	BRIAN RIOS BORRAEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
21	PROFESIONAL SIG	LISMAR ROSSANA MALDONADO MEDINA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
22	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	MARCO MONTENEGRO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
23	PROFESIONAL NAVAL	ORLANDO CASTAÑEDA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-006-2025
24	DIBUJANTE 1	MARIO MONTENEGRO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L5-008-2025

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 6.**

Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 6.

CONSULTORÍA LOTE 6 CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO 1968 DE 2025								
PERSONAL CLAVE								
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS	OFICIOS APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO				
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	X			MAIL (MAIL 28-11-25) / OFICIO L6-001-2025 (28-11-25)	I-871-L6-002-2025	OFICIO APROBACIÓN I-871-L6-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS LEONARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	X			MAIL (MAIL 28-11-25) / OFICIO L6-001-2025 (28-11-25)	I-871-L6-002-2025	OFICIO APROBACIÓN I-871-L6-002-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE								
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS	OFICIOS APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO				
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CARLOS ARTURO BORJAS	X		13-03-26			APROBADO OFICIO I-871-L6-036-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	LAURA KATHERINE AGUILAR PULIDO	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-0011-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GERMAN FELIPE MEDIAN RUBIO	X					OFICIO APROBACIÓN I-871-L6-014-2026
6	GEÓLOGO	LUIS EDUARDO SANTAMARIA MONTOYA	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-008-2026
7	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-006-2025
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JENNY MAGALY RUIZ PIRA	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-008-2026
9	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA	X					OFICIO CON OBSERVACIONES I-871-L6-002-2026
10	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JESUS ALBERTO LUENGAS BERNAL	X					OFICIO APROBACIÓN I-871-L6-009-2026
11	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	HIBET LASSO TRIGOS	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-008-2026
12	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-006-2025
13	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-008-2026
14	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE BETANCOURTH	X					OFICIO CON OBSERVACIONES OFICIO I-871-L6-008-2026
15	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	DIEGO ANDRÉS ROJAS MONTERO	X					OFICIO CON OBSERVACIONES I-871-L6-002-2026
16	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CAROL JEIMY TORRES AFRICANO	X					OFICIO APROBACIÓN I-871-L6-009-2026
17	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIEGO FERNANDO SEQUEDA	X					OFICIO APROBACIÓN I-871-L6-018-2026
18	PROFESIONAL SIG	MAURICIO MENDOZA CUBILLOS	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-006-2025
19	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	CARLOS HERNANDO RIOS FERRERIRA	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-008-2026
20	DIBUJANTE	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	X					APROBADO OFICIO I-871-L6-008-2026

 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME MENSUAL No 5	

A continuación, se presentan el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA, correspondientes al presente periodo.

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Figura 35 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL- CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																												
			VERSIÓN 1																																												
			PÁGINA																																												
			FECHA 11/02/2025 (Día/Mes/Año)																																												
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NIA																																												
CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1914 DE 2025																																															
CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026																																															
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1922 DE 2025																																															
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																																															
NOMBRE ARL: SURA																																															
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR																																															
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ENRIQUE	19146793	DIRECTOR	\$ 5.385.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800.032.486	1	S	Sanitas	1081132190	\$ 332.000	N/A	\$ 332.000					
2	RICARDO ANDRÉS BLANCO	1049613897	RESIDENTE 1	\$ 6.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900.779.202-1	1	S	Nueva EPS	78788042	\$ 248.000	Porvenir	78788042	\$ 984.000	\$ 248.000			
3	LEONARDO PACHECO	1093601847	RESIDENTE 2	\$ 6.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	902.908.592-2	1	S	Sanitas	78778118	\$ 248.000	Corbidos	78273118	\$ 984.000	\$ 248.000			
4	LINA DANIELA GUTIERREZ	1007731365	AUXILIAR 1	\$ 4.090.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900.779.202-1	1	S	Salud Total	78788042	\$ 163.600	Proteccion	78788042	\$ 654.400	\$ 163.600			
5	CRISTIAN JAVIER	1049645409	AUXILIAR 2	\$ 4.090.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900.779.202-1	1	S	Sanitas	78788042	\$ 163.600	Porvenir	78788042	\$ 654.400	\$ 163.600			
6	ANDRÉS FELIPE PRIETO	1049645409	AUXILIAR 3	\$ 4.090.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900.779.202-1	1	S	EPS Sura	78788042	\$ 163.600	Porvenir	78788042	\$ 654.400	\$ 163.600			
7	MARIA ANGELICA PICON	1002329102	DEBUIANTE 1	\$ 2.630.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900.779.202-1	1	S	Famisanar EPS	78781911	\$ 108.600	Porvenir	78781911	\$ 432.200	\$ 108.600			
8																																															
9																																															
10																																															
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																															
El contratista adjunta la certificación de fecha 10/02/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.																																															
NOTAS:																																															
1. Es responsabilidad de la Interventoria verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumple con la dedicación contractual.																																															
2. Es responsabilidad de la Interventoria relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".																																															
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adoptará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																															
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.																																															
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.																																															
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.																																															
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoria la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.																																															
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																															
 Nombre CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA Director de Consultoría Matrícula Profesional No.: 25000-14687 CND				 Nombre RICARDO JOSE COGOLLO Director de Interventoria Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL																																											
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																															



Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Figura 37 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 3.

pág. 68

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figure 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 4.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA															CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-TR-6																														
		VERSIÓN 1																																													
		PÁGINA 1																																													
FECHA 30/04/2026 (Día / Mes / Año)																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1882-2025 CONSULTOR: TORRES Y ASOCIADOS SAS																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4.																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																																															
NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR																																															
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES		Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Descuento en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla		Valor Cotizado Pensión
1	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DOCNCEL	19.068.998	DIRECTOR DE CONSULTORIA	\$ 5,710,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55%	TORRES Y ASOCIADO S SAS	\$ 5,710,000.00	\$ 397,500.00	V	COMPENSAR	9502779798	\$ 228,400	PORVENIR	9502779798	\$ 913,600	\$ 228,400			
2	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	30.745.228	INGENIERA RESIDENTE DE ESTUDIOS Y CAMPO	\$ 6,300,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	TORRES Y ASOCIADO S SAS	\$ 6,300,000.00	\$ 438,500.00	V	SANITAS	9502779798	\$ 252,000	PORVENIR	9502779798	\$ 1,008,000	\$ 252,000			
3	MARLON ALVEIRO	1.234.192.633	INGENIERO AUXILIAR 1	\$ 3,615,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	TORRES Y ASOCIADO S SAS	\$ 3,615,000.00	\$ 251,700.00	V	SANITAS	9502779798	\$ 144,600	PORVENIR	9502779798	\$ 578,400	\$ 144,600			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 15,625,000.00																																											
El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																															
NOTAS: 1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva. 2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo. 3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal asignado contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades. 4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión. 7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 8. Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría. 9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																															
<table border="0"> <tr> <td> Firma Karen Criado Nombre: KAREN DAYANA CRIADO Representante Legal o su Apoderado Consultoría Matricula Profesional No.: </td> <td> Firma Ricardo Cogollo Ponce Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL </td> </tr> </table>																	Firma Karen Criado Nombre: KAREN DAYANA CRIADO Representante Legal o su Apoderado Consultoría Matricula Profesional No.:	Firma Ricardo Cogollo Ponce Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL																													
Firma Karen Criado Nombre: KAREN DAYANA CRIADO Representante Legal o su Apoderado Consultoría Matricula Profesional No.:	Firma Ricardo Cogollo Ponce Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL																																														
Original Informe Mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIMMS. Copia: Interventor, Dirección Territorial																																															

 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME MENSUAL No 5	

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Figura 40 Informe financiero lote 1.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANEJO DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA						CODIGO VERSION 1 PAGINA 1	SEGUIMIENTO EN 10 P.R.S. FECHA 1/05/2025 (Código 7.562 / 7.010)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION TERRITORIAL: N/A														
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1924 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL														
MES INFORME MENSUAL: MAY 2025 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.														
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2025	835925	C.2406-000-7-51102A-2406039-09 ADQUISICION DE BVS - ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 65.474.111								
2025	835925	C.2406-000-6-51102A-2406039-09 ADQUISICION DE BVS - ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION - S. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 2.868.752.121	\$ 1.020.522.998							
TOTAL						\$ 2.934.226.232	\$ 1.020.522.998							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.934.226.232														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
ANTICIPO														
1		16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	\$ 71.852.000	\$ 13.659.480	\$ 85.511.480	\$ 35.946.000	\$ 49.605.480	\$ 1.196.081.828,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.700.198.404	\$ 2.932.226.232		SI NO	
2		16 AL 31 DE ENERO DE 2026	\$ 139.486.000	\$ 26.502.340	\$ 165.988.340	\$ 69.743.000	\$ 96.245.340	\$ 1.126.338.828,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.650.592.924	\$ 2.846.674.752			
3		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	\$ 165.699.900	\$ 31.475.381	\$ 197.135.281	\$ 82.829.950	\$ 114.305.331	\$ 1.043.598.878,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.440.042.253	\$ 2.483.551.131			
4		1 AL 31 DE MARZO DE 2026	\$ 170.918.120	\$ 32.474.443	\$ 203.392.563	\$ 85.459.080	\$ 117.933.503	\$ 958.049.818,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.322.108.750	\$ 2.280.158.988			
5		1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$ 437.080.800	\$ 83.045.352	\$ 520.126.152	\$ 218.540.400	\$ 301.585.752	\$ 730.509.418,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.020.522.998	\$ 1.760.032.416			
TOTALES			\$ 985.036.820	\$ 187.156.998	\$ 1.172.193.816	\$ 492.518.410	\$ 679.675.406	\$ 730.509.418,50		\$ 1.020.522.998	\$ 1.760.032.416			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse exten o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL			\$	328.736.920	\$	62.454.038	\$	391.190.958,00						
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES			\$	182.500.000	\$	34.751.000	\$	217.251.000,00						
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS			\$	473.430.900	\$	89.951.873	\$	563.382.773,00						
VALOR TOTAL			\$	985.036.820	\$	187.156.998	\$	1.172.193.816,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma  Nombre: CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA Director de Consultoría Matrícula Profesional No.: 26009-14687 CND </div> <div> Firma  Nombre: JUAN RICARDO JOSE COGOLLO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 9820205667 ATL </div> </div>														
Copia: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RPOB. Copia: Interventoría a Dirección Técnica														

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 41. Informe financiero lote 2.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA										CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 			
												FECHA 13/05/26 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.			
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1915 DE 2025												CONTRATISTA CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD			
MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026												ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAYNÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS PROYECTO: CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025												INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2025	1096324	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 43.187.756,00	\$ -								
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 1.890.954.926,00	\$ 918.521.858,50								
TOTAL						\$ 1.934.142.682,00	\$ 918.521.858,50								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.934.142.682,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
			\$ 812.664.992,50						834125 del 28/11/2025	\$ 1.121.477.689,50	\$ 1.934.142.682,00				ANTICIPO
1	C	16 al 31 de Diciembre de 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812.664.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 1.121.477.689,50	\$ 1.934.142.682,00				
2	C	1 al 31 de enero de 2026	\$ 131.908.880,00	\$ 25.062.687,00	\$ 156.971.567,00	\$ 66.000.000,00	\$ 90.971.567,00	\$ 746.664.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 1.030.506.122,50	\$ 1.777.171.115,00				
3	C	1 al 28 de febrero de 2026	\$ 113.332.800,00	\$ 21.533.232,00	\$ 291.837.599,00	\$ 56.700.000,00	\$ 78.166.032,00	\$ 689.964.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 952.340.090,50	\$ 1.642.305.083,00				
4	C	1 a 31 de marzo de 2026	\$ 49.012.800,00	\$ 9.312.432,00	\$ 350.162.831,00	\$ 24.507.000,00	\$ 33.818.232,00	\$ 665.457.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 918.521.858,50	\$ 1.583.979.851,00				
5	C	1 a 30 de abril de 2026	\$ 352.971.778,61	\$ 67.064.638,00	\$ 770.199.247,61	\$ 176.490.000,00	\$ 243.546.416,61	\$ 488.967.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 674.975.441,89	\$ 1.163.943.434,39				
TOTALES			\$ 647.226.258,61	\$ 122.972.989,00	\$ 770.199.247,61	\$ 323.697.000,00	\$ 446.502.247,61	\$ 488.967.992,50		\$ 674.975.441,89	\$ 1.163.943.434,39				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1			\$ 183.953.280,00		\$ 34.951.123,00		\$ 218.904.403,00								
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES - Grupo 2			\$ 110.400.000,00		\$ 20.976.000,00		\$ 131.376.000,00								
OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 352.872.978,61		\$ 67.045.866,00		\$ 419.918.844,61								
*															
VALOR TOTAL			\$ 647.226.258,61		\$ 122.972.989,00		\$ 770.199.247,61								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma Nombre: CARLOS ORAMAS LEURO Director de Consultoría Matricula Profesional No.: 0035 </div> <div> Firma Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL </div> </div>															

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Figura 42 Informe financiero lote 3.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN1-IN-15-FR-9 1 1	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												FECHA 22/05/2026 (Día 7 Mes 7 Año)		
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1892-2025												CONSULTOR: CONSORCIO VIA FLUVIAL		
MES INFORME MENSUAL: PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026												PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1957-2025												INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2025	834225	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 41.534.997,00	\$							
2025	834225	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 1.815.585.685,00	\$ 945.181.781,50							
TOTAL						\$ 1.860.124.682,00	\$ 945.181.781,50							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:			\$ 1.860.124.682											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
1	C	16 al 31 de diciembre de 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	834225 de 28/11/2025	\$ 1.860.124.682,00	\$ 1.860.124.682,00		SI NO	
2	C	01 al 31 de enero de 2026	\$ 82.181.800,00	\$ 15.614.542,00	\$ 97.796.342,00	\$ -	\$ 97.796.342,00	\$ -	834225 de 28/11/2025	\$ 1.762.328.340,00	\$ 1.762.328.340,00			
		ANTICIPO	\$ 781.564.992,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	834225 de 28/11/2025	\$ 980.763.347,50	\$ 1.762.328.340,00			ANTICIPO
3	C	01 al 28 de febrero de 2026	\$ 95.793.800,00	\$ 18.200.822,00	\$ 113.994.622,00	\$ 47.896.900,00	\$ 66.097.722,00	\$ 733.668.092,50	834225 de 28/11/2025	\$ 914.665.625,50	\$ 1.648.333.718,00			
4	C	01 al 31 de marzo de 2026	\$ 59.793.800,00	\$ 11.360.822,00	\$ 71.154.622,00	\$ 29.896.900,00	\$ 41.257.722,00	\$ 703.771.192,50	834225 de 28/11/2025	\$ 873.407.903,50	\$ 1.577.179.096,00			
5	C	01 al 30 de Abril de 2026	\$ 354.199.930,00	\$ 67.297.987,00	\$ 421.497.917,00	\$ 177.099.965,00	\$ 244.397.952,00	\$ 526.671.227,50	834225 de 28/11/2025	\$ 629.009.951,50	\$ 1.155.681.179,00			
TOTALES			\$ 532.175.530,00	\$ 112.474.173,00	\$ 704.443.503,00	\$ 254.893.765,00	\$ 449.549.738,00	\$ 526.671.227,50		\$ 629.009.951,50	\$ 1.155.681.179,00			
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - GRUPO 1			\$ 56.137.800		\$ 10.666.182		\$ 66.803.982							
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES - GRUPO 2			\$ -		\$ -		\$ -							
OTROS COSTOS DIRECTOS - GRUPO 3			\$ 298.062.130		\$ 56.631.805		\$ 354.693.935							
VALOR TOTAL			\$ 354.199.930		\$ 67.297.987		\$ 421.497.917							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma Nombre: JUAN CARLOS BANCHEZ GAFARO Representante Legal o Apoderado Consorcio Via Fluvial Contratista </div> <div> Firma Nombre: RICARDO JOSE COSOLLO PONCE Representante Legal o Apoderado Consorcio Concep S.A.S. Interventor </div> </div>														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial														

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 43 Informe financiero lote 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA										CÓDIGO MEPI-MNT-IN-15-FR-8																														
											VERSIÓN 1																														
											PÁGINA 1																														
											FECHA 6/05/2026 (Día / Mes / Año)																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA																																									
CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1882-2025 CONTRATISTA CONSULTOR: TORRES Y ASOCIADOS SAS																																									
MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL", LOTE 4.																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922-2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.																																									
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia Fiscal</th> <th>Registro No.</th> <th>Programa-Subprograma-Proyecto</th> <th>Recurso No.</th> <th>Fuente de Financiación (Nación o Propios)</th> <th>Contrato Principal / Adicional No.</th> <th>Valor</th> <th>Saldo del Acta Anterior</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2025</td> <td rowspan="2">833725</td> <td>C-2406-0600-7-51102A-2406039-02</td> <td>10</td> <td>Nación</td> <td>Principal</td> <td>\$ 30,418,225.00</td> <td>\$ 30,418,225.00</td> </tr> <tr> <td>C-2406-0600-6-51102A-2406039-02</td> <td>10</td> <td>Nación</td> <td>Principal</td> <td>\$ 1,331,847,217.00</td> <td>\$ 799,466,779.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$ 1,362,265,442.00</td> <td>\$ 799,885,004.00</td> </tr> </tbody> </table>												Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	2025	833725	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 30,418,225.00	\$ 30,418,225.00	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 1,331,847,217.00	\$ 799,466,779.00	TOTAL						\$ 1,362,265,442.00	\$ 799,885,004.00
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior																																		
2025	833725	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 30,418,225.00	\$ 30,418,225.00																																		
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 1,331,847,217.00	\$ 799,466,779.00																																		
TOTAL						\$ 1,362,265,442.00	\$ 799,885,004.00																																		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1,362,265,442.00																																									
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																																									
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones																											
			\$ 572,380,438.00						124725 del 11/08/2025	\$ 789,885,004.00	\$ 1,362,265,442.00		SI NO	ANTICIPO																											
1	C	19 al 31 de Diciembre de 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572,380,438.00	124725 del 11/08/2025	\$ 789,885,004.00	\$ 1,362,265,442.00																														
2	C	1 al 31 de Enero de 2026	\$ 30,646,280.00	\$ 5,708,793.20	\$ 36,355,073.20	\$ 15,023,140.00	\$ 20,731,933.20	\$ 567,357,298.00	124725 del 11/08/2026	\$ 789,153,070.80	\$ 1,328,510,368.80																														
3	C	1 al 28 de Febrero de 2026	\$ 87,350,000.00	\$ 16,596,500.00	\$ 103,946,500.00	\$ 43,675,000.00	\$ 60,271,500.00	\$ 513,682,298.00	124725 del 11/08/2027	\$ 708,881,570.80	\$ 1,222,563,868.80																														
4	C	1 al 31 de Marzo de 2026	\$ 341,828,500.00	\$ 64,947,415.00	\$ 406,775,915.00	\$ 170,914,250.00	\$ 235,861,665.00	\$ 342,768,048.00	124725 del 11/08/2028	\$ 473,019,905.80	\$ 815,787,953.80																														
5	C	1 al 30 de Abril de 2026	\$ 50,700,000.00	\$ 9,633,000.00	\$ 60,333,000.00	\$ 25,350,000.00	\$ 34,983,000.00	\$ 488,332,298.00	124725 del 11/08/2028	\$ 438,036,905.80	\$ 755,454,953.80																														
TOTALES			\$ 509,924,788.00	\$ 96,885,708.20	\$ 606,810,488.20	\$ 25,350,000.00	\$ 351,848,098.20	\$ 488,332,298.00		\$ 438,036,905.80	\$ 755,454,953.80																														
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																																									
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																																									
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL																																		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1			\$ 37,500,000.00		\$ 7,125,000.00		\$ 44,625,000.00																																		
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES - Grupo 2			\$ -		\$ -		\$ -																																		
OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 13,200,000.00		\$ 2,508,000.00		\$ 15,708,000.00																																		
+																																									
VALOR TOTAL			\$ 50,700,000.00		\$ 9,633,000.00		\$ 60,333,000.00																																		
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																									
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																																									
Firma: <u>Karen Criado</u> Nombre: KAREN DAYANA CRIADO Representante Legal o su Apoderado Consultoría Matricula Profesional No.:																																									
Firma: _____ Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL																																									

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 44 Informe financiero lote 5.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO: MNFRA-MN-N-15-FR-9 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA										FECHA: 10/03/2026 (Día) (Mes) (Año)				
CONTRATO DE OBRA No: 1957 de 2025		CONTRATISTA: CONSORCIO MNF										CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE SOLITA Y SOLANO				
MES INFORME MENSUAL: 1 - 31 MARZO/26												SECTOR:				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor										
2025	837825	C-2406-0600-6-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS	1957 de 2025	\$ 1.248.662.091,00										
2025	837825	C-2406-0600-7-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS	1957 de 2025	\$ 28.518.351,00										
TOTAL						\$ 1.277.180.442,00										
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 1.277.180.442,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No Registro presupuestal	Saldo Registro presupuestal No. 837825	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
	ANTICIPO		\$ 536.630.438		\$ 536.630.438	\$ -	\$ -	No. 837825	\$ 712.031.653							
1		16-31 DIC/25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No. 837825	\$ 740.550.004	\$ -	\$ 1.277.180.442,00			X		
2		1-31 ENE/26	\$ 90.041.800,00	\$ 17.107.942,00	\$ 107.149.742,00	\$ 45.020.900,00	\$ 491.609.538,00	No. 837825	\$ 678.421.162	\$ -	\$ 1.170.030.700,00			X		
3		1-28 FEB/26	\$ 195.709.600,00	\$ 37.184.824,00	\$ 232.894.424,00	\$ 97.854.800,00	\$ 393.754.738,00	No. 837825	\$ 543.381.538	\$ -	\$ 937.136.276,00			X		
4		1-31 MAR/26	\$ 129.070.800,00	\$ 24.523.452,00	\$ 153.594.252,00	\$ 64.535.400,00	\$ 329.219.338,00	No. 837825	\$ 454.322.686	\$ -	\$ 783.542.024,00			X		
TOTALES			\$ 414.822.200,00	\$ 78.816.218,00	\$ 493.638.418,00	\$ 207.411.100,00	\$ 329.219.338,00		\$ 454.322.686	\$ -	\$ 783.542.024,00					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL										
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		111.643.200,00		21.212.208,00		132.855.408,00										
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES		38.600.000,00		7.334.000,00		45.934.000,00										
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS		264.579.000,00		50.270.010,00		314.849.010,00										
VALOR TOTAL:		\$	414.822.200,00	\$	78.816.218,00	493.638.418,00										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																
NOTAS:																
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																
Firma:  Nombre: JOSE EUSEBIO DE LA HOZ Director de Consultoría Matrícula No.: 0620221777 ATL																
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Matrícula Profesional: 062-0205667 ATL INTERVENTOR																
Original Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copia: Interventoría y Dirección Territorial.																

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

4.5. Estado general del Tiempo

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.


Figura 45 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	1/05/2026 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																													
CONTRATO DE OBRA No: 1892 DE 2025			CONTRATISTA: CONSORCIO VIA FLUVIAL																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26			ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1957 DE 2025			INTERVENTOR: CONCEP S.A.S																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Durante el periodo no se realizarán actividades de campo, por ende no se realizarán verificaciones de estado general de tiempo, así mismo al cierre del informe, no se cuenta con registro disponible del IDEAM.																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ Galfaro Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios Matricula Profesional No.: </div> <div> Firma Nombre: Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios Matricula Profesional No.: </div> </div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 46 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-10																													
			VERSIÓN 1																													
			PÁGINA 																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:																														
CONTRATO DE CONSULTORÍA 1882 DE 2025		CONTRATISTA: TORRES Y ASOCIADOS SAS																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26		PROYECTO: RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 4																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1922 DE 2025		INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS																														
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	18	16	20	24																												78
Lluvias moderadas	6	8	4																													18
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Registro relacionado a Pavasá - Chocó																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma:  Nombre: HEIVER ANDRES TORRES RINCON Residente de Obra Matricula Profesional No.: 25202376269 CND </div> <div> Firma: _____ Nombre: _____ Residente de Interventoría Matricula Profesional No.: _____ </div> </div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 47 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSION	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	5/05/2026 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA</u>			DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAQUETA</u>																													
CONTRATO DE OBRA No: <u>1957 de 2025</u>			CONTRATISTA: <u>CONSORCIO MNF</u>																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>abr-26</u>			ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA PROYECTO: <u>RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 5</u>																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: <u>1922 DE 2025</u>			INTERVENTOR: <u>CONCEP S.A.S</u>																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas	2,12	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		
Total horas																																
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.																																
OBSERVACIONES: El presente registro se encuentra respaldado por el Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME, con una precipitación mensual de 317,3 mm en el mes																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma:  Nombre: CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ Residente de Consultoría Matricula Profesional No.: </div> <div> Firma: _____ Nombre: _____ Residente de Interventoría Matricula Profesional No.: </div> </div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

4.6. Resumen Ensayos de laboratorio

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial

Figura 48 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
						FECHA	1/05/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA						DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A			
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1914 DE 2025						CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26						ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025						INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE CONSULTORIA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBSERVACIONES:									
Durante este periodo se realizaron las exploraciones geotécnicas, una vez se tengan resultados se diligenciará el respectivo formato									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:  Nombre: CARLOS BARRAGÁN MEDINA Director de Consultoría Matrícula Profesional No.: 25000-14687 CND					Firma:  Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Figura 50 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																												
			VERSIÓN 1																																																												
			PÁGINA 1																																																												
		FECHA 1 5 2026 (Día) (Mes) (Año)																																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A																																																															
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1914 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.																																																															
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																															
VALOR INICIAL: \$ 2.932.226.232,00 VALOR ACUMULADO: \$ 2.932.226.232,00 (Incluye adiciones)																																																															
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 293.222.623,20</td> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 1.232.027.829,00</td> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 586.445.246,40</td> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 879.667.869,60</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 293.222.623,20	24	11	2025	30	6	2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	30	6	2026	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 586.445.246,40	24	11	2025	31	12	2028	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030	Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																												
			Desde			Hasta																																																									
Cumplimiento	10%	\$ 293.222.623,20	24	11	2025	30	6	2026																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	30	6	2026																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 586.445.246,40	24	11	2025	31	12	2028																																																							
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce																																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2025																																																															
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																												
			Desde			Hasta																																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																															
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																															
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																															

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																												
		VERSIÓN	1																																																												
		PÁGINA																																																													
		FECHA	1	5	2026																																																										
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																															
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:																																																											
		1																																																													
				SUSPENSIÓN No.:																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 293.222.623,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 1.232.027.829,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 586.445.246,40</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 879.667.869,60</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 293.222.623,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.232.027.829,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 586.445.246,40	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 879.667.869,60	Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			24	11	2025	31	12	2026	24	11	2025	31	12	2026	24	11	2025	30	6	2029	31	12	2025	31	12	2030	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																													
Cumplimiento	10%	\$ 293.222.623,20																																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.232.027.829,00																																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 586.445.246,40																																																													
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 879.667.869,60																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																															
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
24	11	2025	31	12	2026																																																										
24	11	2025	31	12	2026																																																										
24	11	2025	30	6	2029																																																										
31	12	2025	31	12	2030																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774																																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 2 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce																																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/01/2026																																																															
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																															
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:																																																											
				SUSPENSIÓN No.:																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																															
Otros																																																															
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		OTRAS PÓLIZAS No.																																																													
Certificado de modificación o anexo No.		Certificado de modificación o anexo No.																																																													
Razón Social Compañía Aseguradora:		Razón Social Compañía Aseguradora:																																																													
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																													
OBSERVACIONES: Clausula vigesima primera paragrafo primero: "Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría"																																																															
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																															
Firma Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																															

 ONCEP S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 51 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-TR-12																																																														
			VERSIÓN	1																																																														
			PÁGINA																																																															
			FECHA	14	4	2026																																																												
			(Día) (Mes) (Año)																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1915 DE 2025			CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD																																																															
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.																																																																		
FECHA DE INICIO: 16/12/25 PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/25 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 1.934.142.682,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.934.142.682,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.934.142.682,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.934.142.682,00																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 193.414.268,00</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td colspan="3">1/07/26</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 812.664.993,00</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td colspan="3">1/07/26</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 386.828.536,00</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 580.242.805,00</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 193.414.268,00	16	12	2025	1/07/26			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 812.664.993,00	16	12	2025	1/07/26			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 386.828.536,00	16	12	2025	31	12	2028	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 580.242.805,00	31	12	2025	31	12	2030	Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Cumplimiento	10%	\$ 193.414.268,00	16	12	2025	1/07/26																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 812.664.993,00	16	12	2025	1/07/26																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 386.828.536,00	16	12	2025	31	12	2028																																																										
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 580.242.805,00	31	12	2025	31	12	2030																																																										
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																		

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:			
Amparo		% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
						Desde			Hasta
Cumplimiento		10%		\$ 193.414.268,00		29	12	2025	15/11/26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		50%		\$ 812.664.993,00		29	12	2025	15/11/26
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		20%		\$ 386.828.536,00		29	12	2025	15 5 2029
Calidad de Estudios y Diseños		30%		\$ 580.242.805,00		15	5	2026	15 5 2031
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA						Día	Mes	Año	Día Mes Año
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>2077695</u> Certificado de modificación o anexo No.: <u>3</u> <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>LIBERTY SEGUROS</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:			
Seguro		% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
						Desde			Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)						Día	Mes	Año	Día Mes Año
Otros						Día	Mes	Año	Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No. _____ <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: _____ Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).									
Firma _____ Nombre: Ricardo Cogollo Ponce Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.									

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Figura 52 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																															
			VERSIÓN 1																																																															
			PÁGINA 																																																															
			FECHA 1 5 2025 (Día) (Mes) (Año)																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																																		
CONTRATO DE OBRA No. 1892 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO VIA FLUVIAL																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.																																																																		
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: 31/12/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																		
VALOR INICIAL: \$ 1.860.124.682,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.860.124.682,00 (Incluye adiciones)																																																																		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.860.124.682,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.860.124.682,00																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1957 DE 2025 INTERVENTOR: S.A.S- CONCEP S.A.S																																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 186.012.468,20</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>100%</td> <td>\$ 930.062.341,00</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 372.024.936,40</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 558.037.404,60</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	6	2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	6	2026	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	12	2028	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030	Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Cumplimiento	10%	\$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	6	2026																																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	6	2026																																																										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	12	2028																																																										
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030																																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2025																																																																		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																																		
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																																		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																		

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																												
			VERSIÓN 1																																																												
			PÁGINA 																																																												
			FECHA 1 5 2025 (Día) (Mes) (Año)																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																															
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 186.012.468,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>100%</td> <td>\$ 930.062.341,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 372.024.936,40</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 558.037.404,60</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 186.012.468,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60	Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>11</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>11</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>5</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			20	11	2025	30	11	2026	20	11	2025	30	11	2026	20	11	2025	31	5	2029	31	12	2025	31	12	2030	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																													
Cumplimiento	10%	\$ 186.012.468,20																																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00																																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40																																																													
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																															
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
20	11	2025	30	11	2026																																																										
20	11	2025	30	11	2026																																																										
20	11	2025	31	5	2029																																																										
31	12	2025	31	12	2030																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/12/2025																																																															
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																															
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																															
Otros																																																															
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																															
Firma Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ Representante Legal Consultoría Matricula Profesional No.: Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.		Firma Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Representante Legal o Delegado Interventor: Matricula No.:																																																													

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 53 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
			VERSIÓN	1																																																				
			PÁGINA																																																					
			FECHA	30/04/2026 (Día / Mes / Año)																																																				
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1882 de 2025			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS																																																					
OBJETO DEL CONTRATO: Control y vigilancia del Contrato de Consultoría No. 1882 de 2025, Estudios y Diseños para la Infraestructura Fluvial en el Departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lote 4.																																																								
FECHA DE INICIO: 19/12/2025 PLAZO INICIAL: 4,5 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 1,362,265,442.00 VALOR ACUMULADO: \$ 1,362,265,442.00 <small>(Incluye adiciones)</small> SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES PADRON																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 136,226,544.20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 681,132,721.00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 272,453,088.40</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 408,679,632.60</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40	Estabilidad y/o Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			20	11	2025	30	6	2026	20	11	2025	20	6	2026	20	11	2025	31	12	2028	31	12	2025	21	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40																																																						
Estabilidad y/o Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
20	11	2025	30	6	2026																																																			
20	11	2025	20	6	2026																																																			
20	11	2025	31	12	2028																																																			
31	12	2025	21	12	2030																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069541 Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: _____																																																								

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																			
		VERSIÓN	1																																																			
		PÁGINA																																																				
		FECHA	30/04/2026 (Día / Mes / Año)																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 136,226,544.20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 681,132,721.00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 272,453,088.40</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 408,679,632.60</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40	Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>2031</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			20	11	2025	19	7	2026	20	11	2025	19	7	2026	20	11	2025	19	1	2029	31	12	2025	19	1	2031
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																				
Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40																																																				
Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60																																																				
VIGENCIA																																																						
Desde			Hasta																																																			
20	11	2025	19	7	2026																																																	
20	11	2025	19	7	2026																																																	
20	11	2025	19	1	2029																																																	
31	12	2025	19	1	2031																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>400069541</u> Certificado de modificación o anexo No.: <u>2</u> <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>Nacional de seguros</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: _____																																																						
OBSERVACIONES: 																																																						
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran). 																																																						
Firma _____ Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:082-02-05667 ATL		Firma _____ Nombre: Patricia Ines Morales Padron Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:																																																				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																						

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 54 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																			
			VERSIÓN 1																																																			
			PÁGINA 																																																			
FECHA: 5 5 25 (Día) (Mes) (Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ																																																						
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1957 de 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO MNF																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: Estudios y diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional. Lote 5																																																						
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																						
VALOR INICIAL: \$ 1.277.180.442,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.277.180.442,00 (Incluye adiciones)																																																						
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.277.180.442,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.277.180.442,00																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 de 2025 INTERVENTOR: CONCEP S.A.S																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 127.718.044,20</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">30/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>42%</td> <td>\$ 536.630.438,00</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">30/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones sociales</td> <td>20%</td> <td>\$ 255.436.088,40</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 383.154.132,60</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 127.718.044,20	27	11	2025	30/06/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	\$ 536.630.438,00	27	11	2025	30/06/2026			Prestaciones sociales	20%	\$ 255.436.088,40	27	11	2025	31	12	2028	Calidad del servicio	30%	\$ 383.154.132,60	31	12	2025	31	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																			
			Desde			Hasta																																																
Cumplimiento	10%	\$ 127.718.044,20	27	11	2025	30/06/2026																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	\$ 536.630.438,00	27	11	2025	30/06/2026																																																
Prestaciones sociales	20%	\$ 255.436.088,40	27	11	2025	31	12	2028																																														
Calidad del servicio	30%	\$ 383.154.132,60	31	12	2025	31	12	2030																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101141984																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																						
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado																																																						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/12/2025																																																						

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																					
			VERSIÓN	1																																																					
			PÁGINA																																																						
FECHA: 5 (Día) 5 (Mes) 26 (Año)																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:1..... MODIFICACIÓN No.:1..... SUSPENSIÓN No.:N.A.....																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 127.718.044,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>42%</td> <td>\$ 536.630.438,00</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones sociales</td> <td>20%</td> <td>\$ 255.436.088,40</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 383.154.132,60</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 127.718.044,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	\$ 536.630.438,00	Prestaciones sociales	20%	\$ 255.436.088,40	Calidad del servicio	30%	\$ 383.154.132,60	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">31/10/2026</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">31/10/2026</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>4</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			27	11	2025	31/10/2026			27	11	2025	31/10/2026			27	11	2025	31	4	2029	31	12	2025	31	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 127.718.044,20																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	\$ 536.630.438,00																																																							
Prestaciones sociales	20%	\$ 255.436.088,40																																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 383.154.132,60																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
27	11	2025	31/10/2026																																																						
27	11	2025	31/10/2026																																																						
27	11	2025	31	4	2029																																																				
31	12	2025	31	12	2030																																																				
Certificado de modificación o anexo No.:2..... (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora:Seguros del Estado.....																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
OBSERVACIONES:																																																									
La presente se encuentra ajustada según la Prorroga No. 1																																																									
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																									
Firma: _____ Nombre: Ricardo Cogollo P. Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 082-02-05667 ATL																																																									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																									

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Figura 55 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría

No aplica para el presente periodo

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

 ONCEP S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME MENSUAL No 5	

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 56 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de consultoría, LOTE 2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-2			
			VERSIÓN 1			
			PÁGINA 1			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.				
FECHA: 13/05/2026 (Día / Mes / Año)						
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 MES: ABRIL INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐						
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1915 DE 2025 (Indicar número y año)						
CONTRATO DE FIDUCIA No. DE ENTIDAD FINANCIERA:						
CUENTA BANCARIA No. 1893149922 BANCO DAVIVIENDA SUCURSAL: GALERIAS (Indicar el correspondiente al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)						
ANTICIPO OTORGADO: 50 % VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 812.664.992,50 (MCTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:						
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 2.						
CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1922 DE 2025 (Indicar número y año)						
INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP S.A.S.						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pago soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).						
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Manualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.						
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedida por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que corresponden al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.						
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM						
ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL (D=B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Personal directivo, profesional y de apoyo	\$ 30.000.000,00			\$ -	\$ 30.000.000,00
2	Costo por volúmenes técnicos entregables	\$ 900.000.000,00			\$ -	\$ 900.000.000,00
3	Válculos, transportes, oficina e informes	\$ 20.000.000,00			\$ -	\$ 20.000.000,00
4	Adquisición de cartografía, georreferenciación, topografía, y balneometría, ensayos de balneometría y socavación	\$ 70.000.000,00			\$ -	\$ 70.000.000,00
5	Exploración geotécnica	\$ 90.000.000,00			\$ -	\$ 90.000.000,00
6	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante). Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, registros, rieleros, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, muestras de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, balneometría, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	\$ 90.000.000,00			\$ -	\$ 90.000.000,00
7	Estudios técnicos adicionales y complementarios	\$ 52.664.992,50			\$ -	\$ 52.664.992,50
TOTALES		\$ 812.664.992,50			\$ -	\$ 812.664.992,50
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (Abril 2024): \$ 17.824,70 (Indicar el mes) (Según certificación de la Subdirección Financiera o Entidad según el caso)						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ 84.456,74 (Según certificación de la Subdirección Financiera o Entidad según el caso)						
RESUMEN RELACION DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERÍODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
CUS 305481286	\$ 17.824,70		marzo de 2026	13/05/26	\$ 17.824,70	
CUS 305501886	\$ 66.631,04		abril de 2026	13/05/26	\$ 84.456,74	
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)						
OBSERVACIONES:						
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros adjuntando con precisión sus soportes de acuerdo con los formatos de control de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.						
Firma:  Nombre: WALTER ENRIQUE GARCÍA BLANDÓN Representante Legal o Delegado Contratista Matrícula Profesional No.: 13872 AGR			Firma:  Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 57 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de consultoría, LOTE 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA					CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 1	
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS					FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)		
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1					DIRECCIÓN TERRITORIAL:		
DATOS GENERALES							
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOQUÍ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 4.							
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1852 DEL 2025 (indicar número y año)							
CONSULTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pagos salarios de profesionales y primas regionales	\$ 42,429,017.50	\$ 42,429,017.50			\$ 84,858,035.00	7%
2	Pagos Honorarios especialistas	\$ 54,800,750.50	\$ 54,800,750.50			\$ 109,601,501.00	10%
3	Levantamiento Topográfico, Batimétrico y socavación	\$ 34,950,000.00	\$ 34,950,000.00			\$ 69,900,000.00	6%
4	Perforaciones de suelos	\$ 25,101,000.00	\$ 25,101,000.00			\$ 50,202,000.00	4%
5	Viajeros, Transportes Aéreos, Transportes especiales (Vehículos, lancha, otros)	\$ 46,300,000.00	\$ 46,300,000.00			\$ 92,600,000.00	8%
6	Edición de informes, gestiones ambientales y otros estudios técnicos	\$ 29,600,000.00	\$ 29,600,000.00			\$ 59,200,000.00	5%
7	Ensayos de Laboratorio (incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regalías, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	\$ 53,009,451.00	\$ 53,009,451.00			\$ 106,018,902.00	9%
						\$ -	
	SUBTOTAL	\$ 286,190,219.00	\$ 286,190,219.00			\$ 572,380,438.00	
	TOTAL	\$ 572,380,438.00				\$ 572,380,438.00	100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: <u>Karen Criado</u> Nombre: Karen Criado Representante Legal Contratista: Torres y Asociados S.A.S		Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal o su Apoderado Interventor Matricula Profesional No.: _____					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 58 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de consultoría, LOTE 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1 1 de 1				
			VERSIÓN 1				
			PÁGINA 1				
		FECHA 20/04/2026 (Día / Mes / Año)					
SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA					
UNIDAD EJECUTORA: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1957 DE 2025		CONTRATISTA: CONSORCIO MNF					
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 5							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 de 2025		INTERVENTOR: CONCEP SAS					
JUSTIFICACIÓN: N.A. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago salarios profesionales y primas regionales	\$ 43.656.000	\$ 68.899.200			\$ 112.555.200	20,97%
2	Pago honorarios especialistas	\$ 53.820.000				\$ 53.820.000	10,03%
3	Levantamiento Topográfico, Batimétrico y socavación	\$ 56.100.000	\$ 53.930.988			\$ 110.030.988	20,50%
4	Perforaciones en suelos y ensayos de laboratorio	\$ 112.809.250	\$ 100.000.000			\$ 212.809.250	39,86%
5	Vialicos, Transportes aéreos, Transportes especiales (vehiculo, lancha, otros)	\$ 24.215.000				\$ 24.215.000	4,51%
6	Edición de informes, gestiones ambientales, otros estudios técnicos	\$ 23.200.000				\$ 23.200.000	4,32%
TOTAL		\$ 313.800.250	\$ 222.830.188	\$ -	\$ -	\$ 536.630.438	100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y concepcionar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:  Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO Representante Legal Consorcio MNF Matricula profesional: 0820272599 ATL		Firma:  Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Representante Legal Interventor Matricula profesional: 082-02-05667 ATL					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones

4.9.3. Actas de comité y reunión

En el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones o comités de obra:

Tabla 20 Resumen reuniones y comités de seguimiento, periodo abril.

Fecha	Lotes	Concepto
01/04/2026	6	Mesa de trabajo actas de costos
06/04/2026	1, 2 y 3	Comité de seguimiento
07/04/2026	4, 5 y 6	Comité de seguimiento
07/04/2026	4	Mesa de trabajo componente ambiental
13/04/2026	1, 2 y 3	Comité de seguimiento
14/04/2026	4, 5 y 6	Comité de seguimiento
18/04/2026	4	Mesa de trabajo actas de costos
20/04/2026	1, 2 y 3	Comité de seguimiento
21/04/2026	4, 5 y 6	Comité de seguimiento
22/04/2026	1	Mesa de trabajo componente sostenibilidad
24/04/2026	3	Mesa de trabajo componente sostenibilidad
27/04/2026	1, 2 y 3	Comité de seguimiento
28/04/2026	4, 5 y 6	Comité de seguimiento
29/04/2026	4	Audiencia Siniestro

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

En la Tabla 21 se presenta la información básica del Contrato de Interventoría.

Tabla 21 Información del contrato de Interventoría.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	No. 1922 de 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16-12-2025

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

Objeto del contrato	Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Contratista	Construcciones civiles estudios y proyectos S.A.S. (CONCEP S.A.S.)
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor del Contrato	\$ 3.940.965.840,00
Anticipo	\$ 662.347.200
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Prórroga No 1	Del 01 enero de 2026 al 30 de junio 26
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.
Supervisor de contrato	Patricia Morales Padrón
VALOR EJECUTADO A 30 DE ABRIL 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 826.420.536,65
% Ejecutado	20.97 %

Fuente: Propia

En la Tabla 22 se relaciona el personal presentado por la Interventoría y aprobado por el INVIAS para ejecutar el proyecto INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

Tabla 22 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS

No.	CARGO	NOMBRE
1	Director de Interventoría	Ricardo Cogollo Ponce
2	Especialista portuario	Layton Gonzalez Rubio Merritt
3	Especialista en hidráulica e hidrología	Bladimir Salcedo
4	Ingeniero residente de campo	Pedro González Cabrera
5	Geólogo	Claudia Ramírez
6	Especialista en geotecnia	José Guardo García
7	Especialista estructural	Armando Balza
8	Especialista en tránsito y transporte	Euclides Llach
9	Especialista en evaluación económica de proyectos	María Eulalia Arteta
10	Profesional en costos y presupuesto	Oscar Londoño Higgins
11	Economista ambiental	Juan José Vargas
12	Profesional en Arqueología	Wilhen Londoño
13	Ingeniero Forestal	Serafín Benavides
14	Ingeniero Ambiental	Faurid Escobar
15	Profesional Técnico-predial	Angie Sánchez
16	Profesional Jurídico predial	Cristian Hernández
17	Ingeniero Naval	Jairo Alberto Arteta Goenaga

Fuente: Propia

Table 23 Relación equipos de la Interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo de Cómputo, impresora, Plotter	1
Equipo de comunicación	1

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026:

5.3. Informes de especialistas y profesionales

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

En anexo, se presentan el informe del director de Interventoría y de los Ingenieros de campo y estudios, y auxiliar. Durante el período comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Para el presente periodo No Aplica

5.5. Informe matriz de riesgos.

Para el presente periodo No Aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 5</p>	
---	---	---

6 REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En el presente periodo no aplica

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

Figura 59 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

ONCEP S.A.S.		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CODIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-7																																										
		PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSION		1																																										
		MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA		PAGINA																																												
		PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		FECHA		26/05/2026																																										
						(Día / Mes / Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A																																												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 7972-2025				INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., CONCEP S.A.S.																																												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026				PROYECTO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL																																												
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1914-2025, 1915-2025, 1992-2025, 1882-2025, 1967-2025, 1968-2025				CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAN FLUVIAL, CONSORCIO NAVEGABILIDAD, CONSORCIO VIA FLUVIAL, TORRES Y ASOCIADOS S.A.S., CONSORCIO MNF, CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYES Y																																												
NOMBRE ARL: SURA				NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMBARRANQUILLA																																												
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del mes de Marzo 2026																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Valor Cotizado ARL			Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
1	Ricardo Cogollo Ponce	6.872.531	Director de Interventoría	\$ 5.385.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50,00%	CONCEP SAS	\$ 6.415.035,00	\$ 446.500	V	SURA	9504233559	\$ 256.700	PORVENIR	9504233559	\$ 1.353.600	\$ 256.700	\$ 338.400			PENSIONADO
2	Cesar Quintero	9.737.052	Coordinador	\$ 8.460.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	CONCEP SAS	\$ 8.460.000,00	\$ 588.900	V	SURA	9504233559	\$ 338.400	COLPENSIONES	9504233559	\$ 984.000	\$ 338.400	\$ 246.000			
3	Oscar Londono Higgins	72.150.287	Ingeniero Residente	\$ 6.150.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	CONCEP SAS	\$ 6.150.000,00	\$ 428.100	V	SURA	9504233559	\$ 246.000	COLPENSIONES	9504233559	\$ 984.000	\$ 246.000	\$ 246.000			
4	Ramon Acuña Camargo	12.560.186	Ingeniero Residente	\$ 4.981.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81,00%	CONCEP SAS	\$ 5.027.000,00	\$ 349.900	V	SALUD TOTAL	9504233559	\$ 201.100	COLPENSIONES	9504233559	\$ 804.400	\$ 201.100	\$ 246.000			PENSIONADO
5	Yolanda Rodríguez Cortez	32.696.803	Ingeniero Residente	\$ 6.150.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	CONCEP SAS	\$ 6.150.000,00	\$ 428.100	V	SANTAS	9504233559	\$ 246.000	COLPENSIONES	9504233559	\$ 984.000	\$ 246.000	\$ 246.000			
6	Carlos Polo Silveira	8.694.253	Ingeniero Residente	\$ 6.150.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	CONCEP SAS	\$ 6.150.000,00	\$ 428.100	V	SURA	9504233559	\$ 246.000	COLPENSIONES	9504233559	\$ 984.000	\$ 246.000	\$ 246.000			
7	Zuley Acosta Filiz	2258327	Ingeniero Auxiliar	\$ 4.090.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	CONCEP SAS	\$ 4.090.000,00	\$ 284.700	V	SURA	9504233559	\$ 163.600	PROTECCION	9504233559	\$ 654.400	\$ 163.600	\$ 246.000			
8	Kevin Algarin	1007798798	Ingeniero Auxiliar	\$ 2.781.200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68,00%	CONCEP SAS	\$ 2.800.000,00	\$ 194.900	V	COOSALUD SEOR	9504233559	\$ 112.000	PORVENIR	9504233559	\$ 448.000	\$ 112.000	\$ 246.000			
9	Valeria Diaz Osorno	1026595023	Profesional administrativo No.	\$ 4.090.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	CONCEP SAS	\$ 4.090.000,00	\$ 284.700	V	SURA	9504233559	\$ 163.600	COLPENSIONES	9504233559	\$ 654.400	\$ 163.600	\$ 246.000			
10	Fernando Blanco	1002168759	Profesional administrativo No.	\$ 1.717.800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42,00%	CONCEP SAS	\$ 1.750.905,00	\$ 121.900	V	SALUD TOTAL	9504233559	\$ 70.100	PROTECCION	9504233559	\$ 280.200	\$ 70.100	\$ 246.000			
11																																																
12																																																
13																																																
14																																																
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 49.955.500																																												
El Interventor adjunta la certificación de fecha 26/05/2026, a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																																
NOTAS: 1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectivo. 2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo. 3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soporte de novedades. 4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" los accionarios que adelantó o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal. 7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría. 9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 10. El Interventor debe señalar con un (*) o continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No. 082020567ATL </div> <div> Firma Nombre: Patricia Ines Morales Padron Supervisor del Contrato de Interventoría Matricula Profesional No. 1302028125 </div> </div>																																																

 <p>ONCEP S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.</p>	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	 <p>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p>
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

A continuación, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Figura 60 MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>		<p>CODIGO VERSION PAGINA</p>	<p>MEPI-MN1-IN-15-FR-9 1 1</p>									
	<p>FECHA: 20/05/2026 (Día / Mes / Año)</p>												
	<p>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA</p>		<p>DIRECCION TERRITORIAL: VIA</p>										
	<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1922-2025 INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP SAS</p>		<p>PROYECTO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>										
<p>MES INFORME MENSUAL: 01/01/2026 AL 31/03/2026 CONTRATO DE OBRA No.: 1914-2025, 1915-2025, 1892-2025, 1882-2025, 1957-2025, 1968-2025</p>		<p>CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAN FLUVIAL, CONSORCIO NAVEGABILIDAD, CONSORCIO VIA FLUVIAL TORRES Y ASOCIADOS SAS, CONSORCIO MNF, CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYES</p>											
<p>RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA</p>													
<p>Vigencia Fiscal</p>	<p>Registro No.</p>	<p>Programa-Subprograma-Proyecto</p>	<p>Recurso No.</p>	<p>Fuente de Financiación (Nación o Propio)</p>	<p>Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional</p>	<p>Valor</p>	<p>Saldo del Acta Anterior</p>						
2025	837325	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 70.000.000	\$ -						
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.940.965.840	\$ 2.702.758.905						
<p>TOTAL</p>						<p>\$ 3.940.965.840</p>	<p>\$ 2.702.758.905</p>						
<p>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.940.965.840</p>													
<p>SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal ITEM C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	Saldo Registro Presupuestal ITEM C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Anticipo		\$ 662.347.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662.347.200,00	837325 del 01/12/2025	\$ 3.208.618.640,00	\$ 70.000.000,00	\$ 3.940.965.840,00		
1	16/12/2025 al 15/01/2026	\$ 57.721.640,00	\$ 10.967.111,60	\$ 68.688.751,60	\$ 11.544.328,00	\$ 57.144.423,60	\$ 650.802.872,00	837325 del 01/12/2025	\$ 3.208.618.640,00	\$ 12.855.576,40	\$ 3.872.277.088,40		
2	16/01/2026 AL 31/01/2026	\$ 183.169.700,00	\$ 34.802.243,00	\$ 217.971.943,00	\$ 36.633.940,00	\$ 181.338.003,00	\$ 614.168.932,00	837325 del 01/12/2025	\$ 3.040.136.213,40	\$ -	\$ 3.654.305.145,40		
3	28/02/2026 AL 01/03/2026	\$ 137.648.800,00	\$ 26.153.272,00	\$ 163.802.072,00	\$ 27.529.760,00	\$ 136.272.312,00	\$ 586.639.172,00	837325 del 01/12/2025	\$ 2.903.863.901,40	\$ -	\$ 3.490.503.073,40		
4	01/03/2026 AL 31/03/2026	\$ 203.136.360	\$ 38.995.908,40	\$ 242.132.268,40	\$ 40.627.272,00	\$ 201.504.996,40	\$ 546.011.900,00	837325 del 01/12/2025	\$ 2.702.758.905,00	\$ -	\$ 3.248.770.805,00		
5	01/04/2026 AL 30/04/2027	\$ 184.914.000	\$ 35.133.660,00	\$ 220.047.660,00	\$ 36.982.800,00	\$ 183.064.860,00	\$ 509.029.100,00	837325 del 01/12/2025	\$ 2.519.694.045,00	\$ -	\$ 3.028.723.145,00		
6													
7													
8													
9													
10													
<p>TOTALES</p>		\$ 766.590.500,00	\$ 145.652.195,00	\$ 912.242.695,00	\$ 153.318.100,00	\$ 758.924.595,00	\$ 509.029.100,00		\$ 2.519.694.045,00	\$ -	\$ 3.028.723.145,00		
<p>Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.</p>													
<p>RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO</p>													
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL										
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 377.258.700,00	\$ 71.679.153,00	\$ 448.937.853,00										
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	\$ 193.700.000,00	\$ 36.903.000,00	\$ 230.603.000,00										
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 195.631.800,00	\$ 37.170.042,00	\$ 232.801.842,00										
VALOR TOTAL	\$ 766.590.500,00	\$ 145.652.195,00	\$ 912.242.695,00										
<p>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</p>													
<p>NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.</p>													
<p>Firma:  Nombre: RICARDO COSGLIO PONCE, Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 082055607ATL</p>													
<p>Firma:  Nombre: Patricia Ines Morales Padron Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No. 1950208125</p>													
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial</p>													

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

6.4. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 actualizado.

Figura 61 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento y seguros contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																			
			VERSIÓN 1																																																			
			PÁGINA 																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			FECHA: 16/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																			
DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																																																			
OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.																																																						
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/06/2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 3.940.995.840,00 VALOR ACUMULADO: \$ 3.940.995.840,00 <small>(Incluye adiciones)</small> SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Patricia Ines Morales Padron																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 394.096.584,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 1.655.868.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 788.193.168,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 1.182.289.752,00</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00	Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>1</td> <td>2026</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>2031</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			16	12	2025	21	7	2026	16	12	2025	21	7	2026	16	12	2025	21	1	2029	21	1	2026	21	1	2031
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																				
Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00																																																				
Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00																																																				
VIGENCIA																																																						
Desde			Hasta																																																			
16	12	2025	21	7	2026																																																	
16	12	2025	21	7	2026																																																	
16	12	2025	21	1	2029																																																	
21	1	2026	21	1	2031																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027 Certificado de modificación o anexo No.: 2 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2025																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 394.096.584,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 1.655.868.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 788.193.168,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 1.182.289.752,00</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00	Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>1</td> <td>2026</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>2031</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			16	12	2025	31	12	2026	16	12	2025	31	12	2026	16	12	2025	30	6	2029	21	1	2026	21	1	2031
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																				
Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00																																																				
Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00																																																				
VIGENCIA																																																						
Desde			Hasta																																																			
16	12	2025	31	12	2026																																																	
16	12	2025	31	12	2026																																																	
16	12	2025	30	6	2029																																																	
21	1	2026	21	1	2031																																																	

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 5	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	16/01/2026 (Día / Mes / Año)
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027 Certificado de modificación o anexo No.: 3 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:			
OBSERVACIONES:			
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
Firma Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667ATL		Firma Nombre: Patricia Ines Morales Padron Supervisor Contrato de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820254602 ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.			

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de Interventoría. Para el presente informe se entrega el seguimiento a la inversión del anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1

A continuación, se presenta el formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 plan de inversión del anticipo.

6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, no aplica para el periodo

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de abril, los proyectos de infraestructura fluvial han avanzado significativamente en la consolidación de estudios técnicos y la transición hacia el diseño definitivo. Mientras que el Lote 1 inició formalmente su exploración geotécnica desde San José del Guaviare y entregó diagnósticos iniciales para muelles como Pucarón y La Victoria, los Lotes 2, 3 y 5 han concluido la mayoría de sus labores de campo, centrando ahora sus esfuerzos en el procesamiento de laboratorio y la integración de modelos digitales. Este progreso técnico permite que contratos como el del Lote 3 ya inicien los primeros diseños arquitectónicos para muelles específicos, condicionados siempre a la validación de los informes geotécnicos y la aprobación oficial de las alternativas propuestas para evitar reprocesos.

Paralelamente, la gestión administrativa y socioambiental se ha enfocado en superar cuellos de botella normativos y garantizar la viabilidad operativa de los contratos mediante un seguimiento riguroso. Se han mantenido comités semanales para verificar cronogramas y aspectos financieros, gestionando trámites clave como el desembolso de anticipos y solicitudes de prórroga justificadas por los retos logísticos en territorio. En el ámbito legal, persiste una intensa actividad jurídica mediante consultas ante el Ministerio de Ambiente sobre la Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959 y solicitudes al Ministerio del Interior sobre la procedencia de Consultas Previas, factores que son determinantes para la ejecución futura en los Lotes 1 y 3. Finalmente, el componente social ha avanzado con la entrega de propuestas metodológicas de socialización y ejercicios de cartografía comunitaria, buscando que la infraestructura proyectada cuente con el respaldo de los actores locales.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 5</p>	

8 ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

8.2 INFORMES SEMANALES

8.3 INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DEL COORDINADOR Y DE LOS INGENIEROS RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS, Y DEL INGENIERO AUXILIAR.

8.4 PRESENTACIÓN COMITES DE SEGUIMIENTO
