

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. <u>3</u>		MES O PERIODO: <u>NOVIEMBRE</u>			
No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	INTRODUCCIÓN				4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				7
2.1	Localización				7
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				12
2.3	Características técnicas del proyecto				14
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA				17
3.1	Información general del contrato				17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				20
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				21
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				22
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA				23
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3			23
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4			28
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6			29
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			34
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10			37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			43
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12			44
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			58
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			58
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17			77
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				78
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1			78
	• Seguimiento Programa de Obra	MINFRA-MN-IN-2-FR-2			81
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1			83
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	83
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			85
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			92
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA				131
5.1	Información general del contrato				131
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				133
5.3	Informes especialistas				135
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				135
5.5	Información otros programas y aplicativos				135
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				136
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			136
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7			137
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			138
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13			139
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16			149
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18			N/A
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				150
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1			150
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2			150
7	Conclusiones y recomendaciones				151
8	Anexos				210
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				210
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				246
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				N/A

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente
por CARMEN CECILIA
PEREZ LOPEZ

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los
Municipios PDET en el Departamento de
Bolívar en el Marco de la Implementación
del Acuerdo Final para la Paz a Nivel
Nacional".**

30/11/2020
CONSORCIO BOLÍVAR 2020

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 722 DE 2020


“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

INFORME MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOVIEMBRE DE 2020

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	PAGINAS	DESCRIPCION DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
0	5 de Diciembre de 2020		Versión Inicial	X	
Elaborado por:  Director de Interventoría: Ing. Rodrigo Díaz Benjumea				Revisado por:  Director de Interventoría: Ing. Rodrigo Díaz Benjumea	

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA No.	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	INVIAS	5 de Diciembre de 2020
2	ARCHIVO CONSORCIO	5 de Diciembre de 2020

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

1 INTRODUCCION

Mediante Acuerdo No. 15 del 27 de agosto de 2019, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión–OCAD PAZ del SGR, viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto para el MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, designando al Instituto Nacional de Vías – INVIAS como entidad ejecutora y como instancia encargada de contratar la interventoría.

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, creó el Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-009 - 2020, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

De igual forma el Instituto Nacional de Vías INVIAS adjudicó el contrato de interventoría al CONSORCIO BOLIVAR 2020 (Integrado por CONSULTORES INTERVENTORES BOGOTANOS SAS – CONINBO SAS NIT 901.354.068-8 con una participación del 10%, D&B INGENIEROS CIVILES S A S Nit. 830.027.712-4 con una participación del 60%, INGENIERIA COLOMBIANA PREMIUM SAS - INGEVOL PREMIUM S.A.S Nit 901.096.880-5 con una participación del 25% y RD INGENIEROS CIVILES S A S Nit 900.395.263-1 con una participación del 5%, de conformidad mediante Contrato No. 722 de 2020 (se adjunta documento), previo concurso de méritos No. CMA-DO-SRT-009 -2020, por un valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$746.157.896,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA, equivalentes a 850,0288744 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El Instituto Nacional de Vías para cumplir con el pago del contrato de interventoría cuenta con la siguiente apropiación presupuestal: a) SEISCIENTOSVEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$622.239.500) MONEDA CORRIENTE, para el pago del Subtotal Costos Básicos de la interventoría. b) CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$4.783.942) MONEDA CORRIENTE, para el pago de la Provisión para Frentes Adicionales. c) CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$119.134.454) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA.

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 19019 del 9 de diciembre de 2019 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará a suma de \$746.157.896. El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-----------------------------------

perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones, por lo que se estableció como fecha de inicio de la interventoría el día 28 de septiembre de 2020 y fecha de culminación el día 31 de diciembre de 2020.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con el objeto de aunar esfuerzos para el Mantenimiento de las Vías Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar suscribió los Convenios Interadministrativos con la Gobernación de Bolívar y las Alcaldías de los Municipios incluidos en el acuerdo No. 15 del 27 de agosto de 2019. Tal como se describe a continuación:

- **Convenio Nro. 533 de 2020. Partes:** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) -. Alcaldía del Municipio de Córdoba Bol.) Valor: \$1.099.885.853,00.
- **Convenio Nro. 540 de 2020. Partes:** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) -. Alcaldía del Municipio de El Guamo Bol.) Valor: \$1.099.965.317,00.
- **Convenio Nro. 549 de 2020. Partes:** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) -. Alcaldía del Municipio de San Juan de Nepomuceno Bol.) Valor: \$1.099.847.594,00.
- **Convenio Nro. 586 de 2020** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) -. Alcaldía del Municipio de María la Baja Bol.) Valor: \$1.099.980.540,00.
- **Convenio Nro. 688 de 2020. Partes:** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) -. Alcaldía del Municipio de El Carmen de Bol.) Valor: \$1.099.974.305,00.
- **Convenio Nro. 630 de 2020** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) - Departamento de Bolívar). Valor: \$1.099.962.493,00. Municipio de Zambrano Departamento de Bolívar.
- **Convenio Nro. 631 de 2020** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) - Departamento de Bolívar). Valor: \$.1.099.367.380, 00 Municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar.
- **Convenio Nro. 632 de 2020** (Instituto Nacional de Vías (INVIAS) - Departamento de Bolívar). Valor: \$1.099.987.242,00. Municipio de San Pablo Departamento de Bolívar.

Así mismo se adelantó el Proceso de Licitaciones públicas en las Alcaldías y la Gobernación de Bolívar para la contratación de las Obras, siendo estos los resultados del proceso:

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--

NRO. DEL PROCESO	ENTIDAD CONTRANTE	ADJUDICADO A	CONTRATO NRO.	VALOR
LP-OP-001-2020	Alcaldía del Municipio de Córdoba Bol.	CONSORCIO PLACA HUELLA 2020	LP-OP-001-2020	\$1.073.602.538
LP- 001-2020	Alcaldía del Municipio de El Guamo Bol.	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	LP- 001-2020	1.076.137.444
LP- 002-2020	Alcaldía del Municipio de San Juan de Nepomuceno Bol.	MET – CONCIVIL SAS	LP-N- 002-20200801001	\$1.067.909.524
LP-002-2020	Alcaldía del Municipio de María la Baja Bol.	CORPORACIÓN SER SOCIAL	LP-002-2020	\$1.067.627.566
LP-005-2020	Alcaldía del Municipio de El Carmen de Bol.	EN PROCESO	-	-
LIC-SI-004-2020	Alcaldía del Municipio de Zambrano Departamento de Bolívar.	PAZ CONSTRUCCIONES SAS	SI-C- 1881	\$947.367.011,50
LIC-SI-005-2020	Alcaldía del Municipio de San Pablo Departamento de Bolívar	EN PROCESO	-	-
LIC-SI-006-2020	Alcaldía del San Jacinto Departamento de Bolívar	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR	SI-C- 1808	\$925.865.116

El presente Informe Mensual de Interventoría No. 3 para período comprendido entre el 1 noviembre a 30 noviembre de 2020, cuya información corresponde a las actividades realizadas en la ejecución de los Contratos de obras adjudicados a la fecha.

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

2.1.1 SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)



San Juan Nepomuceno es un municipio colombiano ubicado en el norte del departamento de Bolívar. Se encuentra dentro del sistema orográfico de las Serranías de San Jacinto. Tiene un área de 637 km². Está dividido administrativamente de las siguientes áreas: la cabecera municipal y seis corregimientos (los cuales poseen una serie de veredas):

Corralito
La Haya
San Agustín de Playas Blancas
San Cayetano
San José del Peñón
San Pedro Consolado

Su cabecera está en la coordenada 9° 37 latitud norte y 74° 15 longitud oeste, limita por el norte con los municipios del El Guamo y Calamar, por el este con el municipio de Mahates y por el oeste los municipios de Zambrano y San Jacinto, por el sur con los municipios de San Jacinto y María la Baja.

Tiene una extensión aproximada de 675 km² que equivalen al 1,53% del total del departamento de

Bolívar. Tiene una altura de 167 msnm. Está topográficamente determinado por los Montes de María, con zonas donde se presentan pendientes muy variadas y máximo de 50°.

Extensión total: 4130 km²

Extensión área urbana: 2040 km²

Extensión área rural: 2090 km²

La intervención motivo de esta Interventoría se desarrolla desde el tramo San Juan -San José del Peñón (Porqueras), que inicia aproximadamente a 459 kilómetros de la cabecera municipal que serán intervenidos en cuatro tramos referenciados a lo largo de la vía de la siguiente manera **Tramo 1:** K0+459 - K0+953, **Tramo 2:** K5+231 - K5+601, **Tramo 3:** K6+095 - K6+375, **Tramo 4:** K8+826 - K8+876.

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

2.1.2 MARIA LA BAJA (BOLIVAR)



María La Baja, es un municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de Bolívar. Fundado el 8 de diciembre de 1535. Su término municipal limita al norte con el municipio de Arjona, al este con Mahates y San Juan Nepomuceno, por el oeste con San Onofre (Departamento de Sucre), y por el sur con San Jacinto. La capital del departamento, Cartagena de Indias, se encuentra a 72 km al norte. La única entrada al municipio se encuentra a 73 km de Cartagena de Indias por la vía a San Onofre (Sucre) por la Transversal del Caribe.

Está dividido administrativamente de las siguientes áreas: la cabecera municipal y corregimientos (los cuales poseen una serie de veredas): Nueva Florida, Colu, Flamenco, San Pablo, Retiro Nuevo, Los Bellos, San José del Playón, El Níspero, Matuya, Ñanguma, Correa, Arroyo Grande y Mampujan.

La intervención que será llevada a cabo a lo largo de la vía desde la cabecera municipal en dirección TRONCAL - RETIRO NUEVO - FLAMENCO (INCLUYE TRAMO FLAMENCO - CORREA), los tramos han sido abscisados al largo de la vía de la siguiente manera:

Tramo 1 desde K0+000 - K9+000 - K9+543, **Tramo 2** del K16+000 - K16+390.

2.1.3 EL GUAMO (BOLIVAR)



El Guamo es un municipio colombiano, situado en el departamento de Bolívar. Se encuentra ubicado dentro del sistema orográfico de los Montes de María y el Bajo Magdalena. Limita al norte con el municipio de Calamar, al oriente con los municipios del departamento de Magdalena de Pedraza, Tenerife y Zapayan, al occidente y sur con el municipio San Juan Nepomuceno. Además, de la cabecera municipal, cuenta con los corregimientos: La Enea, Nervití, Robles, San José de Lata y Tasajeras.

La vía objeto de intervención une la vereda Lata con la Cabecera Municipal de Guamo Bolívar, también se une con otra red Nacional (Trocál de Occidente) que comunica con el interior del país y con la Costa Caribe. Las obras se realizarán a la altura del puente de acceso al municipio de Lata desde donde inicia el **primer Tramo** abscisado desde el K0+000 - K0+600 y el **segundo**

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

Tramo desde K2+070 - K2+321.

2.1.4 EL CARMEN DE BOLÍVAR



El Carmen de Bolívar es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia, a 114 km al sudeste de Cartagena de Indias. Se encuentra en el sistema orográfico de los Montes de María. Tiene una extensión de 954 km².

En cuanto a infraestructura de transporte, su posición geográficamente privilegiada permite que se conecte al Caribe Colombiano con los Santanderes por medio de la Ruta del Sol, de igual forma es punto clave de conexión del occidente del país hacia los grandes puertos de Barranquilla y Cartagena por la Troncal de Occidente; y por medio de la Transversal Montes de María comunica esta importante arteria vial nacional con el Golfo de Morrosquillo.

La vía objeto de intervención une la vereda El Bledo con la Cabecera Municipal del Carmen de Bolívar, inicia a 500 mts de la salida de El Carmen en la vía Carmen – Macayepo hasta Intersección Vía Carmen – Macayepo, (K5 + 969-K7 + 091).

2.1.5 CÓRDOBA (BOLÍVAR)



Comúnmente llamado Córdoba Tetón es uno de los 46 municipios del departamento de Bolívar en la región Caribe de Colombia. Ubicada al costado izquierdo del Río Magdalena y muy cerca de las estribaciones de los Montes de María. Limita al norte con el Municipio de Zambrano, al sur con el Municipio de Magangué, al sur este con Santa Bárbara de Pinto, al sur oeste con el Municipio de San Pedro, al este con Plato y al oeste con el Carmen de Bolívar.

Además de su Cabecera Municipal, cuenta con los siguientes Corregimientos: Zona Rivereña: San Andrés del Río, Santa Lucía, Tacamocho, Tacamochito.

Zona Baja Montaña Montemariana: Guaymaral, Martin Alonso, Pueblo Nuevo y Sincelejito.

La vía objeto de la intervención une las veredas

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

Gauymaral - San Andrés y la Cabecera Municipal de Córdoba Tetón Bolívar, también se une con otra red terciaria que comunica con el resto del Municipio.

2.1.6 ZAMBRANO (BOLÍVAR).



Zambrano es un municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de Bolívar, a orillas del río Magdalena y muy cerca de las estribaciones de los Montes de María. Se sitúa a 168 km de la capital del departamento, Cartagena de Indias. Posee un único corregimiento: Capaca.

El Municipio de Zambrano, hace parte de la Subregión Montes de María, Ubicada en la parte central del Departamento de Bolívar. Tiene aproximadamente 302 km², equivalentes a 30.200 ha. Geográficamente está ubicado en el margen izquierdo del Río Magdalena a 60 km aguas arriba de la entrada del Canal del Dique.

Extensión total: 302 Km²

Extensión área urbana: 4.6 Km²

Extensión área rural: 297.4 Km²

Limita al norte con el municipio de San Juan Nepomuceno, al sur con el municipio de Córdoba, al este con el municipio de Plato (Departamento del Magdalena) y al oeste con el municipio del Carmen de Bolívar y San Jacinto.

Entre sus vías de comunicación cuenta con la Carretera Troncal del Caribe Pavimentada que comunica a El Carmen de Bolívar, distancia se 39 Kms, carreteable destapada de 25 Kms que comunica con el Municipio de Córdoba Bolívar.

La vía objeto de estudio une la vereda Cachipay con la Cabecera Municipal de Zambrano Bolívar, también se une con otra red Nacional (Trocál de Occidente) que comunica con el interior del país. Iniciando desde la Intersección del k9 de la vía la Troncal (Zambrano - Carmen de Bolívar) con la entrada de la vía al Corregimiento Cahipay hasta el k3 de la vía hacia Cachipay sector parcela de José García Martínez.

2.1.7 SAN JACINTO (BOLÍVAR)



La posición geográfica de San Jacinto está dada por las siguientes coordenadas geográficas: 9° 49' 54" latitud norte y 75° 07' 35" longitud oeste, el Municipio tiene una extensión territorial de 462 km² (La extensión del área Urbana es de 290,58 Ha, y del área Rural 44.200 Ha), una altura sobre el nivel del mar de 239 metros. Se encuentra a una distancia de 120 Kilómetros de Cartagena de Indias capital del departamento de Bolívar, a 593 kilómetros de Bogotá.

El Municipio se encuentra limitado geográficamente de la siguiente forma: por el Norte: con el Municipio de San Juan Nepomuceno, por el Sur: con el Municipio de El Carmen de Bolívar, por el Este: con el Municipio de Zambrano y por el Oeste: con el Municipio de María La Baja.

La vía objeto de estudio une la vereda arenas las Charquitas con la Cabecera Municipal de SAN JACINTO Bolívar, también se une con otra red Nacional (Troncal de Occidente) que comunica con el interior del país y las ciudades de Cartagena y barranquilla. - Longitud total de (1171 metros) PR7+500 - PR8+671.

2.1.8 SAN PABLO (BOLIVAR)



San Pablo Sur de Bolívar es un municipio de Colombia, que se encuentra ubicado en el extremo Sur del Departamento de Bolívar a 576 kilómetros de la Capital de la República, sobre la margen izquierda del Río Magdalena en su recorrido medio. Territorialmente ocupa hacia el occidente un alto porcentaje de la Serranía de San Lucas, principal sistema orográfico de la región de Bolívar. Su posición geográfica es la 7° 09' 00" de Latitud Norte y 75° 56' 00" de longitud.

San Pablo, limita al norte con el municipio de Santa Rosa del Sur y Simití departamento de Bolívar, al sur con el municipio de Cantagallo, al oeste con Remedios y Segovia uh (departamento de Antioquia) y al este con el municipio de Puerto Wilches (departamento de Santander).

Posee una extensión de 2.086 km, con una topografía variada de terrenos planos, semiplanos y ondulados.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

Por ser un municipio tan extenso cuenta con numerosas veredas, pequeños asentamientos aislados y un casco urbano.

La vía objeto de la intervención tiene como referencia o lugar de inicio la vereda de Loma Fresca y termina en el corregimiento del Carmen del Cocu, con una longitud 25 km de los cuales se intervendrán los tramos referenciados en las abscisas K0+710 - K0+770, K3+830- K3+910, K8+150- K8+290.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

2.2.1 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR. (San José del Peñón - Porqueras)

Para el reconocimiento de la vía se realizó una visita técnica el día 29 de septiembre del 2020, donde estuvieron presentes funcionarios de Invias, de la Administración Municipal de El Guamo - Bolívar, el Ingeniero representante del Contratista de la obra y el Ingeniero Director de la Interventoría.

El recorrido fue de aproximadamente 9 kilómetros iniciando en la abscisa K0+459 hasta K8+512, conformada por una superficie del terreno o rasante tipo afirmado, con evidentes tramos en deterioro K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K7+826 - K7+876 donde se requiere la construcción de placa huellas.

Por otra parte, encontramos situaciones críticas en obras de drenaje tipo alcantarillas, también se evidenciaron zonas de la vía con flujos permanentes de agua, dichos problemas fueron observados en las abscisas K0+878, K1+169, K2+131, K5+231, K6+715, K8+026 y K8+512, en las cuales se proyecta la construcción de siete Box Culvert.

En términos generales existen varios tramos de la vía que se encuentran en buen estado, excepto los nombrados anteriormente, la información se concluye de lo observado a la fecha.

2.2.2 MARIA LA BAJA BOLIVAR. Retiro Nuevo - Flamenco (Incluye Tramo Flamenco-Correa)

Para el reconocimiento de la vía, el día 29 de septiembre del 2020, se hizo un recorrido de la totalidad del tramo materia del contrato en el que estuvieron presentes funcionarios de Invias, de la administración Municipal de María la Baja, el ingeniero representante del Consorcio Contratista de la obra y el Ingeniero Director de la Interventoría.

En la vía actualmente se identificaron varios puntos que evidencian deterioro y que representan problemas de seguridad, rapidez y comodidad, además de flujos de agua permanente o alcantarillas en mal estado, los casos de infiltración de agua los podemos observar en las abscisas K0+152, K0+647, K1+647, K9+790, K10+848, K11+203, los cuales requieren la construcción de Box Culvert.

También existen tramos críticos de la vía como lo son K9+000 – K9+543; K16+000 – K16+390, donde se requiere la construcción de placa huellas, esto con fin de mejorar el funcionamiento de la vía.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

En términos generales existen en la vía varias obras de drenaje tipo alcantarilla que se encuentran en buen estado, excepto los sectores ya nombrado en el párrafo anterior, esto se concluye de lo observado a la fecha.

2.2.3 EL GUAMO BOLIVAR (Guamo-Lata)

En la visita de obra realizada el día 07 de octubre del 2020, se reconoció la totalidad del tramo materia del contrato en donde estuvieron presentes funcionarios de Invias, la Administración Municipal del Guamo - Bolívar, el representante legal e ingeniero del Consorcio Contratista de la obra y el Ingeniero Director de la Interventoría.

En la vía actualmente es difícil la intercomunicación terrestre entre la vereda lata con la cabecera Municipal de Guamo Bolívar que también se une con otra red Nacional (Troncal de Occidente) que comunica con el interior del país y la costa Caribe, debido a las vías están en mal estado, intransitables y por qué el mantenimiento de estas es inexistente. Esto genera congestiones en las vías en épocas de invierno por pasos restringidos, afectando la economía de las parcelas aledañas y veredas debido a la baja comercialización de productos del municipio. Por estas razones, se hace necesario el mejoramiento de los tramos en mal estado descritos a continuación:

Tramos críticos de la vía K0+000 – K0+600; K2+070 – K2+321, donde se requiere la construcción de placa huellas.

En la abscisa K0+017, se proyecta la construcción de cuatro Box Culvert unidos.

En términos generales existen varios tramos de la vía que se encuentran en buen estado, excepto los nombrados anteriormente, la información se concluye de lo observado a la fecha.

2.2.4 CORDOBA BOLIVAR (Guaymaral-San Andrés)

En la visita de obra realizada el día 16 de octubre del 2020, se reconoció la totalidad del tramo materia del contrato en donde estuvieron presentes funcionarios de INVIAS, la Administración Municipal de Córdoba Bolívar, Ingeniero representante del Consorcio Contratista de la obra y el Ingeniero Director de la Interventoría.

El recorrido fue de aproximadamente 18 kilómetros iniciando en la abscisa K0+000 hasta K17+400, La vía se encuentra sobre un terreno plano con una pendiente del 0,74% aproximadamente, conformada por una superficie en tierra, en la que encontramos varios tramos y obras de drenaje en deterioro.

En las abscisas K3+350 y K8+910, se observaron alcantarillas en mal estado donde se proyectan dos Box Culvert. También se reconocieron puntos críticos de infiltración de agua ubicados en las abscisas K0+057 y K4+870, que requieren la construcción de bateas.

Por otra parte, evidenciamos deterioro y múltiples fallas a lo largo de varios tramos (K0+000 - K0+168), (K5+450 - K5+508), (K6+150 - K6+595), (K6+710 - K6+957), (K8+910 - K9+046), los cuales requieren la construcción de placa huellas. Todo esto con el fin de mejorar el funcionamiento de la vía.

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

En términos generales existen varios tramos de la vía que se encuentran en buen estado, excepto los nombrados anteriormente, la información se concluye de lo observado a la fecha.

2.2.5 SAN JACINTO (BOLÍVAR)

En la visita de obra realizada 19 de noviembre de 2020 donde estuvo presente el Ingeniero representante del Consorcio Contratista de la obra y el Ingeniero Residente de la Interventoría, se recorrió la vía objeto del Contrato, cuya ubicación se encuentra entre la vereda Cachipay y la Cabecera Municipal de Zambrano Bolívar, también se une con otra red Nacional (Trocál de Occidente) que comunica con el interior del país.

El recorrido se realizó desde Intersección de la vía la Troncal (Zambrano - Carmen de Bolívar) hasta la vía hacia Cachipay.

En el recorrido realizado se evidencio tramos de vía en mal estado, debido al frecuentes lluvia que se han generado en el mes de noviembre, el material del terreno exístete evidencia zanjas ocasionadas por el paso habitual los vehículos y la humedad ocasionada por las lluvias, colocando en riesgo la seguridad, la rapidez y comodidad de quienes transitan por la vía, así mismo se observó tramos donde existen pasos de agua de escorrentías o de flujos superficiales.

Los tramos de vía a intervenir van desde (K0+548 – K0+804); (K1+090 - K1+130); (K1+480 - K1 - 760); (K2+280 - K2+490); (K2+720 - K3+312); para una longitud de 1378 ML aproximadamente.

	<p>“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-----------------------------------

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS busca mediante el presente proyecto realizar las obras de MEJORAMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional, con la ejecución del presente proyecto se busca:

- Disminuir la accidentalidad.
- Garantizar la calidad y estabilidad de las obras existentes y a construir.
- Dar soporte en la infraestructura para las actividades comerciales de la región.
- Aumentar la capacidad y nivel de servicio, brindarles comodidad y seguridad a los usuarios de la misma.
- Contar con una vía que cumpla con las necesidades actuales y a futuro, de la zona en desarrollo, cumpliendo con los requisitos técnicos que se exigen en las correspondientes Normas para el diseño y construcción de vías en Colombia.
- Se establece inicialmente que el alcance físico del proyecto es de:

Municipio de San Juan: 1.2 km
Municipio de María la Baja: 0.93 Km
Municipio de El Guamo: 0.85 Km
Municipio de El Córdoba: 1.054 Km
Municipio de El Carmen de Bolívar: 1.12 Km
Municipio de San Jacinto: 1.17Km
Municipio de Zambrano: 1.38 Km
Municipio de San Pablo: 0.28Km

El proyecto a realizar consiste en una estructura vial de pavimento con Placa-huella, como una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo. Para la adecuada construcción de este tipo de solución es necesario conocer algunos aspectos técnicos, los cuales serán mencionados a continuación:

1. Se requiere realizar la Topografía del área a intervenir, para determinar las características físicas existentes en la superficie de la vía y de los terrenos aledaños.
2. Es necesario conformar y compactar una capa de Sub base que cumpla la especificación general vigente en el Instituto Nacional de Vías. E: 0,15 m.
3. Construcción de módulos repetitivos conformados por las placas-huella y la riostra, trabajando en conjunto. Espesor único placas-huella de quince (15) centímetros y ancho de la riostra es de veinte centímetros (0,20 m) y peralte de la riostra es de treinta centímetros (0,30 m).
4. Construcción de concreto ciclópeo con espesor de quince centímetros (0,15 m).
5. Construcción de cuneta y el bordillo como elementos de drenaje superficial contruidos en concreto reforzado, fundidos monolíticamente y articulados estructuralmente con la riostra.
6. Adicionalmente a la berma-cuneta el pavimento debe complementarse con aliviaderos, así como con otras obras de tipo drenaje transversal (Box Coulver) en los puntos de la vía que son requeridos.

	<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-----------------------------------

2.4 CÓDIGOS, NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES:

- Manual de Gestión Socio – Ambiental de Proyectos Viales en Colombia – INVIAS, versiones 2000 y 2002, Licencias ambientales y sus modificaciones.
- Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS, adoptado mediante Resolución No. 07106 del 2 de diciembre de 2009.
- Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella del INVIAS, adoptado mediante Resolución N° 04401 de 17 octubre de 2017.
- Cartilla Guía para la evaluación de cantidades y ejecución de Presupuestos para la Construcción de obras de la red terciaria y férrea, adoptado mediante Resolución N° 10133 del 28 de diciembre de 2017.
- Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, Resolución No. 0003600 Min transporte.
- Normas de Ensayo para Carreteras, Resolución No. 003290 del 15 de agosto de 2007.
- Especificaciones generales de Construcción de Carreteras, Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007.
- Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles, segunda versión, Resolución No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 INVIAS.
- Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, Resolución No. 000744, del 4 de marzo de 2009.
- Manual de Señalización Vial, Resolución No. 1050 de 2004 de Min transporte y sus modificaciones.
- Manual de Drenaje para Carreteras, Resolución No. 000024 del 7 de enero de 2011.
- Manuales de Inspección de obras del INVIAS (Estructuras de Drenaje, Pavimentos Flexibles, Pavimentos Rígidos, Puentes y Pontones, y Obras de Estabilización).
- Norma Sismo Resistente 2010 NSR-10 y sus modificaciones.

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Corresponde a la información los Contratos celebrados por las Alcaldías y la Gobernación de Bolívar para la contratación de las Obras incluidas en el proyecto de MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Contractualmente se tiene lo siguiente:

MUNICIPIO DE SAN JUAN	
OBJETO DELCONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDTE DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA:	MET-CONCIVIL S.A.S.
CONTRATO No:	LP-N-002-20200801001 DE 1 DE AGOSTO 2020
OTRO SI MODIFICATORIO N°001	VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2020
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
VALOR INICIAL:	\$1,067,909,524
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	
OBJETO DELCONTRATO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS: TRONCAL- RETIRO NUEVO-FLAMENCO ÑANGUMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO-CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA
CONTRATISTA:	CORPORACION SER SOCIAL NIT. 806010227-1
CONTRATO No:	LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
VALOR INICIAL:	\$1,067,627,566
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO:	TREINTA (30) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	--

MUNICIPIO DE EL GUAMO BOLÍVAR	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DEL EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA:	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA
CONTRATO No:	LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020
VALOR INICIAL:	\$1.076.137.444
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACLARATORIO No 1	31 DE AGOSTO DE 2020
ACTA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DE 2020

MUNICIPIO DE CÓRDOBA BOLÍVAR	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL-VÍA QUE VA DEL CORREGIMIENTO DE GUAYAMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA 2020 - NIT:901.404,303-1
CONTRATO No:	LP-OP-001-2020 DE (24) DE AGOSTO DE 2020
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
VALOR INICIAL:	\$1,073,602,538
PLAZO INICIAL:	(1) MES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y (6) MESES DE EJECUCIÓN
ACTA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE 2020

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
--	---	-----------------------------------

ZAMBRANO BOLIVAR	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN "LOS MUNICIPIOS DE PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"
CONSTRUCTOR:	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT:900.789.716-6
CONTRATO No:	SI-C-1881 DE 2020
VALOR INICIAL:	\$ 947.367.011,50 M/CTE
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
SUPERVISION	INVIAS
PLAZO INICIAL:	7 (SIETE) MESES

SAN JACINTO BOLIVAR	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONSTRUCTOR:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S- NIT:900.488.041-0
CONTRATO No:	SI-C-1808 DE 2020
VALOR INICIAL:	925.865.116,00 M/CTE
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
SUPERVISION	INVIAS
PLAZO INICIAL:	7 (SIETE) MESES
ACTA DE INICIO:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2020

La información de los Contratos de Obra evidenciada en el presente informe, corresponde a los contratos adjudicados a la fecha, dado que dos de los Municipios incluidos en el proyecto de MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--

MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, se encuentran aún en procesos de licitación y/o ajustes.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

3.2.1 MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO. CONTRATO N° LP-N-002-20200801001 DE 1 DE AGOSTO 2020

Las actividades realizadas durante el periodo del presente informe corresponden a la Sección 2 del Presupuesto de Obra Contractual **REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS**, cuyas actividades serán descritas a continuación:

- Corrección del Diseño Curvas Verticales Vía
- Corrección de Carteras Topográficas detalle de las obras a construir Box y/o Alcantarillas (cotas entradas y cotas de salida)

3.2.2 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA. CONTRATO N° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020.

Las actividades realizadas durante el periodo del presente informe corresponden a la Sección 1 **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO** y Sección 2 del **REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS** y cuyas actividades serán descritas a continuación:

SECCION 1- CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO

- Excavaciones varias sin clasificar

SECCION 2 - REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

- Entrega de Carteras Topográficas Corregidas
- Entrega de Plano de planta y perfil longitudinal corregimiento de Correa Bolívar Longitud 390 ml.
- Entrega de Plano de planta y perfil longitudinal corregimiento de Flamenco Bolívar Longitud 543 ml.
- Plano de Secciones transversales Placa Huella corregimiento de Correa Bolívar Longitud 390 ml.
- Plano de Secciones transversales Placa huella corregimiento de Flamenco Bolívar Longitud 543 ml
- Plano de Ubicación Box Culvert N° 1, 2 y 3 Corregimiento de Retiro Nuevo Bolívar
- Plano de Ubicación Box Culvert N° 4, 5 y 6 Corregimiento de Flamenco Nuevo Bolívar

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-----------------------------------

3.2.3 MUNICIPIO EL GUAMO. LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020.

Las actividades realizadas durante el periodo del presente informe corresponden a la Sección 2 del Presupuesto de Obra Contractual **REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS**, cuyas actividades serán descritas a continuación:

- Entrega de Carteras Topográficas
- Entrega diseño de curvas Verticales de los tramos a intervenir (K0+000 - K0+600) – (K2+070- K2+321).
- Plano en Planta en AutoCAD de los tramos a intervenir (K0+000 - K0+600) – (K2+070- K2+321)

3.2.4 MUNICIPIO DE CORDOBA. LP-OP-001-2020

Las actividades realizadas durante el periodo del presente informe corresponden a la Sección 2 del Presupuesto de Obra Contractual **REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS**, cuyas actividades serán descritas a continuación:

- Visita de campo y Evaluación diagnóstica

3.2.5 MUNICIPIO DE SAN JACINTO. SI-C-1808 DEL 2020.

- Visita de campo y Evaluación diagnóstica

3.3 SEGUIMIENTO DE ÍTEMS NO PREVISTOS

Los ítems existentes en las condiciones contractuales de los contratos de obra objetos del presente informe, fueron incluidos por parte de la Entidad Estatal en la etapa de planeación y contemplados en el valor total presupuestado para el Proceso de Contratación. A la fecha del presente informe no se han contemplado ítems no previstos.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 3 (del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2020), el Consorcio Bolívar 2020 hizo:

- ✓ Verificó y aprobó la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).
- ✓ Se verificó que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente, con el propósito de exigir el reemplazo en condiciones equivalentes de ser necesario.
- ✓ Se está estudiando los requerimientos de carácter técnico realizados al contratista para evitar modificaciones o sobrecostos a los contratos objetos del presente informe.
- ✓ Se ha solicitado a las alcaldías y contratistas suministren la justificación y documentación correspondientes.
- ✓ Se revisó la suscripción de las actas de inicio que se generaron entre Alcaldías – Contratistas y Gobernación – Alcaldías, durante la ejecución del contrato a la fecha, para dejar documentado el acto administrativo que da por sentado el inicio de las obras.
- ✓ Se exigió a los contratistas el cumplimiento de las obligaciones específicas de acuerdo a las responsabilidades adquiridas mediante la legalización del contrato de obra.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--------------------------------------

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En las siguientes dos páginas se presenta el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

4.1.1 MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO. CONTRATO N° LP-N-002-20200801001 DE 1 DE AGOSTO 2020.

	<small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</small>						<small>CÓDIGO</small> MNFRA-MN-IN-15-FR-3																																						
							<small>VERSION</small> 1																																						
							<small>PÁGINA</small> DE																																						
						<small>FECHA</small> 30 DE 11 2020 (Día) (Mes) (Año)																																							
<small>UNIDAD EJECUTORA:</small> SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA						<small>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</small> BOLÍVAR		<small>PERIODO MES:</small> NOVIEMBRE																																					
<small>CONTRATO DE OBRA N°:</small> LP-N-002-20200801001 DE 1 AGOSTO DE 2020						<small>PLAZO INICIAL:</small> 7 MESES <small>FECHA DE INICIACIÓN:</small> 16 DE OCTUBRE DE 2020		<small>PLAZO ACUMULADO:</small>																																					
<small>OBJETO:</small> MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR						<small>FECHA DE REANUDACIÓN:</small>		<small>FECHA DE SUSPENSIÓN:</small>																																					
<small>CONTRATISTA:</small>						<small>VALOR INICIAL (incluido IVA):</small> \$ 1.067.909.524,00		<small>VALOR ADICIONALES:</small> \$ -																																					
<small>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</small> 722 DE 2020 <small>INTERVENTOR:</small> RODRIGO DIAZ B.						<small>VALOR ACUMULADO:</small> \$ -		<small>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</small> \$ -																																					
<small>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</small> 722 DE 2020 <small>INTERVENTOR:</small> RODRIGO DIAZ B.						<small>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:</small> CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ																																							
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pavimentación</td><td>KM</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>Box Coulver</td><td>UND</td><td>7</td></tr> <tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mejoramiento			Construcción			Pavimentación	KM	1,2	Box Coulver	UND	7	Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD EJECUTADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento			Construcción			Pavimentación			Puentes			Otros		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																											
Mejoramiento																																													
Construcción																																													
Pavimentación	KM	1,2																																											
Box Coulver	UND	7																																											
Otros																																													
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																											
Mejoramiento																																													
Construcción																																													
Pavimentación																																													
Puentes																																													
Otros																																													
AVANCE FINANCIERO																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inversión Programada (P)</th> <th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th> <th>E/P</th> <th>Costos de Intervent (I)</th> <th>C/B</th> <th>I/C</th> </tr> <tr> <th>En el mes:</th> <th>Obra (B)</th> <th>Ajustes (A)</th> <th>Total (C=A+B)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acumulado:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	En el mes:	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)					Acumulado:								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>\$ 1.067.909.524</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 1.067.909.524</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2020	\$ 1.067.909.524	Total	\$ 1.067.909.524				
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C																																						
En el mes:	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																										
Acumulado:																																													
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																													
Año	Valor																																												
2020	\$ 1.067.909.524																																												
Total	\$ 1.067.909.524																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>E/V</th> <th>Meses Ejecutados</th> <th>Plazo Ejecutado/Total</th> <th>Meses Faltantes</th> <th>Saldo Contrato</th> <th>Plazo Adicional Estimado</th> <th>Presupuesto disponible</th> <th>Valor Programado para los meses faltantes del año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratista:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interventor:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año	Contratista:								Interventor:																							
E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año																																						
Contratista:																																													
Interventor:																																													
<small>E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).</small> <small>V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).</small>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th> <th>Valor sin IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 6.331.691</td></tr> <tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td></td></tr> <tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td></tr> <tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td></tr> <tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr> </tbody> </table>						*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 6.331.691	GESTIÓN PREDIAL		GESTIÓN SOCIAL		GESTIÓN AMBIENTAL		OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		VALOR TOTAL																											
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																												
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 6.331.691																																												
GESTIÓN PREDIAL																																													
GESTIÓN SOCIAL																																													
GESTIÓN AMBIENTAL																																													
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN																																													
VALOR TOTAL																																													
<small>* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</small>																																													
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cumplimiento</td><td>1/08/2020</td><td>2/07/2021</td></tr> <tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>1/08/2020</td><td>2/03/2024</td></tr> <tr><td>Cualidad de Estudios y Diseños</td><td>1/03/2021</td><td>1/03/2026</td></tr> <tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td>1/03/2021</td><td>1/03/2026</td></tr> </tbody> </table>						Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	1/08/2020	2/07/2021	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1/08/2020	2/03/2024	Cualidad de Estudios y Diseños	1/03/2021	1/03/2026	Estabilidad y Calidad de Obra	1/03/2021	1/03/2026	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>1/08/2020</td><td>2/03/2021</td></tr> <tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	1/08/2020	2/03/2021	Otros							
Amparo	VIGENCIA																																												
	Desde	Hasta																																											
Cumplimiento	1/08/2020	2/07/2021																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1/08/2020	2/03/2024																																											
Cualidad de Estudios y Diseños	1/03/2021	1/03/2026																																											
Estabilidad y Calidad de Obra	1/03/2021	1/03/2026																																											
Seguro	VIGENCIA																																												
	Desde	Hasta																																											
Responsabilidad Civil Extracontractual	1/08/2020	2/03/2021																																											
Otros																																													
<small>Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:</small> Las pólizas: CG-1021657 - CG-1003889 aportadas mediante la Resolución N°20201013-002, Con fecha 13 de OCTUBRE del año 2020																																													
<small>PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</small>																																													
<small>CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</small>																																													
<small>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA</small>																																													
<small>Firma</small> <small>Nombre</small> <small>Director de Interventoría: Rodrigo Díaz B.</small> <small>Matrícula No</small>																																													
<small>Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)</small> <small>Copio: Interventor, Dirección Territorial</small>																																													

	<p align="center">“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>	

4.1.2 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA. CONTRATO N° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MNFRA-MN-IN-15-FR-3		
							VERSION	1		
							PÁGINA	DE		

										FECHA	30	11	2020
											(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR
 PERIODO MES: NOVIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.:	LP-002-2020	PLAZO INICIAL:	7 MESES	PLAZO ACUMULADO:	
		FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS: TRONCAL - RETIRO NUEVO - FLAMENCO ÑANGUAMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO - CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO MARIA LA BAJA	FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$ 1.067.627.566,00
CONTRATISTA:		VALOR ACUMULADO:	\$ -	VALOR ADICIONALES:	\$ -
		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 722 DE 2020
 INTERVENTOR: RODRIGO DÍAZ B.
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO				AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	
Mejoramiento				Mejoramiento			
Construcción				Construcción		-	
Pavimentación	Km	0.93		Pavimentación	Km		
Box Coulver	Und	6		Box Coulver	Und	-	
Otros				Otros			

AVANCE FINANCIERO							
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)		E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	
En el mes:	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
Acumulado:							

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	\$ 1.067.627.566
Total	

EIV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:							
Interventor:							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
 V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.705.440,34
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	9.705.440,34

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS			
Amparo	VIGENCIA		Seguro
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	28/05/2020	10/06/2021	Responsabilidad Civil Extracontractual
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	28/05/2020	10/06/2021	Otros
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	28/05/2020	10/02/2024	
Calidad de Estudios y Diseños	28/12/2020	28/12/2025	
Estabilidad y Calidad de Obra			

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:
 Poliza de Cumplimiento N° 440-47-994000024130 y Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 440-74-994000007103 aprobadas por resolución N°0104 con fecha de aprobación de 24 de julio de 2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

De acuerdo a la programación de obra en el primer mes de ejecución solo se realizaron actividades correspondientes a revisión y/o ajustes, estudios y diseños

Firma: Rodrigo Díaz B.
 Rodrigo Díaz B.
 Director de Interventoría
 Matrícula No.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	---

4.1.3 MUNICIPIO EL GUAMO. LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MNFRA-MN-IN-15-FR-3
					VERSION 1
					PÁGINA DE

		FECHA	30	11	2020
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR	PERIODO MES: NOVIEMBRE
--	--------------------------------	------------------------

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020	PLAZO INICIAL: 7 MESES	PLAZO ACUMULADO:
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DEL EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	FECHA DE INICIACION:	FECHA DE SUSPENSION:
	FECHA DE REANUDACION:	
	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 1.076.137.444,00	VALOR ADICIONALES: \$ -
	VALOR ACUMULADO: \$ -	AMORTIZACION ANTICIPO: \$ -
CONTRATISTA: DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -	

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 722 DE 2020	INTERVENTOR: RODRIGO DIAZ B.	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
--	------------------------------	--

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento			Mejoramiento		
Construcción			Construcción		-
Pavimentación	Km	0,85	Pavimentación	Km	
Box Coulver	Und	4	Box Coulver	Und	-
Otros			Otros		

AVANCE FINANCIERO							
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
En el mes:	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
Acumulado:							

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	\$ 1.076.137.444
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	12.409.920,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	12.409.920,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS			
Amparo	VIGENCIA		
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	28/05/2020	10/06/2021	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	28/05/2020	10/06/2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	28/05/2020	10/02/2024	
Calidad de Estudios y Diseños	28/12/2020	28/12/2025	
Estabilidad y Calidad de Obra			

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/07/2020	10/02/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: Poliza de Cumplimiento N° 440-47-994000024130 y Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 440-74-994000007103 aprobadas por resolución N°0104 con fecha de aprobación de 24 de julio de 2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA


De acuerdo a la programación de obra en el primer mes de ejecución solo se realizaron actividades correspondientes a revisión y/o ajustes, estudios y diseños

Firma: *Rodrigo Díaz B.*
 Rodrigo Díaz B.
 Director de Interventoria
 Matrícula No.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

4.1.4 MUNICIPIO DE CORDOBA. LP-OP-001-2020 DE 24 DE AGOSTO DE 2020

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MINFRA-MN-NV-15-FR-3																																						
VERSION 1				PÁGINA DE																																						
FECHA 30 11 2020 (Día) (Mes) (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR		PERIODO MES: NOVIEMBRE																																						
CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-001-2020 DE (24) DE AGOSTO DE 2020																																										
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL-VÍA QUE VA DEL CORREGIMIENTO DE GUAYAMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA 2020 - NIT-901.404.303-1																																										
PLAZO INICIAL: 7 MESES FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR INICIAL (Incluido IVA) : \$1.073.602.538 VALOR ACUMULADO: \$ ANTICIPO CONCEDIDO: \$																																										
PLAZO ACUMULADO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES: \$ AMORTIZACION ANTICIPO: \$																																										
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 722 DE 2020 INTERVENTOR: RODRIGO DIAZ B SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ																																										
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																							
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Km</td><td>1.054</td></tr><tr><td>Box Coulver</td><td>Und</td><td>2</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mejoramiento			Construcción			Pavimentación	Km	1.054	Box Coulver	Und	2	Otros			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Km</td><td></td></tr><tr><td>Box Coulver</td><td>Und</td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento			Construcción			Pavimentación	Km		Box Coulver	Und		Otros				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																								
Mejoramiento																																										
Construcción																																										
Pavimentación	Km	1.054																																								
Box Coulver	Und	2																																								
Otros																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																								
Mejoramiento																																										
Construcción																																										
Pavimentación	Km																																									
Box Coulver	Und																																									
Otros																																										
AVANCE FINANCIERO																																										
<table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th rowspan="2">E/P</th><th rowspan="2">Costos de Intervent (I)</th><th rowspan="2">C/B</th><th rowspan="2">I/C</th></tr><tr><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th></tr></thead><tbody><tr><td>En el mes:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	En el mes:									Acumulado:									<table><thead><tr><th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th></tr><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>\$ 1.073.602.538</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 1.073.602.538</td></tr></tbody></table>	VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2020	\$ 1.073.602.538	Total	\$ 1.073.602.538
	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)				E/P	Costos de Intervent (I)	C/B					I/C																													
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																						
En el mes:																																										
Acumulado:																																										
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																										
Año	Valor																																									
2020	\$ 1.073.602.538																																									
Total	\$ 1.073.602.538																																									
<table><thead><tr><th></th><th>E/V</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contratista:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interventor:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:									Interventor:															
	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																		
Contratista:																																										
Interventor:																																										
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																										
<table><thead><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>12.891.466,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>12.891.466,00</td></tr></tbody></table>									*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	12.891.466,00	GESTIÓN PREDIAL		GESTIÓN SOCIAL		GESTIÓN AMBIENTAL		OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		VALOR TOTAL	12.891.466,00																				
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS	12.891.466,00																																									
GESTIÓN PREDIAL																																										
GESTIÓN SOCIAL																																										
GESTIÓN AMBIENTAL																																										
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN																																										
VALOR TOTAL	12.891.466,00																																									
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																										
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																										
<table><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>24/08/2020</td><td>24/09/2021</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>24/08/2020</td><td>24/03/2024</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td colspan="2">si ampara 5 años, 0 meses y 0 días</td></tr></tbody></table>									Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	24/08/2020	24/09/2021	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	24/08/2020	24/03/2024	Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y Calidad de Obra	si ampara 5 años, 0 meses y 0 días															
Amparo	VIGENCIA																																									
	Desde	Hasta																																								
Cumplimiento	24/08/2020	24/09/2021																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	24/08/2020	24/03/2024																																								
Calidad de Estudios y Diseños																																										
Estabilidad y Calidad de Obra	si ampara 5 años, 0 meses y 0 días																																									
<table><thead><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>28/08/2020</td><td>24/03/2021</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/08/2020	24/03/2021	Otros																									
Seguro	VIGENCIA																																									
	Desde	Hasta																																								
Responsabilidad Civil Extracontractual	28/08/2020	24/03/2021																																								
Otros																																										
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: pólizas N°: 540-47-9940000-12591 y 540-74-994000002870 aprobados mediante la resolución N°1711 del 24 de Septiembre de 2020.																																										
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																										
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																										
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																																										
De acuerdo a la programación de obra en el primer mes de ejecución solo se realizaran actividades correspondientes a revisión y/o ajustes, estudios y diseños																																										
Firma:  Rodrigo Díaz B. Director de Interventoría Matrícula No. Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																										

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

4.1.5 MUNICIPIO DE SAN JACINTO. SI-C-1808 DEL 2020.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</p>	<p>CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-3</p> <p>VERSION 1</p> <p>PÁGINA DE</p>																																																																						
		<p>FECHA 30 11 2020 (Día) (Mes) (Año)</p>																																																																						
<p>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR PERIODO MES: NOVIEMBRE</p>																																																																								
<p>CONTRATO DE OBRA No.: <u>SI-C-1808 DE 2020</u> PLAZO INICIAL: <u>7 MESES</u> PLAZO ACUMULADO: <u> </u></p> <p>OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL</p> <p>FECHA DE INICIACIÓN: <u> </u> FECHA DE REANUDACIÓN: <u> </u></p> <p>FECHA DE SUSPENSIÓN: <u> </u></p> <p>CONTRATISTA: <u>INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S- NIT:900.488.041-0</u> VALOR INICIAL (incluido IVA) : <u>\$925.865.116,00</u> VALOR ADICIONALES: <u>\$ -</u></p> <p>VALOR ACUMULADO: <u>\$ -</u> AMORTIZACION ANTICIPO: <u>\$ -</u></p> <p>ANTICIPO CONCEDIDO: <u>\$ -</u></p>																																																																								
<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA: <u>722 DE 2020</u> INTERVENTOR: <u>RODRIGO DIAZ B</u> SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: <u>CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ</u></p>																																																																								
<p>ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO</p> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Km</td><td>1.17</td></tr><tr><td>Box Coulver</td><td>Und</td><td>2</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mejoramiento			Construcción			Pavimentación	Km	1.17	Box Coulver	Und	2	Otros			<p>AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</p> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Km</td><td></td></tr><tr><td>Box Coulver</td><td>Und</td><td>-</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento			Construcción		-	Pavimentación	Km		Box Coulver	Und	-	Otros																																			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																						
Mejoramiento																																																																								
Construcción																																																																								
Pavimentación	Km	1.17																																																																						
Box Coulver	Und	2																																																																						
Otros																																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																																																						
Mejoramiento																																																																								
Construcción		-																																																																						
Pavimentación	Km																																																																							
Box Coulver	Und	-																																																																						
Otros																																																																								
<p>AVANCE FINANCIERO</p> <table><thead><tr><th>Inversión Programada (P)</th><th>INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th>E/P</th><th>Costos de Intervent (I)</th><th>C/B</th><th>I/C</th></tr><tr><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>En el mes:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>E/V</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contratista:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interventor:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).</p> <table><thead><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 5.883.470</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 5.883.470</td></tr></tbody></table> <p>* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</p> <table><thead><tr><th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th></tr><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>\$ 925.865.116</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 925.865.116</td></tr></tbody></table>			Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)	E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				En el mes:						Acumulado:						E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:								Interventor:								*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 5.883.470	GESTIÓN PREDIAL		GESTIÓN SOCIAL		GESTIÓN AMBIENTAL		OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		VALOR TOTAL	\$ 5.883.470	VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2020	\$ 925.865.116	Total	\$ 925.865.116
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)	E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C																																																																			
Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																																																						
En el mes:																																																																								
Acumulado:																																																																								
E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																																																	
Contratista:																																																																								
Interventor:																																																																								
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 5.883.470																																																																							
GESTIÓN PREDIAL																																																																								
GESTIÓN SOCIAL																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL																																																																								
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN																																																																								
VALOR TOTAL	\$ 5.883.470																																																																							
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																																																								
Año	Valor																																																																							
2020	\$ 925.865.116																																																																							
Total	\$ 925.865.116																																																																							
<p>ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS</p> <table><thead><tr><th>Amparo</th><th>VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>8/10/2020</td><td>8/09/2021</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>8/10/2020</td><td>8/05/2024</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>8/05/2021</td><td>8/05/2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td>8/05/2021</td><td>8/05/2026</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Seguro</th><th>VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>8/10/2020</td><td>8/05/2021</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: <u>Polizas CG-1022610 anexo 2. y CG-1004225 anexo 1.</u></p>			Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	8/10/2020	8/09/2021	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	8/10/2020	8/05/2024	Calidad de Estudios y Diseños	8/05/2021	8/05/2026	Estabilidad y Calidad de Obra	8/05/2021	8/05/2026	Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	8/10/2020	8/05/2021	Otros																																									
Amparo	VIGENCIA																																																																							
	Desde	Hasta																																																																						
Cumplimiento	8/10/2020	8/09/2021																																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	8/10/2020	8/05/2024																																																																						
Calidad de Estudios y Diseños	8/05/2021	8/05/2026																																																																						
Estabilidad y Calidad de Obra	8/05/2021	8/05/2026																																																																						
Seguro	VIGENCIA																																																																							
	Desde	Hasta																																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual	8/10/2020	8/05/2021																																																																						
Otros																																																																								
<p>PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>																																																																								
<p>CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>																																																																								
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA</p> <p>De acuerdo a la programación de obra en el primer mes de ejecución solo se realizaron actividades correspondientes a revisión y/o ajustes, estudios y diseños</p>																																																																								
<p>Firma: <u>Rodrigo Díaz B.</u> Rodrigo Díaz B. Director de Interventoría Matrícula No. <u> </u></p> <p>Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial</p>																																																																								

[illegible]

[illegible]

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.4.1 CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S.

De acuerdo a las condiciones contractuales vigentes según el Registro Presupuestal N° 464, por concepto de **MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL** y valor 1.067.909.524, se adjudicó el contrato de obra LP-N-002-20200801001 de 1 de agosto de 2020.

A la fecha del presente informe el Contratista MET- CONCIVIL S.A.S ha ejecutado las actividades que corresponden a la sección 2 del presupuesto contractual **REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS** en un avance del 95% por valor de \$ \$ 7.157.976. El Contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

MUNICIPIO DE SAN JUAN	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDTE DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA:	MET-CONCIVIL S.A.S
CONTRATO No:	LP-N-002-20200801001 DE 1 DE AGOSTO 2020
OTRO SI MODIFICATORIO N°001	VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2020
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA : INGENIERO RODRIGO DIAZ
VALOR INICIAL:	\$1,067,909,524
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

El Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA se presentará en cuanto el contratista presente el acta parcial de cobro.

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	--	-----------------------------------

4.4.2 CONTRATO N°LP-002-2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL.

De acuerdo a las condiciones contractuales vigentes según el Registro Presupuestal N° 0271 de 28 de mayo de 2020, por concepto de **MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS: RETIRO NUEVO – FLAMENGO ÑANGUMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO – CORREA) EN EL MUNICIPIO INTERADMINISTRATIVO N° 586 DEL 5 DE MARZO DE 2020, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MPIO DE MARIA LA BAJA BOLIVAR** y valor 1.067.627.566, se adjudicó el contrato de obra N°LP-002-2020 de 10 de julio de 2020.

A la fecha del presente informe el Contratista ha ejecutado las actividades:

PLACA HUELLA						
6	600.1.1	600	Excavaciones varias sin clasificar	m3	172,50	\$ 7.545.667,50
SECCIÓN 2 - REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS						
13	10P		Construcción de Placa Huella en Concreto, box Culvert	GL	0,95	\$ 9.705.440,34

Las cantidades y valores del costo directo que corresponden las actividades referenciadas anteriormente son resultado de una cuantificación parcial, puesto que el Contratista no ha presentado actas parciales de Obra ni memoria de cantidades, documentos donde se aprueba las cantidades y valores de ejecución oficialmente.

MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS: TRONCAL-RETIRO NUEVO-FLAMENCO ÑANGUMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO-CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA
CONTRATISTA:	CORPORACION SER SOCIAL NIT. 806010227-1
CONTRATO No:	LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
VALOR INICIAL:	\$1,067,627,566
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO:	TREINTA (30) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

El Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA se presentará en cuanto el contratista presente el acta parcial de cobro.

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

4.4.3 CONTRATO LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020: DEIVIS PEREZ S.

De acuerdo a las condiciones contractuales vigentes según el Registro Presupuestal N° 9900243 de 04 de agosto de 2020, por concepto de **MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ** y valor de \$ 1.076.137.444,00, se adjudicó el contrato de obra N° LP-001-2020 de 4 agosto de 2020.

A la fecha del presente informe el Contratista DEIVIS PEREZ S. inició la ejecución de las actividades que corresponden a la sección 2 del presupuesto contractual **REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS**, en un avance del 50% por valor de \$ 7.267.935,50. El Contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

MUNICIPIO DE EL GUAMO BOLÍVAR	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DEL EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA:	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA
CONTRATO No:	LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020
VALOR INICIAL:	\$1.076.137.444
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA: INGENIERO RODRIGO DIAZ
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACLARATORIO No 1	31 DE AGOSTO DE 2020
ACTA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DE 2020

El Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA se presentará en cuanto el contratista presente el acta parcial de cobro.

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--------------------------------------

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.5.1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.5.1.1 MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO BOL.

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 31 °C, rara vez bajan a menos de 28 °C o exceden 34 °C.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 22 °C, rara vez bajan a menos de 21 °C o exceden 24 °C.

Como referencia, el 17 de marzo, el día más caluroso del año, las temperaturas en San Juan Nepomuceno generalmente varían de 23 °C a 35 °C, mientras que el 10 de enero, el día más frío del año, varían de 22 °C a 34 °C.

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</p>		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN																													
			FECHA		DE																											
			FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)																										
<p>UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u></p>																																
<p>CONTRATO DE OBRA No: <u>LP-N-002-20200801001</u> CONTRATISTA: <u>MET-CONCIVIL SAS</u></p>																																
<p>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>NOVIEMBRE</u> CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>SAN JUAN - SAN JOSE DEL PEÑON (PORQUERAS)</u></p>																																
<p>SECTOR: <u>PR0+459 - PR0+953, PR5+231 - PR5+601, PR6+095 - PR6+375, PR7+826 - PR7+876</u></p>																																
<p>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</p>																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	16	22	22	22	21	21	20	22	22	23	23	24	23	22	24	24	24		683	
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	2	1	2	3	3	1	2	1	1	0	1	2	0	0	0		32	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0		
<p>EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.</p>																																
<p>NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.</p>																																
<p>OBSERVACIONES:</p>																																
<p>Firma: <u>Camillo</u> Nombre: Ing Camilo soto Residente de Obra Matrícula No.:</p>																																
<p>Firma: <u>Claudia</u> Nombre: Ing. Claudia Lucia Rojas Residente de Interventoría Matrícula No.:</p>																																
<p>Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial</p>																																

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--------------------------------------

4.5.1.2 MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA BOL.

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 32 °C, rara vez bajan a menos de 30 °C o exceden 35 °C.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 24 °C, rara vez bajan a menos de 23 °C o exceden 26 °C.

Como referencia, el 17 de marzo, el día más caluroso del año, las temperaturas en María la Baja generalmente varían de 25 °C a 35 °C, mientras que el 11 de enero, el día más frío del año, varían de 23 °C a 34 °C.

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</p>		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN																													
			FECHA		DE																											
			FECHA	30	11	2020																										
				(Día)	(Mes)	(Año)																										
<p>UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u></p>																																
<p>CONTRATO DE OBRA No: <u>LP-002-2020</u> CONTRATISTA: <u>CORPORACIÓN SER SOCIAL</u></p>																																
<p>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>NOVIEMBRE 2020</u> CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>MARIA LA BAJA - BOLIVAR</u></p>																																
<p>SECTOR: <u>K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390</u></p>																																
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	5	23	22	21	20	20	21	21	21	24	23	23	23	22	24	24	24		668
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	1	2	2	3	4	3	3	2	0	1	1	1	1	0	1	1		50
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		4
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	0	
<p>EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.</p>																																
<p>NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.</p>																																
<p>OBSERVACIONES:</p>																																
<p>Firma _____ Nombre: _____ Residente de Obra Matrícula No.: _____</p>																																
<p>Firma  _____ Nombre: Ing. Claudia Lucia Rojas Residente de Interventoría Matrícula No.: _____</p>																																
<p>Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial</p>																																

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

4.5.1.3 MUNICIPIO DEL GUAMO BOL.

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 32 °C, rara vez bajan a menos de 29 °C o exceden 36 °C.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 23 °C, rara vez bajan a menos de 22 °C o exceden 24 °C.

Como referencia, el 17 de marzo, el día más caluroso del año, las temperaturas en El Guamo generalmente varían de 24 °C a 36 °C, mientras que el 5 de enero, el día más frío del año, varían de 22 °C a 35 °.

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</p>		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN																													
			FECHA		DE																											
			FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)																										
<p>UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u></p>																																
<p>CONTRATO DE OBRA No: <u>LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020</u> CONTRATISTA: <u>DEIVIS ANTONIO PEREZ CERPA</u></p>																																
<p>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>NOVIEMBRE 2020</u> CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>GUAMO-LATA</u></p>																																
<p>SECTOR: <u>PR0+000 - PR0+600, PR2+070 - PR2+321</u></p>																																
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	22	16	22	20	21	20	21	20	22	21	22	23	24	22	23	24	24	24		677
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	1	4	3	4	3	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0		34
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0		9
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	
<p>EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.</p>																																
<p>NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.</p>																																
<p>OBSERVACIONES:</p>																																
<p>Firma _____ Nombre: _____ Residente de Obra Matrícula No.: _____</p>																																
<p>Firma _____ Nombre: Ing. Nedor Guerrero Residente de Interventoría Matrícula No.: _____</p>																																
<p>Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial</p>																																

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

4.5.1.4 MUNICIPIO DE CORDOBA BOL.

En Córdoba, los veranos son cortos, tórridos y secos; los inviernos son cortos, calientes y mojados y está opresivo y nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 23 °C a 37 °C y rara vez baja a menos de 21 °C o sube a más de 39 °C.

La temporada calurosa dura 2,5 meses, del 31 de enero al 13 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 36 °C. El día más caluroso del año es el 17 de marzo, con una temperatura máxima promedio de 37 °C y una temperatura mínima promedio de 25 °C.

La temporada fresca dura 2,4 meses, del 16 de septiembre al 29 de noviembre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 33 °C. El día más frío del año es el 3 de enero, con una temperatura mínima promedio de 23 °C y máxima promedio de 35 °C.

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Córdoba varía considerablemente durante el año.

La temporada más mojada dura 7,2 meses, de 23 de abril a 28 de noviembre, con una probabilidad de más del 22 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 43 % el 19 de octubre.

La temporada más seca dura 4,8 meses, del 28 de noviembre al 23 de abril. La probabilidad mínima de un día mojado es del 2 % el 20 de enero.

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 43 % el 19 de octubre.

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>	

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</p>																		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10												
																			VERSIÓN													
																			FECHA		DE											
																			FECHA	30	11	2020										
																				(Día)	(Mes)	(Año)										
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA</u>																			DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u>													
CONTRATO DE OBRA No: <u>LP-OP-001-2020</u>																			CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PLACA HUELLA 2020</u>													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>NOVIEMBRE</u>																			DEL CORREGIMIENTO DE GUAYMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS. (K0+000 a K0+168), (K5+450 a K5+508), SECTOR: <u>(K6+150 a K6+595), (K6+710 a K6+957), (</u>													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	20	22	20	20	22	20	22	19	19	23	23	21	20	20	22	21	24	22	23	22		646
Lluvias moderadas	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	4	2	2	2	1	1	3	4	4	2	3	0	2	1	1		65
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		7
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: _____																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma _____</p> <p>Nombre: Ing. Carlos Mario</p> <p>Residente de Obra</p> <p>Matrícula No.: _____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma _____</p> <p>Nombre: Ing. Nedor Guerrero</p> <p>Residente de Interventoría</p> <p>Matrícula No.: _____</p> </div> </div>																																
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																

4.5.1.5 MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOL.

En San Jacinto, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es muy caliente y opresivo durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 21 °C a 35 °C y rara vez baja a menos de 20 °C o sube a más de 37 °C.

La temporada calurosa dura 2,4 meses, del 2 de febrero al 15 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 34 °C. El día más caluroso del año es el 17 de marzo, con una temperatura máxima promedio de 35 °C y una temperatura mínima promedio de 23 °C.

La temporada fresca dura 2,4 meses, del 16 de septiembre al 28 de noviembre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 31 °C. El día más frío del año es el 11 de enero, con una temperatura mínima promedio de 21 °C y máxima promedio de 33 °C.

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en San Jacinto varía considerablemente durante el año.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
			VERSIÓN			
			FECHA		DE	

FECHA

30

(Día)

11

(Mes)

2020

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN RED Terciaria y férrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Bolívar

CONTRATO DE OBRA No:

SI-C-1808 DE 2020

CONTRATISTA:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S- NIT:900.488.041-0

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

NOVIEMBRE

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SAN JACINTO ARENAS-CHARQUITAS

SECTOR:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	22	16	22	20	21	20	21	20	22	21	22	23	24	22	23	24	24	24		
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	1	4	3	4	3	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0		
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0		
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre:

Residente de Obra

Matrícula No.:

Firma

Nombre:

Ing. Claudia Lucia Rojas

Residente de Interventoría

Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Conjtes: Interventor, Dirección Territorial

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

4.6.1 ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA MET-CONCIVIL S.A.S (SAN JUAN NEPOMUCENO)

Para el periodo del presente informe el contratista no realizo entrega de ensayos de laboratorio, para revisión de la Interventoría.

4.6.2 ENSAYOS DE LABORATORIO CORPORACION SER SOCIAL (MARIA LA BAJA)

Al contratista se le realizó en el mes de octubre varias observaciones a cerca del Diseño de Mezcla entregado, las cuales no han sido subsanadas satisfactoriamente a la fecha del presente informe, por tal razón la Interventoría Consorcio Bolívar 2020 programó una visita conjunta con el contratista a la fuente de extracción de materiales para toma de muestras, en el momento que se tengan los resultados de laboratorio, serán compartidos en el próximo informe.





La interventoría realiza seguimiento al pago de los aportes por parte del Contratista. Por medio del formato MINFRA MN-IN-15-FR12 Control Parafiscales de Obra y planillas de pago correspondiente. El cual se presenta a continuación:

[illegible]



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812004943	4	METCONCIVIL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NAPUWUCENO	planeta rica	PLANETA RICA-CORDOBA	7765834	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	803500304	9412817368	E	2020/11/12	2020/11/18	BANCOLOMBIA	\$236,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
1	CC 75086357	GARCIA CARDONA HUGO MARIO	230301	11	\$321,862	\$51,500	EPS016	11	\$321,862	\$12,900	CCF16	11	\$321,862	\$12,900	14-11	11	\$321,862	\$22,500	11
2	CC 1066732433	ORDÓÑEZ LAZA FELIPE ANDRÉS	230201	4	\$117,041	\$18,800	EPS037	4	\$117,041	\$4,700	CCF16	4	\$117,041	\$4,700	14-11	4	\$117,041	\$8,200	4
3	CC 91765570	SIERRA ANILLO ALVEIRO JOSE	230301	11	\$321,862	\$51,500	ESSC07	11	\$321,862	\$12,900	CCF16	11	\$321,862	\$12,900	14-11	11	\$321,862	\$22,500	11
Total Afiliados(3)					\$760,765	\$121,800			\$760,765	\$30,500			\$760,765	\$30,500			\$760,765	\$53,200	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$121,800	\$0	\$121,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$53,200	\$0	\$53,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$30,500	\$0	\$30,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$30,500	\$0	\$0	\$30,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$30,500	\$0	\$30,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$12,900	\$0	\$0	\$12,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$12,900	\$0	\$0	\$12,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$4,700	\$0	\$0	\$4,700
TOTAL					3	\$236,000	\$0	\$236,000





Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
NT 806010227		1	CORPORACION SER SOCIAL		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SUCURSAL001		Cll 31 N 58 32 Avenida Pedro de Heredia		CARTAGENA-BOLIVAR		6685315	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor														
2020-10	2020-11	58889456	9413677981	E	2020/11/09	2020/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	24		51,896,500														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte						
Sucursal: SUCURSAL001 (5 Afiliados)					\$4,389,015	\$702,500	\$4,389,015					\$549,000	\$4,389,015					\$176,000	\$4,389,015		\$220,000			
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)					\$3,511,212	\$562,000	\$3,511,212					\$439,200	\$3,511,212					\$140,800	\$3,511,212		\$176,000			
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)					\$3,511,212	\$562,000	\$3,511,212					\$439,200	\$3,511,212					\$140,800	\$3,511,212		\$176,000			
1	CC 7308086	CORREA PEDRO	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$61,500	30	\$877,803	\$44,000			
2	CC 9156837	CORREA VLADIMIR	25-14	30	\$877,803	\$140,500	ESSC07	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$61,500	30	\$877,803	\$44,000			
3	CC 73142973	PALENCIA HECTOR	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS016	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$61,500	30	\$877,803	\$44,000			
4	CC 1049935997	URBINA YEINER	230301	30	\$877,803	\$140,500	ESSC07	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$61,500	30	\$877,803	\$44,000			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500	\$877,803					\$109,800	\$877,803					\$35,200	\$877,803		\$4,600	30	\$877,803	\$44,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500	\$877,803					\$109,800	\$877,803					\$35,200	\$877,803		\$4,600	30	\$877,803	\$44,000
5	CC 8866006	PEREZ ALVARO	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$4,600	30	\$877,803	\$44,000			
Total Afiliados (5)					\$4,389,015	\$702,500	\$4,389,015					\$549,000	\$4,389,015					\$176,000	\$4,389,015		\$249,000	30	\$877,803	\$220,000



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF													
NT 806010227	1	CORPORACION SER SOCIAL		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SUCURSAL001	Cll 31 N 58 32 Avenida Pedro de Heredia	CARTAGENA-BOLIVAR	6685315	No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
2020-09	2020-10	58886210	9413687277	E	2020/10/07	2020/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	57	\$1,336,400														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SUCURSAL001 (4 Afiliados)						\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$439,200			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$18,400			\$3,511,212	\$176,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$439,200			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$18,400			\$3,511,212	\$176,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$439,200			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$18,400			\$3,511,212	\$176,000
1	CC 73080866	CORREA PEDRO		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$4,800	30	\$877,803	\$44,000	
2	CC 9156837	CORREA VLADIMIR		25-14	30	\$877,803	\$140,500	ESSC07	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$4,800	30	\$877,803	\$44,000	
3	CC 73142973	PALENCIA HECTOR		230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS016	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$4,800	30	\$877,803	\$44,000	
4	CC 1049935997	URBINA YEINER		230301	30	\$877,803	\$140,500	ESSC07	30	\$877,803	\$109,800	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$4,800	30	\$877,803	\$44,000	
Total Afiliados(4)						\$3,511,212	\$562,000			\$3,511,212	\$439,200			\$3,511,212	\$140,800			\$3,511,212	\$18,400			\$3,511,212	\$176,000



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

El contratista manifestó que efectuó que para efectos de Movimiento de tierra, subcontrató la maquinaria y asimismo este contrato incluye el pago de la seguridad Social del operador de la retroexcavadora y el conductor de la volqueta, enviando la seguridad social de ambos, tal como se evidencia a continuación:



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS	UPC	
														1	0
														TOTAL A PAGAR	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADIMON	18	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS		SI			E	04/11/2020	48433107	\$272.000		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Fanzane EPS	830003984-7	35.200	0	0	0	0	0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (INQ) + Protección	800228739-0	140.500	0	0	0	0	0	0	0	140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARL Sura	900296101-9	61.100				61.100	0	0	61.100			0	61.100	1

TOTALES CAJAS								No. Afiliados
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
CCF06	Confianza Cartagena	890480023-7	35.200	0	0	35.200		


TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IHP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	35.200	35.200
Pension	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	61.100	61.100
CCF	1	35.200	35.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	272.000	272.000



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	00055105-0	PROMOTORA VIVE CONSTRUCCIONES S.A.S		Av. Cisneros Lopez Diag. 22 Ns. 47a 155	7102247	gvliveconstrucciones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B - menos de 200 c	ADMON	10	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					IMPORTE 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 2
2020-11	2020-10	E	94/11/2020	46433107	\$272.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION					SALUD		RESEDE LABORALES			CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Tip	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Religión	Profesión	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción

PAGADA



“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono	Exonerado SENA e ICBF										
NT 901360436	1	K&V MAQUINAS Y VOLQUETAS S.A.S.		A - 200 O MAS COTIZANTES		UNO		CARTAGENA-BOLIVAR		CARTAGENA-BOLIVAR		66.35.338	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
2020-10	2020-11	809162896	9412955592	E	2020/11/11	2020/11/24	BANCO DAVIVIENDA	13	\$249,100														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: UNO (1 Afiliados)						\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$38,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 1 (1 Afiliados)						\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$38,200		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$38,200		\$0	\$0	
1	CC	1047390968 DIAZ SARMENTO MARCOS RAMON		231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF08	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30		\$0	
Total Afiliados(1)						\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$38,200		\$0	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 901360436	1	K&V MAQUINAS Y VOLQUETAS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNO	CARTAGENA-BOLIVAR	CARTAGENA-BOLIVAR	66.35.338	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	809162896	9412955592	E	2020/11/11	2020/11/24	BANCO DAVIVIENDA	13	\$249,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
TOTAL				1	\$249,100	\$0	\$0	\$249,100	

[illegible]



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9147546		PEREZ SERPA DEVIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 25A N° 40 32	SINCELEJO-SUCRE	2745523	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	9203242002866065	9412743390	E	2020/11/12	2020/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	\$798,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
1	CC 73229641	ANILLO HELENEZ JANETH ADOLFO	230301	6	\$175,561	\$28,100	ESSC07	6	\$175,561	\$7,100	CCF41	6	\$175,561	\$7,100	14-11	6	\$175,561	\$12,300	6
2	CC 1048404231	BONETT FONTALVO BENJAMIN ANTONIO	230301	6	\$175,561	\$28,100	EPS041	6	\$175,561	\$7,100	CCF41	6	\$175,561	\$7,100	14-11	6	\$175,561	\$12,300	6
3	CC 18881387	CARDENAS PELLIFFO AMALURY GUILLERMO	230301	8	\$234,081	\$37,500	ESSC07	8	\$234,081	\$9,400	CCF41	8	\$234,081	\$9,400	14-11	8	\$234,081	\$16,300	8
4	CC 3805711	GARCIA SALCEDO RAFAEL ANTONIO	230301	6	\$175,561	\$28,100	ESSC07	6	\$175,561	\$7,100	CCF41	6	\$175,561	\$7,100	14-11	6	\$175,561	\$12,300	6
5	CC 18879813	MARINER DIAZ JOSE JUAN	230301	1	\$29,261	\$4,700	ESSC07	1	\$29,261	\$1,200	CCF41	1	\$29,261	\$1,200	14-11	1	\$29,261	\$2,100	1
6	CC 1238338664	TORRES DE LAS NGUAS JUAN ANDRES	230301	30	\$877,803	\$140,500	ESSC24	30	\$877,803	\$35,200	CCF41	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30
7	CC 1101820130	VASQUEZ ARROYO JOSE DAVID	230301	1	\$29,261	\$4,700	EPS048	1	\$29,261	\$1,200	CCF41	1	\$29,261	\$1,200	14-11	1	\$29,261	\$2,100	1
8	CC 92510825	VERGARA NGUAS JAIRO MANUEL	230301	30	\$877,803	\$140,500	ESSC07	30	\$877,803	\$35,200	CCF41	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30
Total Afiliados(8)					\$2,574,892	\$412,200			\$2,574,892	\$103,500			\$2,574,892	\$103,500			\$2,574,892	\$179,600	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$412,200	\$0	\$0	\$412,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$412,200	\$0	\$0	\$412,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$179,600	\$0	\$0	\$179,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$179,600	\$0	\$0	\$179,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$103,500	\$0	\$0	\$103,500
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$103,500	\$0	\$0	\$103,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$103,500	\$0	\$0	\$103,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$1,200	\$0	\$0	\$1,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$7,100	\$0	\$0	\$7,100
TOTAL				8	\$798,800	\$0	\$0	\$798,800

[illegible]



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

El contratista CONSORCIO PLACA HUELLA 2020 celebro un contrato de prestación de servicios con la empresa RODRIGUEZ & CARVAJAL S.A.S, por lo servicios de topografía, razón por la cual el aportante del pago de seguridad social del topógrafo es la empresa subcontratada.



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																				
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono	Exonerado SENA e ICBF																		
NT 80608090		9	RODRIGUEZ & CARVAJAL S.A.S				B - MENOS DE 200 COTIZANTES				SINCELEJO		CLL 26 KRA16A-95 LOC 201		SINCELEJO-SUCRE		2806992	Si																		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																				
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																								
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																
2020-11		2020-12				9413281334		E		2020/12/14								0																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	representante	titular	copro	voluntario	inm	vac	aspi	act	int	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
SUCURSAL: SINCELEJO (7 Afiliados)																			\$5,835,653	\$934,000			\$5,835,653	\$233,900			\$5,835,653	\$233,900			\$5,835,653	\$293,400	\$0	\$0		\$1,495,200
Centro de Trabajo: RIESGOS (5 Afiliados)																			\$4,080,047	\$653,000			\$4,080,047	\$163,500			\$4,080,047	\$163,500			\$4,080,047	\$284,200	\$0	\$0		\$1,264,200
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (5 Afiliados)																			\$4,080,047	\$653,000			\$4,080,047	\$163,500			\$4,080,047	\$163,500			\$4,080,047	\$284,200	\$0	\$0		\$1,264,200
1	CC	92261453	BLANCO HERRERA HAROLD FABIAN	X										030301	10	\$292,601	\$46,900	CCFC3	10	\$292,601	\$11,800	CCF41	10	\$292,601	\$11,800	14-11	10	\$292,601	\$20,400	10	\$0	\$0	\$1	\$90,900		
2	CC	1105686217	CONTRERAS POLO OSWALDO JULIO	X										031001	11	\$321,862	\$51,500	ESSC07	11	\$321,862	\$12,900	CCF41	11	\$321,862	\$12,900	14-11	11	\$321,862	\$22,500	11	\$0	\$0	\$1	\$99,800		
3	CC	1234088543	HERNANDEZ CORRAS ROBERTO MAURIO											030301	30	\$877,803	\$140,500	EP5037	30	\$877,803	\$35,200	CCF41	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	\$1	\$272,000		
4	CC	92259298	MARTINEZ LIDIANA IVAN ANTONIO	X										030301	3	\$87,781	\$14,100	EP5041	3	\$87,781	\$3,600	CCF41	3	\$87,781	\$3,600	14-11	3	\$87,781	\$6,200	3	\$0	\$0	\$1	\$27,500		
5	CC	92537272	TELADA REYES MAICOS ANTONIO											030301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5009	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF41	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	\$1	\$774,000		
Centro de Trabajo: RIESGONIVELADMINISTRACIONRYC (2 Afiliados)																			\$1,755,606	\$281,000			\$1,755,606	\$70,400			\$1,755,606	\$70,400			\$1,755,606	\$9,200	\$0	\$0		\$431,000
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (2 Afiliados)																			\$1,755,606	\$281,000			\$1,755,606	\$70,400			\$1,755,606	\$70,400			\$1,755,606	\$9,200	\$0	\$0		\$431,000
6	CC	1102863948	BETIN SAKUDYO CORAMIA CHANEL											030301	30	\$877,803	\$140,500	ESSC07	30	\$877,803	\$35,200	CCF41	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$4,600	30	\$0	\$0	\$1	\$215,500		
7	CC	1102877432	CANCILLA SOLAR EDGAR JUNIOR											030301	30	\$877,803	\$140,500	EP5037	30	\$877,803	\$35,200	CCF41	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$4,600	30	\$0	\$0	\$1	\$215,500		
Total Afiliados (7)																\$5,835,653	\$934,000			\$5,835,653	\$233,900			\$5,835,653	\$233,900			\$5,835,653	\$293,400	\$0	\$0		\$1,495,200			



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
RODRIGUEZ Y CARVAJAL SAS**

CONTRATO DE OBRA

Entre los suscritos a saber, RODRIGUEZ Y CARVAJAL SAS, identificada con el NIT No 806008050-9, ubicada en la calle 26 No 16ª – 95, segundo piso, Sincelajo (sucre) quien en adelante se denominará Contratante y por la obra MARCOS ANTONIO TEJADA REYES identificado con No de cedula 92.537.272 expedida en Sincelajo (sucre), representante legal de CONSORCIO PLACA HUELLA 2020, identificado con el NIT No. 901404303-1, quien en adelante se denominará contratista, se ha celebrado el presente contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO.-** El presente contrato tiene por objeto: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El lugar de ejecución del presente contrato será en el MUNICIPIO DE CORDOBA – BOLIVAR **TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES- A).OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** Se compromete a efectuar las labores contratadas en los tiempos estipulados y pactados con la empresa

A).OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- El contratante está obligado a suministrar al contratista todos los materiales y/o información necesaria para la ejecución de la labor contratada

CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- El valor del contrato son de DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS (\$10.783.000). Se realiza un pago del 100% del valor del contrato una vez entregado el trabajo o labor contratada **PARÁGRAFO PRIMERO:** El contratista deberá aportar certificación bancaria de cuenta a su nombre, para que los pagos se hagan por transferencia bancaria.

QUINTA- EQUIPO DE TRABAJO- El contratista se compromete a tener su propio equipo de trabajo el cual estará integrado por el personal que el considere necesario para la ejecución del objeto del presente contrato a fin de cumplir con las obligaciones aquí estipuladas.

SEXTA: DURACION- Este contrato tendrá una duración de 20 días

SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO - En caso de incumplimiento de alguna de las partes estas pactan al mutuo acuerdo una cláusula Penal por valor de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000.00)**

CORAIMA BETIN SAMUDIO
CONTRATANTE
Administradora Rodriguez y Carvajal

MARCOS ANTONIO TEJADA REYES
CONTRATISTA
Rep. Legal consorcio placa huella 2020

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	--------------------------------------

4.8 INFORME DE AVANCE FISICO

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO de los contratos de obra, no se diligencia para el periodo correspondiente al presente informe, dado que los contratistas no han presentado Actas parciales de obra.

4.9 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En las siguientes dos (2) páginas se presenta el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

4.9.1 CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</p>	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			
		VERSIÓN	1			
		PÁGINA	1	DE	1	
		FECHA	30	11	2020	
				(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR				
CONTRATO DE OBRA No. LP-N-002-20200801001 DE 1 AGOSTO DE 2020 CONTRATISTA: MET-CONCIVIL SAS						
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDTE DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.						
FECHA DE INICIO: 16/10/2020						
PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES						
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____ (Incluye prórrogas y suspensiones)						
VALOR INICIAL: \$ 1.067.909.524,00						
VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)						
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 7.534.712,00						
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 7.534.712,00						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 722 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO BOLÍVAR 2020						

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																					
<table border="1"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td align="center">10%</td> <td>\$ 106.790.952,40</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td align="center">5%</td> <td>\$ 53.395.476,20</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td align="center">30%</td> <td>\$ 2.261.000,00</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td align="center">10%</td> <td>\$ 106.790.952,40</td> </tr> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 106.790.952,40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 53.395.476,20	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 2.261.000,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 106.790.952,40	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">8</td> <td align="center">2020</td> <td align="center">2</td> <td align="center">7</td> <td align="center">2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">8</td> <td align="center">2020</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2024</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2021</td> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2026</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2021</td> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2026</td> </tr> </table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			1	8	2020	2	7	2021							1	8	2020	2	3	2024	1	3	2021	1	3	2026	1	3	2021	1	3	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 106.790.952,40																																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 53.395.476,20																																																																			
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 2.261.000,00																																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 106.790.952,40																																																																			
VIGENCIA																																																																					
Desde			Hasta																																																																		
1	8	2020	2	7	2021																																																																
1	8	2020	2	3	2024																																																																
1	3	2021	1	3	2026																																																																
1	3	2021	1	3	2026																																																																
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>CG-1021657</u></p> <p>Certificado de modificación o anexo No.: <u>1</u> <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small></p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: <u>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u></p>																																																																					
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																					
<table border="1"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td align="center">20%</td> <td>\$ 405.805.617,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 405.805.617,00	Otros			<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">8</td> <td align="center">2020</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2021</td> </tr> <tr> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Año</td> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Año</td> </tr> </table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			1	8	2020	2	3	2021	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 405.805.617,00																																																																			
Otros																																																																					
VIGENCIA																																																																					
Desde			Hasta																																																																		
1	8	2020	2	3	2021																																																																
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>CG-1003889</u> OTRAS PÓLIZAS No. _____</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.: <u>1</u> <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small></p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: <u>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u></p>																																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS																																																																					
<p>A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.</p>																																																																					
<table border="1"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td align="center">10%</td> <td>\$ 106.790.952,40</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td align="center">20%</td> <td>\$ 213.581.904,80</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td align="center">30%</td> <td>\$ 2.261.000,00</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td align="center">30%</td> <td>\$ 320.372.857,20</td> </tr> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 106.790.952,40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 213.581.904,80	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 2.261.000,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 320.372.857,20	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">9</td> <td align="center">2020</td> <td align="center">2</td> <td align="center">7</td> <td align="center">2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">9</td> <td align="center">2020</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2024</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2021</td> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2026</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2021</td> <td align="center">1</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2026</td> </tr> </table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			25	9	2020	2	7	2021							25	9	2020	2	3	2024	1	3	2021	1	3	2026	1	3	2021	1	3	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 106.790.952,40																																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 213.581.904,80																																																																			
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 2.261.000,00																																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 320.372.857,20																																																																			
VIGENCIA																																																																					
Desde			Hasta																																																																		
25	9	2020	2	7	2021																																																																
25	9	2020	2	3	2024																																																																
1	3	2021	1	3	2026																																																																
1	3	2021	1	3	2026																																																																
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>CG-1021657</u></p> <p>Certificado de modificación o anexo No.: <u>3</u> <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small></p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: <u>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u></p>																																																																					

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	---

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS									
A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	\$ 213.581.904,80	1	8	2020	2	3	2021	
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>CG-1003889</u>			OTRAS PÓLIZAS No. _____						
Certificado de modificación o anexo No. <u>3</u>			(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)						
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u>									
Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:			<u>Las pólizas: CG-1021657 - CG-1003889</u>						
aprobadas mediante la Resolución N°20201013-002. Con fecha 13 de OCTUBRE del año 2020									
OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____									

Firma <u>RODRIGO DIAZ B.</u>									
Nombre: RODRIGO DIAZ B.									
Director de Interventoría:									
Matrícula No.:									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)									
Copias: Interventor y Dirección Territorial.									

En el periodo del presente informe no hubo actualización y/o modificación de las pólizas.

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>	

4.9.2 CONTRATO N°LP-002-2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15																																																														
				VERSIÓN	1																																																														
				PÁGINA	1	DE	1																																																												
				FECHA	30	11	20																																																												
					(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA</u>				DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u>																																																															
CONTRATO DE OBRA No. <u>LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020</u>				CONTRATISTA: <u>CORPORACION SER SOCIAL</u>																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS : TRONCAL-RETIRO NUEVO-FLAMENCO ÑANGUMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO-CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA																																																																			
FECHA DE INICIO: <u>30/09/2020</u>																																																																			
PLAZO INICIAL: <u>SIETE (7) MESES</u>																																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____ (incluye prórrogas y suspensiones)																																																																			
VALOR INICIAL: <u>\$1,067,627,566</u>																																																																			
VALOR ACUMULADO: \$ _____ - (incluye adiciones)																																																																			
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ <u>11.549.474,00</u>																																																																			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ <u>11.549.474,00</u>																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>722 DE 2020</u>				INTERVENTOR: <u>RODRIGO DIAZ MARTINEZ</u>																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>15%</td> <td>\$ 160.144.134,90</td> <td>28</td> <td>5</td> <td>2020</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>30%</td> <td>\$ 320.288.269,80</td> <td>28</td> <td>5</td> <td>2020</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>100%</td> <td>\$ 320.288.269,80</td> <td>28</td> <td>5</td> <td>2020</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 2.911.632,00</td> <td>28</td> <td>12</td> <td>2020</td> <td>28</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 320.288.269,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	15%	\$ 160.144.134,90	28	5	2020	10	6	2021	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	\$ 320.288.269,80	28	5	2020	10	6	2021	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	\$ 320.288.269,80	28	5	2020	10	2	2024	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 2.911.632,00	28	12	2020	28	12	2025	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 320.288.269,80						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																
			Desde			Hasta																																																													
Cumplimiento	15%	\$ 160.144.134,90	28	5	2020	10	6	2021																																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	\$ 320.288.269,80	28	5	2020	10	6	2021																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	\$ 320.288.269,80	28	5	2020	10	2	2024																																																											
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 2.911.632,00	28	12	2020	28	12	2025																																																											
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 320.288.269,80																																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>440-47-994000024130</u>																																																																			
Certificado de modificación o anexo No.: <u>2</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																			
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>Aseguradora Solidaria de Colombia</u>																																																																			
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>200SMLM</td> <td>\$ 195.560.600,00</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>2020</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>								Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLM	\$ 195.560.600,00	10	7	2020	10	2	2021	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																
			Desde			Hasta																																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLM	\$ 195.560.600,00	10	7	2020	10	2	2021																																																											
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																											
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>440-74-994000007103</u> OTRAS PÓLIZAS No. _____																																																																			
Certificado de modificación o anexo No.: <u>1</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																			
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>Aseguradora Solidaria de Colombia</u>																																																																			

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	---

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS									
A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Desde			Hasta			
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____</p> <p>Certificado de modificación o anexo No. _____ <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small></p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: _____</p> <p>Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: <u>Polizas: 440-47-994000024130 y 440-74-994000007103</u> aprobadas por la resolución N° 0104 DE JULIO 24 DEL 2020</p> <p>OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____ _____ _____ _____</p> <p>Firma <u>Rodrigo Díaz B.</u> Nombre: Rodrigo Díaz B. Director de Interventoría Matrícula No.: _____</p> <p><small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.</small></p>									

En el periodo del presente informe no hubo actualización y/o modificación de las pólizas.

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	---

4.9.3 CONTRATO N°: LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020. CONTRATISTA: DEIVIS PEREZ S.

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</p>	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30	11	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP- 001-2020 **CONTRATISTA:** DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIOAL.

FECHA DE INICIO: 26/10/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 1.076.137.444,00

VALOR ACUMULADO: \$ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 14.535.871,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 722 DEL 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO BOLÍVAR 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 107.613.744,40	4	8	2020	4	7	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 322.841.233,20	4	8	2020	4	7	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 215.227.488,80	4	8	2020	4	3	2024
Calidad de Estudios y Diseños	20%	\$ 322.841.233,20	4	8	2020	4	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 322.841.233,20	4	3	2021	4	8	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101107288

Certificado de modificación o anexo No.: 0

señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	---

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMLV	\$ 351.121.200	14	8	2020	4	3	2021	
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101038568 OTRAS PÓLIZAS No. _____									
Certificado de modificación o anexo No. 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>									
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS DEL ESTADO S.A</u>									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS									
A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMLV	\$ 351.121.200	14	8	2020	4	3	2021	
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101038568 OTRAS PÓLIZAS No. _____									
Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>									
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS DEL ESTADO S.A</u>									
Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: Las pólizas: 75-44-101107288 - 75-40-101038568 aprobadas mediante la Resolución N° 206 Con fecha 14 de AGOSTO del año 2020.									
OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____ _____ _____ _____									
Firma <u>Rodrigo Díaz B.</u> Nombre: RODRIGO DIAZ B. Director de Interventoría Matricula No.: _____ <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.</small>									

En el periodo del presente informe no hubo actualización y/o modificación de las pólizas.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--------------------------------------

4.9.4 CONTRATO N°: SI-C-1808 DE 2020: CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</p>	<p>CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-15</p>	<p>VERSIÓN 1</p>																																																															
		<p>PÁGINA</p>	<p>DE</p>																																																															
		<p>FECHA</p>	<p>30 11 2020 (Día) (Mes) (Año)</p>																																																															
<p>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR</p>																																																																		
<p>CONTRATO DE OBRA No. <u>SI-C-1808</u> CONTRATISTA: <u>INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S</u></p>																																																																		
<p>OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL</p>																																																																		
<p>FECHA DE INICIO: <u>20/11/2020</u></p>																																																																		
<p>PLAZO INICIAL: <u>7 MESES</u></p>																																																																		
<p>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>20/06/2021</u> (Incluye prórrogas y suspensiones)</p>																																																																		
<p>VALOR INICIAL: \$ <u>925.865.116</u></p>																																																																		
<p>VALOR ACUMULADO: \$ <u>-</u> (Incluye adiciones)</p>																																																																		
<p>VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ <u>7.001.329,00</u></p>																																																																		
<p>VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ <u>-</u></p>																																																																		
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>722 DEL 2020</u> INTERVENTOR: <u>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</u></p>																																																																		
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL</p>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="146 1346 540 1402">Amparo</th> <th data-bbox="540 1346 678 1402">% Amparo</th> <th data-bbox="678 1346 885 1402">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6" data-bbox="966 1346 1401 1373">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th colspan="3" data-bbox="966 1373 1161 1402">Desde</th> <th colspan="3" data-bbox="1193 1373 1401 1402">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="146 1402 540 1459">Cumplimiento</td> <td data-bbox="540 1402 678 1459">10%</td> <td data-bbox="678 1402 885 1459">\$ 92.586.512</td> <td data-bbox="966 1402 1023 1459">8</td> <td data-bbox="1023 1402 1079 1459">10</td> <td data-bbox="1079 1402 1161 1459">2020</td> <td data-bbox="1193 1402 1250 1459">8</td> <td data-bbox="1250 1402 1307 1459">9</td> <td data-bbox="1307 1402 1401 1459">2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1459 540 1516">Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td data-bbox="540 1459 678 1516"></td> <td data-bbox="678 1459 885 1516"></td> <td data-bbox="966 1459 1023 1516"></td> <td data-bbox="1023 1459 1079 1516"></td> <td data-bbox="1079 1459 1161 1516"></td> <td data-bbox="1193 1459 1250 1516"></td> <td data-bbox="1250 1459 1307 1516"></td> <td data-bbox="1307 1459 1401 1516"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1516 540 1575">Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td data-bbox="540 1516 678 1575">20%</td> <td data-bbox="678 1516 885 1575">\$ 185.173.024</td> <td data-bbox="966 1516 1023 1575">8</td> <td data-bbox="1023 1516 1079 1575">10</td> <td data-bbox="1079 1516 1161 1575">2020</td> <td data-bbox="1193 1516 1250 1575">8</td> <td data-bbox="1250 1516 1307 1575">5</td> <td data-bbox="1307 1516 1401 1575">2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1575 540 1631">Calidad de Estudios y Diseños</td> <td data-bbox="540 1575 678 1631">30%</td> <td data-bbox="678 1575 885 1631">\$ 277.759.534,80</td> <td data-bbox="966 1575 1023 1631">8</td> <td data-bbox="1023 1575 1079 1631">5</td> <td data-bbox="1079 1575 1161 1631">2021</td> <td data-bbox="1193 1575 1250 1631">8</td> <td data-bbox="1250 1575 1307 1631">20</td> <td data-bbox="1307 1575 1401 1631">2026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1631 540 1688">Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td data-bbox="540 1631 678 1688">30%</td> <td data-bbox="678 1631 885 1688">\$ 277.759.534,80</td> <td data-bbox="966 1631 1023 1688">8</td> <td data-bbox="1023 1631 1079 1688">5</td> <td data-bbox="1079 1631 1161 1688">2021</td> <td data-bbox="1193 1631 1250 1688">8</td> <td data-bbox="1250 1631 1307 1688">20</td> <td data-bbox="1307 1631 1401 1688">2026</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 92.586.512	8	10	2020	8	9	2021	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 185.173.024	8	10	2020	8	5	2024	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 277.759.534,80	8	5	2021	8	20	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 277.759.534,80	8	5	2021	8	20	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Cumplimiento	10%	\$ 92.586.512	8	10	2020	8	9	2021																																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 185.173.024	8	10	2020	8	5	2024																																																										
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 277.759.534,80	8	5	2021	8	20	2026																																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 277.759.534,80	8	5	2021	8	20	2026																																																										
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>CG-1022610</u></p>																																																																		
<p>Certificado de modificación o anexo No.: <u>2</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p>																																																																		
<p>Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS MUNDIAL</u></p>																																																																		

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 175.560.600	8	10	2020	8	5	2021	
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.CG-1004225 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 1

Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma Rodrigo Díaz B.

Nombre: RODRIGO DIAZ B.

Director de Interventoría

Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



NIT 860.037.013-5
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855 600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO
**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL**

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-06-PPSUS2R000000048

Nº. PÓLIZA	CG-1004225	Nº. ANEXO	1	Nº. CERTIFICADO	40135148	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2020	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas del 08/10/2020	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas del 08/05/2021	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLE

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00	SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00	SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	Mínimo: 4.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00	SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	Mínimo: 4.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00	SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	Mínimo: 2.00 SMMLV

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA ACLARACION EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.





"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	CG-1022610	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	40135296	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	10/11/2020	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas del 08/10/2020	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas del 08/05/2026	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
					N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S					No. DOC. IDENTIDAD	900.448.041-0
DIRECCIÓN	TV 7.2 264 RSR SANTA ROSALIA					TELÉFONO	8658642
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.059-1
DIRECCIÓN	CARRETERA TURRACO KM 3					TELÉFONO	3102843704
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.059-1
DIRECCIÓN	CARRETERA TURRACO KM 3					TELÉFONO	3102843704

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LO SIGUIENTE EN LA PRESENTE PÓLIZA:

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

ADICIONAL SE INCLUYE AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUERDO A CONTRATO INICIAL

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. SI-C-1808 DE 2020, CUYO OBJETO ES

: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 08/10/2020	24:00 Horas del 08/09/2021	92,586,512.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 08/10/2020	24:00 Horas del 08/05/2024	185,173,024.00	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 08/05/2021	24:00 Horas del 08/05/2026	277,759,535.00	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 08/05/2021	24:00 Horas del 08/05/2026	277,759,534.80	2,501,206.00
TOTAL ASEGURADO			833,278,605.80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COLOMBIANA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/11/2020				

PRIMA BRUTA	\$	2,501,206.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	2,501,206.00
GASTOS EXP.	\$	0.00
IVA	\$	475,229.00
TOTAL A PAGAR	\$	2,976,435.00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONCORDANCIA DEL CUENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANDERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA GARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.	Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.	Líneas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713
---	---	--

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.5735405
Referencia de la garantía 1004225
Estado Aprobada
Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
☒ Cumplimiento - Otros
☒ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía ☐ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☒ Garantía bancaria
Garante GOBERNACION DE BOLIVAR
Sub-tipo de garantía Garantía bancaria
Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	833.278.605 COP	8/05/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	185.173.024 COP	8/05/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	277.759.535 COP	8/05/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Otros	92.586.512 COP	9/08/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	175.560.600 COP	8/05/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
☒ Cumplimiento - Otros
☒ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía ☐ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☒ Garantía bancaria
Garante GOBERNACION DE BOLIVAR
Sub-tipo de garantía Garantía bancaria
Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	833.278.605 COP	8/05/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	185.173.024 COP	8/05/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	277.759.535 COP	8/05/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Otros	92.586.512 COP	9/08/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	175.560.600 COP	8/05/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
po'liza varela.pdf	po'liza varela.pdf	Descargar	Detalle
Poliza_24_CG-1004225_1 (2) (1).pdf	Poliza_24_CG-1004225_1 (2) (1).pdf	Descargar	Detalle

[Cancelar](#)

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--------------------------------------

4.9.5 CONTRATO N°: LP-OP-001-2020 DE (24) DE AGOSTO DE 2020: CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA 2020

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)
-------	-------------	-------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA 2020

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL-VÍA QUE VA DEL CORREGIMIENTO DE GUAYAMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES

FECHA DE INICIO: 17/11/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/06/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 1.073.602.538

VALOR ACUMULADO: \$ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 14.767.805,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 722 DEL 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO BOLÍVAR 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																							
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																				
Cumplimiento	10%	\$ 107.360.253,80	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr> <tr> <td>24</td><td>8</td><td>2020</td><td>24</td><td>9</td><td>2021</td></tr> <tr> <td>24</td><td>8</td><td>2020</td><td>24</td><td>3</td><td>2024</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Desde			Hasta			24	8	2020	24	9	2021	24	8	2020	24	3	2024																		
Desde			Hasta																																				
24	8	2020	24	9	2021																																		
24	8	2020	24	3	2024																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 107.360.253,80																																					
Calidad de Estudios y Diseños																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 322.080.761,40	5 AÑOS																																				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000012591

Certificado de modificación o anexo No.: 0
Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	---

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 175.560.600	24	8	2020	21	3	2021	
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.540-74-994000002870 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:
 Las pólizas: 540-74-994000002870 y 540-47-994000012591 aprobadas mediante la Resolución N° 1711 Con fecha 24 de SEPTIEMBRE del año _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma Rodrigo Díaz B.
 Nombre: RODRIGO DIAZ B.
 Director de Interventoría
 Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



NIT: 800.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP00V4



NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5401207807

PÓLIZA No: 540-47-994000012591

ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA	COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 09 2020	
FECHA DE IMPRESIÓN: 17 09 2020	
DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE: CONSORCIO PLACA HUELLA 2020	IDENTIFICACIÓN: NIT 901.404.303-1
DIRECCIÓN: CL 26 16 A 95 OF 201	CAJAS: 3002161535

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.038.613-1
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.038.613-1

AMPAROS			
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	24/08/2020	24/09/2021	107.360.253.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	24/08/2020	24/03/2024	107.360.253.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		322.080.761.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS			
NIT 806008050	-	RODRIGUEZ & CARVAJAL LTDA	- PART: 90.00%
NIT 900775192	-	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS	- PART: 10.00%

BENEFICIARIOS	
NIT 800038613 - MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DECONTRATO NO. 001 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL- VIA QUE VA DEL CORREGIMIENTO DE GUAYAMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES
*** NOTA ACLARATORIA ***

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	TVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****536,801,269.00	\$ *****3,802,494	\$****15,000.00	\$ *****725,324	\$ *****4,542,818
NOMBRE INTERMEDIARIO:	CLASE:	%PART:	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO:	%PART:
SANDRA PATRICIA BARRERA MORALES	8852	100.00		

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.	
FIRMA ASEGURADOR	FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADOR: Calle 100 No. 94-45 Piso 6 y 12 Bogotá	CLIENTE:
---	----------

CBDC20790D0FFB743F

Escaneado con CamScanner



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No. PÓLIZA: 994000012591 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSORCIO PLACA NUELLA 2020	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.404.303-1
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.038.613-1
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.038.613-1

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
MUNICIPIO DE CORDOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Calle 3 # 2-01 Centro Administrativo Municipal (CAM)
Córdoba Bolívar - NIT 800.038.613-1



Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma Aseg/Actual
Predios, labores y operaciones	24/08/2020	24/03/2021	\$175,560,600.00

Con lo cual se garantiza el cumplimiento y ejecución del requerido contrato.

3. Que de conformidad a la Ley 80 y la Ley 1150 de 2007, la Alcaldía Municipal procede a aprobar la requerida Póliza.
4. Que por lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese Pólizas NO: 540-47-994000012591 de cumplimiento estatal y 540-74-994000002870 de responsabilidad civil extracontractual de la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, de fecha 17 de septiembre de 2020 constituida por CONSORCIO PLACA HUELLA 2020, para garantizarle al Municipio el cumplimiento y ejecución del contrato de el **"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - VIA QUE VA DEL CORREGIMIENTO DE GUAYMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES"**.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de aprobación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Córdoba Bolívar a los 24 días del mes de septiembre de 2020.

REGULO RODRÍGUEZ BEJARANO
Alcalde Municipal
Córdoba-Bolívar

Web: www.cordoba-bolivar.gov.co
Correo: contactenos@cordoba-bolivar.gov.co

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

- **CONTRATO N°LP-002-2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL – MARIA LA BAJA BOL.**
Se solicitó al contratista el plan de Calidad mediante oficios CB2020-02-2020 y CB2020-10-2020, a la fecha del presente informe no ha sido entregado.
- **CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S. – SAN JUAN NEPOMUCENO BOL.**

El contratista entrego el plan de Calidad, el cual fue revisado por la Interventoría, dando origen a varias observaciones y solicitudes para complementar la información presentada, tales como incluir el Plan de inspección, medición y ensayo, Reportes de no conformidades, Quejas y reclamos e Índices de gestión (Para cada objetivo de calidad del plan de calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento).

Inmediatamente el Contratista entregue la información solicitada se adjuntará el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.11.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

- **CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S. – MUNICIPIO DE SAN JUAN**

El contrato de obra N° LP-N-002-20200801001 no contempla pago de anticipo, por lo cual no aplican los formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y MINFRA-MN-IN-2-FR-2.

- **CONTRATO N° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL.**

El Contrato de Obra especifica en la cláusula CUARTA que se pagará por concepto de anticipo equivalente el treinta por ciento (30 % ES DECIR \$320.288.269. TRECIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS) del valor total del contrato, sin que su pago sea requisito de inicio de la ejecución del contrato, previa aceptación de la garantía única por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE y cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.

A la fecha del presente informe no se ha realizado aún el pago del anticipo.

El contratista presento el plan de inversión del anticipo el día 29 de octubre de 2020, el cual fue revisado y no aprobado por la Interventoría, debido que este no se encontraba acorde a la programación de obra, el plan de inversión y flujo de caja, el contratista subsano la información sin embargo, el plan de manejo del anticipo mensualizado para el mes 4 sobrepasa el monto máximo programado para este periodo.

Se solicitó al contratista realizar el ajuste correspondiente.

A continuación, se adjunta el informe de la fiduciaria y el formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA se adjuntará una vez haya sido aprobado el plan de inversión del anticipo.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

SERVITRUST GNB
SUDAMERIS

NIT. 800168763-5

Cartagena, 19 de octubre de 2020

SGNBSC-2020-3374

Señores

CORPORACIÓN SER SOCIAL

Atte. Dr. Alvaro Perez Severiche

Representante Legal

Calle San Vicente No. 10 B - 19 Versalles

Magangué

INFORME MENSUAL - SEPTIEMBRE DE 2020
3-1-93876 P. A. MANEJO ANTICIPO SER SOCIAL
Contrato de Fiducia Mercantil, Suscrito el 4 de agosto de 2020

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, título quinto, capítulo primero: "DISPOSICIONES APLICABLES A LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS" establece en su numeral 6.2 Informes periódicos: "Sin perjuicio de la obligación de rendición comprobada de cuentas, cuando por su importancia resulte necesario o cuando se establezca una obligación contractual en ese sentido, la fiduciaria deberá remitir al fideicomitente o al beneficiario un reporte sobre hechos relevantes que afecten el negocio y las actividades llevadas a cabo frente a los mismos".

Concordantemente con la obligación contractualmente establecida en el Capítulo VII, Numeral 7.4, literal c, remitimos para su conocimiento, la siguiente información:

1. INGRESOS: Corresponden a los recursos provenientes del contrato de Obra Pública No. LP-002-2020 suscrito entre el Municipio de María La Baja y Corporación Ser Social, cuyo objeto es mejoramiento de las vías terciarias: Troncal - Retiro Nuevo - Flamenco Nanguma (incluye tramo Flamenco - Correa) en el municipio de María la Baja, Departamento de Bolívar en el marco del convenio interadministrativo No. 586 del 2020 suscrito entre Invias y el Municipio de María la Baja.

A la fecha de corte del presente informe, no han ingresado recursos al fideicomiso

2. ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

2.1 CUENTAS BANCARIAS Y/O ENCARGOS: Los dineros antes mencionados son administrados a través de las siguientes cuentas y/o encargos. Se anexan extractos del mes de septiembre de 2020:

Banco GNB Sudameris N° 90550940460 - PA Manejo Anticipo Ser Social

2.2. PARTIDAS CONCILIATORIAS: Al corte del presente informe no se presentan las siguientes partidas conciliatorias.

3. EGRESOS: al corte del presente informe, no se han realizado giros en el fideicomiso.

4. CUENTAS POR COBRAR: Al corte del presente informe no se presentan cuentas por



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



cobrar.

5. CUENTAS POR PAGAR: Al corte del presente informe no se presentan cuentas por pagar.

6. PROVISIONES Y RESERVAS: El contrato de fiducia no establece provisión ni reserva de recursos.

7. SALDO DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS: Dado que no han ingresados recursos al fideicomiso, el saldo neto de los bienes fideicomitidos es Ceros Pesos **(0.00)**.

8. OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En virtud del Contrato Fiduciario, no existen quejas o reclamos en curso por parte de cualquier persona natural o jurídica, ni condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos dentro del mismo.


No se tiene conocimiento de hechos adicionales de carácter económico, jurídico, administrativo o contable que incidan en el desarrollo normal del contrato fiduciario.

En los archivos de Servitrust GNB Sudameris S.A. se encuentran los documentos que soportan tanto la información suministrada en el presente documento, como las operaciones registradas en los Estados Financieros adjuntos.

Si dentro de los quince (15) días comunes siguientes a la fecha de recibo del presente informe la Fiduciaria no ha recibido observación alguna de su parte, este se entenderá totalmente aceptado.

Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores Ltda., Calle 100 No. 11A-35, piso 6 Bogotá.

Cordialmente,


JOHNNY GUZMAN PEÑA
Coordinador de Operaciones Fiduciarias



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".


CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

- **CONTRATO N°: LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020. CONTRATISTA: DEIVIS PEREZ S. MUNICIPIO DEL GUAMO.**

El contratista envió en plan de inversión del anticipo, se le solicito que entregue la programación de obra, plan de inversión y flujo de caja del contrato, la interventoría está a la espera de la información antes mencionada para su revisión.

4.11.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

- **CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S. – MUNICIPIO DE SAN JUAN.**

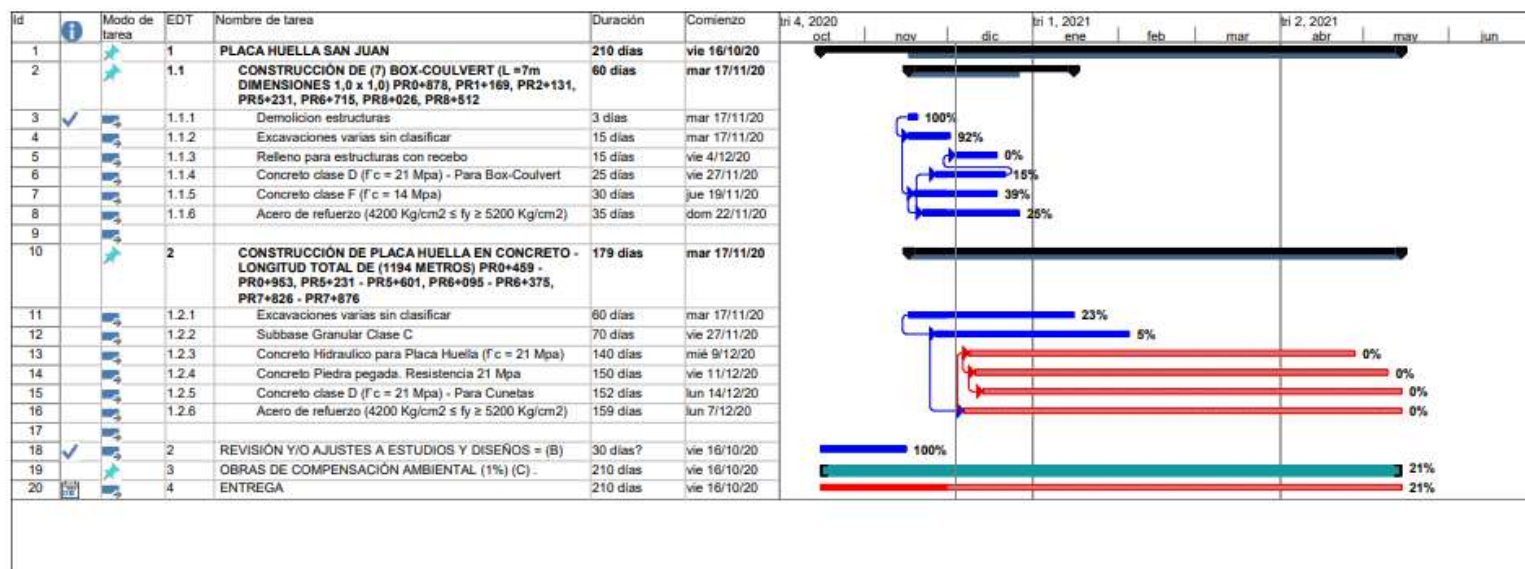


En la programación de obra se muestra el % de ejecución programada a fecha 30 de noviembre de 2020.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

- **CONTRATO N° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL.**

El contratista presento una reprogramación de las obras acorde con los plazos contractuales establecidos en el Contrato, la cual se muestra a continuación evidenciando el porcentaje de avance programado a fecha 30 de Noviembre de 2020.

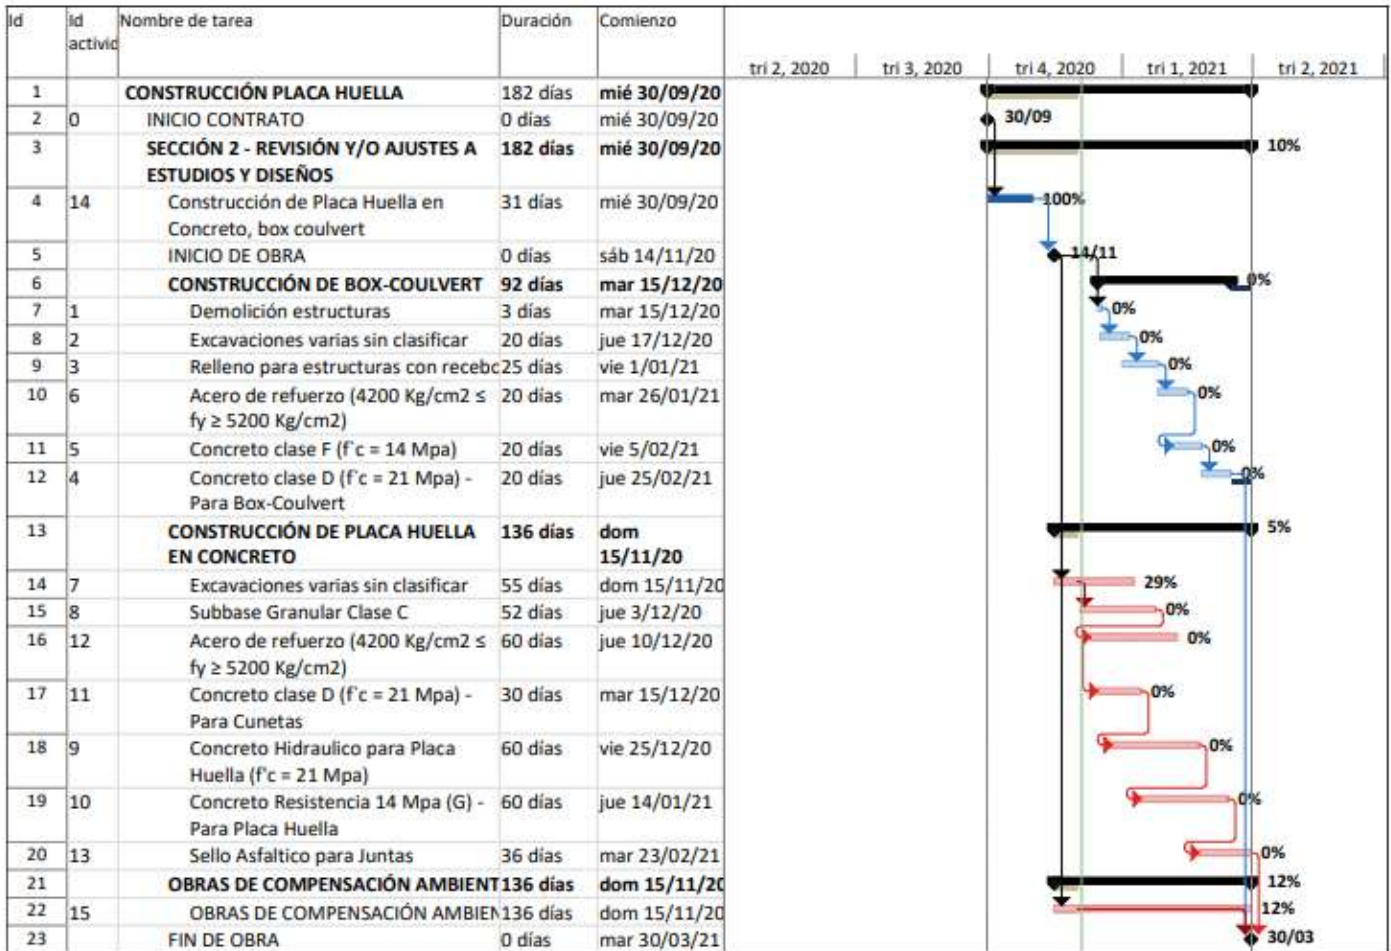

De acuerdo a la reprogramación el contratista no presenta retrasos en la ejecución.

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

4.11.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

- **CONTRATO N° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL.**

Nombre de tarea	Costo	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	\$ 1.067.627.566	\$ 372.564	\$ 11.176.910	\$ 3.431.119	\$ 268.381.763	\$ 451.409.881	\$ 232.006.248	\$ 100.849.081
INICIO CONTRATO	\$ -							
SECCIÓN 2 - REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.067.627.566							
Construcción de Placa Huella en Concreto, box coulvert	\$ 11.549.474	\$ 372.564	\$ 11.176.910					
INICIO DE OBRA	\$ -							
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	\$ 114.843.896							
Demolición estructuras	\$ 391.540				\$ 391.540			
Excavaciones varias sin clasificar	\$ 6.666.433				\$ 4.999.825	\$ 1.666.608		
Relleno para estructuras con recebo	\$ 25.817.788					\$ 25.817.788		
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 $\leq$ fy $\geq$ 5200 Kg/cm2)	\$ 33.886.440					\$ 10.165.932	\$ 23.720.508	
Concreto clase F (f'c = 14 Mpa)	\$ 3.009.090						\$ 3.009.090	
Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Box-Coulvert	\$ 45.072.605						\$ 9.014.521	\$ 36.058.084
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO	\$ 930.457.651							
Excavaciones varias sin clasificar	\$ 7.436.310			\$ 2.163.290	\$ 4.191.375	\$ 1.081.645		
Subbase Granular Clase C	\$ 144.551.629				\$ 80.615.332	\$ 63.936.297		
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 $\leq$ fy $\geq$ 5200 Kg/cm2)	\$ 188.254.668				\$ 69.026.712	\$ 97.264.912	\$ 21.963.045	
Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas	\$ 121.849.824				\$ 69.048.234	\$ 52.801.590		
Concreto Hidraulico para Placa Huella (f'c = 21 Mpa)	\$ 322.734.240				\$ 37.652.328	\$ 166.746.024	\$ 118.335.888	
Concreto Resistencia 14 Mpa (G) - Para Placa Huella	\$ 98.242.220					\$ 29.472.666	\$ 45.846.369	\$ 22.923.185
Sello Asfaltico para Juntas	\$ 47.388.760						\$ 7.898.127	\$ 39.490.633
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	\$ 10.776.545							
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	\$ 10.776.545			\$ 1.267.829	\$ 2.456.418	\$ 2.456.418	\$ 2.218.700	\$ 2.377.179
FIN DE OBRA	\$ -							

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	--	-----------------------------------

- **CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET-CONCIVIL S.A.S.**

El Contratista no ha presentado el plan de Inversión, en cuanto se haya presentado, se revisará. En caso de ser aprobado se compartirá en el próximo informe.

- **CONTRATO N°: LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020. CONTRATISTA: DEIVIS PEREZ S.**

El Contratista no ha presentado el plan de Inversión, en cuanto se haya presentado, se revisará. En caso de ser aprobado se compartirá en el próximo informe.

- **CONTRATO N°: SI-C-1808 DE 2020: CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S**

El Contratista no ha presentado el plan de Inversión, en cuanto se haya presentado, se revisará. En caso de ser aprobado se compartirá en el próximo informe.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-------------------------------

4.11.5 ACTAS DE INICIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
 MUNICIPIO DE CÓRDOBA
 ALCALDÍA MUNICIPAL
 OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
 Calle 3 # 2-01 Centro Administrativo Municipal (CAM)
 Córdoba Bolívar - NIT 800.038.613-1



ACTA DE INICIO

CONTRATO	LP-OP-001-2020
TIPO DE CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO PLACA HUELLA 2020
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901.404.303-1
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL – VIA QUE VA DEL CORREGIMIENTO DE GUAYMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CÓRDOBA BOLÍVAR
VALOR DEL CONTRATO	MIL SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (1.073.602.538.00) M/L
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la oficina de planeación y obras públicas, se reunieron WILLIAM ANTONIO TORRES MEZA, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de supervisor del contrato, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.143.462.088, secretario de planeación y obras públicas del municipio, el señor RODRIGO DÍAZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.226.319 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal suplente y testigo del CONSORCIO BOLIVAR 2020 de la Interventoría contratada por INVIAS y por otra parte, MARCOS ANTONIO TEJADA REYES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.537.272 de Sincelejo Sucre, representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA 2020 identificado con NIT N° 901.404.303-1, en calidad de CONTRATISTA con el objeto de iniciar las actividades del contrato LP-OP-001-2020 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
MUNICIPIO DE CÓRDOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Calle 3 # 2-01 Centro Administrativo Municipal (CAM)
Córdoba Bolívar - NIT 800.038.613-1



CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO IMPLEMENTACION
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL – VIA QUE VA DEL CORREGIMIENTO
DE GUAYMARAL AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES.

Para constancia se firma, en el Municipio de Córdoba Bolívar, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).


WILLIAM ANTONIO TORRES MEZA
Supervisor


MARCOS ANTONIO TEJADA REYES
Contratista


RODRIGO DIAZ MARTINEZ
CONSORCIO BOLIVAR 2020
Representante legal suplente
TESTIGO



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ACTA DE INICIO CONTRATO No.SI-C 1808-2020	
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SAN JACINTO	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C 1808-2020	OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".
VALOR CONTRATO: \$925.865.116	DURACIÓN: SIETE (07) MESES, plazo de ejecución que se contará a partir de la fecha de la presente Acta de Inicio
FECHA DE INICIACION DE OBRAS: NOVIEMBRE 20 DE 2020.	
<p>CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. - INCOCESAR S.A.S. NIT. 900.448.041-0, Rep. Legal: CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENTAND</p> <p>INTERVENTOR: CONSORCIO BOLIVAR 2020 NIT. 901.380.457-1, Rep. Legal: RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA - Contrato De Consultoría No.772-2020</p> <p>SUPERVISOR DESIGNADO: LUIS CARLOS GARCÉS FERNÁNDEZ - Resolución No.027 del 16 de octubre de 2020</p>	
<p>En el sitio de la obra se reunieron los señores: CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENTAND, en representación del Contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. - INCOCESAR S.A.S., RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA en representación de la Interventoría CONSORCIO BOLIVAR 2020 y LUIS CARLOS GARCÉS FERNÁNDEZ, en calidad de Supervisor designado del contrato; reunidos con el fin de INICIAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra SI-C 1808-2020 del 08 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra debidamente perfeccionado y legalizado.</p>	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE BOLIVAR

ACTA DE INICIO CONTRATO No. SI-C 1808-2020

OBSERVACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO: 1. Toda la zona donde se realizarán las obras, se encuentra libre de cualquier obstáculo que impida el comienzo y desarrollo normal del contrato, razón por la cual, en la fecha, se le hace entrega al Contratista del sitio de trabajo.

OBSERVACIONES GENERALES: 1. Con la entrega del sitio de trabajo se da inicio a las obras del presente contrato. 2. El Contratista ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones del Interventor y la Gobernación de Bolívar. 3. El Contratista se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción y las cláusulas exigidas en el contrato. 4. El Contratista se compromete a colocar durante la ejecución de la obra, los profesionales con las calidades y dedicación estipulada en el pliego de condiciones y documentos del proceso de contratación. 5. El Contratista presentará un programa de actividades de acuerdo con el tiempo estipulado para realizar las obras. 6. El Contratista se compromete a cumplir con la totalidad de los factores de calidad ofrecidos en el proceso de contratación. 7. El contratista se compromete a dar estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad (Resoluciones N°666 y N°679 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud).

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de **NOVIEMBRE** de 2020.


**CESAR AUGUSTO CARABALLO
ROSENTAND**
R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
DEL CESAR S.A.S. - INCOCESAR S.A.S.
CONTRATISTA


**RODRIGO ALBERTO DIAZ
BENJUMEA**
R.L. CONSORCIO BOLIVAR 2020
INTERVENTORIA


LUIS CARLOS GARCÉS FERNANDEZ
GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
SUPERVISOR DESIGNADO



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

4.12 ACTAS DE REUNION VEEDURIAS CIUDADANAS

- CONTRATO N°: SI-C-1808 DE 2020: CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de San Jacinto el día 19 mes Noviembre de 2020, se reunió una Asamblea compuesta por líderes del organismo Comunal, con el objeto de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadano y cada ciudadana el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores(as) a los (las) siguientes ciudadanos(as), según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003

Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Dirección y Teléfono	Sector
Maria Vasquez Miranda	32286606	3113339132	Areas
Erick Escudon	9173266		Areas
Gustavo Berrieta	9174242		Areas
Sandra Castro Gomez	40573493	3113058061	Areas
Omar Castro Gomez	9176616	3116274034	Areas

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Area Inzo", estará domiciliada en Cantagaita Areas y tendrá una duración de _____

La Asamblea aprueba esta designación y la lista de asistentes a esta Jornada de Promoción obra como aval de esta acta, debido a que fue en el acto de este ejercicio que se conformó la veeduría.

TERCERO: El grupo de veedores(as) elige democráticamente como su coordinador(a) o presidente(a) a Maria Vasquez Miranda y como secretario(a) a Omar Castro Gomez.

CUARTO: El grupo de control social se compromete a realizar informes periódicos de su labor y a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos y la comunidad. Todos sus aportes seguirán los principios que rigen el control social, consignados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

QUINTO: Las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

FIRMAS

Nombre y apellidos	C.C.	FIRMA
Maria Vasquez Miranda	32286606	<i>Maria Vasquez</i>
Erick Escudon	9173266	<i>Erick Escudon</i>
Gustavo Berrieta	9174242	<i>GUSTO B</i>
Sandra Castro Gomez	40573493	<i>Sandra Castro</i>
Omar Castro Gomez	9176616	<i>Omar Castro</i>

Dada en el Municipio de San Jacinto a los días 19 del mes de Noviembre del año 2020.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JACINTO, BOLIVAR
NIT: 800026685-1



San Jacinto
primero



ACTIVIDAD: Socialización Proyecto Vía Terciaria
San Jacinto - Arroyo
CONTROL DE ASISTENCIA
FECHA: 19 de mayo de 2020 HORA: 10:00 A.M.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Sandra Castro Arce		3113003461		Sandra
Alfonso Guerrero de Pte J.A.C		3113557132		Alfonso
Leonardo Ortega		313547169		Leonardo
Ricardo Cardona				Ricardo
Alexander Villalba				Alexander
Orlando Acosta				Orlando
Diego Luis Barrio Uceda		300341538		Diego
Edison Llo		412242		Edison
David y Guadalupe Aguilar Zuluaga		901-209-1814		David y Guadalupe
Orlando Castro G.		3116414034		Orlando
Carla Lynn Ortega	Universidad	301594937		Carla
Jose A. Carpio M.	Universidad	3009442257		Jose A.
GAS+AV				GAS+AV
Mary Viana Perez	San Jacinto	300458208	maryviana23@gmail.com	Mary Viana
Claudia Ruiz	Interventoría	3002390033	consorcioav2020@gmail.com	Claudia
JAVIER VARELA DE LA CRUZ	CONSTRUCTORA	3106501202	JAVIERVA@HOTMAIL.COM	JAVIER

Colombia, Departamento de Bolívar, Municipio de San Jacinto.
Dirección: Calle 22 Número 39-30, Barrio Centro. Código Postal: 132030
Despacho Alcalde: 3145366734
Email: contactenos@sanjacinto-bolivar.gov.co alcaldia@sanjacinto-bolivar.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JACINTO, BOLIVAR
NIT: 800026685-1



San Jacinto
primero



ACTIVIDAD: Socialización Proyecto Vía Terciaria
San Jacinto - Arroyo
CONTROL DE ASISTENCIA
FECHA: 19 de mayo de 2020 HORA: 10:00 A.M.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Alfonso Guerrero de Pte J.A.C	Interventoría	3113557132	alfonso.guerrero@sanjacinto-bolivar.gov.co	Alfonso
Diego Luis Barrio Uceda	Interventoría	300341538	diego@sanjacinto-bolivar.gov.co	Diego
Orlando Castro G.	Interventoría	3116414034	orlando@sanjacinto-bolivar.gov.co	Orlando
Carla Lynn Ortega	Universidad	301594937	carla@sanjacinto-bolivar.gov.co	Carla
Jose A. Carpio M.	Universidad	3009442257	jose@sanjacinto-bolivar.gov.co	Jose A.
GAS+AV				GAS+AV
Mary Viana Perez	San Jacinto	300458208	maryviana23@gmail.com	Mary Viana
Claudia Ruiz	Interventoría	3002390033	consorcioav2020@gmail.com	Claudia
JAVIER VARELA DE LA CRUZ	CONSTRUCTORA	3106501202	JAVIERVA@HOTMAIL.COM	JAVIER

Colombia, Departamento de Bolívar, Municipio de San Jacinto.
Dirección: Calle 22 Número 39-30, Barrio Centro. Código Postal: 132030
Despacho Alcalde: 3145366734
Email: contactenos@sanjacinto-bolivar.gov.co alcaldia@sanjacinto-bolivar.gov.co

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	---

4.12.1 INFORME SEMANAL

CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S. – MUNICIPIO DE SAN JUAN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																																																											
			VERSIÓN	1																																																																											
			PÁGINA	1	DE	1																																																																									
			FECHA	06 (Día)	noviembre (Mes)	2020 (Año)																																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																															
PROYECTO/CARRETERA:		SAN JUAN - SAN JOSE DEL PEÑON (PORQUERAS)		TRAMO Y/O SECTOR(S): K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876																																																																											
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		BOLÍVAR																																																																									
				SEMANA No.:		3 del 31/10/2020 al 6/11/2020 (Numeración consecutiva)																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:		CARMEN C PEREZ LOPEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:				OSCAR TRIANA																																																																							
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR				FECHA DE INICIO:		16/10/2020																																																																							
KM A MEJORAR:		1,194	KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	1,194	No. PUENTES:																																																																								
					OTROS:	PLACA HUELLA 1,194 Km, 7 BOX CULVERT																																																																									
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																											
CONTRATISTA:		MET-CONCIVIL SAS		INTERVENTOR:		CONSORCIO BOLÍVAR 2020																																																																									
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:		CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGEOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS																																																																									
						D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S																																																																									
CONTRATO No.		LP-N-002-20200801001 DE 1 AGOSTO DE 2020	VALOR INICIAL:	\$	1.067.909.524,00	CONTRATO No.	722 DEL 2020																																																																								
PLAZO INICIAL:		7 MESES	ADICIONES:	\$	-	PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE 2020																																																																								
PLAZO ACUMULADO:			VALOR ACUMULADO:	\$	1.067.909.524,00	PLAZO ACUMULADO:																																																																									
						VALOR ACUMULADO:	\$ 746.157.896,00																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																															
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX																																																																											
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.067.909.524			\$	-																																																																										
EJECUTADO	\$ 6.781.241	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																										
(Indicar valores en pesos)																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 1.067.909.524,00</td> <td>EJECUTADO ACUMULADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ 6.781.241</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>0,64%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 6.781.241</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td></td> <td>VALOR FACTURA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td> <td></td> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Se debe presentar la primera factura del contrato</td> <td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.067.909.524,00	EJECUTADO ACUMULADO:		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 6.781.241			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,64%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -			(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 6.781.241							PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO					MES FACTURADO:		MES FACTURADO:		VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:				NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -			PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL		Se debe presentar la primera factura del contrato		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
OBRA		INTERVENTORIA																																																																													
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.067.909.524,00	EJECUTADO ACUMULADO:																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 6.781.241																																																																														
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,64%																																																																														
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -																																																																														
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)																																																																															
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 6.781.241																																																																														
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																												
MES FACTURADO:		MES FACTURADO:																																																																													
VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:																																																																													
		NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO																																																																													
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -																																																																												
		PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL																																																																													
Se debe presentar la primera factura del contrato		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																													
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																															



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	90	90	90	Placa Huella Existente	90
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):					
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):					
KM SUBBASE (Km):					
KM BASE (Km):					
KM PAVIMENTADOS (Km):					
PROTECCION DE TALUDES (Km):					
OTROS: DISIPADORES					

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876, En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Jurisdicción San Juan La Haya KM 13
9 Hectárea(s) y 8681 mt(s)²

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entregada por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	☒	NO	☐	N/A	☐
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
Ocupación de CAUCES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
VERTIMENTOS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
EMISIONES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
OTROS (Especificar cual)	SI	☐	NO	☐	N/A	☐

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CONTINUA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA. EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIJAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A
AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	_____	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____
OTROS:	_____		

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Entrega de modelo de Valla informativa
Entrega de carteras topográficas transversales de Detalle de las obras a construir Box y/o Alcantarillas (cotas entrada y cotas de salida)
Entrega de carteras topográficas transversales de Detalle de los tramos de placa huella a construir
Entrega de correcciones Diseño de curvas verticales

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega corregida las carteras topográficas transversales de Detalle de las obras a construir Box y/o Alcantarillas (cotas entrada y cotas de salida)
Entrega corregida las carteras topográficas transversales de Detalle de los tramos de placa huella a construir
Entrega de Balance de obra, para análisis de interventoría
Entrega de corrección de Diseño de Curvas verticales (Perfil longitudinal)

RUTA No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1



Fotografía N° 2. Topografía



Fotografía N° 3.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL
TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DIAZ B.

No. MAT:

Invias - Gestión Pública con Calidad

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA	1	DE	1	
		FECHA		13	noviembre	2020	
				(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO/CARRETERA:	SAN JUAN - SAN JOSE DEL PEÑON (PORQUERAS)			TRAMO Y/O SECTOR(S): K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOLÍVAR		SEMANA No.:	4 del 7/11/2020 al 13/11/2020
				(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	CARMEN C PEREZ LOPEZ			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR TRIANA			
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDTE DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR					FECHA DE INICIO: 16/10/2020	
KM A MEJORAR:	1,194	KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	1,194	No. PUENTES:	
				OTROS: PLACA HUELLA 1,194 Km, 7 BOX CULVERT			

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	MET-CONCIVIL SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO BOLÍVAR 2020		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS		
					D&B INGENIEROS IVILES S.A.S		
CONTRATO No.	LP-N-002-20200801001 DE 1 AGOSTO DE 2020	VALOR INICIAL:	\$ 1.067.909.524,00	CONTRATO No.	722 DEL 2020	VALOR INICIAL:	\$ 746.157.896,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	\$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE 2020	ADICIONES:	\$ -
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$ 1.067.909.524,00	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$ 746.157.896,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
VIGENCIA	2020		2021		2022		20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$	1.067.909.524			\$		-
EJECUTADO	\$	7.157.976	\$	-	\$	-	-
(Indicar valores en pesos)							

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.067.909.524,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	7.157.976	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		0,67%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	7.157.976	
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO	
		X	
MES FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:		
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:			
Se debe presentar la primera factura del contrato			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			

INTERVENTORÍA			
EJECUTADO ACUMULADO:			
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO	
		X	
MES FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:		
NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO			
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN:	\$	-	
PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".


CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO				
	1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95	95	95	Placa Huella Existente	95
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):					
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):					
KM SUBBASE (Km):					
KM BASE (Km)					
KM PAVIMENTADOS (Km)					
PROTECCION DE TALUDES (Km)					
OTROS: DISIPADORES					

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876, En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras



1	2	3	4	TOTAL

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Jurisdicción San Juan La Haya KM 13
9 Hectárea(s) y 8681 m²(s)

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	☒	NO	☐	N/A	☐
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
Ocupación de CAUCES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
VERTIMENTOS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
EMISIONES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
OTROS (Especificar cual)	SI	☐	NO	☐	N/A	☐

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CONTINUA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA. EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERORIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ N/A
AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	_____	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____
OTROS:	_____		

OBSERVACIONES

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Entrega corregida las carteras topograficas transversales de Detalle de las obras a construir Box y/o Alcantarillas (cotas entrada y cotas de salida)
Entrega corregida las carteras topograficas transversales de Detalle de los tramos de placa huella a construir
Entrega de Balance de obra, para analisis de interventoria
Entrega de corrección de Diseño de Curvas verticales (Perfil longitudinal)




"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Valla informativa

RUTA No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRO FOTOGRAFICO



Fotografía N° 1



Fotografía N° 2. Topografía



Fotografía N° 3.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRIA, LIMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL
TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES. CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DIAZ MARTINEZ

No. MAT:

18648

Invias - Gestión Pública con Calidad



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-2					
					VERSIÓN		1					
					PÁGINA		1		DE		1	

FECHA				20		noviembre		2020	
				(Día)		(Mes)		(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

SAN JUAN - SAN JOSE DEL PEÑON (PORQUERAS)

TRAMO Y/O SECTOR(S):

K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601,K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOLÍVAR

SEMANA No.:

5

del

14/11/2020

al

20/11/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

CARMEN C PEREZ LOPEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OSCAR TRIANA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDTE DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FECHA DE INICIO:

16/10/2020

KM A MEJORAR:

1.194

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

1.194

No. PUENTES:

OTROS:

PLACA HUELLA 1.194 Km, 7 BOX CULVERT

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

MET-CONCIVIL SAS

INTERVENTOR:

CONSORCIO BOLÍVAR 2020

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS,INGECOL PREMIUM SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS

CONTRATO No.

LP-N-002-20200801001 DE 1 AGOSTO DE 2020

VALOR INICIAL:

\$ 1.067.909.524,00

CONTRATO No.

722 DEL 2020

VALOR INICIAL:

\$ 746.157.896,00

PLAZO INICIAL:

7 MESES

ADICIONES:

\$ -

PLAZO INICIAL:

HASTA 31 DE 2020

ADICIONES:

\$ -

PLAZO ACUMULADO:

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.067.909.524,00

PLAZO ACUMULADO:

VALOR ACUMULADO:

\$ 746.157.896,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.067.909.524		\$	-
EJECUTADO	\$ 7.157.976	\$ -	\$ -	-

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 1.067.909.524,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 7.157.976

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

0,67%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ -

(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 7.157.976

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI

NO

X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA:

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Se debe presentar la primera factura del contrato

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI

NO

X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA:

FECHA FACTURA:

NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:

\$ -

PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO				TOTAL
	1	2	3	4	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95	95	95	Placa Huella Existente	95
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):					
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):					
KM SUBBASE (Km):					
KM BASE (Km):					
KM PAVIMENTADOS (Km):					
PROTECCION DE TALUDES (Km):					
OTROS: DISIPADORES					

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876, En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Jurisdicción San Juan La Haya KM 13
9 Hectárea(s) y 8681 mt(s)2

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	☒	NO	☐	N/A	☐
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
Ocupación de CAUCES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
VERTIMIENTOS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
EMISIONES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
OTROS (Especificar cual)	SI	☐	NO	☐	N/A	☐

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CONTINUA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUENCIA, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ N/A
AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Entrega de Planos detalles Box en AutoCAD (Diseño INVIAS)
Visita de campo en compañía de la Interventoría y Alcaldía (tramo 4)




"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Valla informativa

RUTA No.




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.


TRO FOTOGRAFICO



Fotografía N° 1 Tramo 4 - Placa Huella Existente



Fotografía N° 2. Planos detalles Box en AutoCAD (Diseño INVIAS)



Fotografía N° 3. Planos detalles Box en AutoCAD (Diseño INVIAS)

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRIA, LIMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL
TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES. CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ

No. MAT: 18648

Invias - Gestión Pública con Calidad

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA	1	DE	1	
		FECHA		30	noviembre	2020	
				(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO/CARRETERA:	SAN JUAN - SAN JOSE DEL PEÑON (PORQUERAS)			TRAMO Y/O SECTOR(S):	K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOLÍVAR		SEMANA No.:	6 del 24/11/2020 al 30/11/2020
				(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	CARMEN C PEREZ LOPEZ			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	OSCAR TRIANA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR					FECHA DE INICIO:	16/10/2020
KM A MEJORAR:	1,194	KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	1,194	No. PUENTES:	
				OTROS:	PLACA HUELLA 1,194 Km, 7 BOX CULVERT		

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	MET-CONCIVIL SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO BOLÍVAR 2020		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS		
					D&B INGENIEROS IVILES S.A.S		
CONTRATO No.	LP-N-002-20200801001 DE 1 AGOSTO DE 2020	VALOR INICIAL:	\$ 1.067.909.524,00	CONTRATO No.	722 DEL 2020	VALOR INICIAL:	\$ 746.157.896,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	\$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE 2020	ADICIONES:	\$ -
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$ 1.067.909.524,00	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$ 746.157.896,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
VIGENCIA	2020		2021		2022		20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$	1.067.909.524			\$		-
EJECUTADO	\$	7.157.976	\$	-	\$	-	-
(Indicar valores en pesos)							

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.067.909.524,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	7.157.976	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		0,67%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	7.157.976	
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO	
		X	
MES FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:		
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:			
Se debe presentar la primera factura del contrato			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			

INTERVENTORÍA			
EJECUTADO ACUMULADO:			
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO	
		X	
MES FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:		
NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO			
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN:	\$	-	
PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO				TOTAL
	1	2	3	4	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95	95	95	Placa Huelta Existente	95
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):					
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):					
KM SUBBASE (Km):					
KM BASE (Km)					
KM PAVIMENTADOS (Km)					
PROTECCION DE TALUDES (Km)					
OTROS: DISIPADORES					

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K0+459 - K0+953, K5+231 - K5+601, K6+095 - K6+375, K8+826 - K8+876, En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Jurisdicción San Juan La Haya KM 13
9 Hectárea(s) y 8681 mt(s)2

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	☒	NO	☐	N/A	☐
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
Ocupación de CAUCES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
VERTIMIENTOS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
EMISIONES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
OTROS (Especificar cual)	SI	☐	NO	☐	N/A	☐

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CONTINUA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ N/A
AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Entrega de Hojas de Vida
Entrega Plan de Calidad
Entrega Plan de Inversión y Flujo de Caja
Entrega Plan de manejo ambiental
Perfilación del terreno con motoniveladora

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Valla informativa
Entrega de Diseño de Curvas Horizontales
Entrega de Ensayo de CBR material Sub base y material de Sitio, entre otros

RUTA No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1



Fotografía N° 2.



Fotografía N° 3. Perfilación

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL
TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: RODRIGO DIAZ B.
No. MAT: 18648

Invías - Gestión Pública con Calidad

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2									
			VERSIÓN	1									
			PÁGINA		DE								
			FECHA	06 (Día)	noviembre (Mes)	2020 (Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL													
PROYECTO/CARRETERA:	MARIA LA BAJA - BOLIVAR			TRAMO Y/O SECTOR(S): K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390									
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOLÍVAR			SEMANA No.:	5	del	31/10/2020	al	6/11/2020
										(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	CARMEN C PEREZ LOPEZ			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	OSCAR TRIANA								
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS: TRONCAL - RETIRO NUEVO - FLAMENCO ÑANGUAMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO - CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVÍAS Y EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA												
KM A MEJORAR: 0,933	KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	0,933	No. PUENTES:		OTROS:	PLACA HUELLA 0,933 Km, 6 BOX COULVER					
CONTRATO DE OBRA:					CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN SER SOCIAL				INTERVENTOR:	CONSORCIO BOLÍVAR 2020							
INTEGRANTES:					INTEGRANTES:	CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS,INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS							
CONTRATO No.	LP-002-2020	VALOR INICIAL:	\$	1.067.627.566,00	CONTRATO No.	722 DEL 2020	VALOR INICIAL:	\$	746.157.896,00				
PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	\$	-	PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE 2020	ADICIONES:	\$	-				
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$	1.067.627.566,00	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$	746.157.896,00				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:													
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX									
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.067.627.566		\$ -	-									
EJECUTADO	\$ 9.239.579	\$ -	\$ -	-									
(Indicar valores en pesos)													
OBRA													
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.067.627.566,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	9.239.579,20											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,87%												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-											
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	9.239.579,20											
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO											
		X											
MES FACTURADO:													
VALOR FACTURA:		FECHA FACTURA:											
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:													
Se debe presentar la primera factura del contrato (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)													
INTERVENTORÍA													
EJECUTADO ACUMULADO:													
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO											
		X											
MES FACTURADO:													
VALOR FACTURA:		FECHA FACTURA:											
NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO													
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$	-											
PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL. (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)													



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	80	80	80
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PROTECCIÓN DE TALUDES (Km)			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390, En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles)



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carrotaques:			
Motorizadores:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: pavimentadora, compactador cilind			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CRUCE DEL ARROYO GRANDE EN EL CAMINO CAMPAQA 1

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

UBICACIÓN: MARIA LA BAJA BOLIVAR

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en:

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Expediente: 0-550 MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Vigencia Desde: 15/06/2006 Hasta: 14/06/2036.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO código: HIN-10 CONTRATO UNICO DE CONCESION (LNB -51) Vigencia Desde: 15/05/2008 Hasta: 14/05/2033.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	☒	NO	☐	N/A	☐
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
Ocupación de CAUCES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
VERTIMIENTOS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
EMISIONES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
OTROS (Especificar cual)	SI	☐	NO	☐	N/A	☐

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCION, ACTUALIZACIONSEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERORIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuación de la caracterización de las viviendas.

Detalle de las obras a construir Box y/o Alcantarillas (cotas entrada y cotas de salida)


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega de las carteras de las secciones transversales de levantamiento Topográfico

Instalación de valla informativa de la obra

Inicio ejecución de obra

ruta No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1.



Fotografía N° 2.



Fotografía N° 3.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES. CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DIAZ MARTINEZ

No. MAT: 18648

Invias - Gestión Pública con Calidad



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2							
				VERSIÓN	1							
				PÁGINA		DE						
					FECHA	13	noviembre	2020				
						(Día)	(Mes)	(Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO/CARRETERA:		MARIA LA BAJA - BOLIVAR		TRAMO Y/O SECTOR(S): K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390								
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		BOLIVAR						
				SEMANA No.:		6 del 7/11/2020 al 13/11/2020						
						(Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		CARMEN C PEREZ LOPEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		OSCAR TRIANA						
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS: TRONCAL - RETIRO NUEVO - FLAMENCO ÑANGUAMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO - CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA					FECHA DE INICIO: 30/09/2020					
KM A MEJORAR: 0,933		KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR: 0,933		No. PUENTES:		OTROS: PLACA HUELLA 0,933 Km, 6 BOX COULVER				
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: CORPORACIÓN SER SOCIAL				INTERVENTOR: CONSORCIO BOLÍVAR 2020								
INTEGRANTES:				INTEGRANTES: CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS								
				D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S								
CONTRATO No.		LP-002-2020		CONTRATO No.		722 DEL 2020						
PLAZO INICIAL:		7 MESES		PLAZO INICIAL:		HASTA 31 DE 2020						
PLAZO ACUMULADO:				PLAZO ACUMULADO:								
VALOR INICIAL:		\$ 1.067.627.566,00		VALOR INICIAL:		\$ 746.157.896,00						
ADICIONES:		\$ -		ADICIONES:		\$ -						
VALOR ACUMULADO:		\$ 1.067.627.566,00		VALOR ACUMULADO:		\$ 746.157.896,00						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:												
VIGENCIA		2020		2021		2022		20XX				
RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.067.627.566				\$		-				
EJECUTADO		\$ 10.972.000		\$ -		\$ -		-				
(Indicar valores en pesos)												
OBRA												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		\$ 1.067.627.566,00										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ 10.972.000,30										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		1,03%										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -										
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VA)												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 10.972.000,30										
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		<table border="1"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>							SI	NO		X
SI	NO											
	X											
MES FACTURADO:												
VALOR FACTURA:		FECHA FACTURA:										
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:												
Se debe presentar la primera factura del contrato (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
INTERVENTORÍA												
EJECUTADO ACUMULADO:												
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		<table border="1"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>							SI	NO		X
SI	NO											
	X											
MES FACTURADO:												
VALOR FACTURA:		FECHA FACTURA:										
NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO												
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:		\$ -										
PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95	95	95
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PROTECCIÓN DE TALUDES (Km)			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390, En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles)



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carrotaques:			
Motorizadores:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: pavimentadora, compactador cilind			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CRUCE DEL ARROYO GRANDE EN EL CAMINO CAMPAQA 1

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

UBICACIÓN: MARIA LA BAJA BOLIVAR

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en:

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Expediente: 0-550 MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Vigencia Desde: 15/06/2006 Hasta: 14/06/2036.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO código: HIN-10 CONTRATO UNICO DE CONCESION (LNB -51) Vigencia Desde: 15/05/2008 Hasta: 14/05/2033.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	☒	NO	☐	N/A	☐
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
Ocupación de CAUCES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
VERTIMIENTOS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
EMISIONES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
OTROS (Especificar cual)	SI	☐	NO	☐	N/A	☐

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCION, ACTUALIZACIONSEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERORIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Entrega de las carteras de las secciones transversales de levantamiento Topográfico

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de valla informativa de la obra
Inicio ejecución de obra

ruta No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1.



Fotografía N° 2.



Fotografía N° 3.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES. CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DIAZ MARTINEZ

No. MAT: 18648

Invias - Gestión Pública con Calidad



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	DE				
		FECHA	20	noviembre	2020		
			(Da)	(Mes)	(Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO/CARRETERA:	MARIA LA BAJA - BOLIVAR		TRAMO Y/O SECTOR(S): K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		BOLIVAR		
			SEMANA No.:		7 del 14/11/2020 al 20/11/2020		
					(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	CARMEN C PEREZ LOPEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		OSCAR TRIANA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS: TRONCAL - RETIRO NUEVO - FLAMENCO ÑANGUAMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO - CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA		FECHA DE INICIO:		30/09/2020		
KM A MEJORAR:	0,933	KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:	0,933	No. PUENTES:	
				OTROS:		PLACA HUELLA 0,933 Km, 6 BOX COULVER	
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN SER SOCIAL			INTERVENTOR:	CONSORCIO BOLÍVAR 2020		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS		
CONTRATO No.	LP-002-2020	VALOR INICIAL:	\$ 1.067.627.566,00	CONTRATO No.	722 DEL 2020	VALOR INICIAL:	\$ 746.157.896,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	\$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE 2020	ADICIONES:	\$ -
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$ 1.067.627.566,00	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	\$ 746.157.896,00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX			
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.067.627.566		\$ -	\$ -			
EJECUTADO	\$ 10.972.000	\$ -	\$ -	\$ -			
(Indicar valores en pesos)							
OBRA				INTERVENTORÍA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.067.627.566,00			EJECUTADO ACUMULADO:			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 10.972.000,30						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,03%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -						
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VA)							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 10.972.000,30						
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO		
		X				X	
MES FACTURADO:				MES FACTURADO:			
VALOR FACTURA:		FECHA FACTURA:		VALOR FACTURA:		FECHA FACTURA:	
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:				NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO			
				PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -		
Se debe presentar la primera factura del contrato				PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95	95	95
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PROTECCIÓN DE TALUDES (Km)			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390, En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles)



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carrotaques:			
Motorizadoras:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: pavimentadora, compactador cilind			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CRUCE DEL ARROYO GRANDE EN EL CAMINO CAMPAQA 1

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

UBICACIÓN: MARIA LA BAJA BOLIVAR

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐
LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en:

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Expediente: 0-550 MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Vigencia Desde: 15/06/2006 Hasta: 14/06/2036.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO código: HIN-10 CONTRATO UNICO DE CONCESION (LNB -51) Vigencia Desde: 15/05/2008 Hasta: 14/05/2033.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	☒	NO	☐	N/A	☐
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
Ocupación de CAUCES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
VERTIMIENTOS:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
EMISIONES:	SI	☐	NO	☐	N/A	☒
OTROS (Especificar cual)	SI	☐	NO	☐	N/A	☐

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCION, ACTUALIZACIONSEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERORIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se termino la caracterización de las viviendas.
señalización de la vía para desvío de tráfico.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio ejecución de obra

RUTA No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRO FOTOGRAFICO



Fotografía N° 1. Caracterización de las viviendas aledañas a la vía - Casa con fisura en muros externos



Fotografía N° 2. Muro Exterior de Vivienda en mal estado



Fotografía N° 3. Vivienda con esportillamiento en filos de andenes

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, VERIFICACIÓN DE, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DIAZ B.

No. MAT:

Invias - Gestión Pública con Calidad



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																																																	
				VERSIÓN		1																																																																	
				PÁGINA		DE																																																																	
				FECHA		27	noviembre																																																																
						(Día)	(Mes)																																																																
						2020																																																																	
						(Año)																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																							
PROYECTO/CARRETERA: MARIA LA BAJA - BOLIVAR				TRAMO Y/O SECTOR(S): K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED Terciaria y Férrea				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR																																																																			
SEMANA No.: 8 del 21/11/2020 al 27/11/2020				(Numeración consecutiva)																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: CARMEN C PEREZ LOPEZ				GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR TRIANA																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias: TRONCAL - RETIRO NUEVO - FLAMENCO ÑANGUAMA (INCLUYE TRAMO FLAMENCO - CORREA) EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 586 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA				FECHA DE INICIO: 30/09/2020																																																																			
KM A MEJORAR: 0,933				KM A REHABILITAR:																																																																			
KM A CONSTRUIR: 0,933				No. PUENTES:																																																																			
OTROS: PLACA HUELLA 0,933 Km, 6 BOX COULVER																																																																							
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																			
CONTRATISTA: CORPORACIÓN SER SOCIAL				INTERVENTOR: CONSORCIO BOLIVAR 2020																																																																			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES: CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS																																																																			
CONTRATO No. LP-002-2020				CONTRATO No. 722 DEL 2020																																																																			
PLAZO INICIAL: 7 MESES				PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE 2020																																																																			
PLAZO ACUMULADO:				PLAZO ACUMULADO:																																																																			
VALOR INICIAL: \$ 1.067.627.566,00				VALOR INICIAL: \$ 746.157.896,00																																																																			
ADICIONES: \$ -				ADICIONES: \$ -																																																																			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.067.627.566,00				VALOR ACUMULADO: \$ 746.157.896,00																																																																			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>VIGENCIA</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>20XX</th></tr></thead><tbody><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 1.067.627.566</td><td></td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td>\$ 10.972.000</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>								VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.067.627.566		\$	-	EJECUTADO	\$ 10.972.000	\$ -	\$ -	\$ -																																																	
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX																																																																			
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.067.627.566		\$	-																																																																			
EJECUTADO	\$ 10.972.000	\$ -	\$ -	\$ -																																																																			
(Indicar valores en pesos)																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OBRA</th><th colspan="2">INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 1.067.627.566,00</td><td>EJECUTADO ACUMULADO:</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 10.972.000,30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td><td>1,03%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VA)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 10.972.000,30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>SI NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>MES FACTURADO:</td><td></td><td>MES FACTURADO:</td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td></td><td>VALOR FACTURA:</td><td></td></tr><tr><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td><td></td><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Se debe presentar la primera factura del contrato</td><td colspan="2">PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL</td></tr><tr><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr></tbody></table>								OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.067.627.566,00	EJECUTADO ACUMULADO:		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 10.972.000,30			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,03%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -			(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VA)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 10.972.000,30			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO		X		X	MES FACTURADO:		MES FACTURADO:		VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:						Se debe presentar la primera factura del contrato		PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
OBRA		INTERVENTORIA																																																																					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.067.627.566,00	EJECUTADO ACUMULADO:																																																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 10.972.000,30																																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,03%																																																																						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -																																																																						
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VA)																																																																							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 10.972.000,30																																																																						
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																				
	X		X																																																																				
MES FACTURADO:		MES FACTURADO:																																																																					
VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:																																																																					
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:																																																																					
Se debe presentar la primera factura del contrato		PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																					




"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO O SECTOR	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95	95	95
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (KM)			
SUBBASE GRANULAR CLASE C (MTS)			
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT (UN)			
EXCAVACIONES VARIAS (KM)	0,115		0,115
OTROS: DISIPADORES			



MAQUINARIA Y EQUIPOS			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carrotaques:			
Motoniveladoras:			
Retroexcavadoras	1		
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:	1		
Otros: pavimentadora, compactador cilindro, compactador neumatico			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : K9+000 - K9+543, K16+000 - K16+390, En todos los tramos se realizo visita de campo, Levantamiento topografico (planta y perfiles)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CRUCE DEL ARROYO GRANDE EN EL CAMINO CAMPAQA 1	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___
UBICACIÓN: MARIA LA BAJA BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en :

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Expediente: 0-550 MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Vigencia Desde: 15/06/2006 Hasta: 14/06/2036.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO código: HIN-10 CONTRATO UNICO DE CONCESION (LNB -51)Vigencia Desde: 15/05/2008 Hasta: 14/05/2033.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	X
VERTIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	X
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	___

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUENCIA, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VIA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE PROCEDE A LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

ESTADO:

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	___	N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	___	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	___	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	___	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	___
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	___
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	___
OTROS:	___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	___

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se socializo la obra con la comunidad en presencia de la alcaldesa y contratista
Comenzaron actividades de excavación alcanzando 115 ml.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el proceso de excavación

ruta No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1.



Fotografía N° 2.



Fotografía N° 3.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLO.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLO.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE:
No. MAT:

Rodrigo Díaz B.
RODRIGO DIAZ B

Inviás - Gestión Pública con Calidad



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																	
		VERSIÓN	1																																	
		PÁGINA		DE																																
		FECHA	31 (Día)	octubre (Mes)	2020 (Año)																															
I. INFORMACIÓN GENERAL																																				
PROYECTO/CARRETERA:	GUAMO - BOLIVAR		TRAMO Y/O SECTOR(S): (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321)																																	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		BOLIVAR																															
SEMANA No.:			1		del 26/10/2020 al 1/11/2020 (Numeración consecutiva)																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:			CARMEN C PEREZ LOPEZ																																	
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:			OSCAR TRIANA																																	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:			MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ FECHA DE INICIO: 12/09/2018 A NIVEL NACIONAL																																	
KM A MEJORAR: 0,851			KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR: 0,851																															
No. PUENTES:			OTROS:		PLACA HUELLA 0,851 Km, 4 BOX COULVER																															
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																	
CONTRATISTA: DEVIS ANTONIO PEREZ SERPA			INTERVENTOR: CONSORCIO BOLIVAR 2020																																	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES: CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGEOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS D&B INGENIEROS IVILES S.A.S																																	
CONTRATO No. LP- 001-2020			VALOR INICIAL:		\$ 1.076.137.444,00																															
PLAZO INICIAL: 7 MESES			ADICIONES:		\$ -																															
PLAZO ACUMULADO:			VALOR ACUMULADO:		\$ 1.076.137.444,00																															
			CONTRATO No. 722 DEL 2020		VALOR INICIAL: \$ 746.157.896,00																															
			PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE 2020		ADICIONES: \$ -																															
			PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO: \$ 746.157.896,00																															
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																				
<table border="1"><thead><tr><th>VIGENCIA</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>20XX</th></tr></thead><tbody><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 1.076.137.444</td><td></td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td>\$ 3.633.968</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td></tr></tbody></table> (Indicar valores en pesos)							VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.076.137.444		\$	-	EJECUTADO	\$ 3.633.968	\$ -	\$ -	-															
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX																																
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.076.137.444		\$	-																																
EJECUTADO	\$ 3.633.968	\$ -	\$ -	-																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OBRA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 1.076.137.444,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 3.633.967,75</td></tr><tr><td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td><td>0,34%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 3.633.967,75</td></tr><tr><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td><table border="1"><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>MES FACTURADO:</td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>FECHA FACTURA:</td></tr><tr><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Se debe presentar la primera factura del contrato (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr></tbody></table>							OBRA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.076.137.444,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.633.967,75	AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,34%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 3.633.967,75	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	<table border="1"><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	SI	NO		X	MES FACTURADO:		VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:		Se debe presentar la primera factura del contrato (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
OBRA																																				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.076.137.444,00																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.633.967,75																																			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,34%																																			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -																																			
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 3.633.967,75																																			
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	<table border="1"><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	SI	NO		X																															
SI	NO																																			
	X																																			
MES FACTURADO:																																				
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:																																			
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:																																				
Se debe presentar la primera factura del contrato (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">INTERVENTORÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>EJECUTADO ACUMULADO:</td><td></td></tr><tr><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td><table border="1"><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>MES FACTURADO:</td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>FECHA FACTURA:</td></tr><tr><td colspan="2">NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO</td></tr><tr><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2">PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL. (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr></tbody></table>							INTERVENTORÍA		EJECUTADO ACUMULADO:		PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	<table border="1"><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	SI	NO		X	MES FACTURADO:		VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:	NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -	PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL. (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
INTERVENTORÍA																																				
EJECUTADO ACUMULADO:																																				
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	<table border="1"><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	SI	NO		X																															
SI	NO																																			
	X																																			
MES FACTURADO:																																				
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:																																			
NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO																																				
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN:	\$ -																																			
PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL. (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																				



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	25	25	25
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PROTECCIÓN DE TALUDES (Km)			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1 y 2: (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321). En todos los tramos se realizó visita de campo y se comenzó el Levantamiento topográfico.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carro tanques:			
Motoniveladoras:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: pavimentadora, compactador cilindra, compactador neumático			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: pendiente

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.
El contratista tiene pendiente la entrega de la fuente de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____
VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____
EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA, EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARÁ UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIJAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ N/A
AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico en el primer tramo

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Socialización de la obra

Conformación de Veeduría

Continuar con el Levantamiento Topográfico (Diseño geométrico Vía) y Detalle de las obras a construir Box y/o Alcantarillas (cotas entrada y cotas de salida), Diseño de mezclas, entrega de Certificación de Canteras.

RUTA No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRO FOTOGRAFICO



Fotografía N° 1. Recorrido Visita Tecnica



Fotografía N° 2. Recorrido Visita Tecnica



Fotografía N° 3. Recorrido Visita Tecnica

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ

No. MAT: 18648

Invias - Gestión Pública con Calidad

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2				
					VERSIÓN	1				
					PÁGINA		DE			

FECHA						07	noviembre	2020	
						(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO/CARRETERA: GUAMO - BOLIVAR					TRAMO Y/O SECTOR(S): (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA					DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR				
					SEMANA No.: 2 del 2/11/2020 al 8/11/2020 (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARMEN C PEREZ LOPEZ					GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR TRIANA				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ FECHA DE INICIO: 12/09/2018 A NIVEL NACIONAL.									
KM A MEJORAR: 0,851 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,851 No. PUENTES: OTROS: PLACA HUELLA 0,851 Km, 4 BOX COULVER									

CONTRATO DE OBRA:					CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				
CONTRATISTA: DEMS ANTONIO PEREZ SERPA					INTERVENTOR: CONSORCIO BOLIVAR 2020				
INTEGRANTES:					INTEGRANTES: CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS,INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS				
					D&B INGENIEROS MILES S.A.S				
CONTRATO No. LP- 001-2020		VALOR INICIAL: \$ 1.076.137.444,00		CONTRATO No. 722 DEL 2020		VALOR INICIAL: \$ 746.157.896,00			
PLAZO INICIAL: 7 MESES		ADICIONES: \$ -		PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE 2020		ADICIONES: \$ -			
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO: \$ 1.076.137.444,00		PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO: \$ 746.157.896,00			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX					
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.076.137.444		\$	-					
EJECUTADO	\$ 7.267.936	\$ -	\$ -	\$ -					
(Indicar valores en pesos)									

OBRA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.076.137.444,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 7.267.935,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 7.267.935,50
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO X
MES FACTURADO:	
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:	
Se debe presentar la primera factura del contrato	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	

INTERVENTORÍA	
EJECUTADO ACUMULADO:	
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO X
MES FACTURADO:	
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:
NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO	
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN:	\$ -
PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL.	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	50	50	50
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km):			
KM PAVIMENTADOS (Km):			
PROTECCIÓN DE TALUDES (Km):			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321). En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carrotales:			
Motoniveladoras:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetes:			
Otros: pavimentadora, compactador cilíndrico, compactador neumático			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: pendiente

PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.
El contratista tiene pendiente la entrega de la fuente de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	____	N/A	____
VERTIMENTOS:	SI	NO	____	N/A	____
EMISIONES:	SI	NO	____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	____	N/A	____

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA, EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VIA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARÁ UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPÓSITO DE ATERRIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	____	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	____	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	____	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	____	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	____	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	____	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	____
OTROS:	____		____

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continúa con el Levantamiento Topográfico (Diseño geométrico Vía)

Entrega de cartenas topográficas (planta, perfil longitudinal Y transversales) de los tramos de placa huella a construir.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Socialización de la obra

Conformación de Veeduría

Instalación de la valla informativa

RUTA No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1. topografía



Fotografía N° 2. topografía



Fotografía N° 3. topografía

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRIA, LIMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DIAZ MARTINEZ

No. MAT: 18648

Invias - Gestión Pública con Calidad



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2				
			VERSIÓN	1				
			PÁGINA		DE			
			FECHA	14 (Día)	noviembre (Mes)	2020 (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO/CARRETERA: GUAMO - BOLIVAR			TRAMO Y/O SECTOR(S): (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR		SEMANA No.: 3 del 9/11/2020 al 15/11/2020 (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARMEN C PEREZ LOPEZ			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OSCAR TRIANA					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ FECHA DE INICIO: 12/09/2018 A NIVEL NACIONAL.								
KM A MEJORAR: 0,851		KM A REHABILITAR:	KM A CONSTRUIR: 0,851	No. PUENTES:	OTROS: PLACA HUELLA 0,851 Km, 4 BOX COULVER			
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				
CONTRATISTA: DEMIS ANTONIO PEREZ SERPA		INTERVENTOR: CONSORCIO BOLIVAR 2020						
INTEGRANTES:		INTEGRANTES: CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS,INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS						
		D&B INGENIEROS IVILES S.A.S						
CONTRATO No. LP- 001-2020		VALOR INICIAL: \$ 1.076.137.444,00	CONTRATO No. 722 DEL 2020		VALOR INICIAL: \$ 746.157.896,00			
PLAZO INICIAL: 7 MESES		ADICIONES: \$ -	PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE 2020		ADICIONES: \$ -			
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO: \$ 1.076.137.444,00	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO: \$ 746.157.896,00			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX				
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.076.137.444		\$ -	\$ -				
EJECUTADO	\$ 7.267.936	\$ -	\$ -	\$ -				
(Indicar valores en pesos)								
OBRA								
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.076.137.444,00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 7.267.935,50							
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,68%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -							
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 7.267.935,50							
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO							
	X							
MES FACTURADO:								
VALOR FACTURA:		FECHA FACTURA:						
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:								
Se debe presentar la primera factura del contrato (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
INTERVENTORÍA								
EJECUTADO ACUMULADO:								
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO								
X								
MES FACTURADO:								
VALOR FACTURA:								
FECHA FACTURA:								
NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO								
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -								
PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL. (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020


III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	50	50	50
KM CON OBRAS DE ARTE CUNETAS (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km):			
KM PAVIMENTADOS (Km):			
PROTECCIÓN DE TALUDES (Km):			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321). En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carrotales:			
Motoniveladoras:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetes:			
Otros: pavimentadora, compactador cilíndrico, compactador neumático			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: pendiente

PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: La **CERTIFICACIÓN** de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el **Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007**, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el **Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro**, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. **Plazo del Contrato:** 30 años.
El contratista tiene pendiente la entrega de la fuente de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	____	N/A	____
VERTIMENTOS:	SI	NO	____	N/A	____
EMISIONES:	SI	NO	____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	____	N/A	____

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA, EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VIA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARÁ UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIZAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	____	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	____	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	____	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	____	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	____	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	____	
OTROS:	____	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	____

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Entrega de Levantamiento Topográfico en planta

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Socialización de la obra

Conformación de Veeduría


Instalación de la valla informativa

RUTA No.




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1. Vista en Planta Tramo 1



Fotografía N° 2. Vista en Planta Tramo 2



Fotografía N° 3. Topografía

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRIA, LIMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DIAZ MARTINEZ

No. MAT: 18648

Invias - Gestión Pública con Calidad

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA		DE			
		FECHA	21 (Día)	noviembre (Mes)	2020 (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO/CARRETERA: <u>GUAMO - BOLIVAR</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>(K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321)</u>					
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u>		SEMANA No.: <u>4</u> del <u>16/11/2020</u> al <u>22/11/2020</u> (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>CARMEN C PEREZ LOPEZ</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>OSCAR TRIANA</u>					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ</u> FECHA DE INICIO: <u>12/09/2018</u> <u>A NIVEL NACIONAL</u>							
KM A MEJORAR: <u>0,851</u>		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: <u>0,851</u>		No. PUENTES: _____ OTROS: <u>PLACA HUELLA 0,851 Km, 4 BOX COULVER</u>	
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: <u>DEMS ANTONIO PEREZ SERPA</u>				INTERVENTOR: <u>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</u>			
INTEGRANTES: _____				INTEGRANTES: <u>CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS</u>			
CONTRATO No. <u>LP- 001-2020</u>				D&B INGENIEROS MILES S.A.S			
PLAZO INICIAL: <u>7 MESES</u>		VALOR INICIAL: \$ <u>1.076.137.444,00</u>		CONTRATO No. <u>722 DEL 2020</u>		VALOR INICIAL: \$ <u>746.157.896,00</u>	
PLAZO ACUMULADO: _____		ADICIONES: \$ <u>-</u>		PLAZO INICIAL: <u>HASTA 31 DE 2020</u>		ADICIONES: \$ <u>-</u>	
		VALOR ACUMULADO: \$ <u>1.076.137.444,00</u>		PLAZO ACUMULADO: _____		VALOR ACUMULADO: \$ <u>746.157.896,00</u>	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
VIGENCIA		2020		2021		2022	
RECURSOS POR VIGENCIA		\$ <u>1.076.137.444</u>				\$ <u>-</u>	
EJECUTADO		\$ <u>7.267.936</u>		\$ <u>-</u>		\$ <u>-</u>	
(Indicar valores en pesos)							
OBRA				INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>1.076.137.444,00</u>				EJECUTADO ACUMULADO: _____			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>-</u>							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>7.267.935,50</u>							
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0,68%</u>							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ <u>-</u>							
(PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA)							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ <u>7.267.935,50</u>							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI NO </div>				<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI NO </div>			
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>SI</div><div>NO</div></div>				PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>SI</div><div>NO</div></div>			
MES FACTURADO: _____				MES FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: _____				VALOR FACTURA: _____			
FECHA FACTURA: _____				FECHA FACTURA: _____			
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: _____				NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO			
				PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u>			
Se debe presentar la primera factura del contrato				PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL.			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".


CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	50	50	50
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PROTECCION DE TALUDES (Km)			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321), En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carro tanques:			
Motor niveladoras:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibro compactadores:			
Volquetas:			
Otros: pavimentadora, compactador cilindra, compactador neumático			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: pendiente

PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.
El contratista tiene pendiente la entrega de la fuente de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUENCIA, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA. EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARÁ UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIJAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:			

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Entrega de perfil longitudinal tramos a intervenir

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Socialización de la obra
Conformación de Veeduría
Instalación de la valla informativa

RUTA No.




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1. Perfil Long Terreno Existente tramo 1



Fotografía N° 2. Perfil Long Terreno Existente tramo 2



Fotografía N° 3.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSION DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DÍAZ B.

No. MAT:

Invias - Gestión Pública con Calidad

	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MN-IN-15-FR-2 1																			
			FECHA	28 (Día)	noviembre (Mes)	2020 (Año)																
I. INFORMACIÓN GENERAL																						
PROYECTO/CARRETERA: <u>GUAMO - BOLIVAR</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>(K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321)</u>																				
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u>		SEMANA No.: <u>5</u> del <u>23/11/2020</u> al <u>29/11/2020</u> (Numeración consecutiva)																		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>CARMEN C PEREZ LOPEZ</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>OSCAR TRIANA</u>																				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ</u> FECHA DE INICIO: <u>12/09/2018</u> <u>A NIVEL NACIONAL</u>																						
KM A MEJORAR: <u>0,851</u>		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: <u>0,851</u>		No. PUENTES: _____ OTROS: <u>PLACA HUELLA 0,851 Km, 4 BOX COULVER</u>																
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																		
CONTRATISTA: <u>DEMS ANTONIO PEREZ SERPA</u>				INTERVENTOR: <u>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</u>																		
INTEGRANTES: _____				INTEGRANTES: <u>CONINBO SAS, DYB INGENIEROS CIVILES SAS, INGECOL PREMIUN SAS, RD INGENIEROS CIVILES SAS</u> <u>D&B INGENIEROS VILES S.A.S</u>																		
CONTRATO No. <u>LP- 001-2020</u>		VALOR INICIAL: \$ <u>1.076.137.444,00</u>		CONTRATO No. <u>722 DEL 2020</u>		VALOR INICIAL: \$ <u>746.157.896,00</u>																
PLAZO INICIAL: <u>7 MESES</u>		ADICIONES: \$ <u>-</u>		PLAZO INICIAL: <u>HASTA 31 DE 2020</u>		ADICIONES: \$ <u>-</u>																
PLAZO ACUMULADO: _____		VALOR ACUMULADO: \$ <u>1.076.137.444,00</u>		PLAZO ACUMULADO: _____		VALOR ACUMULADO: \$ <u>746.157.896,00</u>																
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 1.076.137.444</td> <td></td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ 7.267.936</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> (Indicar valores en pesos)		VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.076.137.444		\$	-	EJECUTADO	\$ 7.267.936	\$ -	\$ -	-						
VIGENCIA	2020	2021	2022	20XX																		
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.076.137.444		\$	-																		
EJECUTADO	\$ 7.267.936	\$ -	\$ -	-																		
OBRA				INTERVENTORIA																		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>1.076.137.444,00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>-</u> INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ <u>7.267.935,50</u> AVANCE DE OBRA EN % (B/A): <u>0,68%</u> OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ <u>-</u> (PAGA Y CARACTERIZACION DE LA VIA) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ <u>7.267.935,50</u>				EJECUTADO ACUMULADO: _____																		
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>				SI	NO		X	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>				SI	NO		X							
SI	NO																					
	X																					
SI	NO																					
	X																					
MES FACTURADO: _____				MES FACTURADO: _____																		
VALOR FACTURA: _____ FECHA FACTURA: _____				VALOR FACTURA: _____ FECHA FACTURA: _____																		
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: _____				NO INCLUYE AMORTIZACION ANTICIPO PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ <u>-</u>																		
Se debe presentar la primera factura del contrato (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				PENDIENTE POR PRESENTAR FACTURA CON INFORME MES 1 E INFORME MENSUAL. (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																		



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	50	50	50
KM CON OBRAS DE ARTE cunetas (Km):			
KM AMPLIADOS, MEJORAMIENTO (Km):			
KM SUBBASE (Km):			
KM BASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PROTECCIÓN DE TALUDES (Km)			
OTROS: DISIPADORES			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1, 2, 3 Y 4 : (K0+000, K0+600); (K2+070, K2+321). En todos los tramos se realizó visita de campo, Levantamiento topográfico (planta y perfiles), Diseño de mezclas y Certificación de Canteras



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Trituradora			
Carro tanques:			
Motoniveladoras:			
Retroexcavadoras (cantera)			
Retrocargadores, cargador, minicargador			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: pavimentadora, compactador cilindra, compactador neumático			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: pendiente

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: La CERTIFICACIÓN de adquisición de materiales entrega por el contratista consiste en el Contrato de Concesión Minera N°0-592 de 01 de febrero de 2007, para exploración y explotación de un yacimiento de arcilla y caliza, celebrado entre el Departamento de Bolívar y Carlos Alberto Vasquez de Oro, de acuerdo a la Ley 685 del 2001. Plazo del Contrato: 30 años.
El contratista tiene pendiente la entrega de la fuente de materiales a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____
VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____
EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSECUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y EL ACOPIO CAMPAMENTO LA PIEDRA, EL AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DE MATERIAL Y ATENUAR PARTICULAS EN LA VÍA, DE SER NECESARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: EN EL PERIODO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, SE REALIZARA UN BALANCE DE OBRA CON EL PROPOSITO DE ATERRIJAR LAS CANTIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ARROJADA EN LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ N/A
AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Revisión de correcciones de pendientes de diseño de rasante tramos a intervenir

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Socialización de la obra
Conformación de Veeduría
Instalación de la valla informativa

RUTA No.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1.



Fotografía N° 2.



Fotografía N° 3.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION, REGISTRO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE ENSAYOS (PROCTOR, DENSIDADES, GRANULOMETRÍA, LÍMITES, CBR, ...)
TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROLES Y ENSAYOS AL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE Y PLACA HUELLA.
CONTINUA DESCARGUE, CONFORMACIÓN, ADICIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ADICIONADO PARA SUB BASE.
CONTROL, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN MATERIAL SUB BASE INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO Y ENSAYO A MATERIALES, CONTROL DE MATERIALES PARA SUBBASE Y PLACA HUELLA.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO DÍAZ B.

No. MAT:

Invias - Gestión Pública con Calidad

	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-----------------------------------

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Corresponde al Contrato No. 722 de 2020, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

Contractualmente se tiene lo siguiente:

CONSORCIO BOLIVAR 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
CONTRATO No:	722 DE 2020
INTERVENTORIA	CONSORCIO BOLÍVAR 2020-DIRECTOR DE INTERVENTORIA : INGENIERO RODRIGO DIAZ
VALOR INICIAL:	\$746.157.896,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2020

El INVIAS designó en la Supervisión del contrato de interventoría a los ingenieros descritos a continuación:

- Ing. Carmen Cecilia Pérez López - RESOLUCIÓN No. 1219 28-ABRIL-2020

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
--	---	-----------------------------------

OBJETO DE CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	722 DE 2020: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR 2020		NIT:	901.380.457-1	
CONFORMACIÓN:	CONSULTORES E INTERVENTORES BOGOTANOS S.A.S- CONINBO NIT. 900.378.119				10%
	INGENIERIA COLOMBIANA PREMIUM S.A.S.-INGECOL PREMIUM S.A.S. NIT. 901.096.880-5				25%
	RD INGENIEROS CIVILES S.A.S NIT. 900.395.263-1				5%
	D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 830.027.712-4				60%
Fecha de Inicio:	28 de septiembre de 2020				
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2020				
Total Prórrogas:	NO APLICA				
Prórroga 1:					
Fecha de suspensión:	NO APLICA				
Fecha de reanudación:	NO APLICA				
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2020				
Valor Inicial INCLUIDO IVA:	\$				746.157.896
Valor Basico del contrato	\$				627.023.442
Valor Adiciones:					\$ 0 Incluido IVA
Valor Actual INCLUIDO IVA:	\$				746.157.896
PLAZO TRANSCURRIDO	3%	0,1 MESES	PLAZO FALTANTE MESES	97%	3 MESES
VALOR PROGRAMADO BASICO	3,16%	\$ 19.800.740	VALOR ACTA PROGRAMADO	3,16%	\$ 23.562.881
VALOR ACTAS COBRADAS BASICO	0,48%	\$ 3.019.854	VALOR ACTA MES	0,48%	\$ 3.593.626
VALOR POR EJECUTAR BASICO	99,52%	\$ 624.003.588	VALOR ejecutado acumulado	0,48%	\$ 3.593.626
ATRASO EN VALOR BASICO	2,68%		VALOR por ejecutar	99,52%	\$ 742.564.270

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 3 (del 1 de octubre al 30 de Noviembre de 2020), el Consorcio Bolívar 2020 hizo:

- ✓ Verificó y aprobó la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).
- ✓ Se verificó que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente, con el propósito de exigir el reemplazo en condiciones equivalentes de ser necesario.
- ✓ Se está estudiando los requerimientos de carácter técnico realizados al contratista para evitar modificaciones o sobrecostos al contrato.
- ✓ Se ha solicitado a las alcaldías y contratistas suministren la justificación y documentación correspondientes.
- ✓ Se revisó la suscripción de las actas de inicio que se generaron entre Alcaldías y Contratistas durante la ejecución del contrato a la fecha, para dejar documentado el acto administrativo que da por sentado el inicio de las obras.
- ✓ Se exigió a los contratistas el cumplimiento de las obligaciones específicas de acuerdo a las responsabilidades adquiridas mediante la legalización del contrato de obra.

- **CONTRATO N°LP-002-2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL. MUNICIPIO: MARIA LA BAJA BOL.**

Durante las primeras semanas de ejecución de obra se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Se comenzó las actividades de trazado y replanteo de la vía a partir de la información contenida en los planos de detalle, mediante elementos de referencia visibles en la zona a intervenir, tales como estacas y marcaciones con cal.

La interventoría verifico la ubicación de la zona a intervenir en el terreno, de manera que los puntos coincidieran con lo especificado en los planos, comprobando los ejes y cotas de referencia antes del inicio de la construcción con el fin de que no interfieran o invadieran otros predios y garantizando que la geometría requerida para la obra quedase plasmada en el terreno según las indicaciones de los planos y diseños.

- ✓ Se realizó proceso de excavación de 0,3 m aproximadamente, incluyendo el bombeo de la vía con el fin de alcanzar las cotas requeridas por el proyecto.

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

- ✓ Controlar permanentemente el personal de obra verificando que tenga su respectiva seguridad social e implementos de seguridad, solicitando mediante oficio CB-2020-59-2020 la respectiva información.
- ✓ Cumplimiento de las actividades que desarrolla el contratista en cuanto a todas las sugerencias y diseños entregados.
- ✓ Exigir al contratista delimitación de las zonas a intervenir con cinta e instalar señalización y aviso de ocupación.
- ✓ Solicitar al contratista la información y documentación correspondientes a las canteras propuestas para el suministro de la Sub-base granular y relleno, programando la toma de muestras de estos materiales de manera conjunta, para la realización de ensayos correspondientes según la normatividad.
- ✓ Acompañamiento permanente en la obra para dar las mejores soluciones.
- ✓ Registro de bitácora; La interventoría diligencio formato de bitácora de obra en donde se hace registro diario de lluvias, de personal laborando en la obra, la cual se realiza diariamente consignando actividades realizadas.
- ✓ Registro fotográfico; se hace un seguimiento diario de fotografías de las actividades ejecutadas.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS.

A la fecha de entrega del presente informe, no se ha utilizado al personal especializado. La interventoría solicito una modificación a las condiciones contractuales donde no se incluye personal especializado. Se espera la respuesta de Invias.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 722 DEL 2022									
NUM		VR. PROGRAMADO	IVA PROGRAMADO	VR TOTAL PROGRAM. (INCLUYE IVA)	SALDO CONTRATO SEGÚN PROGRAMADO (BÁSICO)	VR ACTAS (BÁSICO)	IVA ACTAS	VR TOTAL ACTAS (INCLUYE IVA)	SALDO CONTRATO SEGÚN ACTAS (BÁSICO)
	VALOR DEL CONTRATO		\$ 746.157.896		\$ 627.023.442,02	Básico Contrato			\$ 627.023.442,02
1	sep-20	\$ 19.800.740	\$ 3.762.141	\$ 23.562.881	\$ 607.222.702	\$ 3.019.854	\$ 573.772	\$ 3.593.626	\$ 624.003.588
2	oct-20	\$ 202.407.567	\$ 38.457.438	\$ 240.865.005	\$ 424.615.875				
3	nov-20	\$ 202.407.567	\$ 38.457.438	\$ 240.865.005	\$ 404.815.134				
4	dic-20	\$ 202.407.567	\$ 38.457.438	\$ 240.865.005	\$ 222.208.308				
	TOTALES	\$ 627.023.442	\$ 119.134.454	\$ 746.157.896	\$ -	\$ 3.019.854	\$ 573.772	\$ 3.593.626	\$ 624.003.588

Para los contratistas de obra no se tiene programación del PAC, una vez se tenga se procederá a revisar por la interventoría para hacer control mensual.

5.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.

Para el periodo del presente no se ha hecho uso de otros programas o aplicativos.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-------------------------------

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el siguiente cuadro se presenta el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA		30	11	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE CONTRATO No. 722 DE 2020 CARRETERA Y/O PROYECTO: NIVEL NACIONAL
 INTERVENTORÍA: CONSORCIO BOLIVAR 2020 SECTOR: _____

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta NISSAN	IYV 724	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR DE MESA	DEL OPTIPLES 3060	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR PORTATIL #1	LENOVO 9475 SERIE CB16111580	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR PORTATIL #2	TOSHIBA SERIAL 1C077017Q	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA	KIOSERA 2040	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR PORTATIL #3	APPLE MAC																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: _____

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
 (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: _____

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma 

Nombre: Rodrigo Diaz Benjumea
 Director de Interventoría
 Matrícula No.:

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

Firma 

Nombre: Carmen C. Perez Lopez
 Supervisor del Contrato de Interventoría.
 Matrícula No. :13202-188727BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-9
					VERSIÓN 1
					PÁGINA 1 DE 1

FECHA		30	11	20
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCARIA Y FÉRREA
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 722 DE 2020
 INTERVENTOR: CONSORCIO BOLIVAR 2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE
 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
 CARRETERA Y/O PROYECTO: DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
 SECTOR:

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	19019	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"	P13894	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 746.157.896
TOTAL						746.157.896,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 746.157.896,00

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	sept-20	\$ 3.019.854	\$ 573.772	\$ 3.593.626			\$ 742.564.270	\$ 3.593.626	\$ 742.564.270		EN TRAMITE
2	oct-20	\$ 29.675.589	\$ 5.638.362	\$ 35.313.951			\$ 707.250.319	\$ 38.907.577	\$ 707.250.319		EN TRAMITE
3	nov-20	\$ 30.609.259	\$ 5.815.759	\$ 36.425.018			\$ 670.825.301	\$ 75.332.595	\$ 670.825.301		
TOTALES		\$ 63.304.702	\$ 12.027.893	\$ 75.332.595	\$ -	\$ -	\$ 670.825.301	\$ 75.332.595	\$ 670.825.301		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
 Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: Rodrigo Díaz B.
 Nombre: RODRIGO DIAZ BENJUEA
 Director de Interventoría
 Matrícula No.:

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
 Nombre: LOPEZ
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Se presenta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como Los Certificados de afiliación del personal contratado, en el presente informe se entregaran las planillas de pago de la seguridad social del mes de octubre y noviembre.


[illegible]

Famisanar <small>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD</small> TEL 830.053.564-7		FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS	
		<div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">9007204240</div> <div style="font-size: 18px; font-weight: bold;">9007204240</div>	
No. de Registro <div style="font-size: 18px; font-weight: bold;">207093358</div>		Fecha de Registro <div style="font-size: 18px; font-weight: bold;">02 / 12 / 2020</div>	
Código de registro por la EPS			
Llenar las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> I. DATOS DEL TRABAJADOR 1. Tipo de trabajo: A. Afiliación B. Reporte de Novedad ☒ </div> <div style="width: 25%;"> 2. Tipo de Afiliación: A. Individual B. Colectiva a través de Familia C. Beneficiario o afiliado adicional ☒ </div> <div style="width: 25%;"> 3. Régimen: A. Contributivo B. Subsidiado C. De oficio ☐ </div> <div style="width: 25%;"> 4. Tipo de afiliado: A. Trabajador B. Cónyuge de familia ☒ </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> 5. Tipo de cónyuge: A. Dependiente ☒ </div> <div style="width: 25%;"> 6. Tipo de cónyuge: B. Independiente ☐ </div> <div style="width: 25%;"> 7. Tipo de cónyuge: C. Paroquiano ☐ </div> </div>			
A. AFILIACIÓN I. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cónyuge o cónyuges de familia)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> 8. Apellidos y nombre: GUERRERO </div> <div style="width: 25%;"> 9. Tipo de documento de identidad: CC </div> <div style="width: 25%;"> 10. Número del documento de identidad: 79793020 </div> <div style="width: 25%;"> 11. Sexo: Masculino ☒ </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> 12. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977 </div> <div style="width: 25%;"> 13. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977 </div> </div>			
II. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)			
14. Grupo de población especial: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
15. Administración de pensiones: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
16. Ingresos: \$3.480.000			
17. Residencia: Barrio			
18. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar (datos básicos de identificación del cónyuge o cónyuges permanentes o actuales)			
19. Apellidos y nombres: GUERRERO			
20. Tipo de documento de identidad: CC			
21. Número del documento de identidad: 79793020			
22. Sexo: Masculino ☒			
23. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales			
24. Apellidos y nombres: GUERRERO			
25. Tipo de documento de identidad: CC			
26. Número del documento de identidad: 79793020			
27. Sexo: Masculino ☒			
28. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
29. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
30. Tipo de documento de identidad: CC			
31. Número del documento de identidad: 79793020			
32. Sexo: Masculino ☒			
33. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
34. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
35. Tipo de documento de identidad: CC			
36. Número del documento de identidad: 79793020			
37. Sexo: Masculino ☒			
38. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
39. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
40. Tipo de documento de identidad: CC			
41. Número del documento de identidad: 79793020			
42. Sexo: Masculino ☒			
43. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
44. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
45. Tipo de documento de identidad: CC			
46. Número del documento de identidad: 79793020			
47. Sexo: Masculino ☒			
48. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
49. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
50. Tipo de documento de identidad: CC			
51. Número del documento de identidad: 79793020			
52. Sexo: Masculino ☒			
53. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
54. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
55. Tipo de documento de identidad: CC			
56. Número del documento de identidad: 79793020			
57. Sexo: Masculino ☒			
58. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
59. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
60. Tipo de documento de identidad: CC			
61. Número del documento de identidad: 79793020			
62. Sexo: Masculino ☒			
63. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
64. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
65. Tipo de documento de identidad: CC			
66. Número del documento de identidad: 79793020			
67. Sexo: Masculino ☒			
68. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
69. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
70. Tipo de documento de identidad: CC			
71. Número del documento de identidad: 79793020			
72. Sexo: Masculino ☒			
73. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			
74. Datos complementarios: SEGURIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES			
75. Tipo de documento de identidad: CC			
76. Número del documento de identidad: 79793020			
77. Sexo: Masculino ☒			
78. Fecha de nacimiento: 13 / 09 / 1977			



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) NEDOR GERARDO GUERRERO MOLINA identificado(a) con CC 79793020 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios: 11/02/2020

Estado de la Afiliación: ACTIVO

IPS: CENTRO DE ATENCIÓN EN SALUD CAFAM VALLEDUPAR

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 17 días del mes de febrero del año 2020.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

Medellín, 25 de noviembre de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BOLÍVAR 2020 que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 000000001 PRINCIPAL		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
079793020	GUERRERO MOLINA NEDOR GERARDO	26/11/2020	3692h182	DEPENDIENTE	

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/11/2020 16:29:00.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.147.51.190, 198.143.41.20, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD
CC	123456789	RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ	Cra 10 A # 112 - 77	3001564	rodrigoortiz@guiltemalcalles.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EXPANSAIONES
					1
					2
					TOTAL A PAGAR
PURISIMO SALUD	PURISIMO PENSIONES				
2020-11	2020-11	1		ASB-1043	\$730.368

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALDO													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Saldo More	Valor More Colización	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESD017	Compañía EPS	80005544-2	726.360	0					0			726.360	0

TOTALES PENSIÓN											
Código ATP	Nombre	NET	Calificación Obtenida	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Acreditado	Aporte FEP - Subregistro	Aporte FEP - Regularización	Días Muere	Valor Muere Cálculo FEP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NET	Colaboración Obligatoria	Incapacidades No Autorizadas	Colaboración Voluntaria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Contratación	Días Muertos	Valor Muerto Contratación	Subtotal	No. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidarios	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS							
Código OCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliado
SENA				
0	0	0	0	1
ICBF				
0	0	0	0	1
ESAP				
MED				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administrativa	No. Administraciones Registradas	Valor anual de IGE, LMA, RPP x Milera	Total x Pagos
Sesist	1	728.300	728.300
Plancton	0	0	0
Rosquea Latorales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MCB	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALER	1	728.300	728.300

DATOS DEL APORTANTE							EXCERENADO PAGO PARAFISICALES Y SALUD	DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASIGNADA		FECHE PAISO ASIGNADA (MM/AAAA)	TPO PLANILLA	FECHE PAGO (MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
												EMPRESAS	SIC	
												1	2	
												TOTAL A PAGAR		
CC	982500	RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ	Cra 15 A # 12 - 77	361054	msoncar@protonmail.co									
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERSO BAJO	PERSO PERSONES						
UNICA	= Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO	2020-11	2020-11	I	H08-1043	\$726,300			

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CONSORCIO BOLIVAR 2020**, identificada con **NI** número **901380457**, aportó por el empleado **CLAUDIA LUCIA ROJAS JIMENEZ** identificado(a) con **CC** número **45531919** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2020 y 12 - 2020 de la siguiente forma.

[illegible]



**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CONSORCIO BOLIVAR 2020**, identificada con **NI** número **901380457**, aportó por el empleado **DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA** identificado(a) con **CC** número **1083025371** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2020 y 12 - 2020 de la siguiente forma.

[illegible]



**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CONSORCIO BOLIVAR 2020**, identificada con **NI** número **901380457**, aportó por el empleado **OLGA LUCIA IBARRA SIERRA** identificado(a) con **CC** número **1143395920** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2020 y 12 - 2020 de la siguiente forma.

[illegible]

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-------------------------------

6.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En las siguientes dos páginas se presenta el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA SE ANEXA POLIZA.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>	<p>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</p>	<p>MINFRA-MN-IN-15-FR-16 1 DE</p>																																																			
		<p>FECHA (Día) (Mes) (Año)</p>	<p>30 11 2020</p>																																																			
<p>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED Terciaria y Férrea</p>	<p>DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR</p>																																																					
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>722 DE 2020</u> INTERVENTOR: <u>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</u></p>																																																						
<p>OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>																																																						
<p>FECHA DE INICIO: <u>28 DE SEPTIEMBRE DE 2020</u></p>																																																						
<p>PLAZO INICIAL: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2020</u></p>																																																						
<p>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2020</u> (Incluye prórrogas y suspensiones)</p>																																																						
<p>VALOR INICIAL: \$ <u>746.157.896,00</u></p>																																																						
<p>VALOR ACUMULADO: \$ <u>746.157.896,00</u> (Incluye adiciones)</p>																																																						
<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: <u>Ing. Carmen Cecilia Pérez López</u></p>																																																						
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL</p>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 74.615.789,60</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>100%</td> <td>\$ 149.231.579,20</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 149.231.579,20</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 223.847.368,80</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 74.615.789,60	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 149.231.579,20	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 149.231.579,20	Calidad del servicio	30%	\$ 223.847.368,80	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>9</td> <td>2020</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>9</td> <td>2020</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>9</td> <td>2020</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>2021</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			28	9	2020	31	12	2020	28	9	2020	31	12	2020	28	9	2020	31	12	2023	1	6	2021	1	6	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																				
Cumplimiento	10%	\$ 74.615.789,60																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 149.231.579,20																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 149.231.579,20																																																				
Calidad del servicio	30%	\$ 223.847.368,80																																																				
VIGENCIA																																																						
Desde			Hasta																																																			
28	9	2020	31	12	2020																																																	
28	9	2020	31	12	2020																																																	
28	9	2020	31	12	2023																																																	
1	6	2021	1	6	2026																																																	
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>33-44-101199902</u></p>																																																						
<p>Certificado de modificación o anexo No.: <u>0</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p>																																																						
<p>Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS DEL ESTADO S.A</u></p>																																																						
<p>Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: <u>5 de mayo de 2020</u></p>																																																						
<p>OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:</p>																																																						
<p>Firma <u>Rodrigo Díaz B.</u> Nombre: RODRIGO DÍAZ B. Director de Interventoría Matrícula No.:</p>	<p>Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ F Nombre: CARMEN C. PÉREZ LÓPEZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula No.:</p>																																																					
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.</p>																																																						

En el periodo del presente informe no hubo actualización y/o modificación de las pólizas.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

6.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

No aplica el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.7 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

No aplica el formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-----------------------------------

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 REVISIÓN INTERVENTORIA CONTRATO N°LP-002-2020.

Las cantidades de excavación, relleno, acero y concreto de box corresponden a 5 box, ya que luego de realizar la visita técnica se observó que uno de los box existentes incluido en el contrato se encuentra en buen estado.

- **CONSTRUCCIÓN DE (6) BOX-COULVERT (L =7m DIMENSIONES 1,0 x 1,0)**

2 600.1.1 600 Excavaciones varias sin clasificar (m3)

3 610.2 610 Relleno para estructuras con recebo (m3)

RETIRO NUEVO						
CARTERA DE NIVEL						
BOX-COULVERT # 1 K0+152						
COTAS DE TERRENO						
ABS	FONDO	B.I	EJE	B.D	FONDO	OBSERVACIONES
-5		17,826	17,785	17,831		
00	16,217	17,731	17,714	17,37	16,394	Existente
+05		17,686	17,655	17,664		
BOX-COULVERT # 2 K0+647 - existe						
COTAS DE TERRENO						
ABS	FONDO	B.I	EJE	B.D	FONDO	OBSERVACIONES
-5		15,4	15,65	15,56		
00	14,22	15,69	15,69	15,66	14,48	Existente
+05		15,67	15,69	15,69		
BOX-COULVERT # 3 K1+150						
COTAS DE TERRENO						
ABS	FONDO	B.I	EJE	B.D	FONDO	OBSERVACIONES
-5		10,046	10,223	10,248		No se va a realizar porque se encuentra en buen estado
0	9,487	10,531	10,504	10,542	9,523	
+05		10,007	10,145	9,813		
+10		10,046	10,223	10,248		
FLAMENCO-CORREA						
CARTERA DE NIVEL						
BOX-COULVERT # 5 K9+790						
COTAS DE TERRENO						
ABS	FONDO	B.I	EJE	B.D	FONDO	OBSERVACIONES
-5		8,19	8,284	8,276		
00	7,438	8,164	8,412	8,258	7,667	Existente
+05		8,088	8,123	8,05		
BOX-COULVERT #6 K10+848						
COTAS DE TERRENO						
ABS	FONDO	B.I	EJE	B.D	FONDO	OBSERVACIONES
-5		8,535	8,524	8,456		
00	8,04	8,509	8,52	8,457	7,772	
+05		8,501	8,527	8,431		
BOX-COULVERT # 7 K11+203						
COTAS DE TERRENO						
ABS	FONDO	B.I	EJE	B.D	FONDO	OBSERVACIONES
-5		9,884	9,951	9,919		
00	8,661	9,805	9,963	9,815	8,381	Existente
+05		9,981	9,978	9,951		

ABSCISA	COTA DERECHA	COTA EJE	COTA IZQUIERDA	AREA EXC	B EXTERIOR BOX	SOBRE ANCHO (0.5M DE CADA LADO)	AREA RELLENO	VOL EXC	VOL RELLENO
PRO+152	17,731	17,714	17,37	12,6858	1,50	1	2,408	31,71	14,46

COTAS EXISTENTES

Área = 12.6858, Perímetro = 17.4779
Indique una opción

ABSCISA	COTA DERECHA	COTA EJE	COTA IZQUIERDA	AREA EXC	B EXTERIOR BOX	SOBRE ANCHO (0.5M DE CADA LADO)	AREA RELLENO	VOL EXC	VOL RELLENO
PRO+647	15,69	15,69	15,66	11,0075	1,50	1	0,21	27,52	11,17



COTAS EXISTENTES

Área = 11.0075, Perímetro = 17.1301
Indique una opción


ABSCISA	COTA DERECHA	COTA EJE	COTA IZQUIERDA	AREA EXC	B EXTERIOR BOX	SOBRE ANCHO (0.5M DE CADA LADO)	AREA RELLENO	VOL EXC	VOL RELLENO
PR9+790	8,164	8,412	8,258	11,8825	1,50	1	1,736	29,71	13,45
PR10+848	8,509	8,52	8,457	11,2193	1,50	1	0,518	28,05	11,63
PR11+203	9,805	9,963	9,815	11,4208	1,50	1	1,106	28,55	12,51

REVISIÓN DE ACUERDO A CARTILLA GUIA PARA EVALUACION DE CANTIDADES Y EJECUCION DE PRESUPUESTOS

EXCAVACIÓN	Solado	H (tbs)	lado 1 (a6)	lado 2 (a3)	und	# Box	Vol
ZAPATA ALETAS	0,05	0,25	0,75	1,68	4	5	8
EXCAVACIÓN	Solado	H (tbs)	B EXT BOX	Lado (a7)	und	# Box	Vol
SOLERA	0,05	0,35	1,5	0,55	2	5	4

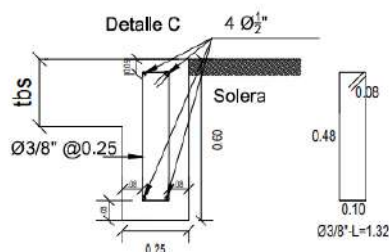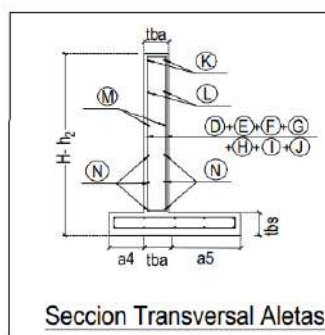

Aletas					Base aleta						
H _{externo}	h ₁	h ₂	a ₁	tba	tbs	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55

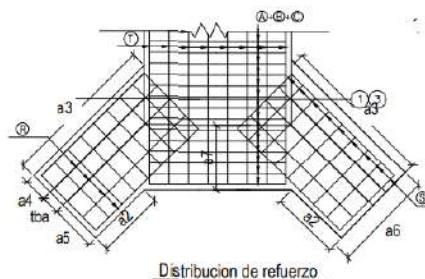

VOL EXC BOX	145,54
EXCAVACIÓN ZAPATA ALETAS	8
EXCAVACIÓN SOLERA	4
TOTAL EXCAVACIÓN	157,54

VOL RELLENO	63,22
--------------------	--------------

630.4 630 Concreto clase D ($f'_c = 21$ Mpa) - Para Box-Culvert (m3)

630.6 630 Concreto clase F ($f_c = 14$ Mpa) (m3)

630.4	Vol Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Box-Couvert - SEGÚN CARTILLA DE INVIAS						
DESCRIPCION	UN	CANT	ML	# BOX	SUB TOTAL		
BOX CULVER	m3/ml	1,250	7	5	43,75		
ALETAS	m3	1,41		5	7,05		
BASE ALETAS	m3	0,98		5	4,90		
PLACA SOLERA	m3	1,0		5	5,00		
GUARDA RUEDA	m3	0,23		5	1,15		
TOTAL				TOTAL	61,85		
630.6	Vol Concreto clase F (f'c = 14 Mpa) - SEGÚN CARTILLA DE INVIAS						
DESCRIPCION	UN	CANT	B EXT	L (ML)	ESP	# BOX	SUB TOTAL
BOX CULVER	m3	1,00	1,50	7,00	0,05	5,00	2,63
	UN	CANT	a3	a6	ESP	# BOX	
ZAPATAS ALETAS	m3	4,00	1,68	0,75	0,05	5,00	1,26
	UN	CANT	B EXT	a7	ESP	# BOX	
PLACA SOLERA	m3	2,00	1,50	0,55	0,05	5,00	0,41
						TOTAL	4,30

640.1 640 Acero de refuerzo ($4200 \text{ Kg/cm}^2 \leq f_y \leq 5200 \text{ Kg/cm}^2$) (kg)

640.1	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2) - SEGÚN CARTILLA INVIAS BOX 1x1			
DESCRIPCION	Kg/ml	L	# Box	SUB TOTAL
BOX	153,57	7	5	5374,95
	Kg		# Box	
ALETAS Y PLACA SOLERA	402,04		5	2010,2
GUARDA RUEDAS	38,07		5	190,35
			TOTAL (KG)	7575.5

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
--	---	-----------------------------------

• **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO**

6 600.1.1 600 **Excavaciones varias sin clasificar (m3)**

7 320.3 320 **Subbase Granular Clase C (m3)**


TRAMO 1 :FLAMENCO K9+000 -K9+543							
TERRENO NATURAL				DIF H CON RELACION AL EJE		ÁREA	
ABSC	B IZQ	EJE	B DER	B IZQ	B DER	B IZQ	B DER
0	11,944	11,938	11,818	-0,006	0,120	-0,01	0,15
10	11,871	11,870	11,860	-0,001	0,010	-0,0013	0,01
20	10,880	11,024	11,101	0,144	-0,077	0,18	-0,10
30	10,168	10,223	10,101	0,055	0,122	0,07	0,15
40	9,839	9,854	9,849	0,015	0,005	0,02	0,01
50	9,720	9,717	9,617	-0,003	0,100	-0,004	0,13
60	9,612	9,520	9,460	-0,092	0,060	-0,12	0,07
70	9,462	9,446	9,312	-0,016	0,134	-0,02	0,17
80	9,357	9,308	9,223	-0,049	0,085	-0,06	0,11
90	9,186	9,195	9,029	0,009	0,166	0,01	0,21
100	9,081	9,064	8,978	-0,017	0,086	-0,02	0,11
110	9,060	8,997	8,911	-0,063	0,086	-0,08	0,11
120	8,993	8,988	8,861	-0,005	0,127	-0,01	0,16
130	9,142	8,956	8,776	-0,186	0,180	-0,23	0,23
140	9,163	9,001	8,877	-0,162	0,124	-0,20	0,15
150	9,346	9,245	9,033	-0,101	0,212	-0,13	0,27
160	9,451	9,437	9,331	-0,014	0,106	-0,02	0,13
170	9,264	9,478	9,472	0,214	0,006	0,27	0,01
180	9,760	9,703	9,652	-0,057	0,051	-0,07	0,06
190	10,047	9,916	9,848	-0,131	0,068	-0,16	0,08
200	9,924	9,923	9,914	-0,001	0,009	-0,001	0,01
210	9,767	9,717	9,562	-0,050	0,155	-0,06	0,19
220	9,811	9,727	9,632	-0,084	0,095	-0,11	0,12
230	9,865	9,758	9,755	-0,107	0,003	-0,13	0,00
240	9,890	9,839	9,794	-0,051	0,045	-0,06	0,06
250	9,678	9,821	9,730	0,143	0,091	0,18	0,11
260	9,723	9,666	9,554	-0,057	0,112	-0,07	0,14
270	9,779	9,539	9,410	-0,240	0,129	-0,30	0,16
280	9,532	9,451	9,305	-0,081	0,146	-0,10	0,18
290	9,431	9,327	9,260	-0,104	0,067	-0,13	0,08
300	9,378	9,356	9,283	-0,022	0,073	-0,03	0,09
310	9,318	9,359	9,301	0,041	0,058	0,05	0,07
320	9,235	9,320	9,351	0,085	-0,031	0,11	-0,04
330	9,119	9,189	9,140	0,070	0,049	0,09	0,06
340	9,096	9,084	9,068	-0,012	0,016	-0,02	0,02
350	8,968	9,006	8,900	0,038	0,106	0,05	0,13
360	8,784	8,844	8,753	0,060	0,091	0,07	0,11
370	8,676	8,664	8,647	-0,012	0,017	-0,02	0,02
380	8,522	8,630	8,547	0,108	0,083	0,14	0,10
390	8,399	8,511	8,479	0,112	0,032	0,14	0,04
400	8,412	8,427	8,483	0,015	-0,056	0,02	-0,07
410	8,476	8,565	8,523	0,089	0,042	0,11	0,05
420	8,514	8,520	8,460	0,006	0,060	0,01	0,07
430	8,468	8,473	8,429	0,005	0,044	0,01	0,06
440	8,373	8,372	8,315	-0,001	0,057	0,00	0,07
450	8,339	8,317	8,242	-0,022	0,075	-0,03	0,09
460	8,215	8,255	8,214	0,040	0,041	0,05	0,05
470	8,149	8,136	8,128	-0,013	0,008	-0,02	0,01
480	8,015	8,127	7,972	0,112	0,155	0,14	0,19
490	8,173	8,229	8,205	0,056	0,024	0,07	0,03
500	7,942	8,009	8,002	0,067	0,007	0,08	0,01
510	7,886	8,011	8,006	0,125	0,005	0,16	0,01
520	7,856	7,993	7,951	0,137	0,042	0,17	0,05
530	7,978	8,067	7,954	0,089	0,113	0,11	0,14
540	7,869	8,072	7,906	0,203	0,166	0,25	0,21
543	8,091	8,205	7,919	0,114	0,286	0,14	0,36



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

Método del área media

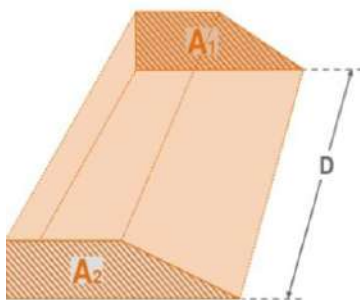

$$V = \left(\frac{A_1 + A_2}{2} \right) \times D$$


Donde:

- V: Volumen de movimiento de tierras
- A₁, A₂: Áreas de secciones transversales consecutivas
- D: Distancia entre las secciones

CÁLCULO DE CORTES Y RELLENOS

Cálculo de los volúmenes de corte y relleno

Caso 2: una sección está en corte y la otra en relleno

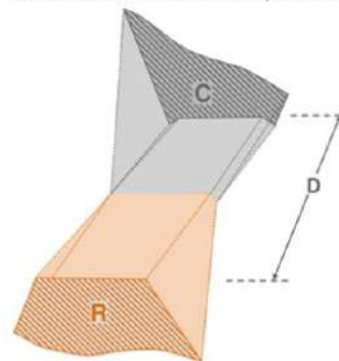

$$V_C = \left(\frac{C^2}{C + R} \right) \times \frac{D}{2}$$

$$V_R = \left(\frac{R^2}{C + R} \right) \times \frac{D}{2}$$



Donde:

- V_C, V_R: Volúmenes de corte y relleno
- C: Áreas de sección en corte
- R: Áreas de sección en relleno
- D: Distancia entre las secciones

Fuente: Eddy Salpín

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
0	0	2,5	5				
	11,944	11,938	11,818				
	0,006	0	0,120	0,0075	0,15		

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
10	0	2,5	5				
	11,871	11,870	11,860				
	0,001	0	0,010	0,0013	0,01	0,0438	0,8125







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
20	0	2,5	5				
	10,880	11,024	11,101				
	0,144	0	0,077	0,1800	0,10	0,00004	0,89
						0,43	0,01




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
30	0	2,5	5				
	10,168	10,223	10,101				
	0,055	0	0,122	0,0688	0,15	0,19	0,06
							0,47




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
40	0	2,5	5				
	9,839	9,854	9,849				
	0,015	0	0,005	0,0187	0,01		1,23



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
50	0	2,5	5				
	9,720	9,717	9,617				
	0,003	0	0,100	0,0038	0,13	0,003	0,08
							0,66



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
60	0	2,5	5				
	9,612	9,520	9,460				
	0,092	0	0,060	0,1150	0,07	0,59	1,00







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
70	0	2,5	5				
	9,462	9,446	9,312				
	0,016	0	0,134	0,0200	0,17	0,68	1,21




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
80	0	2,5	5				
	9,357	9,308	9,223				
	0,049	0	0,085	0,0612	0,11	0,41	1,37




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
90	0	2,5	5				
	9,186	9,195	9,029				
	0,009	0	0,166	0,0113	0,21	0,26	0,01
							1,57



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
100	0	2,5	5				
	9,081	9,064	8,978				
	0,017	0	0,086	0,0212	0,11	0,07	0,02
							0,02



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
110	0	2,5	5				
	9,060	8,997	8,911				
	0,063	0	0,086	0,0788	0,11	0,50	1,08







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
120	0	2,5	5				
	8,993	8,988	8,861				
	0,005	0	0,127	0,0063	0,16	0,43	1,33




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
130	0	2,5	5				
	9,142	8,956	8,776				
	0,186	0	0,180	0,2325	0,23	1,19	1,92




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
140	0	2,5	5				
	9,163	9,001	8,877				
	0,162	0	0,124	0,2025	0,15	2,18	1,9



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
150	0	2,5	5				
	9,346	9,245	9,033				
	0,101	0	0,212	0,1263	0,27	1,64	2,1



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
160	0	2,5	5				
	9,451	9,437	9,331				
	0,014	0	0,106	0,0175	0,13	0,72	1,99







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
170	0	2,5	5				
	9,264	9,478	9,472				
	0,214	0	0,006	0,2675	0,01	0,01	1,26
							0,70




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
180	0	2,5	5				
	9,760	9,703	9,652				
	0,057	0	0,051	0,0713	0,06	0,07	1,06
							0,36




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
190	0	2,5	5				
	10,047	9,916	9,848				
	0,131	0	0,068	0,1638	0,08	1,18	0,74



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
200	0	2,5	5				
	9,924	9,923	9,914				
	0,001	0	0,009	0,0012	0,01	0,82	0,48



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
210	0	2,5	5				
	9,767	9,717	9,562				
	0,050	0	0,155	0,0625	0,19	0,32	1,03







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
220	0	2,5	5				
	9,811	9,727	9,632				
	0,084	0	0,095	0,1050	0,12	0,84	1,56




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
230	0	2,5	5				
	9,865	9,758	9,755				
	0,107	0	0,003	0,1338	0,004	1,19	0,61




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
240	0	2,5	5				
	9,890	9,839	9,794				
	0,051	0	0,045	0,0638	0,06	0,99	0,30



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
250	0	2,5	5				
	9,678	9,821	9,730				
	0,143	0	0,091	0,1787	0,11	0,08	0,66
							0,85



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
260	0	2,5	5				
	9,723	9,666	9,554				
	0,057	0	0,112	0,07	0,14	0,10	0,64
							1,27







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
270	0	2,5	5				
	9,779	9,539	9,410				
	0,240	0	0,129	0,30	0,16	1,86	1,51




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
280	0	2,5	5				
	9,532	9,451	9,305				
	0,081	0	0,146	0,10	0,18	2,01	1,72




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
290	0	2,5	5				
	9,431	9,327	9,260				
	0,104	0	0,067	0,13	0,08	1,16	1,33



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
300	0	2,5	5				
	9,378	9,356	9,283				
	0,022	0	0,073	0,03	0,09	0,79	0,88



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
310	0	2,5	5				
	9,318	9,359	9,301				
	0,041	0	0,058	0,05	0,07	0,05	0,17
							0,82







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
320	0	2,5	5				
	9,235	9,320	9,351				
	0,085	0	0,031	0,11	0,04	0,07	0,24
							0,79




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
330	0	2,5	5				
	9,119	9,189	9,140				
	0,070	0	0,049	0,09	0,06	0,08	0,19
							0,97




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
340	0	2,5	5				
	9,096	9,084	9,068				
	0,012	0	0,016	0,02	0,02	0,01	0,37
							0,41



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
350	0	2,5	5				
	8,968	9,006	8,900				
	0,038	0	0,106	0,05	0,13	0,02	0,18
							0,76



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
360	0	2,5	5				
	8,784	8,844	8,753				
	0,060	0	0,091	0,07	0,11		0,61
							1,23







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
370	0	2,5	5				
	8,676	8,664	8,647				
	0,012	0	0,017	0,02	0,02	0,01	0,31
							0,67




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
380	0	2,5	5				
	8,522	8,630	8,547				
	0,108	0	0,083	0,14	0,10	0,01	0,61
							0,62




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
390	0	2,5	5				
	8,399	8,511	8,479				
	0,112	0	0,032	0,14	0,04		0,72
							1,38




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A CORTE	VOL CORTE	A RELENO
400	0	2,5	5				
	8,412	8,427	8,483				
	0,015	0	0,056	0,02	0,07	0,22	0,07
							0,79



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
410	0	2,5	5				
	8,476	8,565	8,523				
	0,089	0	0,042	0,11	0,05	0,20	0,11
							0,65



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
420	0	2,5	5				
	8,514	8,52	8,46				
	0,006	0	0,06	0,01	0,07		0,59
							0,64







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
430	0	2,5	5				
	8,468	8,473	8,429				
	0,005	0	0,044	0,01	0,06		0,07
							0,65




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
440	0	2,5	5				
	8,373	8,372	8,315				
	0,001	0	0,057	0,001	0,07	0,001	0,12
							0,63




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
450	0	2,5	5				
	8,339	8,317	8,242				
	0,022	0	0,075	0,028	0,09	0,14	0,825



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
460	0	2,5	5				
	8,215	8,255	8,214				
	0,04	0	0,041	0,050	0,05	0,05	0,16
							0,72



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
470	0	2,5	5				
	8,149	8,136	8,128				
	0,013	0	0,008	0,016	0,01	0,02	0,19
							0,31





"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020






ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
480	0	2,5	5				
	8,015	8,127	7,972				
	0,112	0	0,155	0,140	0,19	0,01	0,63
							1,02

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
490	0	2,5	5				
	8,173	8,229	8,205				
	0,056	0	0,024	0,070	0,03		1,12
							1,05

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
500	0	2,5	5				
	7,942	8,009	8,002				
	0,067	0	0,007	0,084	0,01		0,19
							0,77

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
510	0	2,5	5				
	7,886	8,011	8,006				
	0,125	0	0,005	0,156	0,01		0,07
							1,20

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
520	0	2,5	5				
	7,856	7,993	7,951				
	0,137	0	0,042	0,171	0,05		0,29
							1,64







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
530	0	2,5	5				
	7,978	8,067	7,954				
	0,089	0	0,113	0,111	0,14		0,97
							1,41



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
540	0	2,5	5				
	7,869	8,072	7,906				
	0,203	0	0,166	0,254	0,21		1,74
							1,83



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	A RELENO
543	0	2,5	5				
	8,091	8,205	7,919				
	0,114	0	0,286	0,1425	0,3575		0,85
							0,59



VOL. NIVELACION A COTA DE EJE:

VOL TOTAL CORTE	VOL TOTAL RELLENO
21,61	69,61



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

IMPORTANTE: EL TRAMO A INTERVENIR CUENTA CON VIVIENDAS A AMBOS LADOS DE LA VIA, POR LO TANTO, SE CONSIDERÓ EL ESPESOR DE LA EXCAVACIÓN DE 0,30m PARA POSTERIORMENTE, REALIZAR EL RELLENO DE SUB BASE DE 0,15m Y PLACA HUELLA DE 0,15m Y DEJAR EL NIVEL DE PLACA HUELLA A LA MISMA COTA DE EJE DEL TERRENO NATURAL, CON EL FIN DE QUE LAS VIVIENDAS NO QUEDEN DEBAJO DEL NIVEL DE LA PLACA HUELLA.



	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	--

REVISIÓN PENDIENTES VERTICALES:

Descripción	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Cota de Eje terreno Natural	11,938	11,870	11,024	10,223	9,854	9,717	9,520	9,446	9,308	9,195	9,064
Cota de Relleno	11,788	11,720	10,874	10,073	9,704	9,567	9,370	9,296	9,158	9,045	8,914
Cota de excavación	11,638	11,570	10,724	9,923	9,554	9,417	9,220	9,146	9,008	8,895	8,764
Pendiente	-0,68%	-8,46%	-8,01%	-3,69%	-1,37%	-1,97%	-0,74%	-1,38%	-1,13%	-1,31%	-0,67%

Descripción	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Cota de Eje terreno Natural	8,997	8,988	8,956	9,001	9,245	9,437	9,478	9,703	9,916	9,923
Cota de Relleno	8,847	8,838	8,806	8,851	9,095	9,287	9,328	9,553	9,766	9,773
Cota de excavación	8,697	8,688	8,656	8,701	8,945	9,137	9,178	9,403	9,616	9,623
Pendiente	-0,09%	-0,32%	0,45%	2,44%	1,92%	0,41%	2,25%	2,13%	0,07%	-2,06%

Descripción	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Cota de Eje terreno Natural	9,717	9,727	9,758	9,839	9,821	9,666	9,539	9,451	9,327	9,356
Cota de Relleno	9,567	9,577	9,608	9,689	9,671	9,516	9,389	9,301	9,177	9,206
Cota de excavación	9,417	9,427	9,458	9,539	9,521	9,366	9,239	9,151	9,027	9,056
Pendiente	0,10%	0,31%	0,81%	-0,18%	-1,55%	-1,27%	-0,88%	-1,24%	0,29%	0,03%




"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

TRAMO 2 :CORREA K16+000 -K16+390							
TERRENO NATURAL				DIF H CON RELACION AL EJE		ÁREA	
ABSC	B IZQ	EJE	B DER	B IZQ	B DER	B IZQ	B DER
0	40,939	40,966	40,705	0,027	0,261	0,03	0,33
10	40,810	40,798	40,705	-0,012	0,093	-0,0150	0,12
20	40,712	40,789	40,771	0,077	0,018	0,10	0,02
30	40,613	40,662	40,616	0,049	0,046	0,06	0,06
40	40,164	40,299	40,366	0,135	-0,067	0,17	-0,08
50	39,598	39,678	39,634	0,080	0,044	0,100	0,05
60	39,051	39,098	39,011	0,047	0,087	0,06	0,11
70	38,339	38,296	38,233	-0,043	0,063	-0,05	0,08
80	37,118	37,327	37,265	0,209	0,062	0,26	0,08
90	36,433	36,487	36,461	0,054	0,026	0,07	0,03
100	35,673	35,697	35,641	0,024	0,056	0,03	0,07
110	34,802	34,899	34,779	0,097	0,120	0,12	0,15
120	34,047	34,110	34,076	0,063	0,034	0,08	0,04
130	33,081	33,137	33,049	0,056	0,088	0,07	0,11
140	32,318	32,301	32,251	-0,017	0,050	-0,02	0,06
150	31,279	31,309	31,299	0,030	0,010	0,04	0,01
160	30,287	30,281	30,238	-0,006	0,043	-0,01	0,05
170	29,293	29,312	29,292	0,019	0,020	0,02	0,02
180	28,293	28,321	28,268	0,028	0,053	0,04	0,07
190	27,316	27,340	27,309	0,024	0,031	0,03	0,04
200	26,378	26,412	26,379	0,034	0,033	0,042	0,04
210	25,405	25,420	25,434	0,015	-0,014	0,02	-0,02
220	24,210	24,176	23,993	-0,034	0,183	-0,04	0,23
230	22,985	23,007	22,930	0,022	0,077	0,03	0,10
240	21,818	21,704	21,685	-0,114	0,019	-0,14	0,02
250	20,787	20,799	20,706	0,012	0,093	0,02	0,12
260	19,830	19,774	19,747	-0,056	0,027	-0,07	0,03
270	18,884	18,898	18,826	0,014	0,072	0,02	0,09
280	18,017	18,102	18,008	0,085	0,094	0,11	0,12
290	17,373	17,381	17,338	0,008	0,043	0,01	0,05
300	16,739	16,707	16,826	-0,032	-0,119	-0,04	-0,15
310	16,392	16,384	16,410	-0,008	-0,026	-0,01	-0,03
320	16,049	16,058	16,133	0,009	-0,075	0,01	-0,09
330	15,891	15,953	15,916	0,062	0,037	0,08	0,05
340	15,722	15,849	15,693	0,127	0,156	0,16	0,20
350	15,624	15,652	15,559	0,028	0,093	0,03	0,12
360	15,526	15,459	15,487	-0,067	-0,028	-0,08	-0,04
370	15,425	15,355	15,416	-0,070	-0,061	-0,09	-0,08
380	15,323	15,254	15,360	-0,069	-0,106	-0,09	-0,13
390	15,261	15,046	15,252	-0,215	-0,206	-0,27	-0,26


Método del área media

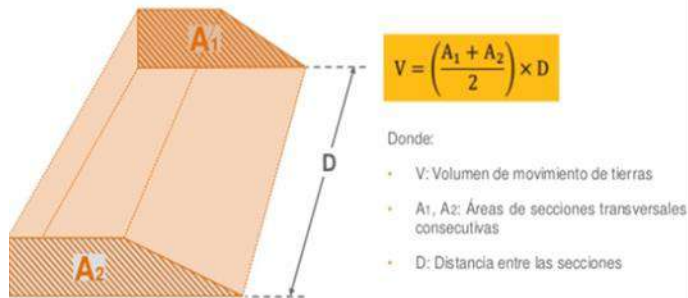

CÁLCULO DE CORTES Y RELLENOS

Cálculo de los volúmenes de corte y relleno




Caso 2: una sección está en corte y la otra en relleno

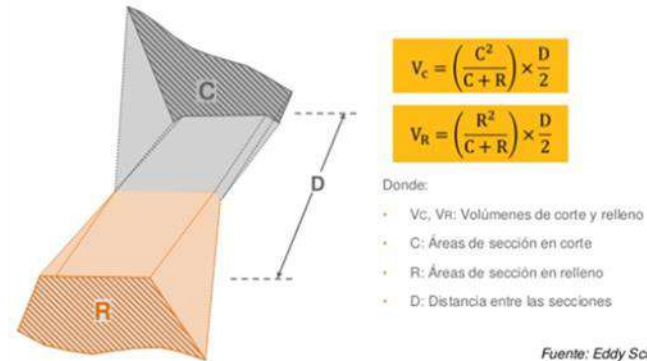

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
0	0	2,5	5				
	40,939	40,966	40,705				
	0,027	0	0,261	0,03	0,33		

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
10	0	2,5	5				
	40,810	40,798	40,705				
	0,012	0	0,093	0,02	0,12	0,02	0,12
							2,21

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
20	0	2,5	5				
	40,712	40,789	40,771				
	0,077	0	0,018	0,10	0,02	0,01	0,42
							0,69







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
30	0	2,5	5				
	40,613	40,662	40,616				
	0,049	0	0,046	0,06	0,06		0,79
							0,40




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
40	0	2,5	5				
	40,164	40,299	40,366				
	0,135	0	0,067	0,17	0,08	0,25	0,12
							1,15




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
50	0	2,5	5				
	39,598	39,678	39,634				
	0,080	0	0,044	0,10	0,05	0,253	0,11
							1,34



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
60	0	2,5	5				
	39,051	39,098	39,011				
	0,047	0	0,087	0,06	0,11		0,79
							0,82



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
70	0	2,5	5				
	38,339	38,296	38,233				
	0,043	0	0,063	0,05	0,08	0,13	0,15
							0,94







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
80	0	2,5	5				
	37,118	37,327	37,265				
	0,209	0	0,062	0,26	0,08	0,05	1,08
							0,78




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
90	0	2,5	5				
	36,433	36,487	36,461				
	0,054	0	0,026	0,07	0,03		1,64
							0,55




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
100	0	2,5	5				
	35,673	35,697	35,641				
	0,024	0	0,056	0,03	0,07		0,49
							0,51



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
110	0	2,5	5				
	34,802	34,899	34,779				
	0,097	0	0,120	0,12	0,15		0,76
							1,10



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
120	0	2,5	5				
	34,047	34,110	34,076				
	0,063	0	0,034	0,08	0,04		1,00
							0,96







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
130	0	2,5	5				
	33,081	33,137	33,049				
	0,056	0	0,088	0,07	0,11		0,74
							0,76




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
140	0	2,5	5				
	32,318	32,301	32,251				
	0,017	0	0,050	0,02	0,06	0,02	0,27
							0,86




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
150	0	2,5	5				
	31,279	31,309	31,299				
	0,030	0	0,010	0,04	0,01	0,04	0,12
							0,38



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
160	0	2,5	5				
	30,287	30,281	30,238				
	0,006	0	0,043	0,01	0,05	0,01	0,16
							0,33



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELLENO	A RELLENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
170	0	2,5	5				
	29,293	29,312	29,292				
	0,019	0	0,020	0,02	0,02	0,01	0,09
							0,39







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
180	0	2,5	5				
	28,293	28,321	28,268				
	0,028	0	0,053	0,04	0,07		0,29
							0,46




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
190	0	2,5	5				
	27,316	27,340	27,309				
	0,024	0	0,031	0,03	0,04		0,33
							0,52




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
200	0	2,5	5				
	26,378	26,412	26,379				
	0,034	0	0,033	0,0425	0,04		0,36
							0,40



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
210	0	2,5	5				
	25,405	25,420	25,434				
	0,015	0	0,014	0,02	0,02	0,03	0,14
							0,31



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
220	0	2,5	5				
	24,210	24,176	23,993				
	0,034	0	0,183	0,04	0,23	0,15	0,03
						0,01	1,06







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
230	0	2,5	5				
	22,985	23,007	22,930				
	0,022	0	0,077	0,03	0,096	0,13	0,05
							1,63




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
240	0	2,5	5				
	21,818	21,704	21,685				
	0,114	0	0,019	0,14	0,02	0,60	0,02
							0,60




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
250	0	2,5	5				
	20,787	20,799	20,706				
	0,012	0	0,093	0,0150	0,12	0,64	0,01
							0,70



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
260	0	2,5	5				
	19,830	19,774	19,747				
	0,056	0	0,027	0,07	0,03	0,29	0,01
							0,75



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
270	0	2,5	5				
	18,884	18,898	18,826				
	0,014	0	0,072	0,02	0,09	0,28	0,02
							0,62







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
280	0	2,5	5				
	18,017	18,102	18,008				
	0,085	0	0,094	0,11	0,12		0,62
							1,04




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
290	0	2,5	5				
	17,373	17,381	17,338				
	0,008	0	0,043	0,01	0,05		0,58
							0,86




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
300	0	2,5	5				
	16,739	16,707	16,826				
	0,032	0	0,119	0,04	0,15	0,16	0,01
						0,55	0,07



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
310	0	2,5	5				
	16,392	16,384	16,410				
	0,008	0	0,026	0,01	0,03	0,25	
						0,91	



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
320	0	2,5	5				
	16,049	16,058	16,133				
	0,009	0	0,075	0,01	0,09	0,02	0,01
						0,63	







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020


ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
330	0	2,5	5				
	15,891	15,953	15,916				
	0,062	0	0,037	0,08	0,05	0,31	0,08
							0,44




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
340	0	2,5	5				
	15,722	15,849	15,693				
	0,127	0	0,156	0,16	0,20		1,18
							1,21




ABS	B IZQ	EJE	B DER	A RELENO	A RELENO	VOL CORTE	VOL RELLENO
350	0	2,5	5				
	15,624	15,652	15,559				
	0,028	0	0,093	0,03	0,12		0,97
							1,56



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
360	0	2,5	5				
	15,526	15,459	15,487				
	0,067	0	0,028	0,08	0,04	0,30	0,05
						0,04	0,45



ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
370	0	2,5	5				
	15,425	15,355	15,416				
	0,070	0	0,061	0,09	0,08	0,86	
						0,56	







"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
380	0	2,5	5				
	15,323	15,254	15,360				
	0,069	0	0,106	0,09	0,13	0,87	
						1,04	

ABS	B IZQ	EJE	B DER	A CORTE	A CORTE	VOL CORTE	VOL RELLENO
390	0	2,5	5				
	15,261	15,046	15,252				
	0,215	0	0,206	0,27	0,26	1,78	
						1,95	



VOL. NIVELACION A COTA DE EJE:

VOL TOTAL CORTE	VOL TOTAL RELLENO
13,12	40,46

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
--	--	-----------------------------------

REVISIÓN PENDIENTES VERTICALES:

Descripción	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Cota de Eje terreno Natural	40,966	40,798	40,789	40,662	40,299	39,678	39,098	38,296	37,327	36,487	35,697
Cota de Relleno	40,816	40,648	40,639	40,512	40,149	39,528	38,948	38,146	37,177	36,337	35,547
Cota de excavación	40,666	40,498	40,489	40,362	39,999	39,378	38,798	37,996	37,027	36,187	35,397
Pendiente	-1,68%	-0,09%	-1,27%	-3,63%	-6,21%	-5,80%	-8,02%	-9,69%	-8,40%	-7,90%	-7,98%

110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
34,899	34,110	33,137	32,301	31,309	30,281	29,312	28,321	27,340	26,412
34,749	33,960	32,987	32,151	31,159	30,131	29,162	28,171	27,190	26,262
34,599	33,810	32,837	32,001	31,009	29,981	29,012	28,021	27,040	26,112
-7,89%	-9,73%	-8,36%	-9,92%	-10,28%	-9,69%	-9,91%	-9,81%	-9,28%	-9,92%

210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
25,420	24,176	23,007	21,704	20,799	19,774	18,898	18,102	17,381	16,707
25,270	24,026	22,857	21,554	20,649	19,624	18,748	17,952	17,231	16,557
25,120	23,876	22,707	21,404	20,499	19,474	18,598	17,802	17,081	16,407
-12,44%	-11,69%	-13,03%	-9,05%	-10,25%	-8,76%	-7,96%	-7,21%	-6,74%	-3,23%



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

310	320	330	340	350	360	370	380	390
16,384	16,058	15,953	15,849	15,652	15,459	15,355	15,254	15,046
16,234	15,908	15,803	15,699	15,502	15,309	15,205	15,104	14,896
16,084	15,758	15,653	15,549	15,352	15,159	15,055	14,954	14,746
-3,26%	-1,05%	-1,04%	-1,97%	-1,93%	-1,04%	-1,01%	-2,08%	

Descripción	Area Autocad	Ancho via	Total
Vol excavación	116,98	5,1	596,598
Vol excavación a cota de eje	ver libro tramo 2		13,12

user:
ver archivo de autocad tramo 2 Maria la baja interventoria

ANCHO DE VIA EN TRAMO CON CUNETAS Y BORDILLOS EXISTENTES	
ABCISAS	ANCHO VIA
K0+090	5,1329
K0+110	4,9652
K0+130	5,7189
K0+150	5,0240
K0+170	4,8773
K0+190	5,0043
K0+210	5,0265
K0+230	5,0080
K0+250	5,0372
K0+260	5,0164
K0+280	4,9627
K0+300	4,9770
PROMEDIO	5,0625

Excavación Riostra	b	h	l	Nro de Vigas	Vol
	0,2	0,15	4,7	140	19,74

Vol Total Excavación	629,5
-----------------------------	--------------

Descripción	Area Autocad	Ancho via	Total
Vol relleno	58,5	5,1	298,35
Vol relleno acota de eje	ver libro tramo 2		27,33

user:
ver archivo de autocad tramo 2 Maria la baja interventoria


Vol Total Relleno	325,68
--------------------------	---------------



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".


CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

9 630.7P 630 PARTICULAR Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella (ciclópeo) m3

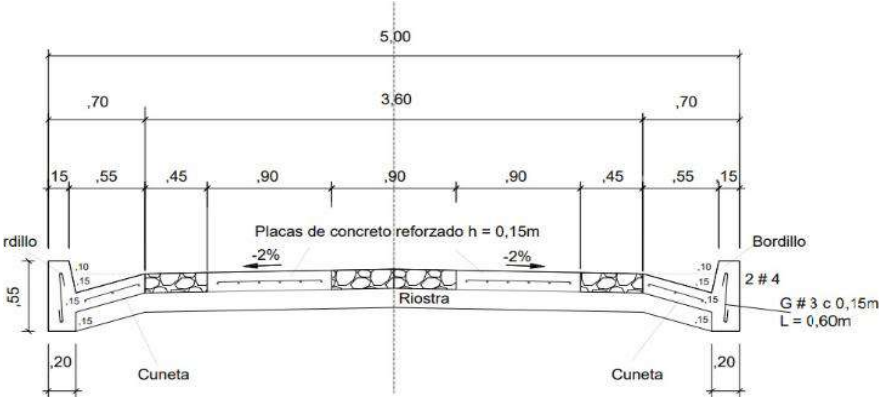TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m							
630.7P	630	DESCRIPCION	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa				
			UN	B	H	L	VOL
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - PARA PLACA HUELLA (CICLOPEO) L:2.8 E:0.15 2 UNA FRANJA DE 0.9			181	0,9	0,15	2,8	68,418
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - PARA PLACA HUELLA (CICLOPEO) L:2.8 E:0.15 2 FRANJAS DE 0.45			362	0,45	0,15	2,8	68,418
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m							
630.7P	630	DESCRIPCION	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa				
			UN	B	H	L	VOL
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - PARA PLACA HUELLA (CICLOPEO) L:2.8 E:0.15 2 UNA FRANJA DE 0.9			130	0,9	0,15	2,8	49,14
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - PARA PLACA HUELLA (CICLOPEO) L:2.8 E:0.15 2 FRANJAS DE 0.45			260	0,45	0,15	2,8	49,14
							
TOTAL (M3)							235,12

10 630.4 630

Concreto clase D ($f_c = 21$ Mpa) - Para Cunetas y bordillos) (m3)

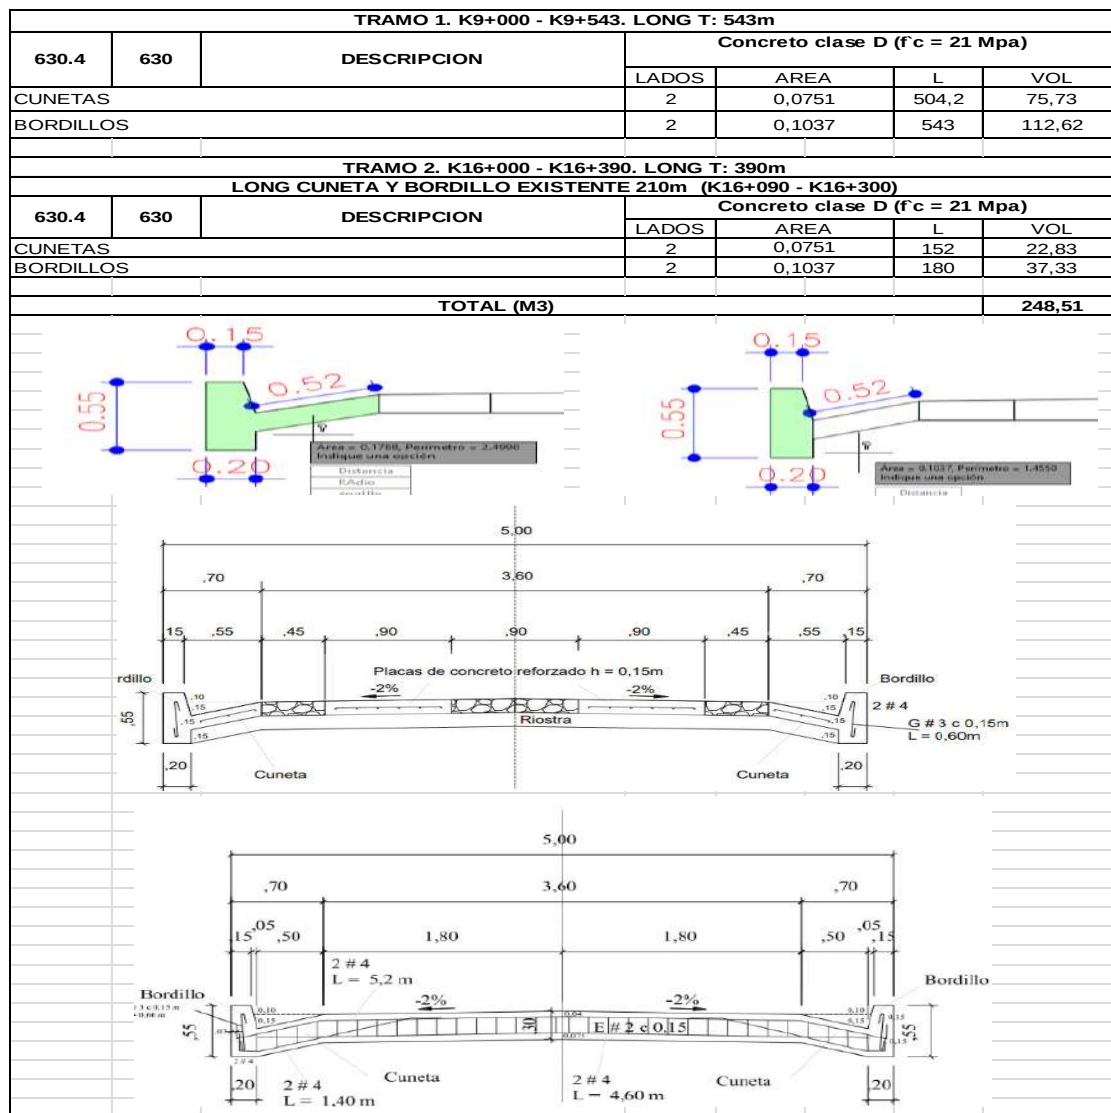



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

11 640.1 640

Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm²)

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m						
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm ² ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm ²)			
			#VIGAS	UN	KG/ML	KG
		ACERO TRANSVERSAL VIGA RIOSTRA #4 L:5.2	194	2	1	2017,60
		ACERO TRANSVERSAL VIGA RIOSTRA #4 L:4.6	194	2	1	1784,80
		ACERO ESTRIBOS # 2 ESP @ 0.15	194	31	0,25	1503,50
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m						
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm ² ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm ²)			
			#VIGAS	UN	KG/ML	KG
		ACERO TRANSVERSAL VIGA RIOSTRA #4	140	2	1	1456,00
		ACERO TRANSVERSAL VIGA RIOSTRA #4	140	2	1	1288,00
		ACERO ESTRIBOS # 2 ESP @ 0.15	140	31	0,25	1085,00
Sub - total						9134,90

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo ($4200 \text{ Kg/cm}^2 \leq f_y \geq 5200 \text{ Kg/cm}^2$)				
			# TRASLAPOS	UN	KG/ML	L + LTRASLAPOS	KG
ACERO LONGITUDINAL PLACA HUELLA #4 TRASLAPOS DE 0.6			46	12	1	570,6	6847,20
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo ($4200 \text{ Kg/cm}^2 \leq f_y \geq 5200 \text{ Kg/cm}^2$)				
			# TRASLAPOS	UN	KG/ML	L + LTRASLAPOS	KG
ACERO LONGITUDINAL PLACA HUELLA #4 TRASLAPOS DE 0.6			33	12	1	409,8	4917,60
Sub - total							11764,80

Diagram illustrating the cross-section of a reinforced concrete bridge deck. The total width is 5.00m. The central section is 3.60m wide, flanked by two 0.70m wide side sections. The central slab has a -2% slope on both sides. Reinforcement includes 2 #4 bars in the top and 3 #3 bars in the bottom. The bottom bars are spaced at 0.15m. The side sections are 0.20m wide and contain 2 #4 bars. The central slab is 0.15m high. The side sections are 0.15m high. The diagram also shows the placement of reinforcement bars and the location of the concrete slabs.

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)				
			LADOS	UN	KG/ML	L GANCHO	KG
ACERO BORDILLO GANCHO #3 @.0.15			2	3620	0,56	0,6	2432,64
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m							
LONG DE VIA CON CUNETAS Y BORDILLO EXISTENTE: 210m (K16+090 - K16+300) - POR CONSTRUIR EN 180m DE VIA							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)				
			LADOS	UN	KG/ML	L GANCHO	KG
ACERO BORDILLO GANCHO #3 @.0.15			2	1200	0,56	0,6	806,40
Sub - total							3239,04

Bordillo

G # 3 c 0,15m
L = 0,60m

.15 .55

.10 .15

.55 .15

.20 2 # 4

Cuneta

Acero transversal
2 c 0,30m

Acero longitudinal
4 c 0,15m



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m

640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm ² ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm ²)			
			LADOS	UN	KG/ML	L + L TRASLAPO
		ACERO LONGITUDINAL BORDILLO #4	2	2	1	570,15
						2280,60


TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m

LONG VIA CON CUNETAS Y BORDILLO EXISTENTE 210m (K16+090 - K16+300) - POR CONSTRUIR 180m DE VIA


640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm ² ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm ²)			
			LADOS	UN	KG/ML	L + L TRASLAPO
		ACERO LONGITUDINAL BORDILLO #4	2	2	1	189,00
						756,00

Sub - total

3036,60

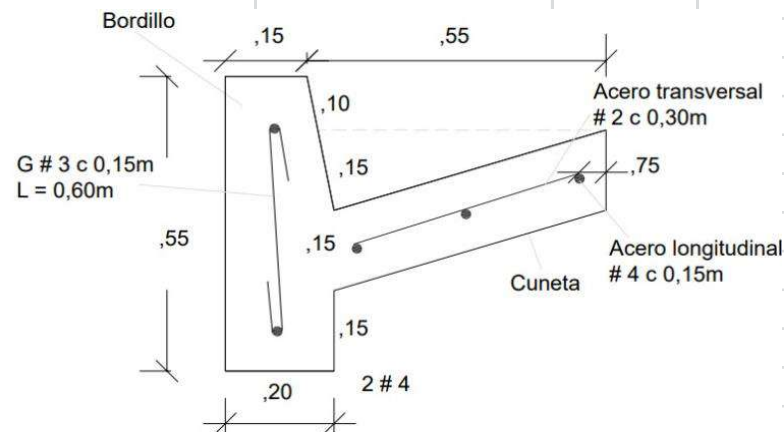

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2)				
			LADOS	UN	KG/ML	L + L TRASLAPO	KG
ACERO LONGITUDINAL CUNETA #4 @0.15			2	3	1	570,15	3420,90
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m							
LONG VIA CON CUNETA Y BORDILLO EXISTENTE 210m (K16+090 - K16+300) - POR CONSTRUIR 180m DE VIA							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2)				
			LADOS	UN	KG/ML	L + L TRASLAPO	KG
ACERO LONGITUDINAL CUNETA #4 @0.15			2	3	1	189,00	1134,00
Sub - total							4554,90

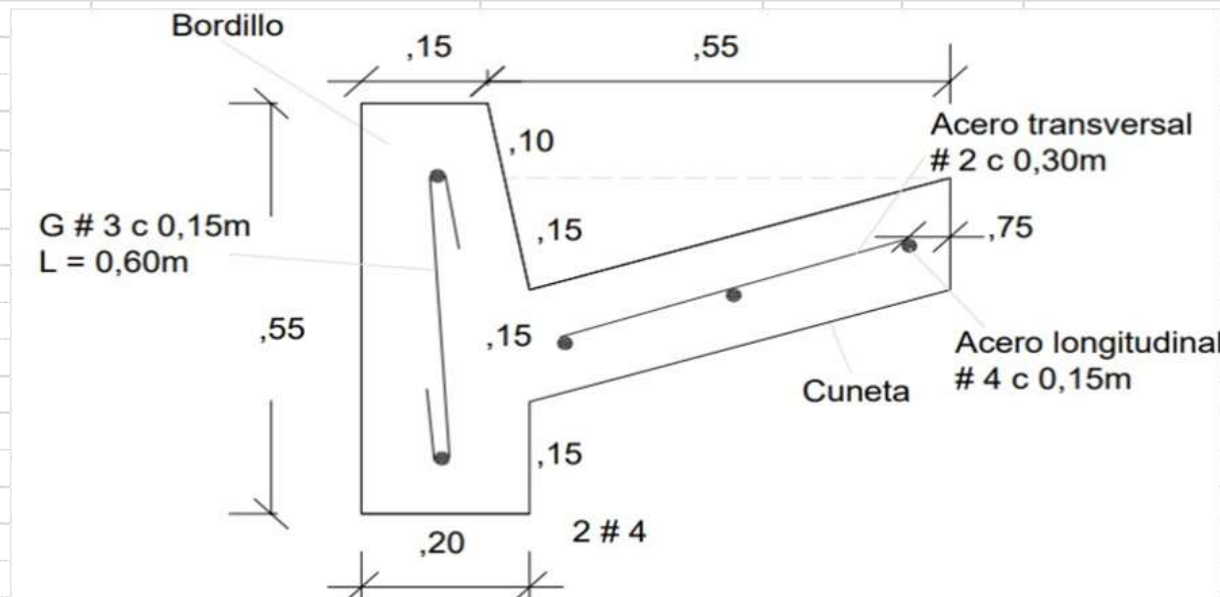



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)				
			LADOS	UN	KG/ML	L GANCHO	KG
ACERO TRANSV CUNETA #2 @0.30			2	1810	0,25	0,3	271,50
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m							
LONG VIA CON CUNETA Y BORDILLO EXISTENTE 210m (K16+090 - K16+300) - POR CONSTRUIR 180m DE VIA							
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)				
			LADOS	UN	KG/ML	L GANCHO	KG
ACERO TRANSV CUNETA #2 @0.30			2	600	0,25	0,3	90,00
Sub - total							361,50

Bordillo

G # 3 c 0,15m
L = 0,60m

,15

,55

,10

,15

,15

,15

,20

2 # 4

Acero transversal
2 c 0,30m

,75

Acero longitudinal
4 c 0,15m

Cuneta



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m						
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm ² ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm ²)			
			#VIGAS	UN	KG/ML	KG
		ACERO TRANSV 2 #4 L:1.40 REFUERZO A VIGA RIOSTRA	194	4	1	1,4
						1086,40
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m						
LONG VIA CON CUNETA Y BORDILLO EXISTENTE 210m (K16+090 - K16+300) - POR CONSTRUIR 180m DE VIA						
640.1	640	DESCRIPCION	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm ² ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm ²)			
			#VIGAS	UN	KG/ML	KG
		ACERO TRANSV 2 #4 L:1.40 REFUERZO A VIGA RIOSTRA	140	4	1	1,4
						784,00
Sub - total						1870,40

TOTAL ACERO

35117,34



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

12 433.1P 433 Sello Asfáltico para Juntas.

TRAMO 1. K9+000 - K9+543. LONG T: 543m				
433.1P	433	DESCRIPCION	Sello Asfáltico para Juntas	
			L	# JUNTAS
		JUNTAS LONGITUDINALES PLACA HUELLA	504,2	6
		JUNTA TRANSVERSALES PLACA HUELLA	5	388
				L TOTAL
				3025,2
				1940
TRAMO 2. K16+000 - K16+390. LONG T: 390m				
433.1P	433	DESCRIPCION	Sello Asfáltico para Juntas	
			L	# JUNTAS
		JUNTAS LONGITUDINALES PLACA HUELLA	362	6
		JUNTA TRANSVERSALES PLACA HUELLA	5	279
				L TOTAL
				2172
				1395
Sub - total				8532,20



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

COMPARATIVO CANTIDADES CONTRACTUALES - INTERVENTORÍA									
		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				CONTRATISTA: CORPORACIÓN SER SOCIAL NIT. 806010227-1.	CONSORCIO BOLIVAR 2020		
		DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR							
		PRESUPUESTO PRIORIZACION DE OBRAS PROGRAMA 120/50 FASE 1						CANTIDADES REVISION INTERVENTORÍA	
MUNICIPIO		VIA			Long (Km)				
MARIA LA BAJA (BOLIVAR)		TRONCAL -RETIRO NUEVO- FLAMENCO (INCLUYE TRAMO FLAMENCO- CORREA)			24,30				
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANTIDAD	MAYORES / MENORES CANTIDADES	
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN DE (6) BOX-COULVERT (L =7m DIMENSIONES 1,0 x 1,0)									
1	201.7	200		Demolicion estructuras	m3	2,00	2,00	0,00	
2	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	152,40	157,54	5,14	
3	610.2	610		Relleno para estructuras con recebo	m3	151,40	63,22	-88,18	
4	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Box-Coulvert	m3	76,20	61,85	-14,35	
5	630.6	630		Concreto clase F (f'c = 14 Mpa)	m3	6,00	4,30	-1,70	
6	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	6.780,00	7.575,50	795,50	
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
6	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	170,00	1359,47	1189,47	
7	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	709,00	714,18	5,18	
8	500.1P	500	PARTICULAR	Concreto Hidraulico para Placa Huella (f'c = 21 Mpa)	m3	480,00	329,30	-150,70	
9	630.7P	630	PARTICULAR	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella (ciclopeo)	m3	235,00	235,12	0,12	
10	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas y bordillos)	m3	206,00	248,51	42,51	
11	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	37.666,00	35.117,34	-2548,66	
12	433.1P	433		Sello Asfaltico para Juntas	ml	10.072,00	8.532,20	-1.539,80	
SECCIÓN 2 - REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS									
13	10P	Construcción de Placa Huella en Concreto, box coulvert			GL	1,00	1,00	0,00	

user:
Las cantidades de excavación, relleno, acero y concreto de box corresponden a 5 box, ya que luego de realizar la visita tecnica se observo que uno de los box existentes incluido en el contrato se encuentra en buen estado.

user:

Las cantidades de excavación, relleno, acero y concreto de box corresponden a 5 box, ya que luego de realizar la visita tecnica se observo que uno de los box existentes incluido en el contrato se encuentra en buen estado.

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-----------------------------------

7.2 REVISION INTERVENTORIA CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET-CONCIVIL S.A.S.

ABSCISA	COTA DERECHA	COTA EJE	COTA IZQUIERDA	ESTADO
PR0+878	156,99	156,59	156,52	NO EXISTE
PR1+169	164,89	164,90	164,11	NO EXISTE
PR2+131	160,04	160,03	160,02	EXISTENTE
	158,62		158,43	
PR5+231	135,71	136,12	136,51	NO EXISTE
PR6+715	133,83	133,81	133,79	EXISTENTE
	132,04		131,68	
PR8+026	129,50	129,12	128,36	NO EXISTE
PR8+512	105,43	105,41	105,39	EXISTENTE
	104,24		104,13	



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

- La revisión de las cantidades se realizó con la información recibida a la fecha, aún está pendiente ajustar algunos ítems conforme el contratista vaya entregando nueva información o complementando la información existente.
- Luego de revisar nuevamente las especificaciones técnicas de Invias del ítem de pago 600.1.1, se concluyó:

Capítulo 6 – ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Art. 600

EXCAVACIONES VARIAS

ARTÍCULO 600 – 13

600.1 DESCRIPCIÓN

600.1.1 Generalidades

Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras a las cuales se refiere el presente Artículo, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Interventor. Comprende, además, la construcción de sistemas de apuntalamientos y entibados, encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje que fuere necesario para la ejecución de los trabajos de excavación, así como el retiro subsiguiente de encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, el transporte y la disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del trabajo.

No se incluyen en este Artículo las excavaciones contempladas por el Artículo 210, las excavaciones para pilotes pre-excavados, las cuales están comprendidas en el Artículo 621, y cualquier otra excavación considerada en algún otro Artículo de estas especificaciones.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020

REVISIÓN VOLUMEN DE BOX:

2	600.1.1	600	Excavaciones varias sin clasificar (m3)
3	610.2	610	Relleno para estructuras con recebo (m3)

ABSCISA	COTA DERECHA	COTA EJE	COTA IZQUIERDA	AREA EXC	B EXT BOX	SOBRE ANCHO	AREA DE RELLENO	VOL EXC	VOL RELLENO
PRO+878	156,99	156,59	156,52	11,92	1,50	1,00	0,49	29,8	12,075

Área = 11.9175, Perímetro = 17.5935
Indique una opción


Área = 0.4900, Perímetro = 14.1400
Indique una opción

- Distancia
- RAdio
- ángUlo
- sRea
- Volumen
- Salir



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".


CONSORCIO BOLÍVAR 2020

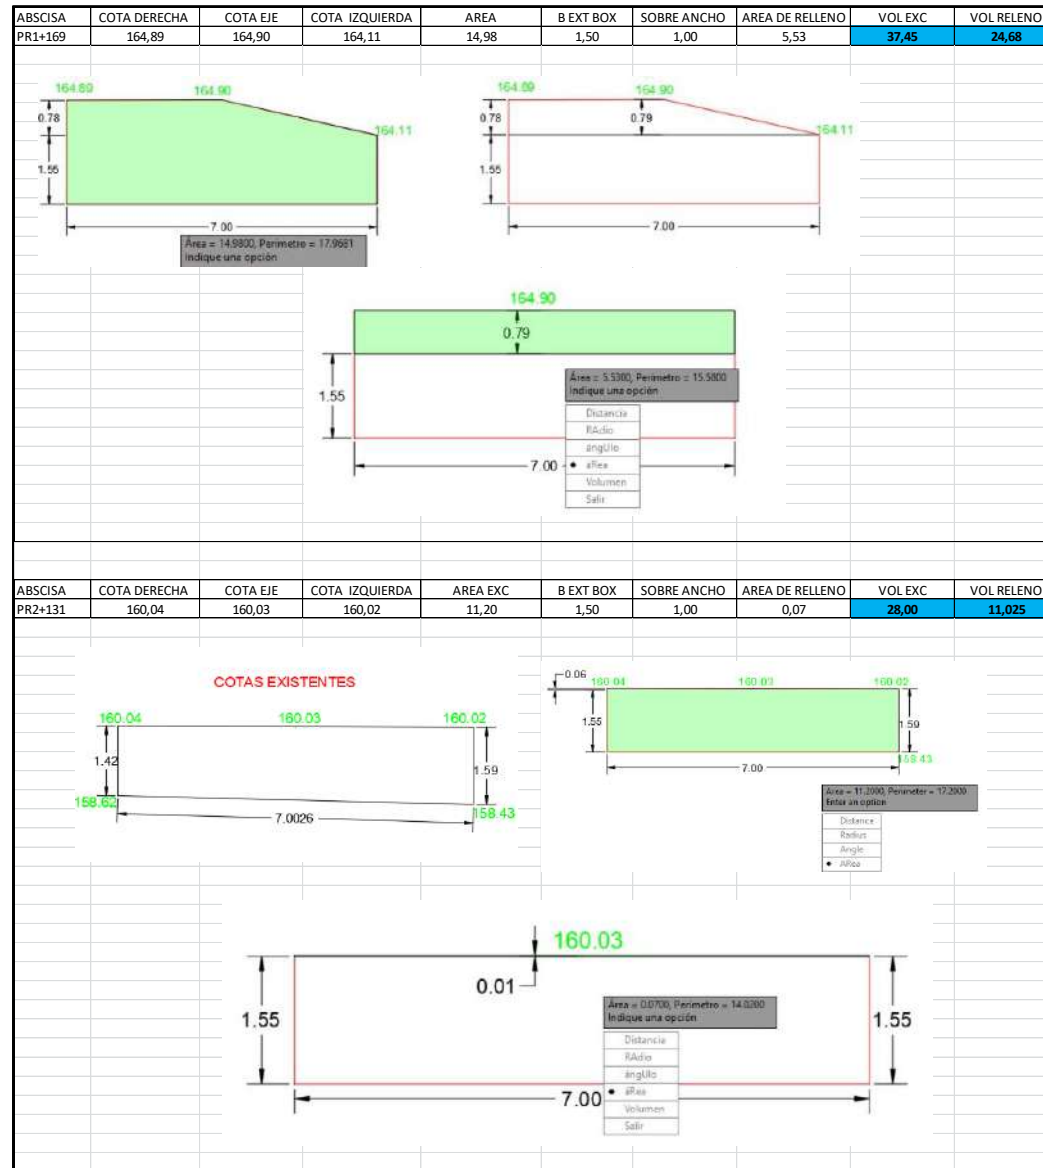



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

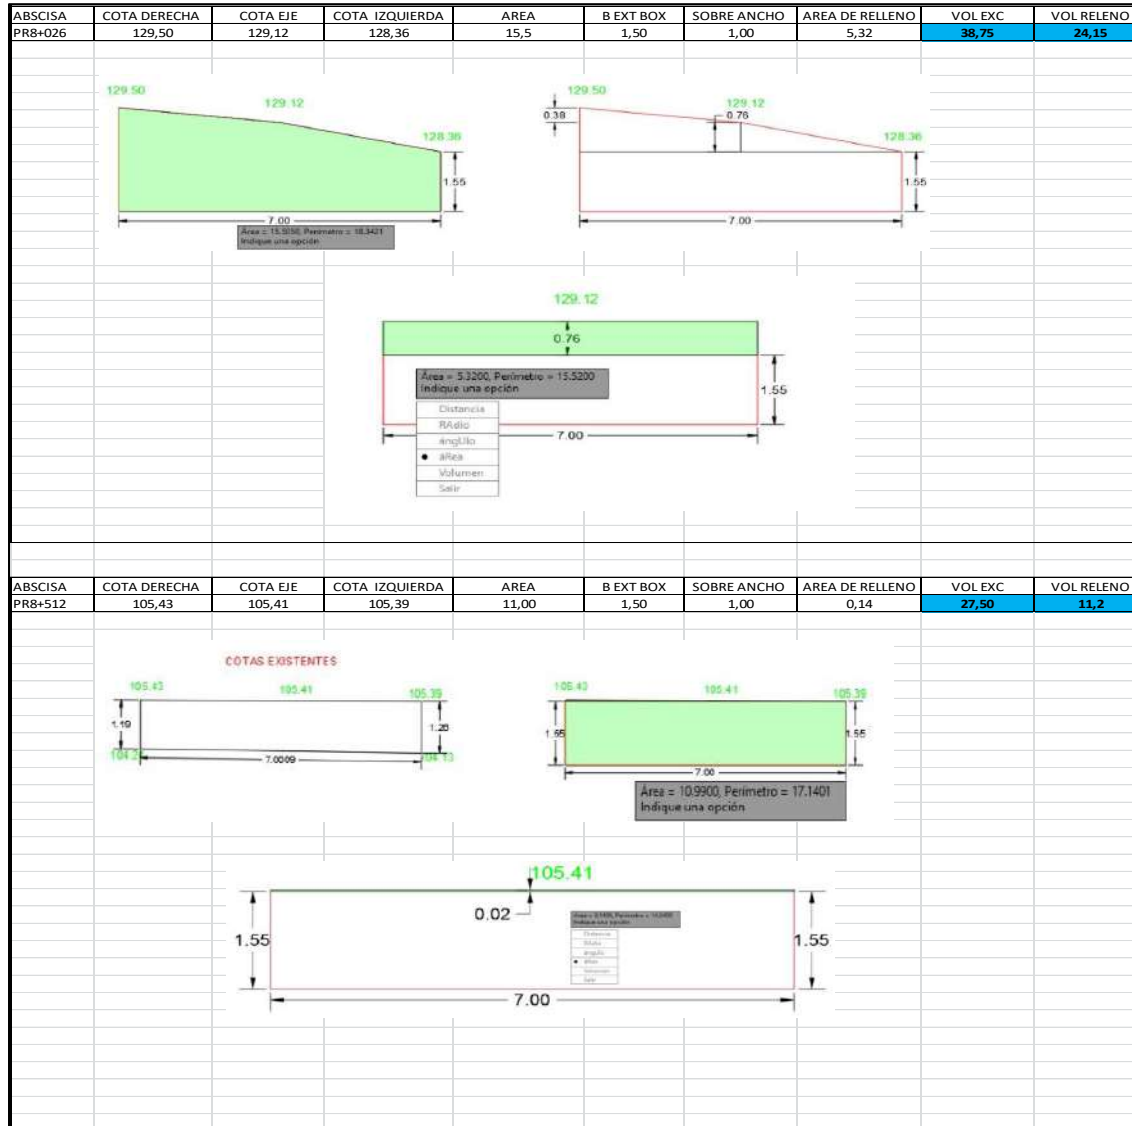



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020

REVISIÓN DE ACUERDO A CARTILLA GUIA PARA EVALUACION DE CANTIDADES Y EJECUCION DE PRESUPUESTOS							
EXCAVACIÓN	Solado	H (tbs)	lado 1 (a6)	lado 2 (a3)	und	# Box	Vol
ZAPATA ALETAS	0,05	0,25	0,75	1,68	4	7	11
EXCAVACIÓN	Solado	H (tbs)	B EXT BOX	Lado (a7)	und	# Box	Vol
SOLERA	0,05	0,35	1,5	0,55	2	7	5

Aletas				Base aleta							
H _{extremo}	h ₁	h ₂	a ₁	tba	tbs	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55
1.50	0.75	0.75	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55

CARTERA DE BOXCOULVERT						
ABSCISA	COTA DERECHA	COTA EJE	COTA IZQUIERDA	ESTADO	VOL EXC	VOL RELLENO
PR0+878	156,99	156,59	156,52	NO EXISTE	29,80	12,08
PR1+169	164,89	164,90	164,11	NO EXISTE	37,45	24,68
PR2+131	160,04	160,03	160,02	EXISTENTE	28,00	11,03
	158,62		158,43			
PR5+231	135,71	136,12	136,51	NO EXISTE	34,23	18,03
PR6+715	133,83	133,81	133,79	EXISTENTE	30,98	16,95
	132,04		131,68			
PR8+026	129,50	129,12	128,36	NO EXISTE	38,75	
PR8+512	105,43	105,41	105,39	EXISTENTE	27,50	11,20
	104,24		104,13			
				TOTAL	226,70	93,95

VOL EXC BOX	226,7
EXCAVACIÓN ZAPATA ALETAS	11
EXCAVACIÓN SOLERA	5
TOTAL	242,7
VOL RELLENO BOX	93,95

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
--	--	-------------------------------

4 630.4 630 Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Box-Culvert (m3)

630.4	CONCRETO CLASE D (F`C = 21 MPA) - PARA BOX COULVERT 1X1 - SEGÚN CARTILLA DE INVIAS				
DESCRIPCION	UN	CANT	ML	# BOX	SUB TOTAL
BOX CULVER	m3/ml	1,250	7	7	61,25
ALETAS	m3	1,41		7	9,87
BASE ALETAS	m3	0,98		7	6,86
PLACA SOLERA	m3	1,0		7	7,00
GUARDA RUEDA	m3	0,23		7	1,61
TOTAL					86,59

5 630.6 630 Concreto clase F (f`c = 14 Mpa) (m3)

630.6	CONCRETO CLASE F (F`C = 14 MPA) BOX 1X1 - SEGÚN CARTILLA DE INVIAS						
	UN	CANT	B EXT	L (ML)	ESP	# BOX	SUB TOTAL
BOX CULVER	m3	1,00	1,50	7,00	0,05	7,00	3,68
	UN	CANT	a3	a6	ESP	# BOX	
ZAPATAS ALETAS	m3	4,00	1,68	0,75	0,05	7,00	1,76
	UN	CANT	B EXT	a7	ESP	# BOX	
PLACA SOLERA	m3	2,00	1,50	0,55	0,05	7,00	0,58
TOTAL							6,02

Vólumen de concreto f`c=21MPa				
Box culvert	Aletas	Base aletas	Placa solera	Concreto guarda ruedas
m ³ /ml	m ³	m ³	m ³	m ³
1.25	1.41	0.98	1.00	0.23

Base aleta						
tbs	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇
m	m	m	m	m	m	m
0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

6 640.1 640 Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² ≤ f_y ≤ 5200 Kg/cm²) (kg)

CANTIDAD DE ACERO SEGÚN CARTILLA INVIAS BOX 1x1				
	Kg/ml	L	# Box	
BOX	153,57	7	7	7524,93
	Kg		# Box	
ALETAS Y PLACA SOLERA	402,04		7	2814,28
GUARDA RUEDA	38,07		7	266,49
			TOTAL (KG)	10605,70

Cantidades de obra para box culvert con relleno

ESPESOR DE RELLENO	DIMENSIONES INTERNAS DEL BOX CULVERT	TOTAL ACERO kg/m VARILLAS A,B,C,T,U,V			TOTAL kg/ml
		3/8"	1/2"	5/8"	
h _r = 1m	1.00 x 1.00 m	35.28	118.29	--	153.57
h _r = 2m	1.00 x 1.00 m	33.49	94.63	--	128.12
h _r = 3m	1.00 x 1.00 m	33.49	94.63	--	128.12
h _r = 4m	1.00 x 1.00 m	35.28	118.29	--	153.57
h _r = 5m	1.00 x 1.00 m	35.28	118.29	--	153.57
h _r = 1m	1.50 x 1.50 m	49.47	197.57	--	247.04
h _r = 2m	1.50 x 1.50 m	49.47	197.57	--	247.04
h _r = 3m	1.50 x 1.50 m	49.47	197.57	--	247.04
h _r = 4m	1.50 x 1.50 m	49.47	197.57	--	247.04
h _r = 5m	1.50 x 1.50 m	51.30	227.79	--	279.09
h _r = 1m	2.00 x 2.00 m	80.63	245.31	--	325.94
h _r = 2m	2.00 x 2.00 m	80.63	245.31	--	325.94
h _r = 3m	2.00 x 2.00 m	84.16	306.36	--	390.53
h _r = 4m	2.00 x 2.00 m	84.16	306.36	--	390.53
h _r = 5m	2.00 x 2.00 m	87.72	367.78	--	455.50
h _r = 1m	3.00 x 3.00 m	--	205.46	544.51	749.96
h _r = 2m	3.00 x 3.00 m	--	205.46	544.51	749.96
h _r = 3m	3.00 x 3.00 m	--	221.34	816.35	1037.70

Cantidades de obra para aletas y placa solera

Box culvert -aletas h _f = 0-5 m	Total refuerzo kg 5/8"	Total refuerzo kg 1/2"	Total refuerzo kg 3/8"	Total kg
1.00 x 1.00 m	--	364.53	37.51	402.04
1.50 x 1.00 m	--	364.53	37.51	402.04
1.50 x 1.50 m	--	640.80	58.23	699.03
2.00 x 2.00 m	--	1373.17	111.27	1484.45
2.50 x 2.00 m	--	1373.17	111.27	1484.45
2.50 x 2.50 m	278.43	1831.83	33.39	2143.65
3.00 x 3.00 m	326.85	2065.67	36.91	2429.44

*Las cantidades de materiales incluyen 4 aletas y dos placa solera

Cantidades de obra para guarda rueda

DIMENSIONES INTERNAS DEL BOX CULVERT	Cantidad de acero 3/8" (kg)	Cantidad de acero 1/2" (kg)	Cantidad de acero 5/8" (kg)	Total kg
1.00 x 1.00 m	--	38.07	--	38.07
1.50 x 1.00 m	--	50.99	--	50.99
1.50 x 1.50 m	--	50.99	--	50.99
2.00 x 2.00 m	--	95.69	--	95.69
2.50 x 2.00 m	--	114.24	--	114.24
2.50 x 2.50 m	--	114.24	--	114.24
3.00 x 3.00 m	--	146.45	--	146.45

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
--	--	-----------------------------------

COMPARATIVO CANTIDADES CONTRACTUALES - INTERVENTORÍA										
		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					MET-CONCIVIL SAS NIT.812004943-4		CONSORCIO BOLIVAR 2020	
		DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR								
		PRESUPUESTO PRIORIZACION DE OBRAS PROGRAMA 120/50 FASE 1								
MUNICIPIO			VIA			Long (Km)	CANTIDADES REVISION INTERVENTORÍA			
SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)			SAN JUAN - SAN JOSE DEL PEÑON (PORQUERAS)			8,90				
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA							CONTRACTUAL			
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	CANTIDAD	MAYORES / MENORES CANTIDADES	
		GENERAL 2018	PARTICULAR							
CONSTRUCCIÓN DE (7) BOX-COULVERT (L =7m DIMENSIONES 1,0 x 1,0)							CONSTRUCCIÓN DE (7) BOX-COULVERT (L =7m DIMENSIONES 1,0 x 1,0)			
1	201.7	200		Demolicion estructuras		m3	4,00	4,00	0,00	
2	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar		m3	177,80	242,70	64,90	
3	610,2	610		Relleno para estructuras con recebo		m3	177,80	93,95	-83,85	
4	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Box-Coulvert		m3	88,90	86,59	-2,31	
5	630.6	630		Concreto clase F (f'c = 14 Mpa)		m3	7,00	6,02	-0,98	
6	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)		kg	7.910,00	10.605,70	2695,70	

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-----------------------------------

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO

El contratista entrego la topografía corregida que corresponde al diseño de rasante de los tres primeros tramos a intervenir de la vía, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría.

Teniendo en cuenta el tipo de terreno (Montañoso) y que las pendientes pronunciadas del terreno natural superan las pendientes máximas entre el 10% y 12 % para velocidades entre los 30 a 40 Km/h en vías terciarias, se evaluó el hecho de que existen mayores cantidades de corte y de relleno, por tal razón se solicitó al contratista realizar ensayos a la muestra de material existente para concluir si el material de corte puede utilizarse para compensar material de relleno.

Para la fecha del presente informe la interventoría se encuentra a la espera del resultado de los ensayos y de la entrega del diseño de las curvas horizontales, para definir las cantidades de la construcción de placa huella.



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

Tramo 4 Long 50 m (K8+826 - K8+876): En el momento de realizar la visita técnica en presencia del contratista, el Secretario de Planeación de la Alcaldía de San Juan y la interventoría se observó la existencia de placa huella en la totalidad de longitud del tramo, la condición actual del pavimento existente es buena, continuación se muestra a través de fotografías el estado de la placa huella existente.

Teniendo en cuenta el buen estado de la vía existente y los volúmenes de excavación y relleno de los tres tramos existentes además de éste, es evidente que no es necesario la construcción de este último tramo, lo cual serviría para compensar las cantidades que de acuerdo al Diseño presentado por el Contratista y a la revisión de la interventoría arrojan mayores cantidades en los Ítems de excavación y rellenos, teniendo en cuenta el tipo de terreno (Montañoso), las pendientes pronunciadas del terreno natural que superan las pendientes máximas entre el 10% y 12 % para velocidades entre los 30 a 40 Km/h y las pésimas condiciones de la vía existente en los tres primeros tramos.





"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020



	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Bolívar en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	--	-------------------------------

8 ANEXOS.

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO BOLIVAR 2020. NOVIEMBRE

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO BOLIVAR 2020				
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	FRENTE/DESTINATARIO	CORREO ENVIADO
5/11/2020	CB2020-25-2020	INFORME MENSUAL NO 2 DEL MES DE OCTUBRE Y ACTA DE COBRO NO 2 DEL CONSORCIO BOLÍVAR 2020	INVIAS	ccperez@invias.gov.co
6/11/2020	CB2020-26-2020	DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA, CANTIDADES VOLÚMENES, RELLENO.	SAN JUAN NEPOMUCENO	mvizcaya1424@gmail.com placahuellasanjuan@gmail.com
6/11/2020	CB2020-27-2020	OBSERVACIONES DE LA INFORMACION TECNICA , ENTREGADA Y REQUERIMIENTOS	GUAMO	deivisperezserpa@yahoo.es
6/11/2020	CB2020-28-2020	APROBACION DE VALLA INFORMATIVA Y REQUERIMIENTOS	SAN JUAN NEPOMUCENO	mvizcaya1424@gmail.com placahuellasanjuan@gmail.com
6/11/2020	CB2020-29-2020	SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDO PARA LE INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO SI-C1808 DE 2020	SAN JACINTO BOLIVAR	dmanrique@bolivar.gov.co aslointer.sas@gmail.com
6/11/2020	CB2020-30-2020	SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDO PARA LE INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO SI-C1881 DE 2020	ZAMBRANO BOLIVAR	dmanrique@bolivar.gov.co pazconstruccionessas@gmail.com
6/11/2020	CB2020-31-2020	INICIO CONTRATO SI-C 1881 DE 2020	GOBERNACION DE BOLIVAR	dmanrique@bolivar.gov.co
6/11/2020	CB2020-32-2020	INICIO CONTRATO SI-C 1808 DE 2020	GOBERNACION DE BOLIVAR	dmanrique@bolivar.gov.co

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
--	--	--

6/11/2020	CB2020-33-2020	INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 001 DE 24 DE AGOSTO DE 2020	CORDOBA	contactenos@cordoba-bolivar.gov.co secretaria_de_planeacion@cordoba-bolivar.gov.co
7/11/2020	CB2020-34-2020	APROBACIÓN VALLA INFORMATIVA	INVIAS	ccperez@invias.gov.co
9/11/2020	BLV-006-2020	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO NO. 722 DE 2020	INVIAS	atencionciudadano@invias.gov.co Con copia a rodrigo.d.ing@gmail.com ccperez@invias.gov.co otriana@invias.gov.co jvillate@invias.gov.co
12/11/2020	CB2020-35-2020	AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 722 DE 2020	INVIAS	otriana@invias.gov.co
12/11/2020	CB2020-36-2020	INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO LP-002-2020 DE 10 DE JULIO 2020	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
13/11/2020	CB2020-37-2020	SOLICITUD DOCUMENTOS REQUEIDO QUE CORRESPONDEN AL PROCESO LP-005-2020	CARMEN DE BOLIVAR	contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co secretariadeplaneacion@elcarmen-bolivar.gov.co
18/11/2020	CB2020-38-2020	INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
18/11/2020	CB2020-39-2020	RADICACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co
18/11/2020	CB2020-40-2020	RADICACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE LP-OP-001-2020 DE (24) DE AGOSTO DE 2020	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co
18/11/2020	CB2020-41-2020	RADICACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020.	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co
18/11/2020	CB2020-42-2020	RADICACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE LP-N-002-20200801001 DE 1 DE AGOSTO 2020.	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
--	--	--

18/11/2020	CB2020-43-2020	RADICACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE SI-C-1808 DE 2020	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co
18/11/2020	CB2020-44-2020	RADICACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE SI-C-1881 DE 2020	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co
18/11/2020	CB2020-45-2020	RADICACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA AL PROCESO LP-005-2020	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co
20/11/2020	CB2020-46-2020	SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 001 DE 24 DE AGOSTO DE 2020.	CORDOBA	mtejada12@hotmail.com
19/11/2020	CB2020-47-2020	AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 722 DE 2020	INVIAS ATENCION AL CIUDADANO	atencionciudadano@invias.gov.co otriana@invias.gov.co
20/11/2020	CB2020-48-2020	APROBACION DE HOJAS DE VIDA Y SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL Y DOTACION DE PERSONAL EN OBRA	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
20/11/2020	CB2020-49-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	SAN JUAN NEPOMUCENO	mvizcaya1424@gmail.com placahuellasanjuan@gmail.com
20/11/2020	CB2020-50-2020	SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO SI-C 1808 DE 2020	SAN JACINTO BOLIVAR	Aslointer.sas@gmail.com
23/11/2020	CB2020-51-2020	INICIO DE LAS OBRAS	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
24/11/2020	CB2020-52-2020	ACTA DE COSTOS NO 2	INVIAS	ccperez@invias.gov.co
24/11/2020	CB2020-53-2020	VALLA INFORMATIVA	SAN JUAN NEPOMUCENO	mvizcaya1424@gmail.com placahuellasanjuan@gmail.com
24/11/2020	CB2020-54-2020	ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS CON FECHA DE ACTA DE INICIO.	SAN JACINTO BOLIVAR	Aslointer.sas@gmail.com
24/11/2020	CB2020-55-2020	INICIO DE LAS OBRAS.	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
24/11/2020	CB2020-56-2020	OBSERVACIONES DE LA INFORMACIÓN TECNICA ENTREGA.	GUAMO	devisperezserpa@yahoo.es
25/11/2020	CB2020-57-2020	SOLICITUD DE INFORMACION QUE CORRESPONDE AL PROCESO LP-005-2020.	CARMEN DE BOLIVAR	contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co secretariadeplaneacion@elcarmen-bolivar.gov.co
26/11/2020	CB2020-58-2020	APROBACION HOJAS DE VIDA	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
--	--	--

26/11/2020	CB2020-59-2020	OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
28/11/2020	CB2020-60-2020	REQUERIMIENTO DISEÑO DE CURVAS HORIZONTALES	SAN JUAN NEPOMUCENO	mvizcaya1424@gmail.com placahuellasanjuan@gmail.com
28/11/2020	CB2020-61-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
28/11/2020	CB2020-62-2020	SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	SAN JUAN NEPOMUCENO	mvizcaya1424@gmail.com
28/11/2020	CB2020-63-2020	SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	MARIA LA BAJA	alpes001@gmail.com
28/11/2020	CB2020-64-2020	SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	GUAMO	deivisperezserpa@yahoo.es
28/11/2020	CB2020-65-2020	SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	CORDOBA	mtejada12@hotmail.com
28/11/2020	CB2020-66-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO SI-C 1808 DE 2020	SAN JACINTO BOLIVAR	Aslointer.sas@gmail.com
28/11/2020	CB2020-67-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	SAN JUAN NEPOMUCENO	contactenos@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co
28/11/2020	CB2020-68-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	CORDOBA	contactenos@cordoba-bolivar.gov.co
28/11/2020	CB2020-69-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	MARIA LA BAJA	alcaldia@marialabaja-bolivar.gov.co
28/11/2020	CB2020-70-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	GUAMO	contactenos@elguamo-bolivar.gov.co
28/11/2020	CB2020-71-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	SAN JACINTO BOLIVAR	dmanrique@bolivar.gov.co
28/11/2020	CB2020-72-2020	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	ZAMBRANO BOLIVAR	dmanrique@bolivar.gov.co

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
--	--	--

8.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	FRENTE/ DESTINATARIO QUIEN ENVIO	CORREO RECIBIDO
9/11/2020	OFI-SP-008	RESPUESTA A OFICIO CB2020-09-2020	CORDOBA - SECRETARIA DE PLNEACION	SECRETARIA_DE_PLANEACION@CORDOBA-BOLIVAR.GOV.CO
9/11/2020	OFI-SP-009	RESPUESTA A OFICIO CB2020-33-2020	CORDOBA - SECRETARIA DE PLNEACION	SECRETARIA_DE_PLANEACION@CORDOBA-BOLIVAR.GOV.CO
10/11/2020	GOBOL-20-037862	RESPUESTA A COMUNICACIÓN EXT-BOL-20-025206-SOLICITUD DE DOCUMENTOS REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO SI-C1808 DE 2020	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN	DMANRIQUE@BOLIVAR.GOV.CO
10/11/2020	GOBOL-20-037866	SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO SI-C1881 DE 2020	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN	DMANRIQUE@BOLIVAR.GOV.CO
12/11/2020	OFICIO NO. INT.GUAMO-003-2020	RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA ENTREGA Y REQUERIMIENTOS	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA CONTRATISTA	ING.DEVISPEREZSERPA2020@GMAIL.COM
12/11/2020	OFICIO NO. INT.GUAMO-004-2020	APROBACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-N-001-2020 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020.	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA CONTRATISTA	ING.DEVISPEREZSERPA2020@GMAIL.COM
23/11/2020	OFICIO REMISORIO	CONTRATO DE OBRA LP-002-2020	CORPORACIÓN SER SOCIAL	CORPORACIONSERSOCIAL@HOTMAIL.COM
24/11/2020	OFICIO METCON PHS NO. 005-2020	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN SU OFICIO CB2020-49-2020 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.	METCONCIVIL S.A.S	PLACAHUELLASANJUAN@GMAIL.COM
24/11/2020	OFICIO REMISORIO 3	CONTRATO DE OBRA LP-002-2020	CORPORACIÓN SER SOCIAL	CORPORACIONSERSOCIAL@HOTMAIL.COM
27/11/2020	OFICIO REMISORIO 4	CONTRATO DE OBRA LP-002-2020	CORPORACIÓN SER SOCIAL	CORPORACIONSERSOCIAL@HOTMAIL.COM
30/11/2020	OFICIO METCON PHS NO. 006-2020	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN SU OFICIO CB2020-49-2020 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.	METCONCIVIL S.A.S	PLACAHUELLASANJUAN@GMAIL.COM



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

8.1.3 PROCESO LICITATORIO LP-005-2020-CARMEN DE BOLIVAR.

- CB2020-37-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 15 de noviembre de 2020 CB2020-37-2020

SRS:
CARLOS EDUARDO TORRES COHEN
Alcalde del Municipio del Carmen de Bolívar
contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
Calle 24 Carrera 48 Esquina - Centro
Carmen de Bolívar

NATALIA ECHEVERRI HERNÁNDEZ
Secretaría de Planeación del Carmen de Bolívar
secretariadeplaneacion@elcarmen-bolivar.gov.co
Calle 24 Carrera 48 Esquina - Centro
Carmen de Bolívar

Asunto: **SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE CORRESPONDEN AL PROCESO LP-005-2020**

Cordial saludo,

En calidad de Director de Interventoría del Contrato de obra en ejecución, me permito solicitar los documentos requeridos, los cuales serán aportados a continuación:

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE CORRESPONDEN AL PROCESO LP-005-2020
1	Contrato de obra entre Contratista y Alcaldía
2	Pólizas del Contrato de Obra y su Aprobación
3	Cuadro de Cantidades y Precios de la Propuesta
4	Pliego de Condiciones Implementado para la Selección del Contratista

Quedo atento que defina por retroalimentación a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 19 N° 101-77 BOGOTÁ - TELÉFONO: 310 6600100 - CORREO: CB2020-37-2020

CALLE 19 N° 101-77 BOGOTÁ
CONSORCIO BOLIVAR 2020
contactenos@consorcio-bolivar2020.com
TELÉFONO: +57 310 6600100
CORREO: CB2020-37-2020

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO BOLIVAR 2020



- CB2020-57-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 25 de noviembre de 2020 CB2020-57-2020

SRS:
CARLOS EDUARDO TORRES COHEN
Alcalde del Municipio del Carmen de Bolívar
contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
Calle 24 Carrera 48 Esquina - Centro
Carmen de Bolívar

NATALIA ECHEVERRI HERNÁNDEZ
Secretaría de Planeación del Carmen de Bolívar
secretariadeplaneacion@elcarmen-bolivar.gov.co
Calle 24 Carrera 48 Esquina - Centro
Carmen de Bolívar

Asunto: **SOLICITUD DE INFORMACION QUE CORRESPONDE AL PROCESO LP-005-2020.**

Cordial saludo,

Mediante la presente solicito la información con relación al proceso licitatorio LP-005-2020, con el propósito de enterarnos si ya el contrato ha sido adjudicado y en caso de ser así solicitamos los siguientes documentos relacionados a continuación:

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE CORRESPONDEN AL PROCESO LP-005-2020
1	Contrato de obra entre Contratista y Alcaldía
2	Pólizas del Contrato de Obra y su Aprobación
3	Cuadro de Cantidades y Precios de la Propuesta
4	Pliego de Condiciones Implementado para la Selección del Contratista

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 19 N° 101-77 BOGOTÁ - TELÉFONO: 310 6600100 - CORREO: CB2020-57-2020

CALLE 19 N° 101-77 BOGOTÁ
CONSORCIO BOLIVAR 2020
contactenos@consorcio-bolivar2020.com
TELÉFONO: +57 310 6600100

SOLICITUD DE INFORMACION QUE CORRESPONDE AL PROCESO LP-005-2020. D

CB CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorcio-bolivar2020@gmail.com>

Jue, 26 nov 8:05 (hace 1 día) ☆

Buenos días,
Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020



	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-------------------------------

8.1.4 MUNICIPIO DE SAN JUAN.CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S. –

•CB2020-26-2020



Cartagena de Indias D.T. y C, 6 de noviembre 2020

CB2020-26-2020

SR,

MANLIO VIZCAYA MENDOZ
Representante Legal
MET-CONCIVIL SAS
mvizcaya1424@gmail.com
placahuelasojuan@gmail.com
Avenida 32-Diagonal 49ª – 135
Bolo - Antioquia

Asunto: **DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA, CANTIDADES VOLUMENES, RELLENO.**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas con relación a las diferencias entre el Diseño Geométrico presentado y las carteras topográficas, solicito en calidad de Director de Interventoría, no se realicen intervenciones de excavación y/o rellenos sin antes haber presentado el nuevo Diseño Geométrico, teniendo en cuenta que esto alteraría las cotas del terreno natural proporcionando mayores cantidades de corte y/o relleno. Por tal razón estas actividades realizadas sin la autorización de la Interventoría no serán tenidas en cuenta como cantidades ejecutadas del contrato.

Al momento de cuantificar las cantidades de corte debe tener en cuenta que la recomendación general es no desestabilizar la superficie existente efectuando cajas o excavaciones. El criterio es obtener un perfil longitudinal aceptable realizando pequeñas correcciones tendientes a mejorar curvas verticales cóncavas demasiado pronunciadas, para ello se harían rellenos en tramos de muy corta longitud con material seleccionado o con material a firmado utilizado para el mantenimiento de la vía o con el mismo material que sería utilizado para la sub base.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ
 Director de Interventoría
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA, CANTIDADES VOLUMENES, RELLENO. ➤



CONSORCIO BOLIVAR 2020 «consorciobolivar2020...» vie., 6 nov. 15:34 (hace 3 días)
para mvizcaya1424, metconcivil, karmenceperez, contactenos ▾

Buenas tardes adjunto enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOLIVAR 2020



	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	---	-------------------------------

• CB2020-28-2020

CB

Cartagena de Indias D.T. y C, 6 de noviembre 2020 CB2020-28-2020

SR.

MANLIO VIZCAYA MENDEZ
Representante Legal
MET-CONCIVIL SAS
mvizcaya1424@gmail.com
clacahuellasantana@gmail.com
Avenida 32-Diagonal 49ª – 135
Bello - Antioquia


Asunto: **APROBACIÓN DE VALLA INFORMATIVA Y REQUERIMIENTOS**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el modelo de Valla Informativa entregada, se realizó la revisión con base a la resolución 01935 del 24 de mayo de 2019, por lo cual será reenviada a Invias para que dé la aprobación final.

Así mismo reiteramos la solicitud de las hojas de vida del personal plan de manejo ambiental, plan de manejo de tráfico y plan de control de calidad.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO BOLÍVAR 2020

APROBACIÓN DE VALLA INFORMATIVA Y REQUERIMIENTOS

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020...> vie., 6 nov. 15:40 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮
para mvizcaya1424, metconcivil, contactenos, karmenceperez ▾

Buenas tardes adjunto enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOLIVAR 2020



• CB2020-34-2020

CB

Cartagena de Indias D.T. y C, 7 noviembre de 2020 CB2020-34-2020

SRA.

CARMEN CECILIA PÉREZ LOPEZ
Supervisora Contrato Interventoría
Directora Regional de Invias-Bolivar
ccperez@invias.gov.co


Asunto: **APROBACIÓN VALLA INFORMATIVA**

Cordial saludo,

Mediante la presente solicitamos aprobación de la Valla Informativa del contrato de obra LPA-002-20200001001 – 2020 del Municipio San Juan Nepomuceno, la cual ya fue revisada por la Interventoría teniendo en cuenta como base la resolución 01935 del 24 de mayo de 2019.



Cordialmente,


ING. RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 6ª #317 Bocagrande – Edificio Jumbo – Oficina 502 – Cartagena
CABERA Via No. 312-77 Bogotá
CONSORCIO BOLIVAR 2020
consorciobolivar2020@gmail.com
teléfono +57 3001564/65 celular +57 3105407764

APROBACIÓN VALLA INFORMATIVA

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com> sáb., 7 nov. 13:13 (hace 5 días) ☆ ↶ ⋮
para karmenceperez ▾

Buenas tardes adjunto enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOLIVAR 2020





"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

- CB2020-49-2020



Cartagena de Indias D.T. y C. 20 de noviembre 2020

CB2020-49-2020

SR.

MANLIO VIZCAYA MENDEZ
Representante Legal
MET-CONCIVIL SAS
mvizcaya1424@gmail.com
placabuseilasanguano@gmail.com
Avenida 32-Diagonal 49ª - 135
Bello - Antioquia

Asunto: **SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS**

Cordial saludo,

Mediante la presente reiteramos la solicitud de documentos faltantes para el inicio:

1. Plan de calidad.
2. Hojas de vida del personal de la propuesta.
3. Plan de manejo ambiental de acuerdo a Invia.

Cordialmente,

Rodrigo Díaz Benjumea

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLÍVAR 2020

SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS



CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para mvizcaya1424, metconcivil, contactenos, c triana, ccperaz

vié, 20 nov 10:34 (hace 4 días)



Buenos días, envío adjunto lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLÍVAR 2020



Responder

Responder a todos

Reenviar

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

• CB2020-53-2020



Cartagena de Indias D.T. y C., 24 de noviembre 2020

CB2020-53-2020

SR.

MANLIO VIZCAYA MENDEZ
Representante Legal
MET-CONCIVIL SAS
mvizcaya1424@gmail.com
mizcaya1424@gmail.com
rjacahueliasanjuan@gmail.com
Avenida 32-Diagonal 49* – 135
Bello - Antioquia

Asunto: **VALLA INFORMATIVA**

Mediante la presente me permito informarle que el Grupo de Comunicaciones de Invias y Ministerio de Transporte ha enviado el modelo de valla informativa para el frente de obra del Municipio de San Juan Nepomuceno que corresponde al contrato LP-N-002-20200801001 de 1 de agosto 2020, cuyo modelo enviamos para su instalación.



Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLÍVAR 2020

CALLE 6ª #317 Bogotá - Edificio Jasben - Oficina 512- Cartagena
CARRERA 15ª No. 112-77 Bogotá
CONSORCIO BOLIVAR 2020
consorcioBolivar2020@gmail.com
Teléfono +57 3001564/ 65
Celular +57 3105607764

VALLA INFORMATIVA

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorcioBolivar2020@gmail.com>
para mvizcaya1424, metconcivil, rodrigo, contactenos, ccperetz +

Buenos días, envío adjunto lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020



• CB2020-60-2020



Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de noviembre 2020

CE2020-60-2020

SR.

MANLIO VIZCAYA MENDEZ
Representante Legal
MET-CONCIVIL SAS
mvizcaya1424@gmail.com
mizcaya1424@gmail.com
rjacahueliasanjuan@gmail.com
Avenida 32-Diagonal 49* – 135
Bello - Antioquia

Asunto: **REQUERIMIENTO DISEÑO DE CURVAS HORIZONTALES Y CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE.**

Mediante la presente me permito solicitar el diseño de las curvas horizontales y la caracterización del material existente.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020

C.C. SANTI ALBERTO
Secretario de Planeación San Juan Nepomuceno
C.C. RAÚL PEDRO A. ROJERO VERGARA
Alcalde de San Juan Nepomuceno

REQUERIMIENTO DISEÑO DE CURVAS HORIZONTALES Y CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE.

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorcioBolivar2020@gmail.com>
para mvizcaya1424, metconcivil, contactenos, planeacion, ccperetz +

Buenas tardes

Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020



 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-------------------------------

•CB2020-62-2020

C-B

Cartagena de Indias D.T. y C. 28 de noviembre 2020 CB2020-62-2020

SR,

MANLIO VIZCAYA MENDEZ
 Representante Legal
 MET-CONCIVIL SAS
mvizcaya1524@gmail.com
plazafuquene@carpetas@gmail.com
 Avenida 32- Diagonal 49ª - 135
 Bello - Antioquia

Asunto: **SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA.**
 Mediante la presente me permito solicitar el Plan de Inversión y flujo de caja de acuerdo a la programación de obra presentada.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

C. C. CARMEN GARCIA PEREZ LOPEZ
 Supervisora Contrato Interventoría
 Dirección Regional de Tránsito de Bolívar
carpaz@trb.gov.co

CALLE 6ª # 817 Bogotá - Edificio Jockey - Oficina 112 - Cartagena
 CARRERA 15ª No. 132-77 Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
carpaz@trb.gov.co
 Teléfono +57 310 511 564/55
 Celular +57 310 560 7764

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
 para contactar, despachecalda, carperez, boc, rodigo

Buenas tardes,
 Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



•CB2020-67-2020

C-B

Cartagena de Indias D.T. y C. 28 de noviembre 2020 CB2020-67-2020

SR,

WILFRIDO A. ROMERO VERGARA
 Alcalde de San Juan Nepomuceno
contactenos@sanjuan-nepomuceno-bolivar.gov.co
despachecalda@sanjuan-nepomuceno-bolivar.gov.co
 Cra 13 # 6 - 70 Centro Administrativo Ramón Rodríguez Dago
 San Juan Nepomuceno Bol.

Asunto: **SOLICITUD DE DOCUMENTOS**
 Mediante la presente me permito solicitar los documentos de la propuesta presentada por el contratista MET-CONCIVIL S.A.S del contrato LP-N-002-2020-00901001 de 1 de agosto 2020.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

C. C. CARMEN GARCIA PEREZ LOPEZ
 Supervisora Contrato Interventoría
 Dirección Regional de Tránsito de Bolívar
carpaz@trb.gov.co

CALLE 6ª # 817 Bogotá - Edificio Jockey - Oficina 112 - Cartagena
 CARRERA 15ª No. 132-77 Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
carpaz@trb.gov.co
 Teléfono +57 310 511 564/55
 Celular +57 310 560 7764

SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA.

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
 para contactar, despachecalda, carperez, boc, rodigo

Buenas tardes,
 Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	--------------------------------------

8.1.5 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA- CONTRATO N. ° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL.

• CB2020-36-2020



• CB2020-38-2020



INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para alpes001, ccpez, otriana, alcaldia

mié, 18 nov. 11:12 (hace 23 horas)

Buenos días adjunto envío lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOLIVAR 2020



Cartagena de Indias D.T. y C., 18 de noviembre de 2020

CB2020-38-2020

SR.
ALVARO PEREZ SEVERICHE
Representante Legal
CORPORACIÓN SER SOCIAL
alpes001@gmail.com
BPS Miraflores CL, 16 TR 31 -
39 Magangué Bol.

Asunto: INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito someter al inicio de las obras, teniendo en cuenta que la fecha de inicio programado de la ejecución de las obras del contrato de la referencia es de fecha 10 de octubre de 2020 y al día de hoy, no se ha dado el inicio de las mismas, razón por la cual solicito se dé cumplimiento al cronograma de ejecución, dado que pese a las observaciones realizadas en la revisión de estudios y diseños y al orden de entrega de la información, esto no ha sido impedimento para dar inicio a la ejecución de las obras.

Es necesario manifestar que en el incumplimiento en el que se ve envuelto, el municipio puede hacer efectiva la cláusula DECIMA CUARTA del contrato que a su vez dice:

"Frente de las sanciones respecto del contratista: DECIMA CUARTA. SANCIONES: a) MULTAS: - En caso de que el contratista no cumpla con los plazos o incumpla total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, EL MUNICIPIO podrá imponerle multas por cada día de retraso que supere la hora programada en el plan de trabajo presentado por el contratista a la administración Municipal, y hasta por quince (15) días calendario. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Contratación del MUNICIPIO, SA. PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al MUNICIPIO. No obstante, EL MUNICIPIO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí previsto, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante solida de señores en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO.

Así mismo reitero la solicitud que la entrega de información respectiva por la Interventoría se realice de manera oficial mediante citación institucional que permitan constatar la veracidad de la información entregada, debido a que la entrega por Corporación Ser Social se ha realizado de manera informal e incompleta en reiteradas ocasiones, siendo que solo a fecha 13 de noviembre de 2020 se ha logrado recibir la información técnica requerida por la Interventoría para lograr realizar el balance de certificaciones del contrato.

Cabe anotar que aun estamos a la espera de la entrega del Diseño de Maqueta y el Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo que se exige de Municipio Ambiental de María la Baja, cuya solicitud se ha realizado en repetidas ocasiones mediante citación institucional de fecha 13 de octubre de 2020 y fecha 13-2020 de fecha 19 de octubre de 2020.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 6ª #517 Bosquegrande - Edificio Jaelan - Oficina 512- Cartagena
CARRETA 154 NO. 31-717 Bogotá
CONSORCIO BOLIVAR 2020
CONTRATISTA: CORPORACIÓN SER SOCIAL
Teléfono: +57 3001564/55
Celular: +57 3105667764

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center"> "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL". </p>	<p align="center"> CONSORCIO BOLÍVAR 2020 </p>
---	--	---

• CB2020-48-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 20 de noviembre de 2020

CB2020-48-2020

SR

ALVARO PEREZ SEVERICHE Representante Legal CORPORACIÓN SER SOCIAL.
alvaro.perez@ser-social.com
 BR Miraflores CL 16 TR 31 –
 36 Magangué Bol.

Asunto: **APROBACION DE HOJAS DE VIDA Y SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL Y DOTACION DE PERSONAL EN OBRA**

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito informarle que las hojas de vida de Director de obra y Residente de obra entregadas por Corporación Ser Social han sido revisadas, a continuación, se describe el resultado del proceso de revisión:

Profesional Aspirante	Profesional Oficiante para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica	Observaciones
Ing. Gregorio Rizo Gomez	No presento donde conste que realice Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, Construcción o similar.	Cumple con los diez (10) años de experiencia a partir de la expedición de la matrícula profesional.	No presento soporte que demuestre que participe como Ingeniero (2) proyectos similares al objeto del presente proceso de contratación en el cargo de director de obra.	Debe subsanar en un tiempo no mayor a 48 horas la información que soporte Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, Construcción o similar y soporte de experiencia específica.
Ing. Héctor Patricia Zúñiga	Presento soporte donde conste como Ingeniero Civil.	Cumple con la experiencia de cinco (5) años a partir de la expedición de la matrícula profesional.	Cumple con los requisitos que demuestren que participe como Ingeniero (2) proyectos similares al objeto del presente proceso de contratación en el cargo de residente de obra.	Aprobado.

Así mismo solicitamos que en un periodo mínimo de 48 horas antes del inicio de las obras se realice la entrega del listado del personal en obra y las certificaciones de inscripción a la seguridad social, dado que todo personal en obra debe estar afiliado a la seguridad social y debe portar todos los elementos de protección personal y dotación.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE # 8317 Bocagrande – Edificio Jackson – Oficina 512- Cartagena
 CARRETERA 1ª No. 112-77
 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
ConsortioBolivar2020@gmail.com
 Tel. Teléfono : 0130015647
 FAX : 0130015647

• CB2020-51-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 23 de noviembre de 2020

CB2020-51-2020

SR

ALVARO PEREZ SEVERICHE
 Representante Legal
 CORPORACIÓN SER SOCIAL
alvaro.perez@ser-social.com
 BR Miraflores CL 16 TR 31 –
 36 Magangué Bol.

Asunto: **INICIO DE LAS OBRAS**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que ya han iniciado el traslado de la maquinaria al lugar de las obras, agradecemos enviar el listado del personal que estará en obra, listado de maquinaria y certificación de seguridad social del personal, debido a que sin esta certificación los trabajadores no podrán ingresar a la obra.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE # 8317 Bocagrande – Edificio Jackson – Oficina 512- Cartagena
 CARRETERA 1ª No. 112-77- Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
ConsortioBolivar2020@gmail.com
 Teléfono : 0130015647

APROBACION DE HOJAS DE VIDA Y SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL Y DOTACION DE PERSONAL EN OBRA




CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
 para alpes001, cbtiana, alcaldia, copez

vie, 20 nov 16:35 (hace 4 días)

Buenos días, envío adjunto lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



INICIO DE LAS OBRAS.



CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
 para alpes001, rcastellarmeta, alcaldia, boc, rodrigo, boc, copez


lun, 23 nov 15:12 (hace 23 horas)

Buenas tardes, envío adjunto lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



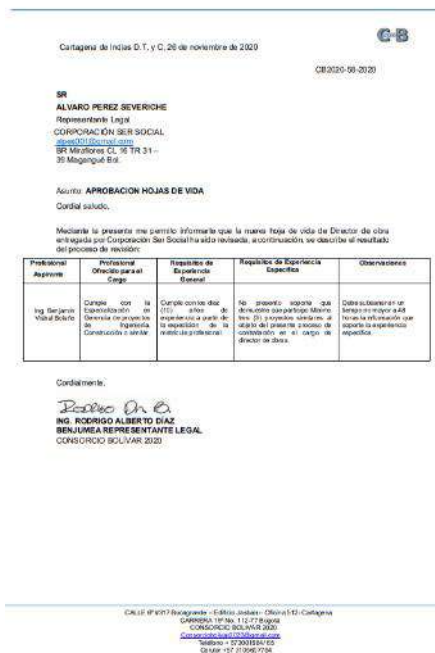

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.	CONSORCIO BOLÍVAR 2020
---	---	-------------------------------

•CB2020-63-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 28 de noviembre de 2020

C-B

CB2020-63-2020

SR.
ALVARO PEREZ SEVERICHE
 Representante Legal
 CORPORACIÓN SER SOCIAL
alpes001@ser-social.com
 BR Manizales CL 16 TR 31 –
 39 Manizales Bca

Asunto: SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA.

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito solicitar actualizar la programación de obra presentada, de acuerdo con las condiciones del contrato.

Así mismo me permito solicitar el Plan de Inversión y flujo de caja de acuerdo con la programación de obra actualizada.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLÍVAR 2020

C.D. GERMÁN CESAR PEREZ LOPEZ
 Experto en Control de Materiales
 Director Regional de Infraestructura
german@conbolivar.gov.co

CALLE # 4387 Bogotá - Edificio Jarama - Oficina 512 - Cartagena
 CAROLINA, 19 de 117-17 Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
conbolivar2020@gmail.com
 Teléfono + 57 301 504 45
 Celular +57 310807654

SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA. >

C-B **CONSORCIO BOLIVAR 2020** <conbolivar2020@gmail.com>
 para alpes001, ccperrez, alcaldia, bcc: rodrigo >
 sábado, 28 nov 16:56 (hace 21 días)

Buenas tardes,
 Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLÍVAR 2020



•CB2020-69-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 28 de noviembre de 2020

C-B

CB2020-69-2020

SRA.
RAGUEL VICTORIA SIERRA CASSIANI
 Alcaldesa Municipal de Mariña Baja
raguel@concejoalcaldeas-bolivar.gov.co
 Cra 14 # 20 - 26
 Mariña Baja Bca

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito solicitar los documentos de la propuesta presentada por el contratista Corporación Ser Social del contrato UP-012-2020 de 10 julio de 2020.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLÍVAR 2020

C.D. GERMÁN CESAR PEREZ LOPEZ
 Experto en Control de Materiales
 Director Regional de Infraestructura
german@conbolivar.gov.co

CALLE # 4387 Bogotá - Edificio Jarama - Oficina 512 - Cartagena
 CAROLINA, 19 de 117-17 Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
conbolivar2020@gmail.com
 Teléfono + 57 301 504 45
 Celular +57 310807654

SOLICITUD DE DOCUMENTOS >

C-B **CONSORCIO BOLIVAR 2020** <conbolivar2020@gmail.com>
 para alcaldia, ccperrez, bcc: rodrigo >
 sábado, 28 nov 17:17 (hace 2 días) ☆

Buenas tardes,
 Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLÍVAR 2020



8.1.6 MUNICIPIO EL GUAMO - BOLÍVAR. CONTRATO N° LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020.

- CB2020-27-2020



Cartagena de Indias D.T. y C. 6 de noviembre de 2020

CB2020-27-2020

SR

DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA
Registrador de Legal
delegacion@pds.gov.co
Calle 25ª # 41 - 60 Barrio Venecia,
Santana de Guatave

Asunto: OBSERVACIONES DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA ENTREGA Y REQUERIMIENTOS.

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito informarle las observaciones y requerimientos realizados acerca de la información técnica entregada:

1. Las curvas topográficas deben ser entregadas en Excel (Perfil transversal de la vía-Cota borde izquierdo eje-Cota borde derecho) considerando el ancho existente de la vía en cada una de las secciones, con el fin de poder verificar las cotas de obra.
- Al momento de cuantificar las cantidades de corte debe tener en cuenta que la recomendación general es no desestimar las superficies existentes, efectuando capping o excavaciones. El criterio es obtener un perfil longitudinal aceptable realizando pequeños correcciones tendientes a mejorar curvas verticales mínimas demandando pronunciadas, para ello se hacen referencias en tramos de muy corte longitudinal, con material seleccionado o con material aferrado utilizado para el mantenimiento de la vía o con gránulos material que sería utilizado para la sub base.
2. Debe entregarse el detalle de las obras a construir (Borlotaje del terreno, corte de entrada y salida, asfáltico al ancho de la sección de la vía.
3. Teniendo en cuenta la fecha de inicio, efectúese la entrega del informe semanal al cual debe ser anexado con corte viernes de cada semana.
4. Le recomendamos la entrega de las hojas de vida del personal, el programa de trabajo Project Grant, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tráfico, plan de control de calidad, cronograma de trabajo de acuerdo a las recomendaciones de Invia y certificaciones de calidad para subcontrata de manuales.

Agradecemos su atención, espero la entrega de la información solicitada a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena
Carretera 19 No. 152-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena
CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena

OBSERVACIONES DE LA INFORMACIÓN TECNICA ENTREGA Y REQUERIMIENTOS. ▸

 **CONSORCIO BOLIVAR 2020** <consorciobolivar202...
para deivisperezserpa, contactenos, karmenceperez ▸

Buenas tardes adjunto enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOLIVAR 2020



- CB2020-56-2020



Cartagena de Indias D.T. y C. 30 de noviembre de 2020

CB2020-56-2020

SR

DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA
Registrador de Legal
delegacion@pds.gov.co
Calle 25ª # 41 - 60 Barrio Venecia,
Santana de Guatave

Asunto: OBSERVACIONES DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA ENTREGADA.

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito informarle las observaciones y requerimientos realizados acerca de la información técnica entregada:

Teniendo en cuenta la sección realizada al diseño entregado por el Contratista, la Interventoría requiere un nuevo diseño, debido que de acuerdo al perfil longitudinal de terreno natural y al perfil longitudinal de la variante, debería ajustarse las tangentes verticales con pendientes superiores a las solicitadas de acuerdo al manual de diseño geométrico de carreteras del Instituto Nacional de Vías, libro 2. Razón entre la pendiente máxima (%) y la velocidad específica de la tangente vertical, ubicada en la pág. 125.

Tabla 4.7
Relación entre la pendiente máxima (%) y la velocidad específica de la tangente vertical (m/s)

CATEGORÍA DE LA CARRETERA	VELOCIDAD ESPECÍFICA DE LA TANGENTE VERTICAL, V _T (m/s)									
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Pendientes de las curvas	8.50%	6.00%	4.50%	3.50%	2.80%	2.20%	1.80%	1.50%	1.20%	1.00%
Pendientes de las rectas	8.50%	6.00%	4.50%	3.50%	2.80%	2.20%	1.80%	1.50%	1.20%	1.00%
Pendientes	8.50%	6.00%	4.50%	3.50%	2.80%	2.20%	1.80%	1.50%	1.20%	1.00%

Al momento de cuantificar las cantidades de corte debe tener en cuenta que la recomendación general es no desestimar las superficies existentes, efectuando capping o excavaciones. El criterio es obtener un perfil longitudinal aceptable realizando pequeños correcciones tendientes a mejorar curvas verticales de cava a demandando pronunciadas, para ello se hacen referencias en tramos de muy corte longitudinal, con material seleccionado o con material aferrado, utilizado para el mantenimiento de la vía o con gránulos material que sería utilizado para la sub base.

Se recomienda tener las pendientes al 10%, para una velocidad de 40 Km/h, esto para el caso de pendientes superiores.

A continuación, se muestran las pendientes del terreno natural US por dentro de diseño de terreno:

CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena
CARRETERA 19 No. 152-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena
CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena

TRAMO 1

Descripción	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Cota de Eje terreno Natural	142.143	143.474	140.913	141.988	142.219	143.236	143.872	144.948	145.521	146.807	147.820
Diseño Rasante	142.143	143	143	143	142.948	143.126	143.165	144.384	145.582	146.732	147.837
Pendiente Rasante	8.57%	8.02%	8.00%	8.52%	7.79%	8.88%	8.58%	11.86%	11.90%	13.69%	16.79%
Pendiente terreno natural	8.58%	8.61%	7.70%	8.27%	14.40%	8.11%	8.76%	10.22%	13.00%	8.91%	11.82%

Descripción	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Cota de Eje terreno Natural	149.002	148.186	151.286	152.334	153.587	155.221	156.910	158.346	159.519	157.759
Rasante	148.91	148.689	151.268	152.354	153.779	155.1	156.753	158.343	159.932	157.34
Pendiente rasante	16.79%	16.79%	12.80%	14.22%	13.24%	6.53%	5.90%	5.89%	8.20%	7.51%
Pendiente terreno natural	11.84%	11.20%	12.78%	14.27%	12.30%	7.89%	4.90%	5.71%	8.50%	7.48%

Descripción	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Cota de Eje terreno Natural	158.485	158.381	160.526	161.488	162.119	162.768	163.558	164.334	165.013	165.838
Diseño Rasante	158.201	158.21	160.288	161.314	162.31	162.701	163.481	164.334	165.088	165.828
Pendiente rasante	8.18%	10.26%	10.26%	8.24%	8.51%	7.82%	7.82%	8.21%	9.25%	8.02%
Pendiente terreno natural	8.96%	11.85%	8.37%	8.21%	15.58%	7.90%	7.76%	8.79%	9.25%	8.42%

Descripción	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
Cota de Eje terreno Natural	166.483	167.348	168.207	169.145	170.153	171.202	172.385	173.573	174.654	175.854
Diseño Rasante	166.427	167.324	168.227	169.129	170.123	171.217	172.31	173.434	174.498	175.814
Pendiente rasante	8.57%	8.07%	8.12%	8.84%	10.84%	10.36%	10.84%	10.84%	11.76%	13.23%
Pendiente terreno natural	8.68%	8.59%	7.38%	8.00%	10.32%	11.83%	11.80%	10.84%	12.99%	13.08%

CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena
CARRETERA 19 No. 152-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena
CALLE 41517 Bogotá - Edificio Jader - Oficina 513 - Cartagena



“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

C-B

Descripción	402	423	426	440	449	452	476	485	488	539
Cota de Eje terreno Natural	177.46	178.509	179.509	180.509	181.507	182.505	183.514	184.514	185.514	186.51
Queda Baseado	179.267	179.236	179.181	179.109	179.030	178.939	178.838	178.728	178.608	178.477
Pendiente rasante	12.80%	12.26%	11.81%	11.1%	10.38%	9.74%	9.13%	8.40%	7.68%	6.94%
Pendiente terreno natural	13.84%	12.39%	11.85%	11.05%	10.34%	9.70%	9.07%	8.34%	7.61%	6.87%

Descripción	518	520	539	549	558	566	574	588	590	606
Cota de Eje terreno Natural	187.754	188.358	190.350	191.752	193.143	194.583	196.100	197.520	198.240	199.537
Queda Baseado	187.080	188.71	189.110	191.611	193.047	194.614	196.281	197.280	198.426	199.84
Pendiente rasante	18.66%	18.26%	18.43%	14.83%	14.83%	14.83%	14.83%	14.83%	14.83%	14.83%
Pendiente terreno natural	12.44%	13.52%	13.72%	14.21%	14.48%	14.73%	15.03%	15.18%	15.18%	15.18%

CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020

C-B

TRANS 2

Descripción	0	16	36	56	63	68	76	88	90	100
Cota de Eje terreno Natural	194.285	196.812	198.039	198.041	199.263	200.013	202.550	202.550	203.364	205.697
Queda Baseado	194.285	196.812	198.039	198.041	199.263	200.013	202.550	202.550	203.364	205.697
Pendiente rasante	12.80%	12.26%	11.81%	11.1%	10.38%	9.74%	9.13%	8.40%	7.68%	6.94%
Pendiente terreno natural	13.84%	12.39%	11.85%	11.05%	10.34%	9.70%	9.07%	8.34%	7.61%	6.87%

Descripción	110	120	130	140	150	160	170	180	185	204
Cota de Eje terreno Natural	204.280	205.780	207.180	208.371	210.364	212.180	214.613	216.088	217.318	219.634
Queda Baseado	204.280	205.780	207.180	208.371	210.364	212.180	214.613	216.088	217.318	219.634
Pendiente rasante	12.80%	12.26%	11.81%	11.1%	10.38%	9.74%	9.13%	8.40%	7.68%	6.94%
Pendiente terreno natural	13.84%	12.39%	11.85%	11.05%	10.34%	9.70%	9.07%	8.34%	7.61%	6.87%

Descripción	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Cota de Eje terreno Natural	221.433	223.364	225.430	227.730	229.031	230.031	231.031	232.031	233.031	234.031
Queda Baseado	221.433	223.364	225.430	227.730	229.031	230.031	231.031	232.031	233.031	234.031
Pendiente rasante	12.80%	12.26%	11.81%	11.1%	10.38%	9.74%	9.13%	8.40%	7.68%	6.94%
Pendiente terreno natural	13.84%	12.39%	11.85%	11.05%	10.34%	9.70%	9.07%	8.34%	7.61%	6.87%

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para de@rsperce@p, contactenos, boc, rodrigo *

Jue, 26 nov 8:56 (hace 1 día) ☆ ↗

Buenos días,
Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020



• CB2020-64-2020

C-B

Cartagena de Indas D.T. y C. 26 de noviembre de 2020

CB2020-64-2020

SR.
DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA
Representante Legal
de@rsperce@p@v@n@o@.co
Calle 25P # 41 - 60 Barrio Venecia,
Bicicleta Sucre.

Asunto: SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA.
Cordial saludo,
Mediante la presente me permito solicitar el Plan de Inversión y Flujo de caja de acuerdo a la programación de obra.
Así mismo le recordamos que está pendiente la entrega de las hojas de vida del personal el programa de trabajo Project Grant, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tráfico, plan de control de calidad, diseño de medidas de acuerdo a las normas de vias y certificación ambiental y registro menor de las cantones, propuestas para la extracción de materiales.
Agradecemos su atención, espero la entrega de la información solicitada a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020

SOLICITUD PLAN DE INVERSION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA. D

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para de@rsperce@p, contactenos, coperez, boc, rodrigo *

vié, 26 nov 16:59 (hace 2 días) ☆ ↗

Buenas tardes,
Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020



CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020
CALLE # 4317 Bogotá - Edificio - Oficina 512 - Cartagena
CAROLINA 1076 - 117-77 Bogotá CONSORCIO BOLIVAR 2020

	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

• CB2020-70-2020



Cartagena de Indas D.T. y C. 28 de noviembre de 2020

SR.

GUSTAVO ADOLFO GUZMAN NARVAEZ
Alcalde de El Guano Bol
contenidos@elguano-bolivar.gov.co
Calle Santander N°207 – Plaza Principal
El Guano Bol

Asunto: **SOLICITUD DE DOCUMENTOS**

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito solicitar los documentos de la propuesta presentados por el contratista DEMS ANTONIO PEREZ SERPA del contrato LP-601-2020 de 4 agosto de 2020.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020
C.C. CARMEN CICILIA PEREZ LOPEZ
Superintendente Contrato Interventoría
superintendente@conso-bol.gov.co


CONSORCIO BOLIVAR 2020

 vía, 6 nov. 15:43 (hace 3 días)



Buenas tardes adjunto enviamos lo referenciado en el asunto. Cordialmente, RODRIGO ALBERTO DÍAZ...


CONSORCIO BOLIVAR 2020

 edb, 7 nov. 16:40 (hace 2 días)





para Dmanrique, AsioInter sas, karmenceperez

Corrección oficio.





	<p align="center">"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".</p>	<p align="center">CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	---

8.1.7 MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR. CONTRATO N.º SI-C-1808 DE 2020

• CB2020-29-2020

C-B

Cartagena de Indias D.T. y C. 6 de noviembre de 2020

CB2020-29-2020

SRS.
DIANA MARGARITA MANRIQUE TERÁN
 Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar
Dmanrique@bolivar.gov.co
Contactenos@bolivar.gov.co
 Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector El Cortijo
 Gobernación de Bolívar

JESAR CARABALLO BODESTAND
 Representante Legal
 Agente de Contratación en Obras
caraballoj@consorcio-bolivar2020.com
 P.O. 7-2-264 Barrio Santa Rosalia Valledupar

Asunto: **SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE COMENZARÁN AL 03/11/2020 A LAS 18:00 HORAS**

Cordialmente,

Enclosed in the present, I attach the documents requested for the start of the works, for which I am grateful for the attention.

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS
1	Contrato de obra entre Contratada y Gobernación de Bolívar
2	Pliego de Condiciones y Pliego de la Propuesta
3	Planos de Construcción y Planos de la Propuesta
4	Planos de Construcción y Planos de la Propuesta para la Selección del Contratista
5	Notas de Vida del Personal de la Propuesta
6	Acta de Revisión del Contrato APTU
7	Programa de Trabajo y Programación
8	Plan de Manejo Ambiental

Además, se adjunta el precio del Contrato de Obra, en cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previos del Pliego de condiciones, solicito a la Gobernación de Bolívar todos en calidad de contratante de la obra de obras.

Cabe señalar que la información solicitada debe ser entregada a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
 Director de Interventoría
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

DADA EN CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR, EL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE 2020
CONSORCIO BOLIVAR 2020
caraballoj@consorcio-bolivar2020.com
 Calle 100 - 1-2000 de la 100
 P.O. 7-2-264

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorcio-bolivar2020@gmail.com>
 para Contactenos, Copez, Bco. Rodrigo +
 6:28 28 nov 17:20 (hace 2 días)

Buenas tardes,
 Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



• CB2020-32-2020

C-B

Cartagena de Indias D.T. y C. 6 de noviembre de 2020

CB2020-32-2020

SRS.
DIANA MARGARITA MANRIQUE TERÁN
 Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar
Dmanrique@bolivar.gov.co
Contactenos@bolivar.gov.co
 Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector El Cortijo
 Gobernación de Bolívar

Asunto: **INICIO CONTRATO SI-C- 1808 DE 2020.**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previos del Pliego de condiciones, solicito a la Gobernación de Bolívar en calidad de contratante la fecha prevista para dar inicio al CONTRATO DE OBRA SI-C-1808 DE 2020. Para las obras en el municipio de San Jacinto

Cordialmente,


ING. RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ
 Director de Interventoría
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

INICIO CONTRATO SI-C- 1808 DE 2020.

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorcio-bolivar2020@gmail.com>
 para Dmanrique, Contactenos, karmenceperez +
 6:28 6 nov 15:50 (hace 3 días)

Buenas tardes adjunto enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



- **CB2020-50-2020**

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de noviembre de 2020

CB2020-50-2020

SR.

Jorge Enrique Cuatrecasas Salazar
 Asesor de San Jacinto Bolívar
jorgecuatrecasas@sanjacinto-bolivar.gov.co
 Calle 19 - Carrera 41 Esquina - San Jacinto - Bolívar
 San Jacinto Bolívar

Robert Alexander Cuatrecasas Salazar
 Asesor de Planación de San Jacinto Bolívar
robertcuatrecasas@sanjacinto-bolivar.gov.co

CESAR CARABALLO ROSENSTAND
 Representante Legal
 Ingeniería y Construcciones del Cesar
cesarcaraballo@ingenieros.com
 TV 7-2 Barrio Santa Rosalia Valledupar

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDE AL CONTRATO SI-C 1808 DE 2020

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito solicitar los documentos requeridos para dar inicio a las obras, los cuales están relacionados a continuación:

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO
1	Plan de trabajo de obra
2	Plan de seguridad de obra
3	Plan de manejo de residuos sólidos
4	Plan de manejo de aguas
5	Plan de manejo de ruido
6	Plan de manejo de tráfico
7	Plan de manejo de calidad del aire
8	Plan de manejo de calidad del agua
9	Plan de manejo de calidad del suelo
10	Plan de manejo de calidad del entorno

Cabe señalar que dichos son entregados a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

Recibido en el correo electrónico de la oficina de la Gobernación de Bolívar el día 20 de noviembre de 2020.

SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO SI-C 1808 DE 2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>

vie, 20 nov 11:11 (hace 4 días)

Buenos días, envío adjunto lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



- **CB2020-54-2020**

Cartagena de Indias D.T. y C., 24 de noviembre de 2020

CB2020-54-2020

SR.

CESAR CARABALLO ROSENSTAND
 Representante Legal
 Ingeniería y Construcciones del Cesar
cesarcaraballo@ingenieros.com
 TV 7-2 Barrio Santa Rosalia Valledupar

Asunto: ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS CON FECHA DE ACTA DE INICIO.

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito solicitar la actualización de las pólizas del contrato SLC-1808 DE 2020 del Municipio San Jacinto Bolívar con fecha de acta de inicio.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

C.C. DIANA MARGARITA SAMBRICIO TERNAN
 Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar
dsambricio@go.bol.gov.co

LUIS CARLOS GARCÉS FERNÁNDEZ
 Coordinador de Infraestructura y Obras Públicas de Bolívar
lgarcés@go.bol.gov.co

CALLE 8ª #317 Bogotá India - Edificio Jairo - Oficina 512 - Cartagena
 CAROLINA 134 No. 512-78 Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
consorciobolivar2020@gmail.com
 Teléfono +57 300 1164 / 83
 Celular +57 310 0807 / 106

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS CON FECHA DE ACTA DE INICIO.

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>

vie, 20 nov 11:11 (hace 2 horas)

Buenos días, envío adjunto lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



Responder Responder a todos Reenviar





CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

PDF

CB2020-72-2020 Z...

8.1.9 MUNICIPIO DE CORDOBA - BOLÍVAR. CONTRATO N.º LP-OP-001-2020 DE (24) DE AGOSTO DE 2020

•CB2020-33-2020

C-B

Cartagena de Indias D.T. y C. 6 de noviembre de 2020

CB2020-33-2020

SRS.
REGULO RODRIGUEZ BEJARANO
 Alcalde Municipal de Córdoba
contactenos@cordoba-bolivar.gov.co
 Calle 3 #2 – 01 Centro Administrativo Municipal (CAM)
 Córdoba Bol.

WILLIAM ANTONIO TORRES M.
 Secretario de Planeación Córdoba Bolívar
Secretaria_de_planeacion@cordoba-bolivar.gov.co
 Córdoba Bol.

Asunto: **INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 001 DE 24 DE AGOSTO DE 2020.**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previos del Pliego de condiciones, ya se cumplieron solicito a la Alcaldía Municipal de Córdoba Bolívar en calidad de contratante, la fecha prevista para dar inicio al contrato de obra referenciado en el asunto.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ
 Director de Interventoría
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 6ª #37 Bogotá - Edificio Jaidán - Oficina 312 - Cartagena
 CARRERA 39 No. 137-77 Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
contactosbolivar2020@gmail.com
 Teléfono +57 3001340155
 Celular +57 3126507254

INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 001 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. 

C-B **CONSORCIO BOLIVAR 2020** <consorciobolivar2020...> vie., 6 nov. 15:51 (hace 3 días) ☆ 

para contactenos, secretaria_de_planeacion, karmencaperez ▾

Buenas tardes adjunto enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 CONSORCIO BOLIVAR 2020



•CB2020-46-2020

C-B

Cartagena de Indias D.T. y C. 20 de noviembre de 2020

CB2020-46-2020

SRS.
MARCO ANTONIO TEJADA REYES
 Representante Legal
 CONSORCIO PLAZA NUEVA 2020
contactenos@plazanueva.gov.co
 Calle 20 N. 18 A. - 96 Oficina 201
 Tall. 3002461635
 Briceño Bogotá

Asunto: **SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 001 DE 24 DE AGOSTO DE 2020.**

Cordial saludo,

Mediante la presente notifico la solicitud realizada a través del oficio CB2020-00-2020 emitido por correo electrónico el día 12 de octubre de 2020, donde se solicitó la entrega de los documentos necesarios para dar inicio a las obras, cuya documentación aún no ha sido recibida de forma completa por lo interviene el Consorcio Bolívar 2020, agradecemos la entrega de la información solicitada a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que se ha firmado el acta de inicio de fecha 17 de noviembre de 2020.

A continuación, relacionamos los documentos requeridos por la Interventoría Consorcio Bolívar 2020 para dar inicio a las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones del Pliego de Condiciones.

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LA OBRA
1	Plan de Vía del Proyecto de la Interventoría
2	Memoria del Proyecto a Vía
3	Programa de Entrenamiento y Promoción Comunitaria
4	Plan de Manejo Ambiental
5	Plan de Manejo de Tráfico y el estacionamiento
6	Programa de Control y Mantenimiento Vial y Control de las Obras a Interventoría por Vía Administrativa (control de tránsito y control de calidad)
7	Plan de Control de Calidad, Plan de Mantenimiento, Certificación de Calidad para extracción de Muestreo (Obligado)
8	Plan de Seguridad

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 6ª #37 Bogotá - Edificio Jaidán - Oficina 312 - Cartagena
 CARRERA 39 No. 137-77 Bogotá
 CONSORCIO BOLIVAR 2020
contactosbolivar2020@gmail.com
 Teléfono +57 3001340155
 Celular +57 3126507254

SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 001 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. 

C-B **CONSORCIO BOLIVAR 2020** <consorciobolivar2020@gmail.com> vie. 20 nov 10:38 (hace 4 días) ☆ 

para mtjodad12, cfrana, copenaz, contactenos ▾

Buenos días envío adjunto lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BOLIVAR 2020





"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

•CB2020-65-2020

CB

Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de noviembre de 2020

CB2020-65-2020

SR.

MARCOS ANTONIO TEJADA REYES
Representante Legal
CONSORCIO PLACA HUELTA 2020
m.tejada12@hotmail.com
Calle 28 N° 16 A - 95 Oficina 201
Tel: 302181535
Sincelajo Sucre

Asunto: **SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS.**

Cordial saludo,

Mediante la presente reitero la solicitud realizada a través del oficio CB2020-65-2020 enviado por correo electrónico el día 20 de noviembre de 2020, donde se solicitó la entrega de los documentos necesarios para dar inicio a las obras, documentación que aún no ha sido recibida de forma completa por la Interventoría Consorcio Bolívar 2020, agradecemos la entrega de esta información a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que ya fue firmado el acta de inicio de fecha 17 de noviembre de 2020.

A continuación, relacionamos los documentos requeridos por la Interventoría Consorcio Bolívar 2020 para dar inicio a las obras, teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Condiciones.

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LA OBRA
1	Hojas de Vida del Personal de la Propuesta
2	Afiliaciones del Consorcio a ARL
3	Programa de Trabajo (Project -Gantt)
4	Plan de Manejo Ambiental
5	Plan de Manejo de Tráfico (si se requiere)
6	Topografía (Diseño geométrico Vía) y Detalle de las obras a construir Box y/o Alcantarillas (cotas entrada y cotas de salida)
7	Plan de Control de Calidad, Diseño de Mezclas, Certificación de Canteras para la Tacción de Materiales (triturado).
8	Plan de Bioseguridad
9	Plan de Inversión y flujo de caja.

Cordialmente,


ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLÍVAR 2020

C. G. GARDEN GELIMPEREZ LOPEZ
Superintendente Intermedia
Dirección Regional de Infraestructura
cgarden@bolivar.gov.co

CALLE P #517 Bogotá - Oficina 101 - Oficina 112 - Cartagena
CONSORCIO BOLIVAR 2020
CONSORCIO.BOLIVAR.2020@gmail.com
Teléfono +57 800 544 165
Celular +57 305507794

SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. ▸

CB

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para mtejada12, contactenos, copeniz, secretaria_de_planeacion, bcc: rodrigo >

📧 sda, 28 nov 12:09 (hace 2 días) ☆

Buenas tardes,

Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020



	<p>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.</p>	<p>CONSORCIO BOLÍVAR 2020</p>
---	--	-------------------------------

• CB2020-68-2020



Cartagena de Indias D.T. y C. 20 de noviembre de 2020

CB2020-68-2020

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para contactarnos, cc:ccperez, bcc: rodrigo

Buenas tardes ,
Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,

ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020

C. G. LARREA, S.C. INTERMEDIARIZ
Su compañía Controla las ventas de
Directos, Registra los datos de los
consorciobolivar2020@gmail.com



CB2020-68-2020 C...

📧 sáb, 28 nov 17:14 (hace 2 días) ☆

CALL 69 #517 Bogotá – Medellín – Oficina 510-Cartagena
Carpetas, 33x No. 112 77 Bogotá
CONSORCIO BOLIVAR 2020
consorciobolivar2020@gmail.com
Teléfono + 57 300 7860 46
Celular +57 3 135639754



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

8.1.10 INTERVENTORIA CONSORCIO BOLIVAR 2020 CONTRATO N.º 722 DE 2020

• BLV-006-2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020	
Bogotá D.C. 09 de noviembre de 2020	BLV-006-2020
Señores: Instituto Nacional de Vías - INVIA Subdirección Red Terrestre y Ferrocarril Attn: Ricardo Antonio Corredor Parra Director Subdirección Calle 262 No. 736 - 90 Bogotá	
Referencia: Contrato No. 722 de 2020, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.	
Asunto: Evaluación ejecución contractual Contrato No. 722 de 2020.	
Respetado señor:	
♦ El Consorcio Bolívar 2020, suscribió con el Instituto Nacional de vías, el contrato de intervención 722 de 2020, cuyo objeto es el de la referencia, al cual se le impartió la orden de inicio el día 28 de septiembre de 2020 con oficio SRT 37331.	
♦ El contrato consiste en las labores de Interventoría de las obras de los municipios	
✓ Cammelo Bolívar convenio 000698 de 2020	
✓ Córdoba convenio 000533 de 2020	
✓ El Guamo convenio 000540 de 2020	
✓ María La Baja convenio 000586 de 2020	
✓ San Jacinto convenio 006311 de 2020 (Gobernación de Bolívar)	
✓ San Juan de Nepomuceno 00549 de 2020	
✓ San Pablo 00632 de 2020 (Gobernación de Bolívar)	
✓ Zambrano 00630 de 2020 (Gobernación de Bolívar)	
♦ En la fecha de la orden de inicio de la interventoría, no se encontraba suscrita ninguna orden de inicio de los contratos de obra entre los municipios y sus respectivos contratistas.	
CARRERA 15 A No. 112-77 • Teléfonos: (1) 3001564 - 3001565 Email: rolf@bolivaringenieroscolombianos.com Bogotá, Colombia.	

Página 1 de 7

CONSORCIO BOLIVAR 2020	
BLV-006-2020	
Tiempo totalmente insuficiente para la ejecución de la interventoría de una manera eficaz y eficiente teniendo en cuenta la ubicación de las obras en cada uno de los 8 municipios, se solicita se autorice un incremento en las comisiones de acuerdo a la distribución en los cuadros adjuntos.	
• Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos: Se cuenta en el contrato 7 ensayos durante 7 meses para un total de 49 ensayos para la totalidad de las obras, se propone el conservar esta cantidad para la totalidad del contrato.	
• Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos): Sin modificación	
• Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible): Sin modificación.	
• Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.: Sin modificación.	
• Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.): Sin modificación.	
• Vestidura comunitaria: Sin modificación.	
• Elementos e Insumos Protocolo de Bioseguridad: Para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad reglamentados por el Gobierno Nacional se requiere la compra de los insumos necesarios por lo que se estima que el costo mensual de esos insumos es de \$1.200.000, durante los 7 meses de duración del contrato, por lo que se solicita se incremente este ítem para la ejecución del contrato.	
Mientras se define el acta modificatoria se solicita el ingreso del personal relacionado teniendo en cuenta el inicio de las labores en los frentes de María La Baja, San Juan de Nepomuceno y Guamo, se solicita se autorice el ingreso del siguiente personal mínimo y básico:	
Ingeniero Residente	2
Vehículo	1
Topografía	2

CARRERA 15 A No. 112-77 • Teléfonos: (1) 3001564 - 3001565
Email: rolf@bolivaringenieroscolombianos.com Bogotá, Colombia.

Página 5 de 7

CONSORCIO BOLIVAR 2020	
BLV-006-2020	
Para lo anterior se ha presupuestado por parte de Interventoría los costos necesarios para poder efectuar la correcta ejecución de los contratos de obra y poder responder por la estabilidad y garantía de las labores desarrolladas, para ello nos permitimos presentar el análisis de los costos.	
En el desarrollo del contrato de la referencia, una vez efectuada la revisión de las cantidades de personal y equipos contenidos en el cuadro de cantidades del contrato, nos permitimos presentar los documentos elaborados por la Interventoría, donde se muestra claramente la necesidad de ejecutar un acta modificatoria y la consecución de los recursos adicionales a fin de poder cumplir a cabalidad las funciones consignadas en el manual de Interventoría.	
• Director de Interventoría cuenta con un recurso de 4 meses para el término de las obras que es de 7 meses, este ítem no requiere modificación.	
• Ingeniero Residente de Interventoría 1. Cuenta con un recurso de 6 meses y se requiere incrementar 1 mes teniendo en cuenta que en la totalidad de las obras contratadas por los diferentes municipios la duración es 7 meses.	
• Ingeniero Residente de Interventoría 2. Cuenta con un recurso de 6 meses y se requiere incrementar 0.5 mes teniendo en cuenta que en la totalidad de las obras contratadas por los diferentes municipios la duración es 7 meses.	
• Ingeniero Residente de Interventoría 3. Cuenta con un recurso de 6 meses y se requiere incrementar 1 mes teniendo en cuenta que en la totalidad de las obras contratadas por los diferentes municipios la duración es 7 meses.	
• Ingeniero Residente de Interventoría 4. Cuenta con un recurso de 6 meses y se requiere incrementar 2 mes teniendo en cuenta que en la totalidad de las obras contratadas por los diferentes municipios la duración es 7 meses.	
• Ingeniero Residente de Interventoría 5. Es necesario adicionar este recurso teniendo en cuenta la ubicación y fecha de inicio de los contratos.	
• Ingeniero auxiliar de interventoría: Cuenta el contrato con 3 auxiliares con una duración de 6 meses, para un total de 18 hmes, se propone cambiar a 1 auxiliar con una duración de seis meses para un total de 6 hmes.	
• Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos: revisadas las obras a ejecutar contenidas en los acuerdos y en los contratos de obra suscritos en los diferentes municipios y previa visita de los sitios de los contratos se evidencia que no se hace necesario tener este recurso o emplearlo en actividades no necesarias por lo que se considera que el recurso de 2 hmes se puede suplir.	
• Especialista Ambiental: En el contrato se cuenta con 2 especialistas con una duración de 3 meses hmes para un total de 6 hmes, se propone suplir este recurso.	

CARRERA 15 A No. 112-77 • Teléfonos: (1) 3001564 - 3001565
Email: rolf@bolivaringenieroscolombianos.com Bogotá, Colombia.

Página 3 de 7

CONSORCIO BOLIVAR 2020	
BLV-006-2020	
• Especialista en Estructuras: revisadas las obras a ejecutar contenidas en los acuerdos y en los contratos de obra suscritos en los diferentes municipios y previa visita de los sitios de los contratos se evidencia que no se hace necesario tener este recurso máximo al se tiene en cuenta que las obras a construir son box coverted de sección de 1 mt x 1 mt, y emplear un especialista hidráulico para este tipo de labores se considera que el recurso de 2 hmes se puede suplir.	
• Ingeniero Residente Ambiental: En el contrato se cuenta con 2 especialistas con una duración de 3 meses hmes para un total de 6 hmes, se propone suplir este recurso.	
• Inspector SISO: Teniendo en cuenta la obligatoriedad de dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad reglamentadas por el Gobierno Nacional, y para la vigilancia y cumplimiento de las mismas se requiere contratar el técnico en seguridad, para ello se propone tres inspectores con una duración de 6 meses cada uno.	
• Inspector de obra civil: Teniendo en cuenta, la ubicación de las obras en los diferentes municipios, las cuales no se ubican en las cercanías de los cascos urbanos sino en las vías de acceso a diferentes veredas o corregimientos de los mismos, y que su acceso se hace por vías veredales, y que los tiempos de viaje entre cada uno de los sitios de las obras superan más de cuatro horas en el trayecto, se hace imposible la supervisión e interventoría sin el emplear este tipo de recurso 1 hmes para cada la distribución de los municipios para un total de 8 inspectores, es de especial atención este recurso.	
• Especialista Hidráulico: revisadas las obras a ejecutar contenidas en los acuerdos y en los contratos de obra suscritos en los diferentes municipios y previa visita de los sitios de los contratos se evidencia que no se hace necesario tener este recurso máximo al se tiene en cuenta que las obras a construir son box coverted de sección de 1 mt x 1 mt, y emplear un especialista hidráulico para este tipo de labores se considera no necesario el tiempo de 1.5 hmes.	
• Secretaría: El contrato contempla el uso de 2 secretarías durante 7 meses, se estima que con una sola durante los 7 meses del contrato es suficiente.	
• Camioneta o campero de más de 2000 c.c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible): En el contrato se considera solo el uso de 1 vehículo durante 4 meses para el transporte de personal, vehículo absolutamente insuficiente para el traslado 4 ingenieros, por lo que al ni el tiempo de utilidades el adecuado al cual es inferior tiempo del contrato, se solicita incrementar este ítem a cinco vehículos de acuerdo a la distribución del cuadro adjunto.	
• Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT): Para este ítem se considera necesario, para el traslado de los inspectores.	
• Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte): El contrato contempla el uso de 3 comisiones durante 2 meses para un total de 6 meses,	
CARRERA 15 A No. 112-77 • Teléfonos: (1) 3001564 - 3001565 Email: rolf@bolivaringenieroscolombianos.com Bogotá, Colombia.	

Página 4 de 7

CONSORCIO BOLIVAR 2020	
BLV-006-2020	
♦ Los procesos que se encontraban más adelantados eran los de María La Baja, El Guamo y San Juan de Nepomuceno en los cuales el contratista sin haber suscrito con el municipio la orden de inicio ya estaban adelantando las labores de localización, relevar y levantamiento topográfico para la construcción de los tramos de plaza huelle.	
♦ Ante esta realidad de los convenios, el consorcio Bolívar 2020, dio inicio a las labores de revisión de lo actuado por los diferentes contratistas en cada uno de los municipios contando para ello con un Ingeniero Residente, un Ingeniero Auxiliar, secretario, un vehículo y la dedicación parcial del Director de Interventoría de acuerdo a lo pactado en el contrato.	
♦ En estos tres municipios se firmaron los ordenes de inicio los días 30 de septiembre para las obras del municipio de María La Baja, 16 de octubre para las obras en San Juan de Nepomuceno y el 26 de octubre para las obras en el Municipio del Guamo.	
♦ Con lo anterior se tiene como fecha de terminación de las obras, los meses de abril de 2021 para María la Baja, 16 de mayo de 2021 para San Juan de Nepomuceno y el 26 de mayo de 2021 para el Municipio del Guamo.	
♦ Los Municipios de Córdoba, aún no han procedido a la firma del acta de inicio, las obras del municipio de Cammelo Bolívar aún no han sido adjudicadas el contrato de obra, si sea su terminación es incierta y de los tres contratos a cargo de la Gobernación de Bolívar para las obras en los municipios de San Jacinto y Zambrano, los contratos ya fueron adjudicados pero la Gobernación no ha procedido a la firma del acta de inicio a pesar de haber solicitado se proceda a ello y para el municipio de San Pablo las obras aún no han sido adjudicadas.	
♦ Teniendo en cuenta los tiempos requeridos para la contratación de las obras en los municipios de Cammelo Bolívar y San Pablo se estima que las ordenes de inicio de los contratos sea a finales del mes de noviembre o mediados de diciembre, los tiempos de estas obras son de siete (7) meses de las cuales uno (1) de revisión de diseños y seis (6) de ejecución de obra, con lo cual se deduce que las obras como tal terminarán en el mes JULIO de 2021.	
♦ La totalidad de los contratos suscritos entre los municipios y los contratistas tiene un plazo de siete (7) meses de los cuales se estima uno (1) de revisión de diseños y seis (6) de ejecución de obra.	
El contrato de la interventoría fue suscrito el día 4 de mayo de 2020 y se recibió la orden de inicio de las labores de interventoría el 28 de septiembre de 2020 transcurriendo 4 meses y 24 días, en la fecha de firma del contrato no se conocía la parte muestra de los convenios y menos del estado de contratación por parte de los ocho municipios, tal y como se mencionó antes en este documento, el contrato de interventoría sobrepasa de un personal y recursos que hacen viable la ejecución de una correcta ejecución de las labores de acuerdo al manual de interventoría del INVIA.	
CARRERA 15 A No. 112-77 • Teléfonos: (1) 3001564 - 3001565 Email: rolf@bolivaringenieroscolombianos.com Bogotá, Colombia.	

Página 2 de 7

CONSORCIO BOLIVAR 2020	
BLV-006-2020	
CARRERA 15 A No. 112-77 • Teléfonos: (1) 3001564 - 3001565 Email: rolf@bolivaringenieroscolombianos.com Bogotá, Colombia.	

Página 6 de 7



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO BOLÍVAR 2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para atencionciudadano, registro.d.ting, copenet, ofitiana, private

9 nov 2020 22:22 (hace 4 días)

Cordial saludo,

La presente para radicar el oficio BLV-006-2020 de parte del CONSORCIO BOLIVAR 2020.

Ref: Contrato No. 722 de 2020. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Asunto: Evaluación ejecución contractual Contrato No. 722 de 2020.

Para su radicación y gestión.

Muchas gracias

BLV-006-2020
Reclamación.pdf
10/11/20

CONSORCIO BOLIVAR 2020

BLV-006-2020

Cordialmente,

Rodrigo Díaz B.
RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
Representante Legal
CONSORCIO BOLIVAR 2020
Atenas, 10 de Noviembre
Capital Antioquia

• CB2020-35-2020



Cartagena de Indias D.T. y C. 12 de noviembre de 2020

CB2020-35-2020

SR.
OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
Gestor Técnico Proyecto-Invias
otriana@invias.gov.co

Asunto: **AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 722 DE 2020**

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito solicitar en calidad de Director de Interventoría la ampliación del plazo del contrato referenciado en el asunto, teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato de Interventoría es de 31 de diciembre de 2020 y el plazo de los contratos de obra es de 7 meses corridos a partir de la fecha del acta de inicio, lo que indica que el plazo de ejecución de las obras es superior al plazo de la Interventoría.

Cabe anotar que tanto el inicio del contrato de Interventoría y la adjudicación e inicio de los contratos de obra estuvieron sujetos a la finalización del periodo de cuarentena oficial decretada a nivel nacional, la cual finalizó el 1 de septiembre de 2020, por consiguiente, el inicio de dichos contratos se vio sujeto a retrasos por la situación antes descrita.

A continuación, se describen las fechas de inicio de los contratos que se encuentran en ejecución y las fechas tentativas de inicio de los contratos por iniciar:

FECHA DE INICIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN		
Descripción	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
María La Baja	30/09/2020	30/04/2021
San Juan de Nepomuceno	16/10/2020	16/05/2021
El Guapito	26/10/2020	26/05/2021
FECHA PREVISTA INICIO CONTRATOS ADJUDICADOS		
Descripción	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Chetolobos	13/11/2020	13/06/2021
San Jacinto	20/11/2020	20/06/2021
Zumbato	20/11/2020	20/06/2021

Los frentes de San Pablo y Carmen de Bolívar se encuentran aún en proceso de adjudicación.

Agradezco su atención y colaboración, espero atento su pronta respuesta.

Cordialmente,

Rodrigo Díaz
ING. RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTÍNEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALL CENTER Bogotá - Oficina Medellín - Oficina Cúcuta - Cartagena
CARRERA 154 No. 112-77 Bogotá
CONSORCIO BOLIVAR 2020
consorcio@bolivar2020.gov.co
Teléfono: +57 3001 1542 15
Celular: +57 310 680 7154

AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 722 DE 2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consorciobolivar2020@gmail.com>
para ofitiana, copenet

12 nov 2020 15:04 (hace 19 horas)

Buenas tardes, adjunto la referenciado en el asunto.

Cordialmente,
RODRIGO ALBERTO DIAZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOLIVAR 2020





INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

CONSORCIO BOLÍVAR 2020

•CB2020-47-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 19 de noviembre de 2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020

Referencia: Contrato No. 722 de 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Asunto: AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 722 DE 2020

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito y doy fe al comunicado CB2020-47-2020 solicitar la ampliación del plazo del contrato referenciado en su asunto teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato de Interventoría es el 31 de diciembre de 2020 y el plazo de los contratos de obra es de 7 meses contados a partir de la fecha del acto de inicio, lo que indica que el plazo de ejecución de las obras va a superar el plazo de la interventoría.

A continuación, se describen las fechas de inicio de los contratos que se encuentran en ejecución y las fechas tentativas de inicio de los contratos por iniciar:

Descripción	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Marta La Rosa	30/06/2020	30/06/2021
San Juan de Nepomuceno	10/10/2020	10/06/2021
El Caimero	20/10/2020	20/06/2021
Córdoba	17/11/2020	17/06/2021

FECHA PREVISTA INICIO CONTRATOS ADJUDICADOS

Descripción	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
San Juan de	01/11/2020	01/06/2021
Sabanalarga	20/11/2020	20/06/2021

Los frentes de San Pablo y Carmen de Bolívar se encuentran aún en proceso de adjudicación, se espera que se inicien a los contratos una vez sean adjudicados para el 7 de diciembre de 2020. Lo que indica que esta interventoría exagere los tiempos de ejecución 7 meses después, hasta el 7 de julio de 2021.

La solicitud de ampliación no requiere recursos adicional.

Agradecemos su atención y colaboración, espero atento su pronta respuesta.

Cordialmente,

Rodrigo Alberto Díaz Benumea
ING. RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENUMEA
Representante Legal
CONSORCIO BOLIVAR 2020

CALLE 4ª 8057 Bogotá - Edificio Indes - Oficina 302 - Cartagena
CARTAGENA 47440-132-77 Bogotá
Teléfono: +57 313 601 1654
Correo: consoibolivar2020@gmail.com

CONSORCIO BOLIVAR 2020 <consoibolivar2020@gmail.com>

para Centro, Rodrigo, enlaza, Laura, clarunji

Cordial saludo,

La presente para radicar el oficio CB2020-47-2020 de parte del CONSORCIO BOLIVAR 2020.

Ref: Contrato No. 722 de 2020. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Asunto: AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 722 DE 2020

Para su radicación y gestión.

Muchas gracias.



•CB2020-52-2020

Cartagena de Indias D.T. y C. 24 noviembre de 2020

CONSORCIO BOLIVAR 2020

SRA
CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Supervisora General de Obras
Dirección Regional de Obras Públicas
clopez@trm.gov.co

Asunto: ACTA DE COSTOS No. 2

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito dar respuesta a cada una de las observaciones realizadas al acta de costos No. 2 que corresponde al periodo de 1 al 31 de octubre de 2020, con el fin de que se realice y se ajuste para el pago de obra.

A continuación, enumeramos las observaciones realizadas con sus respectivas aclaraciones:

OBSERVACIONES AL ACTA DE COSTOS No. 2
CONTRATO 722/2020

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1. Tomando los datos suministrados en la columna presente acta, la liquidación sería:

ITEM No.	Cantidad	Costo Mensual	Deducción Racional Acta 1	Valor
1.	0,50	5.254.000,00		2.580.300,00
2.	1,00	3.450.000,00		3.450.000,00
3.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
4.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
5.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
6.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
7.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
8.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
9.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
10.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
11.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
12.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
13.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
14.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
15.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
16.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
17.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
18.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
19.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
20.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
21.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
22.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
23.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
24.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
25.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
26.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
27.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
28.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
29.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
30.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
31.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
32.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
33.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
34.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
35.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
36.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
37.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
38.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
39.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
40.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
41.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
42.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
43.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
44.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
45.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
46.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
47.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
48.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
49.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
50.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
51.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
52.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
53.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
54.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
55.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
56.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
57.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
58.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
59.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
60.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
61.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
62.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
63.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
64.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
65.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
66.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
67.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
68.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
69.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
70.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
71.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
72.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
73.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
74.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
75.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
76.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
77.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
78.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
79.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
80.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
81.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
82.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
83.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
84.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
85.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
86.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
87.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
88.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
89.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
90.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
91.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
92.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
93.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
94.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
95.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
96.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
97.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
98.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
99.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
100.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
101.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
102.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
103.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
104.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
105.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
106.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
107.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
108.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
109.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
110.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
111.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
112.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
113.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
114.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
115.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
116.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
117.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
118.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
119.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
120.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
121.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
122.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
123.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
124.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
125.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
126.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
127.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
128.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
129.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
130.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
131.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
132.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
133.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
134.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
135.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
136.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
137.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
138.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
139.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
140.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
141.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
142.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
143.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
144.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
145.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
146.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
147.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
148.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
149.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
150.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
151.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
152.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
153.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
154.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
155.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
156.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
157.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
158.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
159.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
160.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
161.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
162.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
163.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
164.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
165.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
166.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
167.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
168.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
169.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
170.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
171.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
172.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
173.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
174.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
175.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
176.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
177.	0,50	2.400.000,00		1.200.000,00
178.	0,50			



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

CON

Este correo es para ser utilizado, en el evento de funcionar bien, (Si funciona, lo cual no se está cumpliendo).

La factura emitida por COTRANTAS No. 01/ 2020 por valor asumido de \$ 400.000, está anexo al correo de **S&S INGENIEROS CIVILES S.A.S.** No está emitida al consorcio contratante.

La factura emitida por INSUMOS Y FORNIDORES No. 01/ 2020 por valor de \$ 100.000, está a nombre de **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TISU**. No está emitida al consorcio contratante.

ACLIARACIÓN: Se pide al correo de la proveedor a los tres meses y se recibe las facturas a nombre de S&S Ingenieros Civiles S.A.S y Unión Temporal TISU.

Concluyendo,

Ing. Rodrigo Alberto Díaz Benjumea
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020

IMPRESA: 01/01/2020
ANEXO: 1. COMPOSICION DE RESOLUCION DE COSTOS Y 2. ACTA DE COSTOS
3. ACTA DE COSTOS Y 4. ACTA DE COSTOS

para coperez, dbarragan, bcc: rodrigo

Buenas tardes ,
Mediante la presente enviamos lo referenciado en el asunto.

Cordialmente,
ING. RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLIVAR 2020


5 archivos adjuntos



CALLE 40 # 7-30 Bogotá, Colombia
GUANAJAY, GUANAJAY 2020
GUANAJAY, GUANAJAY 2020
GUANAJAY, GUANAJAY 2020
GUANAJAY, GUANAJAY 2020

8.2 BITACORA DE INTERVENTORIA.

8.2.1 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA- CONTRATO N. ° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020. CONTRATISTA: CORPORACION SER SOCIAL.

Miércoles 25 de Noviembre de 2020	
Inicio de actividades en obra : 7:00 Am	
Estado del Tiempo: Soleado.	
Personal en Campo:	
- Topografo , Paletero	
- Operador de retroexcavadora y Volqueta.	
Maquinaria y Equipo:	
- RetroExcavadora Serie No ICB3C4TCC0225772	
- Volqueta Placa No SNV 173, Capacidad 10m ³	
- Equipo topografico	
Actividades:	
Se realizo labores de excavación, ejecutaron durante el día 20 ml con un ancho aproximado de 5,50 m y una profundidad de 0,3 m.	
Nota: durante la excavación efectuaron un daño a la tubería domiciliaria del agua de una vivienda, no se ha instalado.	
Viaje de Volqueta : 6 Viajes.	
Ing. Residente de obra:	
	

Jueves 26 de Noviembre 2020

Inicio de Actividades en obra: 7:00 A.M.

Estado del tiempo: Soleado durante la mañana

3:00 pm a 4:00 pm Se presentaron lluvias

personal en Campo:

- Topógrafo, paletero.

- Operador de retroexcavadora y Volqueta.

Maquinaria y Equipo:

- Retroexcavadora.

- Volqueta.

- Equipo topográfico.

Actividades:

Se continuo con las actividades de excavación, avanzando 20 ml más.

Nota: durante la excavación de este

tramo, se encontraron con el tubo madre

Estan a la espera del material para

reparar los daños.

J. C. P. [Signature]

Viernes 27 de Noviembre de 2020.

Inicio de Actividades en obra - 7:00 AM.

Estado del Tiempo: Nublado - Lluvias.

Personal en Campo: - Ing. residente.

- Topógrafo, paletero.

- Operador de retroexcavadora y volqueta.

Maquinaria y Equipo:

- Retroexcavadora.

- Volqueta.

- Equipo Topográfico.

Actividades:

avanzaron con la excavación hasta las 10:00 a.m. debido a que la retro quedó sin ACPM.

Retomaron actividades a la 1:00pm y suspendieron a las 2:00pm por fuertes lluvias.

Ing. residente de obra:
[Firma]

Sabado 28 de Noviembre de 2020

Inicio de Actividades en obra : 7:00 AM

Estado del tiempo : Soleado

Personal en Campo :

- Topografo, paletero

- Operador de Retroexcavadora y Volqueta

Maquinaria y Equipo :

- Retroexcavadora

- Volqueta

- Equipo topografico

Actividades :

Se trabajo medio día, Excavaron 20 ml
más, culminando la Semana con 115 ml

J. Luis / Luis

Lunes 30 de Noviembre de 2020

Inicio de Actividades en obra: 8:00 A.M.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en Campo:

- Ing. Residente
- Topógrafo, Paletero
- Operador de retroexcavadora y Volqueta

Maquinaria y Equipo:

- Retroexcavadora
- Volqueta
- Equipo topográfico

Actividades:

Se excavó 25 ml y se retiró material del terreno, aproximadamente 54 m³.

Se repararon dos tuberías del agua de dos viviendas diferentes.

quedaron pendientes dos tuberías más que han sido avenadas por la excavación del día.

Ing. Residente de obra:

Jaime C. Lora

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

8.2.1. MUNICIPIO EL GUAMO - BOLIVAR. CONTRATO N. ° LP-001-2020 DE 4 AGOSTO DE 2020.





FOTOGRAFIAS. Topografía - Guamo Bolívar



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".

CONSORCIO
BOLÍVAR 2020

**8.2.2. CONTRATO N. ° LP-002-2020 DE 10 JULIO DE 2020. CONTRATISTA:
CORPORACION SER SOCIAL.**



FOTOGRAFIAS. Inicio de Excavación.



FOTOGRAFIAS. Excavación Tramo 1 Flamenco

8.2.3. CONTRATO N° LP-N-002-20200801001. CONTRATISTA: MET- CONCIVIL S.A.S. – MUNICIPIO DE SAN JUAN.



FOTOGRAFIAS. Tramo 4 Placas Huella en buen estado.





FOTOGRAFIAS. Toma de muestras del material del sitio para ensayos. San Juan Nepomuceno

8.2.4. MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR. CONTRATO N. ° SI-C-1808 DE 2020.



FOTOGRAFIAS. Socialización de obra y conformación de Veeduría.

8.2.5. MUNICIPIO DE CORDOBA - BOLÍVAR. CONTRATO N.º LP-OP-001-2020 DE (24) DE AGOSTO DE 2020.



FOTOGRAFIAS. Visita Técnica Córdoba.
