

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

CONTRATO MC-033-2026

OBJETO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO
DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026

PRESENTADO POR:

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
R/L WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA

OTANCHE, 17 DE JUNIO DE 2026

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	MC-033-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE OTANCHE NIT. 891.801.362-1
CONTRATISTA:	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
NIT/CC:	NIT: 901.350.425-6
INTERVENTORIA:	N/A
NIT/CC:	N/A
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026
VALOR INICIAL:	ONCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (\$11.035.139,00) M/CTE
VALOR ADICIÓN:	DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 2.797.484,00) M/CTE
VALOR TOTAL	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS VEINTE TRES MIL PESOS (\$ 13.832.623,00) M/CTE
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO	11 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JUNIO DEL 2026
PLAZO CONTRATO	

7

724

DESARROLLO DEL CONTRATO

• INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el desarrollo y ejecución de las obras enunciadas dentro del objeto contractual contenido en el contrato de obra **MC-033-2026**; suscrito entre la Empresa secretaria de Planeación e Infraestructura de Otanche y la empresa M&M Consultoría y Construcciones SAS el cual cuenta con el objeto MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026

• ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	VALOR EN PESOS
Valor inicial del contrato	(\$11.035.139,00)
Valor Otro si 001	(\$ 2.797.484,00)
Valor total contrato	(\$ 13.832.623,00)
Valor actas anteriores	-
Valor de la presente acta	(\$ 13.832.623,00)
Valor pendiente por ejecutar	-
Porcentaje de avance físico de ejecución	100%

4

R

• INFORME DE ACTIVIDADES

Otanche 17, de junio de 2026

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta los compromisos y obligaciones adquiridas a la firma del contrato MC-033-2026 me permito presentar informe.

Registro de actividades:

Nº	ESPECIFICACIONES		ACTIVIDAD	UND	VALOR	INCREMENTO	CANT	VALOR
	GENERAL	PARTICULAR			UNITARIO	X DISTANCIA		TOTAL
1			1. DEMOLICIÓN Y DESMONTE					
1.1	GORBER.		2.01.14 DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	\$ 45.076,32	0,00%	31,96	\$ 1.440.639,09
1.2	GORBER.		2.01.23 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	\$ 12.851,72	0,00%	24,18	\$ 310.754,64
2			2. ESTRUCTURA					
2.1	GOBER		2.05.23 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	515.707,78	12,00%	3,85	\$ 1.985.474,94
2.2	GOBER		2.02.36 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	10.898,57	12,00%	23,93	\$ 260.802,81
2.3		COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE 20X20	M2	136.787,12	12,00%	9,66	\$ 1.321.363,61
2.4	GOBER		2.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	184.112,06	12,00%	0,00	\$ 0,00
2.5	GOBER		2.06.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	29.243,51	12,00%	36,12	\$ 1.056.275,52
2.6	GOBER		1.01.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	790.447,13	12,00%	0,13	\$ 102.758,13
2.7	GOBER		2.07.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS	M2	33.386,09	12,00%	50,00	\$ 2.337.026,20
NP			ITEM NO PREVISTO					
Np.1	GOBER		3.13.21 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	31.348,64	12,00%	16,80	\$ 526.667,19
Np.2	GOBER		2.05.19 PISO EN CERÁMICA	M2	129.682,35	12,00%	21,84	\$ 2.832.262,57
Np.3	GOBER		2.10.105 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	167.732,22	12,00%	4,00	\$ 670.928,87
Np.4	GOBER		2.10.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	ML	26.137,57	12,00%	20,00	\$ 522.751,42
Np.5	GOBER		2.04.25 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	M2	217.576,80	12,00%	0,20	\$ 43.515,36
Np.6	GOBER		2.12.181 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	140.470,82	12,00%	3,00	\$ 421.412,45
			COSTO BASICO DE OBRA					\$ 13.832.623,00
			ADMINISTRATIVOS (A)					24% \$ 3.319.830,00
			IMPREVISTOS (B)					2% \$ 278.652,00
			UTILIDAD (U)					4% \$ 553.305,00
			VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) ANU = 30% (A=23%, B=3%, U=4%)					\$ 18.283.410,00

• **LOCALIZACION:**

El municipio de Otanche se encuentra en las estribaciones de la cordillera Oriental en dirección al valle del Río Magdalena, en el occidente del departamento de Boyacá.



Imagen 1. Tomada de Google Earth

• **POLIZAS**

	FECHA DE EXPEDICIÓN 21-08-2024	
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL SA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	\$ 1,383,262.30	16/10/2026
POLIZA: 39-44-101182881		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	\$ 691,631.15	16/06/2029
POLIZA: 39-44-101182881		
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 1,383,262.30	16/06/2031
POLIZA: 39-44-101182881		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 350,181,000.00	16/06/2026
POLIZA: 39-40-101048049		

F

Kx

ACTIVIDADES REALIZADAS

N°	ESPECIFICACIONES		ACTIVIDAD	UND	VALOR	INCREMENTO	CANT
	GENERAL	PARTICULAR			UNITARIO	X DISTANCIA	
1			1. DEMOLICIÓN Y DESMONTE				
1.1	GORBER.		2.01.14 DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E <= A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	\$ 45.076,32	0,00%	31,96
1.2	GORBER.		2.01.23 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	\$ 12.851,72	0,00%	24,18
2			2. ESTRUCTURA				
2.1	GOBER		2.05.23 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	515.707,78	12,00%	3,85
2.2	GOBER		2.02.36 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	10.898,57	12,00%	23,93
2.3		COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE 20X20	M2	136.787,12	12,00%	9,66
2.4	GOBER		2.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	184.112,06	12,00%	0,00
2.5	GOBER		2.06.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	29.243,51	12,00%	36,12
2.6	GOBER		1.01.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	790.447,13	12,00%	0,13
2.7	GOBER		2.07.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS	M2	33.386,09	12,00%	50,00
NP			ITEM NO PREVISTO				
Np.1	GOBER		3.13.21 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	31.348,64	12,00%	16,80
Np.2	GOBER		2.05.19 PISO EN CERÁMICA	M2	129.682,35	12,00%	21,84
Np.3	GOBER		2.10.105 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	167.732,22	12,00%	4,00
Np.4	GOBER		2.10.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	ML	26.137,57	12,00%	20,00
Np.5	GOBER		2.04.25 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	M2	217.576,80	12,00%	0,20
Np.6	GOBER		2.12.181 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	140.470,82	12,00%	3,00

B

84

REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1 DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E $\leq$ A 12CM.
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)



1.2 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)



B

PA



2.1 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)



B

A

2.2 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)



2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE 20X20



#

de



2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"



2.6 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)



B


304

305

2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS



Np. 1 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA

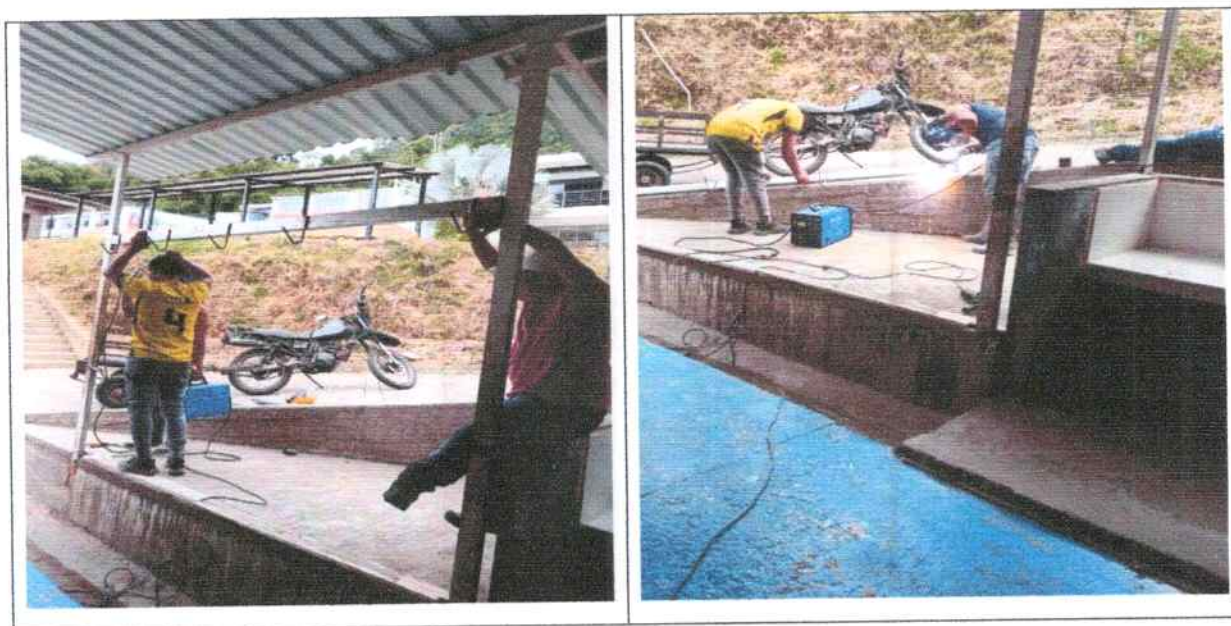

B


104

306

Np. 2 PISO EN CERÁMICA



Np. 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).

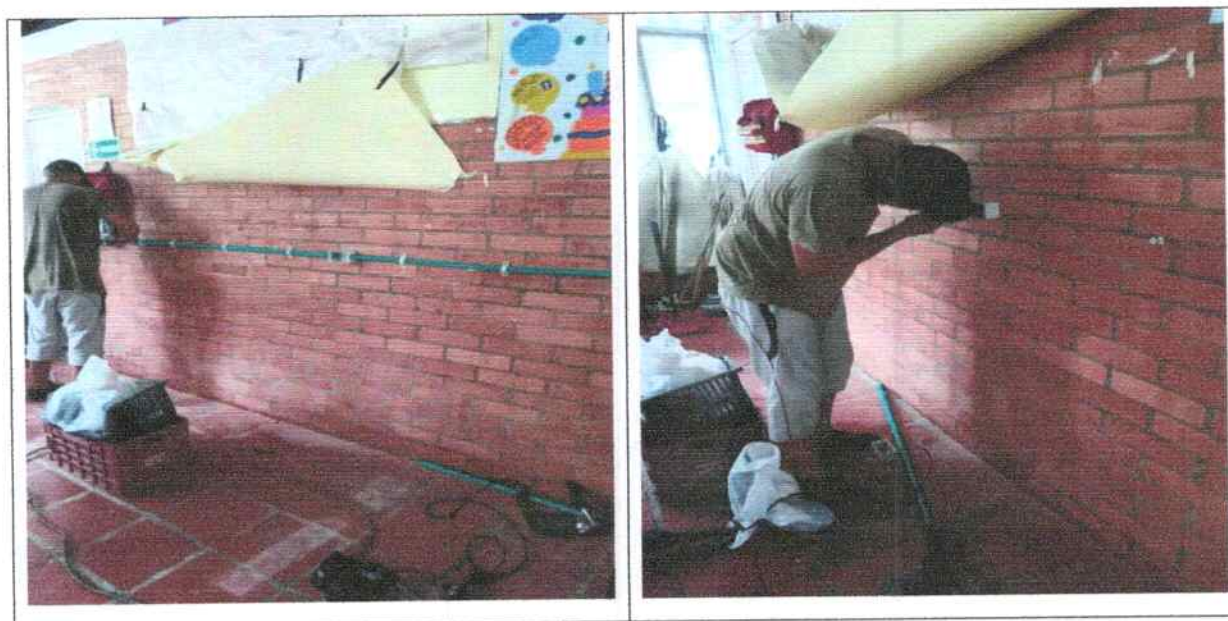


7

✱

Np. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")



Np. 5 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)

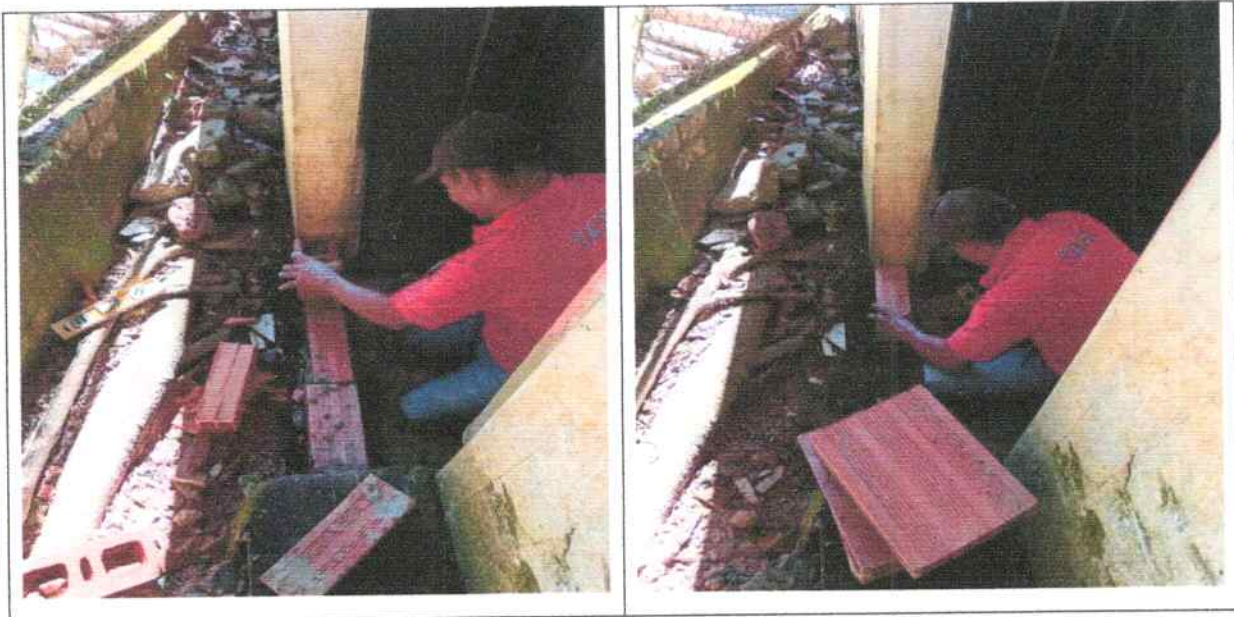

#

22

308

Np. 5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA




WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
R/L M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.350.425-6
CEL 320 621 2512

B


ret

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE OTANCHE Alcaldía Municipal NIT 891.801.362-1										 M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES									
MUNICIPIO										OTANCHE-BOYACA									
FECHA										FORMATO									
DD										17									
MM										AA									
AÑO										2026									
CORTE N°										1									
ELABORÓ										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS									
OBJETO DEL CONTRATO										MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026									
CONTRATISTA										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS									
INTERVENIOR										N/A									
SUPERVISIÓN										ANTHONY ADRIAN GARZON BERNAL									
CONTRATO N°										MIC-003-2026									
CAPÍTULO										3									
ITEM NO PREVISTO										No.3									
																			
2.10. LOS SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, DE CALIBRE 12 AWG Y DUCID PVC DE 1/2" (INCLUIR APARATOS).										2.10. LOS SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, DE CALIBRE 12 AWG Y DUCID PVC DE 1/2" (INCLUIR APARATOS).									
Ubicación RESTAURANTE ESCOLAR										Demarcaciones H L A									
UNIDAD										UNIDAD									
Medida total										Medida total									
4.00										4.00									
ACTA ANTERIOR										ACTA ANTERIOR									
PRESENTE ACTA										PRESENTE ACTA									
TOTAL										TOTAL									
0.00										0.00									
4.00										4.00									
FIRMA										FIRMA									
CONTRATISTA										CONTRATISTA									
M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS									
SUPERVISOR										SUPERVISOR									
ANTHONY ADRIAN GARZON BERNAL										ANTHONY ADRIAN GARZON BERNAL									

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE OTANCHE Alcaldía Municipal NIT 891.801.362-1										 M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
MUNICIPIO										OTANCHE-BOYACA										FORMATO									
FECHA	DD	17	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
OBJETO DEL CONTRATO										MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE-BOYACÁ 2026																			
CONTRATISTA INTERVENIOR										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
SUPERVISIÓN										ANTHONY ADRIAN GARCIA BERNAL																			
CONTRATO N°										MC-033-2026																			
CAPITULO	3	ITEM NO PREVISTO				Np.4	2.10.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F. N. T.) (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")				UNIDAD				ML														
 										Localización				RESTAURANTE ESCOLAR				Medida Total											
										20.00				20.00				20.00											
ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA TOTAL										0.00 20.00 20.00																			
FIRMA CONTRATISTA										FIRMA SUPERVISOR																			
M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS										ANTHONY ADRIAN GARCIA BERNAL																			

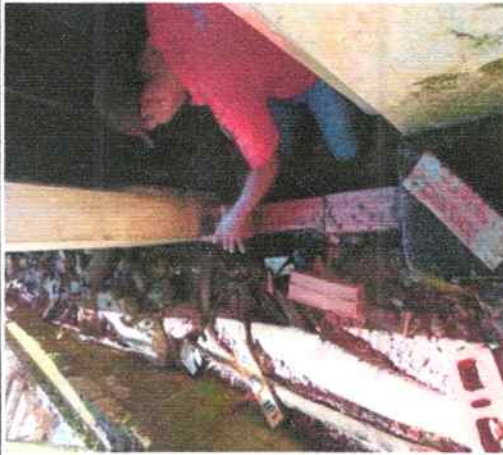REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE OTANCHE Alcaldía Municipal NIT 891.801.362-1										 M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
MUNICIPIO										OTANCHE-BOYACA										FORMATO									
FECHA	DD	17	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
OBJETO DEL CONTRATO										MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOTOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026																			
CONTRATISTA INTERVENIOR										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
SUPERVISIÓN										ANYUL ADRIAN GARCÓN BERNAL																			
CONTRATO N°										MC-033-2026																			
CAPÍTULO	3	ITEM NO PREVISTO				Np.5	2.04.25 MURO EN LADILLO PREBASTADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)				UNIDAD	M2																	
 										Localización				Restaurante ESCOLAR				Denominación											
										H				L				A				Medida Total							
														1.00				0.20				0.20							
ACTA ANTERIOR										0.00																			
PRESENTE ACTA										0.20																			
TOTAL										0.20																			
PRIMA																													
CONTRATISTA										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
SUPERVISOR										ANYUL ADRIAN GARCÓN BERNAL																			

[Handwritten signature]

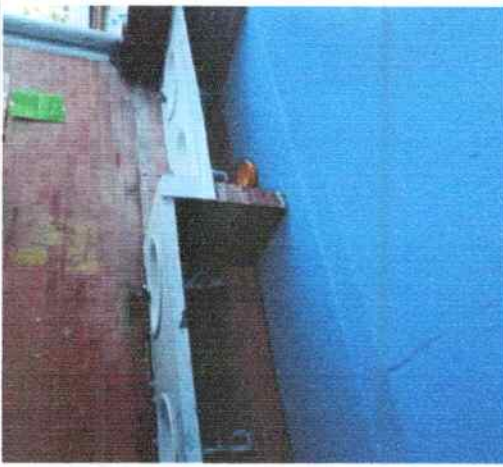REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE OTANCHE Alcaldía Municipal NIT 891.801.362-1										 M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
MUNICIPIO										OTANCHE-BOYACA										FORMATO									
FECHA	DO	17	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
OBJETO DEL CONTRATO										MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE-BOYACÁ 2026																			
CONTRATISTA INTERVENIOR										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
SUPERVISIÓN										ANTHONY ADRIAN GARCÓN BERNAL																			
CONTRATO N°										MC-033-2026																			
CAPÍTULO	3	ITEM NO PREVISTO				Np.4	2.12.161 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA				UNIDAD				UNID														
 										Localización				Restaurante Escolar				UNID				Medida Total							
										3.00				3.00				3.00				3.00							
ACTA ANTERIOR										0.00																			
PRESENTE ACTA										3.00																			
TOTAL										3.00																			
FIRMA										M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS																			
CONTRATISTA										SUPERVISOR																			
ANTHONY ADRIAN GARCÓN BERNAL										ANTHONY ADRIAN GARCÓN BERNAL																			

324

PA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901350425	6	ARMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	II - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFARBOY	CL 3 # 4 33 BARRIO CENTRO	OTANCHE BOYACA	5555555	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-04	2026-05	1000000695	950287044	E		2026/05/08	2026/05/25	\$674,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1014257983	MENDEZ GARCIA WILSON ANDRES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$1,750,905	\$87,700		
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$1,750,905	\$87,700		




RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0
						\$283,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0
						\$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$70,100	\$0
						\$71,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0
						\$221,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$52,600	\$0
						\$53,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$35,100	\$0
						\$35,600
TOTAL				1	\$666,100	\$0
						\$674,600

R

200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901350425	6	MBA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFARBOY	CL 3 # 4 33 BARRIO CENTRO	OTANCHE ROYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-05	2026-06	398472967	9506374577	E		2026/06/05	2026/06/17 NEQUI	\$472,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1014357883	MENDOZA GARCIA WILSON ANDRES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905
Total Afiliados(1)						\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$282,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$70,100	\$70,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$220,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$52,600	\$53,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$35,100	\$35,500
TOTAL				1	\$666,100	\$672,300

[Handwritten signature]

COMPROBANTE

340

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	164322976	398252723	17/06/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901350425**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **200.69.92.217**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera	Total Pagado	\$ 34,582.00
--	--------------	---------------------

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 34,582.00	COP\$ 34,582.00

Handwritten signature and initials

NIT

899999034

Medio de Pago

NEQUI

Nro. Transacción

164322976

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

398252723

17/06/2026

Número de Identificación

901350425

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

6

Departamento

BOGOTA

Dirección de Domicilio

CL 81 89 A 14

Localización

Nacional

Correo electrónico

mymsas53@gmail.com

Regional

Boyaca

Número Licencia de Obra

MC-033-2026

Nombre Obra

MANTENIMIENTO RESTAURANTE ESCO

Fecha Terminación Obra

15/06/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total Mano de Obra

3000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

BOGOTA DC

Teléfono de Contacto

+57,3118177577

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-015-000000

Número Contrato de Obra

MC-033-2026

Fecha Inicio Obra

11/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra

OTANCHE

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

13832623.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

34582.00

Valor del Pago

34582.00





Banco Agrario de Colombia


El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MYM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9013504256, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-153-03-01043-8, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en CHIQUINQUIRA, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2024, con destino a: A QUIEN CORRESPONDA



IB

104
