




Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur E.S.E.



SECRETARÍA DE
SALUD



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PROYECTO URGENCIAS TUNAL CONSORCIO HOSPITAL

JULIO DE 2026



TORRE URGENCIAS TUNAL

- **Convenio Interadministrativo 2806257-2021**
- Fecha Inicio: 13/09/ 2021
- Fecha Terminación: 26/06/2026

CONVENIO



- **Llave en mano: 5008/22**
- Inicio: 20/05/2022
- Terminación: 31/05/2026
- **Interventoría: 5009-2022**
- Inicio: 20/05/2022
- Terminación: 31/05/2026
- Inicio 21 junio de 2026
- Terminación 31 diciembre de 2026

CONTRATOS DERIVADOS




- **SEMANA No. 201**
- **69,95% - Avance esperado**
- **52.77% -Avance ejecutado**
- **Desviación -3 semanas**
- **AVANCE OBRA OBSERVADO 65,60%**

% AVANCE CON CORTE
30 JUNIO DE 2026

%

PORCENTAJE AVANCE OBRA

2. Curva S - % AVANCE DE OBRA

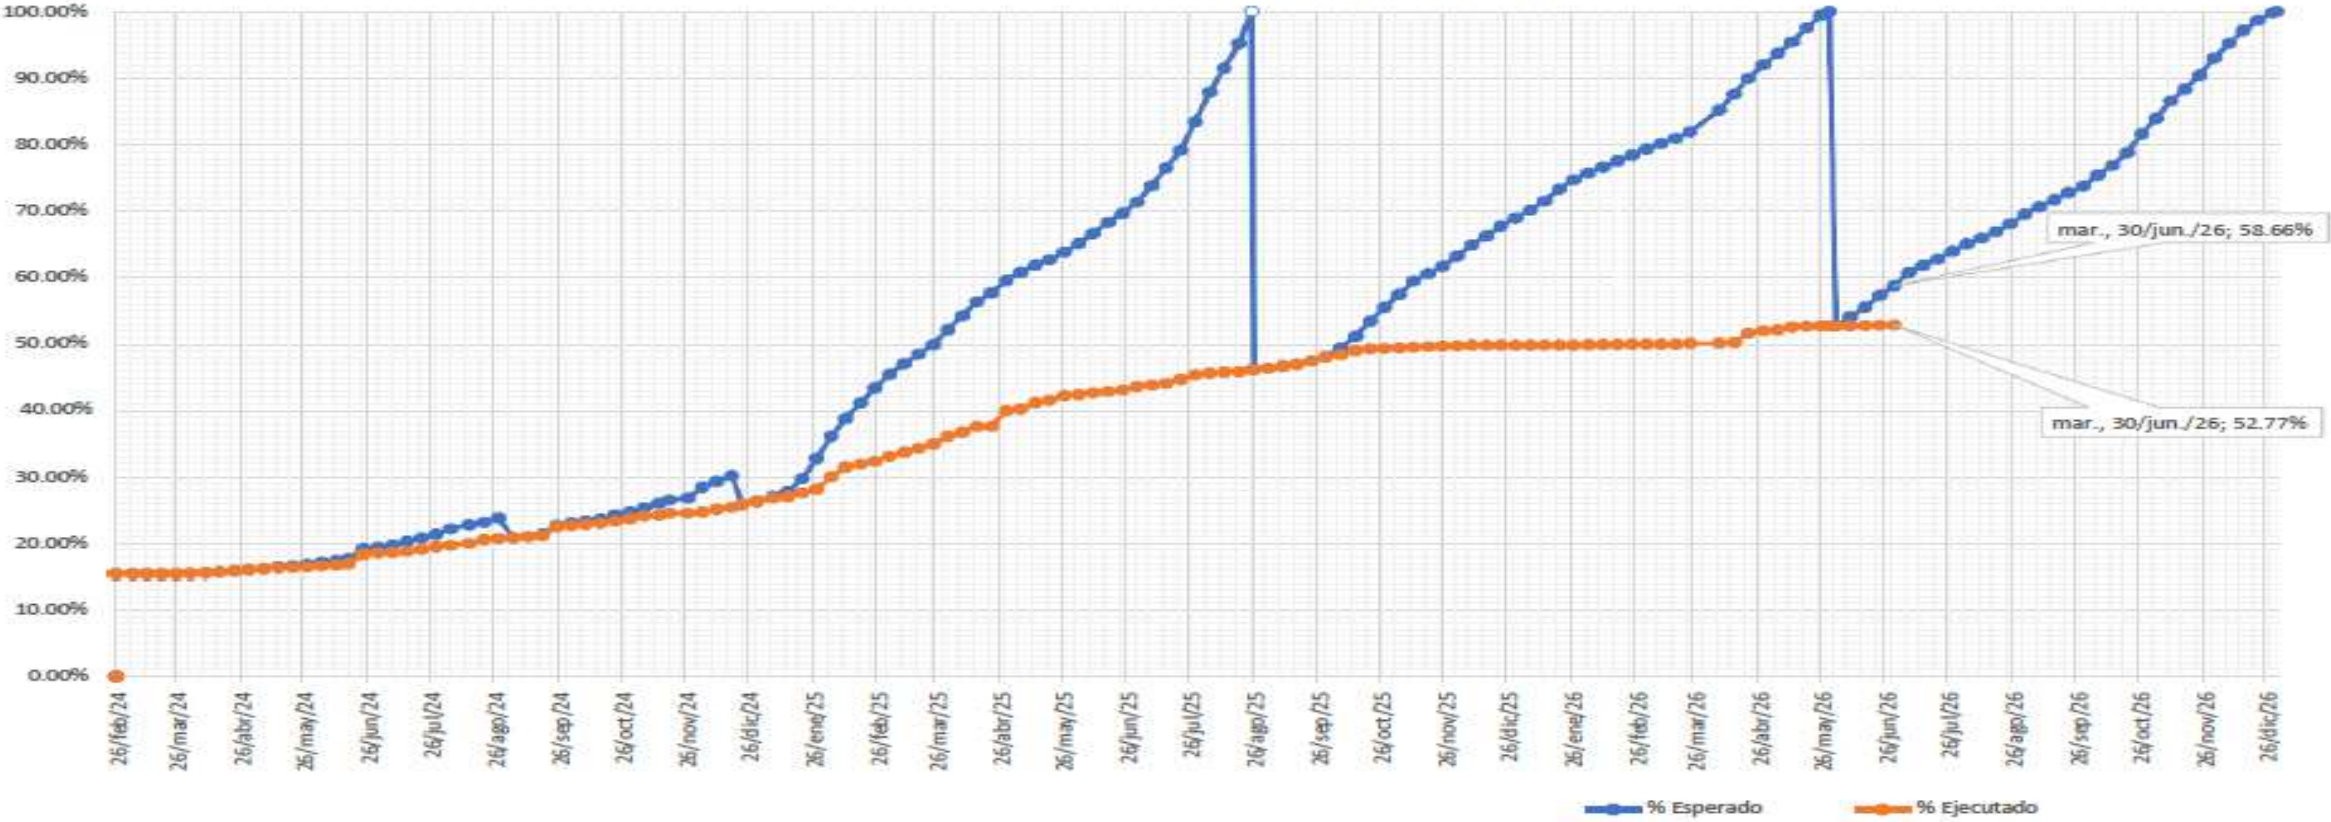

Avance Esperado	58.66%	Estado: Retrasado 3.00 Semanas
Avance Observado	52.77%	
Desviación	-5.89%	

PORCENTAJE AVANCE OBRA DESGLOSADO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	%_ Esperado	%_ Ejecutado	% Desviación	%_ Semana Ant
REPROGRAMACIÓN GENERAL H_TUNAL_20-08-2025	vie 20/05/22	jue 31/12/26	1486.08 días	58.66%	52.77%	-5.89%	51,53%
Fase I ESTUDIOS Y DISEÑOS	vie 20/05/22	mié 31/07/24	714.93 días	100.00%	100.00%	0.00%	100,00%
FASE II CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN	vie 20/05/22	jue 31/12/26	1486.08 días	51.90%	48.63%	-3.27%	47,01%
PROGRAMACIÓN_FASE II DE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TUNAL	vie 20/05/22	jue 31/12/26	1486.08 días	69.95%	65.60%	-4.35%	63,41%
PROGRAMACIÓN FASE II DE DOTACIÓN EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	vie 1/05/26	jue 31/12/26	203.65 días	0.90%	0.51%	-0.40%	0,51%
PROGRAMACIÓN FASE II DE DOTACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO	vie 18/09/26	jue 31/12/26	87.85 días			0.00%	0,00%
PROGRAMACIÓN FASE II SUMINISTRO DOTACIÓN EQUIPO BIOMEDICO - MOBILIARIO FUO - MOBILIARIO NO FUO Y TICS)	sáb 30/09/23	sáb 21/11/26	1008.68 días	81.42%	63.97%	-17.45%	63,97%
COMPRA EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	lun 5/08/24	sáb 21/11/26	733.61 días	72.97%	72.97%	0.00%	72,97%
Fase II. ALISTAMIENTO	mar 15/09/26	mié 30/12/26	90 días			0.00%	0,00%
Fin						0.00%	0,00%

AVANCE FINANCIERO DOTACION

Valores tomados de Acta 42	Valores Totales	Valores de Reembolsos	%
AVANCE FINANCIERO DOTACIÓN	\$ 35,052,062,678	\$ 12,649,326,562	36.09%
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	\$ 16,515,475,678	\$ 7,646,886,358	46.30%
EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO	\$ 18,536,587,000	\$ 5,002,440,204	26.99%
DOTACIÓN Equipos Biomedicos	\$ 13,085,717,484	\$ 2,522,061,125	19.27%
MOBILIARIO NO FUO	\$ 3,063,210,212	\$ 1,286,549,375	42.00%
MOBILIARIO FUO			
EQUIPOS TICS	\$ 2,387,659,409	\$ 1,193,829,704	50.00%

COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA O CAPITULO CONSTRUCCION

AVANCE CRONOGRAMA 30 DE JUNIO DEL 2026

AVANCE PROGRAMACION PROJECT

65.60%

AVANCE ACTA PARCIAL No. 43 DEL 24 DE JUNIO DEL 2026

VALOR CAPITULO CONSTRUCCION	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 43
\$51.405.869.420.63	\$ 34.634.799.313,61

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA FINANCIERO

67.40%

PRIMER PLANO OBRA SEMANA 94



REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

AVANCE GRÁFICO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL - CONSORCIO HOSPITAL



PISO 2. Avance estructura Drywall

AVANCE GRÁFICO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL - CONSORCIO HOSPITAL



PISO 2. Avance estructura Drywall

AVANCE GRÁFICO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL - CONSORCIO HOSPITAL



PISO 4. Avance mampostería fachada

AVANCE GRÁFICO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL - CONSORCIO HOSPITAL



PISO 5. Avance mampostería fachada

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST




REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST




GESTIÓN SOCIAL

1. Recepción hojas de vida
2. Plan de Gestión Social PGS
3. Programa de contratación de población vulnerable

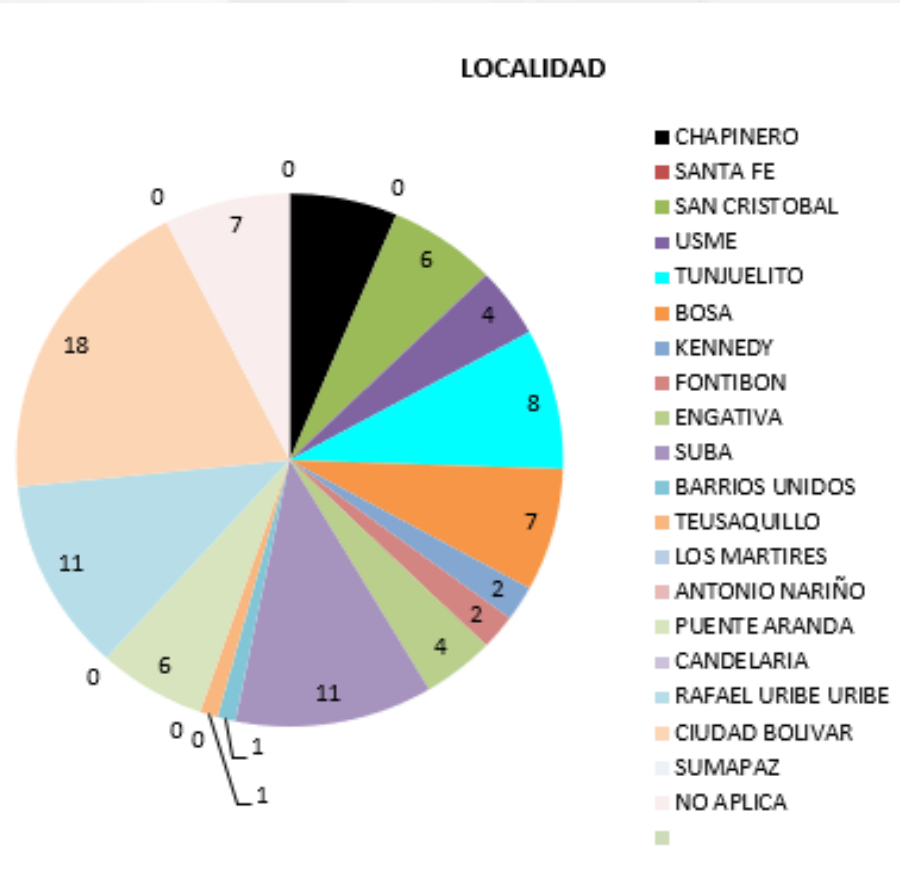

LOCALIDAD	CANTIDAD
USAQUEN	0
CHAPINERO	6
SANTA FE	0
SAN CRISTOBAL	6
USME	4
TUNJUELITO	8
BOSA	7
KENNEDY	2
FONTIBON	2
ENGATIVA	4
SUBA	11
BARRIOS UNIDOS	1
TEUSAQUILLO	1
LOS MARTIRES	0
ANTONIO NARIÑO	0
PUENTE ARANDA	6
CANDELARIA	0
RAFAEL URIBE URIBE	11
CIUDAD BOLIVAR	18
SUMAPAZ	0
NO APLICA	7

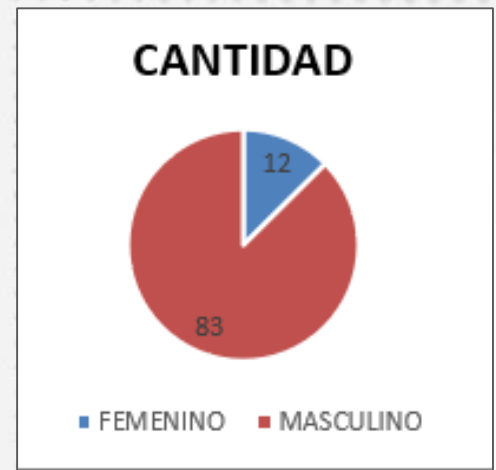

GESTIÓN SOCIAL

**PERSONAL
ACTIVO**

**OPERATIVO
CONSORCIO 11
PERSONAS**

**ADMINISTRATIVO
CONSORCIO
HOSPITAL 11
PERSONAS**

**ADMINISTRATIVO
INTERVENTORIA 5
PERSONAS**

HVAC 4 PERSONAS

**GOMEZ
GRANADOS 13
PERSONAS**

ARM 35 PERSONAS

**SEGURIDAD 4
PERSONAS**

RECOMENDACIONES PARA VISITANTES

1. Ropa cómoda y zapatos antideslizantes, por seguridad no se autoriza el ingreso de personas que usen tacones o camiseta.
2. La obra realiza préstamo de cascos de seguridad.
3. Recuerde realizar el recorrido con la persona designada del proyecto, acate las recomendaciones realizadas por el profesional SST durante el recorrido y solo transite en los senderos peatonales autorizados.
4. Los recorridos deben ser planeados y confirmados con al menos 8 días de anticipación

EN LA **SUBRED SUR** SOMOS:



 **CORAZÓN
BIENESTAR**



SECRETARÍA DE
SALUD

