

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – “INVIAS”
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 732 DE 2020

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.**

MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATO DE OBRA LP – 085 -2020



IFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 08

PERIODO DEL 01 al 30 DE ABRIL DE 2021

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ELABORÓ	REVISÓ
	
ING ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ	JORGE ISSAC VELASQUEZ VARGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

**Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C**

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-
FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

INFORME MENSUAL NO. 8

MES O PERIODO: ABRIL 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	INTRODUCCIÓN			X	6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			X	8
2.1	Localización			X	8
2.2	Inventario y estado inicial de la vía			X	10
2.3	Características técnicas del proyecto			X	10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			X	12
3.1	Información general del contrato			X	12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes			X	12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	16
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA			X	18
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		45
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		47
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		49
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		51
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		53
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		55
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		58
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		60
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		62
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		65
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra			X	20
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		N/A	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		68
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		73
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			X	22
5.1	Información general del contrato			X	22
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			X	22
5.3	Informes especialistas			X	22

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciociuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201

Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	22
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	22
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			X	23
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		82
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		84
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		86
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		88
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		90
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		93
6.7	Otros documentos seguimiento mensual			N/A	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		N/A	
7	Conclusiones y recomendaciones			X	25
8	Anexos		X		26
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		27
8.2	Registro fotográfico		X		27
8.3	Bitácora de obra		X		33
8.4	Video del avance de las obras			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
Localización.....	7
Estado inicial de la Vía.....	9
Características Técnicas del Proyecto	10
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
3.1 Información general del contrato de obra.....	12
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.....	13
3.3 Seguimiento ítems no previstos	15
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.....	15
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	17
4.1 Resumen mensual estado general del proyecto.....	17
4.2 Maquinaria y equipo del contrato.....	17
4.3 Personal del contrato de obra	17
4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra	17
4.5 Estado general del tiempo.....	17
4.6 Resumen ensayos de laboratorio	17
4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra.....	18
4.8 Informe avance físico financiero	18
4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra	18
4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra	18
4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra.....	18
4.12 Seguimiento a la programación de obra.....	18

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

4.13	Seguimiento programa de inversiones	19
4.14	Actas comité de obra.....	19
4.15	Acta reunión.....	19
4.16	Informe semanal	19
5.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	20
5.1	Información general del contrato de interventoría.....	20
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor.....	212
5.3	Informes especialistas.....	212
5.4	Informe del programa anual de caja – PAC.....	212
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	223
6.1	Equipo contrato de interventoría.....	223
6.2	Personal contrato de interventoría.....	223
6.3	Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría	223
6.4	Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría	223
6.5	Seguimiento garantías contrato interventoría	223
6.6	Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría	234
6.7	Seguimiento a la inversión del anticipo.....	234
7.	RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	245
8.	ANEXOS.....	256
8.1	Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido.	256
8.2	Registro fotográfico y video del avance de obras.	267
8.3	Bitácora de obra.....	323

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y tránsito de la población rural del municipio de Colosó Sucre, realizando el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria sector vereda Calle Larga, a fin de proporcionar entornos más apropiados para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de este sector. El municipio de Colosó ha adelantado otros proyectos de este tipo, lo que le permite formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión a fin de ser financiado con recursos del sistema general de regalías-OCAD Paz.

El Instituto Nacional de Vías “INVIAS” a través de la Subdirección de red terciaria férrea, mediante el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.CMA-DO-SRT-010-2020, adjudicó por la Resolución Número 988 del 21 de abril de 2020 al CONSORCIO CIU TERCIARIA, el Contrato No. 732 de 2020 por valor de \$685.270.884 IVA incluido, con Acta de Iniciación a partir del 1° de octubre de 2020. El Objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Por Licitación Pública No. LP – 003 - 2020 el Municipio de Colosó Sucre, adjudicó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO el contrato de Obra No. LP –085 - 2020, por valor de \$1.055.799.942,50 IVA incluido. El Objeto del Contrato es: **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE”**, con acta de Iniciación a partir del 10 de septiembre de 2020. La terminación del contrato de obra está prevista inicialmente para el día 8 de abril del 2021.

El presente documento hace referencia al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°8 correspondiente al periodo del mes de ABRIL del 2021, ha sido elaborado por el CONSORCIO CIU TERCIARIA, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías haciendo una descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la interventoría.

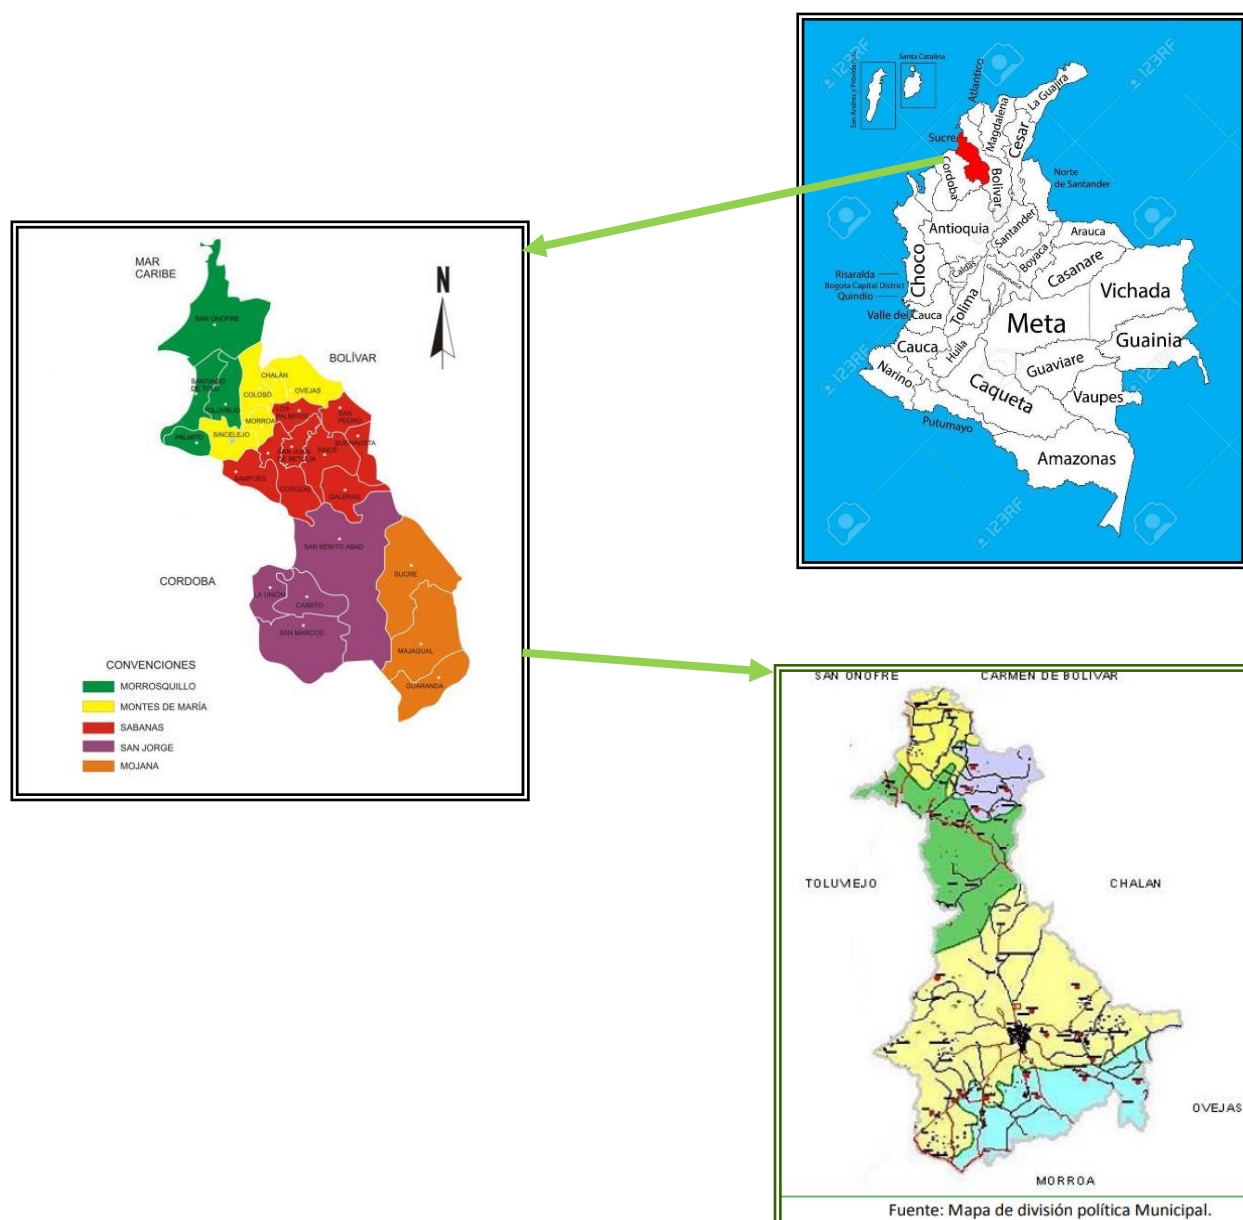
CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de **Colosó, Sucre**, siendo el municipio en extensión territorial del Departamento el puesto número 23.



Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciociuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201

Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la posición astronómica de Colosó está comprendida entre 9° 35' de latitud Norte, 9° 26' de latitud sur; 75° 22' longitud este y 75° 25' longitud oeste, su posición geográfica le sitúa al Noreste del departamento de Sucre, altitud 133 m.s.n.m, superficie aproximada de 127 km², -el 1,20% del área total del departamento de Sucre,- y población promedio de 6.031 habitantes (censo de 2.018).

El municipio de Colosó fue poblado y fundado inicialmente por el Cacique Onné Colosó, de la tribu descendía de los finzenúes, que era el amo y señor de las tierras que hoy comprenden los municipios de Colosó y Chalán, y, mantuvo sus dominios en continuas guerras con sus vecinos los caciques Yumal y Yoney, a quienes venció.

Con el hoy vecino municipio de Chalán, Colosó hizo parte del municipio de Ricaurte, antiguo San Miguel de Colosó. La cabecera municipal no era estable, ya que se disputaba entre ambas localidades la administración de la municipalidad.

A pocos años de crearse el Departamento de Sucre, Colosó se agregó de Ricaurte, formando un municipio aparte por medio de una ordenanza del recién creado departamento, lo cual ocasionó que el nombre del municipio volviera a ser formalmente Colosó, aunque en algunos documentos oficiales aparece en entre paréntesis el nombre anterior de la municipalidad, Ricaurte, y en otros aparece el nombre dado por los españoles, San Miguel de Colosó.

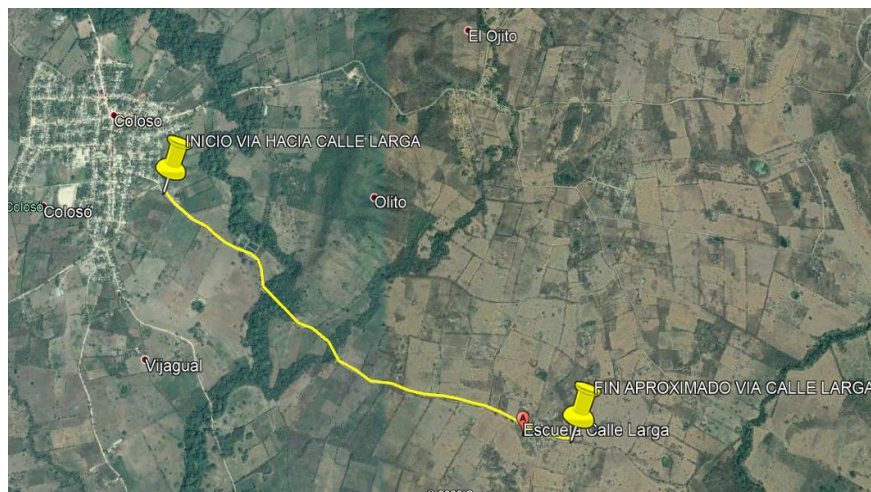


Figura. 2 Localización Vía Vereda Calle Larga

Fuente: Google Earth

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciociuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201

Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

Estado inicial de la Vía

El estado actual de la vía que conduce hacia la vereda Calle Larga, -sitio donde se ejecutará el contrato de obra N° 085 de 2020 con objeto a MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE-, se puede catalogar regular, en términos generales, los tramos a trabajar forman parte de un corredor vial comprendido de un total de 2.850 metros, que desde la salida del municipio conduce hacia la vereda Calle Larga, a continuación, el cuadro ilustra la reubicación de los tramos, -teniendo la distribución proyectada por el municipio versus ubicación real, una vez se precisó la ubicación definitiva de los tramos según las necesidades reales de construcción-.

TRAMOS INICIALES				TRAMOS REUBICADOS			
	INICIO	FIN	DISTANCIA		INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+000	K0+296	296	TRAMO 1	K0+196	K0+494	298
TRAMO 2	K0+531	K0+817	286	TRAMO 2	K1+060	K1+132	72
TRAMO 3	K1+480	K1+580	100	TRAMO 3	K1+225	K1+565	340
TRAMO 4	K2+102	K2+700	598	TRAMO 3"	K1+595	K1+665	70
				TRAMO 4	K2+550	K3+050	500
		TOTAL	1280			TOTAL	1280

Los tramos reubicados,-según se muestra en el cuadro anterior-, presentan dificultades de movilidad debido a cárcavas y/o perdida de finos, su topografía es plana, esta vía está en subrasante natural, su nivel es aproximadamente el de las fincas colindantes, esto genera al corredor vial permanecer encharcado en época de invierno, dificultando el tránsito vehicular de todo tipo; la vía cuenta con su sistema natural de escorrentía de aguas, no tiene obras de drenaje, además su mantenimiento es bajo, conllevando que los ciudadanos no cuenten con una vía que les permita movilizarse con tiempos razonables de viaje y con la seguridad adecuada, lo incrementa los fletes ocasionando pérdidas para los transportadores y usuarios.

La obra que se pretende adelantar se ha definido con base a una inspección preliminar y un estudio adelantado por la Alcaldía de Colosó Sucre, tendiente a mejorar los tramos considerados como críticos.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

Características Técnicas del Proyecto

Se realizará la construcción de placa huella la cual permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural del municipio, al disponer de infraestructura mejorada para tal fin. Se considera la realización de una serie de estudios y diseños relacionados con la ingeniería, específicamente, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, que servirán para determinar las obras necesarias para la atención de puntos críticos, la sostenibilidad integral de las obras y su duración en el tiempo. En cuanto al diseño de las obras de la superficie de rodadura, el INVIAS cuenta con un documento que incluye parámetros sobre dimensiones, materiales, procedimiento constructivo, calidad y medición

- El levantamiento topográfico esta georreferenciado mediante sistema de posicionamiento global (GPS), referenciado al sistema MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional – Sistema de Referenciación para las Américas), que es el datum oficial de Colombia, pudiéndose marcar un inicio y el fin del tramo a intervenir.
- Estudio de suelos, se identificó la calidad del suelo mediante sondeos y extracciones inalteradas, determinando mediante ensayos de CBR la capacidad de soporte de la rasante.
- El manejo de drenaje para este tipo de placa huella, se llevará a cabo mediante dos cunetas, ubicadas cada una de estas en sus extremos. Así mismo, estará compuesta por 2 losas de concreto reforzado, de 0,90 m de ancho y dos franjas de concreto ciclópeo de 0,45 m. contiguos a las cunetas y una franja central de 0.90 también de ciclópeo. Esta conformación permitirá la circulación de vehículos en un sentido.
- Los espesores y refuerzo de la placa se regirán a los parámetros descritos en el anterior prototipo, 15 cm., el diseño de la mezcla será el aprobado por esta interventoría.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

La vía a pavimentar comunica con el sector llamado Calle Larga, además de las obras de pavimentación se construirá un box –coulvert sección 1.0 m * 1.0 m en la abscisa K 1 + 950, obras requeridas para avanzar en obras de pavimentación tipo placa huella, para de esta manera la Alcaldía de Colosó Sucre, garantice la intercomunicación vial con este sector rural del municipio.

Para la protección total de la obra se requiere realizar entre otras las siguientes actividades:

- * Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra, señalización temporal de obra de acuerdo con la normatividad vigente.
- * Elaboración, actualización y ajuste del documento PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales).
- * Vías de acceso, campamento, puesto de control, zonas de depósito, almacén, infraestructura y equipo necesarios para y durante la realización de las obras.
- * Socialización de los trabajos.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato de obra

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Contratista	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Contrato No.	LP - 085 -2020
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Fecha de inicio	10 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reinicio N°1	N/A
Fecha de Suspensión N°2	N/A
Fecha de Reinicio N°2	N/A
Adicional No. 1	N/A
Fecha de Vencimiento reprogramada	8 de abril de 2021
Plazo inicial	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de terminación actualizada	24 de mayo de 2021
Valor Total Contrato (Incluido IVA)	\$ 1.055.799.942,50
Residente de Obra	JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Director de Obra	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA

Tabla 1. Datos Generales Contratista obra

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes OBRA

Durante el mes de abril, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Excavaciones varias sin clasificar, en el tramo 3 de la vía.
- Instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, placa, cunetas y bordillos en el tramo 3.
- Fundición de concreto Clase D, con resistencia de 21 MPa para losas, para el tramo 3.
- Fundición de concreto clase D, con resistencia de 21 MPa para vigas riostras en el tramo 3.
- Fundición de concreto ciclópeo clase G, con resistencia de 14MPa, en el tramo 3.
- Fundición de concreto clase D, para cunetas y bordillos en el tramo N° 4.
- Transporte de materiales para la construcción del box-culvert contemplado en el contrato.
- Actividades preliminares en el tramo 2, preparación de la vía para la instalación de material granular de subbase.

En el mes de abril se presenta un porcentaje de avance de obra ejecutada del 46.65%. De acuerdo con la programación de obra a la fecha inicial de finalización del contrato, entregada por el consorcio constructor, el contratista presenta un retraso del 53.35%.

Debido al plazo de prórroga por término de 45 días adicionales a partir de la fecha de finalización del contrato, la interventoría ha solicitado al contratista entregar la nueva reprogramación de los trabajos, con plan de contingencia y flujo de caja semanal de las obras, teniendo en cuenta el tiempo de prórroga aprobado por la Alcaldía de Colosó, con el fin, de que, la interventoría pueda realizar el seguimiento y control de la inversión y las actividades de obras del contrato de referencia.

Hasta el mes de abril, el contratista ha ejecutado a través de las diferentes actividades 500 metros del tramo 4, de los cuales, 300 ml están contruidos con bordillos y cunetas, por lo que faltarían 200 metros lineales para bordillos y cunetas y aproximadamente 80 metros lineales de placa huella en el tramo 3 y 70 metros lineales de placa huella en el tramo 3" de la vía.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

TRAMOS	LONGITUD (m)	% EJECUCIÓN
TRAMO N°1	298 ml	0,0
TRAMO N°2	72 ml	0,0
TRAMO N°3	340 ml	30%
TRAMO N°3''	70 ml	93%
TRAMO N°4	500 ml	92%

Tabla 2. Porcentaje de ejecución por tramos

En la tabla 3 se puede observar a detalle la ubicación de los boxcoulvet y el porcentaje de ejecución.

ESTRUCTURA DE DRENAJE	UBICACIÓN	% EJECUCION
Boxcoulvert N°1	K1+950	0,0

Tabla 3. Porcentaje de ejecución por alcantarillas

A continuación, en la tabla 4 se observan con cada una de las actividades contratadas y a su vez el porcentaje de avance hasta el mes de abril.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ABRIL		AVANCE	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE
1	CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT								
1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	25.60	\$ 26,127.00	\$ 668,851.20	0.00	\$ -	0.00	0%
1.2	Relleno para estructuras con suelo	m3	8.40	\$ 46,897.00	\$ 393,934.80	0.00	\$ -	0.00	0%
1.3	Concreto clase D (f'c = 21 Mpa)	m3	17.50	\$ 491,409.00	\$ 8,599,657.50	0.00	\$ -	0.00	0%
1.4	Concreto clase F (f'c = 14 Mpa)	m3	1.40	\$ 402,347.00	\$ 563,285.80	0.00	\$ -	0.00	0%
1.5	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2)	kg	1,565.00	\$ 4,879.00	\$ 7,635,635.00	0.00	\$ -	0.00	0%
SUBTOTAL					\$ 17,861,364.30	SUBTOTAL	\$ -		
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230.40	\$ 26,127.00	\$ 6,019,660.80	146.85	\$ 3,836,749.95	146.85	64%
2.2	Subbase Granular Clase C	m3	960.00	\$ 114,944.00	\$ 110,346,240.00	487.5	\$ 56,035,200.00	487.50	51%
2.3	Concreto Hidráulico para Placa Huella (f'c = 21Mpa)	m3	652.80	\$ 570,922.00	\$ 372,697,881.60	240.06	\$ 137,055,535.32	240.06	37%
2.4	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella	m3	320.00	\$ 330,557.00	\$ 105,778,240.00	171.36	\$ 56,644,247.52	171.36	54%
2.5	Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	281.60	\$ 487,978.00	\$ 137,414,604.80	226.926	\$ 110,734,895.63	226.93	81%
2.6	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2)	kg	51,072.00	\$ 4,879.00	\$ 249,180,288.00	26280	\$ 128,220,120.00	26,280.00	51%
2.7	Sello Asfáltico para Juntas	m	13,658.00	\$ 2,301.00	\$ 31,427,058.00	0.00	\$ -	0.00	0%
SUBTOTAL					\$ 1,012,863,973.20	SUBTOTAL	\$ 492,526,748.42		
TOTAL					\$ 1,030,725,337.50	\$	492,526,748.42		

Tabla 4. Avance de obra por ítem contratado.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

INTERVENTORIA

- La interventoría realiza control, seguimiento y acompañamiento a todas las actividades que se ejecutan en obra y de índole administrativa.
- A través de su personal profesional realizó visita al lugar de las obras, con inspectora social e inspectora de salud y seguridad en el trabajo, verificando el cumplimiento de protocolo de bioseguridad para mitigar la propagación del virus COVID- 19, uso de elementos de protección personal, cumplimiento con botiquín de primeros auxilios, cumplimiento de pago de aportes sociales, afiliación del personal vinculado a obra y PQRSF de la comunidad aledaña a las obras.
- La interventoría solicitó al contratista aplicar en campo, los tips constructivos constituidos en el procedimiento técnico presentado por el contratista a la interventoría, acerca del diseño y construcción de las placas huellas en los sectores curvos del eje vial.
- Interventoría solicitó al contratista afiliar a pago social a todo el personal vinculado a la ejecución de las obras.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

No aplica, ya que aún no se tienen ítems no previstos para tramitar.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el mes de abril, el avance físico acumulado de las obras del contrato en referencia es de 46.65%. Según la programación, entregada por el contratista y el flujo de caja, para la fecha, el avance programado sería de 100%, lo que indica un retraso total en las obras de aproximadamente 53.35%. La interventoría solicitó al contratista, entregar reprogramación de las obras, plan de contingencia y flujo de caja semanal de las obras, para realizar el control y verificación correspondiente de la inversión en obra ejecutada y su porcentaje de avance a lo largo del plazo de 45 días adicional solicitado por el CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ y aprobado por el ene contratante, Alcaldía Municipal de Colosó – Sucre.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

En reunión realizada el día 23 de abril de 2021, con la participación del ingeniero Luis Miguel Gonzales Ozuna, supervisor INVIAS de contrato de interventoría, ingeniero Álvaro García, residente de interventoría, Liliana Flarín, coordinadora de interventoría, señora Yina Caro Cohen inspectora SST por parte de interventoría, señora Carmen Montaña inspectora social por parte de interventoría e ingeniero Martín Martínez, especialista ambiental por parte de interventoría se lleva a cabo reunión en la cual se expuso el estado de avance actual del contrato de referencia; en el desarrollo de la reunión se informó al supervisor del contrato ingeniero Luis Miguel González Ozuna del Instituto Nacional de Vías, de la prórroga concedida por el ente contratante al consorcio contratista por término de 45 días, de igual forma se dejó en claro la actualización de las pólizas del consorcio contratista para poder seguir ejecutando el contrato; se notificó también que el contratista a la fecha de la reunión avanzó aproximadamente 500 metros lineales de placa y huella y no ha registrado ningún avance en la construcción del box-culvert. Se informó al supervisor del contrato de interventoría de la fecha de vencimiento actual de contrato, teniendo en cuenta el plazo adicional de 45 días aprobado por el ente contratante; así como, que el contratista no ha entregado información de reprogramación de obras y flujo de caja, de acuerdo a este mismo plazo adicional, así como, que al contratista se le giró el 30% de anticipo, correspondiente a aproximadamente \$117,000,000. La interventoría en aras de mantener informado a INVIAS, continuará con el seguimiento y control de los trabajos e inversión en las obras de pavimentación del contrato de referencia.

En reunión realizada el día 30 de abril de 2020, con la participación del ingeniero Álvaro García, residente de interventoría, ingeniero William Gutiérrez gestor de INVIAS, Jorge Velásquez, Director de interventoría; y Luis Miguel González Ozuna, supervisor del contrato de interventoría y coordinador INVIAS, se aclararon dudas e inquietudes y se informó del avance presentado en obra del contrato, y de la revisión del balance de obra, el cual interventoría hará llegar al ingeniero Luis Gonzales Ozuna.

La interventoría continuará con el seguimiento y control de las actividades ejecutadas en obra, con la finalidad de que se realicen de manera correcta, cumpliendo los diseños entregados por el contratista y calidad exigida por el Instituto Nacional de Vías.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 1**

4.2 Maquinaria y equipo del contrato

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 2**

4.3 Personal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 3**

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 4**

4.5 Estado general del tiempo

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 5.**

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se presenta el resumen ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 6**

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se presenta el control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 7**

4.8 Informe avance físico financiero

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 se presenta el informe avance físico-financiero del contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 8**

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 se presenta el seguimiento garantías y seguros contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 9**

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 se presenta el seguimiento plan de calidad contrato de obra durante el periodo 01 de abril al 31 de abril de 2021. **Ver anexo 10**

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra

El contratista y contratante pactaron en las cláusulas contractuales, un primer desembolso en calidad de anticipo, a la fecha de este informe se desembolsó el 30% del valor total, que corresponde a \$117,412,221.

4.12 Seguimiento a la programación de obra

La interventoría ha solicitado al contratista la entrega de información con la nueva reprogramación de las obras y flujo de caja semanal, considerando el plazo adicional de 45 días aprobado por el ente contratante, Alcaldía de Chalán; sin embargo, a la fecha de este informe, el contratista no ha allegado lo requerido a la interventoría.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

4.13 Seguimiento programa de inversiones

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

4.14 Actas comité de obra

N/A (Para este mes no se realizaron actas de comité de obra). **Ver anexo 11**

4.15 Acta reunión

Se llevó a cabo reunión virtual el día 23 de abril de 2021, con el fin de aclarar y solucionar las dudas que se han presentado durante la obra, en el lugar de las obras y con el contratista. La interventoría, le informa al supervisor del contrato por parte de INVIAS, ingeniero Luis Miguel González de la fecha de terminación actualizada del contrato, teniendo en cuenta el plazo de prórroga concedido por la Alcaldía de Colosó Sucre. Se levantó acta con los detalles y observaciones de la reunión. **Ver anexo 11**

El día 30 de abril de 2021, se realizó reunión virtual, con la finalidad de aclarar dudas e inquietudes presentadas en la ejecución de la obra e informar al supervisor del contrato de interventoría, ingeniero Luis Miguel González Ozuna del estado actual de las obras. Se levantó acta con detalles y observaciones de la reunión. **Ver anexo 11**

4.16 Informe semanal

En el formato MSE-FR-21 se presentan los informes semanales durante el periodo de 01 de abril al 30 de abril de 2021. **Ver anexo 12**

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Interventoría	CONSORCIO CIU TERCIARIA
Contrato	732 de 2020
Objeto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°1 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°2 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°3 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reanudación	N/A
Plazo inicial	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación actualizada	31 de diciembre de 2020
Prorroga No. 1	Tres (3) meses
Prorroga No. 2	Tres (3) meses
Fecha terminación actualizada	30 de junio de 2021
Valor Total Contrato	\$ 685.270.884
Residente de Interventoría	ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ
Director de Interventoría	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Tabla 3. Datos Generales Interventoría

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciociuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201

Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

La interventoría solicitó al contratista con carácter urgente, allegar reprogramación de las obras, flujo de caja semanal de las obras, teniendo en cuenta el plazo adicional de 45 días concedido por la alcaldía de Colosó; con el fin de realizar el control correspondiente y poder verificar y reportar el avance de los trabajos del contrato de referencia.

Mediante circular 03, con fecha 20 de abril de 2021, la interventoría solicitó al contratista, que todos los trabajadores que estén vinculados a la ejecución de obras, deben estar afiliados a seguridad social, para lo cual deben adjuntar la planilla donde se evidencie estas afiliaciones, con el fin de evitar posibles sanciones; esto, debido a que la interventoría a través de su personal profesional inspectora de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspector Social, han constatado en obra, que existe un número de trabajadores que se encuentran laborando en el lugar de ejecución de los trabajos, pero no se encuentran vinculados en los pagos de las planillas presentadas a esta interventoría.

Mediante OFICIO N° 240 2021 CIU/COLOSÓ, con fecha 26 de abril de 2021, la interventoría le comunica al CONSORCIO PLACA HUALLA COLOSÓ R/L GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA, que una vez revisado el procedimiento técnico de anclaje de acero remitido por el contratista a la interventoría, encuentra tal procedimiento ajustado a las hipótesis de diseño y construcción de placas huella el procedimiento constructivo presentado para la construcción y desarrollo de las losas de concreto en los sectores curvos del eje vial; por lo que la interventoría le solicita al consorcio contratista aplicar en campo, los tips constructivos que constituyen el proceso técnico presentado.

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo del presente se requirió el concepto del especialista ambiental; el cual ha realizado actividades de control y seguimiento a la parte ambiental del contrato. La información del profesional se relaciona en los semanales del mes. Ver anexo 12

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se registra los informes semanales durante el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2021. **Ver anexo 13**

6.2 Personal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2021. **Ver anexo 14**

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2021.
Ver anexo 15

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se registra el control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría durante el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2021. **Ver anexo 16**

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 se registra el seguimiento garantías contrato Interventoría del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2021. **Ver anexo 17**

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 se registra el seguimiento al plan de calidad contrato de Interventoría durante el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2021.

Ver anexo 18

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría no tiene anticipo).

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el desarrollo de las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría, se recomienda:

1. Realizar los ensayos de resistencia a compresión del concreto instalado en la placa huella y allegar los resultados a la interventoría, con el fin de verificarlos y tal que cumplan con la resistencia, de acuerdo con los diseños de mezcla entregados por el contratista y aprobados por la interventoría.
2. Interventoría posterior a la revisión del procedimiento técnico constructivo del anclaje de acero en los sectores curvos del eje vial de construcción de las obras del contrato de referencia, remitido por el contratista; y al encontrar ajustado a las hipótesis de diseño y construcción de las placas huella el procedimiento constructivo presentado, solicita al consorcio contratista aplicar en campo los tips constructivos que constituyen el procedimiento técnico presentado.
3. La interventoría le solicita al contratista realizar el pago de seguridad social de todos los trabajadores vinculados a la ejecución de las obras, para dar cumplimiento a la ley 828 de 2003.
4. La interventoría solicita al contratista entregar con carácter urgente la reprogramación de las obras, y flujo de caja semanal de los trabajos, teniendo en cuenta el plazo adicional concedido por la Alcaldía Municipal de Colosó Sucre, por término de 45 días, con el fin de realizar el control y registrar el avance de las obras contratadas.
5. La interventoría continuará realizando control, seguimiento y acompañamiento a todas las actividades, que contribuyan al cumplimiento del contratista con sus obligaciones contractuales.
6. La interventoría continuará informando al Instituto Nacional de Vías, el estado de avance y de las acciones realizadas y a seguir en la ejecución del contrato de obra No. MM-LP-OP-085-2020.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido. **ver anexo 19**

RELACION DE LA CORRESPONDENCIA			
FECHA	ASUNTO	REMITE	DESTINO
26/04/2021	REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCESO ANCLAJE ACERO	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
20/04/2021	PLANILA SEGURIDAD SOCIAL	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONTRATISTAS OBRAS PAVIMENTACION PLACA HUELLA – PROYECTOS PDET SUCRE

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras.



1. Foto: fundición de losas en concreto de 3000 psi en el tramo 3 de la vía.



2. Foto: Instalación de acero refuerzo y encofrado para bordillo en el tramo 4 de la vía

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9



3. Foto: fundición de concreto para bordillos y cunetas en el tramo N° 4.



4. Foto: Ejecución de fundición de concreto de refuerzo 21 MPA, para placa huella en el tramo 3

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciciuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9



5. Foto: Suministro de concreto ciclópeo en el tramo 3 de la vía



6. Foto: Excavaciones varias sin clasificar para vigas riostras en el tramo 3 de la vía.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9



7. Foto: Trabajos de suministro de concreto ciclópeo, Tramo N°3.



8. Foto: Trabajos de suministro de concreto ciclópeo, Tramo N°3.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9



9. Foto: Trabajos de suministro de concreto ciclópeo, Tramo N°3.



10. Instalación acero de refuerzo para cunetas y bordillos tramo 3

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciociuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201

Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9



11. Foto: Actividades preliminares en el tramo 2, preparación de la vía para instalación de subbase granular tipo C.



12. : Actividades preliminares en el tramo 2, preparación de la vía para instalación de subbase granular tipo C.

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572



Email: consorciciuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

8.3 Bitácora de obra.

Fecha: Jueves 1 Abril 2021	
Actividad: El contratista en el día de hoy realiza excavaciones varias sin clasificar para elementos de la placa huella, como: vigas nostas, cunetas y bordillos en el banno 4 de la vía; se realiza también, instalación de acero de refuerzo para bordillos, cunetas, losas y vigas nostas. La interventoría realiza seguimiento y control a las actividades ejecutadas, tal que cumplan la calidad exigida por INVIA.	
 Fernando Silva L. Presidente Interventoría	 Carlos Baños T. Auxiliar Interventoría

CS Escaneada con CamScanner

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

57

Fecha: Viernes 2 Abril 2021

Actividad: En el día de hoy, el contratista realiza fundición de losas, en concreto de resistencia 3000 psi. Simultáneamente lleva a cabo, instalación de acero de refuerzo para losas, vigas, bordillos y cunetas en el tramo 4 de la vía. La interventoría le solicita al contratista tomar las muestras de concreto y realizar ensayo de resistencia a la compresión, con el objetivo de constatar que el concreto instalado cumpla con las especificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista.

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Baños T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Sábado 3 Abril 2021

Actividad: En el lugar de las obras se realizan actividades de instalación de acero para cunetas, bordos y bordillos, simultáneamente se realiza fundición de placas en concreto reforzado de 21 MPa, en el tramo 4 de la vía. La interventoría realiza seguimiento y acompañamiento al contratista en las actividades ejecutadas en obra y de índole administrativa.

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Baños T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Domingo 4 Abril 2021

Actividad: No se ejecutaron actividades en obra al ser un día no laboral, de acuerdo a la programación de obra entregada por el contratista.

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Baños T
Auxiliar Interventoría

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

58

Fecha: Lunes 5 Abril 2021.


Actividad: No se ejecutaron actividades en el lugar de las obras, debido al mal estado de la vía de acceso por fuertes precipitaciones en el día de hoy.



Fernando Silva L
Presidente Interventoría


Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Martes 6 Abril 2021.


Actividad: En el día de hoy no se realizaron actividades en el lugar de las obras, debido a que por fuertes precipitaciones, la vía de acceso se encuentra en un mal estado.



Fernando Silva L
Presidente Interventoría


Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Miércoles 7 Abril 2021

Actividad: No se realizaron actividades en el día de hoy, debido al mal estado de la vía de acceso a las obras, por fuertes precipitaciones.


Fernando Silva L
Presidente Interventoría


Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Jueves 8 Abril 2021

Actividad: Se ejecuta fundición de vigas roscas, cunetas y bordillos en concreto con resistencia 3000 psi, en el tramo 4 de la vía. La interventoría le solicitó al contratista realizar los ensayos correspondientes de resistencia a la compresión, del concreto instalado; asimismo, la interventoría supervisó la realización del concreto en obra, verificando que este cumpla con las especificaciones del diseño de

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

59

mezcla entregado por el contratista.

FH/21

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Barrios

Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Viernes 9 Abril 2021.

Actividad: El contratista realiza instalación de acero de refuerzo para placas en el tramo 3 de la vía; posterior a la anterior actividad, ejecuta fundición en concreto de 3000 psi, para placas en el mismo tramo de la vía.

FH/21

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Barrios

Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Sábado 10 Abril 2021.

Actividad: En el lugar de los trabajos, el contratista continúa instalando acero de refuerzo para losas en el tramo 3; simultáneamente funde placas en concreto de 21 MPa en este mismo tramo de la vía. La interventoría solicita al contratista, allegar los resultados correspondientes de ensayo resistencia a la compresión, para verificar la calidad del concreto instalado.

FH/21

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Barrios

Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría


Fecha: Domingo 11 Abril 2021


Actividad: No se ejecutaron actividades en el día de hoy, al ser un día no laboral, de acuerdo a la programación de obra entregada por el contratista.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9


60



Fernando Silva J.
Presidente Interventoría


Carlos Bonios T.
Auxiliar Interventoría

Fecha: Lunes 12 Abril 2021


Actividad: En el lugar de las obras, continúan con la ejecución de obras de pavimentación en placa-huella, en el tramo 3 de la vía, contemplado en el contrato. El contratista realiza instalación de acero de refuerzo para losas y simultáneamente fude losas en concreto clase D en el mismo tramo de la vía.



Fernando Silva J.
Presidente Interventoría


Carlos Bonios T.
Auxiliar Interventoría

Fecha: Martes 13 Abril 2021

Actividad: El contratista realiza fundición de placas en concreto ciclópeo, en concreto hidráulico y piedra rajón para el tramo 3; se lleva a cabo paralelamente fundición de losas en concreto reforzado de 3000 psi, de acuerdo a los diseños de mezcla entregados por el contratista.


Fernando Silva J.
Presidente Interventoría


Carlos Bonios T.
Auxiliar Interventoría

Fecha: Miércoles 14 Abril 2021

Actividad: El contratista realiza fundición de placas de concreto ciclópeo, en concreto hidráulico y piedra pegada en una proporción 60% y 40% respectivamente para el tramo 3 de la vía Ciénaga - Vereda Calle Larga. Simultáneamente ejecuta excavaciones varias sin clasificar para vigas rústicas, en el mismo tramo; así como fundición de placas en concreto reforzado de 3000 psi. La interventoría realiza visita a obra, hace control de las actividades ejecutadas para la

CS Escaneado con CamScanner

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciociuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201

Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

61

implementación de la vía en placa-luz, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas de los diseños entregados y aprobados, y calidad de obra exigida por INVIAS; la inspectora social es inspectora de seguridad y salud en el trabajo, realizan control de cumplimiento acerca de los temas: implementación de protocolo de bioseguridad contra la propagación del virus COVID-19, uso de elementos de protección personal, botiquín de primeros auxilios, afiliación y pago de seguridad social del personal vinculado a la obra, quejas, peticiones y/o reclamos.

F.S./R.

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Barros

Carlos Barros T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Jueves 15 Abril 2021

Actividad: Se prosigue fundiendo placas de concreto ciclópeo en concreto hidráulico y piedra pagada, en una proporción 60% y 40% respectivamente para el tramo 3 de la vía. La interventoría realiza seguimiento técnico, administrativo, social y ambiental de manera constante, en aras de cumplir con todos los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

F.S./R.

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Barros

Carlos Barros T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Viernes 16 Abril 2021

Actividad: El contratista continúa con fundición de placas en concreto reforzado de 21 MPa y concreto ciclópeo, en concreto hidráulico y piedra pagada, para el tramo 3 de la vía. La interventoría hace control de la ejecución de las actividades.

F.S./R.

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos Barros

Carlos Barros T
Auxiliar Interventoría

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

62

Fecha: Sábado 17 Abril 2021.

Actividad: En el día de hoy, se lleva a cabo en el lugar de los obras, instalación de acero de refuerzo para placas en el tamo 3 de la vía; simultáneamente, el contratista funde placas en concreto reforzado de 21 MPA para el mismo tamo.

Firma:

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Firma:

Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Domingo 18 Abril 2021

Actividad: No se ejecutaron actividades en el día de hoy, a el lugar de los trabajos, al ser un día no laboral, de acuerdo a la programación de obra entregada por el contratista.

Firma:

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Firma:

Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Lunes 19 Abril 2021

Actividad: En el lugar de los trabajos, el contratista realiza instalación de rieles en el tamo 3 de la vía para lozas; a su vez, se ejecuta instalación de acero de refuerzo para placas en el mismo tamo.

Firma:

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Firma:

Carlos Barrios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Martes 20 Abril 2021

Actividad: En el día de hoy, el contratista ejecuta actividades de fundición de lozas en concreto reforzado con resistencia de 3000 psi; a la vez, funde lozas en concreto ciclópeo en concreto hidráulico y piedra pegada, en una proporción 60% y 40% respectivamente. La interventoría a través de

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

63

de su personal profesional realiza constantes visitas a obra y acompaña al contratista en la ejecución de los procesos constructivos con el objetivo que se realicen de manera adecuada.

FH/ra

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos B

Carlos Barios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Miércoles 21 Abril 2021

Actividad: El contratista promueve con fundición de losas en concreto reforzado clase D y fundición de losas en concreto ecólipo, en el tomo 3 de la obra, vanda Calle Larga. Simultaneamente se realizan actividades de excavaciones varias sin clasificar para rigas rieblas en el mismo tomo.

FH/ra

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos B

Carlos Barios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Jueves 22 Abril 2021

Actividad: En el día de hoy se realiza fundición de losas en concreto reforzado con resistencia 3000 psi para el tomo 3 de la obra. La interventoría realiza control de las actividades ejecutadas.

FH/ra

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Carlos B

Carlos Barios T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Viernes 23 Abril 2021

Actividad: El contratista ejecuta actividad de excavaciones varias sin clasificar para cunetas y bordillos del tomo 3 de la obra. Simultaneamente se realiza instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos en el mismo tomo. La interventoría realiza control del acero instalado, tal que cumple con las especificaciones técnicas de los diseños.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

64

entregados por el contratista.

Firma

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Firma

Carlos Ramos T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Sábado 24 Abril 2021

Actividad: En el día de hoy, se ejecuta actividad de fundición de placas en concreto reforzado de 21MPA, en el tramo 3 de la vía. La interventoría le solicita al contratista la toma de cilindros de concreto, para ensayos de resistencia a la compresión.

Firma

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Firma

Carlos Ramos T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Domingo 25 Abril 2021

Actividad: No se ejecutaron actividades en el día de hoy, al ser un día no laboral de acuerdo a la programación de obra entregada por el contratista.

Firma

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Firma

Carlos Ramos T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Lunes 26 Abril 2021.

Actividad: En el día de hoy se lleva a cabo, instalación de acero de refuerzo para losas, bordillos y cunetas en el tramo 3 de la vía. Simultáneamente, el contratista funda losas en concreto clase D, en el mismo tramo de la vía.

Firma

Fernando Silva L
Presidente Interventoría

Firma

Carlos Ramos T
Auxiliar Interventoría

CS Escaneado con CamScanner

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572

Email: consorciociuterciaria@gmail.com

Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201

Bogotá D. C.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

65

Fecha: Martes 27 Abril 2021

Actividad: En el lugar de las obras, se efectúa fundición de losas en concreto de 21MPa y fundición de placas en concreto ciclópeo, en concreto hidráulico y piedra pegada en una proporción 60% y 40% respectivamente. La interventoría verifica que el concreto realizado en obra, cumpla con las dosificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista.

Fernando Silva

Fernando Silva J
Presidente Interventoría

Carlos Baños

Carlos Baños T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Miércoles 28 Abril 2021.

Actividad: El contratista inicia actividades de transporte de materiales para la construcción del box-culvert contemplado en el contrato. La interventoría a través de supervisión preliminar, verifica que las actividades se ejecuten de manera adecuada.

Fernando Silva

Fernando Silva J
Presidente Interventoría

Carlos Baños

Carlos Baños T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Jueves 29 Abril 2021.

Actividad: En el día de hoy, el contratista inicia actividades preliminares en el tramo 2, preparando la vía para la instalación de subbase granular Tipo C.

Fernando Silva

Fernando Silva J
Presidente Interventoría

Carlos Baños

Carlos Baños T
Auxiliar Interventoría

Fecha: Viernes 30 Abril 2021.

Actividad: El contratista continúa con actividades preliminares en el tramo 2 de la vía, preparándola para la instalación de material de subbase granular Tipo C. La interventoría realiza acompañamiento, seguimiento y control en los

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

66

porcos constructivos para las obras de pavimentación, con el fin de que se realicen cumpliendo las especificaciones técnicas de los diseños entregados por el contratista, y los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

F. Alva

Fernando Alva
Presidente Interventoría

Carlos Baños T

Carlos Baños T
Auxiliar Interventoría

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

VERSION

1

PÁGINA

1

DE

10

FECHA

30

(Dia)

4

(Mes)

2021

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

RED FERREA Y TERCARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

PERIODO MES:

ABRIL

CONTRATO DE OBRA No.:

LP – 085 – 2020

PLAZO INICIAL:

7 MESES

FECHA DE INICIACION:

10/09/2020

FECHA DE REANUDACION N°2:

N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 1.055.799.942,50

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.055.799.942,50

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ 117.412.221,00

PLAZO ACUMULADO:

8.5 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:

N/A

VALOR ADICIONALES:

N/A

AMORTIZACION ANTICIPO:

N/A

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA:

CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

732 DE 2020

INTERVENITOR:

CONSORCIO CIU TERCARIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	MI	1280
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	MI	500
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	0

AVANCE FINANCIERO

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)					
En el mes:	83.003.918	\$ 131.612.240	\$ -	\$ 131.612.240	1,59	\$ 69.096.129	1,000	0,52
Acumulado:	1.055.799.943	\$ 492.526.748	\$ -	\$ 492.526.748	0,47	\$ 467.580.387	1,000	0,95

Año	Valor
2020	\$ 1.055.799.942,50
Total	\$ 1.055.799.942,50

E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,47	8,00	0,94	0,50	563.273.194	0	1.055.799.943
Interventor:	0,68	8,00	0,80	2,00	217.690.497	0	217.690.497

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	10/09/2020	26/09/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/09/2020	26/09/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/09/2020	26/05/2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-
Estabilidad y Calidad de Obra	9/04/2021	8/04/2026

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

30/04/2021

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/09/2020	26/05/2021
Otros		

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

LA INTERVENTORÍA HA SOLICITADO AL ENTE CONTRATANTE INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN EMBARGO A LA FECHA , NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA DE LA ALCALDÍA DE COLOSÓ

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MEDIANTE OFICIO N° 240 CIU/COLOSÓ, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 202, LA INTERVENTORÍA LE COMUNICA AL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ, QUE, UNA VEZ REVISADO EL PROCESO TÉCNICO REMITIDO A LA INTERVENTORIA, LO ENCUENTRA AJUSTADO A LA HIPOTESIS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS PLACAS HUELLA Y LE SOLICITA APLICAR EN CAMPO LOS TIPS CONSTRUCTIVOS QUE CONSTITUYEN EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, EN LOS SECTORES CURVOS DEL EJE VIAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE REFERENCIA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA LE SOLICITÓ AL CONTRATISTA ALLEGAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS, PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL DE LAS OBRAS, DE ACUERDO AL PLAZO DE PRórROGA POR TÉRMINO DE 45 DIAS APROBADO POR EL ENTE CONTRATANTE,. QUE EMPEZó A REGIR DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 9 DE ABRIL DE 2021.

Firma

Jorge Isaac Velasquez Vargas

Director de Interventoría

Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	10

	FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA:	<u>RED Terciaria y Ferrea</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>SUCRE</u>
-------------------	-------------------------------	-------------------------------------

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		
--	--	--

MES DEL INFORME MENSUAL:	<u>ABRIL</u>	CONTRATO No. <u>LP – 085 – 2020</u>	CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ</u>
--------------------------	--------------	-------------------------------------	--

CONTRATISTA:	<u>CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO</u>	SECTOR: <u>VEREDA CALLE LARGA</u> <small>(Abcisas alcance del contrato)</small>
--------------	--------------------------------------	---

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Aspersor manual	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de ho	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Carrotanque de agua(1000 Galones)	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	
Cizalla manual de 90 cm.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp	A	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Compresor (barrido y soplado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Compresor 120 HP, con martillo.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6" (152mm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Equipo de soldadura 250 AMP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Mezcladora de concreto 1 bulto	I	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Retroexcavadora A25C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	I	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I
Volqueta 6 m3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:		
------------------------------------	--	--

CONVENCIONES:	ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Firma Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ Residente de Obra Matrícula No. :22202-242017 COR </div> <div style="text-align: center;">  Firma Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ Residente de Interventoría Matrícula No. : 13202-39368 BLV </div> </div>
---------------	---

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	3	DE	10

			FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)
--	--	--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: <u>TERCIARIA Y FERREA</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>SUCRE</u>
---	-------------------------------------

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA		
MES DEL INFORME: <u>ABRIL</u>	CONTRATO DE OBRA No. <u>LP – 085 – 2020</u>	CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ</u>
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO</u>	SECTOR: <u>VEREDA CALLE LARGA</u>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>732 DE 2020</u>	INTERVENTOR: <u>CONSORCIO CIU TERCARIA</u>	

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
TOVAR GOMEZ ALBEIRO SEGUNDO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOBIOS ROBLES WISMAN ALBERTO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MARTINEZ ADAMOR LUISA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CHAVEZ BENITEZ JEFFERSON KLAUS	AUXILIAR DE INGENIERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROMERO COLON RAFAEL ANTONIO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MERCADO CONTRERAS EDILSON YAMITH	MAESTRO DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MENDOZA MADERA FRANKLIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROBLES MONTES OSCAR SEGUNDO	ALMACENISTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PEREZ OCHOA ENARDO ANTONIO	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROBLES HERNANDEZ JUAN GABRIEL	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:	

NOTA:
 Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.


 Firma
 Nombre: **JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ**
 Residente de Obra
 Matricula No. :22202-242017 COR


 Firma
 Nombre: **ALVARO GARCIA FLOREZ**
 Residente de Interventoría
 Matricula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 4

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
			VERSIÓN			
			FECHA	5	DE	10

FECHA			30 <small>(Día)</small>	4 <small>(Mes)</small>	2021 <small>(Año)</small>
-------	--	--	----------------------------	---------------------------	------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: FERREA Y TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES DEL INFORME MENSUAL: ABRIL VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN
CARRETERA Y/O PROYECTO: EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	24	24	24	24	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	714
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lluvias intensas	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: _____


Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR


Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 6

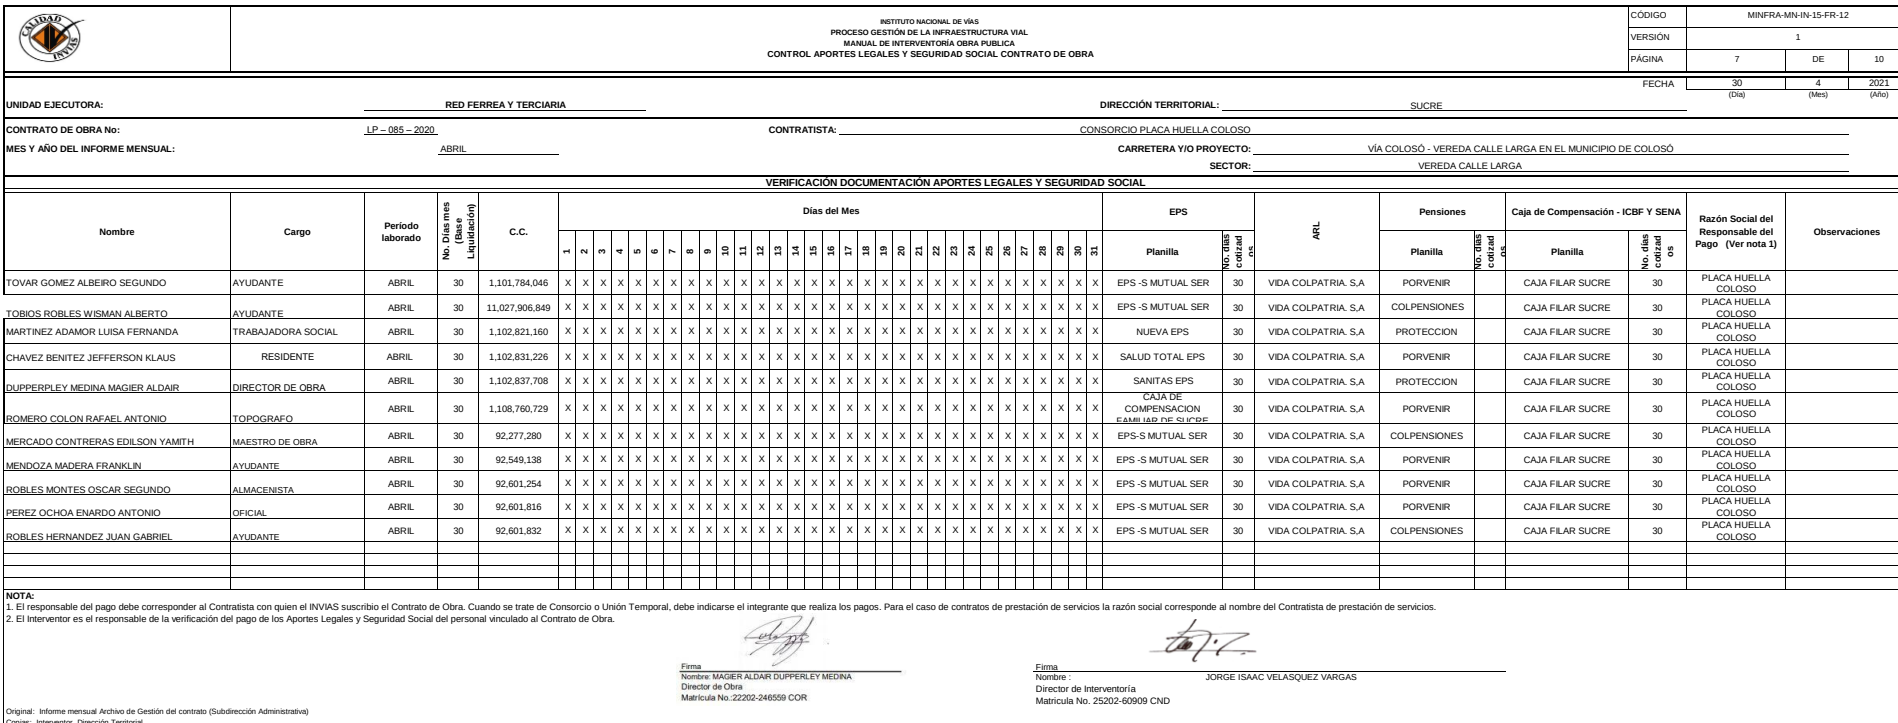
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11					
			VERSIÓN	1					
			PAGINA	6	DE	10			
			FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>RED FERREA Y TERCARIA</u>			DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>SUCRE</u>						
CONTRATO DE OBRA No: <u>LP – 085 – 2020</u>			CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ</u>						
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>ABRIL</u>			CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ</u> SECTOR: <u>VEREDA CALLE LARGA</u>						
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación /Acciones
1	23/02/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K2+910 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1933.64 PSI	SI	
2	16/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3101.86 PSI		
3	27/02/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +920 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1873.46 PSI	SI	
4	20/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3162.47 PSI		
5	2/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +870 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1845.68 PSI	SI	
6	23/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3215.49 PSI		
7	4/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +860 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1828.76 PSI	SI	
8	25/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3319.28 PSI		
1	9/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K2+820 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	2072.57 PSI	SI	
2	30/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3324.52 PSI		
3	12/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +840 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	2136.42 PSI	SI	
4	7/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3444.04 PSI		
5	16/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +790 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1933.96 PSI	SI	
6	6/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3292.67 PSI		
7	20/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K2+785 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	2045.06 PSI	SI	
8	10/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3245.49 PSI		
1	24/02/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOSTRA K2+900 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1999.32 PSI	SI	
2	17/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3245.28 PSI		
3	28/02/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOSTRA K2+850 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	2062.30 PSI	SI	
4	22/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3362.48 PSI		
5	2/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOST RA K2+810 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1861.34 PSI	SI	
6	23/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3211.91 PSI		
7	4/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOSTRA K2+760 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1971.33 PSI	SI	
8	25/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3164.78 PSI		
1	10/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOSTRA K2+710 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1981.07 PSI	SI	
2	31/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3226.94 PSI		
3	13/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	CUNETAS K2+860 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	2022.86 PSI	SI	
4	3/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3308.90 PSI		
5	17/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOSTRA K2+810 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1832.50 PSI	SI	
6	7/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3163.48 PSI		
7	21/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	BORDILLO K2+960 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1939.84 PSI	SI	
8	11/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3120.61 PSI		

 <div> <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</p> <p>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA</p> <p>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO</p> </div>					CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			
					VERSIÓN	1			
					PAGINA	6	DE	10	
					FECHA		30	4	2021
							(Día)	(Mes)	(Año)
1	23/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K2 + 740 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1833.65 PSI	SI	LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
2	13/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3052.60 PSI		
3	26/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +750 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1936.55 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
5	30/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +700 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1925.93 PSI	SI	
6	20/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3204.51 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
7	2/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA DERECHA K2 +690 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	2814.28 PSI	SI	
8	23/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3278.23 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
1	24/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOSTRA K2+680 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1902.55 PSI	SI	
2	14/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3149.24 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
3	27/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	VIGA RIOSTRA K2+640 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1944.55 PSI	SI	
4	17/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3230.17 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
5	31/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	CUNETAS K2+760 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1754.29 PSI	SI	
6	21/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3084.65 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
7	10/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	BORDILLO K2+840 (TRAMO 4)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1861.11 PSI	SI	
8	25/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3041.47 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
1	3/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K1 + 665 (TRAMO 3)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1833.65 PSI	SI	
2	24/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28 DIAS	INV-E-410-13		1	>=100% A LOS 28 DIAS	3052.60 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
3	6/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K1 + 500 (TRAMO 3)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1936.55 PSI		
5	10/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K1 +470 (TRAMO 3)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	1925.93 PSI		LOS RESULTADOS SE AJUSTAN COMO VALOR CONFIABLE DE LA RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 7 DIAS; SIN EMBARGO, EL CHEQUEO FINAL PARA LA APROBACIÓN DEL CONCRETO SERÁ CON LOS RESULTADOS A LOS 28 DIAS
7	14/04/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7 DIAS	INV-E-410-13	HUELLA IZQUIERDA K1 +420 (TRAMO 3)	1	>=55% A LOS 7 DIAS	2814.28 PSI		
OBSERVACIONES:									
NOTA:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
 Firma Nombre: MAGIER ALDAR DUPPERLEY MEDINA Director de Obra Matrícula No.: 22202-246599 COR					 Firma Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS Director de Interventoría Matrícula No.: 25202-60909 CND				
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)									
Copias: Interventor, Dirección Territorial									

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 7



CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 8

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

1

8DE2021
(Día) (Mes) (Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA DE ELABORACIÓN

3042021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

ACTA No:

8

PERIODO MES:

ABRIL

VALOR BÁSICO ACTA:

\$-

CONTRATO DE OBRA No :

LP – 085 – 2020

PLAZO INICIAL:

7 MESES

PLAZO ACUMULADO:

8.5 MESES

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIACIÓN:

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

CONTRATISTA:

CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

24 DE MAYO DE 2021

SECTOR:

VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$1.055.799.942,50

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

N/A

RUTA:

N/A

VALOR ACUMULADO:

\$1.055.799.942,50

VALOR ADICIONALES:

N/A

TRAMO:

N/A

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$117.412.221,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

732 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO CIU TERCIARIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP – 085 – 2020	8.5 MESES	24/05/2021	1.055.799.942,50	1.055.799.942,50

Año	Valor
2020	\$ 1.055.799.942,50
Total	

Otorgado \$	\$ 117.412.221
Amortizado \$	0
Saldo \$	\$ -

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
732 DE 2020	10 MESES	30/06/2021	\$ 685.270.884,00	685.270.884,00

Inversión Programada (P)

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

E/P

Costos de Intervent (I)

C/B

I/C

	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	83.003.918	131.612.240	\$ -	\$ 131.612.240	1,59	\$ 69.096.129,00	1,000
Acumulado:	1.055.799.943	\$ 492.526.748	\$ -	\$ 492.526.748	0,47	\$ 467.580.387,00	1,000

E/V

Meses Ejecutados

Plazo Ejecutado/Total

Meses Faltantes

Saldo Contrato

Plazo Adicional Estimado

Presupuesto disponible

Valor Programado para los meses faltantes del año.

Contratista:	0,47	8,00	0,94	0,50	563.273.194	0	1.055.799.943	-
Interventor:	0,68	8,00	0,80	2,00	217.690.497	0	217.690.497	217.690.497

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Sección

Metros

Observaciones:

LA VIA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA ES VIA TERCIARIA, NO TIENE BERMAS NO REQUIERE MATERIAL DE BASE, Y EN VEZ DE CARPETA ESTA VIA SE CONSTRUIRA EN PLACA HUELLA DE 0,15 m CON BORDILLOS Y CUNETAS DE 0,7 m PARA UN TOTAL DE ANCHO VIAL DE 5,0 m.

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Valor sin IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -
VALOR TOTAL	11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENIONES:

Programado:

Ejecutado:

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)

\$ 13.372.744,0

\$ 18.030.879,0

\$ 17.822.351,0

\$ 19.036.629,0

\$ 108.096.335,0

\$ 493.565.983,0

\$ 676.047.792,0

\$ 1.055.799.942,0

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

EA / PA

INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)

	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	EA / PA	En el mes	Acumulado
						Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN BOX - CULVERT					-	\$ 17.192.513,3	\$ 0,0
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO					0,178	\$ 55.064.761,2	\$ 131.612.240,2
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					-	\$ 0,0	\$ 0,0
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL					-	\$ 10.746.643,0	\$ 0,0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU Terciaria

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	9	DE	10

FECHA			30	4	2021
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24-may-21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 1.055.799.942,50

VALOR ACUMULADO: \$ 1.055.799.942,50
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 14.327.962,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 14.327.962,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 105.579.994,25	10	9	2020	10	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	\$ 316.739.982,75	10	9	2020	10	8	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 211.159.988,50	10	9	2020	11	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 316.739.982,75	9	4	2021	8	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101185482

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	\$ 175.560.600,00	10	9	2020	12	4	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 65-40-101053200
OTRAS PÓLIZAS No. -

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	9	DE	10

FECHA	30	4	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 105.579.994,25	10	9	2020	26	9	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	\$ 316.739.982,75	10	9	2020	26	9	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 211.159.988,50	10	9	2020	26	5	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 316.739.982,75	9	4	2021	8	9	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-40-101053200

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	\$ 175.560.600,00	10	9	2020	26	5	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LAS POLIZAS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN VIGENTES.



Firma _____

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	10	DE	10

		FECHA	30	4	2021
			<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP - 085 - 2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

FECHA DE INICIO: 10/09/2020 PLAZO INICIAL: 07 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 24-may-21
(Indicar día, mes y año) (Indicar número y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
 La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
 No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
 No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA					CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	10	DE	10

FECHA				30	4	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma 

Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
 Director de Obra
 Matricula No.: 22202-246559 COR

Firma N.A.

Nombre: Especialista en Calidad de la Obra
 Matricula No.:

Firma 

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
 Director de la Interventoría
 Matricula No.: 25202-60909 CND

Firma

Nombre: Especialista en Calidad de la Interventoría
 Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 11



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MIFRAMN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	23/04	2021	(Día) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 02.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red
Técnicas y Ferretería

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. NH-40-op DE 2020

CONTRATISTA: consorcio placa Huella Coloso

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Coloso
calle larga en el municipio de Coloso
Departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: Consorcio CIV Terciaria

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
Luis Riquel González
Alvaro García F.
Liliana Harin
Vina Caro Cohen
Calmen Montano
Martin Martinez

CARGO
Coord. INVIAS
Resid. Interventoria
Coord. Interventoria
Asst. Interventoria
Trab. Social
Ing. Ambiental

EMPRESA O ENTIDAD
INVIAS
Consorcio CIV Terciaria
Consorcio CIV Terciaria
Consorcio CIV Terciaria
Consorcio CIV Terciaria
Consorcio CIV Terciaria

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Actualizar y solucionar dudas que se han
presentado durante la obra y en el
lugar de la obra y con los contratistas.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

N/A

N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se empieza la reunión donde el ingeniero Alvaro
informa al Ing. Luis Riquel que este contrato
del municipio de Coloso tiene fecha de termina-
ción el día 24 mayo 2021. Donde se habla de
la prorroga de este contrato ni política donde
tenia Ginepes para la ejecución de este contrato
pero se habla que los plazos no corresponden
al cual deben ser corregido lo antes posible.
Tema de avance en este contrato ha sido un 36%
pero no han enviado la nueva reprogramación
actualizado; de placa huella han comenzado un
promedio de 800 metros box Couvert no han hecho
hacha de anticipo le giraron como unos 117 millones
de peso; es el primer anticipo; no han hecho acta
por terminado la reunión virtual del municipio
de Coloso sin observaciones, ni compromiso,



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 23 04 2021
(Día) (Mes) (Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS


1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Alvaro Garcia F.
Liliana Herrin.
Wiss H. Gonzalez O.
Yina Caro Cohen.
Carmen Montañano.
Martin Martinez.


Yina Caro c.
Carmen Montañano

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	30/04/2021	(Día)	(Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 03
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Regional Técnica y Técnica

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. HH-LP-OP DE 2020

CONTRATISTA: #085 Consorcio Placa Huella Coloso

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía coloso
calle laica en el municipio de coloso
departamento de sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIVIL Técnica

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
<u>Alvaro García F.</u>	<u>Resid. Intervent</u>	<u>Consorcio CIVIL Técnica</u>
<u>William Godínez</u>	<u>Coord. INVIAS</u>	<u>INVIAS</u>
<u>Jorge Velásquez</u>	<u>Director Intervent.</u>	<u>Consorcio CIVIL Técnica</u>
<u>Luis González O</u>	<u>Coord. INVIAS</u>	<u>INVIAS</u>

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

· Aclarar dudas e inquietudes presentadas
en la ejecución de la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

· Seguimiento semanal del contrato de
obra del municipio de coloso
(Reunión virtual).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En este municipio lleva un promedio de
650 metros lineales de Placa Huella. En
anticipo está en trámite. En caso de obra
de este tipo, el balance de obra
de este revisando. Esta semana se le
hará llegar al ingeniero Luis González.
En

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 12

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

2

FECHA

8

(Día)

4

(Mes)

2021

(Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL No. 27

PROYECTO:

CARRETERA:

MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1K0+196 - K0+494
TRAMO 2 - EJE 1K1+060 - K1+132
TRAMO 3 - EJE 1K1+225 - K1+565
TRAMO 3* - EJE 1K1+595 - K1+665
TRAMO 4 - EJE 1K2+550 - K3+050

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN RED TERCERIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

SEMANA No.:

TREINTA Y UNO (31)

del

02/04/2021

al

08/04/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

LUIS M GUEL GONZALEZ OZUNA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO:

10/09/2020

KM A MEJORAR:

N/A

KM A REHABILITAR:

N/A

KM A CONSTRUIR:

1.280

No. PUENTES:

0

No. BOX-CULVERT:

1

OTROS:

CONTRATISTA:

CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

INTERVENITOR:

CONSORCIO CIJ TERCERIA NIT. 901.361.077-9

INTEGRANTES:

REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA

INTEGRANTES:

(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)

CONTRATO No.

LP – 085 – 2020

CONTRATO No.

732-2020

PLAZO INICIAL:

SIETE (7) MESES

PLAZO INICIAL:

CUATRO (4) MESES

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 1.055.799.942,50

ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.055.799.942,50

VALOR ACUMULADO:

\$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$	\$	\$	\$
EJECUTADO	- \$	1.055.799.942,50	- \$	- \$

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO:

Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):

ACUMULADO PROYECTO

	1	2	3	3*	4	TOTAL
CONSTRUCCION DE (1) BOX-CULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar	0	0	0	0	0	0
Relleno para estructuras con suelo	0	0	0	0	0	0
Concreto clase D (f' c = 21 MPa)	0	0	0	0	0	0
Concreto clase F (f' c = 14 MPa)	0	0	0	0	0	0
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²)	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar (M3)	0	0	0	11.1	100.50	111.6
Subbase Granular Clase C (M3)	0	0	0	127.5	337.5	465
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f' c = 21 MPa) (M3)	0	0	0	17.64	141.3	218.94
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella (M3)	0	0	0	55.44	100.8	156.24
Concreto clase D (f' c = 21 MPa) - Para Cunetas (M3)	0	0	0	0	145.30	145.3
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²) (KG)	0	0	0	4415.33	10337.38	14752.71
Sello Asfáltico para Juntas(M)	0	0	0	0	0	0

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carro tanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de ox corte, Capacidad de corte: hasta 6” (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bullo	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m., motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES

PERMISO MINERO: SI _____ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO X

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI _____ NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V1 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha

OBSERVACIONES: El presente

<div>EL CONTRATISTA REALIZA FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.</div>						<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 27</div>		<div>CÓDIGO</div> <div>MINFRA-MN-IN-15-FR-2</div>				
								<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>				
								<div>PÁGINA</div> <div>2DE2</div>				
								<div>FECHA</div> <div>842021</div> <div>(Dia)(Mes)(Año)</div>				
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO/CARRETERA:				MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA			TRAMO Y/O SECTOR(S):			CALLE LARGA		
UNIDAD EJECUTORA:				SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			SUCRE		
SEMANA No.:				TREINTA Y UNO (31)			del			02/04/2021		
al				08/04/2021			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:			WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:				LUIS M GUEL GONZALEZ OZUNA			OBJETO CONTRATO DE OBRA:			MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE		
FECHA DE INICIO:				10/09/2020			KM A MEJORAR:			N/A		
KM A REHABILITAR:				N/A			KM A CONSTRUIR:			1,280		
No. PUENTES:				0			No. BOX COULVERT:			1		
OTROS:												
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA												
Según la programación de obra las siguientes actividades se realizarán :												
1 Relleno para estructuras con suelo para box coulvert												
2 Concreto clase D (f'c = 21 Mpa)												
3 Concreto clase F (f'c = 14 Mpa)												
4 Acero de refuerzo fy = 420 Mpa												
5 Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella												
6 Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas												
7 Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)												
8 Obras de compensación ambiental.												
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO												
<div><div><div>ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)</div><div>K0+196K0+494K1+060K1+132K1+225K1+565K1+595K1+665K2+550K3+050</div><div><div>REALIZAR OBRAS PRELIMINARES</div><div>CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA</div><div>CONSTRUCCION DE (1) BOX.COULVERT</div><div>PLAN DE CALIDAD</div><div>P.A.G.A.</div><div>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</div><div>SEÑALIZACION VIAL</div><div>PLAN DE MANEJO DE TRANSITO</div></div><div><div>SIN INICIO</div><div>EN EJECUCION</div><div>FINALIZADO</div></div></div></div>												
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.												
<div><div><div>FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPA Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.</div><div>FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.</div><div>FOTO 3. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDICION DE CONCRETO PARA BORDILLOS Y CUNETA .</div><div>FOTO 4. ESTADO DE LA VIA DE ACCESO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES LOS DIAS 5,6 Y 7 DE ABRIL.</div></div></div>												
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.												
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA								DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
LA INTERVENTORIA REALIZA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSORSIO CONTRATISTA EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA Y DE INDOLE ADMINISTRATIVA CONSTANTEMENTE PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE MANERA ADECUADA Y CON CALIDAD.								<div>Jorge Isaac Velasquez Vargas</div>				
LA INTERVENTORIA REALIZA VISITAS A OBRA CONSTANTEMENTE A TRAVES DE SU PERSONAL PROFESIONAL PARA CORROBORAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y CON LAS CALIDADES EXIGIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								NOMBRE: <div>JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS</div>				
Invias - Gestión Pública con Calidad												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 29										
	CÓDIGO							MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
	VERSIÓN							1			
PÁGINA							1	DE 2			
FECHA								15	4	2021	
								(Día)	(Mes)	(Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO/CARRETERA:	MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA						TRAMO Y/O SECTOR(S):	TRAMO 1 - EJE 1 K0+196 - K0+494 TRAMO 2 - EJE 1 K1+060 - K1+132 TRAMO 3 - EJE 1 K1+225 - K1+565 TRAMO 3° - EJE 1 K1+595 - K1+665 TRAMO 4 - EJE 1 K2+550 - K3+050			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCERIA Y FERREA				DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SUCRE	SEMANA No.:	TRENTA Y DOS (32)	del	09/04/2021 al 15/04/2021	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA						GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN			
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE						FECHA DE INICIO:	10/09/2020			
KM A MEJORAR:	N/A	KM A REHABILITAR:	N/A	KM A CONSTRUIR:	1.280	No. PUENTES:	0	No. BOX COULVERT:	1	OTROS:	
CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO						INTERVENITOR: CONSORCIO CUJ TERCERA NIT. 901.361.077-9					
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA						INTEGRANTES: (Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)					
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020		VALOR INICIAL:	\$	1.055.799.942.50	CONTRATO No.	732-2020		VALOR INICIAL:	\$	685.270.884.00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES		ADICIONES:	\$	-	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		ADICIONES:	\$	-
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021		VALOR ACUMULADO:	\$	1.055.799.942.50	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021		VALOR ACUMULADO:	\$	685.270.884.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
VIGENCIA	2020		2021		20XX		20XX				
RECURSOS POR VIGENCIA	\$		\$		\$		\$				
EJECUTADO	\$		\$		\$		\$				
(Indicar valores en pesos)											
OBRA											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):			\$		1.055.799.942.50						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			\$		1.055.799.942.50						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			\$		389.972.002						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):					36.94%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			\$		389.972.001.80						
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:			SI NO		X						
MES FACTURADO:											
VALOR FACTURA:			FECHA FACTURA:								
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:											
Nota:											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
INTERVENTORIA											
EJECUTADO ACUMULADO:			\$		685.270.884.00		Básico				
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:			SI NO		X						
MES FACTURADO:											
VALOR FACTURA:	\$		FEBRERO		69.096.129.00		FECHA FACTURA:				
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION:											
Nota:											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
III. AVANCE FÍSICO											
ACUMULADO PROYECTO											
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	3*	4	TOTAL					
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT											
Excavaciones varias sin clasificar	0										
Relleno para estructuras con suelo	0										
Concreto clase D (f' c = 21 Mpa)	0										
Concreto clase F (f' c = 14 Mpa)	0										
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²)	0										
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO											
Excavaciones varias sin clasificar (M3)	0	0	0	11.1	100.50	111.6					
Subbase Granular Clase C (M3)	0	0	0	127.5	337.5	465					
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f' c = 21 Mpa) (M3)	0	0	0	17.64	141.3	218.94					
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella (M3)	0	0	0	55.44	100.8	156.24					
Concreto clase D (f' c = 21 Mpa) - Para Cunetas (M3)	0	0	0	0	145.30	145.3					
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²) (KG)	0	0	0	4415.33	10337.38	14762.71					
Sello Asfáltico para Juntas(M)	0	0	0	0	0	0					
MAQUINARIA Y EQUIPOS											
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL						
Aspersor manual	0	0	0	1	1						
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0						
Carro tanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1						
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0						
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0						
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1						
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0						
Compresor 120 HP											

EL CONTRATISTA REALIZA FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

2

FECHA

15
(Día)

4
(Mes)

2021
(Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL No. 29

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

SEMANA No.:

TREINTA Y DOS (32)

del

09/04/2021

al

15/04/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO:

10/09/2020

KM A MEJORAR:

N/A

KM A REHABILITAR:

N/A

KM A CONSTRUIR:

1.280

No. PUENTES:

0

No. BOX COULVERT:

1

OTROS:

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra las siguientes actividades se realizarán :

1 Relleno para estructuras con suelo para box coulvert

2 Concreto clase D (f' c = 21 Mpa)

3 Concreto clase F (f' c = 14 Mpa)

4 Acero de refuerzo fy = 420 Mpa

5 Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella

6 Concreto clase D (f' c = 21 Mpa) - Para Cunetas

7 Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)

8 Obras de compensación ambiental.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)

K0+196

K0+494

K1+060

K1+132

K1+225

K1+565

K1+595

K1+665

K2+550

K3+090

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 3"

TRAMO 4

REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT

PLAN DE CALIDAD

P.A.G.A.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN VIAL

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

14/04/2021 10:54:33 a. m.
9.48372678N 75.34044042W
COLOSO TRAMO 3

14/04/2021 10:55:28 a. m.
9.48343408N 75.34024745W
COLOSO TRAMO 3

FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPA Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.

14/04/2021 10:56:36 a. m.
9.48335759N 75.34004252W
COLOSO TRAMO 3

14/04/2021 10:56:22 a. m.
9.48330774N 75.34003319W
COLOSO TRAMO 3

FOTO 3. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORIA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

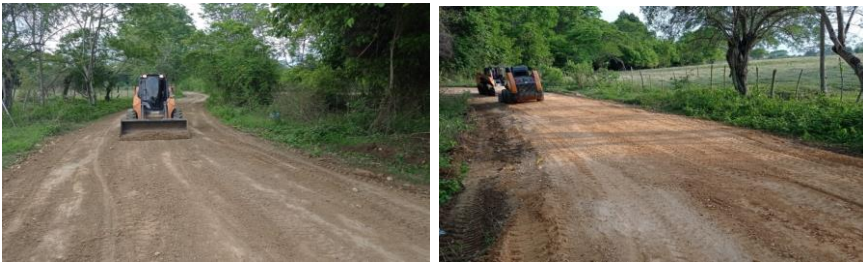

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Invias - Gestión Pública con Calidad

<div><div><div></div></div><div>INFORME SEMANAL No. 29</div></div>						CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-2				
						VERSIÓN		1				
						PÁGINA		1 DE 2				
								FECHA	22 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO/CARRETERA:						MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA						
UNIDAD EJECUTORA:						SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:						LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA						
OBJETO CONTRATO DE OBRA:						MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE						
KM A MEJORAR:						N/A	KM A REHABILITAR:	N/A	KM A CONSTRUIR:	1.280	No. PUNTES:	0
						No. BOX COULVERT:			1	OTROS:		
CONTRATISTA:						CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO						
INTEGRANTES:						REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA						
CONTRATO No.						LP – 085 – 2020						
PLAZO INICIAL:						SIETE (7) MESES						
PLAZO ACUMULADO:						HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021						
INTERVENITOR:						CONSORCIO CIJ TERCERA NIT. 901.381.077-9						
INTEGRANTES:						(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con un participación del 50% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.290.852-1 con una participación del 5%)						
CONTRATO No.						732-2020						
PLAZO INICIAL:						CUATRO (4) MESES						
PLAZO ACUMULADO:						HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:												
VIGENCIA												
RECURSOS POR VIGENCIA												
EJECUTADO												
(Indicar valores en pesos)												
OBRA												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:												
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:												
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:												
MES FACTURADO:												
VALOR FACTURA:												
FECHA FACTURA:												
PAGOS ACUMULADOS REPORTE E SIF -NACION:												
Nota:												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
INTERVENTORIA												
EJECUTADO ACUMULADO:												
Básico												
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:												
MES FACTURADO:												
VALOR FACTURA:												
FECHA FACTURA:												
PAGOS ACUMULADOS REPORTE E SIF NACION:												
Nota:												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
III. AVANCE FISICO												
ACUMULADO PROYECTO												
TRAMO Y/O SECTOR(S):												
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT												
Excavaciones varias sin clasificar												
Relevo para estructuras con suelo												
Concreto clase D (f' c = 21 Mpa)												
Concreto clase F (f' c = 14 Mpa)												
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²)												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO												
Excavaciones varias sin clasificar (M3)												
Subbase Granular Clase C (M3)												
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f' c = 21 Mpa) (M3)												
Concreto Resistencia 14MPa (G) – Para Placa Huella (M3)												
Concreto clase D (f' c = 21 Mpa) – Para Cunetas (M3)												
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²) (KG)												
Sello Asfáltico para Juntas(M)												
MAQUINARIA Y EQUIPOS												
TRAMO Y/O SECTOR(S):												
Aspersor manual												
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.												
Carrozanque de agua(1000 Galones)												
Cizalla manual de 90 cm.												
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP												
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.												
Compresor (barrido y soplado)												
Compresor 120 HP, con martillo.												
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6” (152mm)												
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto												
Equipo de soldadura 250 AMP												
Mezcladora de concreto 1 bullo												
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.												
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP												
Retroeexcavadora A25C												
Retroeexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.												
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt												
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.												
Volqueta 6 m3												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL												
FUENTES DE MATERIALES												
UBICACIÓN:												
EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES												
PERMISO MINERO:												
LICENCIA AMBIENTAL:												
UBICACIÓN:												
PERMISO MINERO:												
LICENCIA AMBIENTAL:												
OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V1 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha.												
OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite												
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)												
ESTADO:												
PENDIENTE ENTREGA PAGA V2												
V. GESTION PREDIAL												
TOTAL PREDIOS A ADQUIRRIR:												
FICHAS PREDIALES APROBADAS:												
AJUSTES APROBADOS:												
PREDIOS ADQUIRIDOS:												
OBSERVACIONES: NO HAY AMPLIACIONES DE LA VIA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICION DE PREDIOS.												
VI. GESTION SOCIAL												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:												
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:												
OTROS:												
No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS:												
No. de CAPACITACIONES REALIZADAS:												
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:												
SINCELEJO - SUCRE												
OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.												
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA												
DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTO ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,												
EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR .												
EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS.												
EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.												
EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.												

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL No. 29</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MINFRA-MN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div>2 DE 2</div>																																																																																																			
		<div>FECHA</div> <div>22 de 4 del 2021 (Día) (Mes) (Año)</div>																																																																																																			
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																					
PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA		TRAMO Y/O SECTOR(S): CALLE LARGA																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE	SEMANA No.: TREINTA Y TRES (33) del 16/04/2021 al 22/04/2021																																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN																																																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE		FECHA DE INICIO: 10/09/2020																																																																																																			
KM A MEJORAR: N/A	KM A REHABILITAR: N/A	KM A CONSTRUIR: 1.280 No. PUENTES: 0 No. BOX COULVERT: 1 OTROS:																																																																																																			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																					
Según la programación de obra las siguientes actividades se realizarán :																																																																																																					
<div>1 Relleno para estructuras con suelo para box coulvert</div> <div>2 Concreto clase D (f' c = 21 Mpa)</div> <div>3 Concreto clase F (f' c = 14 Mpa)</div> <div>4 Acero de refuerzo fy = 420 Mpa</div> <div>5 Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella</div> <div>6 Concreto clase D (f' c = 21 Mpa) - Para Cunetas</div> <div>7 Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2)</div> <div>8 Obras de compensación ambiental.</div>																																																																																																					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																																																					
<table><tr><th>ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)</th><th>K0+000</th><th>K0+494</th><th>K1+060</th><th>K1+132</th><th>K1+225</th><th>K1+565</th><th>K1+595</th><th>K1+665</th><th>K2+550</th><th>K3+050</th></tr><tr><td>REALIZAR OBRAS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PLAN DE CALIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P.A.G.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SEÑALIZACIÓN VIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PLAN DE MANEJO DE TRANSITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><div></div>SIN INICIO<div></div>EN EJECUCIÓN<div></div>FINALIZADO</div>			ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	K0+000	K0+494	K1+060	K1+132	K1+225	K1+565	K1+595	K1+665	K2+550	K3+050	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES											CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA											CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT											PLAN DE CALIDAD											P.A.G.A.											PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD											SEÑALIZACIÓN VIAL											PLAN DE MANEJO DE TRANSITO										
ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	K0+000	K0+494	K1+060	K1+132	K1+225	K1+565	K1+595	K1+665	K2+550	K3+050																																																																																											
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES																																																																																																					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA																																																																																																					
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT																																																																																																					
PLAN DE CALIDAD																																																																																																					
P.A.G.A.																																																																																																					
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD																																																																																																					
SEÑALIZACIÓN VIAL																																																																																																					
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO																																																																																																					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																																																					
<div><div>FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPa Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.</div><div>FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPa.</div><div>FOTO 3.INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO.</div></div>																																																																																																					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																																																					
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																			
LA INTERVENTORIA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.		JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS																																																																																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 30		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2					
			VERSIÓN	1					
			PÁGINA	1	DE	2			
			FECHA	29	4	2021			
			(Día)	(Mes)	(Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO/CARRETERA:	MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA		TRAMO Y/O SECTOR(S):	TRAMO 1 - EJE 1 K0+196 - K0+494 TRAMO 2 - EJE 1 K1+060 - K1+132 TRAMO 3 - EJE 1 K1+225 - K1+565 TRAMO 3° - EJE 1 K1+595 - K1+665 TRAMO 4 - EJE 1 K2+550 - K3+050					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCERIA Y FERREA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SUCRE	SEMANA No.:	TREINTA Y CUATRO (34) del 23/04/2021 al 29/04/2021				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN					
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE		FECHA DE INICIO:	10/09/2020					
KM A MEJORAR:	N/A	KM A REHABILITAR:	N/A	KM A CONSTRUIR:	1.280	No. PUENTES: 0			
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		No. BOX COULVERT: 1 OTROS:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO		INTERVENIOR:	CONSORCIO CIJ TERCERIA NIT. 901.361.077-9					
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA		INTEGRANTES:	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)					
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	VALOR INICIAL:	\$	1.055,799,942.50	CONTRATO No.	732-2020	VALOR INICIAL:	\$	685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	\$	-	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	\$	-
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	VALOR ACUMULADO:	\$	1.055,799,942.50	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	VALOR ACUMULADO:	\$	685,270,884.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
VIGENCIA	2020		2021		20XX		20XX		
RECURSOS POR VIGENCIA	\$		\$		\$		\$		
EJECUTADO	\$		-		\$		-		
(Indicar valores en pesos)									
OBRA									
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$		1,055,799,942.50						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$		1,055,799,942.50						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$		492,526,748						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):			46.85%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$		492,526,748.42						
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO		X						
MES FACTURADO:			FECHA FACTURA:						
VALOR FACTURA:									
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:									
Nota:									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
INTERVENTORIA									
EJECUTADO ACUMULADO:	\$		685,270,884.00		Básico				
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO		X						
MES FACTURADO:			FECHA FACTURA:						
VALOR FACTURA:	\$		69,096,129.00						
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION:									
Nota:									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
III. AVANCE FÍSICO									
ACUMULADO PROYECTO									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	3*	4	TOTAL			
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT									
Excavaciones varias sin clasificar			0			0			
Relleno para estructuras con suelo			0			0			
Concreto clase D (f' c = 21 Mpa)			0			0			
Concreto clase F (f' c = 14 Mpa)			0			0			
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²)			0			0			
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
Excavaciones varias sin clasificar (M3)	0	0	30.45	19.5	137.70	187.65			
Subbase Granular Clase C (M3)	0	0	82.5	52.5	375	510			
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f' c = 21 Mpa) (M3)	0	0	39.12	25.14	176.4	240.66			
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella (M3)	0	0	27.72	17.64	126	171.36			
Concreto clase D (f' c = 21 Mpa) - Para Cunetas (M3)	0	0	36.703	23.357	166.83	226.893			
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm² s fy ≥ 5200 Kg/cm²) (KG)	0	0	4281.98	2750.64	19311.88	26344.5			
Sello Asfáltico para Juntas(M)	0	0	0	0	0	0			
MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	2	3	4	TOTAL				
Aspersor manual	0	0	0	1	1				
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0				
Carro tanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1				
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0				
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0				
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1				
Compresor (barrido y soplado)	0	0							

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL No. 30</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MINFRA-MN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div>2 DE 2</div>																																																																																																								
		<div>FECHA</div> <div>29 DE 2021</div> <div>(Día) (Mes) (Año)</div>																																																																																																								
<div>I. INFORMACIÓN GENERAL</div>																																																																																																										
<div>PROYECTO/CARRETERA:</div> <div>MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA</div>		<div>TRAMO Y/O SECTOR(S):</div> <div>CALLE LARGA</div>																																																																																																								
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA</div>	<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>SUCRE</div>	<div>SEMANA No.:</div> <div>TREINTA Y CUATRO (34)</div> <div>del</div> <div>23/04/2021</div> <div>al</div> <div>29/04/2021</div>																																																																																																								
<div>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:</div> <div>LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA</div>		<div>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:</div> <div>WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN</div>																																																																																																								
<div>OBJETO CONTRATO DE OBRA:</div> <div>MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE</div>		<div>FECHA DE INICIO:</div> <div>10/09/2020</div>																																																																																																								
<div>KM A MEJORAR:</div> <div>N/A</div>	<div>KM A REHABILITAR:</div> <div>N/A</div>	<div>KM A CONSTRUIR:</div> <div>1,280</div> <div>No. PUENTES:</div> <div>0</div> <div>No. BOX COULVERT:</div> <div>1</div> <div>OTROS:</div> <div></div>																																																																																																								
<div>VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</div>																																																																																																										
<div>Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :</div> <div>1 Relleno para estructuras con suelo para box coulvirt</div> <div>2 Concreto clase D (f' c = 21 Mpa)</div> <div>3 Concreto clase F (f' c = 14 Mpa)</div> <div>4 Acero de refuerzo fy = 420 Mpa.</div> <div>5 Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella</div> <div>6 Concreto clase D (f' c = 21 Mpa) - Para Cunetas</div> <div>7 Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)</div> <div>8 Obras de compensación ambiental.</div>																																																																																																										
<div>IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO</div>																																																																																																										
<div><div><div>ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)</div><div>K0+196</div><div>TRAMO 1</div><div>K0+494</div><div>K1+060</div><div>TRAMO 2</div><div>K1+132</div><div>K1+225</div><div>TRAMO 3</div><div>K1+565</div><div>K1+595</div><div>TRAMO 3"</div><div>K1+665</div><div>K2+550</div><div>TRAMO 4</div><div>K3+050</div></div><table><tr><td>REALIZAR OBRAS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PLAN DE CALIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P.A.G.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SEÑALIZACIÓN VIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PLAN DE MANEJO DE TRANSITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div><div></div>SIN INICIO<div></div>EN EJECUCIÓN<div></div>FINALIZADO</div></div>			REALIZAR OBRAS PRELIMINARES													CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA													CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT													PLAN DE CALIDAD													P.A.G.A.													PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD													SEÑALIZACIÓN VIAL													PLAN DE MANEJO DE TRANSITO												
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES																																																																																																										
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA																																																																																																										
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT																																																																																																										
PLAN DE CALIDAD																																																																																																										
P.A.G.A.																																																																																																										
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD																																																																																																										
SEÑALIZACIÓN VIAL																																																																																																										
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO																																																																																																										
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.</div>																																																																																																										
<div><div>FOTO 1. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS EN EL TRAMO 3.</div></div>	<div><div>FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA EN EL TRAMO 3.</div></div>																																																																																																									
<div><div>FOTO 3.ACTIVIDADES PRE ELMINARES EN EL TRAMO 2 , PREPARACION DE LA VIA PARA INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR TIPO C.</div></div>																																																																																																										
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div>																																																																																																										
<div>XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div>	<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div><div>NOMBRE:<div>JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS</div>No. MAT:<div>25202-60909 CHD</div></div></div>																																																																																																									
<div>LA INTERVENTORIA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. INVIAS.</div> <div>LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO N°240 2021 CIJICOLOSO CON FECHA 26 DE ABRIL DE 2021 Y ASUNTO " REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCESO ANCLAJE ACERO DONDE SE HACE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO TECNICO REMITIDO A LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA AJUSTADO A LAS HIPOTESIS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS PLACAS HUELLAS EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PRESENTADO,QUE PERMITA CONSTRUIR Y DESARROLLAR LAS LOSAS DE CONCRETO EN LOS SECTORES CURVOS DEL EJE VIAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA N°MM-LP-OP-085-2020.</div>																																																																																																										

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 13

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ABRIL

CONTRATO No. 732-2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CIU TERCIARIA

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

[illegible]**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	2	DE	6

FECHA			30 <small>(Día)</small>	4 <small>(Mes)</small>	2021 <small>(Año)</small>
-------	--	--	----------------------------	---------------------------	------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCARIA Y FERREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ABRIL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732-2020
CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCARIA
SECTOR: VEREDA CALLE LARGA


NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	DIRECTOR INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTHA YURY GARCIA	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	INSPECTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE MARIA MENDOZA DE VARGAS	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	INSPECTORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YINA JUDITH CARO COHEN	INSPECTORA SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA DEDICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL MES ES LA SIGUIENTE: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 0.429/1, ESPECIALISTA AMBIENTAL 0.66/1; DEMÁS RECURSO PERSONAL: 1/1

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)



Firma
 Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
 Director de Interventoría
 Matrícula No.: 25202-60909 CND



Firma
 Nombre: LUIS MIGUÉN GONZALEZ OZUNA
 Supervisor del Contrato de Interventoría.
 Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 15



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

VERSIÓN

1

PÁGINA

4

DE

6

FECHA

30

4

2021

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

732 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES INFORME MENSUAL:

ABRIL

CARRETERA Y/O PROYECTO:

VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR:

VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70204	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,50
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70508	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,51
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70230	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,52
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70418	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,53
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70473	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,54
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70523	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,55
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70713	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,56
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70823	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,57
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

685.270.884,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	septiembre	\$ 16.447.491	\$ 3.858.053	\$ 20.305.544	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 20.305.544	\$ 685.270.884		ACTA CONCILIADA
2	octubre	\$ 35.518.064	\$ 8.331.398	\$ 43.849.462	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 64.155.006	\$ 621.115.878		ACTA CONCILIADA
3	noviembre	\$ 51.817.723	\$ 12.154.775	\$ 63.972.498	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 128.127.504	\$ 557.143.380		ACTA CONCILIADA
4	diciembre	\$ 51.085.377	\$ 11.982.990	\$ 63.068.367	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 191.195.871	\$ 494.075.013		ACTA EN TRAMITE
5	enero	\$ 55.967.864	\$ 13.128.265	\$ 69.096.129	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 260.292.000	\$ 424.978.884		ACTA EN ELABORACION
6	Febrero	\$ 55.967.864	\$ 13.128.265	\$ 69.096.129	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 329.388.129	\$ 355.882.755		ACTA EN ELABORACION
7	marzo	\$ 55.967.864	\$ 13.128.265	\$ 69.096.129	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 398.484.258	\$ 286.786.626		ACTA EN ELABORACION
8	abril	\$ 55.967.864	\$ 13.128.265	\$ 69.096.129	0	0	\$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	\$ 467.580.387	\$ 217.690.497		ACTA EN ELABORACION
TOTALES		\$ 378.740.113	\$ 88.840.274	\$ 467.580.387							

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma



Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma



Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

86

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-13			
						VERSIÓN		1			
						PÁGINA		3	DE	6	
						FECHA		30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)	
UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA						DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020						INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021						VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ CARRETERA Y/O PROYECTO:					
						SECTOR: VEREDA CALLE LARGA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	DIRECTOR INTERVENTORÍA	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ 156.600,00	\$ 90.000,00	\$ 360.000,00	\$ 90.000,00	\$ -	\$ -
2	MARTHA YURY GARCIA	41708526	SECRETARIA INTERVENTORÍA	\$ 922.000,00	\$ 922.000,00	\$ 64.171,20	\$ 36.880,00	\$ -	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -
3	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	1109842513	INSPECTOR	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 104.400,00	\$ 60.000,00	\$ 240.000,00	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -
4	ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	92186230	RESIDENTE INTERVENTORÍA	\$ 3.450.000,00	\$ 3.450.000,00	\$ 240.200,00	\$ 138.000,00	\$ 552.000,00	\$ 138.000,00	\$ -	\$ -
5	CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	1067950990	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	\$ 2.360.000,00	\$ 2.360.000,00	\$ 164.300,00	\$ 94.400,00	\$ 377.600,00	\$ 94.400,00	\$ -	\$ -
6	ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	1104011109	SECRETARIA INTERVENTORÍA	\$ 922.000,00	\$ 922.000,00	\$ 64.200,00	\$ 36.900,00	\$ 147.600,00	\$ 36.900,00	\$ -	\$ -
7	JORGE MARIO MENDOZA DE VARGAS	1063177819	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	\$ 2.360.000,00	\$ 2.360.000,00	\$ 164.300,00	\$ 94.400,00	\$ 377.600,00	\$ 94.400,00	\$ -	\$ -
8	FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	6816630	RESIDENTE INTERVENTORÍA	\$ 3.450.000,00	\$ 3.450.000,00	\$ 240.200,00	\$ 138.000,00	\$ 552.000,00	\$ 138.000,00	\$ -	\$ -
9	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3880125	ESPECIALISTA AMBIENTAL	\$ 2.970.000,00	\$ 2.970.000,00	\$ 206.800,00	\$ 118.800,00	\$ 475.200,00	\$ 118.800,00	\$ -	\$ -
10	CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	32670053	INSPECTOR SOCIAL	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 111.360,00	\$ 64.000,00	\$ -	\$ 64.000,00	\$ -	\$ -
11	YINA JUDITH CARO COHEN	1102847188	INSPECTOR SST	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 111.360,00	\$ 64.000,00	\$ 256.000,00	\$ 64.000,00	\$ -	\$ -
12	MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	1099965566	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	\$ 2.360.000,00	\$ 2.360.000,00	\$ 164.256,00	\$ 94.400,00	\$ 377.600,00	\$ 94.400,00	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 25.744.000,00							
NOTAS:											
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.											
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.											
<div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula No.: 25202-60909 CND</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: LUIS MIGUEL GONZALES OZUNA</div><div>Supervisor del Contrato de Interventoría</div><div>Matrícula No.: 22202-204005</div></div>											
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)											
Copias: Dirección Territorial.											

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	5	DE	6

			FECHA	30	4	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 01/09/2019
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2020
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 685,270,884.00
VALOR ACUMULADO: \$ 685,270,884.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 68,527,088.40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 137,054,176.80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	\$ 205,581,265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB- 100128840
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	5	DE	6

FECHA	30	4	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 68,527,088.40	24	3	2021	30	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 137,054,176.80	24	3	2021	30	6	2024
Calidad del servicio	30%	\$ 205,581,265	30	6	2021	30	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB- 100128840

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____


Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND


Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	6	DE	6

FECHA					30	4	2021
					(Día)	(Mes)	(Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma 

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
 Director de la Interventoría
 Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma _____

Nombre: _____
 Especialista en Calidad de la Interventoría
 Matrícula No.: _____

Firma 

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula No.: 22202-204005

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 19

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 26 de abril de 2021

OFICIO N° 240 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCESO ANCLAJE ACERO**

Cordial saludo,

Referente al procedimiento técnico remitido a esta interventoría, y, revisado; esta interventoría encuentra ajustado a las hipótesis de diseño y construcción de las placas huella el procedimiento constructivo presentado, que permita construir y desarrollar las losas de concreto en los sectores curvos del eje vial de construcción de las obras del contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020

Por consiguiente, la interventoría solicita aplicar en campo, los tips constructivos que constituyen el procedimiento técnico presentado.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

CIRCULAR 03

ASUNTO: PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

20/04/2021

PARA: CONTRATISTAS OBRAS PAVIMENTACIÓN PLACA HUELLA – PROYECTOS PDET SUCRE

Teniendo en cuenta La Ley 100 de 1993, que consagra la obligación de todos los empleadores, del sector público o privado, de pagar su respectivo aporte al Sistema General de Seguridad Social, y establece sanciones para quienes no cumplan con este deber. Ellos, en todo caso, están obligados a asumir en forma directa los costos de la atención de salud que requieran sus trabajadores, si no los han incorporado al sistema institucional de protección. Esta ley ha señalado que el derecho a la seguridad social es fundamental cuando está íntimamente relacionado con un derecho como la vida y ha sido enfática en exigir a los empleadores el cumplimiento de su obligación de afiliar a sus trabajadores y pagar oportunamente los aportes que les corresponda.

Según el decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.2.1.1. Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. La selección de la entidad administradora de riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del empleador.

Por parte de interventoría se realizaron inspecciones y capacitaciones en el mes de marzo, donde tuvieron asistencia los trabajadores, y se pudo evidenciar que, en la entrega de la planilla de pago de los aportes a seguridad social en el mes de marzo, no se encuentran relacionados algunos trabajadores en la planilla.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Se solicita al contratista encargado de la obra, que todos los trabajadores que estén vinculados en el contrato en ejecución, estar afiliados a seguridad social, para lo cual deben adjuntar la planilla donde se evidencie estas afiliaciones, con el fin de evitar posibles sanciones.

Atentamente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría CIU

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C
