



INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

CONTRATO DG-082-2026

OBJETO:

**CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES
ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 2**

PERÍODO

22 ABRIL AL 25 ABRIL DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	COMPONENTE LEGAL.....	3
3.	COMPONENTE TÉCNICO.....	5
4.	COMPONENTE FINANCIERO	16
5.	COMPONENTE AMBIENTAL	17
6.	COMPONENTE SOCIAL	18
7.	COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	19
8.	CRONOGRAMA.....	20
9.	CONCLUSIONES	21

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 2 DE 22

1. INTRODUCCIÓN

En este primer informe correspondiente al periodo del mes de abril de 2026 se presentaran los avances alcanzados en las actividades de gestión administrativa, operativa y de cumplimientos en los Componentes Social y Ambiental.

El alcance del contrato **DG-082-2026** es la construcción de 2674 soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SSFV- en las comunidades rurales y dispersas de los municipios de Albania y Maica en el Departamento de la Guajira, las cuales incluyen las respectivas instalaciones internas, acometida domiciliaria, sistema de medición y pago, las cuales deberán entregarse en cada comunidad puestas en servicio y sin novedad alguna.

El plazo máximo para la entrega de los sistemas objetivo en el contrato es el 30 de noviembre de 2026. La firma del contrato se llevó a cabo el 20 de marzo de 2026; sin embargo, las pólizas correspondientes fueron aprobadas el 22 de abril debido a inconvenientes en su expedición.

Las actividades preliminares a la ejecución corresponden al replanteo en campo de los usuarios de la formulación del proyecto, el objetivo es ejecutar estas labores en el menor tiempo posible para garantizar la eficiencia en el cronograma inicial, ya que se tiene información de algunas comunidades que tiene problemas interinos que no permiten el ingreso de personal foráneo, ya que estamos trabajando sobre territorios comunitarios ancestrales.

Cumpliendo con los lineamientos de respeto por la cultura étnica y de autoridades autóctonas se programa la socialización del proyecto para la fase de construcción, ya que se habían realizado reuniones iniciales con las autoridades para solicitar permisos y poder iniciar la actividad de replanteo en las zonas correspondientes a las comunidades de Lote 2.



Localización Geográfica de la zona de influencia del proyecto

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 3 DE 22

2. COMPONENTE LEGAL

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

La información general del contrato se presenta en el siguiente cuadro:

CONTRATO NÚMERO	DG-082-2026
CONTRATANTE	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.-DISPAC (Empresa controlada por el Ministerio de Minas y Energía)
NIT	818.001.629-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE HORTA ROJAS
VALOR	SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$75.460.584.054) M/TE, incluido IVA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2
NIT	902.046.923-3
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN GUTIERREZ ARJONA
INTERVENTORIA	PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS - PROINGES SAS
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 2
FECHA INCIO	22 de abril del 2026
PLAZO	El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de noviembre de 2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	7500000174

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 4 DE 22

2.2. GARANTIAS CONTRATO OBRA

- POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO**

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/03/2027	22.638.175.216,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/11/2027	30.184.233.621,60
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/11/2029	3.773.029.202,70
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/11/2029	7.546.058.405,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/11/2026	24:00 Horas Del 30/11/2031	22.638.175.216,20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/11/2028	22.638.175.216,20
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.417.846.878,30

POLIZA No 100295162
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

POLIZA No 100077790
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	3.773.029.202,00	3.773.029.202,70	3.773.029.202,70
PATRONAL	3.773.029.202,00	3.773.029.202,00	3.773.029.202,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	3.773.029.202,00	3.773.029.202,00	3.773.029.202,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	3.773.029.202,00	3.773.029.202,00	3.773.029.202,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 3.773.029.202,70

- POLIZA DE SEGURO TODORIESGO**

POLIZA No 100000477
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OBJETO DE CONTRATO				
RIESGO :				
VIGENCIA (DESDE)	VIGENCIA (HASTA)	20/03/2026	31/01/2027	AMPARO
ASEGURADA	MONEDA			SUMA
DAÑOS MATERIALES		75,460,584,054.00	\$	
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA		75,460,584,054.00	\$	
CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL		75,460,584,054.00	\$	
MANTENIMIENTO		75,460,584,054.00	\$	
AMIT - HMACC		10,000,000,000.00	\$	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES		2,000,000,000.00	\$	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES		2,000,000,000.00	\$	
REMOCIÓN DE ESCOMBROS		3,000,000,000.00	\$	

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 5 DE 22

3. COMPONENTE TÉCNICO

3.1. ETAPA PREVIA

3.1.1. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE DISEÑOS

3.1.1.1. VALIDACIÓN DE DISEÑOS

El equipo de trabajo está actualmente en el proceso de revisión exhaustiva de los documentos que contienen los diseños del proyecto. El objetivo es validar las especificaciones contractuales que se alineen con las especificaciones establecidas por los Proyectos Tipo para la Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales en Zonas No Interconectadas, conforme a las directrices del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Minas y Energía (MME) y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). Este proceso incluye el dimensionamiento estándar, utilizando un cuadro de cargas de referencia orientado a una demanda específica de 40 kW-h/mes.



Imagen de referencia IA equipo de trabajo revisión de diseños

3.1.1.2. APROBACIÓN DE DISEÑOS

El proceso de aprobación está en fase de revisión de los diseños por el equipo de profesionales del área técnica.

3.1.1.3. MODIFICACIONES DE DISEÑOS

Los diseños se encuentran en revisión para emitir el concepto.

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 6 DE 22

3.1.1.4. VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA VALLA PUBLICITARIA

La valla informativa del proyecto fue diseñada según las especificaciones contractuales, y su impresión digital para ser instalada en dos sitios estratégicos para la visualización por parte de los transeúntes. El diseño fue enviado para aprobación por las instancias regulares



3.1.1.5. VALIDACIÓN DEL PERSONAL MINIMO

Se presentaron las hojas de vida de los candidatos para la aprobación de la Interventoría, la documentación completa se envía de manera digitalizada para su revisión

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO				
CARGO	NOMBRE	PERFIL	DEDICACIÓN	ACTIVO
DIRECTOR DE OBRA	EVARISTO MANTILLA MORA	ESPEC. GERENCIA PROY	30%	SI
RESIDENTE TECNICO	SERGIO ANDRES BARROS MONTES	ING. ELECTRICISTA	100%	SI
SUPERVISOR TECNICO EN OBRA 1	ALIRIO VALDERRAMA DELGADO	TEC. ELECTRICISTA INDUSTRIAL	100%	SI
SUPERVISOR TECNICO EN OBRA 3	NORBERTO JAVIER PINTA CAÑAR	TECNOLOGO REDES	100%	SI
RESIDENTE CIVIL	MARIA PAZ CALDERON CAICEDO	ING CIVIL	10%	SI
SUPERVISOR HSEQ 1	BETTY LUZ CASTRO QUIROZ	ESPEC. SST	100%	SI
SUPERVISOR HSEQ 2	KAREN LISETH VASQUEZ AMEZQUITA	ADMIN. SALUD OCUPACIONAL	100%	SI
SUPERVISOR HSEQ 3	JOSE JAMEZ LEON GIL	PROFES. SALUD OCUPACIONAL	100%	SI
SUPERVISOR SOCIAL 1	CLEMENCIA PUSHAINA	TRABAJADORA SOCIAL	100%	SI
SUPERVISOR SOCIAL 2	MAYRA CRISTINA BONIVENTO IPUANA	TRABAJADORA SOCIAL	100%	SI
SUPERVISOR AMBIENTAL	ALEXEI RODRIGUEZ MONTENEGRO	ING. AMBIENTAL	30%	SI

Una vez sean evaluadas y aprobadas se procederá con las gestiones de vinculación para las actividades de campo en el desarrollo de la etapa constructiva.

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 7 DE 22

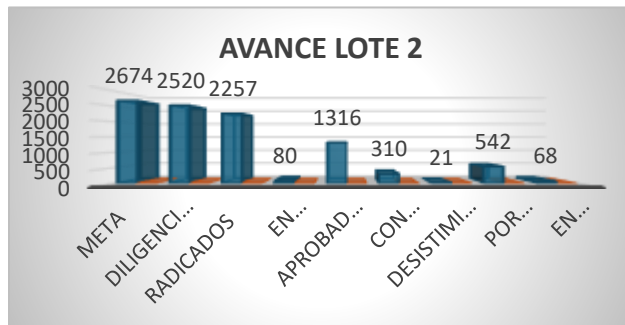
3.1.2. REPLANTEO

3.1.2.1. RESUMEN EJECUTIVO

Las comunidades que se formularon para este proyecto son 136 y corresponden al siguiente listado:

ACUARU	JAVILLITO	NUEVA VICTORIA
ACUARUT	JAWAPIAKAT	NUEVO HORIZONTE
AIPIAPURE	JEPIRRALU	OROLEE
AISHIMANA	JEYUMANA	OULECHI
ALAINAWOU	JIJITUY	OUTKULEMANA
ALIRAPA	JIRRUMANA	PAJANKIRRUMANA
ALITAIMANA	JITKAT	PALASTOULE
AMARE	JIYUTCHON	PALAZUMANA
AMUSHICHOW	JONNE	PANAMA 2
ANAICHON	JUCHIMANA	PARAGUANA
ANAICHONKA	JURUJUTSHIMANA	PARAÍSO
ANARAIPA	JUYASIRRAIN	PARENS PAREN
ANUTPALAO	KACHUTZAO	PARRICHON
AREMASAIN	KAISHAIPA	PARRITCHON
ASIJUSHEIN	KALAPASHERA	PARURUAMANA
ASOCIACIÓN HUELLA	KALASARRIT	PATILLAL
DE PAZ	KASKAJALITO	PERRAKAT
AULAULIA	KAYUSHUWAIN	PERRANCHON
BARRANCA	KETPANA	PINSKI
BELLA VISTA	KIJOMANA	PIRPIR
CAÑAWATAMANA	KOCHINAMANA	QUERRAJULI
CEURA 2	KULIRRILY	RANCHO NUEVO
CHINGOLITO	LA FORTUNA	RILEACHON
CURARIR	LA MARAVILLA	RRUANAMANA
EL MANGO DE NUEVA	LA PLAYA	RULEACHON
AMERICA	LAS GLORIAS	SABOURIAPO
FLOR DE SEURA	LAS PALMITAS	SACALOUSAIN
GUATUPAIN	LOMA FRESCA	SAKALOUSAIN
GUAYABAL	LOS MANGOS	SALA'AKAT
GUAYAVITAL	LUMAKAT	SANTA FE WUNUPARAT
HIOTSHI	MACHETZUMANA	SARARAO
IRRAMALII	MAKU	SHULEMA
ISMAEL CUADRADO	MALAWAIPAA	SINAMANA
RENTERÍA	MALOUYEN	SOLDADO PARATE BIEN
ITACA	MARRALA	TAPLAMANA
JALALOU	MASPALAU	TOLO
JARAROU	MONTAÑITA	TOTALES
JATTO	MULAMANA	TROCOMANA
TUKUPECHON	WAJALETU	WAYACANAL
TUPECHIMANA	WAKANAT	WAYAKANAT
URRAICHIQUEPU	WAMAYAO2	WOTTOIN
USHURU 2	WANAPAREPO	WUNUPARAT
VILLA LUZ	WANETURUMANA	YOULEJUNAY
VILLA ONE	WARARATCHAN	YOUYOUUPANA
WAIKAPARAY	WARE WAREN	ZAPATAMANA
WAIRAKAT	WARRARALAIN	ZENUY
WAIRRAMANA	WARRARATCHON	

PÁGINA 8 DE 22

[illegible]

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 9 DE

RESUMEN DE REPLANTEO DEL LOTE 2						
#	COMUNIDADES	BENEFICIARIO	VISITADOS Y DILIGENCIA	PORCENTAJE DILIGENCIA	RADICADOS INTERVENTOR	AVANCE
1	ACUARU	8	0	0%	0	0,00%
2	ACUARUT	14	0	0%	0	0,00%
3	AIPIAPURE	2	2	100%	2	100,00%
4	AISHIMANA	21	21	100%	21	100,00%
5	ALAINAWOU	5	5	100%	5	100,00%
6	ALIRAPA	16	16	100%	0	0,00%
7	ALITAIMANA	13	0	0%	0	0,00%
8	AMARE	10	10	100%	10	100,00%
9	AMUSHICHOW	5	5	100%	5	100,00%
10	ANAICHON	1	1	100%	1	100,00%
11	ANAICHONKA	8	8	100%	1	12,50%
12	ANARAIPA	8	8	100%	8	100,00%
13	ANUTPALAO	44	43	98%	33	75,00%
14	AREMASAIN	10	10	100%	9	90,00%
15	ASIJUSHEIN	37	37	100%	35	94,59%
16	ASOCIACIÓN HUELLA DE PAZ	59	58	98%	54	91,53%
17	AULAULIA	72	70	97%	70	97,22%
18	BARRANCA	10	10	100%	10	100,00%
19	BELLA VISTA	24	24	100%	24	100,00%
20	CAÑAWATAMANA	5	5	100%	5	100,00%
21	CEURA 2	29	29	100%	29	100,00%
22	CHINGOLITO	3	3	100%	3	100,00%
23	CURARIR	38	38	100%	38	100,00%
24	EL MANGO DE NUEVA AMÉRICA	23	22	96%	17	73,91%
25	FLOR DE SEURA	7	7	100%	7	100,00%
26	GUATUPAIN	3	3	100%	3	100,00%
27	GUAYABAL	7	7	100%	5	71,43%
28	GUAYAVITAL	25	25	100%	25	100,00%
29	HIOTSHI	26	26	100%	26	100,00%
30	IRRAMALII	15	15	100%	15	100,00%
31	ISMAEL CUADRADO RENTERÍA	19	19	100%	19	100,00%
32	ITACA	21	21	100%	21	100,00%
33	JALALOU	3	3	100%	3	100,00%
34	JARAROU	20	20	100%	20	100,00%
35	JATTO	14	14	100%	14	100,00%
36	JAVILLITO	10	10	100%	10	100,00%
37	JAWAPIAKAT	28	28	100%	28	100,00%
38	JEPIRRALU	31	21	68%	0	0,00%
39	JEYUMANA	13	13	100%	0	0,00%
40	JIJITUY	21	20	95%	19	90,48%
41	JIRRUMANA	13	13	100%	13	100,00%
42	JITKAT	6	6	100%	6	100,00%
43	JIYUTCHON	29	29	100%	27	93,10%
44	JONNE	26	24	92%	24	92,31%
45	JUCHIMANA	2	2	100%	2	100,00%
46	JURUJUTSHIMANA	6	6	100%	0	0,00%
47	JUYASIRRAIN	3	3	100%	3	100,00%
48	KACHUTZAO	26	26	100%	26	100,00%
49	KAISHAIPA	5	5	100%	5	100,00%
50	KALAPASHERA	8	6	75%	0	0,00%
51	KALASARRIT	5	5	100%	4	80,00%
52	KASKAJALITO	28	28	100%	28	100,00%
53	KAYUSHUWAIN	7	7	100%	7	100,00%
54	KETPANA	37	36	97%	36	97,30%
55	KIJOMANA	3	3	100%	3	100,00%
56	KOCHINAMANA	34	34	100%	34	100,00%
57	KULIRRILY	17	17	100%	17	100,00%
58	LA FORTUNA	3	3	100%	3	100,00%
59	LA MARAVILLA	7	7	100%	7	100,00%
60	LA PLAYA	73	70	96%	67	91,78%
61	LAS GLORIAS	11	11	100%	10	90,91%
62	LAS PALMITAS	21	21	100%	20	95,24%
63	LOMA FRESCA	10	10	100%	0	0,00%
64	LOS MANGOS	20	20	100%	14	70,00%
65	LUMAKAT	21	21	100%	0	0,00%
66	MACHETZUMANA	21	21	100%	21	100,00%
67	MAKU	22	19	86%	0	0,00%
68	MALAWAIPAA	30	30	100%	30	100,00%
69	MALOUYEN	3	3	100%	3	100,00%

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 10 DE

RESUMEN DE REPLANTEO DEL LOTE 2						
#	COMUNIDADES	BENEFICIARIO	VISITADOS Y DILIGENCIADO	PORCENTAJE DILIGENCIADO	RADICADOS INTERVENOR	AVANCE
70	MARRALA	25	25	100%	25	100,00%
71	MASPALAU	26	26	100%	26	100,00%
72	MONTAÑITA	73	73	100%	72	98,63%
73	MULAMANA	43	43	100%	42	97,67%
74	NUEVA VICTORIA	8	8	100%	8	100,00%
75	NUEVO HORIZONTE	30	30	100%	29	96,67%
76	OROLEE	24	24	100%	23	95,83%
77	OULECHI	14	14	100%	14	100,00%
78	OUTKULEMANA	38	38	100%	38	100,00%
79	PAJANKIRRUMANA	7	0	0%	0	0,00%
80	PALASTOULE	15	14	93%	14	93,33%
81	PALAZUMANA	15	15	100%	15	100,00%
82	PANAMA 2	17	17	100%	0	0,00%
83	PARAGUANA	19	19	100%	0	0,00%
84	PARAÍSO	13	12	92%	0	0,00%
85	PARENS PAREN	26	26	100%	26	100,00%
86	PARRICHON	5	5	100%	5	100,00%
87	PARRITCHON	18	17	94%	16	88,89%
88	PARURUAMANA	6	6	100%	6	100,00%
89	PATILLAL	15	15	100%	15	100,00%
90	PERRAKAT	6	6	100%	6	100,00%
91	PERRANCHON	20	20	100%	19	95,00%
92	PINSKI	101	101	100%	101	100,00%
93	PIRPIR	6	6	100%	6	100,00%
94	QUERRAJULI	23	23	100%	23	100,00%
95	RANCHO NUEVO	1	1	100%	1	100,00%
96	RILEACHON	6	6	100%	5	83,33%
97	RRUANAMANA	18	10	56%	0	0,00%
98	RULEACHON	3	3	100%	3	100,00%
99	SABOURIAPO	27	27	100%	26	96,30%
100	SACALOUSAIN	15	15	100%	15	100,00%
101	SAKALOUSAIN	11	11	100%	0	0,00%
102	SALA'AKAT	14	14	100%	14	100,00%
103	SANTA FE WUNUPARAT	6	6	100%	6	100,00%
104	SARARAO	32	25	78%	0	0,00%
105	SHULEMA	10	9	90%	7	70,00%
106	SINAMANA	41	41	100%	24	58,54%
107	SOLDADO PARATE BIEN	36	0	0%	0	0,00%
108	TAPLAMANA	14	14	100%	14	100,00%
109	TOLO	9	9	100%	9	100,00%
110	TROCOMANA	9	9	100%	9	100,00%
111	TUKUPECHON	32	32	100%	32	100,00%
112	TUUPPECHIMANA	13	13	100%	10	76,92%
113	URRAICHIQUEPU	22	14	64%	0	0,00%
114	USHURU 2	8	8	100%	6	75,00%
115	VILLA LUZ	2	2	100%	2	100,00%
116	VILLA ONE	20	20	100%	20	100,00%
117	WAIKAPARAY	19	19	100%	19	100,00%
118	WAIKAKAT	12	0	0%	0	0,00%
119	WAIIRRAMANA	9	9	100%	0	0,00%
120	WAJALETU	32	32	100%	32	100,00%
121	WAKANAT	13	13	100%	13	100,00%
122	WAMAYAO2	12	12	100%	12	100,00%
123	WANAPAREPO	3	3	100%	3	100,00%
124	WANETURUMANA	22	22	100%	22	100,00%
125	WARARATCHAN	19	19	100%	19	100,00%
126	WARE WAREN	89	75	84%	74	83,15%
127	WARRARALAIN	61	59	97%	59	96,72%
128	WARRARATCHON	11	11	100%	11	100,00%
129	WAYACANAL	28	28	100%	28	100,00%
130	WAYAKANAT	29	29	100%	26	89,66%
131	WOTTOIN	17	17	100%	17	100,00%
132	WUNUPARAT	15	13	87%	13	86,67%
133	YOULEJUNAY	57	56	98%	56	98,25%
134	YOUYOUUPANA	24	24	100%	24	100,00%
135	ZAPATAMANA	24	23	96%	23	95,83%
136	ZENUY	11	11	100%	10	90,91%
TOTALES		2674	2510	94%	2198	82,20%

 UNIÓN TEMPORAL ENERGÉTICA LOTE 2	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 11 DE

3.1.2.3. MODIFICACIONES DEL REPLANTEO

No se han realizado ajustes a los lineamientos de las especificaciones del replanteo

3.1.2.4. INFORME FINAL DE REPLANTEO

Con el avance hasta la fecha de corte del presente informe, no se alcanza el 100% del replanteo

3.1.3. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NACIONALES

3.1.3.1. RESUMEN EJECUTIVO

La Unión Temporal ha comenzado las gestiones con sus proveedores certificados para la adquisición de los materiales de producción nacional para la obra civil y para la parte eléctrica. Los elementos prefabricados como postes y gabinetes serán programados por lotes.

3.1.3.2. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (%) DE AVANCE) CON BASE A LOS HITOS DEL APU

La adquisición de los equipos esta programada para el mes de mayo, por lo cual no se presentan avances en este periodo.

3.1.3.3. SOPORTES (FACTURAS – PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN RETIE SE DEBEN ANEXAR LOS CERTIFICADOS.

No aplica para este informe.

3.1.4. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INTERNACIONALES

3.1.4.1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NEGOCIACIÓN DE EQUIPOS *NOTA DEBE CUMPLIR CON LO ESIPULADO EN EL ANTICIPO

. No aplica para este informe.

3.1.4.2. FABRICACIÓN DE EQUIPOS (SOPORTES DEL ESTADO, TIEMPOS DE ENTREGA, ETC)

No aplica para este informe.

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 12 DE

3.1.4.3. TRANSPORTE DE EQUIPOS - **ACTIVIDAD SIN AVANCE**

No aplica para este informe

3.1.4.4. NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS

No aplica para este informe

3.1.5. TRANSPORTE A SITIO

3.1.5.1. CENTRO DE ACOPIO LOCAL – BODEGA EN COLOMBIA

Se tiene la logística en campo para comenzar a recibir los materiales en centro poblado para su distribución posterior.

3.1.5.2. TRASLADO A COMUNIDADES - **ACTIVIDAD SIN AVANCE**

Una vez se comience la etapa constructiva se comenzarán a distribuir los materiales a cada vivienda individual desde el centro de Acopio utilizando los servicios locales de transporte concertados con las autoridades tradicionales.

Este traslado será sistemático y programado de acuerdo con la llegada de los equipos y materiales.

3.1.5.3. CUADRO RESUMEN MATERIALES - **ACTIVIDAD SIN AVANCE**

No aplica para este periodo presentado.

VER ANEXO 1 – CUADRO CONTROL

UBICACIÓN DE EQUIPOS - SISTEMAS SOLARES INDIVIDUALES													
EQUIPOS	CANTIDAD	EN FABRICACION	% AVANCE	EN PUERTO ò NACIONALIZACION	% AVANCE	EN BODEGA PRINCIPAL	% AVANCE	EN BODEGA ZONA PROYECTO	% AVANCE	EN VEREDAS	% AVANCE	ENTREGADO A USUARIO	% AVANCE
Instalaciones Internas	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
SPT	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gabinetes individuales	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Baterías Individuales	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Inversores individuales	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Controladores individuales	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Paneles X2	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Postes metalicos	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Estructuras	2674	802	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
		MATERIALES FARICADOS	0%	MATERIALES NACIONALIZADOS	0%	MATERIALES EN BODEGA	0%	MATERIALES EN BODEGA DE ZONA	0%	MATERIALES EN VEREDAS	0%	MATERIAL ENTREGADO A USUARIOS	0%

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 13 DE

3.2. ETAPA DE EJECUCIÓN

3.2.1. AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

3.2.1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE MENSUAL

Las actividades de Replanteo representan el avance mas significativo del presente periodo, resaltando la celeridad y la efectividad de la información utilizando la plataforma digital de LUDYCOM, que nos permite obtener la información en tiempo real de la toma de registros en campo, contando con la experiencia del personal asignado a esta labor.

Las gestiones de adquisición de equipos importados se encuentran a la espera de las evaluaciones a la oferta presentada, para iniciar la importación del 1 30% de las unidades requeridas. Los materiales nacionales están gestionados con los proveedores locales y una vez definidos los usuarios finales validados se comienzan las actividades de acuerdo con el cronograma que se apruebe.

3.2.1.2. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ENLISTAR UNA A UNA LAS OBLIGACIONES Y EL AVANCE DE ESTAS EN EL MES DE REPORTE DEL INFORME)

ÍTEM	ACTIVIDAD	COMIENZA	TERMINA	ESTADO
	Presentación y aceptación de ingeniería de detalle	24/04/2026	7/05/2026	CUMPLIDA
	Presentación de equipos y materiales	24/04/2026	7/05/2026	CUMPLIDA
	Presentación de órdenes de compra	8/05/2026	14/05/2026	EN EJECUCION
	Contratación de personal	20/03/2026	27/03/2026	PENDIENTE
1.	Replanteo de Obra	20/03/2026	18/06/2026	
1.1	Replanteo - visitas a usuarios - procesamiento de información	20/03/2026	7/05/2026	CUMPLIDA
1.2	Presentación de Informe de Replanteo	8/05/2026	14/05/2026	EN EJECUCION
1.3	Validación de usuarios nuevos por entes terceros	15/05/2026	11/06/2026	PENDIENTE
1.4	Aprobación de usuarios nuevos	12/06/2026	25/06/2026	PENDIENTE

3.2.1.3. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (%) DE AVANCE)

FECHA DE REPORTE	REPORTE	Usuarios	Internas		Hincado Poste y Cimentaciones		Instalacion Estructura y Paneles solares		Gabinetes		Acometida subterranea		Sistema Puesta a tierra		Batería		Inversor y controlador		Sistema de Medicion		USUARIO ENERGIZADO	
			EJECUTAD O-1	%avance-1	EJECUTAD O-2	%avance-2	EJECUTAD O-3	%avance-3	EJECUTAD O-4	%avance-4	EJECUTAD O-5	%avance-5	EJECUTAD O-6	%avance-6	EJECUTAD O-7	%avance-7	EJECUTAD O-8	%avance-8	EJECUTAD O-9	%avance-9	EJECUTAD O-10	%avance-10
25/04/2026	1	2674	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

 UNIÓN TEMPORAL ENERGÉTICA — LOTE 2 —	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 14 DE

3.2.1.4. REPORTE DE DIFICULTADES

Solamente se han reportado condiciones puntuales de orden público que han restringido la movilidad de los funcionarios en la zona

3.2.1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION: Reunión de inicio de Replanteo

LOCALIZACION: Comunidad de Pinski



DESCRIPCION: Recoleccion de información de registros

LOCALIZACION: Comunidad Maku

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 15 DE



DESCRIPCION: Equipos electrónico-satelitales para replanteo

LOCALIZACION: Centro de acopio de información sede Barranquilla



DESCRIPCION: Reporte de lluvias que atrasan las actividades

LOCALIZACION: Zona rural municipio Maicao acceso a comunidades cuatro vías

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 16 DE

3.3. ETAPA DE CIERRE

3.3.1. PROCESO DE ENTREGA DE OBRA

3.3.1.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ENTREGA DE ACTAS VALIDADAS POR LA INTERVENTORIA

Solamente se ha suscrito el Acta de Inicio el día 22 de Abril de 2026 .

3.3.1.2. REPORTE CUANTITATIVO DE USUARIOS ENTREGADOS

No aplica para este periodo.

3.3.1.3. ENTREGA DE INVENTARIOS (ANEXO ARCHIVO EXCEL)

4. No aplica para este periodo.

5. COMPONENTE FINANCIERO

5.1. REPORTE DETALLADO FINANCIERO

A la fecha de corte de el presente informe no se reportan pagos, por lo cual está la totalidad del recurso financiero disponible.

PLAN DE PAGOS CONTRACTUAL						
CONTRATO	DG-082-2026	# DE USUARIOS	2674	MES	INFORME No	
VALOR CONTRACTUAL	\$ 75.460.584.054,00	VR.IVA	\$ 540.834.061,00	ABRIL 2026	01	
DESCRIPCION DEL PAGO	%	VALOR DEL PAGO	AMORTIZACION	REQUISITO BASE	NETO	PAGO A LA FECH
ANTICIPO	40%	29.967.899.997,20	0 SIN INCLUIR IVA		29.967.899.997,20	\$ -
PRIMER PAGO	15%	11.319.087.608,10	4.495.184.999,58	10% DE USUARIOS INSTALADOS 267	6.823.902.608,52	\$ -
SEGUNDO PAGO	25%	18.865.146.013,50	7.491.974.999,30	40% DE USUARIOS INSTALADOS 1070	11.373.171.014,20	\$ -
TERCER PAGO	20%	15.092.116.810,80	5.993.579.999,44	60% DE USUARIOS INSTALADOS 1604	9.098.536.811,36	\$ -
CUARTO PAGO	20%	15.092.116.810,80	5.993.579.999,44	100% DE USUARIOS INSTALADOS 2674	9.098.536.811,36	\$ -
QUINTO PAGO	20%	15.092.116.810,80	5.993.579.999,44	ACTA DE LIQUIDACION	9.098.536.811,36	\$ -
		29.967.899.997,20			75.460.584.054,00	\$ -

 UNIÓN TEMPORAL ENERGÉTICA LOTE 2	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 17 DE

6. COMPONENTE AMBIENTAL

6.1. ETAPA PREVIA

6.1.1. TRÁMITE DE CERTIFICADOS ANTE ENTIDADES

No se requieren para este proyecto

6.1.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA

Se están elaborando las fichas para la presentación del Plan completo antes del inicio de la etapa de construcción

6.2. ETAPA DE EJECUCIÓN

6.2.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se completo la entrega de la documentación del equipo ambiental, actualmente se están atendiendo las observaciones recibidas para integrar las modificaciones correspondientes y dar cumplimiento a los requisitos solicitados.

6.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION: Aspecto general de la zona del proyecto

LOCALIZACION: Municipio de Albania

 UNIÓN TEMPORAL ENERGÉTICA — LOTE 2 —	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 18 DE

7. COMPONENTE SOCIAL

7.1. ETAPA PREVIA

7.1.1. PLAN DE MANEJO SOCIAL

El Plan de Manejo Plan de Manejo Social (PMS), se radico para su aprobación, no se presentan más avances con corte al periodo reportado.

7.1.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES

En etapa de elaboración para aprobación.

7.2. ETAPA DE EJECUCIÓN

7.2.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron reuniones preliminares con el Residente y el Representante Legal con las autoridades Tradicionales Ancestrales para informarles el comienzo de las actividades preliminares de Replanteo y acordar la fecha de la socialización inicial

7.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION: Reuniones preliminares con Autoridades Tradicionales

LOCALIZACION: asociación Huellas de Paz

 UNIÓN TEMPORAL ENERGÉTICA — LOTE 2 —	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 19 DE

7.3. ETAPA DE CIERRE

7.3.1. SOCIALIZACIÓN FINAL Y CIERRE

No aplica para este periodo

8. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se esta realizando el proceso de vinculación del equipo mínimo de trabajo para iniciar las actividades

8.2. REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:
LOCALIZACION:

8.3. PLANILLAS DE PARAFISCALES MES A MES

No aplica para este periodo.

	INFORME MENSUAL PERIODO ABRIL 2026	UT ENERGETICA LOTE 2
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 04/05/2026
		PÁGINA 21 DE

9.1. CUADRO DE EXCEL CON AVANCE

ÍTEM	ACTIVIDAD	COMIENZA	TERMINA	AVANCE ACTIVIDAD
	Presentación y aceptación de ingeniería de detalle	24/04/2026	7/05/2026	100%
	Presentación de equipos y materiales	24/04/2026	7/05/2026	100%
	Presentación de órdenes de compra	8/05/2026	14/05/2026	30%
	Contratación de personal	20/03/2026	27/03/2026	0%
1.	Replanteo de Obra	20/03/2026	18/06/2026	
1.1	Replanteo - visitas a usuarios - procesamiento de información	20/03/2026	7/05/2026	94%
1.2	Presentación de Informe de Replanteo	8/05/2026	14/05/2026	0%
1.3	Validación de usuarios nuevos por entes terceros	15/05/2026	11/06/2026	N/A
1.4	Aprobación de usuarios nuevos	12/06/2026	25/06/2026	N/A

9.2. CURVA S

No aplica para este periodo.

9.3. FACTOR DE ATRASO

Para este periodo correspondiente al 22 al 25 de Abril se hicieron actividades de replanteo, las cuales no tuvieron atrasos significativos, solo los previsibles por algunas lluvias sectorizadas.

10. CONCLUSIONES

El Avance obtenido en las actividades de Replanteo es lo que se alcanza a reportar en este periodo, la información obtenida en campo se procesa en tiempo real y se radica de inmediato a la interventoría, con lo cual se agiliza notablemente esta actividad, pudiéndose programar en una fecha cercana (2 de mayo) la Reunión de socialización inicial y dar comienzo a las actividades de avance físico.

GERMAN GUTIERREZ ARJONA

REPRESENTANTE LEGAL
