

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	991 de 2021	Contratista:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Contrato de Interventoría No.	985 de 2021	Interventoría:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

INFORME MENSUAL No.	60	MES O PERIODO:	may-26
---------------------	----	----------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Items no previstos		35
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		48
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	60
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	76
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	80
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	144
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	148
4.6	Resumen ensayo de laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	152
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	536
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	542
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		829
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	830
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	832
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	833
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	845
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	856
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	857
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		885
5.1	Información general del contrato		885
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		886
5.3	Informes especialistas y profesionales		926
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1020
5.5	Informe matriz de riesgos.		1021
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1037
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		1037
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1038
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1039
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1042
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1055
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1058
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1063
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1070
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1071
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	1073
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1075
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		1086
8	Anexos		1090
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1090
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1105
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1282
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1289

Nota:

Firma:
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0815 de fecha 17 DE MARZO 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 93.735.215.241	MANO DE OBRA CALIFICADA:	148
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 96.562.691.715	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	132
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	103.02%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	90
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	370
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 25 May 2024 10:27:30 a.m. PR05+445 Ruta 6504, Suministro e instalación de MDC-19		 PR10+900 Ruta 3001, Instalacion de mallá de alta resistencia para estabilización de talud	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
Firma Nombre: WILSON-ANDRÉS PARRA MORALES Director de Interventoría Matrícula No. : 15202138865BYC Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial			



INFORME MENSUAL N°60

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2026**



LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Esquema de localización	5
Ilustración 2 - Esquema de Localización	6
Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio	9
Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas	9



LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato de Obra	11
Tabla 2 Información Contrato Interventoría	57
Tabla 3. Correspondencia Enviada Interventor al Contratista	105
Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista	111



1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 58 de Interventoría, realizado por el CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030, donde se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2026, en desarrollo del Contrato de Obra N° 991 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

A través de este informe se presenta el proceso técnico, predial, administrativo, financiero y ambiental sostenible de la obra, con el fin de informar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) como entidad Contratante, el cumplimiento de las actividades técnicas, administrativas y financieras contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

Se anexan los aspectos más relevantes de la correspondencia enviada y recibida, los registros requeridos para el seguimiento y supervisión de obra y control del sistema de gestión integrada.



2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

2.1 LOCALIZACIÓN

Los trabajos se llevan a cabo partiendo del Municipio de Neiva –San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá.


Ilustración 1 - Esquema de localización



Fuente: Web Google Earth



Ilustración 2 - Esquema de Localización

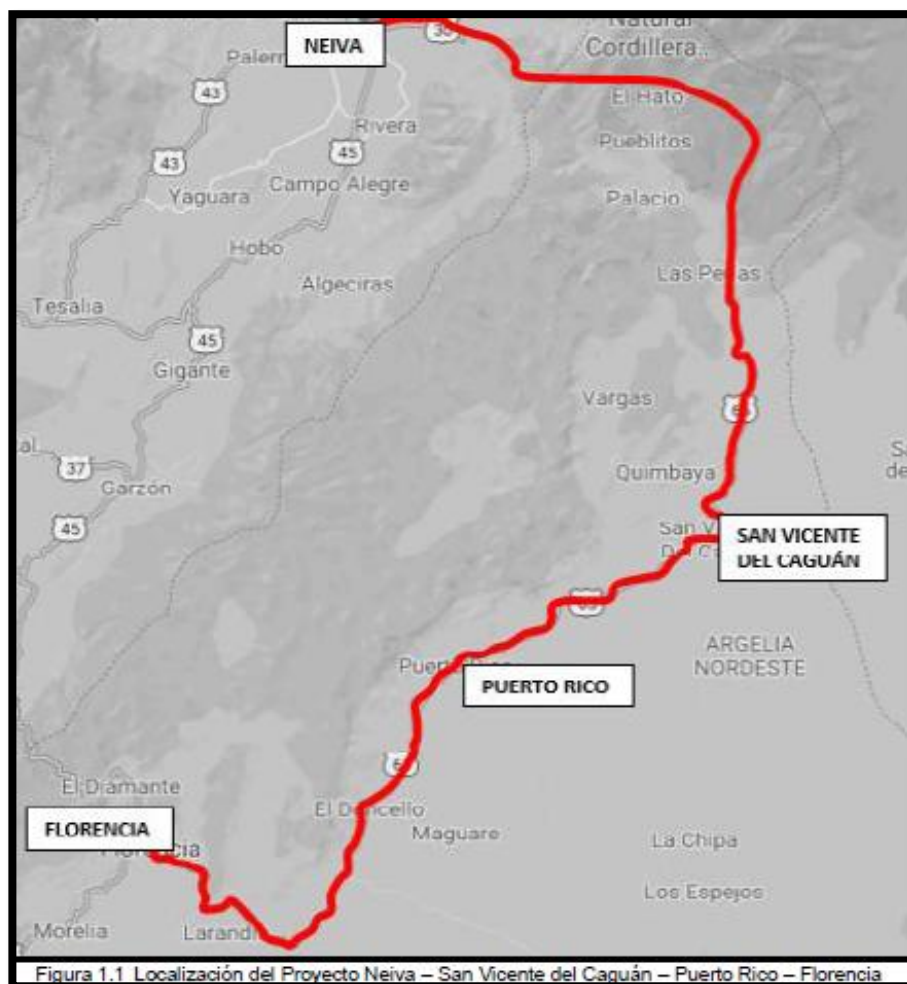

Fuente: Anexo N°1 – Anexo Técnico Modulo 1

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, es una vía nacional que brinda conexión al occidente de Caquetá con la Troncal del Magdalena a la altura de Neiva y, a través de esta, con el centro y norte del país. Los municipios del área de influencia directa son: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita y Florencia en el departamento del Caquetá y Neiva en el departamento del



Huila, el corredor está comprendido por la Región Andina y Amazónica de Colombia, con grandes riquezas naturales en dónde los principales cultivos son de maíz, frijol, patilla (sandia), plátano, café y yuca, de igual manera se observa ganadería extensiva (siendo esta zona una de las que más aporta ganado en pie al interior del país) y algunos espacios para el manejo de especies menores como cerdos, ovinos, caprinos, aves de corral (pollos y gallinas para producción de huevo y carne). Trabajo de campo equipo social.

Estos departamentos están habitados por diferentes comunidades y culturas indígenas; alrededor del corredor vial se puede encontrar el Volcán del Puracé, el Nevado del Huila, el Páramo de Sumapaz, la Zona plana del Río Magdalena, y sobre el corredor atraviesa el parque regional Iberia Ceibas ubicado en la ruta 3001 entre el PR31+713 y el PR47+924. La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 343 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.

El corredor objeto de intervención del contrato de referencia está conformado por varias rutas, la ruta 30 que está dividida en la 3001 y 3002 las cuales están conformadas de la siguiente manera: RUTA 3001: Neiva - Balsillas: Tramo que atraviesa lugares como Neiva, La Victoria (Neiva), Santa Helena (Neiva) y Balsillas (Límite Caquetá) en Huila. RUTA 3002: Balsillas - Mina Blanca: Tramo que atraviesa lugares como Balsillas (Límite Huila), Rovira (San Vicente del Caguán, Acceso), Guayabal (San Vicente del Caguán), Perlas II (San Vicente del Caguán), Mina Blanca (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Entre Mina Blanca (San Vicente del Caguán), Río Caguán (San Vicente del Caguán) , Yarí (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Dentro del área de intervención también se encuentra la Ruta 65, en los tramos 3 y 4 comprende la ciudad de Florencia involucrando como área directa a 500 metros los municipios El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, esta ruta se encuentra dividida de la siguiente manera: Ruta 6503: Florencia – Puerto Rico Ruta 6504: Puerto Rico – Minas Blanca.

Con la ejecución de esta obra en una zona afectada significativamente por el conflicto armado colombiano, la débil presencia institucional, se beneficia a más de 250.000 habitantes del departamento del Caquetá, que podrán acceder a servicios básicos como salud, educación y ofertas institucionales que se garantizan en las cabeceras municipales, de igual manera permite que la comercialización de los productos que se hagan en menor tiempo y con calidad, ya que los tiempos de transitabilidad se optimizan.



De igual manera se valorizan los predios de estas zonas y se mejora la calidad de vida y la seguridad de quienes residen en estas zonas.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 344 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, Tiene una longitud de 344 km, de vía y presenta la siguiente de distribución:

- Ruta 6503: Del PR0+000 (Florencia) al PR96+763 (Puerto Rico) los cuales presenta 72 kilómetros de vía en pavimento natural y 24,2 en Afirmado.
- Ruta 6504: Del PR0+000 (Puerto Rico) al PR81+000 (Mina Blanca) cuentan con tratamiento superficial Asfaltita.
- Ruta 3002: Del PR111+000 (Mina Blanca) al PR0+000 (Balsillas) presenta 55,27km con tratamiento de Asfaltita y 57,052 km en afirmado.
- Ruta 3001: Del PR54+000 (Balsillas) al PR0+000 (Neiva), en pavimento flexible se cuenta con 10,5 km y 43,5 en afirmado.

El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial “Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia” en el Departamentos de Huila y Caquetá, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, En el Primer se entrega el informe de revisión de los diseños iniciales.
- Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 47.0 kilómetros.
- Mantenimiento y rehabilitación.
- Atención de Emergencias, (Deslizamientos, Perdida de Banca etc.)

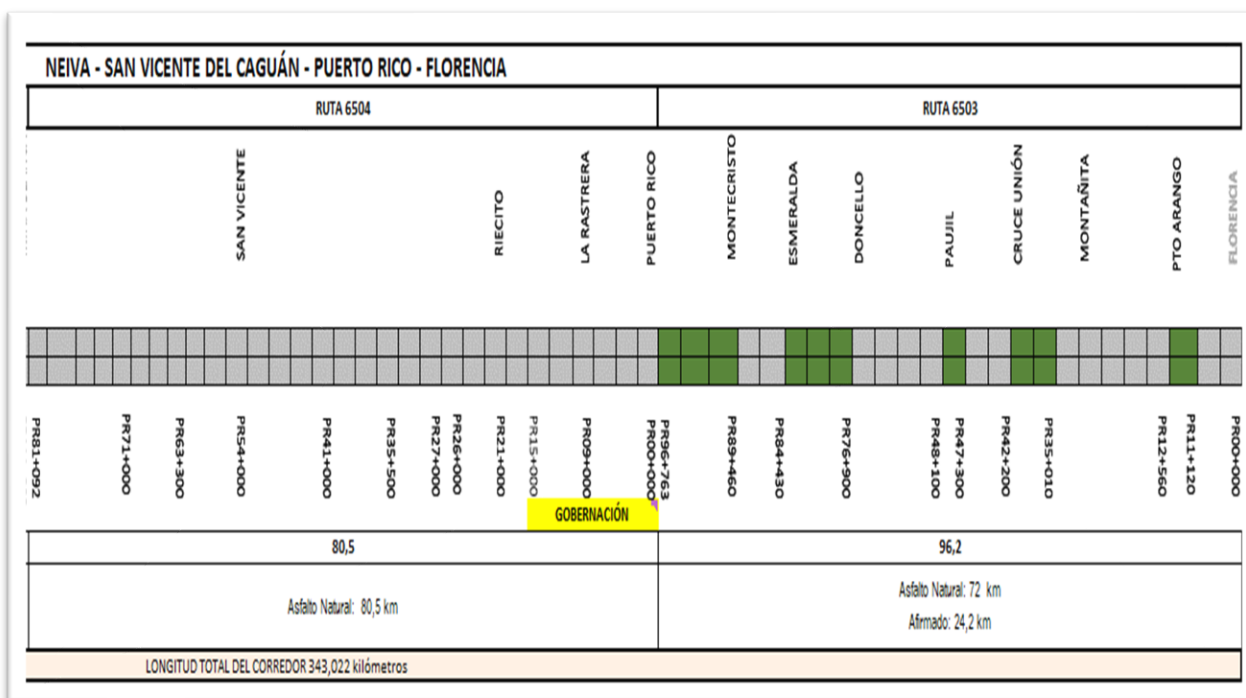



Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio

Municipio	Long.	%
NEIVA	47.91	13.97%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	47.91	13.97%
Municipio	Long.	%
FLORENCIA	18.45	5.38%
MONTAÑITA	23.45	6.84%
PAUJIL	14.85	4.33%
DONCELLO	18.28	5.33%
PUERTO RICO	50.23	14.65%
SAN VICENTE DEL CAGUAN	169.68	49.49%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	294.94	86.03%
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR	342.85	100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas



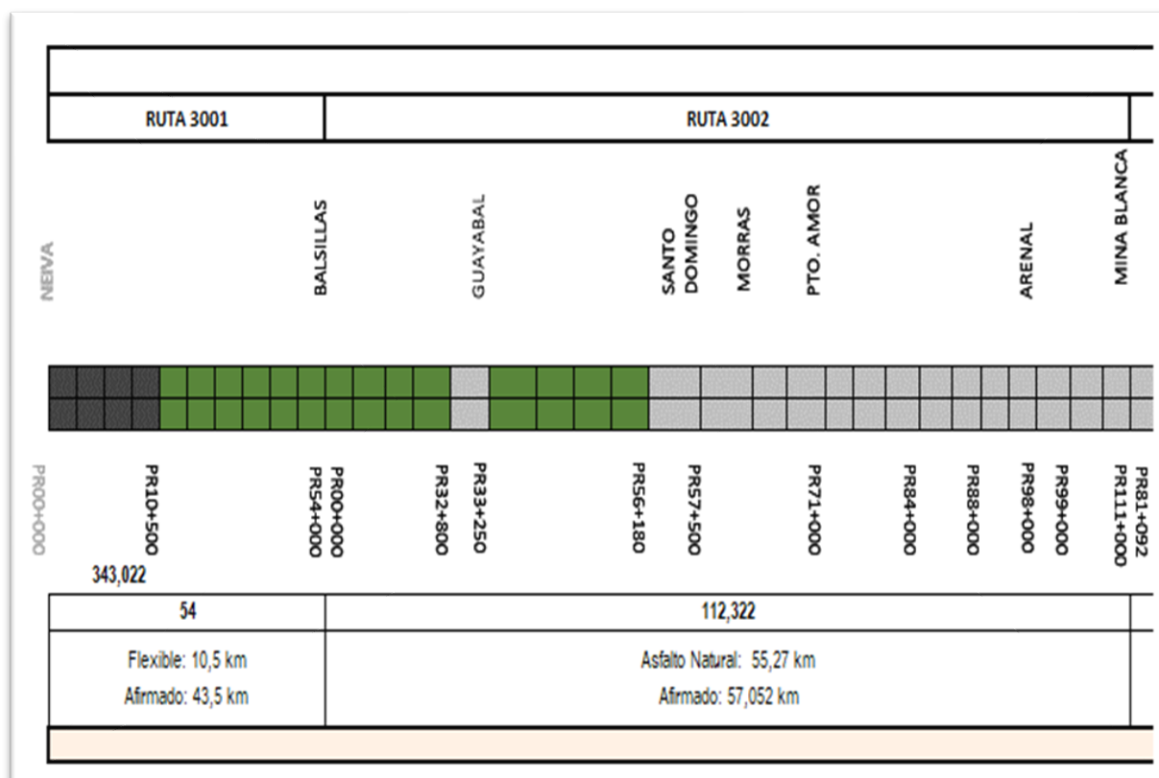

Fuente: Legalidad Neiva- San Vicente del Caguán



3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra No 991 de 2021. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

Tabla 1. Información Contrato de Obra

CTO DE OBRA No.	Contrato de Obra No 991 de 2021		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES



FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR INICIAL CTO.	\$399.567.436.436 M/CTE,	VALOR ANTICIPO.	\$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	\$9.885.528.230 M/CTE	VALOR ADICIÓN 2	\$3.600.000.000 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CTO.	\$413.052.964.666 M/CTE		

Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades:

✓ RUTA 6503, FLORENCIA – PUERTO RICO

- Suministro, instalación y compactación de Terraplén.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR38+085	PR38+259	Calzada completa	Acceso Sur a puente

- Suministro e instalación de Manto TRM 500 para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR38+300	PR38+400	Derecho	Muro mecánicamente estabilizado
PR38+305	PR38+400	Izquierdo	Muro mecánicamente estabilizado



- Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras.

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR38+303	PR38+303	Calzada completa	Placa de aproximación E2
PR38+303	PR38+303	Carril izquierdo	Barrera New Jersey placa de aproximación E2
PR38+303	PR38+303	Carril derecho	Barrera New Jersey placa de aproximación E2
PR38+307	PR38+317	Izquierdo	Barrera New Jersey – M1
PR38+317	PR38+327	Izquierdo	Barrera New Jersey – M2
PR38+327	PR38+337	Izquierdo	Barrera New Jersey – M3
PR38+337	PR38+347	Izquierdo	Barrera New Jersey – M4
PR38+347	PR38+357	Izquierdo	Barrera New Jersey – M5
PR38+357	PR38+367	Izquierdo	Barrera New Jersey – M6
PR38+367	PR38+377	Izquierdo	Barrera New Jersey – M7
PR38+377	PR38+387	Izquierdo	Barrera New Jersey – M8
PR38+387	PR38+397	Izquierdo	Barrera New Jersey – M9
PR38+397	PR38+407	Izquierdo	Barrera New Jersey – M10
PR38+407	PR38+417	Izquierdo	Barrera New Jersey – M11
PR38+417	PR38+427	Izquierdo	Barrera New Jersey – M12
PR38+427	PR38+437	Izquierdo	Barrera New Jersey – M13
PR38+465	PR38+475	Izquierdo	Barrera New Jersey – M17
PR38+475	PR38+485	Izquierdo	Barrera New Jersey – M18



PR38+485	PR38+495	Izquierdo	Barrera New Jersey – M19
PR38+495	PR38+505	Izquierdo	Barrera New Jersey – M20
PR38+505	PR38+515	Izquierdo	Barrera New Jersey – M21
PR38+515	PR38+525	Izquierdo	Barrera New Jersey – M22
PR38+301	PR38+311	Derecho	Barrera New Jersey – M1
PR38+311	PR38+321	Derecho	Barrera New Jersey – M2
PR38+321	PR38+331	Derecho	Barrera New Jersey – M3
PR38+331	PR38+341	Derecho	Barrera New Jersey – M4
PR38+341	PR38+351	Derecho	Barrera New Jersey – M5
PR38+351	PR38+361	Derecho	Barrera New Jersey – M6
PR38+361	PR38+371	Derecho	Barrera New Jersey – M7

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR38+303	PR38+303	Calzada completa	Placa de aproximación puente E2
PR38+990	PR38+990	Carril derecho	Estructura descole alcantarilla

- Construcción de barrera New Jersey en concreto de resistencia 28 MPa.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR38+215	PR38+225	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M15



PR38+235	PR38+245	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+255	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M17
PR38+255	PR38+256	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M18
PR38+155	PR38+165	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M8
PR38+165	PR38+175	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M9
PR38+175	PR38+185	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M10
PR38+185	PR38+195	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+249	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M17
PR38+307	PR38+317	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M1
PR38+317	PR38+327	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M2
PR38+327	PR38+337	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M3
PR38+337	PR38+347	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M4
PR38+347	PR38+357	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M5
PR38+357	PR38+367	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M6
PR38+367	PR38+377	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M7



PR38+377	PR38+387	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M8
PR38+387	PR38+397	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M9
PR38+397	PR38+407	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M10
PR38+465	PR38+475	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M17
PR38+475	PR38+485	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M18
PR38+485	PR38+495	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M19
PR38+495	PR38+505	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M20
PR38+505	PR38+515	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M21
PR38+515	PR38+525	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M22
PR38+215	PR38+225	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+255	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M17
PR38+255	PR38+256	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M18
PR38+185	PR38+195	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M16



PR38+245	PR38+255	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M17
PR38+255	PR38+256	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M18
PR38+155	PR38+165	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M8
PR38+165	PR38+175	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M9
PR38+175	PR38+185	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M10
PR38+185	PR38+195	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+249	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M17
PR38+085	PR38+095	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M1
PR38+095	PR38+105	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M2
PR38+105	PR38+115	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M3
PR38+115	PR38+125	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M4
PR38+125	PR38+135	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M5
PR38+135	PR38+145	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M6
PR38+145	PR38+155	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M7
PR38+155	PR38+165	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M8



PR38+165	PR38+175	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M9
PR38+175	PR38+185	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M10
PR38+185	PR38+195	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+249	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M17
PR38+259	PR38+259	Izquierdo	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+259	PR38+259	Derecho	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+303	PR38+303	Izquierdo	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+303	PR38+303	Derecho	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+307	PR38+317	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M1
PR38+317	PR38+327	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M2
PR38+465	PR38+475	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M17



PR38+475	PR38+485	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M18
----------	----------	-----------	-------------------------------

- Excavación sin clasificar de la explanación y canales.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR38+000	PR38+055	Calzada completa	Subrasante

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR38+000	PR38+055	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR38+000	PR38+055	Calzada completa

- Suministro e instalación de afirmado.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR38+990	PR38+990	Derecho	Relleno sobre muro y aletas alcantarilla

- Imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) en actividades de mantenimiento vial.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR37+760	PR38+020	Calzada completa	Primera capa
PR38+625	PR41+430	Calzada completa	Primera capa

- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 en actividades de mantenimiento vial.



PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR36+130	PR36+230	Carril izquierdo	Primera capa
PR36+670	PR36+740	Carril derecho	Primera capa
PR37+760	PR38+020	Calzada completa	Primera capa
PR38+625	PR41+430	Calzada completa	Primera capa

✓ **RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA**

- Replanteo eje de alineamiento, levantamiento topográfico inicial para cálculo de cantidades de excavación en construcción de obras hidráulicas.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR00+454	PR00+454	Derecho	Estructura box culvert
PR05+735	PR05+735	Izquierdo	Estructura box culvert
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Estructura box culvert
PR09+874	PR09+874	Derecho	Estructura alcantarilla

- Demolición de estructuras existentes.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR00+454	PR00+454	Derecho	Estructura box culvert
PR05+735	PR05+735	Izquierdo	Estructura box culvert
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Estructura box culvert
PR09+874	PR09+874	Derecho	Estructura alcantarilla
PR09+916	PR09+960	Derecho	Cuneta



PR09+925	PR10+000	Izquierdo	Cuneta
----------	----------	-----------	--------

- Remoción de alcantarillas.

PR	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR06+875	Izquierdo	Tubería - Alcantarilla
PR09+872	Derecho	Tubería - Alcantarilla

- Excavación sin clasificar de la explanación y canales.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR09+853	PR09+862	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+864	PR09+870	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+850	PR10+000	Calzada completa	Subrasante

- En conjunto comisión topográfica de contratista e interventoría hacen medición y cálculo de cantidades de excavación.
- Excavación sin clasificar para construcción de obras hidráulicas.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura y tubería encoleta alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Descole box culvert
PR08+027	PR08+095	Derecho	Filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Filtro
PR08+253	PR08+264	Izquierdo	Muro de contención
PR09+866	PR09+874	Derecho	Estructura descole alcantarilla



- Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación en los siguientes tramos:

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR09+853	PR09+862	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+864	PR09+870	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+850	PR10+000	Calzada completa	Subrasante
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura y tubería encoleta alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Descole box culvert
PR08+027	PR08+095	Derecho	Filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Filtro
PR08+253	PR08+264	Izquierdo	Muro de contención
PR09+866	PR09+874	Derecho	Estructura descole alcantarilla

- Suministro e instalación de afirmado.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Relleno sobre tubería alcantarilla
PR09+872	PR09+872	Derecho	Relleno sobre tubería alcantarilla
PR09+853	PR09+862	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+864	PR09+870	Izquierdo	Mejoramiento de fallo



- Suministro e Instalación de Geotextil no tejido.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Suministro e instalación de Tubería perforada 4".

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Suministro e Instalación de Material granular drenante.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular.



LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+320	Calzada completa
PR03+324	PR03+330	Calzada completa
PR07+915	PR07+915	Acceso a predio
PR09+700	PR09+830	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+320	Calzada completa
PR03+324	PR03+330	Calzada completa
PR07+915	PR07+915	Acceso a predio
PR09+700	PR09+830	Calzada completa

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+330	Calzada completa
PR07+100	PR07+370	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+330	Calzada completa
PR07+100	PR07+370	Calzada completa

- Imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1).

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR03+298	PR03+300	Carril izquierdo	Primera capa
PR03+300	PR03+331	Calzada completa	Primera capa



PR03+331	PR03+332	Carril Derecho	Primera capa
PR05+620	PR05+714	Calzada completa	Primera capa
PR06+180	PR06+764	Calzada completa	Primera capa
PR06+764	PR06+790	Carril Derecho	Primera capa
PR03+290	PR03+295	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+295	PR03+335	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+335	PR03+337	Carril Derecho	Segunda capa
PR05+440	PR05+705	Calzada completa	Segunda capa
PR03+230	PR03+283	Carril Derecho	Tercera capa
PR03+283	PR03+341	Calzada completa	Tercera capa
PR03+341	PR03+343	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+394	PR05+439	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+439	PR05+696	Calzada completa	Tercera capa

- Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR03+380	PR03+380	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+390	PR03+390	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+298	PR03+300	Carril izquierdo	Primera capa
PR03+300	PR03+331	Calzada completa	Primera capa
PR03+331	PR03+332	Carril Derecho	Primera capa
PR05+620	PR05+714	Calzada completa	Primera capa
PR06+180	PR06+764	Calzada completa	Primera capa
PR06+764	PR06+790	Carril Derecho	Primera capa
PR03+290	PR03+295	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+295	PR03+335	Calzada completa	Segunda capa
PR03+335	PR03+337	Carril Derecho	Segunda capa
PR05+440	PR05+705	Calzada completa	Segunda capa
PR03+230	PR03+283	Carril Derecho	Tercera capa
PR03+283	PR03+341	Calzada completa	Tercera capa
PR03+341	PR03+343	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+394	PR05+439	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+439	PR05+696	Calzada completa	Tercera capa



- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR03+380	PR03+380	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+390	PR03+390	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+298	PR03+300	Carril izquierdo	Primera capa
PR03+300	PR03+331	Calzada completa	Primera capa
PR03+331	PR03+332	Carril Derecho	Primera capa
PR05+620	PR05+714	Calzada completa	Primera capa
PR06+180	PR06+764	Calzada completa	Primera capa
PR06+764	PR06+790	Carril Derecho	Primera capa
PR03+290	PR03+295	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+295	PR03+335	Calzada completa	Segunda capa
PR03+335	PR03+337	Carril Derecho	Segunda capa
PR05+440	PR05+705	Calzada completa	Segunda capa
PR03+230	PR03+283	Carril Derecho	Tercera capa
PR03+283	PR03+341	Calzada completa	Tercera capa
PR03+341	PR03+343	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+394	PR05+439	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+439	PR05+696	Calzada completa	Tercera capa

- Instalación de tubería de concreto reforzado diámetro 36".

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR06+875	Izquierdo	Tubería	Alcantarilla
PR09+872	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de obras.

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR08+098	Izquierdo	Solado de limpieza caja encole	Alcantarilla



PR08+253	Izquierdo	Solado zarpa	Muro de contención
PR08+280	Izquierdo	Solado zarpa	Muro de contención

- Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras.

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR00+454	Derecho	Placa inferior y muros	Box culvert
PR08+098	Izquierdo	Estructura encole	Alcantarilla
PR08+253	Izquierdo	Zarpa y vástago	Muro de contención
PR08+280	Izquierdo	Zarpa y vástago	Muro de contención

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto.

PR	COSTADO / CARRIL	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR06+875	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR07+858	Izquierdo	Muro y aletas	Alcantarilla
PR07+858	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR08+098	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR08+098	Izquierdo	Muro caja	Alcantarilla
PR08+253	Izquierdo	Zarpa y vástago	Muro de contención

✓ RUTA 3002, BALSILLAS – MINAS BLANCAS

- Se realiza remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias en las siguientes abscisas:



ABSCISA
PR16+700
PR19+100
PR19+680
PR21+364
PR25+565
PR26+900
PR27+762
PR28+265
PR29+000
PR32+393
PR36+512
PR36+525
PR36+850
PR37+000
PR37+285
PR39+500
PR39+925
PR41+500
PR41+900
PR43+550
PR44+000
PR44+287
PR45+025
PR45+150
PR45+508
PR47+000



PR48+400

✓ **ruta 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realiza demolición de estructuras de drenaje existentes en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR15+620	Izquierdo
PR15+780	Izquierdo

- Se realiza remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias en las siguientes abscisas:

ABSCISA
PR29+195
PR31+027
PR32+250
PR32+323
PR34+300
PR34+330
PR34+500
PR34+750
PT37+000

- Se realiza excavación mecánica, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO	OBSERVACIONES
PR15+772-PR15+798	Derecho	Excavación mecánica cajeo aproximación a subrasante Carril derecho
PR 15+802	Derecho	Excavación Mecánica para la construcción de box culvert, cuerpo medio hacia descole



- Se realiza relleno en recebo de las estructuras (obras de arte), en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO	OBSERVACIONES
PR15+802	Derecho	Suelo de fundación box culvert

- Se realiza suministro e instalación de concreto de 14 Mpa, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO	OBSERVACIONES
Alcantarilla PR15+960	Margen derecho	- Solado para apoyo de tubería - Solado para placa de descole - Solado dentellón
Alcantarilla PR15+960	Margen izquierdo	Solado para placa de encole
Alcantarilla PR15+745	Margen izquierdo	Solado para placa de encole
Box culvert PR15+802	Margen derecho	- Solado para placa de descole - Solado dentellón
Box culvert PR15+802	Margen derecho	- Solado para placa de descole - Solado dentellón

- Suministro e instalación de acero $F_y=420$ Mpa utilizado en la construcción de cunetas en zonas de accesos y curvas en las siguientes abscisas:



ABSCISA	COSTADO
PR16+117	Izquierdo
PR16+131	Izquierdo
PR16+127	Izquierdo
PR16+125	Izquierdo

- Se realiza instalación de acero $F_y=420$ Mpa para construcción de las siguientes obras de drenaje:

ABSCISA	COSTADO
Acero de refuerzo para construcción de cabezal descole de alcantarilla PR15+960	Derecho
Acero de refuerzo para construcción de poceta PR15+960	Izquierdo
Acero de refuerzo para construcción de box culvert PR15+802	Derecho
Acero de refuerzo para construcción de palca de descole y aletas de Box culvert PR15+620	Derecho
Acero de refuerzo para construcción de poceta PR15+745	Izquierdo

- Se realiza la adecuación del terreno, nivelación y conformación de superficie de apoyo para instalación de formaleta y posterior suministro e instalación de concreto de 17.5 Mpa de resistencia vaciado in situ para construcción de cunetas, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR16+131– PR16+133	Izquierdo
PR16+117	Izquierdo
PR16+127	Izquierdo
PR16+125	Izquierdo



- Suministro e instalación de concreto con resistencia a la compresión de 28 Mpa para la construcción de las siguientes obras de drenaje.

ABSCISAS	COSTADO
Construcción de losa superior de box culvert PR15+620	Derecho
Construcción de losa de poceta PR15+745	Izquierdo
Construcción de muros de poceta PR15+745	Izquierdo
Construcción de losa de poceta PR15+960	Izquierdo
Construcción de muros de poceta PR15+960	Izquierdo
Construcción de Cabezal descole de alcantarilla PR15+960	Derecho
Construcción de Box culvert PR15+802	Derecho
Construcción de Cabezal descole de Box culvert PR15+620	Derecho
Construcción de solera descole de Box culvert PR15+802	Derecho

- Se realiza suministro e instalación de geotextil no tejido, material granular filtrante y tubería perforada de 4" para la construcción de filtro transversal, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR15+620	Izquierdo

- Se realiza suministro e instalación de cinta PVC Sika o similar, en las siguientes abscisas:



ABSCISA	COSTADO
Losa poceta de alcantarilla PR15+745	Izquierdo
Losa poceta de alcantarilla PR15+960	Izquierdo
Placa de descole alcantarilla PR15+960	Derecho
Losa inferior de Box culvert PR15+802	Derecho
Placa de descole Box culvert PR15+802	Derecho
Placa de descole Box culvert PR15+620	Derecho

- Se realiza suministro e instalación Malla Hexagonal de Alta Resistencia para la estabilización de taludes, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR10+995 – PR11+005	Derecho

- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan proyección y cálculo de cantidades de obra para acta N°60 correspondiente al mes de mayo 2026.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

- ÍTEMS NO PREVISTOS No. 1 - 2022

Se realizo la inclusión del paquete No. 1 mediante acta de modificación de cantidades No.2 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (4-oct-2022), reprogramación al programa de inversiones No.2 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (4-oct-2022), acta de fijación de ítems no previstos No. 1

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

N° Np Paquete No. 3	Descripción
NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5
NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)



NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)
NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)
NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)
NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)
NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)
NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar
NP9	Geotextil NT 4000 o Similar
NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2 - 2023**

Se realizo la inclusión del paquete No.2 mediante acta de modificación de cantidades No. 4 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (5-may-2023), reprogramación al programa de inversiones No.3 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (5-may-2023), acta de fijación de ítems no previstos No. 2

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

Nº Np Paquete No. 3	Descripción
NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)
NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos



NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro
NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
NP21	Concreto Plástico 28 MPA para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max=15m rasante
NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503
NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 3**

Se realizó la inclusión del paquete No.3 mediante acta de modificación de cantidades No. 6 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (17-jun-2024), reprogramación al programa de inversiones No. 5 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (17-jun-2024), acta de fijación de ítems no previstos No. 3

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:



N° Np Paquete No. 3	Descripción
NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M
NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa
NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado
NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.
NP35	Corte de asfalto H=11cm
NP36	Hidrosiembra manual
NP37	Tala De Árboles Clase 1 - H: 1 A 5 Metros
NP38	Tala De Árboles Clase 2 - H: 5.01 A 10 Metros
NP39	Tala De Árboles Clase 3 - H: 10,01 A 15 Metros
NP40	Tala De Árboles Clase 4 - H :15,01 A 20 Metros

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4**

Se realizo la inclusión del paquete No.4 mediante acta de modificación de cantidades No. 8 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (06-mar-2025), reprogramación al programa de inversiones No. 7 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (06-mar-2025), acta de fijación de ítems no previstos No. 4

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

N° Np actual	Descripción
NP 41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm
NP 42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia
NP 43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)
NP 44	Suministro e instalación de Captafaro
NP 45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)



NP 46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos
NP 52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá
NP 53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá
NP 54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm
NP 55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm
NP 56	Desmante Y Retiro De Junta Existente
NP 57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardarruedas (No incluye el acero)
NP 58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardarruedas (No incluye el acero)
NP 59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila
NP 60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila
NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano
NP 62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila
NP 63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"
NP 64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES - 2024**

Se realizo la inclusión del paquete de ítems no previstos para compensaciones ambientales con la aprobación por parte de Subdirección de Sostenibilidad del Instituto



Nacional de Vías, mediante oficio 2024S-VBOG-089103 del 27 de noviembre de 2024, donde se aprueban los Nps y el Plan de Inversión Ambiental (PIA)

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

1. Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022 ruta 3001 Los Ítems No Previstos para la actividad de por el cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro, siembra y riego de árboles, de acuerdo a la Resolución 2330 del 2022	Unidad
Mantenimiento por unidad de árbol de acuerdo a la Resolución 2330 de 2022. Se realizará 4 mantenimientos por 1 año.	Unidad
Mantenimiento mensual y trimestral epífitas de acuerdo con la Resolución 2230 de 2022	Visita
Mantenimiento epífitas anual de acuerdo a la Resolución 2230 de 2022	Visita
2. Compensación requerida por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 artículo decimo ruta 3001	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 de 2022 ruta 3001. No incluye siembra, ni transporte	Unidad
3. Compensación requerida permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo ruta 6504	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6504. No incluye siembra, ni transporte	Unidad
Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SEXTO numeral 17 ruta 6504	Unidad
4. Compensación requerida permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6503	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte	Unidad



Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SEXTO numeral 16 ruta 6503	Unidad
5. Compensación requerida por Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto ruta 6503 en el marco de la emergencia en los municipios de la montaña y el paujil departamento del Caquetá	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal PAF CT-DTC 0673 de 2023 ARTICULO QUINTO Ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte	Unidad

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 5 - 2025**

Se realizo la inclusión del paquete No.5 mediante acta de modificación de cantidades No. 9 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (20-mar-2025), reprogramación al programa de inversiones No. 8 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (20-mar-2025), acta de fijación de ítems no previstos No. 5
Lo ítems no previstos presentados son los siguientes:

N° Np Paquete No. 5	Descripción
NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro
NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600
NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60
NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar
NP69	Suministro y fabricación de estructura metálica puente las delicias
NP70	Montaje de estructura metálica puentes las delicias
NP71	Transporte de estructura metálica puente las delicias
NP72	Suministro e instalación de drenajes en tubería PVC 4"

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 6**

Se realizo la inclusión del paquete No.6 mediante acta de modificación de cantidades No. 11 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (29-oct-2025), reprogramación al programa de inversiones No.



10 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (29-oct-2025), acta de fijación de ítems no previstos No. 6 (8-sep-2025). Los ítems no previstos presentados por el contratista son los siguientes:

N° Np Paquete No. 6	Descripción
NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcho manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)
NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias
NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)
NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias
NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503
NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503
NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión
NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS
NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS
NP82	Prueba de Carga Para Puente
NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 7**

El contratista realizó la radicación de los ítems no previstos paquete No. 7 mediante comunicado CVNSO-0991-868-2025 el 26 de diciembre de 2025, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría, para lo cual, el 20 de enero de 2026 se realizó mesa de trabajo en conjunto contratista e interventoría donde se formularon las observaciones y se encuentran en proceso de atención por parte del contratista.

Los ítems no previstos presentados por el contratista son los siguientes:



N° Np Paquete No. 7	Descripción
NP84	Suministro e instalación de junta de dilatación elastomérica Expansión 50mm
NP85	Suministro e instalación de concreto de 21MPa para recubrimiento de gaviones e=0.05m (No incluye acero de refuerzo)
NP86	Dren Horizontal d=2" - Long max=30m para el sitio crítico PR16+400 RN 6504
NP87	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP88	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP89	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP90	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP91	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP92	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025

La radicación de los Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	RECIBIDO	ASUNTO	ENVIADO	FECHA	ASUNTO
14-ago-25	CVNSO-0991-539-2025	Presentación del paquete de APU's de Ítems No. 7 No Previstos	C-245-3967-1350-25	29/08/2025	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-539-2025 con asunto "Presentación del paquete de APU's de Ítems No. 7 No Previstos"
			C-245-4170-1708-25	18/11/2025	Solicitud urgente y reiterada de presentación de APUs ajustados y soportes técnicos de Ítems No Previstos (NPs) para el Paquete N.º 7, incluyendo la Junta de Dilatación "NP 73" y los ítems de Señalización



					Vertical "NP 80 y NP 81".
26-dic-25	CVNSO-0991-868-2025	Respuesta al comunicado C-245-3967-1350-25 y C-245-4170-1708-25 "Presentación del paquete de APU de Ítems No. 7 No Previstos"			
20-ene-26	Mesa de trabajo	Considerando la entrega de los documentos correspondientes al paquete de Ítems No Previstos N.º 7, la Interventoría convoco mesa de trabajo para el día 20 de enero de 2026, a las 9:00 a. m., con el propósito de agilizar la revisión y el proceso de conciliación, a fin de continuar con el trámite de aprobación de los NPS N.º 7.			
16-mar-2026	CVNSO-0991-180-2026	CVNSO-0991-180-2026 Alcance a comunicado CVNSO-0991-868-2025 "Presentación del paquete de APU de Ítems No. 7 No Previstos"			
26-mar-2026	Mesa de trabajo	Considerando la entrega de los documentos correspondientes al paquete de Ítems No Previstos N.º 7, la Interventoría convoco mesa de trabajo para el			



		día 26 de enero de 2026, a las 1':00 a. m., con el propósito de agilizar la revisión y el proceso de conciliación, a fin de continuar con el trámite de aprobación de los NPS N.º 7.			
			C-245-4590-0964-26	24/04/2026	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-180-2026 con asunto "Alcance a comunicado CVNSO-0991-868-2025 "Presentación del paquete de APU de Ítems No. 7 No Previstos"
16-may-2026	CVNSO-0991-298-2026	Respuesta a Comunicados: i) C-245-4590-0964-26 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-180-2026 con asunto "Alcance a comunicado CVNSO 0991-868-2025 "Presentación del paquete de APU de Ítems No. 7 No Previstos" y ii) C-245-4622-1041-26 con asunto: "RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4544-0805-26, ASUNTO: REQUERIMIENTO DE REPORTE DE AVANCES EN TRÁMITES DE PERMISOS Y PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LA REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN SOBRE EL SECTOR QUEBRADA LAS DECILIAS – ACTAS ACTAEL_1 Y ACTAPE_1."			



			C-245- 4684-1225- 26	25/05/2026	Entrega de documentación de Ítems N°7, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021
--	--	--	----------------------------	------------	--

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES - 2025**

El contratista realizó la radicación de los ítems no previstos de actividades ambientales paquete No. 2 mediante comunicado CVNSO-0991-869-2025 el 26 de diciembre de 2025, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Los ítems no previstos presentados por el contratista son los siguientes:

Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en cumplimiento a requerimientos de la Autoridad Ambiental indicados en actos administrativos (Incluye insumos).	Unidad
Ahuyentamiento y rescate de Fauna Silvestre - Según artículo quinto de la Resolución 1916 de 2025	Mes
Construcción y adecuación de vivero para el manejo de epifitas, autorizadas por la Resolución 1916 de 2025	Unidad
Suministro de plántulas de Aguacate Hass y Aguacate Lorena para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal Resolución 1916 de 2025 (No incluye siembra).	Unidad
Suministro de plántulas de limón común, naranja y mandarina para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal Resolución 1916 de 2025 (No incluye siembra).	Unidad

La radicación de los Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:



FECHA	RECIBIDO	ASUNTO	ENVIADO	FECHA	ASUNTO
26-dic-25	CVNSO-0991-869-2025	Entrega del paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.			
			C-245-4446-0498-26	3-mar-2026	Respuesta al oficio CVNSO-0991-869-2025 con asunto "Entrega del paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.".
31-mar-26	CVNSO-0991-209-2026	Respuesta comunicación C-245 4446-0498-26 Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales			
			C-245-4646-1092-26	11-may-2026	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-209-2026 con asunto "Respuesta comunicación C-245-4446-0498-26 Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales."
22-may-26	CVNSO-0991-313-2026	Respuesta a comunicado C-245-4646-1092-26. "Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales."			
			C-245-4685-1226-26	25-may-2026	Respuesta a oficio CVNSO-0991-313-2026, con asunto Respuesta a comunicado C-245-4646-1092-26.



					“Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales.
--	--	--	--	--	--

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.11 el cual contiene el ajuste de acuerdo con el acta de modificación de cantidades de obra N°12 y la actualización del valor básico a ejecutar en la vigencia del año 2026 de acuerdo con el Plan de Intervención. En este programa de inversiones se establece el porcentaje programado 28.34% y el porcentaje de ejecución es de 28.85% de cada una de las actividades a corte de 31 de mayo de 2026.

En la programación en el mes de mayo se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Construcción de box culvert y alcantarillas.
6. Construcción de obras (sitios atípicos).
7. Construcción de obras de estabilización de taludes.
8. Construcción de puente las Delicias PR38+295
9. Remoción de derrumbes.

En el mes de mayo se remitieron 7 conceptos de especialistas, contando con la aprobación de los siguientes volúmenes:

Especialista en geotecnia: Ruta 6503 – PR54+579 comunicado con asunto "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-211-2026 con asunto "Respuesta comunicado C- 245-3971-1354-25 "Alcance a comunicado C-245-2913 1478-24 con asunto "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-469-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones –



Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"""". mediante comunicado C-245-4645-1090-26 con concepto de NO OBJECIÓN el 11 de mayo de 2026.

Especialista en fundaciones: PR 16+000 comunicado con asunto Respuesta a oficio CVNSO-0991-075-2026 con asunto "Respuesta comunicado C-245-4056-1515-25 "Remisión Volumen Geotecnia – Fundaciones Punto Crítico PR16+000 RN3002"." mediante comunicado C-245-4651-1105-26 con concepto de No objeción el 12 de mayo de 2026.

En el proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca, en la ruta 6503, se continúan actividades para la construcción del puente sobre la quebrada Las Delicias, se realiza suministro, instalación y compactación de Terraplén del PR38+085 a PR38+259 calzada completa acceso Sur a puente, se realiza suministro e instalación de Manto TRM 500 para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos del PR38+300 a PR38+400 costado derecho y PR38+305 a PR38+400 costado izquierdo, se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras en PR38+303 calzada completa placa de aproximación E2, PR38+303 carril izquierdo Barrera New Jersey placa de aproximación E2, PR38+303 carril derecho Barrera New Jersey placa de aproximación E2, PR38+307 a PR38+317 carril izquierdo Barrera New Jersey – M1, PR38+317 a PR38+327 carril izquierdo Barrera New Jersey – M2, PR38+327 a PR38+337 carril izquierdo Barrera New Jersey – M3, PR38+337 a PR38+347 carril izquierdo Barrera New Jersey – M4, PR38+347 a PR38+357 carril izquierdo Barrera New Jersey – M5, PR38+357 a PR38+367 carril izquierdo Barrera New Jersey – M6, PR38+367 a PR38+377 carril izquierdo Barrera New Jersey – M7, PR38+377 a PR38+387 carril izquierdo Barrera New Jersey – M8, PR38+387 a PR38+397 carril izquierdo Barrera New Jersey – M9, PR38+397 a PR38+407 carril izquierdo Barrera New Jersey – M10, PR38+407 a PR38+417 carril izquierdo Barrera New Jersey – M11, PR38+417 a PR38+427 carril izquierdo Barrera New Jersey – M12, PR38+427 a PR38+437 carril izquierdo Barrera New Jersey – M13, PR38+465 a PR38+475 carril izquierdo Barrera New Jersey – M17, PR38+475 a PR38+485 carril izquierdo Barrera New Jersey – M18, PR38+485 a PR38+495 carril izquierdo Barrera New Jersey – M19, PR38+495 a PR38+505 carril izquierdo Barrera New Jersey – M20, PR38+505 a PR38+515 carril izquierdo Barrera New Jersey – M21, PR38+515 a PR38+525 carril izquierdo Barrera New Jersey – M22, PR38+301 a PR38+311 carril derecho Barrera New Jersey – M1, PR38+311 a PR38+321 carril derecho Barrera New Jersey – M2, PR38+321 a PR38+331 carril derecho Barrera New Jersey – M3, PR38+331 a PR38+341 carril derecho Barrera New Jersey – M4, PR38+341 a PR38+351 carril derecho Barrera New Jersey – M5, PR38+351 a PR38+361 carril



derecho Barrera New Jersey – M6, PR38+361 a PR38+371 carril derecho Barrera New Jersey – M7. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto en PR38+303 Calzada completa placa de aproximación puente E2 y PR38+990 carril derecho Estructura descole alcantarilla. Se continua actividad de construcción de barrera New Jersey en concreto de resistencia 28 MPa de PR38+215 a PR38+225 carril izquierdo zarpa barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+255 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M17, PR38+255 a PR38+256 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M18, PR38+155 a PR38+165 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M8, PR38+165 a PR38+175 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M9, PR38+175 a PR38+185 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M10, PR38+185 a PR38+195 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+249 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M17, PR38+307 a PR38+317 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M1, PR38+317 a PR38+327 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M2, PR38+327 a PR38+337 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M3, PR38+337 a PR38+347 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M4, PR38+347^a a PR38+357 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M5, PR38+357 a PR38+367 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M6, PR38+367 a PR38+377 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M7, PR38+377 a PR38+387 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M8, PR38+387 a PR38+397 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M9, PR38+397 a PR38+407 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M10, PR38+465 a PR38+475 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M17, PR38+475 a PR38+485 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M18, PR38+485 a PR38+495 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M19, PR38+495 a PR38+505 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M20, PR38+505 a PR38+515 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M21, PR38+515 a PR38+525 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M22, PR38+215 a PR38+225 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+255 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M17, PR38+255 a PR38+256 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M18, PR38+185 a PR38+195 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril izquierdo Corona



Barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+255 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M17, PR38+255 a PR38+256 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M18, PR38+155 a PR38+165 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M8, PR38+165 a PR38+175 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M9, PR38+175 a PR38+185 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M10, PR38+185 a PR38+195 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+249 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M17, PR38+085 a PR38+095 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M1, PR38+095 a PR38+105 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M2, PR38+105 a PR38+115 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M3, PR38+115 a PR38+125 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M4, PR38+125 a PR38+135 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M5, PR38+135 a PR38+145 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M6, PR38+145 a PR38+155 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M7, PR38+155 a PR38+165 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M8, PR38+165 a PR38+175 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M9, PR38+175 a PR38+185 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M10, PR38+185 a PR38+195 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+249 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M17, PR38+259 a PR38+259 carril izquierdo Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+259 a PR38+259 carril derecho Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+303 a PR38+303 carril izquierdo Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+303 a PR38+303 carril derecho Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+307 a PR38+317 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M1, PR38+317 a PR38+327 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M2, PR38+465 a PR38+475 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M17, PR38+475 a PR38+485 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M18. Se continua actividad de excavación sin clasificar de la explanación y canales en PR38+000 a PR38+055 calzada completa Subrasante, comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase



granular y se realiza suministro, instalación, nivelación y compactación. Se realiza suministro e instalación de afirmado PR38+990 carril derecho relleno sobre muro y aletas alcantarilla. Mediante comunicado C-245-4613-1022-26 radicado el 4 de mayo 2026, esta Interventoría en atención al comunicado CVNSO-0991-248-2026 mediante el cual el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente se pronuncia respecto de los oficios C-245-4534-0775-26 y C-245-4558-084926, esta Interventoría se permite dar respuesta y reiterar los siguientes requerimientos: Adoptar los correctivos pertinentes frente a los retrasos identificados en las actividades de las rampas de acceso (Id. 9 al 19), conforme a la programación aprobada para la vigencia 2026. Presentar, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles contados a partir de la recepción del presente comunicado, un informe técnico detallado que justifique de manera individualizada las causas de cada actividad retrasada. Se reitera al Contratista que la mención genérica de la situación de pagos no constituye, por sí sola, una justificación técnica suficiente, debiendo acreditarse en cada caso la relación directa entre la causa alegada y la actividad específicamente afectada. Lo anterior, en atención a que cualquier retraso debe contar con un sustento documental que permita atender los requerimientos presentes y futuros de los entes de vigilancia y control. Garantizar la disponibilidad permanente del equipo mínimo requerido en el frente de obra del puente (planta de concreto, mixer, trituradora, retroexcavadora de orugas, motoniveladora, compactadores y volquetas). El 5 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4622-1041-26 en atención al comunicado CVNSO-0991-254-2026 mediante el cual el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente presenta el avance de las gestiones adelantadas para la reubicación de la red de media tensión en el sector Quebrada Las Delicias, y una vez realizada la revisión técnica de la documentación soporte remitida para el ítem NP93 – Suministro y transporte de insumos para reubicación de redes eléctricas puente vehicular Las Delicias PR38+200 R6503, esta Interventoría se permite formular observaciones, las cuales una vez sean subsanadas se continuara con el trámite de revisión y aprobación del ítem NP93. El 30 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4699-1285-26 interventoría solicita información sobre los avances en la atención del evento ocurrido el día 27 de mayo de 2026 en el PR 38+295, sector Puente Las Delicias, esto con el propósito de realizar el debido monitoreo a las situaciones que puedan derivarse de la ejecución de las actividades constructivas. De acuerdo con la información reportada, durante la ejecución de actividades de extendido de material pétreo para la conformación del terraplén en el estribo del puente sobre la Quebrada Las Delicias, una volqueta al servicio del proyecto, en desarrollo de maniobras de descargue, habría hecho contacto con una red eléctrica de media tensión que alimenta el transformador No.



13043, situación que generó afectación en el servicio prestado a un predio ubicado en el área de incidencia directa de la obra.

Se continua actividad de mantenimiento vial, se realiza imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) del PR37+760 a PR38+020 calzada completa y PR38+625 a PR41+430 calzada completa, se realiza suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 en actividades de mantenimiento vial del PR36+130 a PR36+230 carril izquierdo, PR36+670 a PR36+740 carril derecho, PR37+760 a PR38+020 calzada completa, PR38+625 a PR41+430 calzada completa.

En la ruta 6504, continúan actividades constructivas para pavimentación, comisión topográfica replantea eje de alineamiento y hace levantamiento topográfico inicial para cálculo de cantidades de excavación en construcción de obras hidráulicas localizadas en PR00+454 carril derecho Estructura box culvert, PR05+735 carril izquierdo Estructura box culvert, PR06+875 carril izquierdo Estructura alcantarilla, PR07+481 carril derecho Estructura box culvert, PR09+874 carril derecho Estructura alcantarilla. Se realiza demolición de estructuras existentes en PR00+454 carril derecho Estructura box culvert, PR05+735 carril izquierdo Estructura box culvert, PR06+875 carril izquierdo Estructura alcantarilla, PR07+481 carril derecho Estructura box culvert, PR09+874 carril derecho Estructura alcantarilla, PR09+916 a PR09+960 carril derecho Cuneta, PR09+925 a PR10+000 carril izquierdo Cuneta. Se realiza remoción de alcantarillas en PR06+875 carril izquierdo Tubería – Alcantarilla, PR09+872 carril derecho Tubería – Alcantarilla. Se realiza excavación sin clasificar de la explanación y canales del PR09+853 a PR09+862 carril izquierdo Mejoramiento de fallo, PR09+864 a PR09+870 carril izquierdo Mejoramiento de fallo, PR09+850 a PR10+000 Calzada completa Subrasante. En conjunto comisión topográfica de contratista e interventoría hacen medición y cálculo de cantidades de excavación, también se realiza excavación sin clasificar para construcción de obras hidráulicas en PR06+875 carril izquierdo Estructura y tubería encoleta alcantarilla, PR07+481 carril derecho descole box culvert, PR08+027 a PR08+095 carril derecho Filtro, PR08+190 a PR08+235 carril izquierdo Filtro, PR08+253 a PR08+264 carril izquierdo Muro de contención y PR09+866 a PR09+874 carril derecho Estructura descole alcantarilla. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación. Se realiza suministro e instalación de afirmado PR06+875 carril izquierdo Relleno sobre tubería alcantarilla, PR09+872 carril derecho Relleno sobre tubería alcantarilla, PR09+853 a PR09+862 carril izquierdo Mejoramiento de fallo y PR09+864 a PR09+870 carril izquierdo Mejoramiento de fallo, se realiza suministro e Instalación de Geotextil no tejido, instalación de Tubería perforada 4" e instalación de Material granular



drenante. del PR08+027 a PR08+095 carril izquierdo construcción de filtro y PR08+190 a PR08+235 carril izquierdo construcción de filtro, comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular del PR03+300 a PR03+320 calzada completa, PR03+324 a PR03+330 calzada completa, PR07+915 a PR07+915 acceso a predio, PR09+700 a PR09+830 calzada completa, se realiza suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular. Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de base granular PR03+300 a PR03+330 calzada completa y PR07+100 a PR07+370 calzada completa, se realiza el suministro, Instalación, nivelación y compactación de base granular. Se realiza imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) de PR03+298 a PR03+300 carril izquierdo Primera capa, PR03+300 a PR03+331 calzada completa Primera capa, PR03+331 a PR03+332 carril derecho Primera capa, PR05+620 a PR05+714 calzada completa Primera capa, PR06+180 a PR06+764 calzada completa Primera capa, PR06+764 a PR06+790 carril derecho Primera capa, en segunda capa del PR03+290 a PR03+295 carril izquierdo, PR03+295 a PR03+335 carril izquierdo, PR03+335 a PR03+337 carril derecho, PR05+440 a PR05+705 calzada completa, PR03+230 a PR03+283 carril derecho, en tercera capa PR03+283 a PR03+341 calzada completa, PR03+341 a PR03+343 carril izquierdo, PR05+394 a PR05+439 carril izquierdo, PR05+439 a PR05+696 calzada completa, comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica y se realiza el suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 de PR03+380 a PR03+380 costado izquierdo acceso a predio y PR03+390 a PR03+390 costado izquierdo acceso a predio, en primera capa PR03+298 a PR03+300 carril izquierdo, PR03+300 a PR03+331 calzada completa, PR03+331 a PR03+332 carril derecho, PR05+620 a PR05+714 calzada completa, PR06+180 a PR06+764 calzada completa, PR06+764 a PR06+790 carril derecho, en segunda capa PR03+290 a PR03+295 carril izquierdo, PR03+295 a PR03+335 calzada completa, PR03+335 a PR03+337 carril derecho, PR05+440 a PR05+705 calzada completa y en tercera capa PR03+230 a PR03+283 carril derecho, PR03+283 a PR03+341 calzada completa, PR03+341 a PR03+343 carril izquierdo, PR05+394 a PR05+439 carril izquierdo y PR05+439 a PR05+696 calzada completa. El 12 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4655-1109-26 está interventoría solicita copia de los soportes documentales que den cuenta de los trámites, gestiones y actuaciones adelantadas en territorio respecto al requerimiento de identificación de redes eléctricas y levantamiento de acta de vecindad RUTA NACIONAL 6504 - PR 8+250 y PR 7+980, lo anterior con el fin de contar con información fehaciente que permita validar el estado



actual de las actuaciones reportadas, así como avalar y consolidar la documentación correspondiente dentro del expediente contractual y de seguimiento del proyecto. El 22 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4678-1201-26 se emiten observaciones al ajuste del diseño geométrico entre PR08 y PR12 de la Ruta 6504.

Se realiza instalación de tubería de concreto reforzado diámetro 36" para construcción de alcantarillas en PR06+875 carril izquierdo y PR09+872 carril derecho, Se realiza suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de obras hidráulicas localizadas en PR08+098 carril izquierdo Solado de limpieza caja encole, PR08+253 carril izquierdo Solado zarpa y PR08+280 carril izquierdo Solado zarpa. Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras en PR00+454 carril derecho Placa inferior y muros Box culvert, PR08+098 carril izquierdo Estructura encole alcantarilla, PR08+253 carril izquierdo Zarpa y vástago Muro de contención, PR08+280 carril izquierdo Zarpa y vástago Muro de contención. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto PR06+875 carril derecho Muro y aletas alcantarilla, PR07+858 carril izquierdo Muro y aletas alcantarilla, PR07+858 carril derecho Muro y aletas alcantarilla, PR08+098 carril derecho Muro y aletas alcantarilla, PR08+098 carril izquierdo muro caja alcantarilla, PR08+253 carril izquierdo Zarpa y vástago Muro de contención.

Mediante comunicado C-245-4648-1094-26 radicado el 11 de mayo de 2026, interventoría relaciona los elementos estructurales en obras ejecutadas en la Ruta 6503 y 6504, en el cual se presenta No conformidad de acuerdo a los resultados del ensayo de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13, evaluados bajo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, Capítulo 6, Artículo 630, numeral 630.4.2 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. De acuerdo con la revisión de los resultados obtenidos, se evidencia que estos no cumplen con los parámetros establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, en consecuencia, y conforme a lo indicado en el numeral 630.5.2.9 – Resistencia, se solicita la toma de núcleos de dichos elementos, siguiendo los lineamientos de la norma INV E-418, con el fin de verificar y certificar la calidad del material instalado, en concordancia con los requisitos técnicos vigentes. El 13 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4660-1117-26 se emite No conformidad a elementos estructurales en obras ejecutadas en la Ruta 6503 y 6504 en los cuales se presenta No conformidad de acuerdo a los resultados del ensayo de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13, evaluados bajo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, Capítulo 6, Artículo 630, numeral 630.4.2 Estudio de la mezcla y



obtención de la fórmula de trabajo. El 20 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4677-1182-26 interventoría relaciona los elementos estructurales en obras ejecutadas en la Ruta 6503 y 6504, en el cual se presenta No conformidad de acuerdo a los resultados del ensayo de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13, evaluados bajo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, Capítulo 6, Artículo 630, numeral 630.4.2 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. De acuerdo con la revisión de los resultados obtenidos, se evidencia que estos no cumplen con los parámetros establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, en consecuencia, y conforme a lo indicado en el numeral 630.5.2.9 – Resistencia, se solicita la toma de núcleos de dichos elementos, siguiendo los lineamientos de la norma INV E-418, con el fin de verificar y certificar la calidad del material instalado, en concordancia con los requisitos técnicos vigentes.

Mediante comunicado C-245-4658-1112-26 radicado el 12 de mayo 2026 esta Interventoría emite respuesta al contratista de obra conforme a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, las normas de ensayo aplicables (INV E-402, INV E-410, INV E-418), la NSR-10 Título C, y las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Obra No. 991 de 2021, referente al No cumplimiento de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13.

El 25 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4683-1213-26 esta Interventoría en el marco del seguimiento a la calidad de los materiales, informa que ha evidenciado reiterados incumplimientos en los resultados de resistencia a la compresión del concreto ejecutado en obra frente a la resistencia de diseño especificada. Con el ánimo de garantizar la estabilidad de la obra y obrando bajo los principios de colaboración, esta Interventoría ha propuesto diversas alternativas complementarias para identificar las causas raíz de estas deficiencias y plantear planes de mejora. Sin embargo, ante la postura del Contratista de desestimar los resultados del control oficial de Interventoría basándose en criterios no contemplados en la norma para la aceptación final del material, nos permitimos informar que, en adelante, el proceso de control, evaluación, aceptación y trámite de pago de los elementos de concreto estructural se desarrollará con estricto apego y literalidad a los lineamientos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, las normas INV aplicables, la NSR-10 y las demás disposiciones técnicas y contractuales vigentes.

En la ruta 3002, se realizaron actividad de remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias desde el PR16+700 al PR48+400 en 34 puntos.



En la ruta 3001, se realizaron actividad de remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias desde el PR29+195 al PR37+000 en 9 puntos.

Se adelantan actividades constructivas en diferentes puntos de la vía, iniciando con la demolición de estructuras existentes correspondientes al Box Culvert ubicado en el PR 15+620 y a la alcantarilla localizada en el PR 15+780. De manera simultánea, se ejecutan actividades de excavación mecánica para el cajeo y conformación de la aproximación a subrasante en el carril derecho entre los sectores PR 15+772 y PR 15+798, así como excavación mecánica para la construcción del cuerpo medio hacia el descole del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho.

Como parte de la preparación y adecuación de las estructuras hidráulicas, se realiza el mejoramiento del suelo de fundación mediante suministro e instalación de material granular para la construcción del Box Culvert ubicado en el PR 15+802. Adicionalmente, se ejecuta relleno para estructuras con recebo en el suelo de fundación de la misma estructura. De igual manera, se adelanta la construcción de un filtro transversal contra el Box Culvert ubicado en el PR 15+620 hacia menores, mediante el suministro e instalación de geotextil no tejido, tubería perforada y material granular drenante.

Continuando con las actividades constructivas, se ejecuta concreto de 14 MPa para la construcción de diferentes elementos de solado requeridos en las estructuras hidráulicas. Estas actividades comprenden el solado de dentellón y descole de alcantarilla en el PR 15+960 costado derecho, el solado de pocetas de alcantarilla en los PR 15+745 y PR 15+960 costado izquierdo, así como el solado del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho, incluyendo la solera de la estructura. De igual forma, se ejecuta concreto de 14 MPa para el solado de la solera y dentellón del Box Culvert localizado en el PR 15+620 costado derecho.

Posteriormente, se adelantan actividades de instalación de acero de refuerzo para la construcción de diferentes elementos estructurales. Entre estas se encuentran la construcción de cunetas en los sectores PR 16+117, PR 16+125, PR 16+127, PR 16+131 y PR 16+133 costado izquierdo; la construcción del cabezal de descole de alcantarilla en el PR 15+960 costado derecho; la construcción de pocetas en los PR 15+745 y PR 15+960 costado izquierdo; la construcción del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho; y la construcción de la solera y aletas de descole del Box Culvert localizado en el PR 15+620 costado derecho.

Seguidamente, se realiza el suministro e instalación de cinta PVC tipo Sika O-22 o similar para garantizar la impermeabilización de juntas en diferentes estructuras hidráulicas. Estas actividades se ejecutan en la losa de la poceta de alcantarilla ubicada en el PR 15+745



costado izquierdo, en la losa de la poceta de alcantarilla localizada en el PR 15+960 costado izquierdo, en la solera de la alcantarilla del PR 15+960 costado derecho, en la losa del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho y en las soleras de descole de los Box Culvert localizados en los PR 15+620 y PR 15+802 costado derecho.

Una vez culminadas las actividades de preparación y armado, se procede con la fundida de concreto de 28 MPa para la construcción de diversos elementos estructurales. Estas actividades incluyen la construcción de la losa superior y del cabezal de descole del Box Culvert ubicado en el PR 15+620 costado derecho; la construcción de la losa y muros de las pocetas localizadas en los PR 15+745 y PR 15+960 costado izquierdo; la construcción del cuerpo estructural del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho; y la construcción de la solera de descole asociada a esta misma estructura.

Finalmente, se adelanta la construcción de cunetas mediante suministro e instalación de concreto de 17,5 MPa en los sectores PR 16+117, PR 16+125, PR 16+127, PR 16+131 y PR 16+133 costado izquierdo, previa adecuación y conformación de la superficie de apoyo. Adicionalmente, se ejecuta el suministro e instalación de malla hexagonal de alta resistencia para la estabilización y protección de taludes entre los sectores PR 11+005 y PR 10+995.

En general se presenta un avance de 0.51% con respecto a la ejecución del 28.85% vs la inversión programada del 28.34% determinados respecto al valor básico de obra para este periodo al 31 de mayo de 2026.

3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS.


- No se registraron situaciones inesperadas durante el mes de mayo.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 991 DE 2021

4.1 INFORME SEMANAL

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CONTRATO	807-880-00-02-05-3																																																																																																																																														
				UBICACIÓN	F																																																																																																																																														
				FECHA	13 de mayo de 2026 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																														
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																			
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAJALÚN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ CAQUETÁ SEMANA No.: <u>255</u> del <u>7/05/2026</u> al <u>13/05/2026</u> Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																			
SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORIA: _____ ING. KAREN DANIELA GALLEGOS SÁNCHEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: _____ ING. JAIDER DEVA REY																																																																																																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAJALÚN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																																																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato) El alcance Monico contempla, el avance a la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III, del corredor vial "Neiva- San Vicente del Cajalún- Puerto Rico - Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá".																																																																																																																																																			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE INTERGENTES: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA CONTRATO No.: 001 DE 2021 FECHA DE INICIO: 20/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030			INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 INTERGENTES: CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - CELOS S.A.S. - ARTIFICIAL CIVIL INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. CONTRATO No.: 005 DE 2021 FECHA DE INICIO: 20/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030																																																																																																																																																
VALOR INICIAL: \$ 399.587.436.000,00 VALOR ADICIONES: \$ 13.485.528.230,00 VALOR ACUMULADO: \$ 413.052.964.666,00 VALOR ANTIPO: \$ 9.885.528.230,00 VALOR AMORTIZADO: \$ 2.496.075.290,00 BALDO POR AMORTIZAR: \$ 7.389.452.940,00			VALOR INICIAL: \$ 23.499.975.248,00 VALOR ADICIONES: \$ 1.200.000.000,00 VALOR ACUMULADO: \$ 34.699.975.248,00 VALOR ANTIPO: \$ 980.381.756,00 VALOR AMORTIZADO: \$ 980.381.756,00 BALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 20.789.631.333</td> <td>\$ 13.833.333.333</td> <td>\$ 27.766.666.667</td> <td>\$ 20.766.666.667</td> <td>\$ 31.366.666.667</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td>\$ 20.789.631.333</td> <td>\$ 13.833.333.333</td> <td>\$ 27.766.666.667</td> <td>\$ 20.766.666.667</td> <td>\$ 31.366.666.667</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTORIA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 2.333.333.333</td> <td>\$ 1.466.666.667</td> <td>\$ 3.233.333.333</td> <td>\$ 2.333.333.333</td> <td>\$ 3.133.333.333</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td>\$ 2.333.333.333</td> <td>\$ 1.466.666.667</td> <td>\$ 3.233.333.333</td> <td>\$ 2.333.333.333</td> <td>\$ 3.133.333.333</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 20.789.631.333	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 20.766.666.667	\$ 31.366.666.667		EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 20.789.631.333	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 20.766.666.667	\$ 31.366.666.667		SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.333.333.333	\$ 1.466.666.667	\$ 3.233.333.333	\$ 2.333.333.333	\$ 3.133.333.333		EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 2.333.333.333	\$ 1.466.666.667	\$ 3.233.333.333	\$ 2.333.333.333	\$ 3.133.333.333		SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																													
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																													
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 20.789.631.333	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 20.766.666.667	\$ 31.366.666.667																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 20.789.631.333	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 20.766.666.667	\$ 31.366.666.667																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																													
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.333.333.333	\$ 1.466.666.667	\$ 3.233.333.333	\$ 2.333.333.333	\$ 3.133.333.333																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 2.333.333.333	\$ 1.466.666.667	\$ 3.233.333.333	\$ 2.333.333.333	\$ 3.133.333.333																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>2025</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 41.650.000.000</td> <td>\$ 37.052.222.222</td> <td>\$ 46.277.777.778</td> <td>\$ 76.672.222.222</td> <td>\$ 88.927.777.777</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td>\$ 41.650.000.000</td> <td>\$ 37.052.222.222</td> <td>\$ 46.277.777.778</td> <td>\$ 76.672.222.222</td> <td>\$ 88.927.777.777</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTORIA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 3.350.000.000</td> <td>\$ 2.977.777.778</td> <td>\$ 3.722.222.222</td> <td>\$ 5.927.777.778</td> <td>\$ 6.922.222.222</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td>\$ 3.350.000.000</td> <td>\$ 2.977.777.778</td> <td>\$ 3.722.222.222</td> <td>\$ 5.927.777.778</td> <td>\$ 6.922.222.222</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO	VIGENCIA	2025	2027	2028	2029	2030	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 41.650.000.000	\$ 37.052.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 76.672.222.222	\$ 88.927.777.777		EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 41.650.000.000	\$ 37.052.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 76.672.222.222	\$ 88.927.777.777		SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.350.000.000	\$ 2.977.777.778	\$ 3.722.222.222	\$ 5.927.777.778	\$ 6.922.222.222		EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 3.350.000.000	\$ 2.977.777.778	\$ 3.722.222.222	\$ 5.927.777.778	\$ 6.922.222.222		SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																													
CONTRATO	VIGENCIA	2025	2027	2028	2029	2030																																																																																																																																													
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 41.650.000.000	\$ 37.052.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 76.672.222.222	\$ 88.927.777.777																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 41.650.000.000	\$ 37.052.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 76.672.222.222	\$ 88.927.777.777																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																													
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.350.000.000	\$ 2.977.777.778	\$ 3.722.222.222	\$ 5.927.777.778	\$ 6.922.222.222																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 3.350.000.000	\$ 2.977.777.778	\$ 3.722.222.222	\$ 5.927.777.778	\$ 6.922.222.222																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																													
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)</td> <td>\$ 334.889.238.546,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td> <td>\$ 93.159.091.419,20</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)</td> <td>\$ 94.442.338.636,25</td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRÁS DE OBRA</td> <td>\$ (1.293.247.226,05)</td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td>\$ 539.235.968,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA</td> <td>\$ 93.159.091.419,20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</td> <td>\$ 94.442.338.636,25</td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRÁS EN LA INVERSIÓN</td> <td>\$ (1.293.247.226,05)</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ 566.658.829,89</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ 639.545.747,75</td> </tr> </tbody> </table> INTERVENTORIA <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA</td> <td>\$ 14.496.353.649,00</td> <td>41,69%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</td> <td>\$ 14.496.353.649,00</td> <td>41,69%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN PROG. EN LA SEMANA</td> <td>\$ 74.250.024,00</td> <td>0,21%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ 74.250.024,00</td> <td>0,21%</td> </tr> </tbody> </table> RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: <table border="1"> <thead> <tr> <th>BI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: INVASI-CPJ-026-4986 DEL 14/05/2026 PERÍODO FACTURADO: MARZO - 2026 VALOR FACTURA: \$ 3.138.596.125,00 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones: RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: <table border="1"> <thead> <tr> <th>BI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: INVASI-CPJ-026-4176 DEL 30/04/2026 PERÍODO FACTURADO: FEBRERO - 2026 VALOR FACTURA: \$ 292.833.256,00 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:						OBRA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 334.889.238.546,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 93.159.091.419,20	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ 94.442.338.636,25	AVANCE O ATRÁS DE OBRA	\$ (1.293.247.226,05)	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ 539.235.968,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 93.159.091.419,20	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 94.442.338.636,25	AVANCE O ATRÁS EN LA INVERSIÓN	\$ (1.293.247.226,05)	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 566.658.829,89	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 639.545.747,75	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 14.496.353.649,00	41,69%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 14.496.353.649,00	41,69%	INVERSIÓN PROG. EN LA SEMANA	\$ 74.250.024,00	0,21%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 74.250.024,00	0,21%	BI	NO	X		BI	NO	X																																																																																																					
OBRA																																																																																																																																																			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 334.889.238.546,00																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 93.159.091.419,20																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ 94.442.338.636,25																																																																																																																																																		
AVANCE O ATRÁS DE OBRA	\$ (1.293.247.226,05)																																																																																																																																																		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ 539.235.968,00																																																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 93.159.091.419,20																																																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 94.442.338.636,25																																																																																																																																																		
AVANCE O ATRÁS EN LA INVERSIÓN	\$ (1.293.247.226,05)																																																																																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 566.658.829,89																																																																																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 639.545.747,75																																																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 14.496.353.649,00	41,69%																																																																																																																																																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 14.496.353.649,00	41,69%																																																																																																																																																	
INVERSIÓN PROG. EN LA SEMANA	\$ 74.250.024,00	0,21%																																																																																																																																																	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 74.250.024,00	0,21%																																																																																																																																																	
BI	NO																																																																																																																																																		
X																																																																																																																																																			
BI	NO																																																																																																																																																		
X																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ANTICIPOS</th> <th>INDICADOR VC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otorgado \$</td> <td>\$ 9.885.528.230,00</td> <td>En el mes:</td> </tr> <tr> <td>Amortizado \$</td> <td>\$ 2.496.075.290,00</td> <td>Acumulado:</td> </tr> <tr> <td>Saldo \$</td> <td>\$ 7.389.452.940,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ANTICIPOS		INDICADOR VC	Otorgado \$	\$ 9.885.528.230,00	En el mes:	Amortizado \$	\$ 2.496.075.290,00	Acumulado:	Saldo \$	\$ 7.389.452.940,00																																																																																																																																			
ANTICIPOS		INDICADOR VC																																																																																																																																																	
Otorgado \$	\$ 9.885.528.230,00	En el mes:																																																																																																																																																	
Amortizado \$	\$ 2.496.075.290,00	Acumulado:																																																																																																																																																	
Saldo \$	\$ 7.389.452.940,00																																																																																																																																																		
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																			
Meta Física Programada % <u>27,83%</u> Avance o Atrás Físico % <u>0,39%</u> Meta Física Ejecutada % <u>28,22%</u>																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Ejecutado acumulado a 2025</th> <th>Vigencia 2026</th> <th>Avance Físico</th> <th>Tramo 3001</th> <th>Tramo 6504</th> <th>Total 2026</th> <th>% 2026</th> <th>Ejecutado Total proyecto</th> <th>% Total proyecto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estudios y diseños</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>56,60</td> <td>0,40</td> <td>Prog</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> <td>0,40</td> <td>100,0%</td> <td>56,62</td> <td>99,33%</td> </tr> <tr> <td>Exploraciones</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>20,04</td> <td>5,10</td> <td>Prog</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>100,0%</td> <td>20,04</td> <td>35,16%</td> </tr> <tr> <td>Bases, subbases y Alcantarillas</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>18,74</td> <td>5,10</td> <td>Ejec</td> <td>2,35</td> <td>2,35</td> <td>2,35</td> <td>84,9%</td> <td>22,84</td> <td>40,01%</td> </tr> <tr> <td>Pavimentos Asfálticos</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>17,40</td> <td>5,70</td> <td>Prog</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>100,0%</td> <td>17,40</td> <td>30,53%</td> </tr> <tr> <td>Estructuras y Drenajes</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>16,90</td> <td>4,70</td> <td>Ejec</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>100,0%</td> <td>16,90</td> <td>30,01%</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Señalización</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>7,00</td> <td>4,70</td> <td>Prog</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>100,0%</td> <td>7,00</td> <td>12,28%</td> </tr> <tr> <td>Obras Varías</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>1,83</td> <td>4,70</td> <td>Ejec</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>100,0%</td> <td>1,83</td> <td>3,21%</td> </tr> <tr> <td>Transportes</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>19,19</td> <td>4,70</td> <td>Prog</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>100,0%</td> <td>19,19</td> <td>33,68%</td> </tr> <tr> <td>Puente Vehicular PR38-000 RN 6500 sobre la Quebrada Las Delicias</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>0,71</td> <td>0,29</td> <td>Prog</td> <td>0,00</td> <td>0,29</td> <td>0,29</td> <td>41,4%</td> <td>0,63</td> <td>89,08%</td> </tr> <tr> <td>Bombeo Provisional</td> <td>KM</td> <td>57</td> <td>19,19</td> <td>4,70</td> <td>Ejec</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td>100,0%</td> <td>19,19</td> <td>35,44%</td> </tr> </tbody> </table> El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia indicando los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Cajalún- Mina Blanca TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Balolitas - Mina Blanca						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Ejecutado acumulado a 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Total 2026	% 2026	Ejecutado Total proyecto	% Total proyecto	Estudios y diseños	KM	57	56,60	0,40	Prog	0,2	0,2	0,40	100,0%	56,62	99,33%	Exploraciones	KM	57	20,04	5,10	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	20,04	35,16%	Bases, subbases y Alcantarillas	KM	57	18,74	5,10	Ejec	2,35	2,35	2,35	84,9%	22,84	40,01%	Pavimentos Asfálticos	KM	57	17,40	5,70	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	17,40	30,53%	Estructuras y Drenajes	KM	57	16,90	4,70	Ejec	0,90	0,90	0,90	100,0%	16,90	30,01%	Seguridad y Señalización	KM	57	7,00	4,70	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	7,00	12,28%	Obras Varías	KM	57	1,83	4,70	Ejec	0,90	0,90	0,90	100,0%	1,83	3,21%	Transportes	KM	57	19,19	4,70	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	19,19	33,68%	Puente Vehicular PR38-000 RN 6500 sobre la Quebrada Las Delicias	UND	1	0,71	0,29	Prog	0,00	0,29	0,29	41,4%	0,63	89,08%	Bombeo Provisional	KM	57	19,19	4,70	Ejec	0,90	0,90	0,90	100,0%	19,19	35,44%
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																															
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Ejecutado acumulado a 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Total 2026	% 2026	Ejecutado Total proyecto	% Total proyecto																																																																																																																																								
Estudios y diseños	KM	57	56,60	0,40	Prog	0,2	0,2	0,40	100,0%	56,62	99,33%																																																																																																																																								
Exploraciones	KM	57	20,04	5,10	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	20,04	35,16%																																																																																																																																								
Bases, subbases y Alcantarillas	KM	57	18,74	5,10	Ejec	2,35	2,35	2,35	84,9%	22,84	40,01%																																																																																																																																								
Pavimentos Asfálticos	KM	57	17,40	5,70	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	17,40	30,53%																																																																																																																																								
Estructuras y Drenajes	KM	57	16,90	4,70	Ejec	0,90	0,90	0,90	100,0%	16,90	30,01%																																																																																																																																								
Seguridad y Señalización	KM	57	7,00	4,70	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	7,00	12,28%																																																																																																																																								
Obras Varías	KM	57	1,83	4,70	Ejec	0,90	0,90	0,90	100,0%	1,83	3,21%																																																																																																																																								
Transportes	KM	57	19,19	4,70	Prog	0,90	0,90	0,90	100,0%	19,19	33,68%																																																																																																																																								
Puente Vehicular PR38-000 RN 6500 sobre la Quebrada Las Delicias	UND	1	0,71	0,29	Prog	0,00	0,29	0,29	41,4%	0,63	89,08%																																																																																																																																								
Bombeo Provisional	KM	57	19,19	4,70	Ejec	0,90	0,90	0,90	100,0%	19,19	35,44%																																																																																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																			
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																
UBICACIÓN: PUERTO RICO PERMISO MINERO: <u>DISPONIBLE</u> SI <u>X</u> NO <u>-</u>			ZONAS DE DEPOSITO: SI <u>X</u> NO <u>-</u> N/A <u>-</u> LICENCIA AMBIENTAL: SI <u>-</u> NO <u>-</u> N/A <u>X</u>																																																																																																																																																
QUEBRADA MONTE CRISTO LICENCIA AMBIENTAL: SI <u>X</u> NO <u>-</u>			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI <u>X</u> NO <u>-</u> N/A <u>-</u> CONCESIÓN DE AGUAS: SI <u>X</u> NO <u>-</u> N/A <u>-</u>																																																																																																																																																
UBICACIÓN: PUERTO RICO PERMISO MINERO: SI <u>X</u> NO <u>-</u>			Ocupación de CAUCE: SI <u>X</u> NO <u>-</u> N/A <u>-</u> VERTIENTOS: SI <u>-</u> NO <u>-</u> N/A <u>X</u>																																																																																																																																																
EL AGUILA LICENCIA AMBIENTAL: SI <u>X</u> NO <u>-</u>			EMISIONES: SI <u>X</u> NO <u>-</u> N/A <u>-</u> OTROS (Especificar cual): SI <u>X</u> NO <u>-</u> N/A <u>-</u>																																																																																																																																																

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

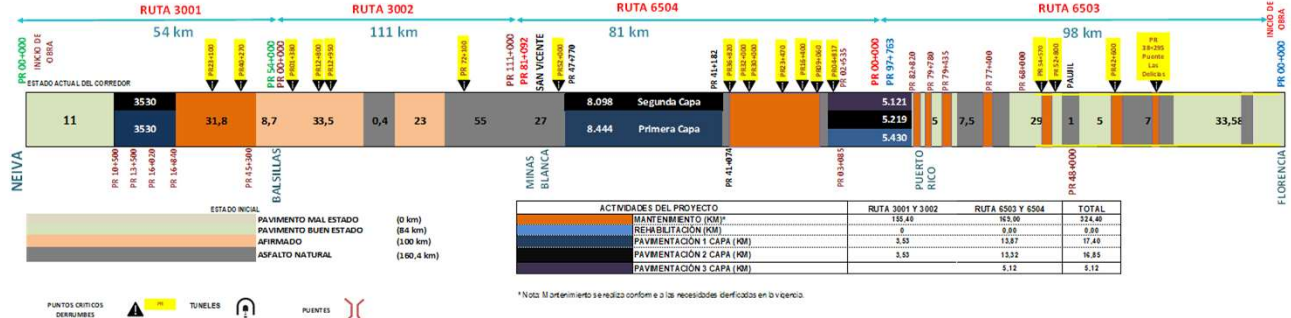 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN FECHA	MDP-001-2015-PR-3 1 20 de mayo de 2026 (Día / Mes / Año)																								
RUTA 3001: Remoción de derrumbes. • Se realiza la remoción de material proveniente de los taludes con el fin de habilitar el tránsito por los siguientes puntos, PRPR37+000, PR34+750 PR34+330, PR32+323, PR32+250, PR31+207 y PR29+195. Concreto de 28Mpa • Se realiza el suministro e instalación de concreto de 28Mpa para la construcción de cabezal de descole de alcantarilla ubicado en el PR 15+960, costado derecho. • Se realiza el suministro e instalación de concreto de 28Mpa para la construcción de losa inferior de cuerpo de descole para box culvert ubicado en el PR 15+802, costado derecho. Acero de refuerzo • Se realiza el suministro e instalación de acero de refuerzo para la construcción de box culvert de 1X1 ubicado en el PR 15+802, costado derecho. Cinta PVC Sika O-22. • Se realiza el suministro e instalación de cinta de PVC Sika O-22, para placa de box culvert ubicado en el PR 15+802.																											
RUTA 3002: Remoción de derrumbes • Se realiza la remoción y transporte de materia proveniente de los derrumbes de la ruta 3002. Transporte de derrumbes. • Se realiza la remoción y transporte de materia proveniente de los derrumbes de la ruta 3002.																											
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROXIMA SEMANA																											
RUTA 6503: Suministro e instalación de terraplén (m3): • PR38+085 al PR38+190. Acero de refuerzo New Jersey eje 1 y eje 2 (kg): • PR38+150 al PR38+260. • PR38+300 al PR38+600. Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias eje 1 y eje 2 (m3): • PR38+150 al PR38+260. • PR38+300 al PR38+600. Riego de liga asfáltica (m2): • PR36+000 al PR37+700. Mezcla Densa Caliente MDC-19 (m3): • PR36+000 al PR37+700.																											
RUTA 6504: Retro de asfaltita (m2): • PR10+000 al PR10+200. Excavación sin clasificar (m3): • PR10+000 al PR10+200. Transporte material de excavación (m3-km): • PR10+000 al PR10+200. Geotextil NT 2500 (m2): • PR9+600 al PR9+800. Material granular drenante (m3): • PR9+600 al PR9+800. Tubería perforada 4" (m): • PR9+600 al PR9+800. Suministro e instalación de subbase (m3): • PR10+000 al PR10+200. Base granular clase A (m3): • PR7+300 al PR7+750. Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas (m3) • PR6+875 al PR9+872. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa (Kg) • PR6+875 al PR9+872.																											
RUTA 3001 Suministro e instalación de acero de refuerzo: • PR15+620, para aletas de Box Culvert de 1.5X1.5 • PR15+960, costado izquierdo, para poceta de encofe de alcantarilla. Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa: • PR15+620, para aletas de Box Culvert Excavación mecánica: • PR15+620 a PR15+745, para la construcción de filtros longitudinal costado derecho. Instalación de concreto de 28Mpa • PR15+802, para la construcción de muros y placa superior de box Culvert.																											
RUTA 3002 Remoción de derrumbes • Remoción de material proveniente de los taludes. Transporte de derrumbes. • Transporte de material proveniente de los taludes.																											
CORREDOR VAL NEIVA - FLORENCIA RUTAS 3001, 3002, 6503 Y 6504 Dpto. HUILA Dpto. CAQUETÁ  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES DEL PROYECTO</th> <th>RUTA 3001 Y 3002</th> <th>RUTA 6503 Y 6504</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANTENIMIENTO (RM)</td> <td>155.40</td> <td>163.00</td> <td>318.40</td> </tr> <tr> <td>REHABILITACIÓN (RM)</td> <td>0</td> <td>9.80</td> <td>9.80</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (RM)</td> <td>3.93</td> <td>13.87</td> <td>17.80</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (RM)</td> <td>3.93</td> <td>13.32</td> <td>16.85</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (RM)</td> <td></td> <td>5.12</td> <td>5.12</td> </tr> </tbody> </table> * Nota: Mantenimiento se realiza conforme a las necesidades identificadas en la vigencia.				ACTIVIDADES DEL PROYECTO	RUTA 3001 Y 3002	RUTA 6503 Y 6504	TOTAL	MANTENIMIENTO (RM)	155.40	163.00	318.40	REHABILITACIÓN (RM)	0	9.80	9.80	PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (RM)	3.93	13.87	17.80	PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (RM)	3.93	13.32	16.85	PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (RM)		5.12	5.12
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	RUTA 3001 Y 3002	RUTA 6503 Y 6504	TOTAL																								
MANTENIMIENTO (RM)	155.40	163.00	318.40																								
REHABILITACIÓN (RM)	0	9.80	9.80																								
PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (RM)	3.93	13.87	17.80																								
PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (RM)	3.93	13.32	16.85																								
PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (RM)		5.12	5.12																								
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO   																											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																											
El contrato de obra 991 de 2021 en el plan de inversiones, a corte del 26/05/2026, presenta un adelanto del 0,38%.																											
Verificación de la densidad de campo mediante el método del cono de arena o densímetro nuclear, eligiendo un grado de compactación mínimo del 95% o 100% según corresponda a la capa compactada.																											
A la fecha se lleva 3,53 km. Pavimentados con Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en Primera capa en la Ruta 3001 y 13,87 km. Pavimentados con Mezcla Densa en Caliente MDC-19 primera capa de la Ruta 6504 para un total en el proyecto de 17,40 Km.																											
Firma: _____ Nombre: _____ Matricula Profesional No.: _____		Firma: _____ Nombre: WILSON ANDRES PARRA Matricula Profesional No.: 15002138865 BYC																									

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN
1
PÁGINA

FECHA
31/05/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-26 PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO No. 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV221	FREIGHTLINER/ 2022	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV225	FREIGHTLINER/ 2022	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZO735	DAEWOO/ 2011	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	R	R	R	I	R	A	A	A	A	A	I	I	A	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW077	DAEWOO/ 2015	22TON	NEIVA	I	A	I	A	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	I	R	R	A	A	R	R	I	
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW454	DAEWOO/ 2014	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	R	I	
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLL809	DAEWOO/ 2015	22TON	NEIVA	I	A	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLL812	DAEWOO/ 2015	22TON	NEIVA	I	A	I	A	R	R	R	R	I	R	A	A	A	A	A	A	A	I	I	R	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	I
RETRO DE LLANTAS RC-016	DOSSAN / 2021	0,76M3	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR MC-051	CATERPILLAR / 2021	1000kg	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA NISSAN ZZ0887	NISSAN	1000 KG / 5P	NEIVA	I	R	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I	I	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA MITSUBISHI KWT225	MITSUBISHI	689 KG / 5P	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMPERO KXY-317	SUZUKI	4P	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIÓN UTILITARIO KSO400	CHEVROLET	3950 KG	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MOTOSOLDADOR MS012	MILLER	100-225 AMP	NEIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	
MOTOSOLDADOR MS006	MILLER	100-225 AMP	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJS-944	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJS-945	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN596	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK 363	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO 410	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	R	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV 225	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CARRO RIEGO - SZN 833	DAEWOO 2011	14 M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	R	R	A	I	A	A	A	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV246	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO 0414	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV 218	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CARRO RIEGO - WLK034	DAEWOO 2015	14 M3	PUERTO RICO	I	A	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK364	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SPU 185	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SWP 834	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	R	I	R	R	R	R	R	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SOQ 182	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
CARRO RIEGO WFT 501	DAEWOO 2014	14 M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SOQ 185	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT 531	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SOQ 189	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	R	R	R	I	A	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT 526	DAEWOO 2014	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW085	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	R	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW458	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT506	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN824	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK038	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	R	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK039	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT784	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK362	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN824	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SPU190	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA WLL810	DAEWOO 2015	14 m3	PUERTO RICO	I	A	I	R	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
MIXER WFW 091	DAEWOO 2015	6 M3	PUERTO RICO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	R	R	I	
MIXER WLK379	DAEWOO	15.86 TON	PUERTO RICO	I	R	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	R	I	I	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I
MIXER WLK377	DAEWOO	15.86 TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MIXER WCV 889	DAEWOO	15.86 TON	PUERTO RICO	I	R	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	I

f



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN
1
PÁGINA

FECHA
31/05/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-26 PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO No. 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CAMIONETA JXU-053	NISSAN	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CAMIONETA KWP-027	MITSUBISHI	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CAMIONETA MUR-340	TOYOTA	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CAMIONETA RBZ418	TOYOTA	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CAMPERO KXV-002	SUZUKI	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CAMION SERVICIO CHEVROLET KSO 396	MACK	55 TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTONIVELADORA MO-015	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTONIVELADORA MO-024	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTONIVELADORA MO 012	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTONIVELADORA MO 009	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-055	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-010	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-054	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-069	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
VIBRO COMPACTADOR DE LLANTAS VC 075		0.69M3																																	
VIBRO COMPACTADOR DOBLE TANDEN VC 074		0.69M3	PUERTO RICO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	I	
MINICARGADOR MC-036	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR MC-043	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR MC-035	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
EXCAVADORA DE ORUGAS EX-032	DOSSAN	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I
RETRO DE LLANTAS RC-017	DOSSAN/ 2020	0.5M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CARGADOR DE LLANTAS CG-018	DOSSAN/ 2020	3M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I
CARGADOR DE LLANTAS CG-015	DOSSAN/2015	3M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I
TRITURADORA MOVIL TR-020	METSO S3.9/ 2021	10M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
TRITURADORA MOVIL TR-021	METSO LOCOTRAC/ 2021	6M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA DE ASFALTO CIBER PL-005	CIBER/2021	180T/h	PUERTO RICO	I	R	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	A	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO	PC-004	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	R	R	I
GENERADOR ELECTRICO GE-004	PERKINS/2016	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
GENERADOR ELECTRICO GE-020	STANFORD/2021	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
FINISHER PV012			PUERTO RICO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	92	92	93	93	93	93	90	93	93	93	93	93	93	93
TOTAL ACTIVO				0	82	12	80	79	81	78	67	79	12	81	83	76	83	70	81	13	13	82	81	83	72	82	11	85	85	82	81	81	81	81	10
TOTAL EN REPARACIÓN				1	6	1	8	9	7	10	8	9	1	7	5	12	8	9	9	9	2	2	9	11	9	9	10	2	8	8	11	12	12	3	
TOTAL INACTIVO				91	4	79	4	4	4	4	17	4	79	4	4	4	1	13	1	77	77	1	1	1	12	1	77	0	0	0	0	0	0	0	80

RESUMEN PERIODO / MES		No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		93	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		64	69%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		7	8%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		21	22%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-025 salio del proyecto el dia 04 de mayo de 2026, FINISHER PV 012, VIBROCOMPACTADOR DOBLE TANDEN VC 074, VIBROCONPACTADOR DE LLANTAS VC 075 ingresaron el 14 de mayo de 2026, MIXER WFW 091 ingreso el dia 26 de mayo de 2026.

Handwritten signature

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA					
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-26		PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA			
CONTRATO No. 991 de 2021		CONTRATISTA: CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021		INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO. NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																		

Firma:

Nombre: JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCON
 Director de obra
 Matricula Profesional No.: 25202134261 CND

Firma:

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
 Residente de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 13202-122413 BLV


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEP/MI/NI-15-FR-6																															
														VERSIÓN		1																													
														PÁGINA																															
														FECHA		8 Julio 2026 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE														DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA																															
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021														CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may 26														PROYECTO: CORREDOR NENA – SAN VICENTE DEL CAJALÚN – PUERTO RICO – FLORENCIA																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 995 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																															
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar														NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																															
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																													
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																										Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (BEC)	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)				
					P	N	E	N	A	E	N	A	E	N	A	E	N	A	E	N	A	E	N	A	E	N	A	E	N	A			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión		Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ABENDANO CRUZ JOSE ESAUL	17.783.543	CONDUCTOR DOBLE TROQUE	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.823.030	\$ 126.900	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 73.000	COLPENSIONES	9504470881	\$ 291.700	\$ 59.000	-	-	-	
2	ACEVEDO LUIS ALBERIO	17.783.543	CONDUCTOR DOBLE TROQUE	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.510.200	\$ 174.800	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 100.500	COLPENSIONES	9504470881	\$ 401.700	\$ 100.500	-	-	-
3	AGUIDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1.115.953.038	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.858.135	\$ 129.400	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 74.400	PORVENIR	9504470881	\$ 297.400	\$ 45.000	-	-	-
4	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17.702.262	CONDUCTOR DOBLE TROQUE	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.637.841	\$ 183.600	V	NUEVA E.P.S. MOVILIDAD	9504470881	\$ 105.600	PORVENIR	9504470881	\$ 422.100	\$ 45.000	-	-	-
5	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	17.788.532	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.203.085	\$ 223.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 128.200	PORVENIR	9504470881	\$ 512.500	\$ 128.200	-	-	-
6	ANDRADE ROS LONDREY	7.726.893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.308.968	\$ 160.800	V	SANITAS	9504470881	\$ 92.400	PORVENIR	9504470881	\$ 369.500	\$ 92.400	-	-	-
7	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	1.115.950.528	CONDUCTOR DOBLE TROQUE	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.193.018	\$ 152.700	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 87.800	PORVENIR	9504470881	\$ 350.900	\$ 87.800	-	-	-
8	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	\$ 6.397.798	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 6.931.132	\$ 482.500	V	FAMISANAR	9504470881	\$ 277.300	COLPENSIONES	9504470881	\$ 1.109.000	\$ 277.300	-	-	-
9	ARBOLEDA CARACAS HECTOR FAVIO	10.499.735	OFICIAL DE OBRA	\$ 1.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 750.667	\$ 52.300	V	0	9504470881	\$ 30.100	0	9504470881	\$ 120.200	\$ 30.100	-	-	FRMA DE CONTRATO 21 DE ABRIL DE 2026
10	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1.003.820.143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	\$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.800.000	\$ 194.900	V	SANITAS	9504470881	\$ 112.000	COLPENSIONES	9504470881	\$ 448.000	\$ 112.000	-	-	-
11	ARIAS VIDAL FERNIEY EDUARDO	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	\$ 6.397.798	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 13.566.667	\$ 944.300	V	NUEVA EPS	9504470881	\$ 542.700	COLFONDOS	9504470881	\$ 2.170.700	\$ 542.700	\$ 271.333	\$ 407.000	-
12	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8.566.761	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.910.905	\$ 133.000	V	EPS MUTUAL SER	9504470881	\$ 76.500	PROTECCION	9504470881	\$ 305.800	\$ 38.400	-	-	-
13	AYA GULMBO YARLEDIS	1.118.364.489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRAFICO	\$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	A.I.C.	9504470881	\$ 70.100	PORVENIR	9504470881	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	126 DIAS DE LICENCIA DE MATERNIDAD DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2026
14	AYALA BARRA LUIS MIGUEL	1.093.775.884	PROFESIONAL CALIDAD	\$ 4.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 4.733.334	\$ 329.500	V	NUEVA EPS	9504470881	\$ 189.400	PORVENIR	9504470881	\$ 757.400	\$ 189.400	-	-	-
15	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1.075.274.138	AUXILIAR AMBIENTAL	\$ 2.080.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.148.225	\$ 149.600	V	SANITAS	9504470881	\$ 86.000	PROTECCION	9504470881	\$ 343.800	\$ 86.000	-	-	-
16	BARRIOS CABRERA JHONATAN	1.006.518.031	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.071.816	\$ 144.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 82.900	PORVENIR	9504470881	\$ 331.500	\$ 82.900	-	-	-
17	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16.189.231	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.808.984	\$ 126.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 72.400	PORVENIR	9504470881	\$ 289.500	\$ 72.400	-	-	-
18	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7.720.225	AUXILIAR DE LABORATORIO	\$ 1.943.439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.004.000	\$ 139.500	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 80.200	COLFONDOS	9504470881	\$ 320.700	\$ 80.200	-	-	-
19	BOLANO ARRETA LENER ALEJSSO	1.049.348.655	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.932.955	\$ 134.600	V	COOSALUD MOVILIDAD	9504470881	\$ 77.400	PROTECCION	9504470881	\$ 309.300	\$ 101.900	-	-	-
20	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	93.235.403	TOPOGRAFO	\$ 2.827.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.147.000	\$ 219.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9504470881	\$ 125.900	COLFONDOS	9504470881	\$ 503.600	\$ 125.900	-	-	-
21	BORRAY MONTEL JOSE JESUS	96.332.427	OFICIAL DE OBRA	\$ 1.752.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.126.271	\$ 78.400	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 45.100	PORVENIR	9504470881	\$ 180.300	\$ 45.100	-	-	RENUNCIA 17 DE ABRIL DE 2026
22	BRAND MOLANO JUAN SEBASTIAN	1.097.182.827	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.750.906	\$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 70.100	PORVENIR	9504470881	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
23	BURROS GOMEZ ANDRES CAMILO	1.081.154.948	CONDUCTOR DOBLE TROQUE	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.266.236	\$ 157.800	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 90.700	PORVENIR	9504470881	\$ 362.600	\$ 90.700	-	-	4 DIAS DE VACACIONES 27 AL 30 DE ABRIL
24	CABALLERO GONZALEZ OLIVIA JOHANA	26.429.849	PALETERO	\$ 1.750.905	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.751.273	\$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 70.100	PORVENIR	9504470881	\$ 280.300	\$ 70.100	-	-	3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 6 AL 8 DE ABRIL Y 5 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 16 AL 20 DE ABRIL
25	CABARCIA FLOREZ DONNO	11.051.242	OFICIAL DE OBRA	\$ 1.902.108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.234.383	\$ 162.500	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 93.400	PORVENIR	9504470881	\$ 373.600	\$ 48.000	-	-	-
26	CACELMA ESPINOSA LINA ANDREA	1.075.276.273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	\$ 2.208.900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.283.000	\$ 158.900	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 91.400	PORVENIR	9504470881	\$ 365.300	\$ 13.000	-	-	3 DIAS DE CALAMIDAD DOMESTICA 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO
27	CADENA DIAZ NELSON	7.719.307	CONDUCTOR DOBLE TROQUE	\$ 2.200.000	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1.534.458	\$ 106.800	V	SANITAS	9504470881	\$ 61.400	COLPENSIONES	9504470881	\$ 245.600	\$ 61.400	-	-	AUSENTISMO 6 AL 9 DE ABRIL RENUNCIA EL 9 DE ABRIL DE 2026
28	CACEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13.069.675	PROFESIONAL AMBIENTAL	\$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 5.813.834	\$ 404.700	V	NUEVA EPS	9504470881	\$ 23							


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO		MEP/MNI-RI-15-FR-8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	VERSION		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	PAGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																	FECHA		8 julio 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																			(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO SUR OCCIDENTE															DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA No:		991 DE 2021															CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		may-26															CORRECTOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAJALIAN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		995 DE 2021															CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NOMBRE ARL:		Seguros Bolívar															NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
42	CAVEDES PERDOMO EDL	83.248.558	OPERADOR COMPACTADOR 2 TONOS MAS	\$	2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

k

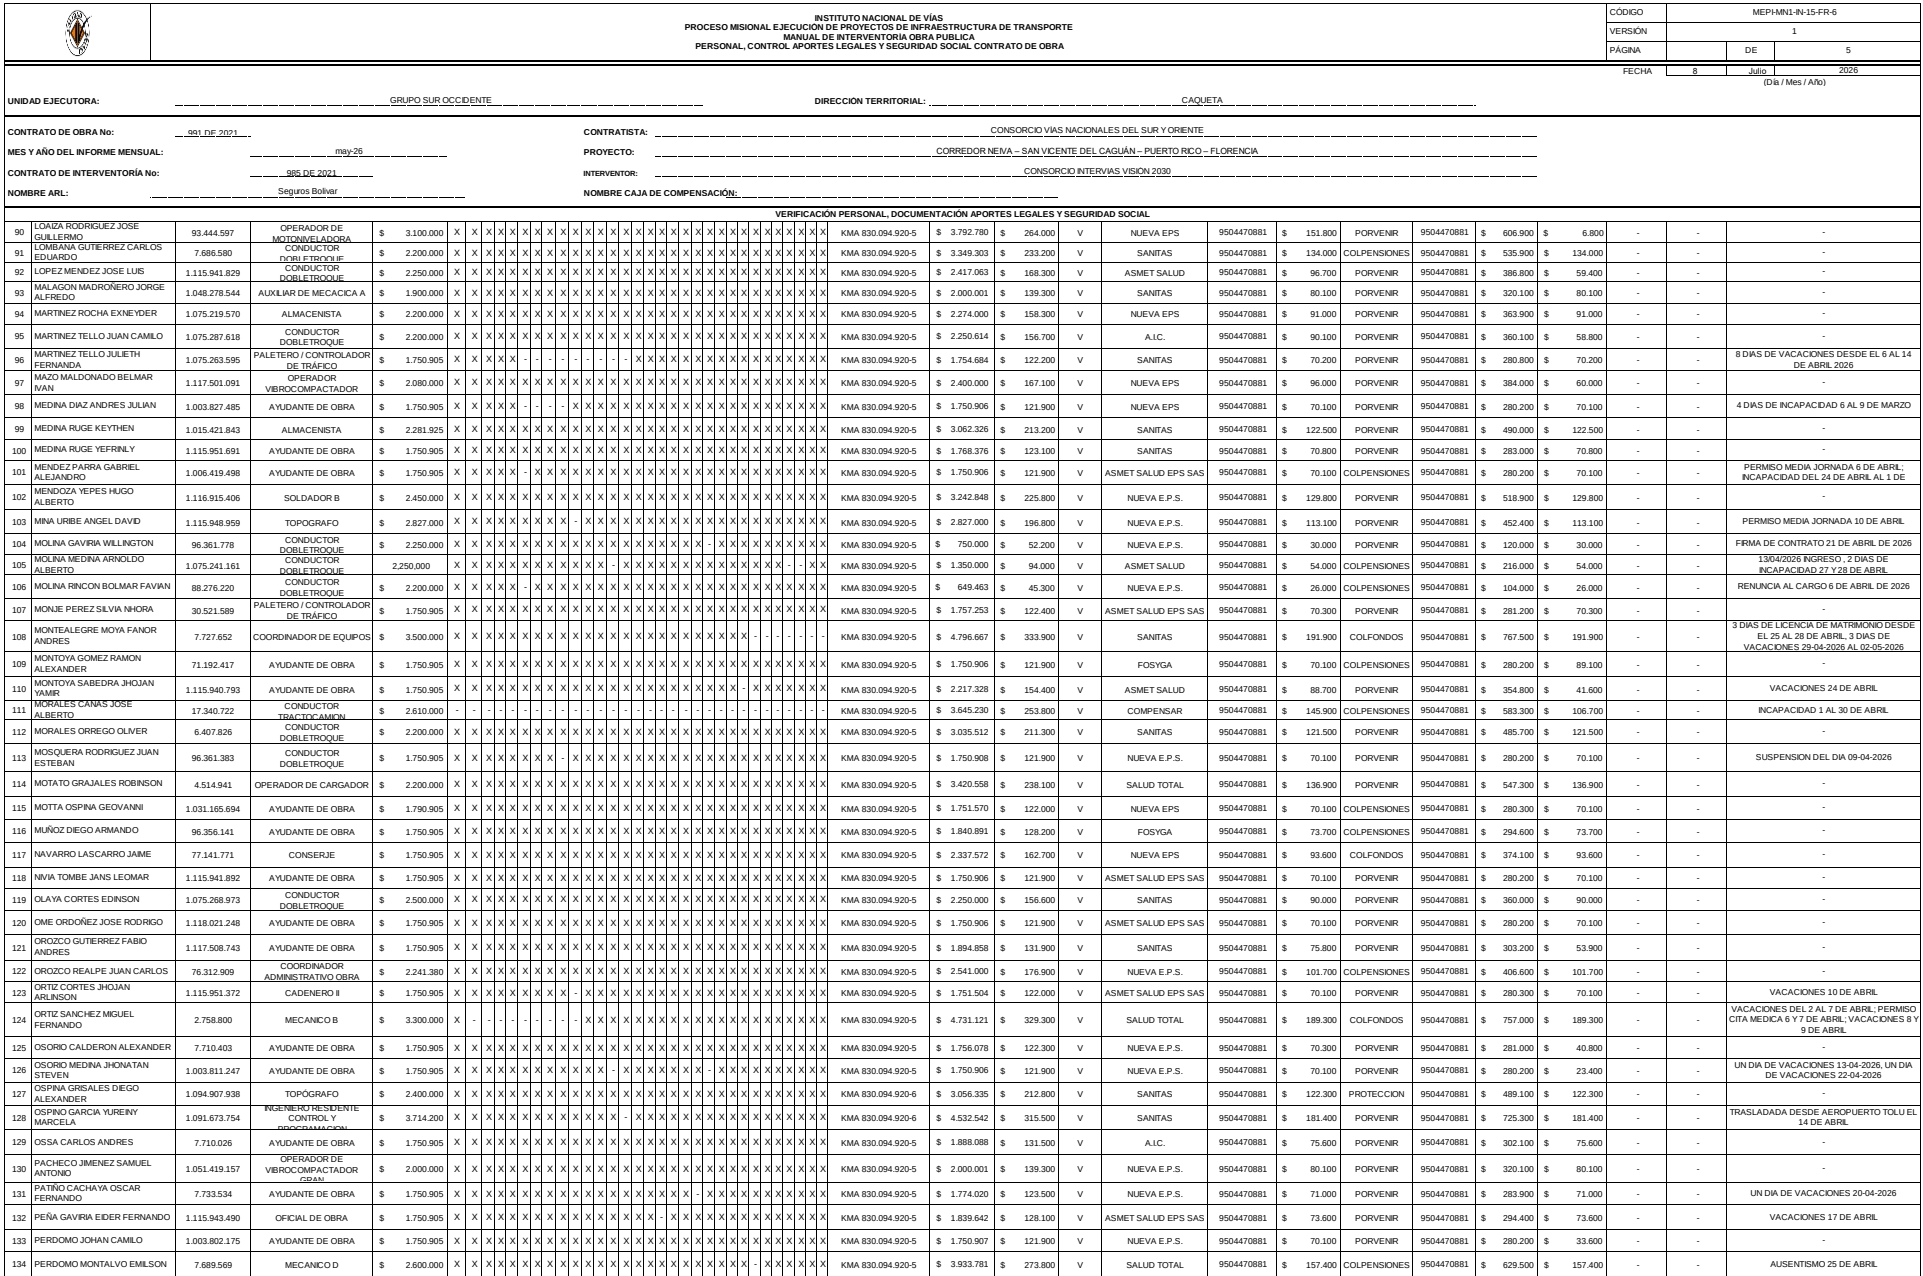

b

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																				CODIGO	MEPH-MNI-N-15-FR-6																			
																					VERSION	1																			
																					PAGINA	DE	5																		
																				FECHA	8	Julio / Mes / Año		2026																	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE																				DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA																					
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021																				CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo 26																				CORREDOR NEMA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 985 DE 2021																				CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																					
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar																				NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:																					
VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																									
135	PERDOMO PULIDO EDINSON	1.075.270.671	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.075.490	\$	144.500	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	83.100	PROTECCION	9504470881	\$	332.100	\$	83.100	-	-	DOS DIAS DE INCAPACIDAD 12 Y 13 DE ABRIL.		
136	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1.003.807.675	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.816.491	\$	126.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9504470881	\$	72.700	PROTECCION	9504470881	\$	290.700	\$	36.800	-	-	UN DIA DE VACACIONES 04-04-2026, UN DIA DE VACACIONES 11-04-2026, UN DIA DE VACACIONES 18-04-2026 Y INCAPACIDAD POR UN DIA 27-04-2026		
137	PEREZ TMOITE DIEGO FERNANDO	1.117.493.692	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.883.648	\$	131.200	V	ASMET SALUD	9504470881	\$	75.400	PORVENIR	9504470881	\$	301.400	\$	75.400	-	-	-		
138	PERILLA JUAN FRANCISCO	74.363.378	OFICIAL DE OBRA	\$	2.024.807	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	\$	13.064.904	\$	909.400	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	522.600	PORVENIR	9504470881	\$	2.090.400	\$	522.600	\$	261.298	\$	391.947	VACACIONES DEL 2 AL 14 DE ABRIL
139	PINZA JOJOA TORBIO GABRIEL	12.992.663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	\$	2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	3.078.345	\$	214.300	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	123.200	COLFONDOS	9504470881	\$	492.600	\$	123.200	-	-	-		
140	PINZON GUERREROLUIS FRANCISCO	79.794.332	COORDINADOR DE EQUIPOS	\$	4.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	5.033.334	\$	350.400	V	NUEVA EPS	9504470881	\$	201.400	COLPENSIONES	9504470881	\$	805.400	\$	201.400	-	-	-		
141	POLANA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	1.003.953.459	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	\$	641.999	\$	44.700	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	25.700	PORVENIR	9504470881	\$	102.800	\$	74.000	-	-	INCAPACIDAD POR 30 DIAS DESDE 31-03-2026 AL 29-04-2026, INCAPACIDAD POR 30 DIAS DESDE 30-04-2026 AL 29-05-2026		
142	POSADA OLIVEROS BRAYAN FORLEY	1.006.528.938	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	\$	1.839.047	\$	128.000	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	73.600	PORVENIR	9504470881	\$	294.300	\$	73.600	-	-	LICENCIA DE PATERNIDAD DEL 10 AL 19 DE ABRIL, VACACIONES 20 Y 21 ABRIL		
143	POSADA GROZCO YESSEN ESTIVEN	1.118.020.352	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.851.530	\$	128.900	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	74.100	PROTECCION	9504470881	\$	296.300	\$	74.100	-	-	-		
144	PRADA TIQUE GUILLERMO	93.445.007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	\$	2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.794.019	\$	194.500	V	SALUD TOTAL	9504470881	\$	111.800	PORVENIR	9504470881	\$	447.100	\$	70.300	-	-	-		
145	PUNTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1.075.271.209	MECANICO C	\$	2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	3.050.001	\$	212.300	V	SANITAS	9504470881	\$	122.100	PORVENIR	9504470881	\$	488.100	\$	122.100	-	-	-		
146	PULIDO POLANA DIEGO FERNANDO	1.075.240.735	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.943.446	\$	135.300	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	77.800	PROTECCION	9504470881	\$	311.000	\$	77.800	-	-	UN DIA DE VACACIONES 27-04-2026		
147	QUITAN CASTAÑO LEDUAR	17.688.381	OPERADOR DE MINICARGADOR	\$	2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.523.672	\$	175.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$	101.000	PORVENIR	9504470881	\$	403.800	\$	101.000	-	-	-		
148	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	1.003.804.498	CADENERO II	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.767.619	\$	123.100	V	NUEVA EPS	9504470881	\$	70.800	PROTECCION	9504470881	\$	282.900	\$	70.800	-	-	-		
149	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10.784.198	OFICIAL DE OBRA	\$	1.943.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.618.065	\$	182.300	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	104.800	COLFONDOS	9504470881	\$	418.900	\$	104.800	-	-	-		
150	RAMOS MANA YNA PAOLA	1.081.153.136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRAFICO	\$	1.750.905	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.757.703	\$	122.400	V	SANITAS	9504470881	\$	70.400	PROTECCION	9504470881	\$	281.300	\$	70.400	-	-	2 DIAS DE INCAPACIDAD 6 Y 7 DE ABRIL . AUSENTEISMO DEL DIA 25-04-2026		
151	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	7.712.044	CONDUCTOR DE TRAFICO	\$	2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.250.000	\$	156.600	V	NUEVA EPS	9504470881	\$	90.000	PORVENIR	9504470881	\$	360.000	\$	90.000	-	-	-		
152	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	1.115.951.987	CONDUCTOR DE TRAFICO	\$	2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.272.867	\$	158.200	V	SANITAS	9504470881	\$	91.000	PORVENIR	9504470881	\$	363.700	\$	91.000	-	-	-		
153	RAMOS RODRIGUEZ YESSAN JAVIER	1.003.804.392	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.750.906	\$	121.900	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	70.100	PORVENIR	9504470881	\$	280.200	\$	70.100	-	-	-		
154	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	1.118.363.187	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.771.386	\$	123.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$	70.900	PORVENIR	9504470881	\$	283.500	\$	70.900	-	-	-		
155	RIEYES ORTIZ GONZALO ENRIQUE	7.162.225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	\$	4.598.502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.112.268	\$	77.500	V	POSYGA	9504470881	\$	44.500	PROTECCION	9504470881	\$	178.000	\$	60.300	-	-	RENUNCIA AL CARGO 6 DE ABRIL DE 2026		
156	RINCON GARCIA JAVIER ENRIQUE	1.006.512.659	OPERADOR DE EXCAVADORA	\$	2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.454.093	\$	170.900	V	NUEVA EPS	9504470881	\$	98.200	PORVENIR	9504470881	\$	392.700	\$	59.900	-	-	AUSENTEISMO 29 Y 30 DE ABRIL		
157	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1.075.279.696	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.834.223	\$	127.700	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	73.400	PORVENIR	9504470881	\$	293.500	\$	73.400	-	-	-		
158	ROA CULMA JESSICA	1.075.304.142	AUXILIAR SOCIAL	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.826.936	\$	127.200	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	73.100	PORVENIR	9504470881	\$	292.400	\$	73.100	-	-	-		
159	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1.115.949.550	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.801.145	\$	125.400	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	72.100	PORVENIR	9504470881	\$	288.200	\$	72.100	-	-	VACACIONES DEL 24 AL 29 DE ABRIL		
160	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80.189.153	INGENIERO RESIDENTE	\$	7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	8.474.667	\$	589.900	V	COMPENSAR	9504470881	\$	339.000	PORVENIR	9504470881	\$	1.356.000	\$	339.000	-	-	-		
161	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	96.362.290	OFICIAL DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.800.102	\$	125.300	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	72.100	PORVENIR	9504470881	\$	288.100	\$	72.100	-	-	15 Y 20 DE ABRIL PERMISO POR CITA MEDICA		
162	ROJAS BURBANCO FRANKLIN FRED	17.688.437	CONDUCTOR DE MOTONIVELADORA	\$	2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	3.001.654	\$	209.000	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	120.100	PROTECCION	9504470881	\$	480.300	\$	120.100	-	-	-		
163	ROJAS CORDOBA LIDER	17.788.159	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.782.143	\$	124.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$	71.300	COLPENSIONES	9504470881	\$	285.200	\$	71.300	-	-	VACACIONES 15 DE ABRIL		
164	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.075.311.208	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.753.838	\$	122.100	V	SANITAS	9504470881	\$	70.200	PORVENIR	9504470881	\$	280.700	\$	70.200	-	-	AUSENTEISMO DEL DIA 25-04-2026		
165	ROMERO FERRO ANIBAL	1.115.952.530	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.202.376	\$	153.300	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	88.100	PORVENIR	9504470881	\$	352.400	\$	88.100	-	-	-		
166	RONCANCO PEREA OSCAR	1.115.940.243	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.756.796	\$	122.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$	70.300	PORVENIR	9504470881	\$	281.100	\$	70.300	-	-	INCAPACIDAD 24 Y 25 DE ABRIL		
167	SALAZAR SAENZ JAVIER	17.646.330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	\$	2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	2.798.957	\$	194.900	V	SANITAS	9504470881	\$	112.000	COLPENSIONES	9504470881	\$	447.900	\$	112.000	-	-	-		
168	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	17.646.330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	\$	3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	3.031.118	\$	211.000	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	121.300	COLPENSIONES	9504470881	\$	485.000	\$	121.300	-	-	VACACIONES 20 DE ABRIL		
169	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79.870.481	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$	1.931.804	\$	134.500	V	NUEVA E.P.S.	9504470881	\$	77.300	COLPENSIONES	9504470881	\$	309.100	\$	77.300	-	-	-		
170	SANCHEZ HOYOS ARCEÑO	1.115.951.014	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X</																					



4



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPHM01-IV-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

5

FECHA

8

Julio

2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No:

991 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

may-26

PROYECTO:

CORREDOR NEVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

995 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL:

Seguros Bolívar

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																															
227	DAÍZ LUNA ELKIN	70.528.411	OFICIAL DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	MUTUAL SER	9504537313	\$ 70.100	PORVENIR	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
228	LEAL CAMACHO LUIS FERNANDO	1.006.529.505	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	ASMET SALUD	9504537313	\$ 70.100	PORVENIR	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
229	ZAMBRANO LOZADA JOSE ELECER	1.006.514.779	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	ASMET SALUD	9504537313	\$ 70.100	PORVENIR	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
230	SANCHEZ CERON RICARDO	1.118.026.106	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	ASMET SALUD	9504537313	\$ 70.100	PORVENIR	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
231	RIVERO CARDENAS JHON DEYD	1.002.499.713	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	CAJACOPÍ	9504537313	\$ 70.100	PORVENIR	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
232	PEÑA GAVIRIA SANDRA PATRICIA	1.006.419.312	SST	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	ASMET SALUD	9504537313	\$ 70.100	PORVENIR	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
233	URBIAEZ REDONDO ROBERT	17.955.383	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	CAJACOPÍ	9504537313	\$ 70.100	PROTECCIÓN	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
234	GUERRERO GRON JHON FREDY	1.063.817.930	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.050.543	\$ 73.200	V	ASMET SALUD	9504537313	\$ 42.100	PROTECCIÓN	9504537313	\$ 168.100	\$ 42.100	-	-	-
235	HUIKE MEDINA NAHUM SERAFIN	1.042.465.956	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.750.905	\$ 121.900	V	SANITAS	9504537313	\$ 70.100	PORVENIR	9504537313	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-
236	LLANOS LIBARDO	1.118.020.476	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.283.997	\$ 89.400	V	ASMET SALUD	9504537313	\$ 51.400	PROTECCIÓN	9504537313	\$ 205.500	\$ 51.400	-	-	SE RETIRO EL DIA 15/05/2026
237	DAÍZ WILDER	16.189.082	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 1.283.997	\$ 89.400	V	ASMET SALUD	9504537313	\$ 51.400	PORVENIR	9504537313	\$ 205.500	\$ 51.400	-	-	SE RETIRO 15/05/2026
238	ROCHA MILETH	12.603.532	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEOTECNO INGENIERIA SAS	\$ 466.908	\$ 32.500	V	MUTUAL SER	9504537313	\$ 18.700	PORVENIR	9504537313	\$ 74.800	\$ 18.700	-	-	INGRESO 26/04/2026
239	REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER	79.057.911	ESP. EN GEOTECNIA Y GEOLOGIA	\$ 4.744.314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOPORTE GEOTECNICO SAS	\$ 4.744.314	\$ 330.300	V	SANITAS	9504372394	\$ 189.800	COLPENSIONES	9504372394	\$ 759.100	\$ 189.800	-	-	-
240	REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER	79.057.911	ESP. EN GEOTECNIA Y GEOLOGIA	\$ 4.744.314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOPORTE GEOTECNICO SAS	\$ 4.744.314	\$ 330.300	V	SANITAS	9504372394	\$ 189.800	COLPENSIONES	9504372394	\$ 759.100	\$ 189.800	-	-	-

OBSERVACIONES

La solicitud de pago del KMA 830.094.970-5 se presenta con novedades de nómina del mes de abril de 2026. De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), interventoría y contratista, se acordó que se revisaran los elementos correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumple con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: MAURICIO RODRIGUEZ PINCON

Director de Obra

Matrícula No: 25202-134261 CHD

Firma

Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES

Director de Interventoría

Matrícula No: 15202138858BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Interventor, Dirección Territorial.

Cartagena, D.T y C, junio 11 de 2026

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

445

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."

El Revisor Fiscal, **WALTER AGUAS GAMARRA** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de mayo del año 2026.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



Firma Electrónica por Walter Aguas G.
E Sign ID 86245C
Fecha 11-06-2026 09:28:17 am
CICON S.A.S
Colombia

WALTER AGUAS GAMARRA
REVISOR FISCAL
Designado por Anaya & Anaya S.A.S
C.C.#19.873.182
T.P.#80370-T

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: 991 de 2021

Objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.”

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Mayo de 2026. Para constancia se firma a los 05 días del mes de Junio de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ

Revisor Fiscal
T.P. 73746-T



**NIT. 806014108
MANGA, CALLE 25 No. 24 A 16
EDIFICIO TWINS BAY, PISO 9
(605) 642 4505 - 642 4506
CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Mayo de 2026.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de Junio de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE



JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6165AB69047A5B92

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

222053-T

JULIETH LISETH
BERTEL PEREZ
C.C. 1102830154

RESOLUCION INSCRIPCION 1234 FECHA 08/11/2016

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

DIRECTOR GENERAL


OSCAR EDUARDO FUENTES PENA 239319



225646

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PAX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL KMA CONSTRUCCIONES S A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2026-04	2026-05	289803314		9504470881	E	2026/05/07	2026/05/07	BANCOLOMBIA		\$2,440,476,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
Sucursal: BOGOTA (189 Afiliados)					\$465,977,825	\$74,711,400			\$468,315,397	\$18,666,400			\$459,962,005	\$18,425,800			\$468,315,397	\$28,656,200		\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (183 Afiliados)					\$56,571,624	\$8,992,100			\$56,725,018	\$2,194,600			\$38,397,086	\$1,555,400			\$56,725,018	\$0		\$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (22 Afiliados)					\$6,262,892	\$993,100			\$6,262,892	\$241,500			\$5,037,462	\$203,800			\$6,262,892	\$0		\$0
1	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	\$58,954	\$9,500	EPS037	1	\$58,954	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,954	\$0	\$0
2	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	\$58,954	\$9,500	EPS037	1	\$58,954	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,954	\$0	\$0
3	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	1	\$58,652	\$9,400	ESSC62	1	\$58,652	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,652	\$0	\$0
4	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	1	\$58,652	\$9,400	ESSC62	1	\$58,652	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,652	\$0	\$0
5	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	1	\$76,795	\$12,300	EPS037	1	\$76,795	\$3,100	CCF13	1	\$65,900	\$2,700	14-7	1	\$76,795	\$0	\$0
6	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	1	\$76,795	\$12,300	EPS037	1	\$76,795	\$3,100	CCF13	1	\$65,900	\$2,700	14-7	1	\$76,795	\$0	\$0
7	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	\$63,036	\$10,100	EPS037	1	\$63,036	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,036	\$0	\$0
8	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	\$63,036	\$10,100	EPS037	1	\$63,036	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,036	\$0	\$0
9	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	1	\$92,254	\$14,800	ESSC07	1	\$92,254	\$3,700	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$92,254	\$0	\$0
10	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	1	\$92,254	\$14,800	ESSC07	1	\$92,254	\$3,700	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$92,254	\$0	\$0
11	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	1	\$85,905	\$13,800	EPS010	1	\$85,905	\$3,500	CCF13	1	\$84,905	\$3,400	14-7	1	\$85,905	\$0	\$0
12	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	1	\$85,905	\$13,800	EPS010	1	\$85,905	\$3,500	CCF13	1	\$84,905	\$3,400	14-7	1	\$85,905	\$0	\$0
13	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	1	\$59,641	\$9,600	ESSC62	1	\$59,641	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,641	\$0	\$0
14	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	1	\$59,641	\$9,600	ESSC62	1	\$59,641	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,641	\$0	\$0
15	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	1	\$59,883	\$9,600	EPS005	1	\$59,883	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,883	\$0	\$0
16	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	1	\$59,883	\$9,600	EPS005	1	\$59,883	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,883	\$0	\$0
17	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	1	\$97,300	\$15,600	EPS041	1	\$97,300	\$3,900	CCF13	1	\$76,000	\$3,100	14-7	1	\$97,300	\$0	\$0
18	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	1	\$97,300	\$15,600	EPS041	1	\$97,300	\$3,900	CCF13	1	\$76,000	\$3,100	14-7	1	\$97,300	\$0	\$0
19	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0
20	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0
21	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	\$102,763	\$16,500	EPS005	1	\$102,763	\$4,200	CCF13	1	\$87,000	\$3,500	14-7	1	\$102,763	\$0	\$0
22	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	\$102,763	\$16,500	EPS005	1	\$102,763	\$4,200	CCF13	1	\$87,000	\$3,500	14-7	1	\$102,763	\$0	\$0
23	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	1	\$106,903	\$17,200	EPS037	1	\$106,903	\$4,300	CCF13	1	\$83,334	\$3,400	14-7	1	\$106,903	\$0	\$0
24	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	1	\$106,903	\$17,200	EPS037	1	\$106,903	\$4,300	CCF13	1	\$83,334	\$3,400	14-7	1	\$106,903	\$0	\$0
25	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	\$102,599	\$16,500	EPS037	1	\$102,599	\$4,200	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,599	\$0	\$0
26	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	\$102,599	\$16,500	EPS037	1	\$102,599	\$4,200	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,599	\$0	\$0
27	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	\$102,599	\$12,400	EPS037	1	\$102,599	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$102,599	\$0	\$0
28	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	1	\$59,011	\$9,500	EPS005	1	\$59,011	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,011	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
29	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	1	\$59,011	\$9,500	EPS005	1	\$59,011	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,011	\$0	1	\$0	\$0
30	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	2	\$287,839	\$46,100	EPS002	2	\$287,839	\$11,600	CCF13	2	\$223,334	\$9,000	14-7	2	\$287,839	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	2	\$287,839	\$46,100	EPS002	2	\$287,839	\$11,600	CCF13	2	\$270,084	\$10,900	14-7	2	\$287,839	\$0	2	\$0	\$0
32	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	2	\$287,839	\$46,100	EPS002	2	\$287,839	\$11,600	CCF13	2	\$266,973	\$10,700	14-7	2	\$287,839	\$0	2	\$0	\$0
33	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	1	\$143,920	\$23,100	EPS002	1	\$143,920	\$5,800	CCF13	1	\$111,667	\$4,500	14-7	1	\$143,920	\$0	1	\$0	\$0
34	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	1	\$143,920	\$23,100	EPS002	1	\$143,920	\$5,800	CCF13	1	\$111,667	\$4,500	14-7	1	\$143,920	\$0	1	\$0	\$0
35	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	6	\$483,721	\$77,400	EPS037	6	\$483,721	\$19,400	CCF13	6	\$460,000	\$18,400	14-7	6	\$483,721	\$0	6	\$0	\$0
36	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	2	\$161,241	\$25,800	EPS037	2	\$161,241	\$6,500	CCF13	2	\$150,667	\$6,100	14-7	2	\$161,241	\$0	2	\$0	\$0
37	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	2	\$161,241	\$25,800	EPS037	2	\$161,241	\$6,500	CCF13	2	\$149,778	\$6,000	14-7	2	\$161,241	\$0	2	\$0	\$0
38	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	1	\$80,621	\$12,900	EPS037	1	\$80,621	\$3,300	CCF13	1	\$70,000	\$2,800	14-7	1	\$80,621	\$0	1	\$0	\$0
39	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	1	\$80,621	\$12,900	EPS037	1	\$80,621	\$3,300	CCF13	1	\$70,000	\$2,800	14-7	1	\$80,621	\$0	1	\$0	\$0
40	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	1	\$105,000	\$16,800	EPS037	1	\$105,000	\$4,200	CCF13	1	\$104,444	\$4,200	14-7	1	\$105,000	\$0	1	\$0	\$0
41	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	3	\$210,011	\$33,700	EPS037	3	\$210,011	\$8,500	CCF13	3	\$0	\$0	14-7	3	\$210,011	\$0	3	\$0	\$0
42	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	1	\$105,000	\$16,800	EPS037	1	\$105,000	\$4,200	CCF13	1	\$88,334	\$3,600	14-7	1	\$105,000	\$0	1	\$0	\$0
43	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	1	\$105,000	\$16,800	EPS037	1	\$105,000	\$4,200	CCF13	1	\$88,334	\$3,600	14-7	1	\$105,000	\$0	1	\$0	\$0
44	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	1	\$179,534	\$28,800	MIN001	1	\$179,534	\$7,200	CCF13	1	\$162,000	\$6,500	14-7	1	\$179,534	\$0	1	\$0	\$0
45	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	1	\$179,534	\$28,800	MIN001	1	\$179,534	\$7,200	CCF13	1	\$162,000	\$6,500	14-7	1	\$179,534	\$0	1	\$0	\$0
46	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	1	\$179,534	\$21,600	MIN001	1	\$179,534	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$179,534	\$0	1	\$0	\$0
47	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	1	\$64,760	\$10,400	EPS037	1	\$64,760	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,760	\$0	1	\$0	\$0
48	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	1	\$64,760	\$10,400	EPS037	1	\$64,760	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,760	\$0	1	\$0	\$0
49	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	\$87,385	\$14,000	EPS005	1	\$87,385	\$3,500	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$87,385	\$0	1	\$0	\$0
50	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	\$87,385	\$14,000	EPS005	1	\$87,385	\$3,500	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$87,385	\$0	1	\$0	\$0
51	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	1	\$120,733	\$19,400	EPS005	1	\$120,733	\$4,900	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$120,733	\$0	1	\$0	\$0
52	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	1	\$120,733	\$19,400	EPS005	1	\$120,733	\$4,900	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$120,733	\$0	1	\$0	\$0
53	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	1	\$89,334	\$14,300	EPS002	1	\$89,334	\$3,600	CCF13	1	\$86,742	\$3,500	14-7	1	\$89,334	\$0	1	\$0	\$0
54	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	1	\$89,334	\$14,300	EPS002	1	\$89,334	\$3,600	CCF13	1	\$76,667	\$3,100	14-7	1	\$89,334	\$0	1	\$0	\$0
55	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	1	\$89,334	\$14,300	EPS002	1	\$89,334	\$3,600	CCF13	1	\$76,667	\$3,100	14-7	1	\$89,334	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (63 Afiliados)						\$18,431,657	\$2,922,500			\$18,585,051	\$710,600			\$12,717,851	\$515,500			\$18,585,051	\$0		\$0	\$0
56	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	1	\$71,789	\$11,500	EPS005	1	\$71,789	\$2,900	CCF32	1	\$68,334	\$2,800	14-7	1	\$71,789	\$0	1	\$0	\$0
57	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	1	\$71,789	\$11,500	EPS005	1	\$71,789	\$2,900	CCF32	1	\$68,334	\$2,800	14-7	1	\$71,789	\$0	1	\$0	\$0
58	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	\$93,334	\$15,000	EPS005	1	\$93,334	\$3,800	CCF32	1	\$93,334	\$3,800	14-7	1	\$93,334	\$0	1	\$0	\$0
59	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	\$93,334	\$15,000	EPS005	1	\$93,334	\$3,800	CCF32	1	\$93,334	\$3,800	14-7	1	\$93,334	\$0	1	\$0	\$0
60	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	1	\$63,364	\$10,200	EPS037	1	\$63,364	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,364	\$0	1	\$0	\$0
61	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	1	\$63,364	\$10,200	EPS037	1	\$63,364	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,364	\$0	1	\$0	\$0
62	CC	1118364489	AYA GIULOMBO YARLEDY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$0	\$0	14-7	30	\$1,750,905	\$0	30	\$0	\$0
63	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	\$71,675	\$11,500	EPS005	1	\$71,675	\$2,900	CCF32	1	\$71,600	\$2,900	14-7	1	\$71,675	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
64	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	\$71,675	\$11,500	EPS005	1	\$71,675	\$2,900	CCF32	1	\$71,600	\$2,900	14-7	1	\$71,675	\$0	1	\$0	\$0
65	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	\$71,675	\$11,500	EPS005	1	\$71,675	\$2,900	CCF32	1	\$71,600	\$2,900	14-7	1	\$71,675	\$0	1	\$0	\$0
66	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	\$66,800	\$10,700	EPS037	1	\$66,800	\$2,700	CCF32	1	\$66,800	\$2,700	14-7	1	\$66,800	\$0	1	\$0	\$0
67	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	\$66,800	\$10,700	EPS037	1	\$66,800	\$2,700	CCF32	1	\$66,800	\$2,700	14-7	1	\$66,800	\$0	1	\$0	\$0
68	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	\$64,389	\$10,400	ESSC24	1	\$64,389	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,389	\$0	1	\$0	\$0
69	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	\$64,389	\$10,400	ESSC24	1	\$64,389	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,389	\$0	1	\$0	\$0
70	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	1	\$104,234	\$16,700	EPS041	1	\$104,234	\$4,200	CCF32	1	\$94,234	\$3,800	14-7	1	\$104,234	\$0	1	\$0	\$0
71	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	1	\$104,234	\$16,700	EPS041	1	\$104,234	\$4,200	CCF32	1	\$94,234	\$3,800	14-7	1	\$104,234	\$0	1	\$0	\$0
72	CC	1097182827	BRAND MOLANO JUAN SEBASTIAN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
73	CC	1097182827	BRAND MOLANO JUAN SEBASTIAN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
74	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
75	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
76	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$175,091	\$0	3	\$0	\$0
77	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	\$58,547	\$9,400	EPS037	1	\$58,547	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,547	\$0	1	\$0	\$0
78	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	\$58,547	\$9,400	EPS037	1	\$58,547	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,547	\$0	1	\$0	\$0
79	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	\$76,100	\$12,200	EPS037	1	\$76,100	\$3,100	CCF32	1	\$76,100	\$3,100	14-7	1	\$76,100	\$0	1	\$0	\$0
80	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	\$76,100	\$12,200	EPS037	1	\$76,100	\$3,100	CCF32	1	\$76,100	\$3,100	14-7	1	\$76,100	\$0	1	\$0	\$0
81	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275	\$13,900	EPS005	1	\$115,275	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
82	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	3	\$345,825	\$41,500	EPS005	3	\$345,825	\$0	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$345,825	\$0	3	\$0	\$0
83	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275	\$18,500	EPS005	1	\$115,275	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
84	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275	\$18,500	EPS005	1	\$115,275	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
85	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275	\$18,500	EPS005	1	\$115,275	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
86	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
87	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
88	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	1	\$102,703	\$16,500	EPS037	1	\$102,703	\$4,200	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,703	\$0	1	\$0	\$0
89	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	1	\$102,703	\$16,500	EPS037	1	\$102,703	\$4,200	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,703	\$0	1	\$0	\$0
90	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	1	\$82,288	\$13,200	EPS005	1	\$82,288	\$3,300	CCF32	1	\$69,334	\$2,800	14-7	1	\$82,288	\$0	1	\$0	\$0
91	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	1	\$82,288	\$13,200	EPS005	1	\$82,288	\$3,300	CCF32	1	\$69,334	\$2,800	14-7	1	\$82,288	\$0	1	\$0	\$0
92	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	\$63,644	\$10,200	EPS037	1	\$63,644	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,644	\$0	1	\$0	\$0
93	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	\$63,644	\$10,200	EPS037	1	\$63,644	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,644	\$0	1	\$0	\$0
94	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	1	\$61,000	\$7,400	EPS041	1	\$61,000	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$61,000	\$0	1	\$0	\$0
95	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	1	\$61,000	\$9,800	EPS041	1	\$61,000	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,000	\$0	1	\$0	\$0
96	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	1	\$61,000	\$9,800	EPS041	1	\$61,000	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,000	\$0	1	\$0	\$0
97	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
98	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
99	CC	1075294781	DUCLARA GUTIERREZ CRISTIAN	230301	1	\$78,334	\$12,600	EPS037	1	\$78,334	\$3,200	CCF32	1	\$78,334	\$3,200	14-7	1	\$78,334	\$0	1	\$0	\$0
100	CC	1075294781	DUCLARA GUTIERREZ CRISTIAN	230301	1	\$78,334	\$12,600	EPS037	1	\$78,334	\$3,200	CCF32	1	\$78,334	\$3,200	14-7	1	\$78,334	\$0	1	\$0	\$0
101	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$18,700	EPS037	1	\$116,387	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
102	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$18,700	EPS037	1	\$116,387	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
103	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$18,700	EPS037	1	\$116,387	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
104	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$14,000	EPS037	1	\$116,387	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
105	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	1	\$68,312	\$11,000	EPS005	1	\$68,312	\$2,800	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,312	\$0	1	\$0	\$0
106	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	1	\$68,312	\$11,000	EPS005	1	\$68,312	\$2,800	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,312	\$0	1	\$0	\$0
107	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	\$92,222	\$14,800	EPS017	1	\$92,222	\$3,700	CCF32	1	\$89,656	\$3,600	14-7	1	\$92,222	\$0	1	\$0	\$0
108	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	\$92,222	\$14,800	EPS017	1	\$92,222	\$3,700	CCF32	1	\$89,656	\$3,600	14-7	1	\$92,222	\$0	1	\$0	\$0
109	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	3	\$190,000	\$22,800	EPS017	3	\$190,000	\$0	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$190,000	\$0	3	\$0	\$0
110	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	1	\$63,334	\$10,200	EPS017	1	\$63,334	\$2,600	CCF32	1	\$63,334	\$2,600	14-7	1	\$63,334	\$0	1	\$0	\$0
111	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	1	\$63,334	\$10,200	EPS017	1	\$63,334	\$2,600	CCF32	1	\$63,334	\$2,600	14-7	1	\$63,334	\$0	1	\$0	\$0
112	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	7	\$444,241	\$71,100	EPS037	7	\$444,241	\$17,800	CCF32	7	\$0	\$0	14-7	7	\$444,241	\$0	7	\$0	\$0
113	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	2	\$126,927	\$20,400	EPS037	2	\$126,927	\$5,100	CCF32	2	\$116,727	\$4,700	14-7	2	\$126,927	\$0	2	\$0	\$0
114	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	1	\$63,464	\$10,200	EPS037	1	\$63,464	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,464	\$0	1	\$0	\$0
115	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	1	\$63,464	\$10,200	EPS037	1	\$63,464	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,464	\$0	1	\$0	\$0
116	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	1	\$63,464	\$10,200	EPS037	1	\$63,464	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,464	\$0	1	\$0	\$0
117	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
118	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$98,348	\$4,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
119	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
120	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
121	CC	1048278544	MALAGON MADRONERO JORGE ALFREDO	230301	1	\$66,667	\$10,700	EPS005	1	\$66,667	\$2,700	CCF32	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
122	CC	1048278544	MALAGON MADRONERO JORGE ALFREDO	230301	1	\$66,667	\$10,700	EPS005	1	\$66,667	\$2,700	CCF32	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
123	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	1	\$75,800	\$12,200	EPS005	1	\$75,800	\$3,100	CCF32	1	\$75,800	\$3,100	14-7	1	\$75,800	\$0	1	\$0	\$0
124	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	1	\$75,800	\$12,200	EPS005	1	\$75,800	\$3,100	CCF32	1	\$75,800	\$3,100	14-7	1	\$75,800	\$0	1	\$0	\$0
125	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	1	\$75,307	\$12,100	EPS002	1	\$75,307	\$3,100	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,307	\$0	1	\$0	\$0
126	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	1	\$75,307	\$12,100	EPS002	1	\$75,307	\$3,100	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,307	\$0	1	\$0	\$0
127	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	6	\$351,514	\$56,300	EPS005	6	\$351,514	\$14,100	CCF32	6	\$350,181	\$14,100	14-7	6	\$351,514	\$0	6	\$0	\$0
128	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	1	\$58,586	\$9,400	EPS005	1	\$58,586	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,586	\$0	1	\$0	\$0
129	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	4	\$234,343	\$37,500	EPS005	4	\$234,343	\$9,400	CCF32	4	\$233,454	\$9,400	14-7	4	\$234,343	\$0	4	\$0	\$0
130	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	4	\$234,343	\$37,500	EPS005	4	\$234,343	\$9,400	CCF32	4	\$233,454	\$9,400	14-7	4	\$234,343	\$0	4	\$0	\$0
131	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	1	\$58,586	\$9,400	EPS005	1	\$58,586	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,586	\$0	1	\$0	\$0
132	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	1	\$58,586	\$9,400	EPS005	1	\$58,586	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,586	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
133	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	4	\$233,454	\$37,400	EPS037	4	\$233,454	\$9,400	CCF32	4	\$0	\$0	14-7	4	\$233,454	\$0	4	\$0
134	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
135	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
136	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	2	\$116,727	\$18,700	ESSC62	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0
137	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	1	\$58,901	\$9,500	ESSC62	1	\$58,901	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,901	\$0	1	\$0
138	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	1	\$58,901	\$9,500	ESSC62	1	\$58,901	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,901	\$0	1	\$0
139	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	1	\$157,667	\$25,300	EPS005	1	\$157,667	\$6,400	CCF32	1	\$124,334	\$5,000	14-7	1	\$157,667	\$0	1	\$0
140	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	1	\$157,667	\$25,300	EPS005	1	\$157,667	\$6,400	CCF32	1	\$124,334	\$5,000	14-7	1	\$157,667	\$0	1	\$0
141	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0
142	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	4	\$233,454	\$37,400	EPS005	4	\$233,454	\$9,400	CCF32	4	\$0	\$0	14-7	4	\$233,454	\$0	4	\$0
143	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364	\$7,100	EPS005	1	\$58,364	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
144	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364	\$7,100	EPS005	1	\$58,364	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
145	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364	\$7,100	EPS005	1	\$58,364	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
146	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
147	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
148	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	\$0	\$0	EPS037	1	\$76,697	\$3,100	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$76,697	\$0	1	\$0
149	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	\$0	\$0	EPS037	1	\$76,697	\$3,100	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$76,697	\$0	1	\$0
150	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	1	\$75,000	\$12,000	EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0
151	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	1	\$75,000	\$12,000	EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0
152	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
153	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
154	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
155	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
156	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	1	\$63,176	\$10,200	EPS002	1	\$63,176	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,176	\$0	1	\$0
157	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	1	\$63,176	\$10,200	EPS002	1	\$63,176	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,176	\$0	1	\$0
158	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	1	\$58,381	\$9,400	EPS037	1	\$58,381	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,381	\$0	1	\$0
159	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	1	\$58,381	\$9,400	EPS037	1	\$58,381	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,381	\$0	1	\$0
160	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	1	\$63,381	\$10,200	EPS037	1	\$63,381	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,381	\$0	1	\$0
161	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	1	\$63,381	\$10,200	EPS037	1	\$63,381	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,381	\$0	1	\$0
162	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	1	\$63,381	\$10,200	EPS037	1	\$63,381	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,381	\$0	1	\$0
163	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
164	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS037	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0
165	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0
166	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
167	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
168	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
169	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
170	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
171	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
172	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	1	\$92,187	\$14,800	EPS002	1	\$92,187	\$3,700	CCF32	1	\$81,667	\$3,300	14-7	1	\$92,187	\$0	1	\$0	\$0
173	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	1	\$92,187	\$14,800	EPS002	1	\$92,187	\$3,700	CCF32	1	\$81,667	\$3,300	14-7	1	\$92,187	\$0	1	\$0	\$0
174	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	1	\$101,667	\$16,300	EPS005	1	\$101,667	\$4,100	CCF32	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$101,667	\$0	1	\$0	\$0
175	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	1	\$101,667	\$16,300	EPS005	1	\$101,667	\$4,100	CCF32	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$101,667	\$0	1	\$0	\$0
176	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	\$58,603	\$9,400	EPS037	1	\$58,603	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,603	\$0	1	\$0	\$0
177	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	\$58,603	\$9,400	EPS037	1	\$58,603	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,603	\$0	1	\$0	\$0
178	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	\$58,603	\$9,400	EPS037	1	\$58,603	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,603	\$0	1	\$0	\$0
179	CC	1003804498	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	230201	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
180	CC	1003804498	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	230201	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
181	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	1	\$83,830	\$13,500	EPS037	1	\$83,830	\$3,400	CCF32	1	\$67,517	\$2,800	14-7	1	\$83,830	\$0	1	\$0	\$0
182	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	1	\$83,830	\$13,500	EPS037	1	\$83,830	\$3,400	CCF32	1	\$67,517	\$2,800	14-7	1	\$83,830	\$0	1	\$0	\$0
183	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS037	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
184	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS037	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
185	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
186	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
187	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
188	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	1	\$59,176	\$9,500	EPS005	1	\$59,176	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,176	\$0	1	\$0	\$0
189	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	1	\$59,176	\$9,500	EPS005	1	\$59,176	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,176	\$0	1	\$0	\$0
190	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	\$60,677	\$9,800	EPS037	1	\$60,677	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,677	\$0	1	\$0	\$0
191	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	\$60,677	\$9,800	EPS037	1	\$60,677	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,677	\$0	1	\$0	\$0
192	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS037	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
193	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
194	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
195	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$60,938	\$9,800	EPS037	1	\$60,938	\$2,500	CCF32	1	\$61,334	\$2,500	14-7	1	\$60,938	\$0	1	\$0	\$0
196	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$60,938	\$9,800	EPS037	1	\$60,938	\$2,500	CCF32	1	\$61,334	\$2,500	14-7	1	\$60,938	\$0	1	\$0	\$0
197	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$60,938	\$9,800	EPS037	1	\$60,938	\$2,500	CCF32	1	\$61,334	\$2,500	14-7	1	\$60,938	\$0	1	\$0	\$0
198	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	1	\$280,267	\$47,900	EPS005	1	\$280,267	\$11,300	CCF32	1	\$246,934	\$9,900	14-7	1	\$280,267	\$0	1	\$0	\$0
199	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	1	\$280,267	\$47,900	EPS005	1	\$280,267	\$11,300	CCF32	1	\$246,934	\$9,900	14-7	1	\$280,267	\$0	1	\$0	\$0
200	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	\$59,830	\$9,600	EPS005	1	\$59,830	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,830	\$0	1	\$0	\$0
201	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	\$59,830	\$9,600	EPS005	1	\$59,830	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,830	\$0	1	\$0	\$0
202	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	1	\$59,567	\$9,600	EPS037	1	\$59,567	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,567	\$0	1	\$0	\$0
203	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	1	\$59,567	\$9,600	EPS037	1	\$59,567	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,567	\$0	1	\$0	\$0
204	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	1	\$99,734	\$16,000	EPS037	1	\$99,734	\$4,000	CCF32	1	\$99,734	\$4,000	14-7	1	\$99,734	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
205	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	1	\$99,734	\$16,000	EPS037	1	\$99,734	\$4,000	CCF32	1	\$99,734	\$4,000	14-7	1	\$99,734	\$0	1	\$0	\$0
206	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS037	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$116,727	\$4,700	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
207	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS037	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$0	28	\$0	\$0
208	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	1	\$127,071	\$20,400	EPS037	1	\$127,071	\$5,100	CCF32	1	\$105,000	\$4,200	14-7	1	\$127,071	\$0	1	\$0	\$0
209	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	1	\$127,071	\$20,400	EPS037	1	\$127,071	\$5,100	CCF32	1	\$105,000	\$4,200	14-7	1	\$127,071	\$0	1	\$0	\$0
210	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	1	\$200,000	\$32,000	EPS005	1	\$200,000	\$8,000	CCF32	1	\$200,000	\$8,000	14-7	1	\$200,000	\$0	1	\$0	\$0
211	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	1	\$200,000	\$32,000	EPS005	1	\$200,000	\$8,000	CCF32	1	\$200,000	\$8,000	14-7	1	\$200,000	\$0	1	\$0	\$0
212	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	5	\$421,417	\$67,500	EPS037	5	\$421,417	\$16,900	CCF32	5	\$0	\$0	14-7	5	\$421,417	\$0	5	\$0	\$0
213	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	1	\$84,284	\$13,500	EPS037	1	\$84,284	\$3,400	CCF32	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,284	\$0	1	\$0	\$0
214	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	1	\$84,284	\$13,500	EPS037	1	\$84,284	\$3,400	CCF32	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,284	\$0	1	\$0	\$0
215	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	1	\$129,000	\$20,700	EPS037	1	\$129,000	\$5,200	CCF32	1	\$129,000	\$5,200	14-7	1	\$129,000	\$0	1	\$0	\$0
216	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	1	\$129,000	\$20,700	EPS037	1	\$129,000	\$5,200	CCF32	1	\$129,000	\$5,200	14-7	1	\$129,000	\$0	1	\$0	\$0
217	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
218	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						\$5,075,316	\$812,500			\$5,075,316	\$203,600			\$2,272,171	\$91,500			\$5,075,316	\$0		\$0	\$0
219	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	1	\$68,270	\$11,000	ESSC62	1	\$68,270	\$2,800	CCF40	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,270	\$0	1	\$0	\$0
220	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	1	\$68,270	\$11,000	ESSC62	1	\$68,270	\$2,800	CCF40	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,270	\$0	1	\$0	\$0
221	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
222	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
223	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$195,418	\$7,900	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
224	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	2	\$442,267	\$70,800	EPS017	2	\$442,267	\$17,700	CCF40	2	\$372,134	\$14,900	14-7	2	\$442,267	\$0	2	\$0	\$0
225	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
226	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	2	\$442,267	\$70,800	EPS017	2	\$442,267	\$17,700	CCF40	2	\$439,929	\$17,600	14-7	2	\$442,267	\$0	2	\$0	\$0
227	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$217,627	\$8,800	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
228	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	17	\$2,506,304	\$401,100	EPS017	17	\$2,506,304	\$100,300	CCF40	17	\$0	\$0	14-7	17	\$2,506,304	\$0	17	\$0	\$0
229	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
230	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (90 Afiliados)						\$24,396,675	\$3,878,600			\$24,396,675	\$942,000			\$16,104,654	\$653,300			\$24,396,675	\$0		\$0	\$0
231	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	1	\$60,768	\$9,800	EPS037	1	\$60,768	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,768	\$0	1	\$0	\$0
232	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	1	\$60,768	\$9,800	EPS037	1	\$60,768	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,768	\$0	1	\$0	\$0
233	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	1	\$89,534	\$14,400	EPS041	1	\$89,534	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,534	\$0	1	\$0	\$0
234	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	1	\$89,534	\$14,400	EPS041	1	\$89,534	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,534	\$0	1	\$0	\$0
235	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	1	\$94,814	\$15,200	EPS041	1	\$94,814	\$3,800	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$94,814	\$0	1	\$0	\$0
236	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	1	\$94,814	\$15,200	EPS041	1	\$94,814	\$3,800	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$94,814	\$0	1	\$0	\$0
237	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	1	\$65,890	\$10,600	ESSC62	1	\$65,890	\$2,700	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$65,890	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
238	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	1	\$65,890	\$10,600	ESSC62	1	\$65,890	\$2,700	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$65,890	\$0	1	\$0	\$0
239	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	\$229,927	\$36,800	EPS017	1	\$229,927	\$9,200	CCF13	1	\$213,260	\$8,600	14-7	1	\$229,927	\$0	1	\$0	\$0
240	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	\$229,927	\$36,800	EPS017	1	\$229,927	\$9,200	CCF13	1	\$213,260	\$8,600	14-7	1	\$229,927	\$0	1	\$0	\$0
241	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	1	\$450,000	\$76,600	EPS037	1	\$450,000	\$18,000	CCF13	1	\$416,667	\$16,700	14-7	1	\$450,000	\$0	1	\$0	\$0
242	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	1	\$450,000	\$76,600	EPS037	1	\$450,000	\$18,000	CCF13	1	\$416,667	\$16,700	14-7	1	\$450,000	\$0	1	\$0	\$0
243	CC	1093775884	AYALA IBARRA LUIS MIGUEL	230301	1	\$156,667	\$25,100	EPS037	1	\$156,667	\$6,300	CCF13	1	\$140,000	\$5,600	14-7	1	\$156,667	\$0	1	\$0	\$0
244	CC	1093775884	AYALA IBARRA LUIS MIGUEL	230301	1	\$156,667	\$25,100	EPS037	1	\$156,667	\$6,300	CCF13	1	\$140,000	\$5,600	14-7	1	\$156,667	\$0	1	\$0	\$0
245	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	1	\$65,522	\$10,500	EPS037	1	\$65,522	\$2,700	CCF13	1	\$58,400	\$2,400	14-7	1	\$65,522	\$0	1	\$0	\$0
246	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	1	\$65,522	\$10,500	EPS037	1	\$65,522	\$2,700	CCF13	1	\$58,400	\$2,400	14-7	1	\$65,522	\$0	1	\$0	\$0
247	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	1	\$192,684	\$30,900	EPS037	1	\$192,684	\$7,800	CCF13	1	\$176,017	\$7,100	14-7	1	\$192,684	\$0	1	\$0	\$0
248	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	1	\$192,684	\$30,900	EPS037	1	\$192,684	\$7,800	CCF13	1	\$176,017	\$7,100	14-7	1	\$192,684	\$0	1	\$0	\$0
249	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	1	\$146,732	\$23,500	EPS010	1	\$146,732	\$5,900	CCF13	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$146,732	\$0	1	\$0	\$0
250	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	1	\$146,732	\$23,500	EPS010	1	\$146,732	\$5,900	CCF13	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$146,732	\$0	1	\$0	\$0
251	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	1	\$84,225	\$13,500	EPSIC6	1	\$84,225	\$3,400	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,225	\$0	1	\$0	\$0
252	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	1	\$84,225	\$13,500	EPSIC6	1	\$84,225	\$3,400	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,225	\$0	1	\$0	\$0
253	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	2	\$433,334	\$52,100	EPS005	2	\$433,334	\$0	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$433,334	\$0	2	\$0	\$0
254	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	1	\$216,666	\$26,000	EPS005	1	\$216,666	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$216,666	\$0	1	\$0	\$0
255	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	1	\$216,667	\$34,700	EPS005	1	\$216,667	\$8,700	CCF13	1	\$183,334	\$7,400	14-7	1	\$216,667	\$0	1	\$0	\$0
256	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	1	\$216,667	\$34,700	EPS005	1	\$216,667	\$8,700	CCF13	1	\$183,334	\$7,400	14-7	1	\$216,667	\$0	1	\$0	\$0
257	CC	1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	1	\$59,710	\$9,600	ESSC62	1	\$59,710	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,710	\$0	1	\$0	\$0
258	CC	1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	1	\$59,710	\$9,600	ESSC62	1	\$59,710	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,710	\$0	1	\$0	\$0
259	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	14	\$870,613	\$139,300	ESSC62	14	\$870,613	\$34,900	CCF13	14	\$0	\$0	14-7	14	\$870,613	\$0	14	\$0	\$0
260	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	5	\$310,919	\$49,800	ESSC62	5	\$310,919	\$12,500	CCF13	5	\$292,038	\$11,700	14-7	5	\$310,919	\$0	5	\$0	\$0
261	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	2	\$124,368	\$19,900	ESSC62	2	\$124,368	\$5,000	CCF13	2	\$116,815	\$4,700	14-7	2	\$124,368	\$0	2	\$0	\$0
262	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$62,184	\$10,000	ESSC62	1	\$62,184	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,184	\$0	1	\$0	\$0
263	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$62,184	\$10,000	ESSC62	1	\$62,184	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,184	\$0	1	\$0	\$0
264	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359	\$9,500	ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	1	\$0	\$0
265	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359	\$9,500	ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	1	\$0	\$0
266	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359	\$9,500	ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	1	\$0	\$0
267	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359	\$9,500	ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	1	\$0	\$0
268	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
269	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
270	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
271	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
