



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REVISADO
05-08-26

FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE RADICACIÓN:	15 de julio de 2026
CONTRATO No.	0469-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.200.461-3
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$386.051.641) M/CTE.
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC 901.617.088-5 R/L: KATHERINE ESTRADA CORTEZ CC. 1.006.847.128
INTERVENTOR:	CARLOT S.A.S ZOMAC NIT: 901379301-8 Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
PLAZO:	Un (01) mes
FECHA DE INICIO	15 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 01:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO 01:	11 de febrero de 2026
PRORROGA 01:	Un (01) mes
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	13 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 02:	10 de marzo de 2026

PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA

DOCUMENTOS PARA USO DE LA OFICINA TESORERIA MUNICIPAL		FISICO	EXPEDIENTE
1	<p>Para el trámite de las cuentas, se requiere previamente radicar un ejemplar en medio físico <u>a la Oficina Jurídica y Contratación</u>, para que se realice la respectiva revisión y aprobación. Dicho expediente deberá contener;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Registro presupuestal (RP)2) Factura comercial3) Planillas de pago de Seguridad social y parafiscales del periodo ejecutado4) Registro único tributario – RUT5) Copia de la cuenta bancaria – Solo aplica para la primera cuenta6) Informe de supervisión firmada por el supervisor7) Acta de recibo de obra firmada por el supervisor8) Acta de liquidación – Solo aplica para la última cuenta9) Paz y salvo municipal – Solo aplica para la primera cuenta	X	Un original



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Nota. Esta sección se identifican los documentos requeridos para pago y objeto de radicación en la Oficina de Tesorería, previa aprobación de la Oficina Jurídica.

OBSERVACION. Una vez se obtenga el visto bueno de los documentos por el encargado de Revisión de cuentas de la Oficina Jurídica y Contratación, deberá proceder a sacar una copia y serán entregados nuevamente a Jurídica, para radicarlos a la Oficina Tesorería Municipal para pago.

Así mismo, las cuentas que sean radicadas y presenten errores tales como; fechas, plazos, falta de documentos requeridos, actas mal diligenciadas, serán objeto de devolución por escrito para su respectiva corrección.

DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE ELABORAR Y CARGAR A SECOP II		FISICO	SECOP II
1	<p>Informe de actividades. Este informe debe diligenciarse de forma detallada y debe estar acompañado de todos sus soportes. Así;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Informe HSEQ – Si aplica2) Informe ambiental (PAGA) (PMA) - Si aplica3) Informe de tránsito - Si aplica4) Informe de legalización de imprevistos5) Bitácora de obra (Aplica para informes parciales y final)6) Estudios de suelos y concretos – Si aplica7) Permisos Ambientales y su Respectivo Certificado Ambiental - Si aplica8) Planos Récord - Si aplica9) Memoria de cantidades10) Desglose del AIU11) Comités Técnicos12) Socialización del Proyecto – Si aplica13) Conformación de la Veeduría Ciudadana - Si aplica14) Reconocimiento ante Personería de la Veeduría Ciudadana - Si aplica15) Recibo de la Veeduría Ciudadana - Si aplica <p>Nota. Los documentos antes relacionados, deben entregarse en un expediente original a la oficina Jurídica para su respectiva revisión.</p>	X	X
2	Planillas de pago a Seguridad Social y riesgos profesionales. para el efecto la empresa contratista, deberá anexar las planillas de pago a seguridad social y parafiscales de los empleados que tuvo a cargo durante la ejecución de la obra.	X	X
3	Pagos del FIC	X	X
4	Factura comercial.	X	X
5	Paz y salvo municipal – Solo aplica para la primera cuenta	X	X
6	Póliza estabilidad de obra. Aplica solo para la última cuenta	X	X

OBSERVACION. Una vez el contratista haya obtenido la aprobación favorable de su informe por parte de su supervisor, y de la Oficina Jurídica y contratación, deberá proceder a cargarlos en documento PDF (cuando el expediente es muy grande, deberá dividirlo en Tomos 1, Tomo 2 etc.), en la sección plan de pagos de la plataforma SECOP II, en el Orden antes relacionado.

NOTA. Los informes publicados en SECOP II, deben estar completos y legibles, si hay registros fotográficos deben ser a color y no se admitirá documentos borrosos o escaneados por celular.

DOCUMENTOS QUE EL SUPERVISOR DEBERA REALIZAR Y CARGAR A SECOP II		FISICO	SECOP II
1	Acta de recibo parcial o Final de obra. Debe elaborarse por el supervisor del contrato, en los formatos entregados por la Oficina Jurídica y Contratación	X	X
2	Informe de interventoría de obra (parcial o final) - Si aplica	X	X
3	Informe de supervisión. (parcial o final)	X	X
4	Acta de liquidación de obra - Solo aplica para la última cuenta	X	X




ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

OBSERVACION. Una vez estos documentos se encuentren firmados por el supervisor, desde el usuario del supervisor designado deberá proceder a publicarla en un solo documento en formato PDF en la sección plan de pagos del expediente del contrato de la plataforma SECOP II. En el siguiente orden;

- 1) Acta de Recibo de obra
- 2) Informe de Interventoría - **Si aplica**
- 3) Informe de supervisión
- 4) Acta de liquidación de obra

Nota. Los documentos a publicar se deberán hacer en el orden y secuencia requerida en el presente documento, Además deberán ser legibles y no se admitirá documentos borrosos. **Cualquier discrepancia en el contenido de la información publicada, es responsabilidad de las oficinas supervisoras.**



JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal




ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cl 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2025801417

Fecha 2026-01-01 **Identificacion** 901617088
Tercero GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC
Dirección CARRERA 33 27 17 **Telefono** 3203084432
Detalle OBRA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Codigo	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.16	CCPET	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	0.00
2.3.16.002	CCPET	INFRAESTRUCTURA	0	0.00
2.3.16.002.2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005	CCPET	Construcción y servicios de la construcción	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.010	CCPET	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00	CCPET	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1	CCPET	CON SITUACION DE FONDOS	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40	CCPET	Vivienda, Ciudad y Territorio	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003	CCPET	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003.019		Alcantarillados ampliados		193,025,820.50
Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	CCPET	VALOR
202500000036737	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	0 - NO APLICA	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	193,025,820.50
			CPC (193,025,820.50)	VALOR
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
202500000037549	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	00 - NO APLICA	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	193,025,820.50
			CPC (193,025,820.50)	VALOR
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
TOTAL				193,025,820.50

SON : CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.


Cierre fiscal 2025
Elaboró

Aprobó



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL
2025801417

Fecha 2026-01-01 **Identificación** 901617088
Tercero GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC
Dirección CARRERA 33 27 17 **Telefono** 3203084432
Detalle OBRA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
Contrato
Entidad
Contrato
Secop

Codigo	Nombre	Doc	VALOR
16	Inversión	2025801417	0.00
16.002	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2025801417	0.00
16.002.2.3	INFRAESTRUCTURA	2025801417	0.00
16.002.2.3	Inversión	2025801417	0.00
16.002.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1	CON SITUACION DE FONDOS	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40	Vivienda, Ciudad y Territorio	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	2025801417	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003.019	Alcantarillados ampliados		193,025,820.50

Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	CCPET	VALOR
202500000036737	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	0 - NO APLICA	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción CPC (193,025,820.50)	193,025,820.50
			VALOR	
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
202500000037549	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	00 - NO APLICA	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción CPC (193,025,820.50)	193,025,820.50
			VALOR	
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	193,025,820.50
			DANE (386,051,641.00)	VALOR
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	136,471,724.00
			53290 - Otras obras de ingeniería civil	249,579,917.00

TOTAL 193,025,820.50

SON : CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
CON CINCO CENTAVOS M/CTE.

Cierre fiscal 2025
Elaboró



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL
2025001417

Fecha 2025-12-15 **Identificación** 901617088
Tercero GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC
Dirección CARRERA 33 27 17 **Telefono** 3203084432
Detalle OBRA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
Contrato 469-2025
Entidad
Contrato CO1.PCCNTR.8614080
Secop

Codigo	Nombre	Doc	VALOR
16	Inversión	2025000843	0.00
16.002	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2025000843	0.00
16.002.2.3	INFRAESTRUCTURA	2025000843	0.00
16.002.2.3.2	Inversión	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02	Adquisición de bienes y servicios	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02	Adquisiciones diferentes de activos	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.02	Adquisición de servicios	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1	CON SITUACION DE FONDOS	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40	Vivienda, Ciudad y Territorio	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	2025000843	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003.019	Alcantarillados ampliados		249,579,917.00

Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	VALOR
202500000036737	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	0 - NO APLICA	249,579,917.00

DANE (136,471,724.00)	VALOR
53290 - Otras obras de ingeniería civil	136,471,724.00

16	Inversión	2025000861	0.00
16.002	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2025000861	0.00
16.002.2.3	INFRAESTRUCTURA	2025000861	0.00
16.002.2.3.2	Inversión	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02	Adquisición de bienes y servicios	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02	Adquisiciones diferentes de activos	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.02	Adquisición de servicios	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1	CON SITUACION DE FONDOS	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40	Vivienda, Ciudad y Territorio	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	2025000861	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003.019	Alcantarillados ampliados		136,471,724.00

Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	VALOR
202500000037549	SGP APSB Construcción y.o mejoramiento de alcantarillado	00 - NO APLICA	136,471,724.00

DANE (272,943,448.00)	VALOR
53290 - Otras obras de ingeniería civil	136,471,724.00

TOTAL 386,051,641.00

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró

GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S
ZOMAC
NIT 901.617.088-5
CR 33 27 17
Tel: (608) 3203084432
Puerto Asís - Colombia
Proyectosgrupos2622@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo



Factura electrónica de venta
No. FE 43

Señores		MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		Fecha y hora Factura	
NIT	891.200.461-3	Teléfono	(608) 4221640	Generación	02/07/2026, 16:26
Dirección	CRA 19 CALLE 10 ESQUINA	Ciudad	Puerto Asís - Colombia	Expedición	02/07/2026, 16:27
				Vencimiento	01/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO:MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.	1.00	279,120,849.02
2	ADMINISTRACION	1.00	80,964,750.53
3	UTILIDAD	1.00	13,956,042.46
4	PMA	1.00	8,760,000.00
5	PMT	1.00	3,250,000.00

Total items: 5	Total Bruto	383,823,366.32
Valor en Letras: Trescientos ochenta y seis millones cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte con un cent.	IVA 19%	2,228,275.69
Forma de pago: Crédito	IVA 0%	0.00
Medio de pago: Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por	Total a Pagar	386,051,642.01
\$		386,051,642.01

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103272339 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 39 al 200 Vigencia: 12 Meses Meses
- Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa 10
CUFE: 885d2970e49539b9866b0ac90b9c88e05604172dd7985e80ddb30ee7ad0f280fe543104eb1d18f8103af954542e3a2b4

Espacio para
Logo Corporativo

GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S
ZOMAC
NIT 901.617.088-5
CR 33 27 17
Tel: (608) 3203084432
Puerto Asís - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 14

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		
NIT	891.200.461-3	Teléfono	(608) 4221640
Dirección	CRA 19 CALLE 10 ESQUINA	Ciudad	Puerto Asís - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-09-02
Factura de Venta	FE-43
Generación	02/09/2026, 08:58
Expedición	02/09/2026, 08:58
Vencimiento	02/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ADMINISTRACION 28%	1.00	1.01

Total items: 1

Valor en Letras:

Un pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-02 por

\$

1.01

Total Bruto	1.01
IVA 0%	0.00
Total	1.01

Observaciones:

CUDE: bd95914c919afa464cc171a95106c843ffff887847cd54d1532a1ba137d7d4ecd723fe3940900ba9f67675b28a4b868f
CUFE factura: 885d2970a49539b9866b0ac90b9c88e05604172dd7985e90ddb30ee7ad0f290fe543104eb1d16f8103af954542e3a2b4



GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC

Creceer Diferente

Nit 901 617 088-5

Puerto Asis, Putumayo 01 de septiembre de 2026

Señores

ALCALDIA DE PUERTO ASIS,
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL


Asunto: **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Cordial saludo,

Mediante el presente de la manera más atenta solicito que el pago final del contrato DE OBRA PUBLICA No 0469-2025, cuyo objeto es; "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO", se realice el descuento que se tiene pendiente del contrato de prestación de servicios número 338-2025, derivado de la Mic-023-2025, cuyo objeto es; Fortalecimiento del comité de ciudadano consejo territorial de planeación Ctp.

Atentamente,

Nombre del Proponente	Grupo Empresarial S.a.s Zomac
Nombre del Representante Legal	Katherine Estrada Cortez
C.C. No.	1.006.847.128 expedida en Puerto Asis, Putumayo
Dirección de correo	Grupoempresarialaabc@gmail.com
Ciudad	Puerto Asis, Putumayo
Celular	322 363 9520



Firma del Representante Legal

Dirección: Carrera 33 No. 27-17 Barrio/ Luis Carlos Galán

Teléfono: 3203084420

Correo Electrónico: grupoempresarialaabc@gmail.com

2026/07/06 09:47 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-12	2026-01	455336639	9507546265	E	2026/01/23	2026/07/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	164	\$388,500		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$227,800	\$25,400	\$0	\$253,200			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$227,800	\$25,400	\$0	\$253,200			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$7,600	\$900	\$0	\$8,500			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$7,600	\$900	\$0	\$8,500			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$57,000	\$6,400	\$0	\$63,400			
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$57,000	\$6,400	\$0	\$63,400			
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$57,000	\$6,400	\$0	\$63,400			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$28,500	\$3,200	\$0	\$31,700			
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$28,500	\$3,200	\$0	\$31,700			
TOTAL				2	\$349,400	\$39,100	\$0	\$388,500			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4277026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	455336639	9507546421		E	2026/03/20	2026/07/06		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	108	\$616,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	lga	lma	vac	arp	vct	lri	vp																Total Aportes
1	CC	1123308201	AREVALO LUIS	X																															\$286,300
2	CC	1110493777	RUBIO RICARDO	X																															\$286,300
Total		Afiliados(2)																																	\$572,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	455336639	9507546421	E	2026/03/20	2026/07/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	108	\$616,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$373,600	\$28,400	\$0	\$402,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$373,600	\$28,400	\$0	\$402,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$12,200	\$1,000	\$0	\$13,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$12,200	\$1,000	\$0	\$13,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$93,400	\$7,100	\$0	\$100,500	
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$93,400	\$7,100	\$0	\$100,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$93,400	\$7,200	\$0	\$100,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$46,700	\$3,600	\$0	\$50,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$46,700	\$3,600	\$0	\$50,300	
TOTAL				2	\$572,600	\$43,700	\$0	\$616,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4272026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Pension	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	455336639	9507546454			E	2026/04/23	2026/07/06		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	74	\$302,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION					SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	Idc	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vet	tri	vip	Aporte	IBCF	Dias	Codigo	Dias	IBCF	Aporte	IBCF	Dias	Aporte	Econerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC 1123308201	AREVALO LUIS																		\$93,400	\$583,635	10	230301	10	\$583,635	\$23,400	\$583,635	10	\$23,400	\$23,400	\$0	\$143,300		
2	CC 1110493777	RUBIO RICARDO																		\$93,400	\$583,635	10	230301	10	\$583,635	\$23,400	\$583,635	10	\$23,400	\$23,400	\$0	\$143,300		
Total	Afiliados(2)																			\$186,800	\$1,167,270				\$1,167,270	\$46,800	\$1,167,270		\$46,800	\$6,200	\$0	\$286,600		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AARC S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	455336639	9507546454	E	2026/04/23	2026/07/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	74	\$302,100

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
PORVENIR			230301	800,224,808	8	2	\$186,800	\$10,000	\$0	\$196,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS			14-23	860,011,153	6	2	\$6,200	\$400	\$0	\$6,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
COMFAMILIAR PUTUMAYO			CCF63	891,200,337	8	2	\$46,800	\$2,500	\$0	\$49,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)										
FAMISANAR			EP5017	830,003,564	7	1	\$46,800	\$2,500	\$0	\$49,300
NUEVA E.P.S.			EP5037	900,156,264	2	1	\$23,400	\$1,300	\$0	\$24,700
TOTAL						2	\$286,600	\$15,500	\$0	\$302,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NTI 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-12	2026-01	323844385	9504976271	E		2026/01/23	2026/05/21	BANCOLOMBIA	118

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	tae	tdp	asp	vsp	cor	vst	sin	lge	vac	arp	vct	hrt	vpt	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	CC	1123313971	GARCIA JUAN																230301	30	\$1,423,500	\$227,000	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cluidad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	323844385	9304976271	E	2026/01/23	2026/05/21	BANCOLOMBIA	118	\$376,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$17,800	\$0	\$245,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$17,800	\$0	\$245,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$600	\$0	\$8,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$600	\$0	\$8,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$4,500	\$0	\$61,500	
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$4,500	\$0	\$61,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$4,500	\$0	\$61,500	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$4,500	\$0	\$61,500	
TOTAL				1	\$349,300	\$27,400	\$0	\$376,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	
ZOMAC									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-01	323844385	E	2026/02/20	2026/05/21	BANCOLOMBIA	90	\$455,700		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tadp	tap	vsp	cor	vst	aln	lge	lma	vac	arp	vct	ir1	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1123313971	GARCIA JUAN							X																												\$429,600		
Total		Afiliados(1)																																				\$429,600		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	323844385	9504976512	E	2026/02/20	2026/05/21	BANCOLOMBIA	90	\$455,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$16,900	\$0	\$297,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$600	\$0	\$9,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	1	\$70,100	\$4,300	\$0	\$74,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$4,300	\$0	\$74,400
TOTAL					1	\$429,600	\$26,100	\$0	\$455,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 700 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	323844385	E	2026/04/23	2026/05/21	2026/05/21	BANCOLOMBIA	28	\$438,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tdie	tae	tdtp	tap	vsp
1	CC 112331971	GARCIA JUAN							
Total Afiliados(1)									


NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Total Aportes									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901617088	5	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO LUIS CARLOS GALAN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	323844385	9504977062	E	2026/04/23	2026/05/21	BANCOLOMBIA	28	\$438,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$5,600	\$0	\$285,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$5,600	\$0	\$285,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$1,400	\$0	\$71,500	
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$70,100	\$1,400	\$0	\$71,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$1,400	\$0	\$71,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$1,400	\$0	\$71,500	
TOTAL				1	\$429,600	\$8,600	\$0	\$438,200	

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141222603160



(415)7707212489984(8020) 000014122260316 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 1 7 0 8 8

5

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

4 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Putumayo

8 6

40. Ciudad/Municipio

Puerto Asís

5 6 8

41. Dirección principal

CR 33 27 17 BRR LUIS CARLOS GALAN I

42. Correo electrónico

GRUPOEMPRESARIAAABC@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 3 0 8 4 4 3 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

3 9 0 0

2 0 2 2 0 1 0 2

4 7 7 3

2 0 2 2 0 1 0 2

4 7 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5											

Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 1 1

61. Fecha 2025-11-26 / 02:04:17PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre GOMEZ CORREA FABIO

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141222603160



(415)7707212489984(8020) 000014122260316 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 1 7 0 8 8 | 5

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

4 6

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 5 1 1 0 1

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

1 3

1 0 0 6 8 4 7 1 2 8

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

ESTRADA

CORTES

KATHERINE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 5 1 1 0 1

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

1 3

1 1 2 3 2 0 3 7 5 2

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

PANTOJA

MONTES

DEISY

GIGLYOLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Certificación Bancaria

Lunes, 26 de enero de 2026

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC** identificado(a) con NIT. **901617088** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	451-000023-51	2022/12/23	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

INFORME FINAL DE OBRA

Contrato de Obra No 0469-2025 del 20 de noviembre de 2025

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO” Y “MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

CONTRATISTA:
GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC
R.L. KATHERINE ESTRADA CORTEZ

INTERVENTOR:
CARLOT S.A.S ZOMAC
R.L. JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL

SUPERVISION
JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PUERTO ASIS-PUTUMAYO
JUNIO 2026

Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

 alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co

 www.puertoasis-putumayo.gov.co




Tabla de contenido

1. INTRODUCCION	3
2. FICHA TECNICA	4
3. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS	4
3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5
3.1.1. INICIO DE OBRA	5
3.1.2. CONTROL DE POLIZAS.....	5
3.1.3. COMITES TECNICOS	6
3.1.4. SUSPENSIONES Y REINICIOS	6
3.1.5. PRORROGAS	7
3.1.6. ADICIONES	7
3.1.7. SEGURIDAD SOCIAL	7
3.1.8. ACTA PARCIAL.....	7
3.1.9. ACTA FINAL.....	7
3.2. ACTIVIDADES TECNICAS	7
3.2.1. UBICACIÓN DE LA OBRA	7
3.2.2. DISEÑOS DEL PROYECTO	9
3.2.3. PERSONAL EN OBRA Y MAQUINARIA	9
La maquinaria y equipos que se están empleando en la obra son los siguientes:	9
3.2.4. BITACORA DE OBRA.....	9
3.2.5. Condiciones iniciales del contrato.....	10
3.2.7. Actividades ejecutadas en el acta de recibo final	14
3.2.8. DESCRIPCION DE LA OBRA.....	16
3.3. ACTIVIDADES FINANCIERA.....	16
4. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES.....	17



1. INTRODUCCION

El municipio de Puerto Asís delegó a la entidad GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC, como la empresa constructora para la ejecución del Contrato de Obra No 0469-2025 del 20 de noviembre de 2025, cuyo objeto es la **"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"** Y **"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"**. El presente informe se desarrolla con el fin de informar las labores ejecutadas tanto técnicas como administrativas que se llevaron a cabo en el transcurso de la obra desde el día 16 de diciembre de 2025 hasta el día 10 de marzo de 2026.





2. FICHA TECNICA

CONTRATO No.	0469-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.200.461-3
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO” Y “MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$386.051.641) M/CTE.
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC 901.617.088-5 R/L: KATHERINE ESTRADA CORTEZ CC. 1.006.847.128
INTERVENTOR:	CARLOT S.A.S ZOMAC NIT: 901379301-8 Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
PLAZO:	Un (01) mes
FECHA DE INICIO	15 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 01:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO 01:	11 de febrero de 2026
PRORROGA 01:	Un (01) mes
FECHA ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	13 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 02:	10 de marzo de 2026

3. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS

La obra se desarrolla según las instrucciones y planos entregados por la entidad contratante y bajo la supervisión de obra de la secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal, se ha realizado el debido seguimiento técnico durante la construcción.



3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1.1. INICIO DE OBRA

El día 16 de diciembre de 2025 en la secretaria de infraestructura del municipio de Puerto Asís se reunieron el secretario de infraestructura y supervisor del contrato en ese momento LUIS EDUARDO GALLEGU BARRERA, la constructora GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC con Nit: 901.617.088-5 representada legalmente por KATHERINE ESTRADA CORTEZ y la interventoría CARLOT S.A.S ZOMAC con Nit. 901379301-8, representada legalmente por JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL. (ANEXO 1)

3.1.2. CONTROL DE POLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el CONTRATO DE OBRA No 0469-2025, suscrito con la compañía Seguros Mundial S.A, las cuales se encuentran vigentes. (ANEXO 2)

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

- Anexo 0:
Póliza de cumplimiento No. CCS-100045747
Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 38.605.164,10	20/11/2025	30/06/2026
Buen manejo de anticipo	\$ 193.025.820,50	20/11/2025	30/06/2026
Prestaciones sociales	\$ 19.302.582,05	20/11/2025	31/12/2028
Estabilidad de obra	\$ 77.210.328,20	31/12/2025	31/12/2030

- Anexo 1: Extensión de vigencias
Póliza de cumplimiento No. CCS-100045747
Fecha de expedición: 30 de marzo de 2026

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 38.605.164,10	16/12/2025	10/09/2026
Buen manejo de anticipo	\$ 193.025.820,50	16/12/2025	10/09/2026
Prestaciones sociales	\$ 19.302.582,05	16/12/2025	10/03/2029



Estabilidad de obra	\$ 77.210.328,20	10/03/2026	10/03/2031
---------------------	------------------	------------	------------

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- Anexo 0:
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CCS-100009852
Fecha de expedición: 24 de noviembre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Amparos básicos predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025
Patronal	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025

- Anexo 1: Extensión de vigencias
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CCS-100009852
Fecha de expedición: 30 de marzo de 2026

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Amparos básicos -predios, labores y operaciones	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026
Patronal	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026

3.1.3. COMITES TECNICOS

Durante el periodo del presente informe se realizaron.

- Comité 01 –suspensión.
- Comité 02 - Reinicio
- Comité 03 – Acta de mayores y menores cantidades.

3.1.4. SUSPENSIONES Y REINICIOS

Durante el periodo del presente informe se tuvo una suspensión y un reinicio en las siguientes fechas:



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

- Suspensión No. 1: 30 de diciembre de 2025
- Reinicio No. 1: 11 de febrero de 2026

3.1.5. PRORROGAS

Durante el periodo del presente informe se tuvo una prórroga por un término de un mes calendario y se firmó en la siguiente fecha:

- Prorroga No. 1 (1 mes): 11 de febrero de 2026

3.1.6. ADICIONES

No se realizaron adiciones.

3.1.7. SEGURIDAD SOCIAL

Se observa que la empresa contratista realizó la afiliación a la seguridad social de sus trabajadores como se puede evidenciar en las planillas (anexo 3).

3.1.8. ACTA PARCIAL

No se realizaron pagos parciales


3.1.9. ACTA FINAL

El día 10 de marzo se firma acta de recibo y entrega final

3.2. ACTIVIDADES TECNICAS

3.2.1. UBICACIÓN DE LA OBRA

El proyecto se ejecuta sobre la calle 10, barrios las colinas y los chiparos. Tramo 1 calle 13 con carrera 20 mediante adecuación de sumidero y tramo 2 calle 10 con carrera 33 mediante recalce de tubería.

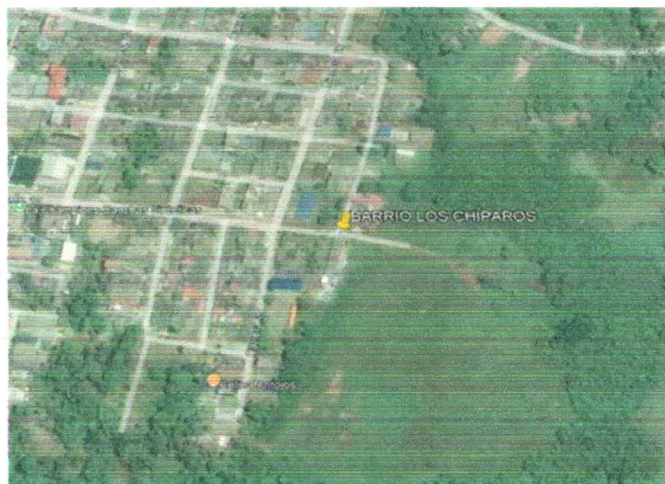


UBICACIÓN PROYECTO EN EJECUCION –

Localizado en Latitud: 0.494029°, Longitud: -76.490042°



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

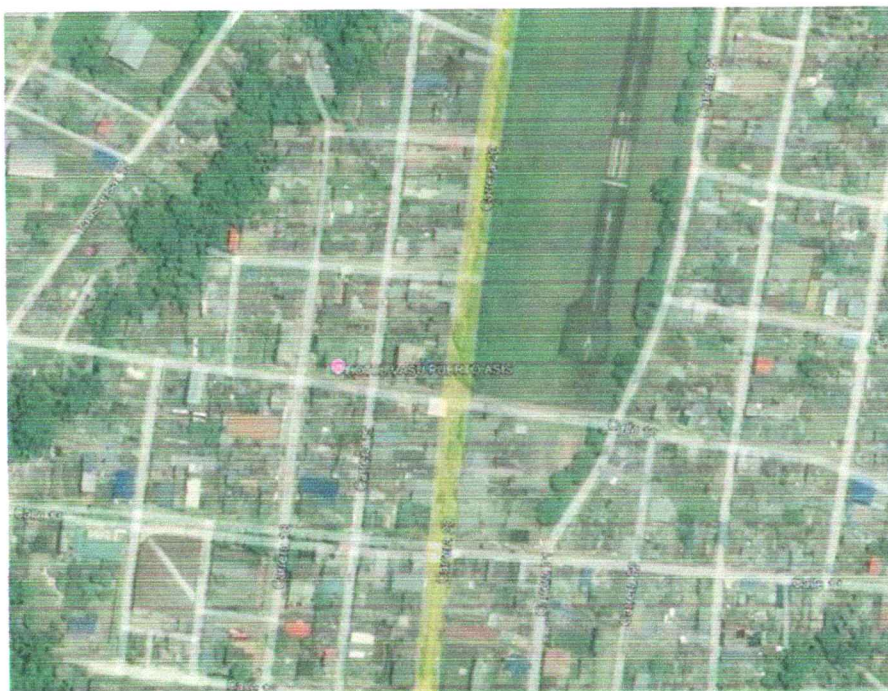

LOCALIZACIÓN TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20
(Google Earth).



LOCALIZACIÓN TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33
(Google Earth).



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



3.2.2. DISEÑOS DEL PROYECTO

Se le entregó al contratista los planos y diseño que se tuvieron en cuenta para la formulación y modificación del proyecto.

3.2.3. PERSONAL EN OBRA Y MAQUINARIA

El personal de la obra que está participando en la construcción son los siguientes:

RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
MAESTRO	1
AYUDANTES	1

La maquinaria y equipos que se están empleando en la obra son los siguientes:

Herramienta menor	1
Retroexcavadora	1
Rotomartillo	1
Rana	1
Volqueta	1
Mezclador	1

3.2.4. BITACORA DE OBRA

Se llevo correctamente la bitácora de obra, reportando actividades de ejecución, clima, cantidad de trabajadores y equipos en el sitio.





3.2.5. Condiciones iniciales del contrato

CONDICIONES INICIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,00	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	196,00	\$ 2.910,40	\$ 570.438
1,02	CERRAMIENTO CON LONA H=2 M	ML	16,00	\$ 15.660,00	\$ 250.560
				SUBTOTAL	\$ 820.998
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES				
2,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	502,17	\$ 27.569,00	\$ 13.844.192
2,02	ENTIBADO	M2	55,00	\$ 40.003,84	\$ 2.200.211
2,03	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA CRUDO DE RÍO	M3	25,70	\$ 122.136,41	\$ 3.138.662
2,04	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	216,35	\$ 18.905,00	\$ 4.090.097
2,05	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO	M3	108,00	\$ 64.055,00	\$ 6.917.940
2,06	ENCAMADO DE TUBERÍA CON ARENA DE RÍO APISONADA	M3	48,00	\$ 81.582,00	\$ 3.915.936
2,07	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO E=0,18 M	M2	17,02	\$ 33.425,00	\$ 569.027
				SUBTOTAL	\$ 34.676.065
3,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA PVC Ø= 315 MM - 12"	ML	232,83	\$ 194.614,81	\$ 45.312.166
3,02	CÁMARA DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2 M H≤4,00 M. INCLUYE PLACA DE PISO EN CONCRETO CON CAÑUELAS ESMALTADAS, ARO Y CONTRA ARO METÁLICO CON REFUERZO EN TAPA.	UND	6,00	\$ 4.003.616,86	\$ 24.021.701
3,03	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM.	UND	2,00	\$ 163.890,68	\$ 327.781
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 2"x1/8" Y CELOSIA EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	ML	90,00	\$ 817.125,00	\$ 73.541.250
				SUBTOTAL	\$ 143.202.899
4,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4,01	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO E=0,18M R-4000 PSI	M2	17,02	\$ 181.569,41	\$ 3.091.038
				SUBTOTAL	\$ 3.091.038
5,00	ITEM NO PREVISTOS				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" Y CELOSIA EN ÁNGULO DE 1"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	M2	0,00	\$ 787.654,00	\$ -
5,02	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,00	\$ 60.235,00	\$ -
				SUBTOTAL	\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO:		\$	181.791.000
ADMINISTRACIÓN (29%):	29%	\$	52.454.367
UTILIDAD (5%):	5%	\$	9.089.550
PMA:		\$	6.245.000
TOTAL OBRA:		\$	249.579.917



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL.UNITARIO	VL. TOTAL
1,00	PRELIMINARES				
1,01	Localización y replanteo	ml	33,79	\$ 3.136,53	\$ 105.983
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	124,34	\$ 15.660,00	\$ 1.947.164
				SUBTOTAL	\$ 2.053.148
2,00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES				
2,01	Excavación mecánica en material común	m3	160,72	\$ 26.171,00	\$ 4.206.075
2,02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	91,52	\$ 32.375,00	\$ 2.962.960
2,03	Relleno compacto con material de excavación	m3	105,80	\$ 41.637,50	\$ 4.405.073
2,04	Acondicionamiento de superficie para instalación de tubería	ml	8,30	\$ 42.074,29	\$ 349.217
2,05	Corte y demolición de placa en concreto	m2	232,99	\$ 33.425,00	\$ 7.787.691
2,06	Entibado metálico	m2	121,60	\$ 47.025,00	\$ 5.718.240
				SUBTOTAL	\$ 25.429.255
3,00	TUBERIA				
3,01	Recalce uniones de tubería	und	7	\$ 140.969,60	\$ 986.787
3,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 12"	ml	11,96	\$ 169.519,81	\$ 2.027.457
				SUBTOTAL	\$ 3.014.244
4,00	CONEXIÓN A CAMARA EXISTENTE				
4,01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada	und	1	\$ 161.894,96	\$ 161.895
				SUBTOTAL	\$ 161.895
5,00	REPOSICIÓN DE VIAS				
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18)	m2	232,99	\$ 181.569,42	\$ 42.303.858
5,02	Sub base granular	m3	46,598	\$ 166.963,33	\$ 7.780.157
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	175,5636	\$ 23.617,50	\$ 4.146.373
5,04	Suministro e instalación de geotextil, para separación de s	m2	228,55	\$ 26.355,00	\$ 6.023.435
				SUBTOTAL	\$ 60.253.824
6,00	ACERO				
6,01	Acero de refuerzo	Kg	375,48	\$ 9.978,50	\$ 3.746.678
				SUBTOTAL	\$ 3.746.678
7,00	SUMIDERO				
7,01	Sumidero en concreto 1.20 m x 0.70m x 0.90 m medidas	und	1	\$ 1.230.964,93	\$ 1.230.965
				SUBTOTAL	\$ 1.230.965
8,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
8,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), e	m3	41,139	\$ 29.056,88	\$ 1.195.371
				SUBTOTAL	\$ 1.195.371

COSTO DIRECTO		\$ 97.085.380
ADMINISTRACION	\$ 0,30	\$ 28.767.076
UTILIDAD	\$ 0,05	\$ 4.854.269
TOTAL AU	\$ 0,35	\$ 33.621.345
TOTAL PRESUPUESTO OBRA + AIU		\$ 130.706.724
PMA		\$ 2.515.000
PMT		\$ 3.250.000

TOTAL COSTO OBRA	\$ 136.471.724
-------------------------	-----------------------

TOTAL CONTRATO	
OBRA No. 1	\$ 249.579.917
OBRA No. 2	\$ 136.471.724
TOTAL	\$ 386.051.642



3.2.6. MODIFICATORIO MAYORES Y MENORES CANTIDADES


Durante el desarrollo de las actividades constructivas se evidenció la necesidad técnica de realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de algunos ítems no previstos, derivados de las condiciones reales encontradas en campo y de los ajustes necesarios para garantizar la correcta ejecución hidráulica, estructural y funcional del sistema de alcantarillado sanitario proyectado y sin afectar el valor del contrato.

CONDICIONES INICIALES			MODIFICACION 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	(+/-)	CANT	CANT	VR TOTAL
1,00	PRELIMINARES					
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	+	36,80	232,8	\$ 677.541,12
1,02	CERRAMIENTO CON LONA H=2 M	ML	-	-	16,0	\$ 250.560,00
	SUBTOTAL				\$	928.101,12
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES					
2,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	(+)	204,11	706,28	\$ 19.471.433,32
2,02	ENTIBADO	M2	-	-	55,00	\$ 2.200.211,31
2,03	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA CRUDO DE RIO	M3	(+)	76,65	102,35	\$ 12.500.661,95
2,04	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	(+)	-	216,35	\$ 4.090.096,75
2,05	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO	M3	-	-	108,00	\$ 6.917.940,00
2,06	ENCAMADO DE TUBERÍA CON ARENA DE RIO APISONADA	M3	(+)	1,20	49,20	\$ 4.013.834,40
2,07	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO E=0,18 M	M2	-	-	17,02	\$ 568.893,50
	SUBTOTAL				\$	49.763.071,23
3,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO					
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA PVC Ø= 315 MM - 12"	ML	(+)	11,97	244,8	\$ 47.641.705,49
3,02	CÁMARA DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2 M H≤4,00 M. INCLUYE PLACA DE PISO EN CONCRETO CON CAÑUELAS ESMALTADAS, ARO Y CONTRA ARO METÁLICO CON REFUERZO EN TAPA.	UND	(-)	- 1,00	5,0	\$ 20.018.084,32
3,03	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM.	UND	-	-	2,0	\$ 327.781,35
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 2"x1/8" Y CELOSIA EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	ML	(-)	- 90,00	0,0	\$ -
	SUBTOTAL				\$	67.987.571,16
4,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
4,01	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO E=0,18M R-4000 PSI	M2	-	0,00	17,0	\$ 3.090.311,39
	SUBTOTAL				\$	3.090.311,39
5,00	ITEM NO PREVISTOS					
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" Y CELOSIA EN ÁNGULO DE 1"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	M2	+	87,00	87,0	\$ 68.525.898,00
5,02	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	+	562,52	562,5	\$ 33.883.399,43
	SUBTOTAL				\$	102.409.297,43
TOTAL COSTO DIRECTO:						\$ 224.178.352,34
ADMINISTRACIÓN (29%):						\$ 64.684.905,10
UTILIDAD (5%):						\$ 11.208.917,62
PMA:						\$ 6.245.000,00
TOTAL OBRA:						\$ 306.317.175,05



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO			MODIFICACION 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	(+/-)	CANT	CANT	VR TOTAL
1,00	PRELIMINARES					
1,01	Localización y replanteo	ml		-	33,79	\$ 105.983,46
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml		-	124,34	\$ 1.947.164,40
SUBTOTAL						\$ 2.053.147,86
2,00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES					
2,01	Excavación mecánica en material común	m3	(-)	- 53,15	107,57	\$ 2.815.214,47
2,02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	(-)	- 87,36	4,16	\$ 134.679,99
2,03	Relleno compacto con material de excavación	m3	(-)	- 9,90	95,90	\$ 3.992.884,90
2,04	Acondicionamiento de superficie para instalación de tubería	ml	(-)	- 2,30	6,00	\$ 252.445,74
2,05	Corte y demolición de placa en concreto	m2	(-)	- 99,35	133,64	\$ 4.466.917,00
2,06	Entibado metálico	m2	(-)	- 109,60	12,00	\$ 564.300,00
SUBTOTAL						\$ 12.226.442,09
3,00	TUBERIA					
3,01	Recalce uniones de tubería	und	(-)	- 2,00	5,00	\$ 704.848,00
3,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 12"	ml	(-)	- 2,30	9,66	\$ 1.637.561,36
SUBTOTAL						\$ 2.342.409,36
4,00	CONEXIÓN A CAMARA EXISTENTE					
4,01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada	und		-	1,00	\$ 161.894,96
SUBTOTAL						\$ 161.894,96
5,00	REPOSICIÓN DE VIAS					
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18)	m2	(-)	- 99,35	133,64	\$ 24.264.936,62
5,02	Sub base granular	m3	(-)	- 19,87	26,73	\$ 4.462.595,88
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	(-)	- 94,77	80,79	\$ 1.908.057,83
5,04	Suministro e instalación de geotextil, para separación de s	m2	(-)	- 99,35	129,2	\$ 3.405.066,00
SUBTOTAL						\$ 34.040.656,33
6,00	ACERO					
6,01	Acero de refuerzo	Kg	(-)	- 153,88	221,60	\$ 2.211.234,46
SUBTOTAL						\$ 2.211.234,46
7,00	SUMIDERO					
7,01	Sumidero en concreto 1.20 m x 0.70m x 0.90 m medidas	und		-	1,0	\$ 1.230.964,93
SUBTOTAL						\$ 1.230.964,93
8,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
8,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), e	m3	(-)	- 17,88	23,26	\$ 675.746,69
SUBTOTAL						\$ 675.746,69
COSTO DIRECTO						\$ 54.942.496,68
ADMINISTRACION						\$ 16.279.845,43
UTILIDAD						\$ 813.992,27
TOTAL AU						\$ 19.026.970,27
AL PRESUPUESTO OBRA +						\$ 73.969.466,95
PMA						\$ 2.515.000,00
PMT						\$ 3.250.000,00
TOTAL COSTO OBRA						\$ 79.734.466,95
TOTAL CONTRATO						
OBRA No. 1						\$ 306.317.175,05
OBRA No. 2						\$ 79.734.466,95
TOTAL						\$ 386.051.642,00



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

3.2.7. Actividades ejecutadas en el acta de recibo final

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACION 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	(+/-)	CANT	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.00 PRELIMINARES											
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	196.00	\$ 2.910.40	\$ 570.438	+	36.80	232.8	\$ 677.541.12	232.8	\$ 677.541.12
1.02	CERRAMIENTO CON LONA H=2 M	ML	16.00	\$ 15.660.00	\$ 250.560	-	-	16.0	\$ 250.560.00	16.0	\$ 250.560.00
				SUBTOTAL	\$ 820.998				\$ 928.101.12		\$ 928.101.12
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES											
2.01	EXCAVACION MECANICA	M3	502.17	\$ 27.569.00	\$ 13.844.192	(+)	204.11	706.28	\$ 19.471.433.32	706.28	\$ 19.471.433.32
2.02	ENTIBADO	M2	55.00	\$ 40.003.84	\$ 2.200.211	-	-	55.00	\$ 2.200.211.31	55.00	\$ 2.200.211.31
2.03	RELLENO CON COMPACTACION MANUAL - MECANICA CRUDO DE RIO	M3	25.70	\$ 122.136.41	\$ 3.138.662	(+)	76.65	102.35	\$ 12.500.661.95	102.35	\$ 12.500.661.95
2.04	RELLENO CON COMPACTACION MANUAL - MECANICA MATERIAL DE EXCAVACION	M3	216.35	\$ 18.905.00	\$ 4.090.097	(+)	-	216.35	\$ 4.090.096.75	216.35	\$ 4.090.096.75
2.05	RELLENO CON COMPACTACION MANUAL - MECANICA MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO	M3	108.00	\$ 64.055.00	\$ 6.917.940	-	-	108.00	\$ 6.917.940.00	108.00	\$ 6.917.940.00
2.06	ENCAMADO DE TUBERIA CON ARENA DE RIO APSOMADA	M3	48.00	\$ 81.582.00	\$ 3.915.936	(+)	1.20	49.20	\$ 4.013.834.40	49.20	\$ 4.013.834.40
2.07	DEMOLICION DE PAVIMENTO E=0.18 M	M2	17.02	\$ 33.425.00	\$ 569.027	-	-	17.02	\$ 568.893.50	17.02	\$ 568.893.50
				SUBTOTAL	\$ 34.676.065				\$ 49.763.071.23		\$ 49.763.071.23
3.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
ALCANTARILLADO SANITARIO											
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA CORRUGADA PVC Ø= 315 MM - 12"	ML	232.83	\$ 194.614.81	\$ 45.312.166	(+)	11.97	244.8	\$ 47.641.705.49	244.8	\$ 47.641.705.49
3.02	CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCRETO DE 3000PSI D=1.2 M H≤4.00 M. INCLUYE PLACA DE PISO EN CONCRETO CON CAÑUELAS ESMALTADAS, ARO Y CONTRA ARO METALICO CON REFUERZO EN TAPA.	UND	6.00	\$ 4.003.616.86	\$ 24.021.701	(-)	1.00	5.0	\$ 20.018.084.32	5.0	\$ 20.018.084.32
3.03	CONEXION A CAMARA EXISTENTE, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM.	UND	2.00	\$ 163.890.68	\$ 327.781	-	-	2.0	\$ 327.781.35	2.0	\$ 327.781.35
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA 40x40 cm EN ANGULO DE 2x1/8" Y CELOSIA EN ANGULO DE 1 1/2x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	ML	90.00	\$ 817.125.00	\$ 73.541.250	(-)	90.00	0.0	\$ -	0.0	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 143.202.899				\$ 67.987.571.16		\$ 67.987.571.16
4.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
REPOSICION PAVIMENTO RIGIDO CONCRETO E=0.18M R-4000 PSI											
4.01		M2	17.02	\$ 181.569.41	\$ 3.091.038	-	0.00	17.0	\$ 3.090.311.39	17.0	\$ 3.090.311.39
				SUBTOTAL	\$ 3.091.038				\$ 3.090.311.39		\$ 3.090.311.39
5.00 ITEM NO PREVISTOS											
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA 40x40 cm EN ANGULO DE 1 1/2x1/8" Y CELOSIA EN ANGULO DE 1x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	M2	0.00	\$ 787.654.00	\$ -	+	87.00	87.0	\$ 68.525.898.00	87.0	\$ 68.525.898.00
5.02	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	\$ 60.235.00	\$ -	+	562.52	562.5	\$ 33.883.399.43	562.5	\$ 33.883.399.43
				SUBTOTAL	\$ -				\$ 102.409.297.43		\$ 102.409.297.43
TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 181.791.000											
ADMINISTRACION (29%): \$ 52.454.367											
UTILIDAD (5%): \$ 9.089.550											
PMA: \$ 6.245.000											
TOTAL OBRA: \$ 249.579.917											



3.2.8. DESCRIPCION DE LA OBRA

El objetivo del contrato es mejorar la prestación del servicio de alcantarillado y de esta manera disminuir los riesgos de contraer enfermedades.

3.2.9. TIEMPO TRASCURRIDO DEL CONTRATO

El tiempo transcurrido del contrato de obra fue el siguiente:

Plazo de Ejecución:	UN (01) mes y catorce (14) días
Fecha de Inicio:	16 de diciembre de 2025
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2025
Fecha de Suspensión No. 1:	30 de diciembre de 2025
Fecha de Reinicio No. 1:	11 de febrero de 2026
Fecha de Prorroga No. 1 (1 mes):	11 de febrero de 2026
Fecha de Terminación No. 2:	10 de marzo de 2026

3.3. ACTIVIDADES FINANCIERA

En esta tabla se muestra las cantidades y el valor ejecutado del contrato de obra.

Valor inicial del contrato	\$ 386.051.641,00
Valores adicionales	\$ 0,00
Valor anticipo	\$ 193.025.820,50
Valor total del contrato	\$ 386.051.641,00
Valor pagado actas parciales	\$ 0,00
Valor total ejecutado acta final	\$ 386.051.641,00
Valor amortización anticipo	\$ 193.025.820,50
Valor total a pagar acta final	\$ 193.025.820,50
Saldo a favor del municipio	\$ 0,00
Porcentaje de ejecución financiera total	100%
Porcentaje de ejecución físico	100%

La obra se ejecuta en actividades 100% cumpliendo el objeto del contrato.







4. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

Las actas que se desarrollaron en el contrato de obra hasta la fecha fueron las siguientes:

FECHA ACTA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2025
COMITÉ TECNICO No 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN 01:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO Y PRORROGA:	11 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE MAYORES Y MENORES:	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	10 DE MARZO DE 2026

Atentamente;



JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura

Proyecto	Christian Leonardo Charria	Apoyo profesional SIM	
----------	----------------------------	-----------------------	---




ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REGISTRO FOTOGRAFICO

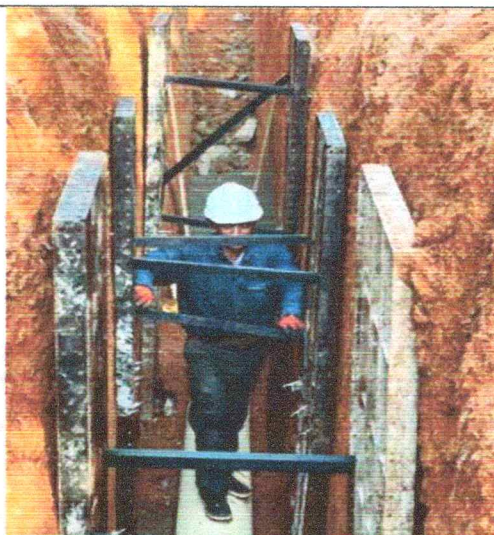




ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

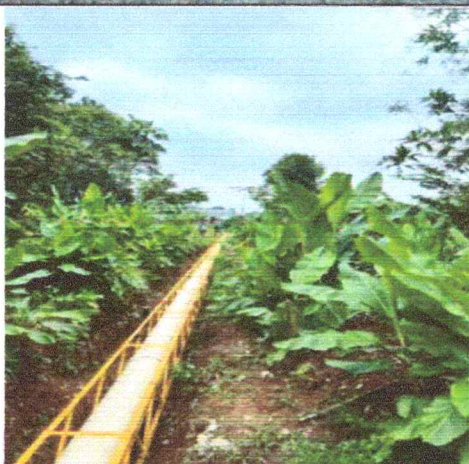



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

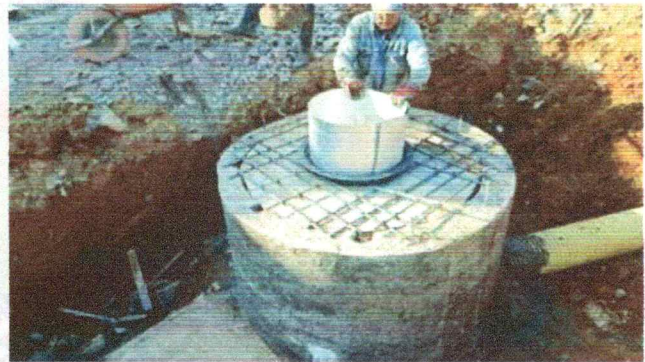

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano
Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
Teléfono: (02) 251 21 21
Correo electrónico: alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co
Página web: www.puertoasis-putumayo.gov.co



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.0495-2025

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS SOBRE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

PERIODO: 16/12/2025 AL 10/03/2026

INFORME DE INTERVENTORÍA

Contratante:

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

Contratista de obra:

GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC
901.617.088-5
R/L: KATHERINE ESTRADA CORTEZ
CC. 1.006.847.128

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT: 901379301-8

JUNIO DE 2026



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
2.1. Datos generales del contrato de obra e interventoría.....	4
2.1.1. Información general del contrato de obra.....	4
2.1.2. Información general del contrato de interventoría.....	4
2.1.3. Seguimiento garantías contractuales – contrato de interventoría.....	5
2.1.4. Seguimiento garantías contractuales – contrato de obra	7
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.	9
4. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS CONTRATADOS	10
4.1. Modificación de cantidades	12
5. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	16
6. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA	20
6.1. AVANCE FÍSICO.....	20
6.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.....	20
7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA	20
7.1. Seguimiento a la implementación PMA.....	21
7.2. Seguimiento a la implementación Plan de Manejo de Transito.....	22
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	24



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría se elabora en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para la supervisión técnica, administrativa, financiera al proyecto denominado *"mejoramiento de alcantarillado sanitario mediante la construcción de colector principal sobre la calle 10, barrios las colinas y los chiparos del municipio de puerto Asís, putumayo"* y *"mejoramiento de alcantarillado tramo 1 calle 13 con carrera 20 mediante adecuación de sumidero y tramo 2 calle 10 con carrera 33 mediante recalce de tubería del municipio de puerto Asís, putumayo"*

Este proyecto forma parte de las acciones adelantadas por la administración municipal para fortalecer la infraestructura de saneamiento básico y mejorar las condiciones de vida de la comunidad del municipio.

La interventoría, en su rol de garante del cumplimiento del contrato de obra, presenta en este documento el seguimiento detallado a las actividades ejecutadas, los avances físicos y financieros, las gestiones administrativas realizadas, las observaciones técnicas relevantes y las recomendaciones orientadas a asegurar la correcta ejecución del proyecto conforme a las especificaciones contractuales, normativas vigentes y principios de transparencia en la gestión pública.

Con ello, se busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puerto Asís y al cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en materia de desarrollo territorial, sostenibilidad ambiental y bienestar comunitario.



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Datos generales del contrato de obra e interventoría

2.1.1. Información general del contrato de obra

CONTRATO No.	0469-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.200.461-3
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$386.051.641) M/CTE.
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC 901.617.088-5 R/L: KATHERINE ESTRADA CORTEZ CC. 1.006.847.128
PLAZO:	Un (01) mes
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 01:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO 01:	11 de febrero de 2026
PRORROGA 01:	Un (01) mes
FECHA DE TERMINACIÓN 02:	10 de marzo de 2026

2.1.2. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.	0495-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.200.461-3
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS SOBRE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE



	COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS (\$ 26.551.102) M/CTE.
CONTRATISTA:	CARLOT S.A.S ZOMAC NIT: 901379301-8 Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
PLAZO:	Un (01) mes
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 01:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO 01:	11 de febrero de 2026
PRORROGA 01:	Un (01) mes
FECHA DE TERMINACIÓN 02:	10 de marzo de 2026

2.1.3. Seguimiento garantías contractuales – contrato de interventoría

La garantía del contrato de interventoría No. 0495-2025, se encuentra aseguradas por SEGUROS DEL ESTADO S.A. que amparan el Contrato de interventoría–cumplen con los requisitos de valor y tiempo del contrato.

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas anteriormente mencionadas junto con el valor asegurado.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Anexo 0.**
Póliza de cumplimiento No. 11-44-101272763
Fecha de expedición: 15 de diciembre de 2025



AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$2.655.110,20	15/12/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$5.310.220,40	31/12/2025	31/12/2030
Calidad del servicio	\$1.327.555,10	15/12/2025	31/12/2028

- Anexo 2: ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101272763

Fecha de expedición: 29 de diciembre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$2.655.110,20	16/12/2025	01/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$5.310.220,40	16/12/2025	01/01/2029
Calidad del servicio	\$1.327.555,10	01/01/2026	01/01/2031

- Anexo 3: ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101272763

Fecha de expedición: 11 de marzo de 2026

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$2.655.110,20	16/12/2025	10/09/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$5.310.220,40	16/12/2025	10/03/2029
Calidad del servicio	\$1.327.555,10	01/01/2026	01/01/2031

2.1.4 Seguimiento garantías contractuales – contrato de obra

La garantía del contrato de obra No. 0469-2025, se encuentra aseguradas por SEGUROS MUNDIAL S.A que amparan el Contrato de obra y cumplen con los requisitos de valor y tiempo del contrato.

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas anteriormente mencionadas junto con el valor asegurado.

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

- Anexo 0:**

Póliza de cumplimiento No. CCS-100045747

Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento	\$ 38.605.164,10	20/11/2025	30/06/2026
Buen manejo de anticipo	\$ 193.025.820,50	20/11/2025	30/06/2026
Prestaciones sociales	\$ 19.302.582,05	20/11/2025	31/12/2028
Estabilidad de obra	\$ 77.210.328,20	31/12/2025	31/12/2030

- Anexo 1: Extensión de vigencias**

Póliza de cumplimiento No. CCS-100045747

Fecha de expedición: 30 de marzo de 2026

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento	\$ 38.605.164,10	16/12/2025	10/09/2026
Buen manejo de anticipo	\$ 193.025.820,50	16/12/2025	10/09/2026
Prestaciones sociales	\$ 19.302.582,05	16/12/2025	10/03/2029
Estabilidad de obra	\$ 77.210.328,20	10/03/2026	10/03/2031



POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- Anexo 0:**

Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CCS-100009852

Fecha de expedición: 24 de noviembre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Amparos básicos -predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025
Patronal	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	\$ 284.700.000,00	20/11/2025	31/12/2025

- Anexo 1: Extensión de vigencias**

Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CCS-100009852

Fecha de expedición: 30 de marzo de 2026

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Amparos básicos -predios, labores y operaciones	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026
Patronal	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000,00	20/11/2025	10/03/2026

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecuta sobre la calle 10, barrios las colinas y los chiparos. Tramo 1 calle 13 con carrera 20 mediante adecuación de sumidero y tramo 2 calle 10 con carrera 33 mediante recalce de tubería.



UBICACIÓN PROYECTO EN EJECUCION –
Localizado en **Latitud: 0.494029°, Longitud: -76.490042°**



LOCALIZACIÓN TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20
(Google Earth).



LOCALIZACIÓN TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33
(Google Earth).

4. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS CONTRATADOS

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO PUTUMAYO					
PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	196.00	\$ 2,910.40	\$ 570,438
1.02	CERRAMIENTO CON LONA H=2 M	ML	16.00	\$ 15,660.00	\$ 250,560
				SUBTOTAL	\$ 820,998
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES				
2.01	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	502.17	\$ 27,569.00	\$ 13,844,192
2.02	ENTIBADO	M2	55.00	\$ 40,003.84	\$ 2,200,211
2.03	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECANICA CRUDO DE RIO	M3	25.70	\$ 122,136.41	\$ 3,138,662
2.04	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECANICA MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	216.35	\$ 18,905.00	\$ 4,090,097
2.05	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECANICA MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO	M3	108.00	\$ 64,055.00	\$ 6,917,940
2.06	ENCAMADO DE TUBERIA CON ARENA DE RIO APISONADA	M3	48.00	\$ 81,582.00	\$ 3,915,936
2.07	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO E=0,18 M	M2	17.02	\$ 33,425.00	\$ 569,027
				SUBTOTAL	\$ 34,676,065
3.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO				
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA PVC Ø= 315 MM - 12"	ML	232.83	\$ 194,614.81	\$ 45,312,166



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

3.02	CAMARA DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2 M H≤4.00 M. INCLUYE PLACA DE PISO EN CONCRETO CON CAÑUELAS ESMALTADAS, ARO Y CONTRA ARO METÁLICO CON REFUERZO EN TAPA.	UND	6.00	\$ 4,003,616.86	\$ 24,021,701
3.03	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM.	UND	2.00	\$ 163,890.68	\$ 327,781
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 2"x1/8" Y CELOSIA EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	ML	90.00	\$ 817,125.00	\$ 73,541,250
SUBTOTAL					\$ 143,202,899
4.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4.01	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO E=0.18M R-4000 PSI	M2	17.02	\$ 181,569.41	\$ 3,091,038
SUBTOTAL					\$ 3,091,038

TOTAL COSTO DIRECTO:		\$ 181,791,000
ADMINISTRACIÓN (29%):	29%	\$ 52,454,367
UTILIDAD (5%):	5%	\$ 9,089,550
PMA:		\$ 6,245,000
TOTAL OBRA:		\$ 249,579,917

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL.UNITARIO	VL. TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo	ml	33.79	\$ 3,136.53	\$ 105,983
1.02	Cierre en lona verde h=2m	ml	124.34	\$ 15,660.00	\$ 1,947,164
SUBTOTAL					\$ 2,053,148
2.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES				
2.01	Excavación mecánica en material común	m3	160.72	\$ 26,171.00	\$ 4,206,075
	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	91.52	\$ 32,375.00	\$ 2,962,960
2.03	Relleno compacto con material de excavación	m3	105.80	\$ 41,637.50	\$ 4,405,073
2.04	Acondicionamiento de superficie para instalacion de tubería de PVC incluye cama de arena y atraque lateral con material granular (transporte desde cantera autorizada)	ml	8.30	\$ 42,074.29	\$ 349,217
2.05	Corte y demolición de placa en concreto	m2	232.99	\$ 33,425.00	\$ 7,787,691
2.06	Entibado metálico	m2	121.60	\$ 47,025.00	\$ 5,718,240
SUBTOTAL					\$ 25,429,255
3.00	TUBERIA				
3.01	Recalce uniones de tubería	und	7	\$ 140,969.60	\$ 986,787
3.02	Suministro e instalación de tubería corrugada 12"	ml	11.96	\$ 169,519.81	\$ 2,027,457
SUBTOTAL					\$ 3,014,244
4.00	CONEXIÓN A CAMARA EXISTENTE				
4.01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada 4 mm	und	1	\$ 161,894.96	\$ 161,895
SUBTOTAL					\$ 161,895
5.00	REPOSICIÓN DE VIAS				
5.01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	232.99	\$ 181,569.42	\$ 42,303,858
5.02	Sub base granular	m3	46.598	\$ 166,963.33	\$ 7,780,157
5.03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	175.5636	\$ 23,617.50	\$ 4,146,373
5.04	Suministro e instalación de geotextil, para separación de suelo de subrasante y capa granular	m2	228.55	\$ 26,355.00	\$ 6,023,435
SUBTOTAL					\$ 60,253,824
6.00	ACERO				
6.01	Acero de refuerzo	Kg	375.4751107	\$ 9,978.50	\$ 3,746,678
SUBTOTAL					\$ 3,746,678



7.00	SUMIDERO				
7.01	Sumidero en concreto 1.20 m x 0.70m x 0.90 m medidas internas, placa inferior, muros y placa superior en concreto de 3000psi de 10 cm de espesor con refuerzo en varilla de 1/2" @ 15 cm en ambos sentidos, rejilla metálica en ángulo metálico 2"x3/16 con marco y contra marco, incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	1	\$ 1,230,964.93	\$ 1,230,965
SUBTOTAL					\$ 1,230,965
8.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
8.01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	41.139	\$ 29,056.88	\$ 1,195,371
SUBTOTAL					\$ 1,195,371

COSTO DIRECTO		\$ 97,085,380
ADMINISTRACION	\$ 0.30	\$ 28,767,076
UTILIDAD	\$ 0.05	\$ 4,854,269
TOTAL AU	\$ 0.35	\$ 33,621,345
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		\$ 130,706,724
PMA		\$ 2,515,000
PMT		\$ 3,250,000

TOTAL COSTO OBRA	\$ 136,471,724
-------------------------	----------------

TOTAL CONTRATO	
OBRA No. 1	\$ 249,579,917
OBRA No. 2	\$ 136,471,724
TOTAL	\$ 386,051,641

4.1. Modificación de cantidades

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se evidenció la necesidad técnica de realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de algunos ítems no previstos, derivados de las condiciones reales encontradas en campo y de los ajustes necesarios para garantizar la correcta ejecución hidráulica, estructural y funcional del sistema de alcantarillado sanitario proyectado y sin afectar el valor del contrato.

Por lo anterior, las cantidades del presupuesto quedan de la siguiente manera:

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	(+/-)	CANT	CANT	VR TOTAL
1.00	PRELIMINARES						
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	196.00	+	36.80	232.8	\$ 677,541.12
1.02	CERRAMIENTO CON LONA H=2 M	ML	16.00		-	16.0	\$ 250,560.00
SUBTOTAL							\$ 928,101.12
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES						
2.01	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	502.17	(+)	204.11	706.28	\$ 19,471,433.32



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

2.02	ENTIBADO	M2	55.00		-	55.00	\$ 2,200,211.31
2.03	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECANICA CRUDO DE RIO	M3	25.70	(+)	76.65	102.35	\$ 12,500,661.95
2.04	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECANICA MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	216.35	(+)	-	216.35	\$ 4,090,096.75
2.05	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECANICA MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO	M3	108.00		-	108.00	\$ 6,917,940.00
2.06	ENCAMADO DE TUBERIA CON ARENA DE RIO APISONADA	M3	48.00	(+)	1.20	49.20	\$ 4,013,834.40
2.07	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO E=0,18 M	M2	17.02		-	17.02	\$ 568,893.50
SUBTOTAL						\$ 49,763,071.23	
3.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO						
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA PVC Ø= 315 MM - 12"	ML	232.83	(+)	11.97	244.8	\$ 47,641,705.49
3.02	CAMARA DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2 M H≤4.00 M. INCLUYE PLACA DE PISO EN CONCRETO CON CAÑUELAS ESMALTADAS, ARO Y CONTRA ARO METÁLICO CON REFUERZO EN TAPA.	UND	6.00	(-)	- 1.00	5.0	\$ 20,018,084.32
3.03	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM.	UND	2.00		-	2.0	\$ 327,781.35
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 2"x1/8" Y CELOSIA EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	ML	90.00	(-)	- 90.00	0.0	\$ -
SUBTOTAL						\$ 67,987,571.16	
4.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.01	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO E=0.18M R-4000 PSI	M2	17.02		- 0.00	17.0	\$ 3,090,311.39
SUBTOTAL						\$ 3,090,311.39	
5.00	ITEM NO PREVISTOS						
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" Y CELOSIA EN ÁNGULO DE 1"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	M2	0.00	+	87.00	87.0	\$ 68,525,898.00
5.02	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	+	562.52	562.5	\$ 33,883,399.43
SUBTOTAL						\$ 102,409,297.43	

TOTAL COSTO DIRECTO:		\$ 224,178,352.34
ADMINISTRACIÓN (29%):		\$ 64,684,905.10
UTILIDAD (5%):		\$ 11,208,917.62



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

PMA:		\$	6,245,000.00
TOTAL OBRA:		\$	306,317,175.05

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO							
CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	(+/-)	CANT	CANT	VR TOTAL
1.00	PRELIMINARES						
1.01	Localización y replanteo	ml	33.79		-	33.79	\$ 105,983.46
1.02	Cierre en lona verde h=2m	ml	124.34		-	124.34	\$ 1,947,164.40
SUBTOTAL							\$ 2,053,147.86
2.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES						
2.01	Excavación mecánica en material común	m3	160.72	(-)	- 53.15	107.57	\$ 2,815,214.47
2.02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	91.52	(-)	- 87.36	4.16	\$ 134,679.99
2.03	Relleno compacto con material de excavación	m3	105.80	(-)	- 9.90	95.90	\$ 3,992,884.90
2.04	Acondicionamiento de superficie para instalacion de tubería de PVC incluye cama de arena y atraque lateral con material granular (transporte desde cantera autorizada)	ml	8.30	(-)	- 2.30	6.00	\$ 252,445.74
2.05	Corte y demolición de placa en concreto	m2	232.99	(-)	- 99.35	133.64	\$ 4,466,917.00
2.06	Entibado metálico	m2	121.60	(-)	- 109.60	12.00	\$ 564,300.00
SUBTOTAL							\$ 12,226,442.09
3.00	TUBERIA						
3.01	Recalce uniones de tubería	und	7	(-)	- 2.00	5.00	\$ 704,848.00
3.02	Suministro e instalación de tubería corrugada 12"	ml	11.96	(-)	- 2.30	9.66	\$ 1,637,561.36
SUBTOTAL							\$ 2,342,409.36
4.00	CONEXIÓN A CAMARA EXISTENTE						
4.01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada 4 mm	und	1		-	1.00	\$ 161,894.96
SUBTOTAL							\$ 161,894.96
5.00	REPOSICIÓN DE VIAS						
5.01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	232.99	(-)	- 99.35	133.64	\$ 24,264,936.62
5.02	Sub base granular	m3	46.598	(-)	- 19.87	26.73	\$ 4,462,595.88
5.03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	175.5636	(-)	- 94.77	80.79	\$ 1,908,057.83
5.04	Suministro e instalación de geotextil, para separación de suelo de subrasante y capa granular	m2	228.55	(-)	- 99.35	129.2	\$ 3,405,066.00
SUBTOTAL							\$ 34,040,656.33
6.00	ACERO						
6.01	Acero de refuerzo	Kg	375.48	(-)	- 153.88	221.60	\$ 2,211,234.46
SUBTOTAL							\$ 2,211,234.46
7.00	SUMIDERO						
7.01	Sumidero en concreto 1.20 m x 0.70m x 0.90 m medidas internas, placa inferior, muros y placa superior en concreto de 3000psi de 10 cm de espesor con	und	1		-	1.0	\$ 1,230,964.93



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

	refuerzo en varilla de 1/2" @ 15 cm en ambos sentidos, rejilla metálica en ángulo metálico 2"x3/16 con marco y contra marco, incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.						
SUBTOTAL							\$ 1,230,964.93
8.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
8.01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia máxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	41.139	(-)	-	17.88	23.26 \$ 675,746.69
SUBTOTAL							\$ 675,746.69

COSTO DIRECTO			\$ 54,942,496.68
ADMINISTRACION			\$ 16,279,845.43
UTILIDAD			\$ 813,992.27
TOTAL AU			\$ 19,026,970.27
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU			\$ 73,969,466.95
PMA			\$ 2,515,000.00
PMT			\$ 3,250,000.00

TOTAL COSTO OBRA			\$ 79,734,466.95
-------------------------	--	--	------------------

TOTAL CONTRATO			
OBRA No. 1			\$ 306,317,175.05
OBRA No. 2			\$ 79,734,466.95
TOTAL			\$ 386,051,642.00



5. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 10 de marzo de 2026 es el siguiente:

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.00	PRELIMINARES								
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	196.00	\$ 2,910.40	\$ 570,438	232.8	\$ 677,541.12	232.8	\$ 677,541.12
1.02	CERRAMIENTO CON LONA H=2 M	ML	16.00	\$ 15,660.00	\$ 250,560	16.0	\$ 250,560.00	16.0	\$ 250,560.00
				SUBTOTAL	\$ 820,998		\$ 928,101.12		\$ 928,101.12
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES								
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	502.17	\$ 27,569.00	\$ 13,844,192	706.28	\$ 19,471,433.32	706.28	\$ 19,471,433.32
2.02	ENTIBADO	M2	55.00	\$ 40,003.84	\$ 2,200,211	55.00	\$ 2,200,211.31	55.00	\$ 2,200,211.31
2.03	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA CRUDO DE RIO	M3	25.70	\$ 122,136.41	\$ 3,138,662	102.35	\$ 12,500,661.95	102.35	\$ 12,500,661.95
2.04	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	216.35	\$ 18,905.00	\$ 4,090,097	216.35	\$ 4,090,096.75	216.35	\$ 4,090,096.75
2.05	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO	M3	108.00	\$ 64,055.00	\$ 6,917,940	108.00	\$ 6,917,940.00	108.00	\$ 6,917,940.00
2.06	ENCAMADO DE TUBERÍA CON ARENA DE RIO APISONADA	M3	48.00	\$ 81,582.00	\$ 3,915,936	49.20	\$ 4,013,834.40	49.20	\$ 4,013,834.40
2.07	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO E=0,18 M	M2	17.02	\$ 33,425.00	\$ 569,027	17.02	\$ 568,893.50	17.02	\$ 568,893.50
				SUBTOTAL	\$ 34,676,065		\$ 49,763,071.23		\$ 49,763,071.23
3.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO								
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA PVC Ø= 315 MM - 12"	ML	232.83	\$ 194,614.81	\$ 45,312,166	244.8	\$ 47,641,705.49	244.8	\$ 47,641,705.49



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

3.02	CAMARA DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCRETO DE 3000PSI D=1.2 M H=4.00 M. INCLUYE PLACA DE PISO EN CONCRETO CON CAÑUELAS ESMALTADAS, ARO Y CONTRA ARO METÁLICO CON REFUERZO EN TAPA.	UND	6.00	\$ 4,003,616.86	\$ 24,021,701	5.0	\$ 20,018,084.32	5.0	\$ 20,018,084.32
3.03	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM.	UND	2.00	\$ 163,890.68	\$ 327,781	2.0	\$ 327,781.35	2.0	\$ 327,781.35
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA 40x40 cm EN ANGULO DE 2"x1/8" Y CELOSIA EN ANGULO DE 1 1/2"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	ML	90.00	\$ 817,125.00	\$ 73,541,250	0.0	\$ -	0.0	\$ -
				SUBTOTAL		\$ 143,202,899		\$ 67,987,571.16	
4.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS								\$ 67,987,571.16
4.01	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO E=0.18M R-4000 PSI	M2	17.02	\$ 181,569.41	\$ 3,091,038	17.0	\$ 3,090,311.39	17.0	\$ 3,090,311.39
				SUBTOTAL		\$ 3,091,038		\$ 3,090,311.39	
5.00	ITEM NO PREVISTOS								\$ 3,090,311.39
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA 40x40 cm EN ANGULO DE 1 1/2"x1/8" Y CELOSIA EN ANGULO DE 1"x1/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE)	M2	0.00	\$ 787,654.00	\$ -	87.0	\$ 68,525,898.00	87.0	\$ 68,525,898.00
5.02	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.00	\$ 60,235.00	\$ -	562.5	\$ 33,883,399.43	562.5	\$ 33,883,399.43
				SUBTOTAL		\$ -		\$ 102,409,297.43	
				SUBTOTAL		\$		\$ 102,409,297.43	



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALLE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO						CONDICIONES ACTUALIZADAS			EJECUTADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL.UNITARIO	VL. TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	
1.00 PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo	ml	33.79	\$ 3.136.53	\$ 105.983	33.79	\$ 105.983.46	33.79	\$ 105.983.46	
1.02	Cierre en lona verde h=2m	ml	124.34	\$ 15.660.00	\$ 1.947.164	124.34	\$ 1.947.164.40	124.34	\$ 1.947.164.40	
					SUBTOTAL		\$ 2,053,148		\$ 2,053,147.86	
2.00 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES										
2.01	Excavación mecánica en material común	m3	160.72	\$ 26.171.00	\$ 4.206.075	107.57	\$ 2,815,214.47	107.57	\$ 2,815,214.47	
2.02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	91.52	\$ 32.375.00	\$ 2.962.960	4.16	\$ 134,679.99	4.16	\$ 134,679.99	
2.03	Relleno compacto con material de excavación	m3	105.80	\$ 41.637.50	\$ 4.405.073	95.90	\$ 3,992,884.90	95.90	\$ 3,992,884.90	
Acondicionamiento de superficie para instalación de tubería de PVC incluye cama de arena y atraque lateral con material granular (transporte desde cantera autorizada)										
2.04		ml	8.30	\$ 42,074.29	\$ 349.217	6.00	\$ 252,445.74	6.00	\$ 252,445.74	
2.05	Corte y demolición de placa en concreto	m2	232.99	\$ 33.425.00	\$ 7.787.691	133.64	\$ 4,466,917.00	133.64	\$ 4,466,917.00	
2.06	Entibado metálico	m2	121.60	\$ 47.025.00	\$ 5,718.240	12.00	\$ 564,300.00	12.00	\$ 564,300.00	
					SUBTOTAL		\$ 12,226,442.09		\$ 12,226,442.09	
3.00 TUBERIA										
3.01	Recalce uniones de tubería	und	7	\$ 140,969.60	\$ 986,787	5.00	\$ 704,848.00	5.00	\$ 704,848.00	
3.02	Suministro e instalación de tubería corrugada 12"	ml	11.96	\$ 169,519.81	\$ 2,027.457	9.66	\$ 1,637,561.36	9.66	\$ 1,637,561.36	
					SUBTOTAL		\$ 2,342,409.36		\$ 2,342,409.36	
4.00 CONEXIÓN A CAMARA EXISTENTE										
4.01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada 4 mm	und	1	\$ 161,894.96	\$ 161,895	1.00	\$ 161,894.96	1.00	\$ 161,894.96	
					SUBTOTAL		\$ 161,894.96		\$ 161,894.96	
5.00 REPOSICIÓN DE VIAS										
5.01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	232.99	\$ 181,569.42	\$ 42,303.858	133.64	\$ 24,264,936.62	133.64	\$ 24,264,936.62	
5.02	Sub base granular	m3	46.598	\$ 166,963.33	\$ 7,780,157	26.73	\$ 4,462,595.88	26.73	\$ 4,462,595.88	
5.03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	175.5636	\$ 23,617.50	\$ 4,146,373	80.79	\$ 1,908,057.83	80.79	\$ 1,908,057.83	



5.04	Suministro e instalación de geotextil, para separación de suelo de subrasante y capa granular	m2	228.55	\$	26,355.00	\$	6,023,435	129.2	\$	3,405,066.00	129.20	\$	3,405,066.00
					SUBTOTAL	\$	60,253,824		\$	34,040,656.33		\$	34,040,656.33
6.00	ACERO												
6.01	Acero de refuerzo	Kg	375.48	\$	9,978.50	\$	3,746,678	221.60	\$	2,211,234.46	221.60	\$	2,211,234.46
					SUBTOTAL	\$	3,746,678		\$	2,211,234.46		\$	2,211,234.46
7.00	SUMIDERO												
	Sumidero en concreto 1.20 m x 0.70m x 0.90 m medidas internas: placa inferior, muros y placa superior en concreto de 3000psi de 10 cm de espesor con refuerzo en varilla de 1/2" @ 15 cm en ambos sentidos, rejilla metálica en ángulo metálico 2"x3/16 con marco y contra marco. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	1	\$	1,230,964.93	\$	1,230,965	1.0	\$	1,230,964.93	1.0	\$	1,230,964.93
7.01					SUBTOTAL	\$	1,230,965		\$	1,230,964.93		\$	1,230,964.93
8.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia máxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	41.139	\$	29,056.88	\$	1,195,371	23.26	\$	675,746.69	23.26	\$	675,746.69
8.01					SUBTOTAL	\$	1,195,371		\$	675,746.69		\$	675,746.69

COSTO DIRECTO		\$	97,085,380		\$	54,942,496.68
ADMINISTRACION	\$	0.30	\$	28,767,076	\$	16,279,845.43
UTILIDAD	\$	0.05	\$	4,854,269	\$	813,992.27
TOTAL AU	\$	0.35	\$	33,621,345	\$	19,026,970.27
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU			\$	130,706,724	\$	73,969,466.95
PMA	\$		\$	2,515,000	\$	2,515,000.00
PMT	\$		\$	3,250,000	\$	3,250,000.00

TOTAL COSTO OBRA	\$	136,471,724	\$	79,734,466.95
-------------------------	----	-------------	----	---------------

TOTAL CONTRATO					
OBRA No. 1	\$	249,579,917	\$	306,317,175.05	\$ 306,317,175.05
OBRA No. 2	\$	136,471,724	\$	79,734,466.95	\$ 79,734,466.95
TOTAL		\$ 386,051,642		\$ 386,051,642.00	\$ 386,051,642.00



6. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

6.1. AVANCE FÍSICO

El porcentaje de avance físico general del contrato de obra ejecutado en el periodo 16/12/2025 al 10/03/2026:

AVANCE FÍSICO TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA.	100.0%
---	--------

6.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

El avance financiero correspondiente al periodo comprendido entre 16/12/2025 al 10/03/2026 del contrato de obra:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO No.369-2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:	\$ 386.051.641,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	\$ 193.025.821,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 386.051.641,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA DE OBRA – ACTA PARCIAL No.1	\$ 0,00
PORCENTAJE (%) AVANCE PAGADO	50,00%
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO	100,00%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 386.051.641,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	\$ 193.025.821,00
PORCENTAJE (%) PENDIENTE POR CANCELAR	50,00%

7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- El primer día de iniciación de labores de ejecución de la obra, se solicitó muy comedidamente se nos proporcione todos los documentos presentados por el contratista de obra y su equipo de trabajo para revisar el contrato de obra, pólizas, cronogramas y presupuesto de obra; para poder llevar un control de las actividades realizadas por el contratista y así mismo agilizar la ejecución proyectada del mismo.
- La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo del contrato de obra No. 0469-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO

ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO", sin que se presenten inconvenientes en el transcurso del desarrollo de las actividades contractuales.

- Durante el desarrollo del contrato, como interventoría se veló por la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la adecuada utilización de los recursos, y la coordinación entre los actores responsables, sin que se presentaran inconvenientes que afectaran la normal ejecución del proyecto.

7.1. Seguimiento a la implementación PMA

Como parte del seguimiento a las labores el contratista y supervisadas por la interventoría, a continuación, se presenta el resumen de los temas más relevante en relación con los aspectos del PMA.

Objetivo General.

Presentar las actividades realizadas en cumplimiento al desarrollo del Plan de adaptación de la guía ambiental (PMA), en obediencia a la normatividad ambiental vigente y al requerimiento contractual del contrato de obra 0469-2025.

Programa gestión ambiental medio abiótico

Instalaciones de infraestructura temporal.

Este programa establece las medidas mínimas que el contratista debe implementar para la instalación, operación y desmantelamiento de los campamentos y sitios de acopio temporal (bodegas) requeridos para la ejecución de las obras del proyecto. Asimismo, define los lineamientos ambientales que deberán aplicarse durante todas las fases de funcionamiento de dichas instalaciones.

El contratista implementó el campamento y/o las áreas de acopio temporal destinadas al almacenamiento de materiales de construcción, residuos de excavación, escombros de demolición y zonas para el parqueo de maquinaria, entre otros, garantizando el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para minimizar los impactos sobre el suelo, el aire y la vegetación circundante.

Manejo de excavaciones, rellenos y movimiento de tierras

Se revisa el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental descritas para las actividades de excavación y relleno. Se verifica que:

- El almacenamiento del material de descapote y excavación se realice de forma ordenada dentro del área de obra, evitando la obstrucción de las zonas de trabajo.
- El volumen reportado de material de excavación corresponde al material efectivamente removido y dispuesto según las áreas autorizadas, lo cual fue corroborado mediante inspección visual y revisión de los registros de transporte.
- Las volquetas empleadas para el transporte de material de excavación, relleno o descapote deben mantener el uso obligatorio de lonas o cobertores durante todo el recorrido. Esta medida es fundamental para evitar la dispersión de partículas, la caída de material en la vía y la generación de polvo, contribuyendo así al cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad vial.

Manejo integral de materiales de construcción

Durante la revisión de las actividades correspondientes al manejo integral de materiales de construcción, la interventoría realizó la verificación en campo de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, evidenciando un cumplimiento satisfactorio de las disposiciones aplicables.

- Los materiales fueron almacenados adecuadamente, en zonas ventiladas, secas, aisladas del suelo y protegidas de la lluvia.
- El cemento se mantuvo en lugares secos y libres de humedad.
- El personal de obra hizo uso de los elementos de protección personal (EPP) requeridos para la manipulación y transporte de materiales, garantizando condiciones seguras de trabajo.
- No se realizaron mezclas directamente sobre el suelo y se evitó el lavado de mezcladoras en frentes de obra o cuerpos de agua, previniendo afectaciones ambientales.

7.2. Seguimiento a la implementación Plan de Manejo de Tránsito

Como parte del seguimiento a las labores el contratista y supervisadas por la interventoría, a continuación, se presenta el resumen de los temas más relevante en relación con los aspectos del Plan de Manejo de tránsito.

El contratista implementó las medidas de señalización, control y orientación del tránsito vehicular y peatonal, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, los trabajadores y la comunidad aledaña. Las acciones ejecutadas se desarrollaron conforme a lo establecido en el PMT aprobado.

- Se instalaron señales preventivas, reglamentarias e informativas en puntos estratégicos de ingreso, tránsito y salida de los vehículos relacionados con la obra.
- Se mantuvo comunicación constante con la comunidad y las autoridades de tránsito para mitigar molestias o riesgos durante la ejecución de los trabajos.



CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT. 901379301-8

- Las maniobras de transporte de materiales se realizaron en horarios establecidos para reducir congestión y minimizar el impacto sobre la movilidad local.
- No se reportaron incidentes viales durante el periodo evaluado.

8. REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES Y CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

8.1. Actas de avance generadas (16/12/2025 – 10/03/2026)

NO. DE ACTA	FECHA DEL ACTA	ACTA
N.A	N.A	N.A

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La interventoría presenta el informe final correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el 10 de marzo de 2026, con base en las actividades verificadas y documentadas durante dicho intervalo.
2. La obra se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas contractuales, alcanzando un avance físico acumulado del 100.0% entre el 16 de diciembre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, según lo constatado en las visitas de verificación realizadas en campo por la interventoría.
3. El contratista de obra cumplió con la implementación de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, conforme a los lineamientos ambientales del proyecto.
4. Durante el desarrollo de la obra, el contratista mantuvo el cumplimiento satisfactorio de las medidas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, asegurando la entrega de elementos de protección personal, la instalación de señalización preventiva y la ejecución de prácticas seguras en el frente de obra.
5. El contratista de obra cumplió con los requisitos contractuales, manteniendo debidamente actualizadas las pólizas exigidas para la vigencia del contrato.
6. Se recomienda a la secretaría de infraestructura hacer entrega del sistema de alcantarillado a la empresa prestadora de servicios públicos para ser incluido en el plan de mantenimientos de la misma.

Cordialmente,


JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL

C.C. No 1.123.209.227 de Puerto Asís (Putumayo)
Repr. Legal: CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT: 901379301-8
Correo: carlotsaszomac@gmail.com

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PREMILIMARES

Localización y replanteo



MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES



Excavación mecánica

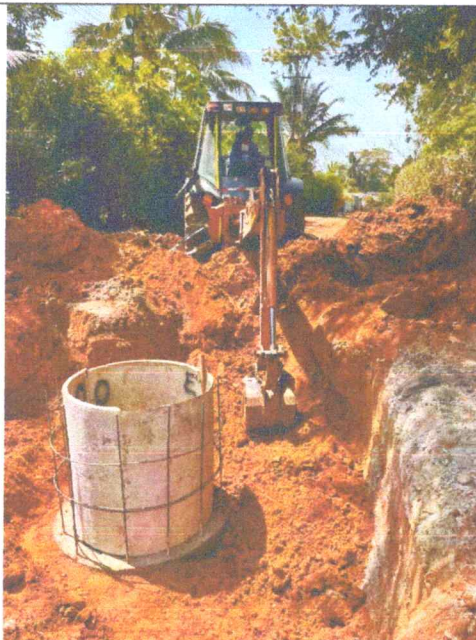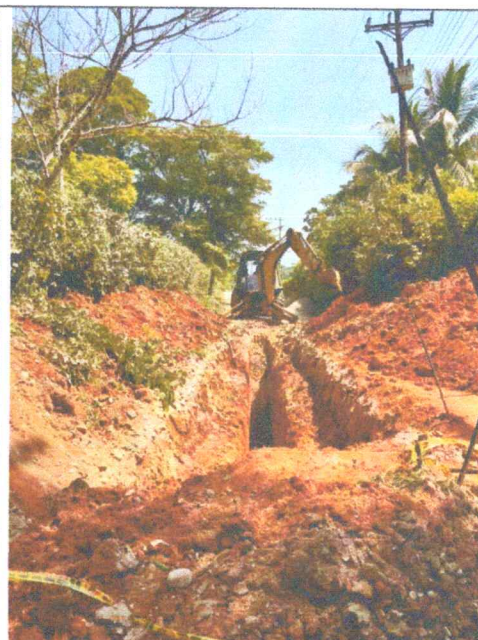



MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Entibados

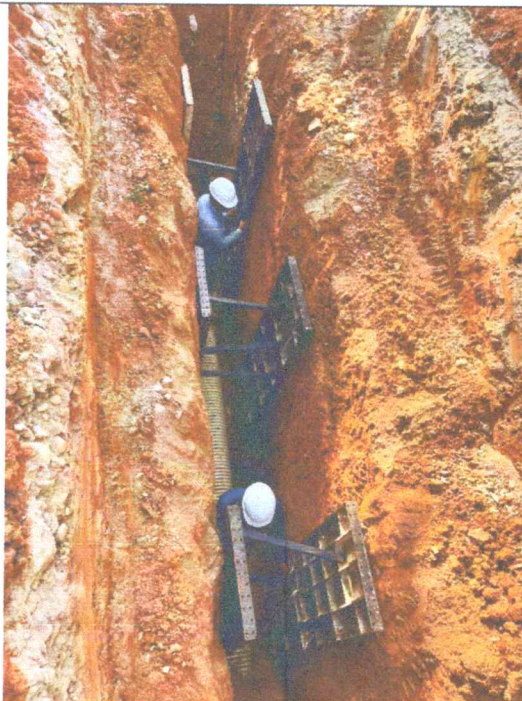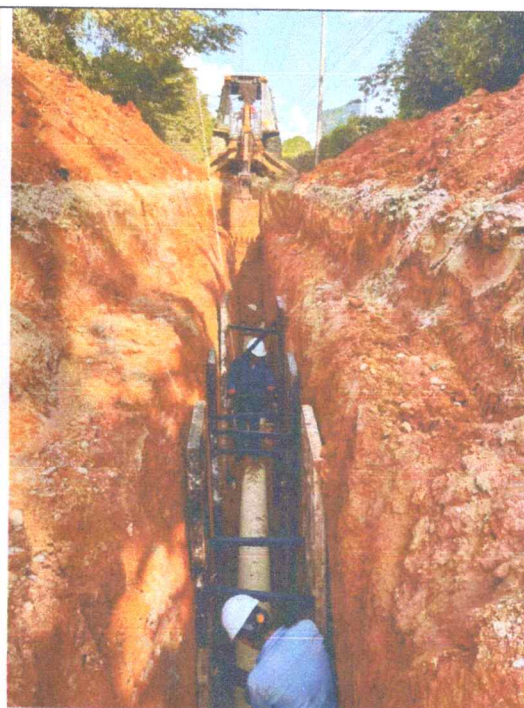

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Rellenos con compactación manual



MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES


Corte y demolición de placas de concreto





INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO

Suministro e instalación de tubería sanitaria corrugada PVC – 12"

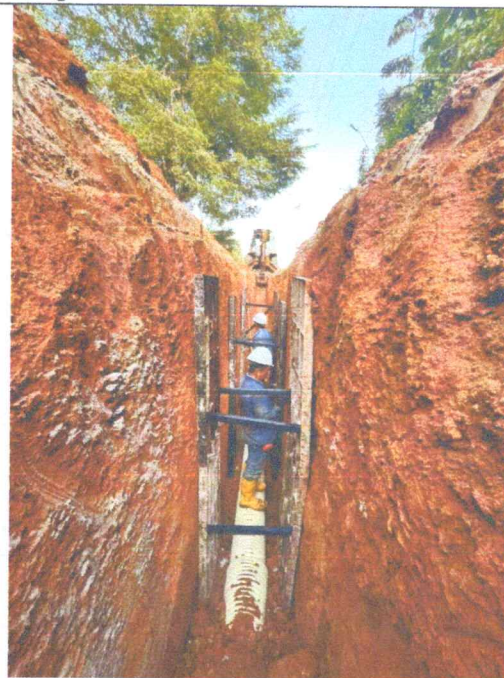



INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO

Camara de inspección alcantarillado sanitario





REPOSICION DE VIAS

Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI




REPOSICION DE VIAS

Sub base granular



SUMIDERO

Sumidero en concreto

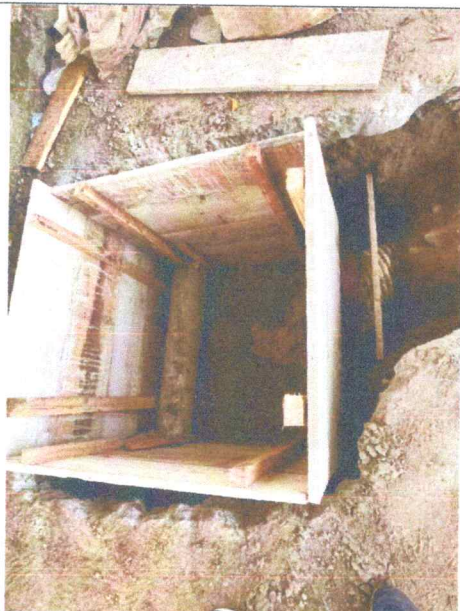



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 0469-2025

CONTRATO No.	0469-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.200.461-3
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$386.051.641) M/CTE.
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC 901.617.088-5 R/L: KATHERINE ESTRADA CORTEZ CC. 1.006.847.128
INTERVENTOR:	CARLOT S.A.S ZOMAC NIT: 901379301-8 Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
PLAZO:	Un (01) mes
FECHA DE INICIO	15 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 01:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO 01:	11 de febrero de 2026
PRORROGA 01:	Un (01) mes
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	13 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 02:	10 de marzo de 2026

En Puerto asís Putumayo, a los diez (10) días del mes de marzo de 2026 se reunieron los suscritos a saber, el arquitecto JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO, secretario de infraestructura municipal en calidad de supervisor del contrato de obra No. 469-2025, KATHERINE ESTRADA CORTEZ representante legal de GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC, entidad contratista y JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL representante legal de CARLOT S.A.S ZOMAC entidad en calidad de interventor, con el fin de celebrar la presente acta de recibo final de obra correspondiente al contrato No. 469-2025 derivado del proceso SAMC-046-2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO." Toda vez que se verifico la terminación de obra cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

El objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de obra No. 469-2025, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 hasta el 10 de marzo de 2026.

CONSIDERACIONES

- Que, el 20 de noviembre del 2025 se suscribió el contrato de obra No. 469-2025, entre el municipio de Puerto Asís y GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC con NIT: 1.006.847.128, el cual tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO".
- Que una vez perfeccionado el contrato se suscribió el acta de inicio de obra el día 16 de diciembre de 2025.
- Que la fecha de finalización del contrato se estipulo inicialmente para el 31 de diciembre de 2025.
- Que el día 30 de diciembre se realizó la suscripción de la suspensión No. 01.
- Que, el día 11 de febrero se reinicia el contrato de obra y de igual manera se otorga prorroga de tiempo por UN (01) mes, quedando como nueva fecha de terminación el día 10 de marzo de 2026.
- Que, una vez constatado en sitio, realizada la verificación de datos de obra, cantidades ejecutadas, flujo de caja y las actividades planteadas en el presupuesto y el acta de modificación por balance de menores y mayores cantidades, se puede dar por terminada la ejecución del proyecto.



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

- Que el balance general o relación financiera del contrato es el siguiente:

RESUMEN	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 386.051.641,00
Valores adicionales	\$ 0,00
Valor anticipo	\$ 193.025.821,00
Valor total del contrato	\$ 386.051.641,00
Valor pagado actas parciales	\$ 0,00
Valor a pagar acta final	193.025.821,00
Valor total ejecutado	\$ 386.051.641,00
Saldo a favor del municipio	\$ 0,00
Porcentaje de ejecución financiera total	100%
Porcentaje de ejecución físico	100%

DESARROLLO: En este documento se plasman las actividades y cantidades a recibir, previamente revisadas tanto física como financieramente, establecidas, mediante el siguiente cuadro:



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS			EJECUTADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	(+ / -)	CANT	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1,00 PRELIMINARES											
1,01	LOCALIZACIÓN Y RELEVANTEO	ML	196,00	\$ 2.910,40	\$ 570.438	+	36,80	232,8	\$ 677.541,12	232,8	\$ 677.541,12
1,02	CERRAMIENTO CON LONA H= 2 M	ML	16,00	\$ 15.660,00	\$ 250.560	-	-	16,0	\$ 250.560,00	16,0	\$ 250.560,00
				SUBTOTAL	\$ 820.998				\$ 928.101,12		\$ 928.101,12
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES											
2,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	502,17	\$ 27.569,00	\$ 13.844.162	(+)	204,11	706,28	\$ 19.471.433,32	706,28	\$ 19.471.433,32
2,02	ENTIBADO	M2	55,00	\$ 40.003,84	\$ 2.200.211	-	-	55,00	\$ 2.200.211,31	55,00	\$ 2.200.211,31
2,03	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA CRUDO DE RIO	M3	25,70	\$ 122.136,41	\$ 3.138.662	(+)	76,65	102,35	\$ 12.500.661,95	102,35	\$ 12.500.661,95
2,04	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	216,35	\$ 18.905,00	\$ 4.090.097	(+)	-	216,35	\$ 4.090.096,75	216,35	\$ 4.090.096,75
2,05	RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO	M3	108,00	\$ 64.055,00	\$ 6.917.940	-	-	108,00	\$ 6.917.940,00	108,00	\$ 6.917.940,00
2,06	ENCAMADO DE TUBERÍA CON ARENA DE RIO	M3	48,00	\$ 81.582,00	\$ 3.915.936	(+)	1,20	49,20	\$ 4.013.834,40	49,20	\$ 4.013.834,40
2,07	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO H= 0,18 M	M2	17,02	\$ 33.425,00	\$ 569.027	-	-	17,02	\$ 568.893,50	17,02	\$ 568.893,50
				SUBTOTAL	\$ 34.676.065				\$ 49.763.071,23		\$ 49.763.071,23
3,00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
ALCANTARILLADO SANITARIO											
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA P.C Ø= 315 MM.- 12'	ML	232,83	\$ 194.614,81	\$ 45.312.166	(+)	11,97	244,8	\$ 47.641.705,49	244,8	\$ 47.641.705,49
3,02	CÁMARA DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANTIARIO EN CONCRETO DE 3000 PSI D= 1,2 M H= 4,00 M. INCLUYE LACA DE PISO EN CONCRETO CON CÁULAS ESMALTADAS, ARO Y CONTRA ARO METÁLICO CON REFUERZO EN TAPA	UND	6,00	\$ 4.003.616,86	\$ 24.021.701	(-)	-	5,0	\$ 20.018.084,32	5,0	\$ 20.018.084,32
3,03	CONEXIÓN CÁMARA EXISTENTE INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM.	UND	2,00	\$ 163.880,68	\$ 327.781	-	-	2,0	\$ 327.781,35	2,0	\$ 327.781,35
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 2"x1/8" Y CELOSÍA EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" (INCLUYE ANTI CORROSIÓN PINTURA Y ANCLAJE)	ML	90,00	\$ 817.125,00	\$ 73.541.250	(-)	-	0,0	\$ -	0,0	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 143.202.899				\$ 67.987.571,16		\$ 67.987.571,16
4,00 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
4,01	REFORMA DE PAVIMENTO (RIGIDO CON CRETO) H= 0,18 M R= 4000 PSI	M2	17,02	\$ 181.569,41	\$ 3.091.038	-	0,00	17,0	\$ 3.090.311,39	17,0	\$ 3.090.311,39
				SUBTOTAL	\$ 3.091.038				\$ 3.090.311,39		\$ 3.090.311,39
5,00 ÍTEM NO PREMIADOS											
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA 40x40 cm EN ÁNGULO DE 1 1/2"x1/8" Y CELOSÍA EN ÁNGULO DE 1"x1/8" (INCLUYE ANTI CORROSIÓN PINTURA Y ANCLAJE)	M2	0,00	\$ 787.654,00	\$ -	+	87,00	87,0	\$ 68.525.898,00	87,0	\$ 68.525.898,00
5,02	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,00	\$ 60.235,00	\$ -	+	562,52	562,5	\$ 33.883.369,43	562,5	\$ 33.883.369,43
				SUBTOTAL	\$ -				\$ 102.409.297,43		\$ 102.409.297,43
TOTAL COSTO DIRECTO											
				\$ 181.791.000					\$ 224.178.352,34		\$ 224.178.352,34
ADMINISTRACIÓN (25%)											
				\$ 52.454.367					\$ 64.694.905,10		\$ 64.694.905,10
UTILIDAD (5%)											
				\$ 9.089.550					\$ 11.208.917,62		\$ 11.208.917,62
				\$ 6.245.000					\$ 6.245.000,00		\$ 6.245.000,00
				TOTAL OBRA:	\$ 249.579.917				\$ 306.317.175,05		\$ 306.317.175,05



MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.L. UNITARIO		V.L. TOTAL	MODIFICACION 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO FINAL	
							(+ / -)	CANT	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.00 PRELIMINARES												
1.01	Localización y replanteo	m	33,79	\$	3.136,53	\$	105.983	-		33,79	\$	105.983,46
1.02	Cierre en lona verde h= 2m	m	124,34	\$	15.660,00	\$	1.947.164	-		124,34	\$	1.947.164,40
					SUBTOTAL	\$	2.063.148				\$	2.063.147,86
2.00 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES												
2.01	Excavación mecánica en material común	m3	160,72	\$	26.171,00	\$	4.206.075	(-)		107,57	\$	2.815.214,47
2.02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	91,52	\$	32.375,00	\$	2.962.960	(-)		4,16	\$	134.679,99
2.03	Relleno compacto con material de excavación	m3	105,80	\$	41.637,50	\$	4.405.073	(-)		95,90	\$	3.992.894,90
2.04	Acordionamiento de superficie para instalación de tubería	m	8,30	\$	42.074,29	\$	349.217	(-)		2,30	\$	252.445,74
2.05	Corte y demolición de placa en concreto	m2	232,99	\$	33.425,00	\$	7.787.691	(-)		99,35	\$	4.466.917,00
2.06	Entibado metálico	m2	121,60	\$	47.025,00	\$	5.718.240	(-)		12,00	\$	564.300,00
					SUBTOTAL	\$	26.429.266				\$	12.226.442,09
3.00 TUBERIA												
3.01	Recalce uniones de tubería	und	7	\$	140.969,60	\$	986.787	(-)		5,00	\$	704.848,00
3.02	Suministro e instalación de tubería conugada 12"	m	11,96	\$	169.519,81	\$	2.027.457	(-)		9,66	\$	1.637.561,36
					SUBTOTAL	\$	3.014.244				\$	2.342.409,36
4.00 CONEXIÓN A CAMARA EXISTENTE												
4.01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada	und	1	\$	161.894,96	\$	161.895	-		1,00	\$	161.894,96
					SUBTOTAL	\$	161.896				\$	161.894,96
5.00 REPOSICIÓN DE VÍAS												
5.01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e= 16)	m2	232,99	\$	181.569,42	\$	42.303.858	(-)		133,64	\$	24.264.936,62
5.02	Sub base granular	m3	46,598	\$	166.963,33	\$	7.780.157	(-)		26,73	\$	4.462.596,88
5.03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	m	175.5636	\$	23.617,50	\$	4.146.373	(-)		80,79	\$	1.908.057,83
5.04	Suministro e instalación de geotextil, para separación de sl	m2	228,55	\$	26.355,00	\$	6.023.435	(-)		99,35	\$	3.405.066,00
					SUBTOTAL	\$	60.263.824				\$	34.040.656,33
6.00 ACERO												
6.01	Acero de refuerzo	kg	375,48	\$	9.978,50	\$	3.746.678	(-)		221,60	\$	2.211.234,46
					SUBTOTAL	\$	3.746.678				\$	2.211.234,46
7.00 SUMIDERO												
7.01	Sumidero en concreto 1,20 m x 0,70 m x 0,90 m medidas	und	1	\$	1.230.964,93	\$	1.230.965	-		1,0	\$	1.230.964,93
					SUBTOTAL	\$	1.230.965				\$	1.230.964,93
8.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS												
8.01	Carga, retiro y transporte de material sobrante(m3/km). e	m3	41,139	\$	29.056,88	\$	1.195.371	(-)		23,26	\$	675.746,69
					SUBTOTAL	\$	1.195.371				\$	675.746,69
COSTO DIRECTO												
ADMINISTRACION				\$	0,30	\$	97.086,380				\$	64.942.496,68
UTILIDAD				\$	0,05	\$	28.767.076				\$	16.279.845,43
TOTAL AU				\$	0,35	\$	4.854.269				\$	2.747.124,93
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+ AU						\$	33.621.346				\$	19.026.970,27
RMA						\$	130.706.724				\$	73.969.466,95
RMT						\$	2.515.000				\$	2.515.000,00
						\$	3.250.000				\$	3.250.000,00
					TOTAL COSTO OBRA	\$	136.471.724				\$	79.734.466,95
TOTAL CONTRATO												
OBRA No. 1						\$	249.579.917				\$	306.317.175,05
OBRA No. 2						\$	136.471.724				\$	79.734.466,95
					TOTAL	\$	386.051.642				\$	386.051.642,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 386.051.642
VALOR SEGUN MODIFICACION 01	\$ 386.051.642
VALOR EJECUTADO	\$ 386.051.642
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%



ALCALDÍA DE **PUERTO ASÍS**

Con la información suministrada en las consideraciones y constatado con las respectivas actas numéricas y el control de actividades en sitio, se establece que el contrato de obra No. 469-2025 con el objeto: "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.", esta ejecutado en un 100% tanto física como financieramente.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato de obra 469-2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" teniendo en cuenta que al día de la firma de la presente acta ya se encuentra ejecutadas todas las actividades de los ítems contratados.

El valor final a pagar estará supeditado a la entrega del informe final y sus respectivos soportes en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de conformidad a lo establecido en el proceso de contratación en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales de acuerdo a la minuta contractual y sus respectivas modificaciones.

El contratista deberá estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social, actualizar el amparo de estabilidad de obra y estar al día en el pago del FIC.



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

Katherine Estrada

KATHERINE ESTRADA CORTEZ

R/L GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC
Contratista de obra

Jazmin Rocio Romo Bernal

JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL

R/L CARLOT S.A.S ZOMAC
Contratista de interventoría

Jorge Eduardo Gaitan Escudero

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de infraestructura municipal
Supervisor del contrato

Proyecto: Christian Leonardo Charria

Apoyo profesional secretaria de infraestructura

Christian Leonardo Charria



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 0469-2025

Página 1 de 5

CONTRATO	0469-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-046-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CONTRATISTA DE OBRA	GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC 901.617.088-5 R/L: KATHERINE ESTRADA CORTEZ CC. 1.006.847.128
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CARLOT S.A.S ZOMAC NIT: 901379301-8 Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
SUPERVISIÓN	JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$386.051.641) M/CTE.
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	11 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA	27 DE ENERO DE 2026
ANEXO PRORROGA	UN (01) MES
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN No. 02	10 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	10 DE MARZO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	10 DE JULIO DE 2026

En Puerto Asís Putumayo a los diez (10) días del mes de julio de 2026, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo, Arq. **JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO** secretario infraestructura Municipal en calidad de supervisor, **KATHERINE ESTRADA CORTEZ** con cédula de ciudadanía Nro. 1.006.847.128, obrando como Representante Legal de la GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC identificada con Nit. 901.617.088-5, en condición de contratista y **JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL** representante legal de CARLOT S.A.S ZOMAC en condición de interventor, con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE OBRA No. 469-2025.



ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 0469-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato	\$ 386.051.641	Adiciones en valor	\$ 0.00
Valor total del contrato	\$ 386.051.641		
PLAZOS DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	Un (01) mes	Plazo final de ejecución	Dos (02) meses
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2025	Fecha Terminación	10 de marzo de 2026

ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS CONFORME AL ACTA DE RECIBO FINAL					
COMPañÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	CCS-100045747	\$ 38.605.164,10	10/03/2026	10/09/2026
	Buen manejo del anticipo		\$ 193.025.820,50	10/03/2026	10/09/2026
	Prestaciones sociales		\$ 19.302.582,05	10/03/2026	10/03/2029
	Estabilidad de la obra		\$ 77.210.328,20	10/03/2026	10/03/2031

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	2025000843 del 10-10-2025	\$267.397.192,00	Inicial	No. 2025001417 del 15-12-2025	\$386.051.641,00
	2025000861 del 10-17-2026	\$145.951.859,00			
Reserva	2025801417 del 01-01-2026	\$193.025.820,50	Reserva	No. 2025801417	\$193.025.820,50

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS					
ACTA No	Fecha del acta	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado (Marque con una x)	
				SI	NO
N/A					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No	Documento que lo certifica			Si	No
2	Acta de recibo final de fecha 10 de marzo de 2026, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.			X	
3	Factura de venta No FE 43 del 02 de julio de 2026			X	
4	Informe de supervisión de fecha 10 de junio de 2026			X	
Supervisor		JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO			
Dependencia		Secretaria de Infraestructura			



ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

- Que, entre la Alcaldía Municipal de Puerto Asís y GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC, identificada con NIT 901.617.088-5, celebró el Contrato de obra No. 469-2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 10, BARRIOS LAS COLINAS Y LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" Y "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO 1 CALLE 13 CON CARRERA 20 MEDIANTE ADECUACION DE SUMIDERO Y TRAMO 2 CALLE 10 CON CARRERA 33 MEDIANTE RECALCE DE TUBERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.", por un valor inicial de \$386.051.641,00 M/CTE.
- Que en fecha 16 de diciembre de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato de la referencia.
- Que el plazo de ejecución pactado para el Contrato de obra No. 469-2025, es de un (01) mes.
- Que a los treinta (30) días del mes de diciembre el contrato fue suspendido.
- Que a los once (11) días del mes de febrero el contrato fue reiniciado y se modificó el plazo de ejecución adicionándole un mes mas de ejecución, quedando como fecha final de entrega el diez (10) de marzo.
- Que para efectos de liquidación del contrato la secretaria de infraestructura radica de fecha 28 de julio de 2026, los siguientes documentos:
 - a) Acta de cumplimiento de fecha 10 de marzo de 2026, en la cual deja constancia que "(...) se dio cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final que hace parte integral del acta, correspondiente a la ejecución del contrato".
 - b) Informe de supervisión de fecha 10 de junio de 2026, en la cual registra el seguimiento realizado al contrato.
 - c) Informe de ejecución de actividades con fecha de radicación 9 de junio de 2026, en la cual el contratista hace entrega a la secretaria de infraestructura los soportes sobre el desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.
 - d) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado
 - e) Factura FE 43 del 02 de julio de 2026, presentada por la contratista.
- Que teniendo en cuenta que el interventor y supervisor reciben a entera satisfacción el contrato de obra No. 469-2025, se procede a la liquidación del contrato.



SALVEDADES

Ninguna.

El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, artículo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, artículo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de obra No. 469- 2025, suscrito entre el Municipio de Puerto Asís y GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC identificada con Nit. 901.617.088-5 representada legalmente por KATHERINE ESTRADA CORTEZ con cédula de ciudadanía Nro. 1.006.847.128, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
valor inicial del contrato	\$386.051.641,00
v/r adicional	\$0.00
V/r total del contrato	\$386.051.641,00
V/r Anticipo	\$193.025.820,50
Valor pagado actas parciales	\$0.00
V/r total ejecutado acta final	\$386.051.641,00
Porcentaje financiero ejecutado acta final	100%
Porcentaje físico ejecutado acta final	100%
Valor a amortizar anticipo	\$193.025.820,50
V/r total pago final	\$193.025.820,50
saldo a favor del municipio	\$0.00

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista un último pago por valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$193.025.820,50)




MDA/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.


ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No 469, según informes y acta de recibo final que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.


En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.


Se expide a los, veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.


JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL
PUERTO ASÍS - PUTUMAYO


KATHERINE ESTRADA CORTEZ
R/L GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC
CONTRATISTA


JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato


JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
R/L CARLOT S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDO		CARGO	Firma
Elaboró	Ing. Christian Leonardo Charria	Profesional de apoyo Sec Infraestructura	
Revisó	Juliana Marcela Trejos	Jefe Oficina Jurídica y de Contratación	



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

B&R 343-26

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que el establecimiento **GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC**
NIT: **901.617.088-5** Representación Legal de la señora **KATHERINE**
ESTRADA CORTES identificado (a) con **C.C. No. 1.006.847.128**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de **INDUSTRIA Y**
COMERCIO del periodo gravable Año **2025**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades
de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), al
segundo (02) día del mes de septiembre 2026.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 30
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyectó: Aleigny Carolina Herrera Castillo Apoyo de Oficina de Bienes y Rentas <i>Carolina H.</i>	Revisó: Víctor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas <i>[Firma]</i>	Revisó: Jackeline Alvarez Apoyo de la gestión <i>[Firma]</i>	Aprobó: José Fabian Flórez Hoyos Secretario De Hacienda <i>[Firma]</i>
--	--	--	--

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas.
