

Medellín, 01 de septiembre de 2026

1300 2661

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Radicado: R 2026010591353
Fecha: 02/09/2026 11:31:24.0
Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 – “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

Asunto: Entrega de informes mensuales técnicos de Interventoría del Lote 2 – Subregión Occidente correspondientes al mes de enero a junio de 2026 – Contrato No. 20260072

Cordial Saludo,

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la secretaria de Infraestructura física y RENTAN y en el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

Tomo 1

- Oficio Remisorio (1 folio – folio 1)
- Informe mensual Técnico No. 01 de Interventoría del mes de enero 2026, periodo 01 al 31 de enero (17 folios – del folio 2 al 18).
- Informe mensual Técnico No. 02 de Interventoría del mes de febrero 2026, periodo 01 al 28 de febrero (21 folios – del folio 19 al 39).
- Informe mensual Técnico No. 03 de Interventoría del mes de marzo 2026, periodo 01 al 31 de marzo (27 folios – del folio 40 al 66).
- Informe mensual Técnico No. 04 de Interventoría del mes de abril 2026, periodo 01 al 30 de abril (31 folios – del folio 67 al 97).
- Informe mensual Técnico No. 05 de Interventoría del mes de mayo 2026, periodo 01 al 31 de mayo (59 folios – del folio 98 al 156).

ARCHIVO SIF
2026 SEP 7 9:16:56

- Informe mensual Técnico No. 06 de Interventoría del mes de junio 2026, periodo 01 al 30 de junio (44 folios – del folio 157 al 200).

Tomo 2

- Informe mensual Técnico No. 06 de Interventoría del mes de junio 2026, periodo 01 al 30 de junio (18 folios – del folio 201 al 218).

Total, de folios 218


En medio digital, cinco (6) USB anexa con la siguiente Información:

- ANEXOS TÉCNICOS
 - ✓ Anexo 1. Anexos Técnicos enero
 - ✓ Anexo 2. Anexos Técnicos febrero
 - ✓ Anexo 3. Anexos Técnicos marzo
 - ✓ Anexo 4. Anexos Técnicos abril
 - ✓ Anexo 5. Anexos Técnicos mayo
 - ✓ Anexo 6. Anexos Técnicos junio

La documentación remitida corresponde a los informes mensuales técnicos de interventoría del Lote 2 – Occidente – contrato No. 20260072 de los meses de enero a junio del 2026 y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atento a cualquier inquietud.


Cordialmente,



CATALINA CASTRILLÓN TORRES

Subgerente de Ejecución

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	DAVID FERNANDO VILLOTA ROJAS Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		01/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			


CONSORCIO TEMPORALES

CONTRATO No 20260072
OBJETO CONTRATO DE OBRA

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA
SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2) A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

MARZO 2026

**INFORME MENSUAL TÉCNICO No 3
LOTE 2 - OCCIDENTE**

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 2 de 26

INFORME TÉCNICO MENSUAL N°3

(Versión 01- Periodo 01 al 31 de marzo de 2026)

RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN S.A.S.

Entidad Contratante

CONSORCIO EL PROGRESO

Contratista de Obra

**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)**

Objeto Contrato de Obra

N.º de Contrato de Obra 2500111B2821 de 2025.

CONSORCIO TEMPORALES



Contratista de Interventoría

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA
SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2 OCCIDENTE) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

Objeto Contrato de Interventoría

N.º de Contrato de Interventoría 20260072

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 3 de 26

Firma:  Juan Tobón R.L Consorcio Temporales	Firma:  Catalina Castrillón Supervisor Rentan
Elaboró	Recibe

CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	4
2.	DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO	4
2.1	LOCALIZACION	5
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL.....	6
3.2	INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.....	6
4.	SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA	7
4.1	SEGUIMIENTO TÉCNICO	7
4.1.1	RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO.....	7
4.1.2	DESCRIPCION Y CANTIDADES EJECUTADAS (CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS)	9
4.2	ACTAS DE PAGO	16
4.3	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	16
4.3.1.	INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL	16
4.3.1.1	PERSONAL ACTIVO	16
4.3.1.2.	PERSONAL RETIRADO	20
5.	GARANTÍAS	25
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
7.	ANEXOS	26

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 4 de 26

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato de obra denominado “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – LOTE 2 OCCIDENTE”, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026.

La interventoría se desarrolla en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600018656 celebrado entre la Gobernación de Antioquia y RENTAN - IECE, e incluye el control y seguimiento de los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y legal, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.

Durante el periodo evaluado, se evidenció la ejecución de actividades constructivas en los frentes de Sopetrán y Frontino, correspondientes principalmente a la limpieza de obras transversales, así como a la conformación y ampliación de la vía. De manera complementaria, se dio inicio a actividades de exploración mediante la ejecución de apiques en los corredores Miserenga – Ebéjico y Ebéjico – Heliconia, orientadas a la caracterización de la estructura existente y al soporte técnico para el diseño y control de las intervenciones.

El presente documento consolida los avances, hallazgos y observaciones identificadas por la interventoría, así como las recomendaciones técnicas orientadas a garantizar la adecuada ejecución del proyecto, en concordancia con las especificaciones técnicas aplicables y las condiciones contractuales.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la ejecución de “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, cuyo propósito es optimizar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente en la red secundaria y terciaria del departamento.

De acuerdo con los estudios y documentos previos, el alcance del proyecto comprende la ejecución de actividades orientadas al mantenimiento y mejoramiento de corredores viales, mediante intervenciones que incluyen:

- Estabilización de la estructura vial mediante el uso de materiales tratados con cemento y/o cal
- Mejoramiento de la superficie de rodadura

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 5 de 26

- Construcción y mantenimiento de obras de drenaje y subdrenaje
- Construcción de obras complementarias como disipadores
- Implementación de señalización vial
- Caracterización y levantamiento de información de la red vial

El proyecto busca mejorar la intercomunicación terrestre de las subregiones intervenidas, incrementando los niveles de servicio, seguridad y comodidad de los usuarios, especialmente en corredores de bajo volumen de tránsito (LVR), mediante soluciones técnicas que garanticen mayor durabilidad frente a las condiciones actuales de operación.

Así mismo, se establece como estrategia técnica la sustitución de intervenciones tradicionales basadas en recarga de material granular, por procesos de estabilización de los materiales existentes en los primeros niveles de la estructura vial, permitiendo optimizar el uso de recursos y mejorar el desempeño estructural de la vía.

En este sentido, las intervenciones deben ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo los lineamientos establecidos en las especificaciones particulares SIF001, SIF002 y la normativa INVIAS vigente.

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se desarrolla en la subregión de Occidente del departamento de Antioquia, en corredores viales pertenecientes a la red secundaria y terciaria a cargo del Departamento.

Los tramos objeto de intervención corresponden a corredores rurales estratégicos que permiten la conectividad entre cabeceras municipales, corregimientos y veredas, facilitando el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios esenciales.

Dentro del Lote 2 – Occidente, se incluyen los siguientes corredores viales objeto de intervención:

- Frontino – Nutibara
- Sopetrán – Horizontes – Belmira
- Titiribí – Armenia
- Ebéjico – Heliconia – Medellín

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 6 de 26

- Miserenga – Ebéjico

Estos corredores presentan condiciones geométricas y estructurales propias de vías de bajo volumen de tránsito, caracterizadas por:

- Secciones reducidas
- Pendientes variables
- Estructuras granulares no pavimentadas
- Alta vulnerabilidad a condiciones hidráulicas

Adicionalmente, los corredores cumplen una función estratégica en la movilidad rural, soportando tránsito asociado a actividades productivas como ganadería, minería, producción de panela y transporte de leche, así como movilidad cotidiana de comunidades rurales hacia centros educativos y servicios básicos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL

3.2 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: 2500111B2821 de 2025

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL PROGRESO

NIT: 902.017.242-2

PLAZO DEL CONTRATO: DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

TOTAL, PLAZO 18 meses

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE AGOSTO 2027

VALOR INICIAL: \$ 104.855.613.958

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 7 de 26

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 104.855.613.958

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA
4.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO
4.1.1 RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, el contrato de obra se encuentra en fase activa de ejecución, dando continuidad a las actividades iniciadas a partir del 10 de febrero de 2026.

En este contexto, durante el periodo evaluado se evidencia el desarrollo de actividades constructivas en los frentes de Sopetrán y Frontino, orientadas al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de los corredores intervenidos. Específicamente, se ejecutan actividades de limpieza de obras transversales, con el propósito de restablecer su capacidad hidráulica y garantizar el adecuado drenaje de la vía, así como actividades de conformación y ampliación de la calzada iniciadas el 10 de marzo en ambos corredores.

De manera complementaria, se da inicio a actividades de exploración geotécnica mediante la ejecución de apiques en los corredores Miserenga – Ebéjico y Ebéjico – Heliconia, con el objetivo de avanzar en la caracterización de la estructura existente y generar insumos técnicos para la definición y control de las intervenciones proyectadas.

Paralelamente, la interventoría continúa con el desarrollo de actividades de seguimiento y control mediante recorridos técnicos en los diferentes frentes de obra, en acompañamiento al contratista, así como con la verificación de las condiciones de intervención y el control de las actividades ejecutadas. De igual forma, se da continuidad a la ejecución de apiques de contramuestreo en los corredores de Sopetrán y Frontino, con el fin de verificar las condiciones reales de la subrasante y contrastar la información suministrada por el contratista, fortaleciendo el control de calidad y la trazabilidad de los resultados geotécnicos obtenidos, en concordancia con las obligaciones de control técnico propias de la interventoría.

Actividades de obra realizadas por el contratista en el periodo

Con el fin de establecer un método de cálculo del porcentaje de ejecución del periodo informado, se adopta como criterio el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución efectiva de actividades de obra durante el periodo, relacionando el valor correspondiente a dicha ejecución frente al valor total del contrato.

Para el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, se evidencia la ejecución de actividades constructivas en los frentes de Sopetrán y Frontino, principalmente asociadas a la limpieza de obras transversales, así como a

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 8 de 26

la conformación y ampliación de la vía, orientadas al mejoramiento de las condiciones de drenaje y transitabilidad de los corredores intervenidos.

De manera complementaria, se dio inicio a actividades de exploración mediante la ejecución de apiques en los corredores Miserenga – Ebéjico y Ebéjico – Heliconia, las cuales constituyen insumo técnico para la caracterización de la estructura existente.

No obstante, a la fecha del presente informe no se cuenta con corte de obra aprobado ni con programación de obra debidamente aprobada, por lo que no es posible determinar de manera formal el porcentaje de avance físico ni realizar una correlación entre ejecución y programación. En consecuencia, el seguimiento del periodo se realiza con base en la verificación en campo de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

AVANCE FINANCIERO.

Ejecutado a la Fecha \$0

Programado a la Fecha \$0

Cumplimiento Avancé del \$0

AVANCE FÍSICO.

Ejecutado a la Fecha 0%

Programado a la Fecha 0%

Cumplimiento Avancé del 0%

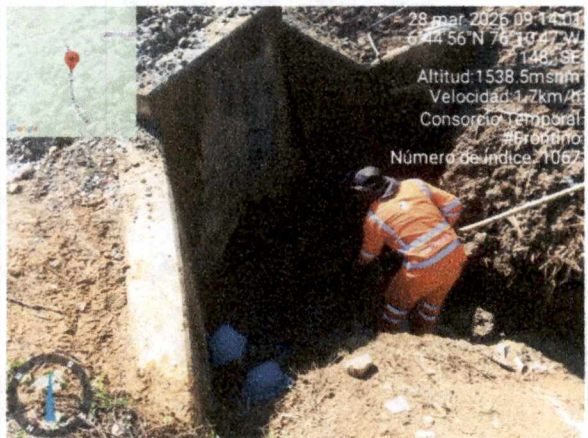
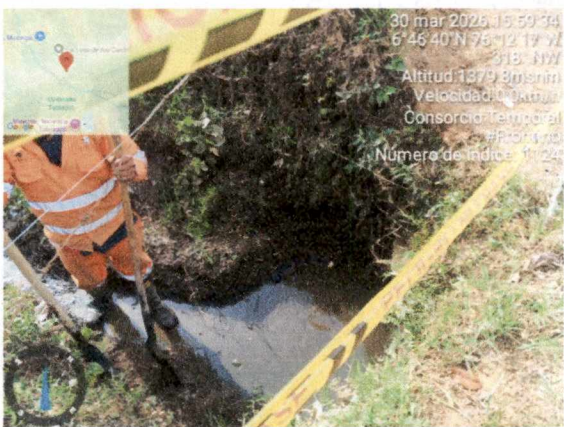
A continuación, se presenta un cuadro resumen donde se establecen las actividades de obra desarrolladas en el periodo y los ítems efectivamente ejecutados.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 9 de 26

4.1.2 DESCRIPCION Y CANTIDADES EJECUTADAS (CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Frontino - Nutibara			
8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	676,25
Sopetran - Horizontes - Belmira			
8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.834,09

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE FRONTINO NUTIBARA	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE FRONTINO NUTIBARA

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 10 de 26

	
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTESOPETRAÑ - BELMIRA	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTESOPETRAÑ - BELMIRA

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, se da continuidad a la ejecución del contrato de obra, con la apertura y operación de los frentes de trabajo por parte del contratista.

Las actividades se desarrollan en dos (2) frentes principales de obra, correspondientes a los corredores:

- Frontino – Nutibara
- Sopetrán – Horizontes - Belmira

En estos frentes se ejecutan actividades asociadas al mejoramiento funcional de la vía, dentro de las cuales se destacan la limpieza de obras transversales, orientada a la recuperación de la capacidad hidráulica de las estructuras existentes, así como la conformación y ampliación de la calzada existente, las cuales presentan desarrollo en ambos frentes de intervención.

Es importante precisar que las actividades de conformación y ampliación de la calzada actualmente se encuentran en proceso de validación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física – SIF, en relación con su alcance,

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 11 de 26

condiciones de ejecución y reconocimiento dentro del contrato. Estas actividades se desarrollan de manera progresiva a lo largo de los corredores intervenidos.

De forma paralela, la interventoría adelanta actividades de levantamiento topográfico en los tramos activos, con el fin de obtener información base para el control geométrico, la verificación de cantidades de obra y el seguimiento técnico del contrato. Así mismo, se ejecutan apiques en los diferentes corredores, orientados a la caracterización de la estructura existente de la vía y a la obtención de información geotécnica necesaria para la definición y control de las intervenciones.

En este sentido, las cantidades ejecutadas durante el periodo se encuentran en proceso de medición, validación y consolidación por parte de la interventoría.

Es importante señalar que, aunque se evidencia avance en la ejecución de las actividades en campo, no se cuenta con corte de obra aprobado ni con programación de obra debidamente aprobada, por lo que no es posible establecer un avance porcentual formal del contrato, encontrándose la información en proceso de estructuración para su respectivo control y eventual certificación.

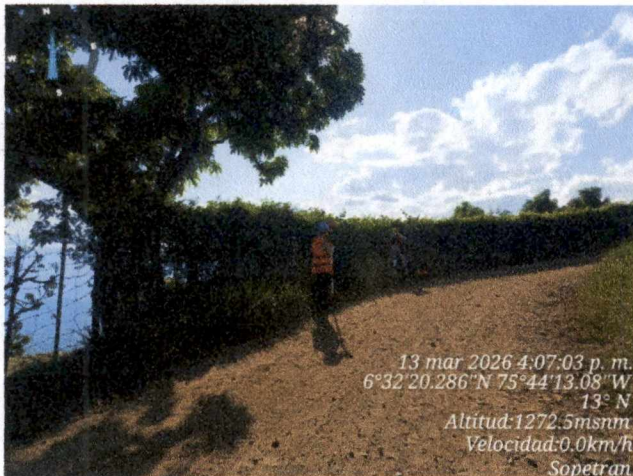
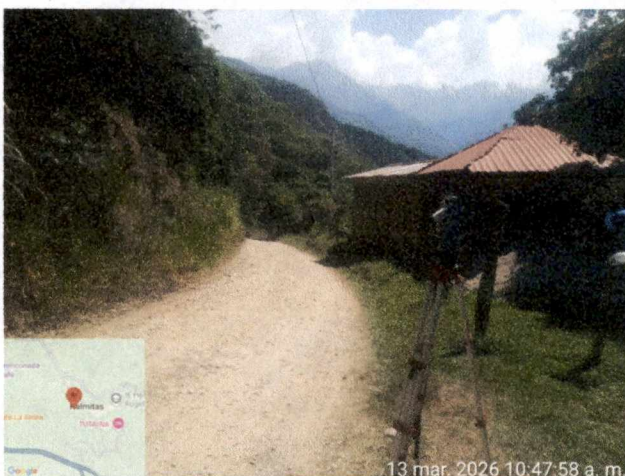
REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
ACTIVIDADES DE CONFORMACION SOPETRA - BELMIRA	ACTIVIDADES DE CONFORMACION SOPETRA - BELMIRA

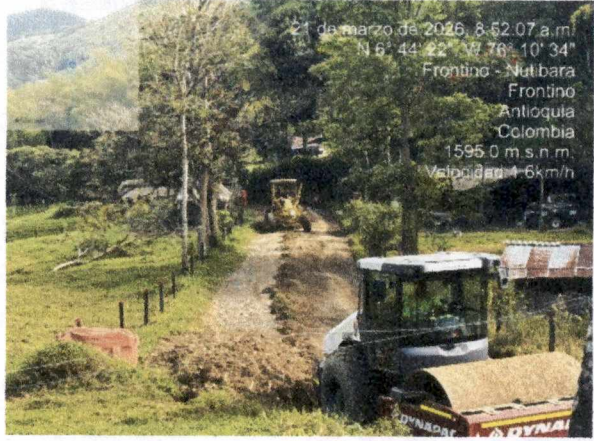
	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 12 de 26

	
ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN - BELMIRA	ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN - BELMIRA

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 13 de 26

	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DE INTERVENTORIA SOPETTRAN - BELMIRA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DE INTERVENTORIA SOPETTRAN - BELMIRA

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 14 de 26

 23 mar 2026 09:02:15 Altitud: 1512.4msnm Velocidad: 0.6km/h Consortio: el progreso Frontino-Nutibara Número de índice: 190	 21 de marzo de 2026, 8:52:07 a.m. N 6° 44' 22" W 76° 10' 34" Frontino - Nutibara Frontino Antioquia Colombia 1595.0 m.s.n.m. Velocidad: 1.6km/h
ACTIVIDADES DE CONFORMACION FRONTINO - NUTIBARA	ACTIVIDADES DE CONFORMACION FRONTINO - NUTIBARA
 20 de marzo de 2026 8:54:38 a.m. N 6° 44' 41" W 76° 10' 54" 1686.3 m.s.n.m. Velocidad: 1.8km/h	 19 mar 2026 15:47:40 6° 44' 59" N 76° 10' 25" W 222° SW Altitud: 1762.5msnm Velocidad: 0.7km/h Consortio: Temporal #Frontino Número de índice: 789
ACTIVIDADES DE AMPLIACION FRONTINO - NUTIBARA	ACTIVIDADES DE AMPLIACION FRONTINO - NUTIBARA

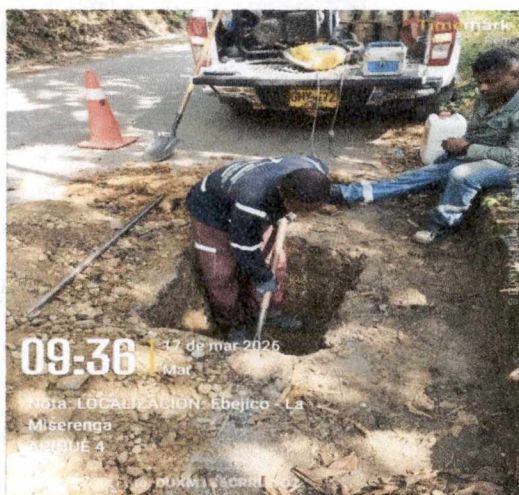


INFORME MENSUAL TÉCNICO

Código: GEP-F1310-13

Versión: 01

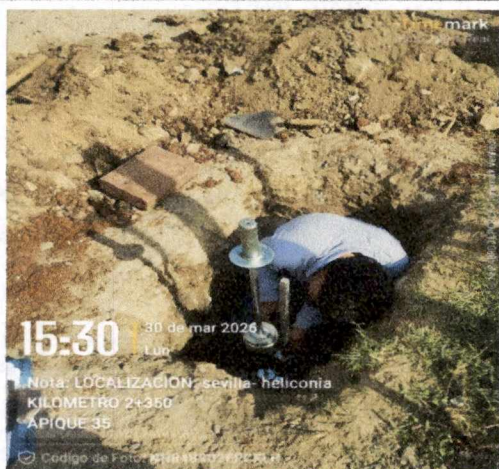
Página 15 de 26



**MUESTRAS DE LABORATORIO
CORREDOR MISERENGA - EBEJICO**



**MUESTRAS DE LABORATORIO
CORREDOR MISERENGA - EBEJICO**



**MUESTRAS DE LABORATORIO
CORREDOR EBEJICO - HELICONIA**



**MUESTRAS DE LABORATORIO
CORREDOR EBEJICO - HELICONIA**

55

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 16 de 26

4.2 ACTAS DE PAGO

CONTROL FINANCIERO					
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO/ DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
ACTA 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

4.3.1. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL

4.3.1.1 PERSONAL ACTIVO

Tabla 1 Recurso humano contratista de Obra

NOMBRES Y APELLIDOS DEL COLABORADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE INGRESO_OBRA	CARGO	ESTAD O
JHAN CARLOS ORTIZ MUNERA	1001845530	26/02/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
EMERSON ANDREY LARA ESPINOSA	1000875066	26/02/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
LUIS ELMER ORTIZ MENDEZ	94462511	26/02/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
OSCAR MARIO MUÑETON MACIAS	1007074966	26/02/2026	CONDUCTOR	ACTIVO
MATEO URREGO	1020457132	26/02/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
SANDRO DE JESUS SERNA	98454198	26/02/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO

57



INFORME MENSUAL TÉCNICO

Código: GEP-F1310-13

Versión: 01

Página 17 de 26

LEONARDO ECHEVERRI	3538332	26/02/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
CRISTIAN CAMILO MURIEL USUGA	1042709773	14/02/2026	CONDUCTOR	ACTIVO
NIDIA VASQUEZ ARTEAGA	43452148	24/02/2026	R. SOCIAL	ACTIVO
YENNI YOBHANA VARGAS	28951310	26/02/2026	R. TECNICA CIVIL	ACTIVO
RENZO FERNANDO CASTRILLON	98504484	23/02/2026	R. AMBIENTAL	ACTIVO
LEIDY MARCELA PIEDRAHITA	1000411687	5/02/2026	AUX. ADMO	ACTIVO
LEONTE CERQUERA SANCHEZ	12125124	26/02/2026	OPERADOR	ACTIVO
JESUS MARIA AYALA	70928011	17/02/2026	ENCARGADO DE OBRA	ACTIVO
LUIS ALEJANDRO GARCES	70435247	26/02/2026	OPERADOR	ACTIVO
ANDYS RODRIGUEZ	1001741183	5/01/2026	OPERADOR	ACTIVO
EDDINSON BORJA	71780138	26/02/2026	CONDUCTOR	ACTIVO
ANDRES FELIPE PAJARO	1067865644	5/01/2026	R. CIVIL	ACTIVO
GUSTAVO ADOLFO PENAGOS REYES	1106483875	21/02/2026	R. SST	ACTIVO
YOJAN ESTIVEN AGUIRRE TOBON	1002103301	14/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
IVAN DARIO FLOREZ FLOREZ	1013537040	14/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
ALEJANDRO GARCIA FLOREZ	1042709410	14/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
JONATHAN METAUTE MUÑOZ	1042706786	14/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
ERMINSON GUIASO DELGADO	1045520233	10/03/2026	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO
JUAN JOSE ESTRADA URIBE	1011512757	10/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
YEISON ADRIAN MACHADO	1018230523	10/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
JAIME ALONSO SAUCEDA	98481182	10/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
OMAR TAMAYO NUNO	1017930018	10/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO



INFORME MENSUAL TÉCNICO

Código: GEP-F1310-13

Versión: 01

Página 18 de 26

SANTIAGO VAHOS SAMPEDRO	1042710025	10/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
JUAN JOSE ESTRADA URIBE	1011512757	10/03/2026	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
ELKIN RUEDA HERRERA	1049349592	5/03/2026	OPERADOR	ACTIVO
DEIBY ALEXANDER MARIN TORRES	71387590	26/03/2026	OPERADOR	ACTIVO
DANIEL FERNANDO FLOREZ	1054996193	26/03/2026	CONDUCTOR	ACTIVO
OSCAR ALEXANDER SEPULVEDA CANO	71310972	26/03/2026	CONDUCTOR	ACTIVO
JHON FREDY HENAO	1059815037	11/03/2026	CONDUCTOR	ACTIVO
SILVA GARCES ANA ARLENY	1038336371		RESIDENTE SST	ACTIVO
MARICELLY LOPEZ ZAPATA	1038332594		AUX ADMINISTRATIVA	ACTIVO
LOPEZ GALVIS JAIRO JAVIER	15961990		OPERADOR	ACTIVO
MURILLO ANDRADE MANUEL LORENZO	1039686627		OPERADOR	ACTIVO
TIBATA CHITIVO JOAQUIN ANTONIO	4180080		RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO
ISAZA CASTRILLON CESAR AUGUSTO	3588787		SUPERVISOR DE OBRA	ACTIVO
SARRAZOLA ROLDAN JUAN FERNANDO	3482877		CONDUCTOR	ACTIVO
LOPEZ LOPEZ BELARMIN ANTONIO	71023580		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
GONZALEZ CARVAJAL EMERSON	1038927240		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
MONTOYA RIVERA DIEGO LEON	1038337721		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
RAMIREZ ALVAREZ HECTOR HERNAN	98698790		OPERADOR	ACTIVO
HERRERA VARGAS DUVAN ALCIDES	1041631427		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
BAILARIN DOMICO WILSON DAVID	1007440327		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
MONTOYA RIVERA SEBASTIAN	1001581076		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
MONTOYA RIVERA JOSE ARMANDO	1038927085		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 19 de 26

MONTOYA RIVERA JUAN CARLOS	1001580411		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
LONDOÑO PEÑA HERNAN DE JESUS	15322099		CONDUCTOR	ACTIVO
VARELA GALLEGU CARLOS MARIO	1038336870		CONDUCTOR	ACTIVO
VIQUE HERNANDEZ YELIXZA YULIET	1094902123		ADMINISTRADORA	ACTIVO
GALVIS JIMENEZ LUISA FERNANDA	1128442100		RESIDENTE SOCIAL	ACTIVO
DOMICO BAILARIN LEONARDO	1038926008		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
LOPEZ DAVID DINEY DE JESUS	1007578999		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
RAMOS ZAPATA FREDY ALEXANDER	1038335227		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
DIAZ HERNANDEZ DONALDO DE JESUS	10886715		OFICIAL DE OBRA	ACTIVO
JOSE LUIS ESCOBAR PARRA	98503235		CONDUCTOR	ACTIVO
COLORADO PARRA DUBER EDWIN	75060447		OPERADOR	ACTIVO
NOHABA GRACIANO VICTOR IVAN	1038927534		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
DOMICO MILTON	1040794352		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
VELASQUEZ SALAS JUAN ESTEBAN	1001581118		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
SALAS PEREZ IVAN DARIO	8085531		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
SEPULVEDA SEPULVEDA FELIPE ESNEIDER	1038926986		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
POSSO VARELAS DIOMAR ALEXIS	1039284669		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
RAMOS NUÑEZ IVAN ALEXANDER	14135215		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
GARCIA POSADA PAOLA ANDREA	1038926693		AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO

NOTA: Se aclara que las personas que no tienen la fecha de ingreso pertenecen al frente de Frontino – Nutibara, la información por parte del contratista se envió incompleta, se deja la observación al contrista para la corrección y complemento.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 20 de 26

4.3.1.2. PERSONAL RETIRADO

Tabla 2 Personal Retirado

NOMBRES Y APELLIDOS DEL COLABORADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA RETIRO OBRA	CARGO	OBSERVACIONES
KATHERINE GARCIA RODRIGUEZ	1042708755	14/03/2026	AUX. ADMO	ACTIVO
CARLOS ANDRES RIASCOS RAMIRES	1036604727	12/03/2026	LABORATORISTA	ACTIVO
RENTERIA MORENO CIPRIAN	11794184	12/03/2026	LABORATORISTA	ACTIVO
JAIRO ALONSO URREGO	1128478336	12/03/2026	LABORATORISTA	ACTIVO
ASPRILLA MENA WILBER	1077444142	12/03/2026	LABORATORISTA	ACTIVO
DAYRON RIVERA VARGAS	71054125	25/03/2026	CONDUCTOR	ACTIVO

Ver Anexo. Base de datos informe SST

4.4. SEGUIMIENTO LEGAL

4.4.1. PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

Para la ejecución del contrato de obra, el contratista constituye las garantías exigidas en la minuta contractual, mediante pólizas expedidas por compañía aseguradora legalmente autorizada, las cuales amparan los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En este sentido, se cuenta con las siguientes garantías:

- Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101246138, la cual ampara el cumplimiento general del contrato, incluyendo la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, el pago de multas y cláusula penal.
- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101085609, la cual ampara los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, conforme a las condiciones y vigencias establecidas en el documento de la póliza.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 21 de 26

Las pólizas referidas se encuentran vigentes y cumplen con las condiciones establecidas contractualmente en cuanto a amparos, valores asegurados y plazos de cobertura. La interventoría verifica su validez como requisito previo al inicio de la ejecución del contrato.

4.4.2. CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE	CEDULA	PERIODO	PLANILLA	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	TOTAL
AYALA JESUS	70928011	2026-03	9501285161	\$ 42.900	\$ 171.600	\$ 74.700	\$ 289.200
BAILARIN WILSON	1007440327	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
CASTRILLON RENSON	98504487	2026-03	9501285161	\$ 46.800	\$ 186.900	\$ 81.300	\$ 315.000
ECHEVERRI LEONARDO	3538332	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
GARCIA KATHERINE	1042708755	2026-03	9501285161	\$ 11.800	\$ 47.000	\$ 1.600	\$ 60.400
GONZALEZ EMERSON	1038927240	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
HERRERA DUVAN	1041631427	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
ISAZA CESAR	3588787	2026-03	9501285161	\$ 66.300	\$ 265.100	\$ 115.400	\$ 446.800
LARA EMERSON	1000875066	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
LOPEZ BELARMIN	71023580	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
LOPEZ MARICELLY	1038332594	2026-03	9501285161	\$ 41.100	\$ 164.300	\$ 5.400	\$ 210.800
MONTOYA DIEGO	1038337721	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
MONTOYA JOSE	1038927085	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
MONTOYA JUAN	1001580411	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
MONTOYA SEBASTIAN	1001581076	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
MUÑETON OSCAR	1007074966	2026-03	9501285161	\$ 26.700	\$ 106.700	\$ 29.000	\$ 162.400
MURIEL CRISTIAN	1042709773	2026-03	9501285161	\$ 41.600	\$ 166.300	\$ 45.200	\$ 253.100
MURILLO MANUEL	1039686627	2026-03	9501285161	\$ 50.700	\$ 202.700	\$ 88.200	\$ 341.600
ORTIZ JHAN	1001845530	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
ORTIZ LUIS	94462511	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
PAJARO ANDRES	1067865644	2026-03	9501285161	\$ 216.000	\$ 864.000	\$ 375.900	\$ 1.455.900
PENAGOS GUSTAVO	1106483875	2026-03	9501285161	\$ 49.400	\$ 197.300	\$ 85.900	\$ 332.600
PIEDRAHITA LEIDY	1000411687	2026-03	9501285161	\$ 76.300	\$ 305.100	\$ 10.000	\$ 391.400
RODRIGUEZ ANDYS	1001741183	2026-03	9501285161	\$ 128.000	\$ 512.000	\$ 222.800	\$ 862.800
SARRAZOLA JUAN	3482877	2026-03	9501285161	\$ 41.400	\$ 165.500	\$ 45.000	\$ 251.900
SERNA SANDRO	98454198	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
SILVA ANA	1038336371	2026-03	9501285161	\$ 46.100	\$ 184.400	\$ 80.200	\$ 310.700
TIBATA JOAQUIN	4180080	2026-03	9501285161	\$ 130.700	\$ 522.700	\$ 227.400	\$ 880.800
URREGO MATEO	1020457132	2026-03	9501285161	\$ 11.700	\$ 46.700	\$ 20.400	\$ 78.800
VARELA CARLOS	1038336870	2026-03	9501285161	\$ 11.300	\$ 45.200	\$ 12.300	\$ 68.800
VARGAS YENNI	28951310	2026-03	9501285161	\$ 40.300	\$ 161.200	\$ 70.100	\$ 271.600
VASQUEZ NIDIA	43452148	2026-03	9501285161	\$ 42.400	\$ 169.400	\$ 73.700	\$ 285.500
VIQUE YELIXZA	1094902123	2026-03	9501285161	\$ 93.400	\$ 373.400	\$ 162.500	\$ 629.300
MURILLO MANUEL	1039686627	2024-03	9465493916	\$ 31.800	\$ 127.100	\$ 55.300	\$ 214.200
MESA JONATHAN	1045111602	2026-02	9501317623	\$ 159.000	\$ 635.900	\$ 172.900	\$ 967.800
LOPEZ JAIRO	15961990	2026-01	9499624650	\$ 120.400	\$ 481.500	\$ 167.600	\$ 769.500
LONDOÑO HERNAN	15322099	2026-01	9499624650	\$ 141.100	\$ 564.100	\$ 137.200	\$ 842.400
RAMIREZ HECTOR	98698790	2026-01	9499624650	\$ 193.200	\$ 772.800	\$ 336.200	\$ 1.302.200

Ver anexo 21 ambos frentes informe SST

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 22 de 26

4.5. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.5.1. Actividades en seguridad y Salud en el trabajo realizadas por el contratista

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, se da continuidad a la ejecución del contrato de obra, evidenciándose un avance en la implementación del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en concordancia con el desarrollo de actividades constructivas en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara.

En este contexto, el contratista consolida la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la permanencia del personal responsable del componente en los frentes de obra, así como el acompañamiento en campo durante la ejecución de actividades, especialmente aquellas relacionadas con operación de maquinaria, conformación y ampliación de la vía y limpieza de obras transversales.

De igual manera, se evidencia la ejecución de actividades de control operativo en los frentes de trabajo, orientadas a la identificación y gestión de riesgos, verificación del uso de elementos de protección personal (EPP), realización de charlas de seguridad y acompañamiento permanente a las labores desarrolladas por el personal operativo, en cumplimiento de la normatividad vigente y las obligaciones contractuales del proyecto.

Por parte de la interventoría, se realiza seguimiento continuo al componente SST mediante recorridos en campo, validando la presencia del profesional SST, las condiciones de seguridad en los frentes activos y la aplicación de medidas preventivas durante la ejecución de las actividades.

No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la consolidación, trazabilidad y oportunidad de los soportes documentales del SG-SST, así como en el registro sistemático de las actividades ejecutadas, aspectos que continúan siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría.

En consecuencia, el componente SST presenta un avance en su fase de implementación, contando con actividades en campo y soporte documental asociado; sin embargo, se requiere fortalecer su gestión integral para garantizar el cumplimiento pleno de los lineamientos establecidos.

Ver Anexo

Anexo. Informe del componente SST

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 23 de 26

4.6. SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, se da continuidad a la ejecución del contrato de obra, evidenciándose un avance en la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en concordancia con el desarrollo de las actividades constructivas en el corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira.

En este sentido, el contratista inicia la ejecución de actividades propias de los programas ambientales, incluyendo la gestión y operación de la Zona de Disposición de Material de Excavación (ZODME) ubicada en el predio La Aventura (PR 18+300), la cual cuenta con la documentación requerida y fue previamente validada. Durante el periodo se realiza la disposición de material estéril proveniente de las actividades de conformación y recuperación de la vía, así como la adecuación, conformación y compactación del material depositado, garantizando condiciones de estabilidad y manejo adecuado del sitio.

De igual manera, se implementan medidas asociadas al manejo de residuos sólidos, evidenciando la recolección, clasificación y disposición final de residuos ordinarios a través de la Empresa de Servicios Públicos de Sopetrán, así como el almacenamiento de residuos aprovechables. Adicionalmente, se establecen puntos ecológicos en los frentes de obra y se desarrollan jornadas de orden y aseo.

En el marco del programa de biodiversidad, se ejecutan actividades de descapote en el área destinada al ZODME, con el fin de conservar la capa vegetal para su posterior uso en procesos de recuperación ambiental. Asimismo, no se evidencian intervenciones sobre cobertura arbórea ni afectación a fauna durante el periodo.

De manera complementaria, se implementan medidas de manejo ambiental asociadas al control de emisiones atmosféricas, mediante el carpado de volquetas y la proyección del uso de vehículos para humectación de la vía. En cuanto al manejo del recurso hídrico y saneamiento básico, se gestionan alternativas para el uso de unidades sanitarias en predios aledaños y sistemas sépticos autorizados.

Por su parte, la interventoría realiza seguimiento permanente mediante recorridos en campo, verificando el cumplimiento de las medidas ambientales implementadas, la adecuada operación del ZODME, el manejo de residuos, el estado de las áreas intervenidas y el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables.

En consecuencia, el componente ambiental presenta un avance significativo respecto al periodo anterior, pasando de una fase inicial de estructuración a una fase de implementación activa de las medidas del PMA, en coherencia con el progreso de las actividades constructivas del proyecto.

Ver Anexo

Anexo. Informe del componente Ambiental

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 24 de 26

4.7 SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, se evidencian avances en la ejecución de actividades asociadas al componente social del proyecto, en concordancia con el inicio de las actividades constructivas en el corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira.

No obstante, a la fecha de corte del presente informe, el Plan de Gestión Social (PGS) no se encuentra aprobado, razón por la cual las actividades desarrolladas se enmarcan en una fase inicial de implementación, orientadas principalmente al reconocimiento del entorno, el relacionamiento comunitario y la socialización del proyecto.

En este contexto, se adelantan actividades correspondientes al programa de reconocimiento del entorno, incluyendo la identificación de predios en el área de influencia, el levantamiento de actas de entorno, actas de vecindad y la gestión de permisos de intervención; sin embargo, se evidencia que la documentación presentada por el contratista se encuentra incompleta y sin aprobación por parte de la interventoría, lo que impide la consolidación de una línea base social verificable.

De igual manera, se desarrollan actividades de socialización y articulación con actores comunitarios, destacándose la realización de reuniones informativas con juntas de acueducto, sistemas de riego y comunidad en general, así como la socialización de inicio de obra, con participación de la población del área de influencia. Estas actividades permiten la identificación de posibles conflictos asociados a interferencias con redes de servicios, restricciones comunitarias y afectaciones por condiciones de la vía.

En cuanto al programa de comunicación y divulgación, se evidencia la implementación de estrategias como la entrega de volantes informativos, emisión de cuñas radiales y convocatoria a reuniones comunitarias; no obstante, se identifican actividades pendientes a cargo del contratista, tales como la instalación de vallas informativas, avisos metálicos, carteleras y buzones de PQRS.

Adicionalmente, se reporta la vinculación de personal para la ejecución del proyecto, incluyendo mano de obra local; sin embargo, se identifica oportunidad de mejora en el fortalecimiento de la participación de personal del área de influencia directa y en la aplicación del enfoque diferencial.

Por su parte, la interventoría realiza seguimiento permanente al componente social mediante recorridos, comités de obra y revisión documental, evidenciando la necesidad de fortalecer el cumplimiento de los requisitos contractuales, especialmente en la estructuración, aprobación e implementación del PGS, así como en la calidad y oportunidad de los soportes entregados por el contratista.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 25 de 26

En consecuencia, el componente social presenta un avance en su fase de implementación en campo; no obstante, persisten debilidades de carácter documental, administrativo y de cumplimiento, que deben ser atendidas de manera prioritaria para garantizar la adecuada gestión social del proyecto.

5. GARANTÍAS

Este capítulo este contenido dentro del numeral 4.4.1 PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, el contrato de obra se encuentra en fase activa de ejecución, evidenciándose el desarrollo de actividades constructivas en los frentes de Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara, principalmente asociadas a la limpieza de obras transversales, así como a la conformación y ampliación de la calzada, orientadas al mejoramiento de las condiciones de drenaje y transitabilidad de los corredores intervenidos.

De manera complementaria, se da inicio a actividades de exploración geotécnica mediante la ejecución de apiques en diferentes corredores, así como a la realización de apiques de contramuestreo por parte de la interventoría, fortaleciendo el control técnico y la verificación de las condiciones reales de la estructura vial.

No obstante, a la fecha de corte del presente informe no se cuenta con programación de obra ni con corte de obra debidamente aprobados, lo que impide establecer de manera formal el avance físico y financiero del contrato, encontrándose la información en proceso de estructuración, validación y consolidación por parte de las partes.

En el componente administrativo, se evidencia que la información del personal presenta inconsistencias e incompletitud, particularmente en el frente de Frontino – Nutibara, lo cual afecta la trazabilidad y control del recurso humano vinculado al proyecto; en este sentido, se hace necesario fortalecer la calidad, completitud y oportunidad en la entrega de la información por parte del contratista.

En cuanto al componente ambiental, se observa un avance en la implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), destacándose la operación del ZODME y la ejecución de actividades asociadas al manejo de residuos y control ambiental; no obstante, estas acciones se encuentran en fase inicial y requieren consolidación, seguimiento continuo y aseguramiento del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Respecto al componente social, se evidencian avances en actividades de socialización, relacionamiento comunitario y vinculación de personal; sin embargo, persisten debilidades relevantes, como la falta de aprobación del Plan de Gestión Social (PGS), la insuficiencia de soportes documentales y la no implementación completa de las estrategias de comunicación, por lo que se requiere su atención prioritaria.

En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se observa la implementación inicial del sistema de gestión y la presencia de personal en campo; no obstante, se identifican oportunidades de mejora en la consolidación documental, seguimiento y trazabilidad de las actividades ejecutadas.

En términos generales, el proyecto presenta avance en la ejecución en campo; sin embargo, se evidencian debilidades en la planeación, estructuración administrativa y control documental, por lo que se requiere al contratista la presentación y aprobación de la programación de obra y del primer corte de obra, así como el fortalecimiento integral de los componentes administrativo, ambiental, social y SST, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del proyecto.

7. ANEXOS

7.1 Actas de Comités

7.2 Correspondencia enviada

7.3 Correspondencia recibida

8. CONTROL DE VERSIONES

[illegible]

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
