

Medellín, 01 de septiembre de 2026

1300 2661

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Radicado: R 2026010591353
Fecha: 02/09/2026 11:31:24.0
Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 – “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

Asunto: Entrega de informes mensuales técnicos de Interventoría del Lote 2 – Subregión Occidente correspondientes al mes de enero a junio de 2026 – Contrato No. 20260072

Cordial Saludo,

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la secretaria de Infraestructura física y RENTAN y en el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

Tomo 1

- Oficio Remisorio (1 folio – folio 1)
- Informe mensual Técnico No. 01 de Interventoría del mes de enero 2026, periodo 01 al 31 de enero (17 folios – del folio 2 al 18).
- Informe mensual Técnico No. 02 de Interventoría del mes de febrero 2026, periodo 01 al 28 de febrero (21 folios – del folio 19 al 39).
- Informe mensual Técnico No. 03 de Interventoría del mes de marzo 2026, periodo 01 al 31 de marzo (27 folios – del folio 40 al 66).
- Informe mensual Técnico No. 04 de Interventoría del mes de abril 2026, periodo 01 al 30 de abril (31 folios – del folio 67 al 97).
- Informe mensual Técnico No. 05 de Interventoría del mes de mayo 2026, periodo 01 al 31 de mayo (59 folios – del folio 98 al 156).

ARCHIVO SIF
2026 SEP 7 9:16:56

- Informe mensual Técnico No. 06 de Interventoría del mes de junio 2026, periodo 01 al 30 de junio (44 folios – del folio 157 al 200).

Tomo 2

- Informe mensual Técnico No. 06 de Interventoría del mes de junio 2026, periodo 01 al 30 de junio (18 folios – del folio 201 al 218).

Total, de folios 218


En medio digital, cinco (6) USB anexa con la siguiente Información:

- ANEXOS TÉCNICOS
 - ✓ Anexo 1. Anexos Técnicos enero
 - ✓ Anexo 2. Anexos Técnicos febrero
 - ✓ Anexo 3. Anexos Técnicos marzo
 - ✓ Anexo 4. Anexos Técnicos abril
 - ✓ Anexo 5. Anexos Técnicos mayo
 - ✓ Anexo 6. Anexos Técnicos junio

La documentación remitida corresponde a los informes mensuales técnicos de interventoría del Lote 2 – Occidente – contrato No. 20260072 de los meses de enero a junio del 2026 y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atento a cualquier inquietud.


Cordialmente,



CATALINA CASTRILLÓN TORRES

Subgerente de Ejecución

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	DAVID FERNANDO VILLOTA ROJAS Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		01/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			


CONSORCIO TEMPORALES

CONTRATO No 20260072
OBJETO CONTRATO DE OBRA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**ABRIL
2026**
**INFORME MENSUAL TÉCNICO No 4
LOTE 2 - OCCIDENTE**

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 1 de 62

INFORME TÉCNICO MENSUAL N°4

(Versión 01- Periodo 01 al 30 de abril de 2026)

RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN S.A.S.

Entidad Contratante

CONSORCIO EL PROGRESO

Contratista de Obra

**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)**

Objeto Contrato de Obra

N.º de Contrato de Obra 2500111B2821 de 2025.



CONSORCIO TEMPORALES

Contratista de Interventoría

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA
SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2 OCCIDENTE) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

Objeto Contrato de Interventoría

N.º de Contrato de Interventoría 20260072

Firma:  Juan Tobón R.L Consorcio Temporales	Firma:  Catalina Castrillón Supervisor Rentan
Elaboró	Recibe

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 1 de 62

CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	4
2.	DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO	4
2.1	LOCALIZACION	5
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL.....	6
3.2	INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.....	6
4.	SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA	6
4.1	SEGUIMIENTO TÉCNICO	6
4.1.1	RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO.....	6
4.1.2	DESCRIPCION Y CANTIDADES EJECUTADAS (CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS)	9
4.2	ACTAS DE PAGO	15
4.3	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.....	15
4.3.1.	INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL	15
4.3.1.1	PERSONAL ACTIVO	15
4.3.1.2.	PERSONAL RETIRADO	24
5.	GARANTÍAS	29
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29
7.	ANEXOS	30

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 1 de 62

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato de obra denominado "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – LOTE 2 OCCIDENTE", durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

La interventoría se desarrolla en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600018656 celebrado entre la Gobernación de Antioquia y RENTAN - IECE, e incluye el control y seguimiento de los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y legal, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.

Durante el periodo evaluado, se evidenció la ejecución de actividades constructivas en los frentes de Sopetrán y Frontino, correspondientes principalmente a la limpieza de obras transversales, así como a la conformación y ampliación de la vía. De manera complementaria, se continuo con actividades de exploración mediante la ejecución de apiques en el corredor Ebéjico – Heliconia, orientadas a la caracterización de la estructura existente y al soporte técnico para el diseño y control de las intervenciones, además se inició con actividades de limpieza de trasversales en este corredor.

El presente documento consolida los avances, hallazgos y observaciones identificadas por la interventoría, así como las recomendaciones técnicas orientadas a garantizar la adecuada ejecución del proyecto, en concordancia con las especificaciones técnicas aplicables y las condiciones contractuales.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la ejecución de "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", cuyo propósito es optimizar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente en la red secundaria y terciaria del departamento.

De acuerdo con los estudios y documentos previos, el alcance del proyecto comprende la ejecución de actividades orientadas al mantenimiento y mejoramiento de corredores viales, mediante intervenciones que incluyen:

- Estabilización de la estructura vial mediante el uso de materiales tratados con cemento y/o cal
- Mejoramiento de la superficie de rodadura
- Construcción y mantenimiento de obras de drenaje y subdrenaje
- Construcción de obras complementarias como disipadores
- Implementación de señalización vial

- Caracterización y levantamiento de información de la red vial

El proyecto busca mejorar la intercomunicación terrestre de las subregiones intervenidas, incrementando los niveles de servicio, seguridad y comodidad de los usuarios, especialmente en corredores de bajo volumen de tránsito (LVR), mediante soluciones técnicas que garanticen mayor durabilidad frente a las condiciones actuales de operación.

Así mismo, se establece como estrategia técnica la sustitución de intervenciones tradicionales basadas en recarga de material granular, por procesos de estabilización de los materiales existentes en los primeros niveles de la estructura vial, permitiendo optimizar el uso de recursos y mejorar el desempeño estructural de la vía.

En este sentido, las intervenciones deben ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo los lineamientos establecidos en las especificaciones particulares SIF001, SIF002 y la normativa INVIAS vigente.

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se desarrolla en la subregión de Occidente del departamento de Antioquia, en corredores viales pertenecientes a la red secundaria y terciaria a cargo del Departamento.

Los tramos objeto de intervención corresponden a corredores rurales estratégicos que permiten la conectividad entre cabeceras municipales, corregimientos y veredas, facilitando el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios esenciales.

Dentro del Lote 2 – Occidente, se incluyen los siguientes corredores viales objeto de intervención:

- Frontino – Nutibara
- Sopetrán – Horizontes – Belmira
- Titiribí – Armenia
- Ebéjico – Heliconia – Medellín
- Miserenga – Ebéjico

Estos corredores presentan condiciones geométricas y estructurales propias de vías de bajo volumen de tránsito, caracterizadas por:

- Secciones reducidas
- Pendientes variables
- Estructuras granulares no pavimentadas

- Alta vulnerabilidad a condiciones hidráulicas

Adicionalmente, los corredores cumplen una función estratégica en la movilidad rural, soportando tránsito asociado a actividades productivas como ganadería, minería, producción de panela y transporte de leche, así como movilidad cotidiana de comunidades rurales hacia centros educativos y servicios básicos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL

3.2 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: 2500111B2821 de 2025

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL PROGRESO

NIT: 902.017.242-2

PLAZO DEL CONTRATO: DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

TOTAL, PLAZO 18 meses

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE AGOSTO 2027

VALOR INICIAL: \$ 104.855.613.958

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 104.855.613.958

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA

4.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO

4.1.1 RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, el contrato de obra se encuentra en fase activa de ejecución, dando continuidad a las actividades iniciadas a partir del 10 de febrero de 2026.

En este contexto, durante el periodo evaluado se evidencia el desarrollo de actividades constructivas en los frentes Sopetrán – Horizontes – Belmira, Frontino – Nutibara y el inicio de actividades en el corredor Ebéjico – Heliconia, orientadas al mejoramiento de las condiciones de drenaje y transitabilidad de los corredores intervenidos.

En el corredor Frontino – Nutibara se culminan las actividades de limpieza de obras transversales y las labores de conformación de la calzada. Como resultado de dichas actividades, se identificaron algunas estructuras que requieren permisos previos de intervención por parte de las entidades competentes. De manera paralela, se dio inicio al reemplazo de tuberías existentes en mal estado en el tramo comprendido dentro de los primeros 3 km del corredor, correspondientes a estructuras que no requieren permisos adicionales para su intervención. No obstante, estas actividades se desarrollan bajo la responsabilidad técnica, constructiva y económica exclusiva del contratista, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con diseños definitivos aprobados para el corredor.

En el corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira se continúa con las actividades de limpieza de obras transversales, identificándose estructuras que requieren trámite de ocupación de cauce, así como otras que requieren autorización de los propietarios de los predios donde se localizan los encoles y descoles para su respectiva intervención. Paralelamente, se da continuidad a las actividades de ampliación y conformación de la calzada, avanzando en la recuperación de la geometría y condiciones funcionales de la vía.

Por su parte, en el corredor Ebéjico – Heliconia se da inicio a actividades el día 20 de abril de 2026, comenzando con la limpieza de obras transversales y el traslado de maquinaria y equipos al frente de obra, con el propósito de iniciar las intervenciones programadas en el corredor.

De manera complementaria, se continúa con las actividades de exploración geotécnica mediante la ejecución de apiques en el corredor Ebéjico – Heliconia, con el objetivo de avanzar en la caracterización de la estructura existente y generar insumos técnicos para la definición, validación y control de las intervenciones proyectadas.

Paralelamente, la interventoría continúa desarrollando actividades de seguimiento y control mediante recorridos técnicos en los diferentes frentes de obra, en acompañamiento al contratista, verificando las condiciones de intervención, la ejecución de las actividades constructivas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables. De igual forma, se da continuidad a las actividades de control topográfico y seguimiento documental, en concordancia con las obligaciones técnicas propias de la interventoría a.

Actividades de obra realizadas por el contratista en el periodo

Con el fin de establecer un criterio de seguimiento al desarrollo del contrato durante el periodo informado, la interventoría realiza verificación de las actividades efectivamente ejecutadas en campo, relacionándolas con las obligaciones contractuales y el alcance técnico previsto para el proyecto.

Para el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, se evidencia la ejecución de actividades constructivas en los frentes Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara, así como el inicio de actividades en el corredor Ebéjico – Heliconia, orientadas principalmente al mejoramiento de las condiciones de drenaje y transitabilidad de los corredores intervenidos.

74

**INFORME MENSUAL TÉCNICO**

Código: GEP-F1310-13

Versión: 01

Página 1 de 62

Adicionalmente, se continúa con actividades de exploración geotécnica mediante la ejecución de apiques en el corredor Ebéjico – Heliconia, las cuales constituyen un insumo técnico fundamental para la caracterización de la estructura vial existente y la evaluación de las intervenciones proyectadas.

AVANCE FINANCIERO.

Ejecutado a la Fecha \$874.774.271

Programado a la Fecha \$244.006.959

Cumplimiento Avancé del \$0

AVANCE FÍSICO.

Ejecutado a la Fecha 4.79%

Programado a la Fecha 0%

Cumplimiento Avancé del 0%

A continuación, se presenta un cuadro resumen donde se establecen las actividades de obra desarrolladas en el período y los ítems efectivamente ejecutados.

4.1.2 DESCRIPCION Y CANTIDADES EJECUTADAS (CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS)

Nº	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	OBRA ACUMULADA		
			ANEXO 16.3 - 16.13	GENERAL	PARTICULAR	Cantidad	Vr / Total	% DE OBRA EJECUTADA
					VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14			
					CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			
46	8.1	11604		NA	8.1 Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	2.022,27	\$ 283.874.129,00	100,00%
					SUBTOTAL OBRAS VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14		\$ 283.874.129,00	0,96%
					VIA SOPETRA-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13			
					CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			
160	8.1	11604		NA	8.1 Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	4.209,47	\$ 590.900.142,00	86,47%
					SUBTOTAL OBRAS VIA SOPETRA-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13		\$ 590.900.142,00	1,94%
					SUBTOTAL OBRA ORDINARIA		\$ 874.774.271,00	0,93%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE FRONTINO NUTIBARA	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE FRONTINO NUTIBARA

		INFORME MENSUAL TÉCNICO		
Código: GEP-F		310-13	Versión: 01	Página 1 de 62
				
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE SOPETRAN - BELMIRA		LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE SOPETRAN - BELMIRA		
				
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE EBEJICO - HELICONIA		LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL FRENTE EBEJICO - HELICONIA		

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, se da continuidad a la ejecución del contrato de obra, con la apertura y operación de los frentes de trabajo por parte del contratista.

Las actividades se desarrollan en tres (3) frentes de obra, correspondientes a los corredores:

- Frontino – Nutibara
- Sopetrán – Horizontes – Belmira

- Ebéjico – Heliconia

En estos frentes se ejecutan actividades asociadas al mejoramiento funcional de la vía, dentro de las cuales se destacan la limpieza de obras transversales, orientada a la recuperación de la capacidad hidráulica de las estructuras existentes, así como la conformación y ampliación de la calzada existente, las cuales presentan desarrollo en ambos frentes de intervención.

Es importante precisar que las actividades de conformación y ampliación de la calzada actualmente se encuentran en proceso de validación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física – SIF, en relación con su alcance, condiciones de ejecución y reconocimiento dentro del contrato. Estas actividades se desarrollan de manera progresiva a lo largo de los corredores intervenidos.


De forma paralela, la interventoría adelanta actividades de levantamiento topográfico en los tramos activos, con el fin de obtener información base para el control geométrico, la verificación de cantidades de obra y el seguimiento técnico del contrato. Así mismo, se ejecutan apiques en los diferentes corredores, orientados a la caracterización de la estructura existente de la vía y a la obtención de información geotécnica necesaria para la definición y control de las intervenciones.


En este sentido, las cantidades ejecutadas durante el periodo se encuentran en proceso de medición, validación y consolidación por parte de la interventoría.

26


	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 1 de 62

REGISTRO FOTOGRÁFICO

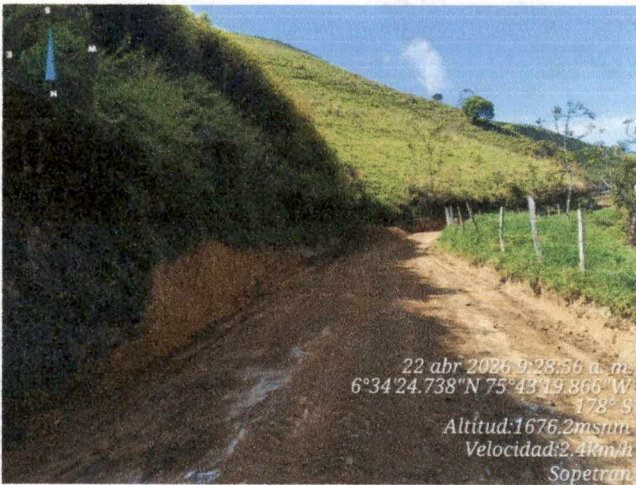
 22 abr 2026 7:40:45 a. m. 6°34'15.306"N 75°43'27.306"W 88° E Altitud:1691.9msnm Velocidad:1.3km/h Sopetran	 22 abr 2026 9:28:56 a. m. 6°34'24.738"N 75°43'19.866"W 178° S Altitud:1676.2msnm Velocidad:2.4km/h Sopetran
ACTIVIDADES DE CONFORMACION SOPETRAN - BELMIRA	ACTIVIDADES DE CONFORMACION SOPETRAN - BELMIRA
 29 abr 2026 8:13:52 a. m. 6°34'53.142"N 75°44'12.594"W 218° SW Altitud:1654.5msnm Velocidad:0.0km/h Sopetran	 29 abr 2026 11:10:09 a. m. 6°34'53.172"N 75°44'12.342"W 210° SW Altitud:1676.2msnm Velocidad:3.2km/h Sopetran
ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN - BELMIRA	ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN - BELMIRA

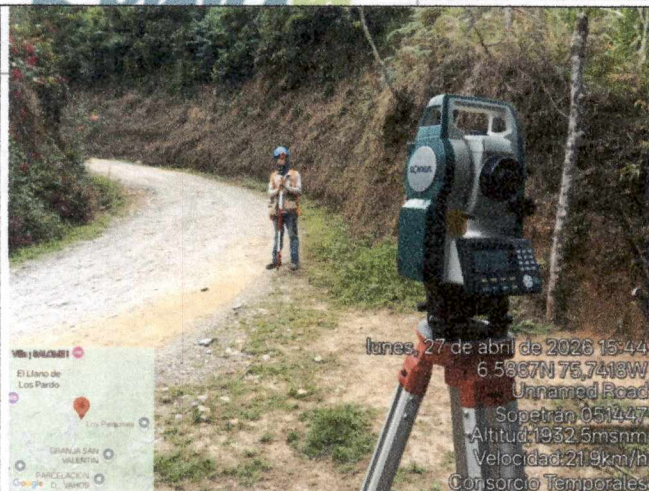


LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DE INTERVENTORIA SOPETRAN - BELMIRA

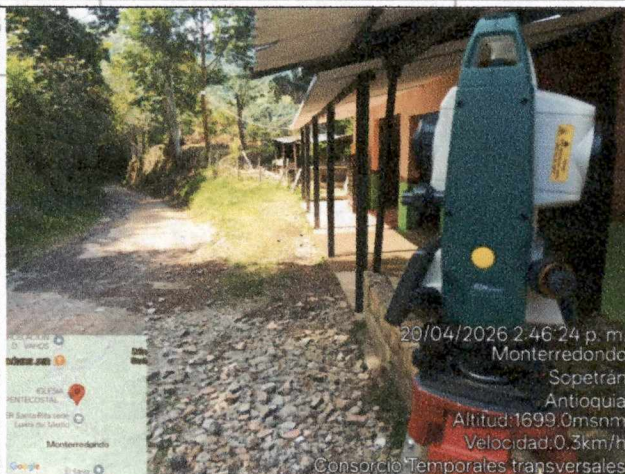


LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DE INTERVENTORIA SOPETRAN - BELMIRA

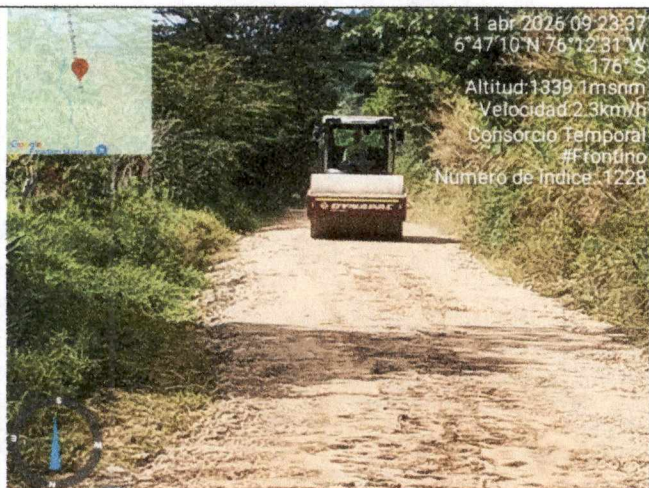

ACTIVIDADES DE CONFORMACION FRONTINO - NUTIBARA

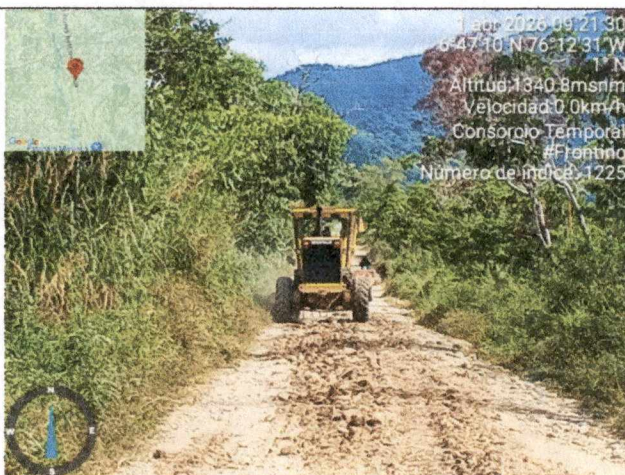

ACTIVIDADES DE CONFORMACION FRONTINO - NUTIBARA

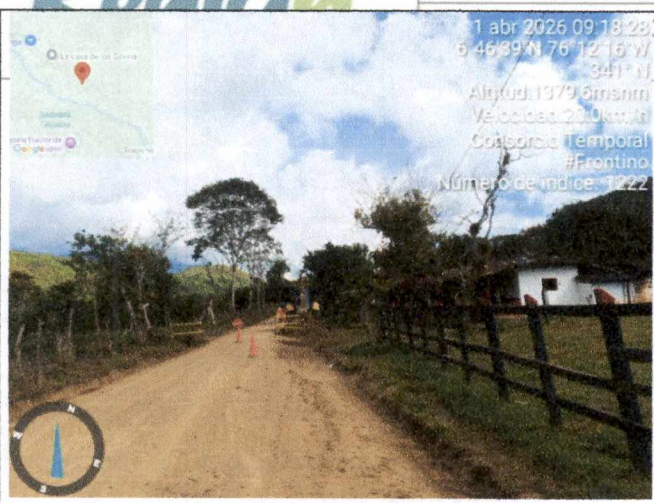

ACTIVIDADES DE AMPLIACION FRONTINO
- NUTIBARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION
FRONTINO - NUTIBARA



LIMPIEZA DE TRANSVERSALES EBEJICO
- HELICONIA

LIMPIEZA DE TRANSVERSALES
EBEJICO - HELICONIA

 INFORME MENSUAL TÉCNICO de 62	
 jueves, 30 de abril de 2026 14:32 6.2891N 75.7821W Ebéjico-Heliconia Ebéjico 055818 Altitud: 1708.3msnm Velocidad: 0.0km/h Consortio Temporales - ebejico- Heliconia - obras transversales# 2	 jueves, 30 de abril de 2026 14:29 6.2891N 75.7822W Ebéjico-Heliconia Ebéjico 055818 Altitud: 1704.8msnm Velocidad: 0.0km/h Consortio Temporales - ebejico- Heliconia - obras transversales# 2
LIMPIEZA DE TRANSVERSALES EBEJICO - HELICONIA	LIMPIEZA DE TRANSVERSALES EBEJICO - HELICONIA

4.2 ACTAS DE PAGO

CONTROL FINANCIERO					
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO/ DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
ACTA 1	31-03-2026	\$104.855.613.957	\$ 988.176.235	\$ 839.949.800	\$ 103.867.437.723
ACTA 2	30-04-2026	\$104.855.613.957	\$ 611.219.836	\$ 519.536.861	\$ 103.256.217.887
TOTALES			\$ 1.599.396.071	\$1.389.485.661	

4.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO


4.3.1. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL

4.3.1.1 PERSONAL ACTIVO

Tabla 1 Recurso humano contratista de Obra

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO
CONTRATO

No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	LEIDY MARCELA PIEDRAHITA SERNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.000.411.687	CONSORCIO EL PROGRESO	5/02/2026	
2	JESUS MARIA AYALA GONZALEZ	ENCARGADO DE OBRA	70928011	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
3	RENZO FERNANDO CASTRILLON JIMENEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	98504487	CONSORCIO EL PROGRESO	23/02/2026	
4	KATHERINE GARCIA RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1042708755	CONSORCIO EL PROGRESO	27/02/2026	14/03/2026
5	OSCAR MARIO MUÑETON MACIAS	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1007074966	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
6	CRISTIAN CAMILO MURIEL USUGA	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1042709773	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
7	ANDRES FELIPE PAJARO PATIÑO	INGENIERO RESIDENTE CIVIL	1067865644	CONSORCIO EL PROGRESO	5/01/2026	
8	MARICELLY LOPEZ ZAPATA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.038.332.594	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
9	ANA ARLENY SILVA GARCES	RESIDENTE SST	1.038.336.371	CONSORCIO EL PROGRESO	23/02/2025	
10	JAIRO JAVIER LOPEZ GALVIS	OPERADOR	15.961.990	CONSORCIO EL PROGRESO	24/02/2026	
11	MANUEL LORENZO MURILLO ANDRADE	OPERADOR	1.039.686.627	CONSORCIO EL PROGRESO	20/02/2026	



INFORME MENSUAL TÉCNICO

	JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO	Código: GEP-F1310-13 RESIDENTE OBRA	4.180.080	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	Página 1 de 62
12	CESAR AUGUSTO ISAZA CASTRILLON	SUPERVISOR DE OBRA	3.588.787	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
13	JUAN FERNANDO SARRAZOLA ROLDAN	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	3482877	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
14	BELARMIN ANTONIO LOPEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	71023580	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	31/03/2026
15	DIEGO LEON MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1038337721	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
16	EMERSON GONZALEZ CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1038927240	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
17	HECTOR HERNAN RAMIREZ ALVAREZ	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	98698790	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
18	DUVAN ALCIDES HERRERA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	1041631427	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
19	WILSON DAVID BAILARIN DOMICO	AYUDANTE DE OBRA	1007440327	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
20	MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1001581076	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
21	SEBASTIAN MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1038927085	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
22	JOSE ARMANDO MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1001580411	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
23	JUAN CARLOS PENAGOS REYES	RESIDENTE SST	1106483875	CONSORCIO EL PROGRESO	21/02/2026	

		Código: GEP-F1310-13	Version: 01	Página 1 de 62		
25	YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO	RESIDENTE CIVIL DE OBRA	28951310	CONSORCIO EL PROGRESO	2/26/2026	
26	NIDIA SORAIDA VASQUEZ ARTEAGA	RESIDENTE SOCIAL	43452148	CONSORCIO EL PROGRESO	24/02/2026	
27	HERNAN DE JESUS LONDOÑO PEÑA	CONDUCTOR	15322099	CONSORCIO EL PROGRESO	10/12/2012	
28	MATEO URREGO LAINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1020457132	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
29	EMERSON ANDREY LARA ESPINOSA	AYUDANTE DE OBRA	1000875066	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	

30	LUIS ELMER ORTIZ MENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	94462511	CONSORCIO O EL PROGRESO	26/02/2026	
31	JHAN CARLOS ORTIZ MÚNERA	AYUDANTE DE OBRA	1001845530	CONSORCIO O EL PROGRESO	26/02/2026	
32	LEONANR DO ECHEVERR Y BEDOYA	AYUDANTE DE OBRA	3538332	CONSORCIO O EL PROGRESO	26/02/2026	
33	SANDRO DE JESUS SERNA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	98454198	CONSORCIO O EL PROGRESO	26/02/2026	
34	COLORA DO PARRA DUBER EDWIN	OPERADOR	75060447	MINOICA	10/03/2026	
35	NOHABA GRACIAN O VICTOR IVAN	AYUDANTE DE OBRA	1038927534	CSC EL PROGR ESO	10/03/2026	

		INFORME MENSUAL TÉCNICO				
36	DOMICO MILTON	AYUDANTE DE OBRA	Código: GEP-F1310-13 1040794352	CSC EL PROGR ESO	Version: 01 18/03/2026	Página 1 de 62
37	VELASQUEZ SALAS JUAN ESTEBAN	AYUDANTE DE OBRA	1001581118	CSC EL PROGR ESO	18/03/2026	

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 1 de 62

38	SALAS PEREZ IVAN DARIO	AYUDANTE DE OBRA	8085531	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
39	SEPULVEDA SEPULVEDA FELIPE ESNEIDER	AYUDANTE DE OBRA	1038926986	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
40	POSSO VARELAS DIOMAR ALEXIS	AYUDANTE DE OBRA	1039284669	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
41	RAMOS NUÑEZ IVAN ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	14135215	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
42	GARCIA POSADA PAOLA ANDREA	AYUDANTE DE OBRA	1038926693	CSC EL PROGRESO	17/03/2026	

43	CARLOS ANDRES RIASCOS RAMIRES	LABORATORISTA	1036604727	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
44	RENTERIA MORENO CIPRIAN	LABORATORISTA	11794184	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
45	JAIR ALONSO URREGO	LABORATORISTA	1128478336	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
46	ASPRILLA MENA WILBER	LABORATORISTA	1077444142	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
47	YOJAN ESTIVEN AGUIRRE TOBON	AYUDANTE DE OBRA	1002103301	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	
48	IVAN DARIO FLOREZ FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	1013537040	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	
49	ALEJANDRO GARCIA FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	1042709410	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	
50	JONATHAN METAUTE MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1042706786	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	

51	ERMINSON GUISAO DELGADO	OFICIAL DE OBRA	1045520233	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
52	JUAN JOSE ESTRADA URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1011512757	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
53	YEISON ADRIAN MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	1018230523	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
54	JAIME ALONSO SAUCEDA	AYUDANTE DE OBRA	98481182	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
55	OMAR TAMAYO NUNO	AYUDANTE DE OBRA	1017930018	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
56	SANTIAGO VAHOS SAMPEDRO	AYUDANTE DE OBRA	1042710025	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
57	JUAN JOSE ESTRADA URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1011512757	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
58	JOSE DAVID SEPULVEDA SALAZAR	CONDUCTOR	71379420	INTRAMAQ	10/03/2026	
59	ELKIN RUEDA HERRERA	OPERADOR	1049349592	CONSORCIO EL PROGRESO	5/03/2026	
60	DAYRON RIVERA VARGAS	CONDUCTOR	71054125	CONSORCIO EL PROGRESO	16/03/2026	23/03/2026
61	DEIBY ALEXANDER MARIN TORRES	OPERADOR	71387590	CONSORCIO EL PROGRESO	26/03/2026	
62	DANIEL FERNANDO FLOREZ	CONDUCTOR	1054996193	CONSORCIO EL PROGRESO	26/03/2026	
63	OSCAR ALEXANDER SEPULVEDA CANO	CONDUCTOR	71310972	CONSORCIO EL PROGRESO	26/03/2026	
64	JHON FREDY HENAO	CONDUCTOR	1059815037	CONSORCIO EL PROGRESO	11/03/2026	
65	RENDON CARLOS ANDRES	OPERADOR	1037323292	INTRAMAQ	10/04/2026	
66	PEREA VALENCIA BLANCA NIEVE	TOPOGRAFIA	1077436785	CONSORCIO EL PROGRESO	11/04/2026	
67	ARANGO LOPEZ SANTIAGO	CONDUCTOR	1002620334	CONSORCIO EL PROGRESO	6/04/2026	

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 22 de 31

68	SANDY LORENA VARGAS CRISTANCHO	TOPOGRAFA	1105611361	CONSORCIO EL PROGRESO	13/04/2026	
69	JHOAN CAMILO HENAO ARIAS	CONDUCTOR	1047973032	CONSORCIO EL PROGRESO	17/04/2026	

Tabla 2 Recurso humano interventoría de Obra

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	JUAN GUILLERMO TOBON POSADA	RESIDENTE CIVIL	71776136	CONSORCIO TEMPORALES	23/01/2026	
2	CARLOS MEJIA	RESIDENTE CIVIL	112836805	CONSORCIO TEMPORALES	23/01/2026	
3	JHON ALEXANDER GOMEZ	TOPOGRAFO	1096956411	CONSORCIO TEMPORALES	16/02/2026	
4	JHON FREDY CUARTAS MEJIA	AUX TOPOGRFIA	1040733652	CONSORCIO TEMPORALES	16/02/2026	
5	DIANA CAROLINA VASQUEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	1020447060	CONSORCIO TEMPORALES	16/02/2026	17/03/2027
6	YULIANIS MARRIET SIERRA LONDOÑO	DIRECTORA INTERVENTORIA	32182315	CONSORCIO TEMPORALES	03/03/2026	17/04/2026


INFORME MENSUAL TÉCNICO

Código: GEP-F1310-13

Versión: 01

Página 23 de 31

7	FRAMBEY CUELLO	PROFESIONAL AMBIENTAL	1122404244	CONSORCIO TEMPORALES	16/03/2026	
8	NUBIA INES GIL CARMONA	PROFESIONAL SST	42683118	CONSORCIO TEMPORALES	9/03/2026	
9	DIANA MILENA HERNANDEZ	PROFESIONAL SOCIAL	1017169820	CONSORCIO TEMPORALES	3/03/2026	17/03/2026
10	NATALIA RIOS GIRALDO	PROFESIONAL SOCIAL	1053797926	CONSORCIO TEMPORALES	16/03/2026	
11	BRAYAN GRAJALES	TECNOLOGO AUX INTERV	1094942155	CONSORCIO TEMPORALES	9/03/2026	
12	OMAR ZACARIAS AMAYA	TECNOLOGO AUX INTERV	71780175	CONSORCIO TEMPORALES	2/03/2026	
13	MARIA CAMILA CANO VELEZ	SECRETARIA ADMON	1006635089	CONSORCIO TEMPORALES	7/03/2026	
14	MARIANA OTALVARO ZEA	SECRETARIA ADMON	1000412842	CONSORCIO TEMPORALES	2/03/2026	
15	PAULA ANDREA HERNANDEZ DUCUARA	RESIDENTE SST	52198193	CONSORCIO TEMPORALES	06/04/2026	30/04/2026
16	FABIAN LEANDRO FORERO MARTINEZ	RESIDENTE CIVIL	5428444	CONSORCIO TEMPORALES	16/04/2026	

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 24 de 31

4.3.1.2. PERSONAL RETIRADO

NOTA: Ver fecha de Egreso en tabla de personal

Ver Anexo. Base de datos informe SST

4.4. SEGUIMIENTO LEGAL

4.4.1. PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

Para la ejecución del contrato de obra, el contratista constituye las garantías exigidas en la minuta contractual, mediante pólizas expedidas por compañía aseguradora legalmente autorizada, las cuales amparan los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En este sentido, se cuenta con las siguientes garantías:

- Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101246138, la cual ampara el cumplimiento general del contrato, incluyendo la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, el pago de multas y cláusula penal.
- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101085609, la cual ampara los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, conforme a las condiciones y vigencias establecidas en el documento de la póliza.

Las pólizas referidas se encuentran vigentes y cumplen con las condiciones establecidas contractualmente en cuanto a amparos, valores asegurados y plazos de cobertura. La interventoría verifica su validez como requisito previo al inicio de la ejecución del contrato.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 25 de 31

4.4.2. CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

Ver anexo 21 informe SST

4.5. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.5.1. Actividades en seguridad y Salud en el trabajo realizadas por el contratista

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, se dio continuidad a la ejecución del contrato de obra, evidenciándose avance en la implementación y seguimiento del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en concordancia con el desarrollo de actividades constructivas en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara, así como con el inicio de actividades en el corredor Ebéjico – Heliconia.

En este contexto, el contratista continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), manteniendo personal responsable del componente SST en los diferentes frentes de obra y realizando acompañamiento permanente durante la ejecución de actividades asociadas a operación de maquinaria, ampliación y conformación de la vía, limpieza y construcción de obras transversales, así como labores de señalización y manejo de tránsito.

De igual manera, se evidenció la ejecución de actividades orientadas al control y prevención de riesgos laborales, entre las cuales se destacan inspecciones de maquinaria y vehículos, diligenciamiento de preoperacionales, charlas de seguridad, inducciones, capacitaciones, pausas activas, hidratación al personal y verificación del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), en cumplimiento de la normatividad vigente y las obligaciones contractuales del proyecto. Asimismo, se verificó la implementación y mantenimiento de la señalización vial y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los frentes activos de trabajo.

Por parte de la interventoría, se realizó seguimiento continuo al componente SST mediante acompañamiento en campo y revisión documental, validando la presencia del personal SST, el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales, las condiciones de seguridad de los frentes de trabajo y la aplicación de medidas preventivas durante la ejecución de las actividades constructivas.

Adicionalmente, durante el periodo evaluado se verificó el cumplimiento de actividades asociadas al SG-SST, tales como afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social, entrega de dotación y EPP, realización de exámenes médicos ocupacionales, seguimiento al PESV y desarrollo de capacitaciones e inducciones al personal vinculado al proyecto.

No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de la gestión documental, la consolidación y trazabilidad de algunos soportes asociados al SG-SST y el seguimiento permanente a los controles

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 26 de 31

operacionales implementados en campo, aspectos que continúan siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría.

En consecuencia, el componente SST presenta continuidad en su proceso de implementación y seguimiento, evidenciándose actividades operativas y administrativas orientadas a la prevención de riesgos laborales y al cumplimiento de los lineamientos establecidos para el desarrollo seguro de las actividades del proyecto.

Ver Anexo

Anexo. Informe del componente SST

4.6. SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, se dio continuidad a la ejecución del contrato de obra, evidenciándose avance en la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en concordancia con el desarrollo de las actividades constructivas en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara, así como con el inicio de actividades preliminares en el corredor Ebéjico – Heliconia.

En este sentido, el contratista continuó la ejecución de actividades propias de los programas ambientales, incluyendo la gestión y operación de la Zona de Disposición de Material de Excavación (ZODME) ubicada en el predio La Aventura (PR 18+300 aprox.) para el corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira, la cual cuenta con la documentación requerida y fue previamente validada. Durante el periodo se realizó la disposición de material estéril proveniente de las actividades de conformación y recuperación de la vía, así como la adecuación, conformación y compactación del material depositado, procurando condiciones adecuadas de estabilidad y manejo ambiental del sitio. Adicionalmente, para el corredor Ebéjico – Heliconia se iniciaron actividades de reconocimiento y verificación de posibles predios para la gestión y trámite de futuras ZODME requeridas para el desarrollo del proyecto.

De igual manera, se implementaron medidas asociadas al manejo integral de residuos sólidos, evidenciándose la recolección, clasificación, almacenamiento y disposición final de residuos ordinarios mediante gestores autorizados y Empresas de Servicios Públicos de los municipios intervenidos, así como el manejo de residuos aprovechables. Asimismo, se instalaron puntos ecológicos en los frentes de obra y se desarrollaron jornadas de orden y aseo en las áreas intervenidas.

En el marco del programa de manejo de cobertura vegetal y biodiversidad, se realizaron actividades de descapote y conservación de capa vegetal en áreas destinadas para manejo de material estéril, con el propósito de facilitar posteriores procesos de recuperación ambiental. Durante el periodo evaluado no se evidenciaron intervenciones sobre cobertura arbórea ni afectaciones relevantes sobre fauna silvestre asociadas a las actividades ejecutadas.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 27 de 31

De manera complementaria, se implementaron medidas de manejo ambiental relacionadas con el control de emisiones atmosféricas y material particulado, mediante el seguimiento al carpado de volquetas utilizadas para el transporte de material, así como actividades orientadas al control de polvo en los frentes activos de trabajo. En cuanto al manejo del recurso hídrico y saneamiento básico, se mantuvo el uso de unidades sanitarias portátiles y sistemas autorizados para disposición de aguas residuales domésticas del personal vinculado al proyecto.

Por su parte, la interventoría realizó seguimiento permanente mediante recorridos en campo y revisión documental, verificando el cumplimiento de las medidas ambientales implementadas por el contratista, la adecuada operación de las zonas de disposición, el manejo de residuos sólidos, las condiciones de orden y aseo, el estado de las áreas intervenidas y el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables al proyecto.

En consecuencia, el componente ambiental presenta continuidad en la implementación activa de las medidas contempladas en el PMA, evidenciándose avance en los programas de manejo ambiental asociados al desarrollo de las actividades constructivas y al inicio de nuevos frentes de intervención del proyecto.

Ver Anexo

Anexo. Informe del componente Ambiental

4.7 SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, se evidencian avances en la ejecución de actividades asociadas al componente social del proyecto, en concordancia con el desarrollo de las actividades constructivas en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara, así como con el inicio de actividades preliminares en el corredor Ebéjico – Heliconia.

A la fecha de corte del presente informe, el Plan de Gestión Social (PGS) continúa en proceso de ajuste y consolidación por parte del contratista; no obstante, se observa continuidad en la ejecución de actividades orientadas al reconocimiento del entorno, relacionamiento comunitario y acompañamiento social a las actividades constructivas desarrolladas en los diferentes frentes de obra.

En este contexto, se adelantaron actividades correspondientes al programa de reconocimiento del entorno y gestión social predial, incluyendo identificación de predios en el área de influencia, levantamiento de actas de entorno y vecindad, socialización con propietarios y gestión de autorizaciones requeridas para la intervención y uso temporal de áreas asociadas al proyecto. Asimismo, en el corredor Ebéjico – Heliconia se iniciaron acercamientos preliminares

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 28 de 31

y reconocimiento social del territorio para la identificación de posibles áreas requeridas para apoyo logístico y futuras zonas de disposición de material.

De igual manera, se desarrollaron actividades de socialización y articulación con actores comunitarios y líderes del área de influencia, destacándose reuniones informativas con comunidad, propietarios, juntas de acueducto y usuarios de sistemas de riego, en las cuales se abordaron aspectos relacionados con el inicio y avance de las obras, manejo de interferencias, tránsito vehicular, afectaciones temporales y requerimientos comunitarios asociados al desarrollo del proyecto. Estas actividades permitieron fortalecer el relacionamiento comunitario y facilitar la identificación temprana de situaciones susceptibles de seguimiento social.

En cuanto al programa de comunicación y divulgación, se evidenció la continuidad de estrategias informativas mediante entrega de volantes, convocatoria a reuniones comunitarias y divulgación de información asociada al proyecto; no obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de algunos mecanismos de atención e información a la comunidad, así como en la consolidación documental de los soportes asociados a las actividades ejecutadas.

Adicionalmente, se reporta continuidad en la vinculación de personal para la ejecución de las actividades constructivas, incluyendo participación de mano de obra local en los diferentes frentes de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda continuar fortaleciendo la participación del personal del área de influencia directa y la aplicación de criterios asociados al enfoque diferencial y relacionamiento comunitario.

Por su parte, la interventoría realizó seguimiento permanente al componente social mediante recorridos en campo, participación en comités de obra y revisión documental, verificando el desarrollo de las actividades sociales ejecutadas por el contratista y efectuando observaciones relacionadas con la consolidación, calidad y oportunidad de los soportes requeridos para el adecuado seguimiento del componente social.

En consecuencia, el componente social presenta continuidad en su proceso de implementación y acompañamiento a las actividades del proyecto, evidenciándose avances en las labores de relacionamiento comunitario, reconocimiento del entorno y gestión social en campo; no obstante, se requiere continuar fortaleciendo los procesos documentales, administrativos y de seguimiento asociados a la implementación integral del PGS.

	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 29 de 31

5. GARANTÍAS

Este capítulo este contenido dentro del numeral 4.4.1 PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, el contrato de obra continuó en fase activa de ejecución, evidenciándose avance en las actividades constructivas desarrolladas en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira y Frontino – Nutibara, así como el inicio de actividades en el corredor Ebéjico – Heliconia, mediante la apertura del frente de trabajo, traslado de maquinaria y ejecución inicial de limpieza de obras transversales.

En el componente técnico, se evidenció la continuidad de actividades asociadas principalmente a limpieza de obras transversales, conformación y ampliación de la calzada, orientadas al mejoramiento de las condiciones hidráulicas y de transitabilidad de los corredores intervenidos. Asimismo, se dio continuidad a las actividades de exploración geotécnica mediante apiques y levantamientos topográficos, como insumo para la caracterización de la estructura existente y el control técnico de las intervenciones proyectadas.

En el componente administrativo y legal, se verificó la permanencia del personal técnico y operativo requerido para la ejecución del proyecto, así como la vigencia de las garantías contractuales exigidas para el desarrollo de las actividades. De igual forma, se efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad social y documentación contractual del personal vinculado al proyecto.

Respecto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció continuidad en la implementación y seguimiento del SG-SST, mediante acompañamiento en campo, inspecciones operativas, capacitaciones, control de riesgos y seguimiento a las condiciones de seguridad en los diferentes frentes de obra. No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la consolidación documental y trazabilidad de algunos soportes asociados al componente SST.

En relación con el componente ambiental, se observó continuidad en la implementación de las medidas establecidas en el PMA, incluyendo la operación de la ZODME del corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira, el manejo de residuos sólidos, control de material particulado y conservación de capa vegetal. Adicionalmente, en el corredor Ebéjico – Heliconia se iniciaron actividades de reconocimiento y gestión preliminar de posibles predios para futuras ZODME requeridas para el desarrollo del proyecto.

En cuanto al componente social, se evidenció continuidad en las actividades de reconocimiento del entorno, relacionamiento comunitario y socialización con actores del área de influencia, acompañando el avance de las actividades constructivas y el inicio de nuevos frentes de intervención. No obstante, se requiere continuar fortaleciendo los procesos documentales y la consolidación integral del Plan de Gestión Social (PGS).

Como resultado del seguimiento efectuado durante el periodo evaluado, la interventoría recomienda al contratista continuar fortaleciendo la coordinación técnica, administrativa, ambiental, social y SST entre los diferentes frentes de obra, garantizando la adecuada trazabilidad documental de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales aplicables.

Así mismo, se recomienda continuar adelantando las gestiones y trámites requeridos ante las entidades competentes y propietarios de predios para la intervención de estructuras hidráulicas, ocupaciones de cauce, disposición de materiales y demás actividades necesarias para garantizar la continuidad adecuada de las obras proyectadas.

Finalmente, la interventoría continuará realizando seguimiento técnico, administrativo, ambiental, social, SST y legal al desarrollo del contrato, mediante recorridos en campo, revisión documental y acompañamiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lineamientos contractuales y condiciones requeridas para la adecuada ejecución del proyecto.

7. ANEXOS

7.1 Actas de Comités

7.2 Correspondencia enviada

7.3 Correspondencia recibida

8. CONTROL DE VERSIONES

[illegible]

**INFORME MENSUAL TÉCNICO**

Código: GEP-F1310-13

Versión: 01

Página 31 de 31

N°. Versión	de	Fecha Versión	de	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción cambio	del

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
