



FLORENCIA, DICIEMBRE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1. Localización	7
2.2. Características del proyecto	8
3. DATOS GENERALES	13
3.1. Datos del contrato objeto de interventoría	13
3.2. Datos de la interventoría	14
3.3. Obligaciones del contrato de interventoría	14
4. GARANTÍAS	18
4.1. Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Obra	18
4.2. Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Interventoría	20
5. VERIFICACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO CONTRACTUAL	22
5.1. Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de obra	22
5.2. Verificación de pago de seguridad social y aportes legales	22
5.3. Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de interventoría	23
6. ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	25
6.1. Descripción de actividades ejecutadas en el mes	25
6.2. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.	35
6.3. Informe de avance físico de la obra	41
7. INFORMACIÓN FINANCIERA	43
7.1. Informe de avance financiero de la obra	43
7.2. Información de manejo del anticipo	43
8. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA	45
8.1. Problemas presentados y mecanismos de solución propuestos	45
8.2. Control de calidad	45
8.6. Documentos suscritos	47
9. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	50

10.	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	59
10.1.	Desarrollo e implementación de la gestión ambiental	59
10.2.	Programa de actividades constructivas	59
10.3.	Biodiversidad y servicios ecosistémicos	60
10.4.	Programa de gestión social	61
10.5.	Gestión de salud y seguridad en el trabajo.	62
11.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	64

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Actividades incluidas en el alcance del proyecto.	8
Tabla 2.	Ficha técnica del Contrato objeto de interventoría	13
Tabla 3.	Ficha técnica del Contrato de Interventoría.	14
Tabla 4.	Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones iniciales.	18
Tabla 5.	Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.	18
Tabla 6.	Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.	19
Tabla 7.	Póliza de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra, condiciones iniciales.	19
Tabla 8.	Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.	19
Tabla 9.	Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.	20
Tabla 10.	Resumen de actualización de pólizas contrato de obra.	20
Tabla 11.	Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones iniciales.	20
Tabla 12.	Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.	21
Tabla 13.	Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.	21
Tabla 14.	Personal mínimo requerido del Contratista de obra.	22
Tabla 15.	Personal del Contrato de Obra.	22
Tabla 16.	Personal de apoyo y operativo sst Diciembre	23
Tabla 17.	Personal mínimo requerido de interventoría.	23
Tabla 18.	Personal de Interventoría.	23

Tabla 19. Localización y replanteo	27
Tabla 20. Demolición de baldosa cerámica.	27
Tabla 21. Desmote de vidrio templado	27
Tabla 22. Retiro de material cargue y descargue	28
Tabla 23. Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha	28
Tabla 24. Estuco para muros	29
Tabla 24. Cielo raso plano en drywall	30
Tabla 26. Muro liviano en superboard e= 8mm 2 caras	30
Tabla 27 Suministro e instalación División en vidrio templado 10 mm	30
Tabla 28. Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	31
Tabla 29. Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	31
Tabla 29. Pañete filos marcos puertas o ventanas	31
Tabla 31. Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI).	32
Tabla 32. Excavación manual	32
Tabla 33. Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico	32
Tabla 34. Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada	33
Tabla 35. Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 24000 BTU	33
Tabla 36. Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360°	34
Tabla 37. Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360°	34
Tabla 38. Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4	34
Tabla 39. Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC	35
Tabla 40. Anclaje de platina 300*300 mm de ½"	35
Tabla 41. Anclaje de platina 300*300 mm de ½"	35
Tabla 42. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.	35
Tabla 43. Resumen de cantidades ejecutadas a la fecha de corte del presente informe.	36
Tabla 44. Tabla de programación vs Ejecución	41
Tabla 45. Información Financiera	43
Tabla 46. Plan de inversión del anticipo del contrato de obra.	44

Tabla 47. Informe de inversión del anticipo del contrato de obra.	44
Tabla 48. Relación de equipo empleado en obra.	46
Tabla 49. Documentación del contrato de obra.	47
Tabla 50. Comités de Seguimiento	47
Tabla 51. Control de Correspondencia	48
Tabla 52. Verificación del cumplimiento de Obligaciones contractuales	50

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización del municipio de Florencia	7
Figura 2. Lugar de intervención.	8
Figura 3. Planta arquitectónica primer nivel edificio Gobernación.	26
Figura 4: Mantenimiento Piso tipo Alpha	29
Figura 5: Vigas de cimentación en concreto reforzado de 4000 PSI	31
Figura 6. Curva S - Contrato de obra	41



	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	--	--

1. INTRODUCCIÓN

La sede central de la Gobernación del Caquetá constituye un espacio fundamental para la atención al público y el desarrollo de las actividades administrativas del departamento. No obstante, los espacios destinados a la atención ciudadana presentan un deterioro físico y funcional, producto del uso continuo, la falta de mantenimiento periódico y la obsolescencia de algunos elementos constructivos e instalaciones, lo cual incide de manera directa en la calidad del servicio prestado y en las condiciones laborales de los funcionarios.

En respuesta a esta situación, la Gobernación del Caquetá adelantó el proceso de contratación de construcción de obras civiles para el proyecto, mediante el proceso de Licitación Pública No DC-GE-LP.016-2025 cuyo objeto consiste en “Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá” que fue adjudicado al Consorcio Caquetá 2025. La contratación de la interventoría se adelantó mediante Concurso de Méritos Abierto No DC-GE-CMA-012-2025, del cual resultó adjudicatario la empresa Geovial ingeniería Zomac S:A:S

El presente documento corresponde al Informe Mensual de Interventoría No.3, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre y el 31 de Diciembre de 2026. En este informe se describe el avance de las actividades ejecutadas como parte de la interventoría Técnica, Administrativa Jurídica y Financiera del Contrato cuyo Objeto Consiste en: “Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá”, e igualmente describe las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento al Contrato No. 202500000893.

INGENIERIA ZOMAC S.A.S

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

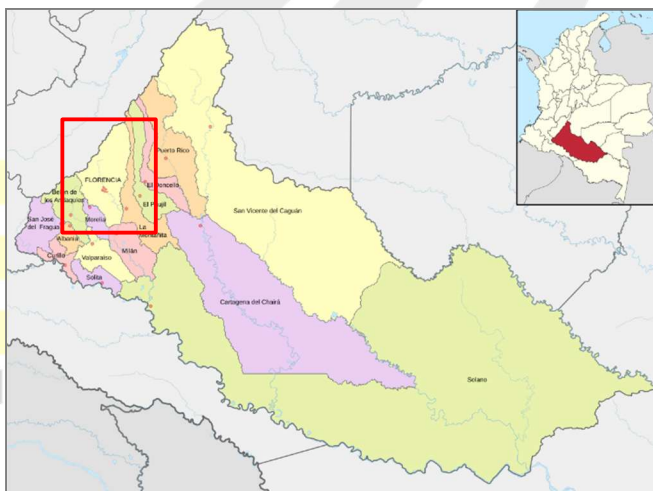
2.1. Localización

El proyecto de Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá se ejecutará en el Municipio de Florencia, Caquetá, en la Carrera 13 con Calle 15, barrio el Centro.

El Municipio de Florencia está localizado en el departamento del Caquetá, a los 01°37'03" de latitud norte y 75°37'03" de longitud oeste y a una altura de 242 metros sobre el nivel del mar.

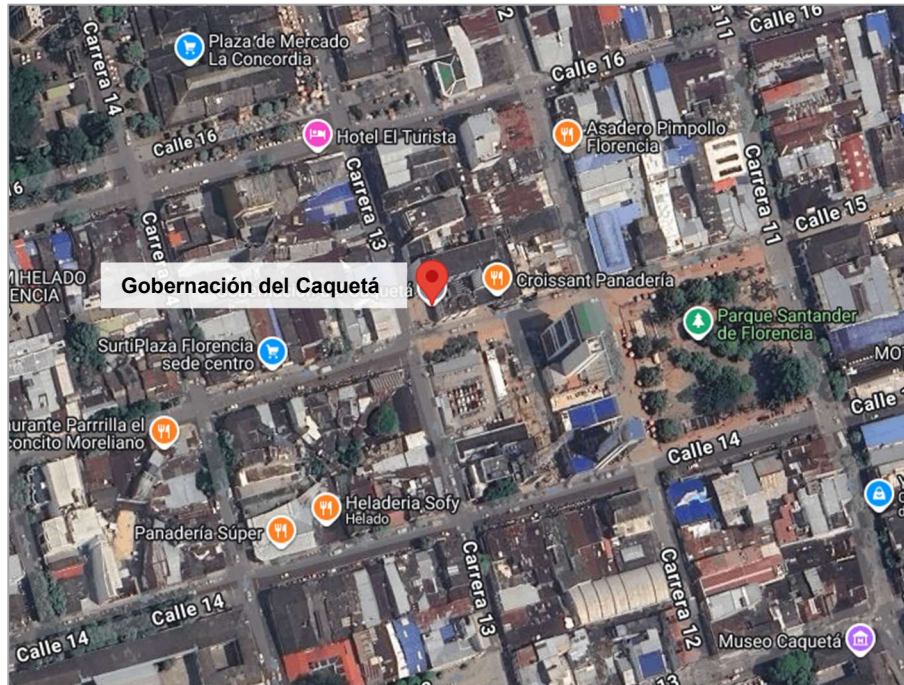
El municipio de Florencia, limita por el Norte con el departamento del Huila, al Sur con los municipios Milán y Morelia, al Este con el Municipio de La Montañita y al Oeste con los Municipios de Belén de los Andaquíes y Departamento del Huila. La extensión es de 2.292 km² aproximadamente, el cual es equivalente a 229.200 has y con relación al resto del país ocupa el 0.2% del territorio.

Figura 1. Localización del municipio de Florencia



Nota: Tomado de Mapa de Caquetá (Wikipedia, 2025)

Figura 2. Lugar de intervención.



Nota: Tomado de Google Maps, 2025

2.2. Características del proyecto

El contrato de interventoría define el objeto del contrato así: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”, el cual contempla las siguientes actividades:

Tabla 1. Actividades incluidas en el alcance del proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo	M ²	1,015.00
1.2	Cerramiento en tela verde	ML	102.00
1.3	Limpieza de fachada	M ²	2,230.00
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE		
2.1	Desmonte de marcos y puertas.	UND	35.00
2.2	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	3.00
2.3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M ²	3.50

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
2.4	Desmonte de cielo raso existente	M ²	1,015.00
2.5	Demolición de baldosa cerámica	M ²	76.13
2.6	Desmonte o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	15.00
2.7	Desmonte de vidrio templado	M ²	53.00
2.8	Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M ²	167.00
2.9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M ²	109.54
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M ³	18.00
2.11	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M ²	23.08
3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS		
3.1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	1.00
3.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4".	ML	26.00
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA		
4.1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	3.00
4.2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	3.00
4.3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	3.00
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES		
5.1	Enchape cerámica pared	M ²	60.70
5.2	Enchape cerámica antideslizante piso	M ²	14.78
5.3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M ²	1,324.00
5.4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	205.00
5.5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	152.00
5.6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M ²	180.00
5.7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M ²	126.50
6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA		
6.1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M ²	584.00
6.2	Estuco para muros.	M ²	584.00
6.3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M ²	1,734.48
6.4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M ²	17.00
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL		
7.1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M ²	1,015.00
7.2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	462.00
7.3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M ²	202.57
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS		

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
8.1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	4.00
8.2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M ²	25.60
8.3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M ²	9.24
8.4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M ²	24.11
8.5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	11.00
8.6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	15.00
8.7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	6.00
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS		
9.1	Pañete 1:4	M ²	5.26
9.2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M ³	34.00
9.3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M ³	8.38
9.4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M ³	5.48
9.5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	94.45
9.6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	381.80
9.7	Excavación manual	M ³	41.44
10	OBRAS ELÉCTRICAS		
10.1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	1.00
10.2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	1.00
10.3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	5.00
10.4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 100A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	1.00
10.5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	4.00
10.6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	655.68
10.7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	172.00
10.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	389.00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
10.9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	344.00
10.10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	37.00
10.11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	20.00
10.12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	58.00
10.13	Desmante de aparatos de salidas eléctricas	UND	190.00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	8.00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	15.00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	12.00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	796.00
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	172.00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	25.00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	208.00
10.21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	49.00
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	36.77
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	83.48
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	30.00
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1.00
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en	ML	100.00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
	cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"		
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA		
11.1	Polycarbonato alveolar para cubierta	M ²	159.00
11.2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	87.00
11.3	Canal en lámina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	16.93
11.4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	2179.64
11.5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	3518.00
11.6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	26.13
11.7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	2.00
11.8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	4.00
11.9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	2.00

GEOVIAL
INGENIERIA ZOMAC S.A.S

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	--	--

3. DATOS GENERALES

FECHA:	Febrero de 2026	INFORME No.	4
---------------	-----------------	--------------------	---

PERIODO No.	4	DEL:	1 de enero de 2026	AL:	31 de enero de 2026
--------------------	---	-------------	--------------------	------------	---------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Florencia, Caquetá

3.1. Datos del contrato objeto de interventoría

Tabla 2. Ficha técnica del Contrato objeto de interventoría

No. DEL PROCESO	DC-GE-LP-016-2025				
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA				
CONTRATO No:	202500000874				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/09/2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
NIT/CC:	901.987.427-5				
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS (\$2.401.062.171) MCTE				
ANTICIPO:	\$ 960,484,868.00				
ADICIONES:	N. A.				
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de Inicio por el Contratista y el Supervisor del contrato.				
AMPLIACIÓN 1:	De acuerdo al OTROSÍ No. 0001 al Contrato de Obra No. 202500000874 del 12 de septiembre de 2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.				
FECHA ACTA DE INICIO:	09/10/2025				
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento catorce (114) días				
No. CDP	2025071266	Fecha exp.	4/07/2024	Valor (\$)	2,571,206,371.00
No. RP	2025094328	Fecha exp.	15/09/2025	Valor (\$)	2,401,062,171.00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.</p> <p align="center">CONTRATO No. 202500000893</p> <p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	--	--

3.2. Datos de la interventoría

Tabla 3. Ficha técnica del Contrato de Interventoría.

No. DEL PROCESO	DC-GE-LP-016-2025				
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
CONTRATO No:	2022500000893 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CONTRATISTA:	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC:	901.390.155-3				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$168.209.800) M/CTE.				
ANTICIPO:	N. A				
ADICIONES:	N. A.				
PLAZO DE INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de Inicio por el Contratista y el Supervisor del contrato.				
AMPLIACIÓN 1:	De acuerdo al OTROSÍ No. 0001 al Contrato de Interventoría No. 2022500000893 del 25 de septiembre de 2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.				
FECHA ACTA DE INICIO:	09/10/2025				
PLAZO TRANSCURRIDO:	Sesenta (60) días				
No. CDP	2025071266	Fecha exp.	4/07/2025	Valor (\$)	2,571,206,371.00
No. RP	2025094490	Fecha exp.	25/09/2025	Valor (\$)	168,209,800.00

3.3. Obligaciones del contrato de interventoría

3.3.1. Obligaciones generales

De acuerdo con el contrato de interventoría, el interventor asume las siguientes obligaciones:

Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato el Contratista deberá:

- Presentar las garantías exigidas
- Suscribir el Acta de Inicio del contrato
- Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados
- Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas.
- Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

- f. Permitir al supervisor asignado por el Departamento, realizar la inspección del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.
- g. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato, ejecutar el mismo y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el municipio, le imponga multas sucesivas por valor del Uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin superar el Diez por ciento (10%) del mismo, hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- h. Tratándose de personas naturales la base para el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del valor total final del contrato.
- i. El contratista se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual a la suspensión o ampliación del contrato si a ello hay lugar.
- j. Garantizar la calidad del trabajo o servicio realizado.
- k. Presentar un informe final de ejecución del contrato.
- l. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.
- m. Las demás que deriven de la ejecución contractual.

3.3.2. Obligaciones específicas

• Obligaciones Técnicas

- a. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar, según corresponda, la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto pactado,
- b. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario,
- c. Verificar el cumplimiento del alcance del objeto contractual,

- d. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad correspondiente (Ordenador del Gasto), previo concepto escrito de la Interventoría o la supervisión,
 - e. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar,
 - f. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos,
 - g. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados por él; constatar su estado y cantidad,
 - h. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato,
 - i. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes,
 - j. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución,
 - k. Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte del Departamento en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en la invitación pública que dieron origen al contrato objeto de interventoría.
- **Obligaciones Administrativas:**
 - a. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato;
 - b. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo,
 - c. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista,
 - d. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual,
 - e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas,
 - f. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados,

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

- g. Coordinar con las dependencias de la entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales,
 - h. Procurar que por causas atribuibles a la entidad no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato,
 - i. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato,
 - j. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos,
 - k. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables,
 - l. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.
- **Obligaciones Financieras:**
 - a. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta inversión (Cuando Aplique). Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la presentación del programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo,
 - b. Revisar, aprobar y tramitar ante la dependencia de la entidad correspondiente, las solicitudes de pago formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados,
 - c. Verificar que el contratista este al día en los pagos de pensiones, ARP, parafiscales y salud de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes,
 - d. Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, registro y reserva presupuestal cuando se requiera.

4. GARANTÍAS

4.1. Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Obra

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra suscrito entre la Entidad Contratante y el Consorcio Caquetá 2025, en la cláusula decima se definieron las características que deben cumplir las garantías expedidas por el contratista. Dichas garantías se describen a continuación y se incluyen como anexo al presente informe.

Tabla 4. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento – Anexo 0				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	\$ 240,106,217.10	61-44-101061224	12/09/2025	31/12/2030
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 120,053,108.55		12/09/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 480,212,434.20		Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960,424,868.40		12/09/2025	31/12/2025

Tabla 5. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento – Anexo 2				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	\$ 240,106,217.10	61-44-101061224	9/10/2025	28/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 120,053,108.55		9/10/2025	27/01/2026
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 480,212,434.20		Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960,424,868.40		9/10/2025	27/01/2026

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4	
--	--	--

Tabla 6. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento – Anexo 3				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	\$ 240,106,217.10	61-44-101061224	9/10/2025	29/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 120,053,108.55		9/10/2025	30/09/2029
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 480,212,434.20		Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960,424,868.40		9/10/2025	30/04/2026

Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 0				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	\$ 569,400,000.00	61-40-101022183	12/09/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$ 569,400,000.00		12/09/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	\$ 569,400,000.00		12/09/2025	31/12/2025

Tabla 8. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 2				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	\$ 569,400,000.00	61-40-101022183	9/10/2025	27/01/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	27/01/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	27/01/2026

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	---	--

Tabla 9. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS				
Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 3				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	\$ 569,400,000.00	61-40-101022183	9/10/2025	30/04/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	30/04/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	30/04/2026

Tabla 10. Resumen de actualización de pólizas contrato de obra.

Tipo Garantía	Póliza No.	Anexo	Tipo Modificación	Expedición
Cumplimiento	61-44-101061224	0	Original	19/09/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	0		
Cumplimiento	61-44-101061224	1	Según acta de inicio	27/10/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	1		
Cumplimiento	61-44-101061224	2	Según acta de inicio	
Responsabilidad civil	61-40-101022183	2		
Cumplimiento	61-44-101061224	3	Según Otrosí No. 001	29/12/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	3		

4.2. Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Interventoría

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Interventoría suscrito entre la Entidad Contratante y Geovial Ingeniería Zomac S.A.S, en la cláusula decima se definieron las características que deben cumplir las garantías expedidas por el contratista. Dichas garantías se describen a continuación y se incluyen como anexo al presente informe.

Tabla 11. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS				
Póliza de cumplimiento - Anexo 0				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato	\$ 16,820,980.00	CHU-100057685	25/09/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 8,410,490.00		25/09/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	\$ 16,820,980.00		31/12/2025	31/12/2030

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

Tabla 12. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento - Anexo 2				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato	\$ 16,820,980.00	CHU-100057685	9/10/2025	14/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 8,410,490.00		9/10/2025	14/01/2029
Calidad del servicio	\$ 16,820,980.00		14/01/2026	14/01/2031

Tabla 13. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento - Anexo 3				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato	\$ 16,820,980.00	CHU-100057685	29/12/2025	28/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 8,410,490.00		29/12/2025	30/04/2029
Calidad del servicio	\$ 16,820,980.00		30/04/2026	30/04/2031

5. VERIFICACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO CONTRACTUAL

5.1. Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de obra

De acuerdo con los documentos del proyecto el Contratista de obra deberá contar con el personal profesional mínimo y operacional requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.

Tabla 14. Personal mínimo requerido del Contratista de obra.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN MES (%)
Director de obra	1	50%
Residente de obra	1	100%
Especialista en estructuras	1	20%
Ingeniero electricista	1	25%
Profesional SISO	1	50%
Especialista ambiental	1	20%

El contratista de obra presentó el equipo de trabajo que hace parte del personal de obra durante la ejecución del proyecto en cumplimiento con el personal mínimo requerido en los documentos del proyecto.

Tabla 15. Personal del Contrato de Obra.

CARGO	NOMBRE
Director de obra	German Alonso Lozada Lozada
Residente de obra	Diego Alexander Ijaji Figueroa
Especialista en estructuras	German Alonso Lozada Lozada
Ingeniero electricista	Jorge Alonso Romero Giraldo
Profesional SISO	Oriana Andrea Murillo Cotamo
Especialista ambiental	German Alonso Lozada Lozada

El contratista de obra ha realizado el pago de seguridad social del personal anteriormente mencionado, la verificación se realizó para la elaboración del presente informe. Al final de este informe se anexa las planillas de seguridad social donde se vincula el personal de obra y personal mínimo requerido propuesto por el contratista en el contrato. De igual manera se anexa el certificado de paz y salvo de parafiscales a la fecha de corte del presente informe emitido por la contadora del contratista de obra Consorcio Caquetá 2025.

5.2. Verificación de pago de seguridad social y aportes legales

Durante el periodo de ejecución, el contratista de obra contó con el siguiente personal operativo y de apoyo además del personal administrativo del proyecto.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	---	--

Tabla 16. Personal de apoyo y operativo sst Diciembre

Nombre	Cédula	Cargo	Planilla No.
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Director	9498304548
Diego Alexander Ijaji Figueroa	1.061.792.456	Residente de Obra	
Jorge Alonso Romero Giraldo	10.251.613	Especialista Eléctrico	
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Especialista Estructural	
Oriana Andrea Murillo Cotamo	1.117.543.616	Profesional Siso	
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Especialista Ambiental	
José Elías Rincón Flórez	17.324.685	Maestro General	9496314281
Mario Ernesto Alvira Oviedo	1.119.586.124	Oficial	9496296052
Wilson Javier Alvis Alape	96.362.521	Técnico electricista	
Miller Hernán Aguilar Rodríguez	93.342.731	Paletero	
Nicacio Alvira Oviedo	1.119.581.906	Ayudante	

5.3. Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de interventoría

De acuerdo con los documentos del proyecto el interventor cuenta con el equipo que se relaciona a continuación.

Tabla 17. Personal mínimo requerido de interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN MES(%)
Personal de supervisión		
Director de Interventoría	1	50%
Residente de Interventoría	1	100%
Profesional SISO	1	100%
Ingeniero eléctrico	1	50%
Especialista en estructuras	1	50%

La Interventoría presentó el equipo de trabajo que hace parte del proyecto durante el periodo de ejecución en cumplimiento con el personal mínimo requerido en los documentos del proyecto.

Tabla 18. Personal de Interventoría.

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE	PROFESIÓN
Director de Interventoría	50%	Jhonattan Hoyos Márquez	Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
Residente de Interventoría	100%	Mayerly Molina Zambrano	Ingeniera Civil
Profesional SISO	100%	Jennifer Salazar	Administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniero eléctrico	50%	Yoylan Torres	Ingeniero Eléctrico

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE	PROFESIÓN
Especialista en estructuras	50%	Jhonattan Hoyos Márquez	Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras



Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

6. ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

6.1. Descripción de actividades ejecutadas en el mes

Durante desarrollo del proyecto se han ejecutado las siguientes actividades de obra:

REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

- Limpieza de fachada

REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE

- Desmonte y/o demolición de granito y adoquín

INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

- Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople

INSTALAR PISOS Y ENCHAPES

- Enchape cerámica pared
- Enchape cerámica antideslizante piso
- Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido
- Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro

INSTALAR ESTUCO Y PINTURA

- Pintura tipo 1 para muros interiores
- Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)

INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL

- Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación
- Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cieloraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.

INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS

- Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM
- Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM

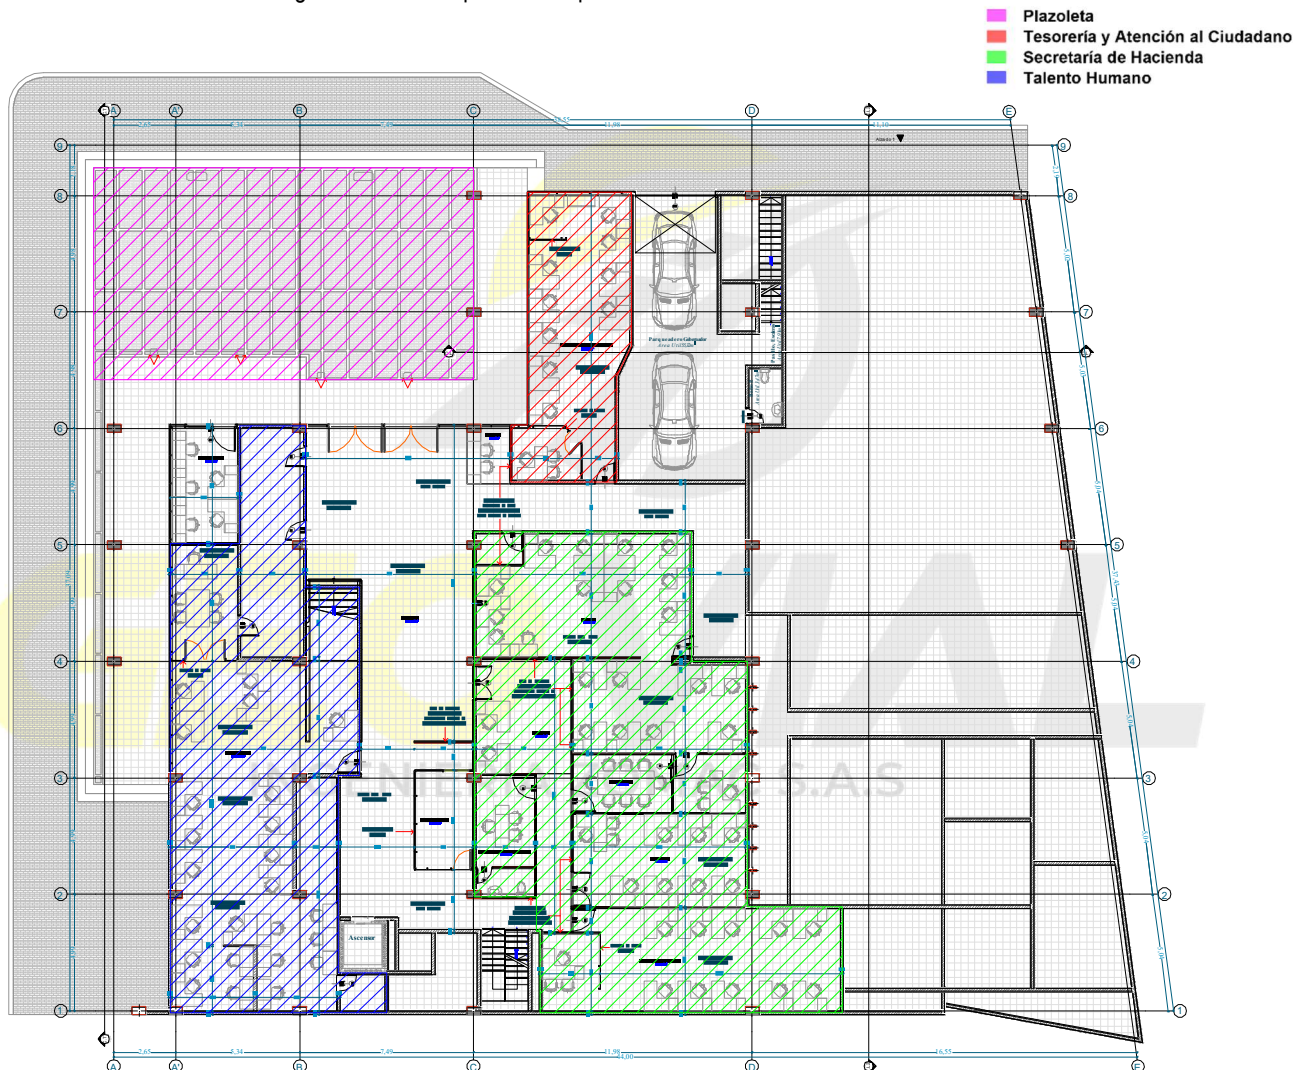
OBRAS ELÉCTRICAS

- Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K

y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70

- Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v
- Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar.

Figura 3. Planta arquitectónica primer nivel edificio Gobernación.



A continuación, se presenta el avance del contratista de obra en el periodo comprendido entre el **1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025**.

6.1.1. Localización y replanteo

Se ejecutaron las labores de localización y replanteo en las áreas intervenidas del primer piso y la plazoleta del edificio central de la Gobernación del Caquetá, incluyendo la materialización de ejes, referenciación de niveles y marcación de los elementos constructivos conforme a los planos arquitectónicos y estructurales aprobados. La actividad se desarrolló de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, la NSR-10 (Título A – Requisitos Generales de Diseño y Construcción) y las normas topográficas aplicables, garantizando la precisión geométrica, el control dimensional y la correcta ejecución de la obra, mediante el uso de un nivel laser.

Tabla 19. Localización y replanteo

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UND	CANTIDAD
1.1	Localización y replanteo	M2	195,48

6.1.2. Demolición de baldosa cerámica

Se realizó la demolición de baldosa cerámica de los baños donde se demolió muro de mampostería en las áreas del primer piso del edificio central de la Gobernación, conforme a lo que contempla el alcance del objeto establecido. El proceso constituyó en la demolición de la baldosa de cerámica con las herramientas y el personal con sus elementos de seguridad adecuados, asegurando la integridad del personal. Así, se garantiza que las áreas estén listas para los procesos de adecuación que se tiene establecidos y conforme a los requerimientos técnicos del proyecto.

Tabla 20. Demolición de baldosa cerámica.

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
2.5	Demolición de baldosa cerámica	M2	15,89

6.1.3. Desmote de vidrio templado

Se realizó el desmote de vidrio templado existente, incluyendo la remoción cuidadosa de las láminas de vidrio, herrajes y elementos de fijación, garantizando la integridad de los materiales desmontados y la seguridad del personal durante la actividad. Los elementos retirados fueron nuevamente instalados en la misma área un poco mas adelante, cumpliendo su función nuevamente y siguiendo los parámetros de seguridad y el reglamento técnico vigente.

Tabla 21. Desmote de vidrio templado

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
2.7	Desmote de vidrio templado	M2	7,35

6.1.4. Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera

Se ejecutó la actividad de retiro de material producto de las demoliciones y desmontes, incluyendo el cargue, descargue y transporte fuera de las instalaciones del edificio central de la Gobernación, conforme al alcance del contrato y a la normativa ambiental vigente. Los trabajos se realizaron de manera controlada, evitando afectaciones a las áreas en funcionamiento y garantizando la seguridad del personal y de los usuarios del edificio.

El material retirado fue transportado y dispuesto en escombrera autorizada, cumpliendo con los lineamientos ambientales y de manejo de residuos de construcción y demolición. Al finalizar la actividad, las áreas intervenidas quedaron limpias, despejadas y en condiciones adecuadas para la continuidad de actividades de obra, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Tabla 22. Retiro de material cargue y descargue

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M3	6

6.1.5. Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha

Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha, consiste en una limpieza profunda, retiro de suciedad y residuos adheridos, corrección de piezas sueltas o deterioradas, emboquillado y sellado de fisuras o pequeños agujeros, y acabado final para recuperar las condiciones de funcionalidad, seguridad y estética del piso, conforme a las especificaciones técnicas del contrato, en el Edificio Central de la Gobernación.

Tabla 23. Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
5,3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M ²	206,76

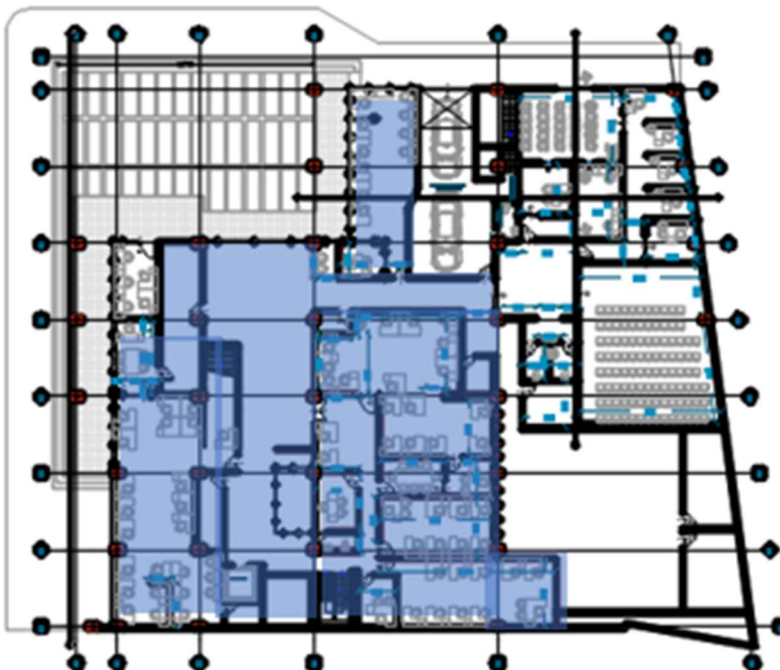


Figura 4: Mantenimiento Piso tipo Alpha

6.1.6. Estuco para muros

Para el desarrollo de la actividad Estuco para muros en el edificio central de la Gobernación, se incluyeron trabajos de preparación, limpieza de las superficies, resane de imperfecciones, aplicación de estuco en las áreas intervenidas, afinado y lijado para lograr una superficie lisa y uniforme, corrección de detalles y limpieza final, garantizando condiciones óptimas para posteriores acabados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Tabla 24. Estuco para muros

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UND	CANTIDAD
6,2	Estuco para muros	M2	488,07

6.1.7. Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación

Se instaló la estructura del cielo raso plano en drywall según el diseño, sujetando los elementos como viguetas de carga en el sentido más corto de la habitación, niveladas con una precisión al milímetro, para lo cual se utilizó un láser como apoyo y como referencia.

El proceso de instalación de la estructura de este cielo raso en drywall, requiere instalar paneles de sujeción donde van las demás viguetas de la estructura, ésta debe ser lo suficientemente fuerte para resistir el peso de las láminas que se montan después.

Tabla 25. Cielo raso plano en drywall

ÍTEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
7,1	Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	140,625

6.1.8. Muro liviano en superboard e= 8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)

Se ejecutó la actividad correspondiente a la construcción de muro liviano en sistema superboard de 8mm de espesor, instalado a dos caras, en las áreas definidas del Edificio Central de la Gobernación, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. Los trabajos incluyen el suministro e instalación de la estructura metálica galvanizada, placas de superboard, elementos de fijación, tratamiento de juntas y acabados necesarios para su correcto funcionamiento, pero este último aún no se ejecuta.

La actividad se desarrolló cumpliendo las especificaciones técnicas, normas vigentes y los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, garantizando la correcta alineación, nivelación y estabilidad del sistema. Al finalizar, el muro liviano queda debidamente instalado, faltando solamente el acabado, de acuerdo con el alcance contractual y los diseños aprobados.

Tabla 26. Muro liviano en superboard e= 8mm 2 caras

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
7,3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	159,61

6.1.9. Suministro e instalación División en vidrio templado 10 mm

Esta actividad ejecutada conforme a planos y especificaciones técnicas, incluyendo suministro del vidrio, perfilera y herrajes necesarios, anclajes, nivelación, aplome y sellos perimetrales. La actividad contempla mano de obra calificada, equipos, herramientas y materiales requeridos para su correcta instalación, garantizando seguridad, estabilidad, funcionalidad y un adecuado acabado arquitectónico, dejando la división totalmente instalada y operativa.

Tabla 27 Suministro e instalación División en vidrio templado 10 mm

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
8,4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 mm	M2	11,15

6.1.10. Zapata en concreto reforzado 4000 PSI

La actividad comprendió excavación y adecuación del terreno, conformación y compactación. Se instaló una base en ciclópeo de cuarenta centímetros, suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo según planos estructurales, formaleta, vaciado de concreto de resistencia 4000 PSI, nivelación, curado y limpieza

final del área intervenida, garantizando estabilidad estructural y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Tabla 28. Zapata en concreto reforzado 4000 PSI

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
9,3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	8,38

6.1.11. Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI

Los trabajos comprendieron el replanteo y nivelación, excavación según diseño estructural, suministro, corte y colocación de acero de refuerzo conforme a planos, formaleta, vaciado de concreto de resistencia especificada, vibrado y compactación, curado y desencofrado, control de calidad y limpieza final del área intervenida, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y estructurales del proyecto.

Tabla 29. Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
9,4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	5,26

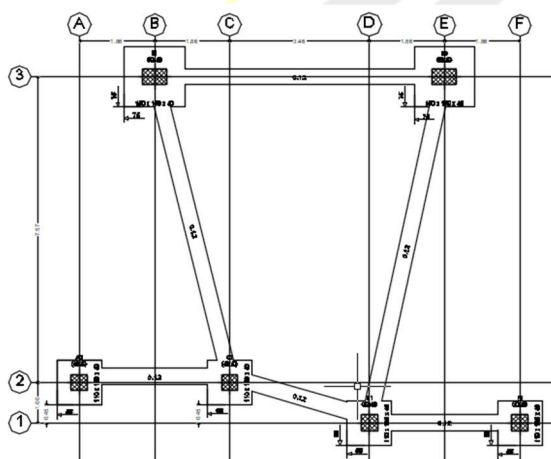


Figura 5: Vigas de cimentación en concreto reforzado de 4000 PSI

6.1.12. Pañete filos marcos puertas o ventanas

La actividad incluyó la preparación y limpieza de las superficies, resane de bordes y encuentros, aplicación de mortero para conformación y alineación de filos, afinado y corrección de imperfecciones, garantizando acabados uniformes, alineados y acordes con las especificaciones técnicas y arquitectónicas del proyecto, así como la limpieza final del área intervenida.

Tabla 30. Pañete filos marcos puertas o ventanas

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
9,5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	10,5

6.1.13. Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI)

Los trabajos incluyeron el suministro del acero conforme a especificaciones técnicas, corte y doblado según planos estructurales, amarre y fijación, colocación en elementos estructurales, verificación de recubrimientos y espaciamientos, control de calidad y limpieza final del área intervenida, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y de los diseños estructurales del proyecto.

Tabla 31. Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI).

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
9,6	Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI)	ML	351,25

6.1.14. Excavación manual

La actividad comprendió replanteo del área a intervenir, excavación manual conforme a cotas y dimensiones establecidas en los diseños, perfilado y nivelación del terreno, retiro y disposición del material excavado en sitio autorizado, limpieza del área intervenida y verificación de condiciones para la ejecución de posteriores actividades constructivas, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad.

Tabla 32. Excavación manual

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
9,7	Excavación manual	M3	22,28

6.1.15. Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye; un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros

La actividad incluyó el suministro del tablero conforme a especificaciones técnicas, instalación y anclaje en sitio, suministro e instalación de breaker industrial totalizador hasta 50 A, así como breakers enchufables de uno, dos y tres polos según el diagrama general de tableros, identificación de circuitos, verificación de aprietes, pruebas de funcionamiento, cumplimiento de la normatividad eléctrica vigente y limpieza final del área intervenida.

Tabla 33. Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
10,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye; un breaker industrial totalizador hasta 50 A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	3

6.1.16. Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye; un breaker industrial totalizador de hasta 50 A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.

La actividad incluyó el suministro del tablero conforme a especificaciones técnicas, instalación y anclaje en sitio, suministro e instalación de breaker industrial totalizador hasta 50 A, así como breakers enchufables de uno, dos y tres polos según el diagrama general de tableros, identificación de circuitos, verificación de aprietes, pruebas de funcionamiento, cumplimiento de la normatividad eléctrica vigente y limpieza final del área intervenida.

Tabla 34. Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
0,5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye; un breaker industrial totalizador hasta 50 A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	3

6.1.17. Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3x12 AWG y tubo PVC Sch40 ½"

La actividad ejecutada incluyó el suministro de materiales conforme a especificaciones técnicas, instalación de tubería y accesorios, tendido, identificación de fases, neutro y puesta a tierra, verificación de continuidad y aislamiento, pruebas de funcionamiento, cumplimiento de la normatividad eléctrica y limpieza final del área intervenida.

Tabla 35. Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 24000 BTU

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
10,6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3x12 AWG tubo PVC Sch40 ½"	ML	400

6.1.18. Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva

La actividad ejecutada incluyó el suministro e instalación de unidades manejadoras de aires acondicionados tipo cassette de 360°, instalada en techo, con capacidad de 24.000 BTU, los elementos de fijación y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento. Esta actividad no contempla el suministro ni la instalación de la unidad condensadora correspondiente.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	--	--

Tabla 36. Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360°

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
10,15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	10

6.1.19. Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva

La actividad ejecutada incluyó el suministro e instalación de unidades manejadoras de aires acondicionados tipo cassette de 360°, instalada en techo, con capacidad de 24.000 BTU, los elementos de fijación y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento. Esta actividad no contempla el suministro ni la instalación de la unidad condensadora correspondiente.

Tabla 37. Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360°

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
10,16	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	7

6.1.20. Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T – AWG, en ducto de PVC SCH 40 de 1+1/4”

Se realizó de manera correcta la actividad de las acometidas parciales desde el Tablero General de Distribución a los Tableros de Distribución, incluyendo el suministro de cable de cobre aislado, ductos de PVC SCH e igualmente los elementos de fijación, esta actividad fue desarrollada por personal capacitado, teniendo en cuenta la normativa técnica y la de seguridad personal también.

Tabla 38. Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
10,20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F-1#8T – AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4”	ML	150

6.1.21. Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3”

Esta actividad ejecutada con éxito incluyó el suministro de cable de cobre aislado para la instalación de la Acometida parcial desde el Tablero General de Distribución a Tablero General de Condensadoras, la cual también incluye las conexiones eléctricas y elementos de fijación, igualmente se desarrolló con personal capacitado cumpliendo la normativa técnica y la de seguridad personal.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	--	--

Tabla 39. Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
10,23	Suministro e instalación de Acometidas parcial de TGD a TGC (A.A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4 en ducto EMT de 3"	ML	26

6.1.22. Anclaje de platina 300*300 mm de ½"

Instalada mediante un sistema de fijación, el cual garantiza la correcta sujeción y estabilidad del elemento estructural a instalar. El cual va anclado a los pedestales de las zapatas construidas siguiendo los planos estructurales y la normativa técnica, también el personal capacitado y con protección personal.

Tabla 40. Anclaje de platina 300*300 mm de ½"

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
11,8	Anclaje de platina 300*300mm de ½"	UND	4

6.1.23. Anclaje de platina 300*450 mm de 5/8"

Instalada mediante un sistema de fijación, el cual garantiza la correcta sujeción y estabilidad del elemento estructural a instalar. El cual va anclado a los pedestales de las zapatas construidas siguiendo los planos estructurales y la normativa técnica, también el personal capacitado y con protección personal.

Tabla 41. Anclaje de platina 300*300 mm de ½"

ITEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
11,9	Anclaje de platina 300*450mm de 5/8"	UND	2

6.2. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.

Tabla 42. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES		
1,1	Localización y replanteo	M2	694,06
1,2	Cerramiento en tela verde	ML	59,90
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES		
5,3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	556,76
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL		
7,1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	412,59
7,3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	202,36
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS		
9,6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	351,25
9,7	Excavación manual	M3	22,28
10	OBRAS ELÉCTRICAS		
10,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para	UND	3,00

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
	totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.		
10,5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	3,00
10,6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	400,00
10,7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	119,00
10,8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	265,00
10,9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	110,00
10.13	Desmonte de aparatos de salidas eléctricas	UND	190,00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	7,00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	10,00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	7,00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	150,00
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	26,00
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1,00

A continuación, se presenta la tabla consolidada de actividades ejecutadas con sus respectivas cantidades acumuladas al corte correspondiente al período de ejecución No. 4. Se precisa que las cantidades aquí relacionadas corresponden exactamente a las registradas en el Acta Parcial de Obra No. 1, documento que sirve de soporte para el trámite de cobro por parte del contratista. La información ha sido verificada por la interventoría, garantizando su coherencia con el avance físico reportado y con los registros de seguimiento efectuados en obra.

Tabla 43. Resumen de cantidades ejecutadas a la fecha de corte del presente informe.

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				\$ 5.716.225,00
1,1	Localización y replanteo	M2	\$ 3.834,00	694,06	\$ 2.661.026,00
1,2	Cerramiento en tela verde	ML	\$ 8.446,00	59,90	\$ 505.915,00
1,3	Limpieza de fachada	M2	\$ 7.115,14	358,29	\$ 2.549.284,00
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE				\$ 9.234.982,00
2,1	Desmonte de marcos y puertas.	UND	\$ 19.580,00	13,00	\$ 254.540,00
2,2	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	\$ 19.580,00	1,00	\$ 19.580,00
2,3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M2	\$ 16.316,00	2,81	\$ 45.848,00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
2,4	Desmante de cielo raso existente	M2	\$ 10.116,00	515,08	\$ 5.210.549,00
2,5	Demolición de baldosa cerámica	M2	\$ 13.054,00	21,32	\$ 278.311,00
2,6	Desmante o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	\$ 65.866,00		\$ -
2,7	Desmante de vidrio templado	M2	\$ 17.516,00	7,35	\$ 128.743,00
2,8	Desmante y/o demolición de granito y adoquín	M2	\$ 13.985,00	136,85	\$ 1.913.847,00
2,9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	\$ 10.275,00	19,65	\$ 201.904,00
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M3	\$ 49.634,00	18,00	\$ 893.412,00
2.11	Desmante de divisiones en aluminio y vidrio	M2	\$ 13.144,00	21,93	\$ 288.248,00
3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS				
3,1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	\$ 645.836,00		
3,2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4".	ML	\$ 46.783,00		
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA				\$ 876.625,00
4,1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	\$ 876.625,00	1,00	\$ 876.625,00
4,2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	\$ 608.074,77		
4,3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	\$ 31.507,00		
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				\$ 25.152.997,00
5,1	Enchape cerámica pared	M2	\$ 91.483,00	14,02	\$ 1.282.592,00
5,2	Enchape cerámica antideslizante piso	M2	\$ 82.713,00	2,88	\$ 238.213,00
5,3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	\$ 36.771,00	556,76	\$ 20.472.622,00
5,4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	\$ 11.594,00	25,50	\$ 295.647,00
5,5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	\$ 21.857,00	131,03	\$ 2.863.923,00
5,6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M2	\$ 136.118,00		\$ -
5,7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M2	\$ 51.352,00		\$ -
6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA				\$ 27.099.550,00
6,1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M2	\$ 17.090,00	488,07	\$ 8.341.116,00
6,2	Estuco para muros.	M2	\$ 18.559,00	488,07	\$ 9.058.091,00
6,3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	\$ 27.074,00	358,29	\$ 9.700.343,00
6,4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M2	\$ 32.728,00		\$ -
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL				\$ 70.101.051,00
7,1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	\$ 83.105,00	412,59	\$ 34.288.292,00
7,2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	\$ 56.881,00	255,74	\$ 14.546.747,00
7,3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	\$ 105.090,00	202,36	\$ 21.266.012,00
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS				\$ 23.712.210,00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
8,1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.552.005,00		\$ -
8,2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 742.609,00	17,72	\$ 13.159.031,00
8,3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	\$ 590.779,00	6,36	\$ 3.757.354,00
8,4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 609.491,00	11,15	\$ 6.795.825,00
8,5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	\$ 423.869,00		\$ -
8,6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.647.505,00		\$ -
8,7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.747.405,00		\$ -
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS				\$ 17.209.011,00
9,1	Pañete 1:4	M2	\$ 29.427,00		\$ -
9,2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M3	\$ 145.660,00		\$ -
9,6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	\$ 7.030,00	351,25	\$ 2.469.288,00
9,7	Excavación manual	M3	\$ 41.221,00	22,28	\$ 918.404,00
10	OBRAS ELÉCTRICAS				\$ 419.123.670,00
10,1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	\$ 8.100.949,00		\$ -
10,2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	\$ 5.711.516,00		\$ -
10,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	\$ 1.342.899,00	3,00	\$ 4.028.697,00
10,4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 100A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	\$ 2.514.715,00		\$ -
10,5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	\$ 1.280.629,00	3,00	\$ 3.841.887,00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
10,6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	\$ 30.791,00	400,00	\$ 12.316.400,00
10,7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	\$ 261.708,00	119,00	\$ 31.143.252,00
10,8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	\$ 194.105,00	265,00	\$ 51.437.825,00
10,9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 216.691,00	110,00	\$ 23.836.010,00
10.10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	\$ 189.272,00		\$ -
10.11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 131.181,00		\$ -
10.12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	\$ 5.325.286,00		\$ -
10.13	Desmonte de aparatos de salidas eléctricas	UND	\$ 11.454,00	190,00	\$ 2.176.260,00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	\$15.215.430,00	7,00	\$ 106.508.010,00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	\$ 8.500.713,00	10,00	\$ 85.007.130,00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	\$ 6.398.727,00	7,00	\$ 44.791.089,00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	\$ 77.341,00		\$ -
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	\$ 179.172,00	95,00	\$ 17.021.340,00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	\$ 197.091,00	15,00	\$ 2.956.365,00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	\$ 84.668,00	150,00	\$ 12.700.200,00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	--

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
10.21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS , 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	\$ 132.922,00		\$ -
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	\$ 285.107,00		\$ -
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	\$ 553.810,00	26,00	\$ 14.399.060,00
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	\$ 756.173,00		\$ -
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	\$ 6.960.145,00	1,00	\$ 6.960.145,00
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2 , UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"	ML	\$ 92.214,00		\$ -
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 47.217.125,00
11,1	Policarbonato alveolar para cubierta	M2	\$ 132.190,00		\$ -
11,2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 864.806,00		\$ -
11,3	Canal en lamina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	\$ 118.185,00		\$ -
11,4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.838,00	2127,72	\$ 46.465.149,00
11,5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.855,00		\$ -
11,6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	\$ 235.048,00		\$ -
11,7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 3.256.543,00		\$ -
11,8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	\$ 106.393,00	4,00	\$ 425.572,00
11,9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	\$ 163.202,00	2,00	\$ 326.404,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				\$ 645.443.446,00
	ADMINISTRACIÓN	26,00%			\$ 167.815.295,96
	IMPREVISTOS	1,00%			\$ 6.454.434,46
	UTILIDAD	3,00%			\$ 19.363.303,38
	TOTAL A.I.U. 30%				\$ 193.633.034,00
	Costo certificación RETIE				
	Costo certificación RETILAP				
	Plan de Manejo Ambiental				
	Plan de Manejo de Tránsito				
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				\$ 839.076.480,00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

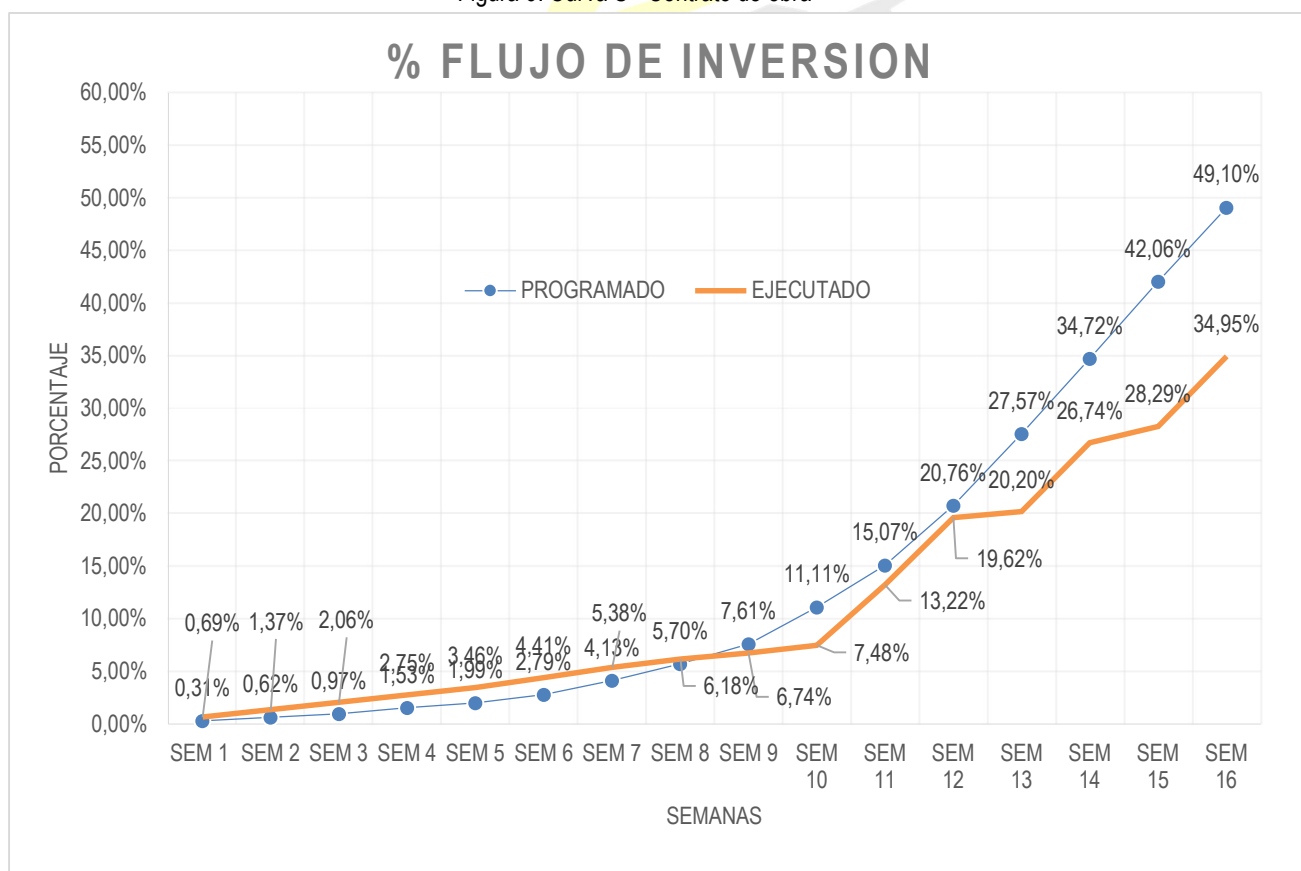
6.3. Informe de avance físico de la obra

A continuación, se muestra el avance físico de la obra durante el período de ejecución, el cual incluye el análisis comparativo entre el avance programado y el avance ejecutado, identificando variaciones, posibles retrasos o adelantos. Lo anterior se realizó a partir de seguimiento y control del cronograma aprobado del proyecto, el cual se incluye como documento anexo al presente informe.

Tabla 44. Tabla de programación vs Ejecución

Fecha de Inicio	9 de octubre de 2025
Fecha Final de corte (según el presente informe)	31 de enero de 2026
% Avance de obra programado	49 %
% Avance de obra ejecutado	32 %
% Avance durante el periodo	%

Figura 6. Curva S - Contrato de obra



De acuerdo con el análisis del avance físico del proyecto, se evidencia un desempeño inferior en comparación con el avance programado a la fecha de corte. El avance acumulado programado corresponde

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.</p> <p>CONTRATO No. 202500000893</p> <p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	--	--

al 49,10 %, mientras que el avance ejecutado alcanza únicamente el 34,95 %, lo que representa un atraso del 14,15 %.

Adicionalmente, durante las semanas reportadas en el presente informe se observa una desaceleración en el ritmo de ejecución, reflejada en un menor rendimiento respecto a lo planificado. Esta tendencia incrementa el riesgo de incumplimiento del cronograma contractual.

En consecuencia, se hace necesario implementar medidas correctivas inmediatas orientadas a recuperar el atraso presentado, optimizar los recursos disponibles y garantizar el cumplimiento oportuno de las metas establecidas en el cronograma del proyecto.



7. INFORMACIÓN FINANCIERA

7.1. Informe de avance financiero de la obra

Tabla 45. Información Financiera

Descripción	Valor	Valor	Porcentaje
Valor del contrato	\$ 2,401,062,171.00		100%
Anticipo		\$ 960,424,868.00	40%
Valor Acta Parcial No. 1 por pagar		\$ 714,518,922.00	34,95%
Amortización Acta No. 1		\$ -335.630.592,00	
Saldo Por Cobrar		\$ 1 061 748.973	
Sumas Iguales	\$ 2,401,062,171.00	\$ 2,401,062,171.00	

7.2. Información de manejo del anticipo

En el contrato de obra No. 202500000874, en la cláusula octava **Forma de Pago** se estipula lo siguiente:

“El sistema de pago es a través de precios unitarios El Departamento del Caquetá, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, pagará al Contratista el valor del contrato, de la siguiente manera:

(i) **UN ANTICIPO** hasta del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previa presentación y aprobación de las garantías correspondientes, constitución de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, presentación de un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor y supervisor designado por la entidad.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.

La amortización del anticipo se realizará mediante deducciones del 40% del valor de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a título de anticipo. De igual manera el valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales de avance de obra, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa amortización del porcentaje que se entrega a título de anticipo,

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

presentación de informe de actividades en medio físico y magnético, con registros fotográficos y certificación de cumplimiento expedida por el interventor externo del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el interventor o el supervisor de solicitar informes cuando lo considere necesario.”

El anticipo fue desembolsado a la cuenta del contratista el 19 de noviembre de 2025. El valor del anticipo es del cuarenta por ciento (40%) correspondiente a novecientos sesenta millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos (\$ 960,424,848.00) M/CTE para lo cual se presentó el siguiente plan de inversión del anticipo.

Tabla 46. Plan de inversión del anticipo del contrato de obra.

No.	Descripción	Valor	Porcentaje
1	Compra de materiales	\$ 620,318,651.00	64.59%
2	Mano de Obra	\$ 282,480,725.00	29.41%
3	Transporte o Alquiler de maquinaria y Equipo	\$ 57,625,492.00	6.00%
TOTAL		\$ 960,424,868.00	100%

A continuación, se presenta el informe de pagos relacionados con el manejo del anticipo

Tabla 47. Informe de inversión del anticipo del contrato de obra.

Factura No.	Descripción	PROVEEDOR	FECHA	VALOR
FE2773	Suministro e instalación de los sistemas de aire acondicionado y/o ventilación mecánica que acompañaran la reforma y remodelación de la oficina de atención y orientación ciudadana - gobernación del Caquetá ubicada en el municipio de Florencia.	Coll Aires Multi Aires SAS	15/11/25	246.750.262,0
M11938	1 pantalla led p8 exterior 58 cabinets de 96cm x 80cm incluyendo dos cabinets especiales para una integración optima- garantía 2 año- transmisión de imágenes y videos	Zuled Soluciones SAS	18/11/25	271.317.731,10
FE 309	Tubería estructural y Soldadura	Induperfiles y PVC de Colombia SAS	20/11/25	282.480.725,00
FE 310	Tubería estructural y Soldadura		20/1/25	10.300.000,00
FE 319	LAMINAS PVC Blanco Varios (Valor factura 69.750.657,00)		24/11/25	19.328.655,00
1	SUBTOTAL Compra de materiales			569.896.650,10
ALT 96	Mano de obra y construcción para el contrato de obra dc-ge-lp-016-2025 cuyo objeto es "la adecuación y mejoramiento integralde espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá	ALTING INGENIERÍA SAS	25/11/25	282,480,725,00
2	SUBTOTAL Mano de Obra			\$282,480,725.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CONTRATO DE OBRA No DC-GE-LP-016-2025	ALTING INGENIERÍA SAS	25/11/25	\$282,480,725.00
3	SUBTOTAL Transporte o Alquiler de maquinaria y Equipo			\$282,480,725.00
	TOTAL, ANTICIPO PAGADO			\$910.002.867,10

8. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

8.1. Problemas presentados y mecanismos de solución propuestos

- Durante el seguimiento al avance del proyecto, se evidenció atraso en las actividades correspondientes a la adecuación de algunas oficinas, particularmente en las oficinas destinadas al funcionamiento de Talento Humano y Tesorería y Atención al ciudadano. Esta situación obedece a que la instalación de las conexiones de puntos de voz y datos no se encuentra contemplada dentro del alcance contractual, lo cual ha generado una interferencia en la programación de actividades como la instalación de cielorrasos, conformación de muros y demás acabados arquitectónicos. Toda vez que estos sistemas deben quedar debidamente instalados, probados y certificados antes de proceder con el cerramiento definitivo de los elementos constructivos, se ha recomendado definir a la mayor brevedad el mecanismo administrativo que permita la ejecución de estas actividades complementarias, con el fin de mitigar mayores afectaciones al cronograma general y evitar posibles sobrecostos derivados de intervenciones posteriores.
- Durante la ejecución del proyecto se evidenciaron mayores cantidades de obra frente a las inicialmente previstas, las cuales fueron presentadas en un balance general para revisión por parte de la entidad y la interventoría. En este sentido, se ha solicitado evaluar la viabilidad de una posible adición presupuestal, considerando que dichas cantidades adicionales y algunos ítems no contemplados inicialmente resultan necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y adecuación integral del edificio.
- Se evidenció una cantidad reducida de personal ejecutando las actividades del proyecto, situación que limita el avance físico de las obras y podría generar afectaciones en el cumplimiento del cronograma establecido. Ante esta situación, se recomendó al contratista de obra aumentar el número de frentes de trabajo con el fin de optimizar los rendimientos, evitar atrasos y garantizar el desarrollo oportuno de las actividades programadas, minimizando el riesgo de incumplimientos en los plazos contractuales.

8.2. Control de calidad

Para garantizar la calidad de las actividades desarrolladas como parte de la Adecuación y mejoramiento de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación se verificó lo siguiente:

8.3. Control de acceso de materiales

Durante el periodo de ejecución se realizaron controles a los materiales tales como revisión de los mismos, solicitud de fichas técnicas, verificación del modo de almacenamiento.

8.4. Soporte de los ensayos, pruebas y certificados de calidad de materiales

Para garantizar la calidad de las obras ejecutada se realizó la verificación del cumplimiento en cuanto a especificaciones técnicas de los materiales empleados en la fabricación de concretos. Durante el periodo de ejecución, el contratista de obra presentó los resultados correspondientes al diseño de mezcla de concreto, así como los ensayos de laboratorio realizados al concreto empleado para la construcción del sistema de cimentación de la cubierta proyectada, incluyendo pruebas de resistencia a la compresión conforme a las especificaciones técnicas del contrato. De igual manera, se presentaron las certificaciones de calidad de los materiales pétreos provenientes de cantera, en las cuales se acredita su procedencia y el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para su uso en la obra. Los documentos mencionados se incluyen como anexo al presente informe.

8.5. Control de maquinaria y equipos.

Se realizó el control de equipos utilizados durante la ejecución de actividades incluidas en el presente informe

Tabla 48. Relación de equipo empleado en obra.

Equipo	Cumple
Herramienta menor	Si
Andamios metálicos por sección	Si
Mezcladora de concreto	Si
Vibrador de concreto	SI
Equipo soldador eléctrico	SI
Grúa	Si

8.6. Documentos suscritos

8.6.1. Documentación del contrato de obra

Tabla 49. Documentación del contrato de obra.

No.	Referencia	Fecha	Descripción
1	Contrato de obra No. 202500000874	12/09/2025	Contrato suscrito entre la Gobernación del Caquetá y el Consorcio Caquetá 2025.
2	Acta de inicio	9/10/2025	Acta mediante la cual se da inicio a las actividades del contrato de obra No. 202500000874.
3	Acta de pago anticipo	27/10/2025	Acta mediante la cual se autoriza el desembolso del pago del anticipo.
4	Otrosí No. 001 al contrato de obra No. 202500000874	29/12/2025	Acta mediante la cual se modifica el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2026

8.6.2. Comités de seguimiento

Tabla 50. Comités de Seguimiento

No	Referencia	Fecha	Objeto
1	Acta de comité No. 1	21/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento al avance físico y técnico del proyecto Verificar el estado de ejecución en las distintas áreas de trabajo Revisar la documentación requerida Definir compromisos clave para asegurar el cumplimiento de los plazos, la calidad de la obra y los requisitos administrativos, incluyendo la gestión de permisos, la radicación del anticipo, la actualización de pólizas y la coordinación de próximas actividades operativas y técnicas.
2	Acta de comité No. 2	27/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el estado del trámite de la licencia de construcción Socializar las actividades no previstas y los motivos que han generado retraso en la ejecución de las obras, para la solicitud de prórroga del contrato de obra Analizar la solicitud de Adición presupuestal por parte del contratista de obra
3	Acta de comité No. 3	15/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> Socializar el avance del proyecto con respecto a la programación Lectura y verificación del Acta de Comité de obra No 2 Verificación del cumplimiento de compromisos anteriores Solicitud de prórroga del contrato de obra e Interventoría Elaboración de formatos para Solicitud de Prorroga
4	Acta de comité No. 4	21/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de prórroga del contrato de obra e Interventoría Elaboración de formatos para Solicitud de Prorroga

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

8.6.3. Relación de correspondencia

Tabla 51. Control de Correspondencia

NO.	REFERENCIA	ASUNTO	FECHA	ENVÍA	RECIBE
1	CQ25-CO0874-0001-09-10-2025	Radicación afiliaciones personal de obra y personal profesional, para el inicio del contrato de obra.	9/10/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
2	GV-CI-00893-001-09-10-2025	Radicación afiliaciones personal, para el inicio de los contratos de obra e interventoría. (Contratos 202500000874 y 202500000893)	9/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
3	GV-CI-00893-001A-20-10-2025	Invitación a primer comité técnico de obra	20/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consorcio Caquetá 2025
4	CQ25-CO0874-003-27-10-2025	Entrega certificación bancaria fiducia	27/10/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
5	GV-CI-00893-002-27-10-2025	Radicación plan de inversión aprobado contrato de obra N° 202500000874	27/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
6	CQ25-CO074-004-05-11-2025	Radicación plan de inversión del anticipo	5/11/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
7	GV-CI-00893-003-10-11-2025	Informe ejecutivo de ejecución	10/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
8	3764	Reiteración por Segunda oportunidad de cumplimiento obligaciones contractuales y compromisos adquiridos en comité técnico del 21 de octubre de 2025 del contrato de obra No. 202500000874	11/11/2025	Gobernación del Caquetá	Geovial Ingeniería Zomac SAS
9	CQ25-CO0874-005-11-11-2025	Solicitud de adición presupuestal y prórroga al contrato de obra N° 202500000874	11/11/2025	Consorcio Caquetá 2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

NO.	REFERENCIA	ASUNTO	FECHA	ENVÍA	RECIBE
10	GV-CI-00893-004-19-11-2025	Aval solicitud de prórroga en tiempo a los contratos de Obra e Interventoría (202500000874 y 202500000893)	19/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
11	GV-CI-00893-005-25-11-2025	Invitación a segundo comité técnico de obra	25/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025
12	CQ25-CO0874-006-28-11-2025	Solicitud de prórroga No. 1	28/11/2025	Consortio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
13	CQ25-CO0874-007-02-12-2025	invitación a primera socialización del contrato de obra	2/12/2025	Consortio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá
14	GV-CI-00893-008-11-12-2025	Invitación a tercer comité técnico de obra	11/12/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025
15	GV-CI-00893-009-19-09-2026	Invitación al cuarto comité técnico de obra	19/01/2026	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025
16	Gmail-GV-CI-00893-009-27-01-2026	Viabilidad y solicitud de adición presupuestal a los contratos de Obra (202500000874) e Interventoría (202500000893)	27/01/2026	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
17	GV-CI-00893-010-10-02-2026	Invitación al quinto comité técnico de obra	10/02/2026	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025

INGENIERIA ZOMAC S.A.S

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

9. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Tabla 52. Verificación del cumplimiento de Obligaciones contractuales

Ítem	Actividad	Cumple
OBLIGACIONES GENERALES		
a	Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.	Si
b	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.	Si, se adoptan los planes de Tránsito y Manejo Ambiental.
c	Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.	Si, se presenta las planillas de pago de seguridad social.
d	Mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	N/A
e	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.	N/A
f	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	N/A
g	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	N/A
h	Notificar a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	N/A
i	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Si, se presenta las garantías con las características establecidas en el contrato de obra.
j	Presentar los documentos que le solicite el supervisor e Interventor.	Si
k	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	N/A
l	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	Si
m	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el supervisor y el Interventor.	Si
n	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de iniciación de obra respectiva, el contratista deberá presentar los documentos técnicos que solicite el interventor y supervisor del contrato.	Si
o	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	Si, se presenta el cronograma de obra del proyecto.

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
p	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Si
q	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad.	Si
r	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual, evitando dilaciones y retrasos.	Si
s	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho	N/A
t	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Si
u	Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Contratación de la entidad los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del cumplimiento a las leyes que rigen la materia.	Si
v	Informar oportunamente a la interventoría, supervisión y a la entidad sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato.	Si
w	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	Si, se presenta el cronograma de obra del proyecto.
x	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Si
y	Acatar las instrucciones y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del DEPARTAMENTO, la INTERVENTORÍA.	Si
z	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos.	Si
aa	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	N/a
bb	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Si
cc	El contratista deberá contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia lícita de minerales, y deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con relación a las actividades a ejecutar en el presente contrato.	N/a
dd	Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos y de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato.	N/a
ee	Constituir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Si, se presenta las garantías vigentes con las características establecidas en el contrato de obra.
ff	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado garantizando los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. En este orden de ideas, será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con EL DEPARTAMENTO.	Si
gg	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros, operarios, profesionales y todo el	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

Ítem	Actividad	Cumple
	personal de intervienen en cada una de las obras a ejecutar, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.	
hh	Es responsabilidad del contratista ubicar una valla por la obra, con las siguientes características: Dimensiones: Vallas rectangulares de dos (2) metros de ancho por uno metro de altura. Texto: Elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. Contenido: Deberá contener como mínimo el escudo del Departamento del Caquetá, el eslogan del gobierno “OBRAS Y NO PROMESAS”, nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, interventor y fecha de inicio y terminación del proyecto. Instalación de la valla: Se instalará en sitio visible previamente determinados por el interventor. El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la obra.	Si
ii	EL CONTRATISTA, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, deberá abstenerse de celebrar contratos de interventoría con EL DEPARTAMENTO, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del presente contrato.	Si
jj	Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Interventoría de EL DEPARTAMENTO, los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del cumplimiento a las leyes que rigen la materia.	Si
kk	Informar oportunamente a la interventoría y al DEPARTAMENTO sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato de obra.	Si
Respecto a la obra		
a	Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.	Si
b	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	Si, se adoptan los planes de Tránsito y Manejo Ambiental.
c	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	N/a
d	EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.	Si
e	EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.	N/a
f	Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.	Si, se tramita el permiso de El permiso de Obra Menor.
g	El contratista suministrará junto con cada equipo, una copia de todos aquellos detalles constructivos principales incluyendo también un diagrama unifilar de las redes construidas.	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual		
a	Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato y ofrecidos.	Si
b	En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL DEPARTAMENTO o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si
c	El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
d	El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por EL DEPARTAMENTO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
e	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.	Si, el 100% del personal no calificado corresponde a personas de la región.
f	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cinco por ciento (5%) del personal no calificado, a individuos que se hayan acogido al programa de desmovilización y reinserción impulsado por el Gobierno Nacional o a individuos en condición de desplazamiento.	No
g	Mantener al frente de las obras al profesional idóneo, quien será el director de proyecto y representante de EL CONTRATISTA para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra.	Si
h	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.	N/a
i	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL DEPARTAMENTO.	Si
j	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del contrato.	N/A
Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.		

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
a	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.	Si
b	Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.	Si
c	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	Si
d	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Si
e	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.	Si
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
a	Realizar los trabajos en las condiciones contratadas	Si
b	Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e Instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o Instalaciones	Si
c	Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras	Si
d	Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará la entidad, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Planeación o el Interventor	Si
e	Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato	Si
f	Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, la entidad o la comunidad	Si
g	Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas	N/A
h	Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.	Si, se realizó el trámite del Permiso de Obra Menor ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Florencia
i	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

Ítem	Actividad	Cumple
j	Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.	Si
k	Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.	N/A
l	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o la entidad, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas.	N/A
m	Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.	Si
n	Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.	Si
o	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	N/A
p	EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.	Si
q	EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.	Si
r	Aquellas permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.	Si, se realizó el trámite del Permiso de Obra Menor ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Florencia
s	Realizar ajuste a los diseños, si diere lugar a ello, por algún evento que la obra presente afectación por inestabilidad o necesidad para garantizar su uso o cambio de normas.	N/A
t	Suministrar y mantener, durante la obra, conforme a los porcentajes de dedicación el personal ofrecido y requerido para el proyecto.	Si
u	En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con la entidad o con terceros.	Si
v	El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
w	El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por la entidad. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

Ítem	Actividad	Cumple
	técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	
x	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un ochenta por ciento (80%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.	Si, el 100% del personal no calificado corresponde a personas de la región.
y	EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato en los términos en que fue viabilizado el proyecto.	Si
z	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.	N/A
aa	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la entidad.	Si
bb	Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos Sistemas.	Si
cc	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la entidad, por causa o con ocasión del contrato.	N/A
dd	Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del contrato, utilizando para ello los frentes de trabajo que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.	Si
ee	Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.	Si
ff	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: A) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. B) Ajustar o reajustarse, según sea necesario. C) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. D)	N/A

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
	Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.	
gg	Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.	N/A
hh	El contratista deberá entregar a la entidad, copia de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las obras.	Si, se presenta copia del Permiso de Obra Menor.
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS		
a	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad, el interventor o de los organismos de control.	Si
b	Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría integral y deberá contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Registros fotográficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. D) Fotocopia de la bitácora de obra. E) Resumen de las actividades realizadas. F) Relación del personal empleado en la ejecución de las obras. G) Actualización del programa de ejecución del contrato. H) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.	Si, se presenta el informe mensual de ejecución con los requisitos establecidos
c	Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director del proyecto, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, y el Supervisor del contrato de interventoría, sin perjuicio de que participen otros empleados de las diferentes áreas. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Rectoría.	Si, se incluye copia de las actas de comité realizadas durante el periodo de ejecución.
d	Evaluar, juntamente con el interventor, semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.	Si
e	Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y deberá contener: A) Resumen de actividades y desarrollo del contrato. B) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría. C) Actualización de la Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. E) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación. F) Registro fotográficos definitivos.	N/A
f	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo,	Si, se está llevando la bitácora de obra de acuerdo con el requisito exigido.

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
	personal laborando, estado y relación del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la entidad.	
g	Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.	Si
h	Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría cualquier necesidad de adición de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra o inclusión de ítems no previstos, cuando estos resulten indispensables para la adecuada terminación de la obra. Estas solicitudes deberán ser sustentadas técnica, financiera y jurídicamente, y no darán lugar a modificación contractual alguna mientras no cuenten con la aprobación expresa por parte de la entidad contratante.	N/A
i	Deberá contar con una oficina central en la ciudad de Florencia Departamento del Caquetá, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
a	Verificar junto con el Interventor el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta.	Si
b	Ejecutar el contrato de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto aprobado.	Si
c	Reportar de forma oportuna a la entidad contratante cualquier variación o desbalance en el flujo de recursos que pueda comprometer el normal desarrollo de la obra.	N/A
d	Realizar la legalización del anticipo recibido (si aplica) dentro de los plazos establecidos, mediante la presentación de los documentos contables y financieros que soporten su correcta inversión, conforme a las actividades ejecutadas.	N/A
e	Cumplir con las obligaciones tributarias, parafiscales y de seguridad social derivadas de la ejecución del contrato, y allegar a la entidad los soportes de pago correspondientes, cuando así se requiera.	Si, se Anexan las planillas de pago de seguridad social de los meses de Octubre del 2025 a Enero del 2026 relacionadas en el numeral 5.2 del presente informe y el certificado de paz y salvo de parafiscales emitido por el contador público del Consorcio Caquetá 2025
f	Abstenerse de efectuar modificaciones presupuestales internas o reasignaciones de recursos entre actividades sin autorización previa y por escrito de la entidad contratante.	Si
g	Conservar y custodiar los documentos contables y financieros relacionados con el contrato por el término legal, poniéndolos a disposición de la entidad contratante o de los entes de control cuando sean requeridos.	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

10. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1. Desarrollo e implementación de la gestión ambiental

10.1.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental

El contratista ha realizado la entrega del Plan de Manejo Ambiental, el cual se ciñe y adapta a la ejecución del presente proyecto. Se elaboró bajo la lógica de optimizar, cuidar y racionalizar el uso de los recursos naturales y físicos afectados por el proyecto, desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto durante su ejecución. Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecución y cumplimiento de los programas propuestos en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, tendientes a controlar los impactos generados por el proyecto.

10.1.2. Capacitación y concienciación del personal en obra

Se verificó la ejecución de capacitaciones orientadas a la divulgación del Plan de Manejo Ambiental, protección y cuidado de la flora y fauna de la región, manejo adecuado de materiales y escombros, gestión integral de residuos sólidos, uso correcto de los elementos de protección personal y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Lo anterior se comprobó mediante la revisión de los registros de asistencia, soportes de los contenidos desarrollados y evidencias fotográficas, verificando el cumplimiento de las metas establecidas en el subprograma. De acuerdo con el seguimiento efectuado, se evidenció coherencia entre las actividades ejecutadas y las obligaciones correspondientes al periodo evaluado. Se recomienda mantener la periodicidad de las jornadas de capacitación y reforzar la cultura de prevención y control ambiental de todos los involucrados en la obra.

10.2. Programa de actividades constructivas

10.2.1. Señalización de frentes de obra

Se realizó seguimiento al subprograma de señalización de frentes de obra, verificando la adecuada instalación y mantenimiento de la señalización y de aislamiento en las áreas intervenidas durante el periodo evaluado. Se verificó que el contratista implementara el aislamiento y la demarcación de los frentes de trabajo mediante el uso de malla para cerramiento y cintas demarcadoras, garantizando la separación entre las zonas intervenidas y las áreas de circulación peatonal y vehicular. Durante el periodo de ejecución se verificó que los elementos de la señalización permanecieran en condiciones adecuadas de visibilidad, alineación y

estabilidad, contribuyendo a la prevención de riesgos laborales y a la mitigación de posibles afectaciones al entorno. Adicionalmente, se recomendó al contratista mantener el control permanente sobre el estado de la señalización instalada y efectuar la reposición inmediata de los elementos que presenten deterioro o desplazamiento.

10.2.2. Manejo y disposición final de residuos sólidos

Se realizó seguimiento al subprograma de Manejo y disposición final de residuos sólidos, verificando la implementación de las medidas establecidas para la clasificación, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos generados en los frentes de trabajo. Se comprobó que el contratista dispusiera recipientes debidamente identificados para la separación en la fuente, diferenciando residuos ordinarios, reciclables y residuos metálicos, conforme a lo definido en el programa ambiental. Así mismo, se evidenció que los residuos ordinarios son entregados al sistema de recolección municipal para su disposición final y que los materiales reciclables y residuos metálicos son entregados para su aprovechamiento, evitando su acumulación en obra. Durante las visitas técnicas se verificó el adecuado almacenamiento temporal, el orden en las zonas de acopio y la no disposición de residuos en sitios no autorizados, observándose coherencia entre las actividades ejecutadas y las obligaciones establecidas en los documentos del contrato.

10.3. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

10.3.1. Protección de ecosistemas sensibles

Durante el período de ejecución se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con el subprograma de protección de ecosistemas sensibles mediante la verificación de la implementación de medidas orientadas a la sensibilización y prevención de posibles afectaciones sobre los ecosistemas identificados en el área de influencia del proyecto. Para tal fin se verificó el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas al personal de obra sobre la importancia de la preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos y sensibles, así como sobre las buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades constructivas. Se revisaron los registros de asistencia y evidencias fotográficas correspondientes, verificando el cumplimiento de las metas establecidas en el programa.

10.3.2. Recuperación de áreas afectadas

Durante el período de ejecución no se aplicó el programa de Recuperación de Áreas Afectadas ya que las actividades de adecuación y mejoramiento de las oficinas y de la plazoleta se encuentran en desarrollo y no se ha realizado la entrega formal de los espacios intervenidos. En consecuencia, las labores de limpieza final, desmonte de instalaciones temporales y restitución de áreas a condiciones iguales o mejores a las iniciales se verificarán una vez se concluya la totalidad de las actividades constructivas programadas en dichos espacios.

No obstante, se realizó el seguimiento permanente a las condiciones generales de orden y aseo en las áreas intervenidas, verificando la correcta disposición temporal de los residuos generados y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas, con el fin de prevenir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.

10.4. Programa de gestión social

10.4.1. Información y divulgación

Se realizó el seguimiento al subprograma de Información y Divulgación, verificando la implementación de las acciones orientadas a garantizar que la población del área de influencia directa (A.I.D.) se mantenga informada de manera clara y oportuna sobre las actividades del proyecto.

Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento frente a las reuniones programadas, observándose coherencia entre las actividades desarrolladas y las metas establecidas en el programa. Se verificó la ejecución de espacios de socialización, en los cuales se presentó la descripción del proyecto, sus actividades, cronograma y medidas de manejo ambiental aplicables. Se realizó el seguimiento a la logística de las reuniones de información y divulgación, verificando la adecuada programación, convocatoria y disponibilidad de los espacios y recursos necesarios para su desarrollo. Durante el periodo de ejecución no se realizaron reuniones con la comunidad.

10.5. Gestión de salud y seguridad en el trabajo.

Durante el periodo de ejecución la gestión del contratista se enfocó principalmente en la charla rutinaria de aspectos relacionados con uso de los implementos de seguridad personal y el manejo de herramientas dentro de los sitios de trabajo, así como la regulación con el orden y el aseo de los sitios de trabajo.

Se verificó la gestión respecto a la afiliación al sistema general de seguridad social de los trabajadores cuyas certificaciones se encuentran anexas en el presente informe.

10.5.1. Afiliaciones y seguimiento de pagos de seguridad social y aportes legales

Se revisó que todo el personal vinculado a la obra contara con la debida afiliación laboral al sistema de seguridad social integral (ARL; EPS y AFP) verificándose que se encuentra al día en cuanto a los pagos de seguridad social y aportes legales para el periodo correspondiente al presente informe. Anexo se encuentra los soportes de afiliación y de planillas de pago del personal relacionado.

10.5.2. Exámenes médicos

Se verificó el cumplimiento de los requisitos relacionados con los exámenes médicos ocupacionales del personal vinculado al contrato de obra. En este sentido, se revisó que el contratista cuenta con los certificados de aptitud laboral vigentes para el personal asignado a las actividades del proyecto, los cuales son expedidos por una entidad competente en salud ocupacional.

El contratista de obra presentó los reportes de los exámenes médicos de salud ocupacional al personal que ingresó y estuvo laborando durante el periodo de ejecución. La documentación fue revisada y se encuentra conforme con lo exigido por la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y se incluye como anexo al presente informe.

10.5.3. Capacitaciones

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra realizó las capacitaciones de inducción dirigidas por la SISO acerca de la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos presentes en el frente de trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), los procedimientos seguros de trabajo, el reporte de actos y condiciones inseguras, y las medidas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.</p> <p>CONTRATO No. 202500000893</p> <p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4</p>	
--	--	--


Se verifico los formatos de asistencia firmados por el personal con lo que se establece que las actividades realizadas por el contratista de obra se encuentran alienadas con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

10.5.4. Elementos de protección personal

Al inicio de las actividades se verificó la entrega de los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores por parte del contratista de obra, como soporte se entrega los registros de entrega de dotación y EPP. De igual manera se verifico el correcto uso de los elementos de protección de personal de los trabajadores que participaron en el proyecto durante el periodo de ejecución.


10.5.5. Inspecciones de seguridad

El contratista de obra implementó medidas de prevención y control en los frentes de trabajo, mediante la demarcación de las áreas intervenidas. De igual manera, se evidenció la aplicación de controles para la regulación del flujo peatonal y vehicular en las zonas de influencia del proyecto, y la realización de inspecciones periódicas a los elementos de protección personal (EPP), con el fin de garantizar su correcto uso y estado de conservación.



11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el seguimiento del proyecto se identificó un atraso en la adecuación de las oficinas de Talento Humano, Tesorería y Atención al Ciudadano, debido a que la instalación de puntos de voz y datos no está incluida en el alcance contractual. Esto afectó actividades como la instalación de cielorrasos, muros y acabados. Se recomendó definir con urgencia un mecanismo administrativo para ejecutar estas labores complementarias y así evitar mayores retrasos y posibles sobrecostos.
- Se evidenció una baja cantidad de personal en obra, lo que limita el avance físico del proyecto y pone en riesgo el cumplimiento del cronograma. Por ello, se recomendó al contratista aumentar los frentes de trabajo para mejorar los rendimientos, evitar atrasos y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales, Solicitud que fue acogida por el contratista de obra mejorando así el rendimiento frente a la programación
- Del análisis del avance acumulado del proyecto y de las actividades verificadas por la interventoría durante el periodo evaluado, se obtuvo un avance de obra ejecutado acumulado del 34.95% que corresponde al Acta de Recibo Parcial de Obra No 1; frente a un 49,10% de avance de obra programado, de lo anterior se concluye que el proyecto presenta un retraso con respecto a la reprogramación del 14,15%.
- La documentación soporte de la ejecución del proyecto, incluyendo registros fotográficos, informes de avance y actas de seguimiento, fue revisada y Aprobada por la interventoría para la autorización del pago del Acta de Recibo parcial de Obra No 1, evidenciando trazabilidad y control sobre las actividades ejecutadas.


JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
 CC 17.652.312 de Florencia
 RL GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S
 INTERVENTORÍA
 Contrato de Interventoría 202500000893 del 2025



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN:
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.
CONTRATO No. 202500000893
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.4




REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO
OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
PERIODO: 9 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2025

ANEXO 1





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN:
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.
CONTRATO No. 202500000893
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO
OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONTRATO No. 202500000893
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3



1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 202500000893 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31 12 2025
INTERVENTORÍA		D M A
CONTRATISTA		SUPERVISOR
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

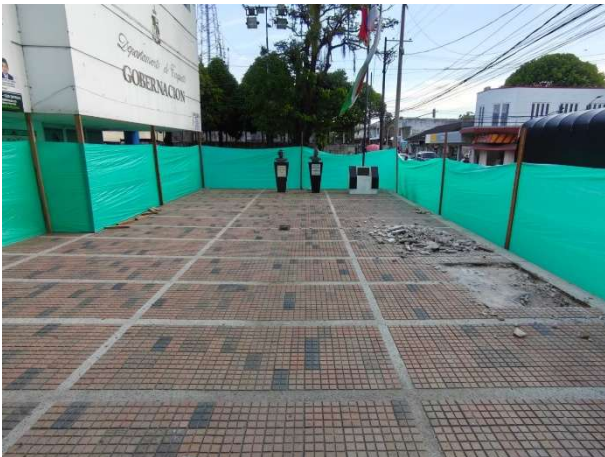
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES
---	------------------------------------



FOTOGRAFÍA 1.
Localización y replanteo



FOTOGRAFÍA 2.
Localización y replanteo



FOTOGRAFÍA 3.
Cerramiento en tela verde



FOTOGRAFÍA 4.
Cerramiento en tela verde

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE
----------	---



FOTOGRAFÍA 5.
Demolición de baldosa cerámica



FOTOGRAFÍA 6.
Demolición de baldosa cerámica



FOTOGRAFÍA 7.
Desmonte de vidrio templado



FOTOGRAFÍA 8.
Desmonte de vidrio templado

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO		31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

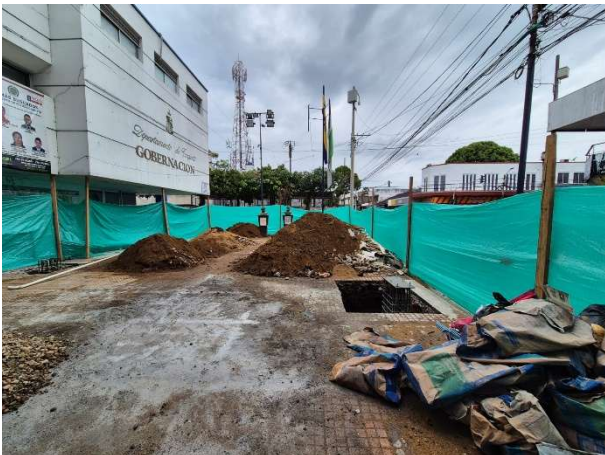
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE
---	----------------------------------



FOTOGRAFÍA 9.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera



FOTOGRAFÍA 10.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera



FOTOGRAFÍA 11.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera



FOTOGRAFÍA 12.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31
INTERVENTORÍA		12
CONTRATISTA		2025
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		D M A
		SUPERVISOR
		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES
---	----------------------------------



FOTOGRAFÍA 13.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación



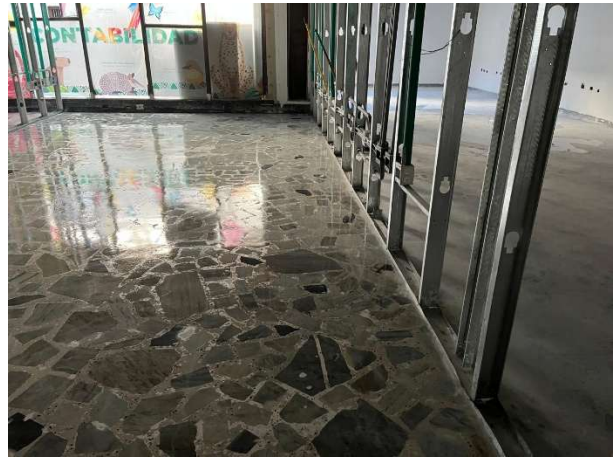
FOTOGRAFÍA 14.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación



FOTOGRAFÍA 15.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación



FOTOGRAFÍA 16.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA
---	---------------------------



FOTOGRAFÍA 17.
Estuco para Muros



FOTOGRAFÍA 18.
Estuco para Muros



FOTOGRAFÍA 19.
Estuco para Muros



FOTOGRAFÍA 20.
Estuco para Muros.

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31 12 2025
INTERVENTORÍA		D M A
CONTRATISTA		SUPERVISOR
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL
---	---



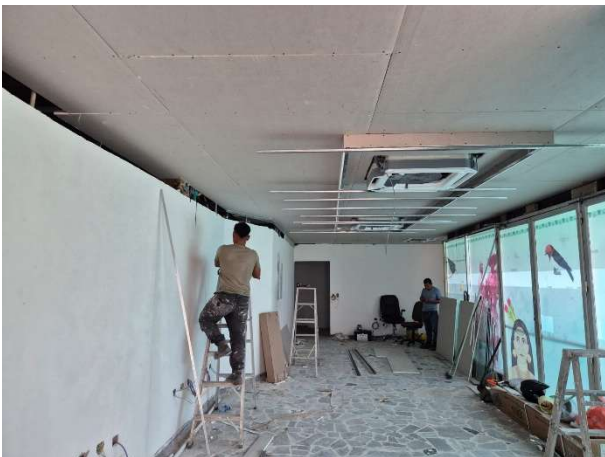
FOTOGRAFÍA 21.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.



FOTOGRAFÍA 22.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.



FOTOGRAFÍA 23.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.

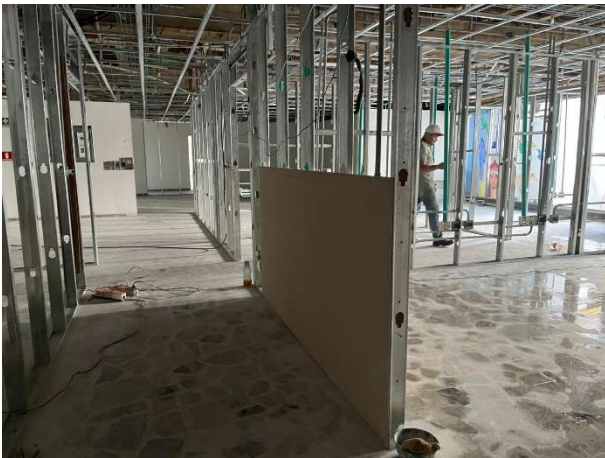


FOTOGRAFÍA 24.

Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL
----------	--



FOTOGRAFÍA 25.

Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)



FOTOGRAFÍA 26.

Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)



FOTOGRAFÍA 27.

Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)



FOTOGRAFÍA 28.

Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31 12 2025
INTERVENTORÍA		D M A
CONTRATISTA		SUPERVISOR
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

8 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM**



FOTOGRAFÍA 29.

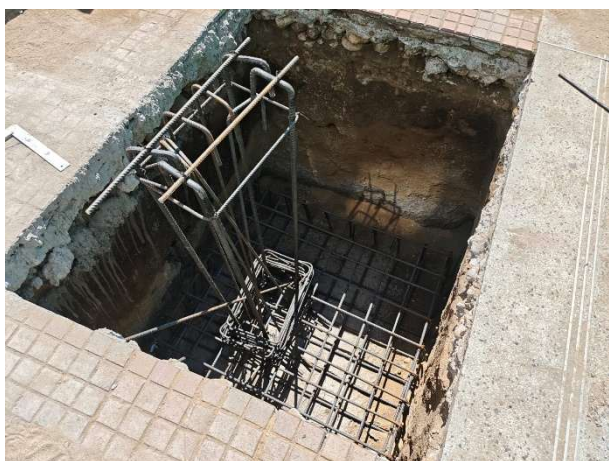
Suministro e instalación División en vidrio templado 10 mm



FOTOGRAFÍA 30.

Suministro e instalación División en vidrio templado 10 mm

9 **INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS**



FOTOGRAFÍA 31.

Zapata en concreto reforzado 4000 PSI



FOTOGRAFÍA 32.

Zapata en concreto reforzado 4000 PSI

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31 12 2025
INTERVENTORÍA		D M A
CONTRATISTA		SUPERVISOR
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

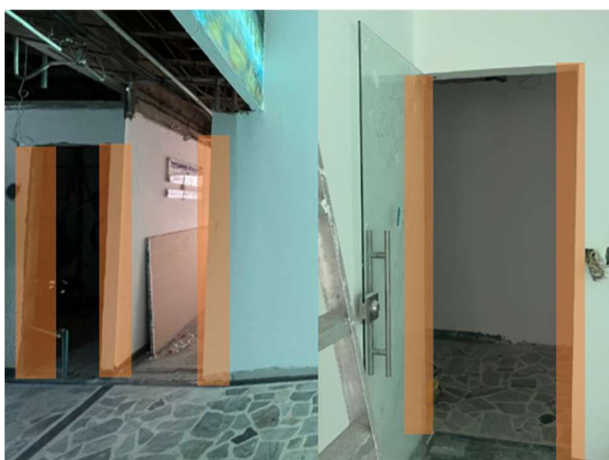
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS
---	---



FOTOGRAFÍA 33.
Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI



FOTOGRAFÍA 34.
Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI



FOTOGRAFÍA 35.
Demolición de cielo raso y divisiones existentes



FOTOGRAFÍA 36.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones,
incluye transporte a escombrera

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO		31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS
---	--



FOTOGRAFÍA 37.
Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI)



FOTOGRAFÍA 38.
Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI)



FOTOGRAFÍA 39.
Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI)



FOTOGRAFÍA 40.
Acero de refuerzo resistencia $F_y = 420$ MPa (60000 PSI)

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS
---	---



FOTOGRAFÍA 41.
Excavación manual



FOTOGRAFÍA 42.
Excavación manual



FOTOGRAFÍA 43.
Excavación manual



FOTOGRAFÍA 44.
Excavación manual

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

10

OBRAS ELÉCTRICAS



FOTOGRAFÍA 45.

Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye; un breaker industrial totalizador hasta 50 A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros

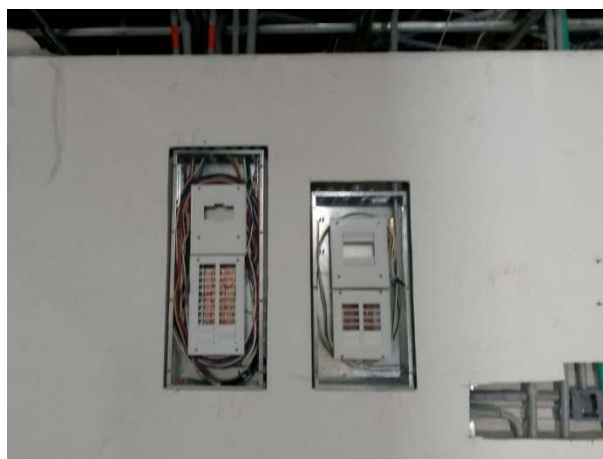


FOTOGRAFÍA 46.



FOTOGRAFÍA 47.

Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye; un breaker industrial totalizador hasta 50 A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros



FOTOGRAFÍA 48.

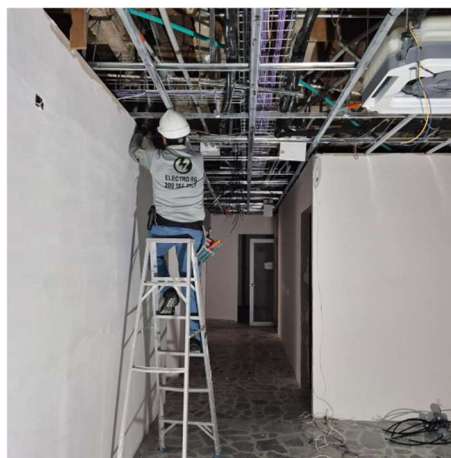
CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL
----------	--



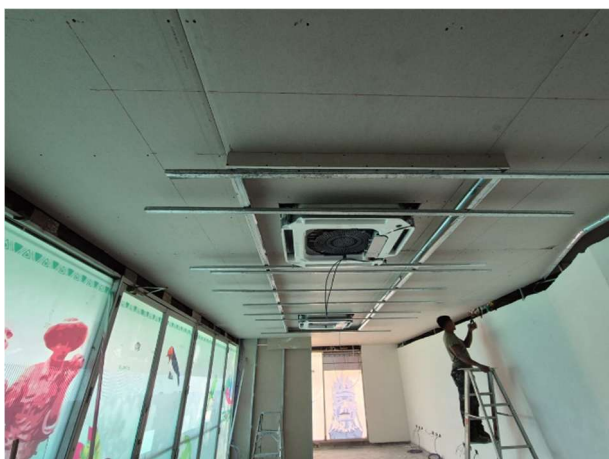
FOTOGRAFÍA 49.

Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3x12 AWG tubo PVC Sch40 1/2"



FOTOGRAFÍA 50.

Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3x12 AWG tubo PVC Sch40 1/2"



FOTOGRAFÍA 51.

Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva



FOTOGRAFÍA 52.

Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva

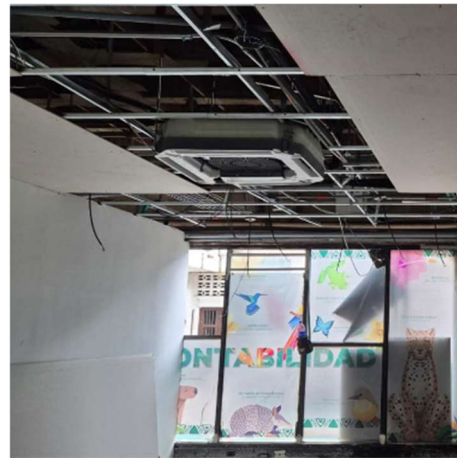
CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL
----------	--



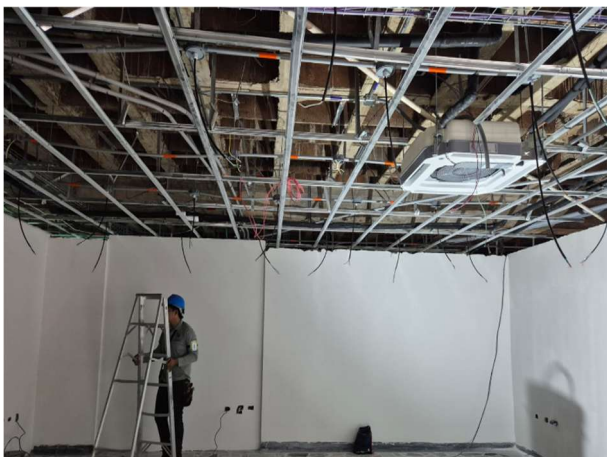
FOTOGRAFÍA 53.

Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva



FOTOGRAFÍA 54.

Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva



FOTOGRAFÍA 55.

Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F-1#8T – AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4"



FOTOGRAFÍA 56.

Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F-1#8T – AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4"

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	31 12 2025
INTERVENTORÍA		D M A
CONTRATISTA		SUPERVISOR
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

7 INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL



FOTOGRAFÍA 57.

Suministro e instalación de Acometidas parcial de TGD a TGC (A.A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4 en ducto EMT de 3"



FOTOGRAFÍA 58.

Suministro e instalación de Acometidas parcial de TGD a TGC (A.A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4 en ducto EMT de 3"

11 INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA



FOTOGRAFÍA 59.

Anclaje de platina 300*300mm de 1/2"



FOTOGRAFÍA 60.

Anclaje de platina 300*300mm de 1/2"

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO		31	12	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA
----	------------------------------



FOTOGRAFÍA 61.
Anclaje de platina 300*450mm de 5/8"



FOTOGRAFÍA 62.
Anclaje de platina 300*450mm de 5/8"



FOTOGRAFÍA 63.
Anclaje de platina 300*450mm de 5/8"



FOTOGRAFÍA 64.
Anclaje de platina 300*450mm de 5/8"



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN:
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.
CONTRATO No. 202500000893
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 2 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2385314	9498304548	E	2026/01/15	2026/01/23	BANCOLOMBIA	8	\$3,579,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$1,762,200	\$8,700	\$0	\$1,770,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$747,800	\$3,700	\$0	\$751,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$1,014,400	\$5,000	\$0	\$1,019,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$690,400	\$3,400	\$0	\$693,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$690,400	\$3,400	\$0	\$693,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$554,600	\$2,800	\$0	\$557,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$554,600	\$2,800	\$0	\$557,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$554,600	\$2,800	\$0	\$557,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$253,600	\$1,300	\$0	\$254,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$301,000	\$1,500	\$0	\$302,500
TOTAL				6	\$3,561,800	\$17,700	\$0	\$3,579,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17324685		RINCON FLOREZ JOSE ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	parcela 6 vda limonar	FLORENCIA-CAQUETA	4354640	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: JOSE ELIAS RINCON (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: JOSE ELIAS RINCON (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
1	CC	17324685	RINCON FLOREZ JOSE ELIAS	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96314281	9496314281	I	2026/01/22	2025/12/12	BANCO AV VILLAS	0	\$504,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$504,900	\$0	\$0	\$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17324685	8	JOSE ELIAS RINCON FLOREZ	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 1	CRA 12 16 15	FLORENCIA-CAQUETA	4350000	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SUCURSAL 1 (4 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$396,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: JOSE ELIAS (4 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$396,400		\$0	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$396,400		\$0	\$0	
1	CC 93342731	AGUILAR RODRIGUEZ MILLER HERNAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	
2	CC 1119586124	ALVIRA OVIEDO MARIO ERNESTO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	
3	CC 1119581906	ALVIRA OVIEDO NICACIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	
4	CC 96362521	ALVIS ALAPE WILSON JAVIER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(4)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$396,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	96296052	9496296052	E	2026/01/22	2025/12/11	BANCO AV VILLAS	0	\$1,763,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$396,400	\$0	\$0	\$396,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	4	\$396,400	\$0	\$0	\$396,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
COMFACA	CCF13		891,190,047	2	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62		900,935,126	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
TOTAL					4	\$1,763,600	\$0	\$0	\$1,763,600



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN:
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.
CONTRATO No. 202500000893
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO
OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**ANEXO 3
SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA**

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901390155	3	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 5 B 9 180 BRR LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	3112267727	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2026-01	2067595724	9497213531	E	2026/01/15	2026/01/08	BANCOLOMBIA	\$5,973,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$3,116,000	\$0	\$0	\$3,116,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$720,000	\$0	\$0	\$720,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$2,396,000	\$0	\$0	\$2,396,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,329,400	\$0	\$0	\$1,329,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$1,329,400	\$0	\$0	\$1,329,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$764,000	\$0	\$0	\$764,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	\$764,000	\$0	\$0	\$764,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$764,000	\$0	\$0	\$764,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$612,000	\$0	\$0	\$612,000
TOTAL				4	\$5,973,400	\$0	\$0	\$5,973,400



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN:
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.
CONTRATO No. 202500000893
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO
OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



ANEXO 4 BITÁCORA DE OBRA


Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com







FORMATO No 1 V-1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 1 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: Lunes 01 de diciembre, se continúan actividades de destronque en el área de donde se tiene planteado Tesorería y atención al ciudadano, también se sigue estucando algunos muros de mampostería y se continúa con las instalaciones para las salidas de iluminación, tomacorrientes e interruptores. Estas actividades se están realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. Se hace desmonte de cielo raso en el área frente al cubículo de secretaría de hacienda.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025		BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		ANOTACIONES 2 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025			
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ			
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS			
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS			
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ			
PLAZO :	31-dic-25			
VALOR :	\$ 2.401.062.171			
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO			
PERSONAL				
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes				
EQUIPOS			CLIMA	
Herramienta menor			Soleado	
ACTIVIDADES				
<p>Actividades: Martes 02 de diciembre, se continúan con las instalaciones eléctricas en el área donde se tiene plateado Talento Humano, salidas para iluminación, interruptores y tomacorrientes. por otro lado, se sigue puliendo el piso y aplicando granito en algunos partes donde se demolió muros de mampostería. Estas actividades se están realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> Residente de Obra  DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025 </div> <div style="width: 30%;"> Director de Obra  GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025 </div> <div style="width: 30%;"> Director de Interventoría  JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S </div> </div>				


FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTERVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		ANOTACIONES 3 DICIEMBRE/2025
PERSONAL			
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: Miercoles 03 de diciembre, se continuan con las instalaciones electricas en el area donde se tiene plateado Talento Humano, salidas para iluminación, interruptores, tomacorrientes y los tableros de distribución. por otro lado, se sigue puliendo el piso y aplicando granito en algunos partes donde se demolió muros de mampostería. se instalan lamnas de superboard para muro liviano. se hace retiro de los escombros acumulados. y se hace un comité de socialización del proyecto, pero solo llega interventoria y obra. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	


FORMATO No 1 V -1 10/06/2025		BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL		JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA		GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL		JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:		EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :		31-dic-25		
VALOR :		\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL				
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes				
EQUIPOS			CLIMA	
Herramienta menor			Soleado	
ACTIVIDADES				
<p>Actividades: jueves 04 de diciembre, se continúan con las instalaciones eléctricas en el área donde se tiene plateado Talento Humano, salidas para iluminación, interruptores, tomacorrientes y los tableros de distribución. se instalan laminas de superboard para muro liviano. Estas actividades se están realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>				
Residente de Obra		Director de Obra		Director de Interventoría
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025		 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025		 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: viernes 05 de diciembre, se continúan con las instalaciones eléctricas en el área donde se tiene plateado Talento Humano, salidas para iluminación, interruptores, tomacorrientes y los tableros de distribución. se instalan laminas de superboard para muro liviano. Estas actividades se están realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	

FORMATO No 1 V-1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 6 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: sabado 06 de diciembre, se continuan con las instalaciones electricas en el area donde se tiene plateado Talento Humano, salidas para iluminación, interruptores, tomacorrientes y los tableros de distribución. se instalan laminas de superboard para muro liviano. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	


FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		ANOTACIONES 8 DICIEMBRE/2025
PERSONAL			
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: lunes 08 de diciembre, se continúan actividades de pulimento de piso en las cuales se utiliza una pulidora industrial y ácidos que le dan brillo al piso. se siguen instalando láminas de superboard para muro liviano, después se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. por otro lado, se iniciaron labores en el frente de trabajo de la plazoleta, donde se realizaron los huecos para instalar los parales para el cerramiento e intervenir esta área. Estas actividades se están realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	




FORMATO No 1 V -1 10/06/2025		BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL		JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA		GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL		JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:		EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :		31-dic-25		
VALOR :		\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		ANOTACIONES 9 DICIEMBRE/2025
PERSONAL				
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes				
EQUIPOS			CLIMA	
Herramienta menor			Soleado	
ACTIVIDADES				
<p>Actividades: martes 09 de diciembre, se continuan actividades de pulimiento de piso en las cules se utiliza una pulidora industrial y acidos que le dan brillo al piso. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. por otro lado, se continuan labores en el frente de trabajo de la plazoleta, se instaló el cerramiento e intervenir esta area. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>				
Residente de Obra		Director de Obra		Director de Interventoría
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025		 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025		 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S


FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: miercoles 10 de diciembre. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IYAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 11 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: jueves 11 de diciembre. se continua puliendo el piso, aplicando cristalizador para poder sacarle brillo al piso. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	


FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: viernes 12 de diciembre. se continua puliendo el piso, aplicando cristalizador para poder sacarle brillo al piso. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano. en el frente de trabajo de la plazoleta, se podó el arbol que esta al costado de la via que dirige hacia el parque principal, porque impedía para iniciar la construcción de la cubierta, tambien se inicia la excavación para las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	

FORMATO No 1 V-1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			ANOTACIONES 13 DICIEMBRE/2025
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS			
Herramienta menor		CLIMA	
		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: sabado 13 de diciembre. se continua puliendo el piso, aplicando cristalizador para poder sacarle brillo al piso y tapando algunos huecos que se generan por el desgaste. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se inicia la instalación de estos equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se continuan las excavaciones para las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		ANOTACIONES 15 DICIEMBRE/2025
PERSONAL			
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: lunes 15 de diciembre. se continua puliendo el piso, aplicando cristalizador para poder sacarle brillo al piso y tapando algunos huecos que se generan por el desgaste en el pasillo de la entrada despues de recepción. se siguen instalando laminas de superbord para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se continuan las excavaciones para las zapatas. se realiza comite de técnico #03. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025		BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		ANOTACIONES 16 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025			
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ			
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS			
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS			
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ			
PLAZO :	31-dic-25			
VALOR :	\$ 2.401.062.171			
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO			
PERSONAL				
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes				
EQUIPOS			CLIMA	
Herramienta menor			Soleado	
ACTIVIDADES				
<p>Actividades: martes 16 de diciembre. se continua puliendo el piso, aplicando cristalizador para poder sacarle brillo al piso y tapando algunos huecos que se generan por el desgaste. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>				
<div> <div> Residente de Obra  DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025 </div> <div> Director de Obra  GERMÁN ALÓNSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025 </div> <div> Director de Interventoría  JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S </div> </div>				



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 17 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERÍA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: miercoles 17 de diciembre. se continua puliendo el piso, aplicando cristalizador para poder sacarle brillo al piso y tapando algunos huecos que se generan por el desgaste. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	


FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: jueves 18 de diciembre. se continua puliendo el piso, aplicando cristalizador para poder sacarle brillo al piso y tapando algunos huecos que se generan por el desgaste. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	


[illegible]



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			ANOTACIONES 20 DICIEMBRE/2025
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS			
Herramienta menor			CLIMA
			Soleado
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: sabado 20 de diciembre. se siguen instalando laminas de superboard para muro liviano, despues se coloca cinta malla en sus juntas para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos, se desinstala el cielo raso que se encontraba en la entrada de recepción. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	


FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor, mezcladora de concreto		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: lunes 22 de diciembre. se coloca cinta malla en las juntas de las laminas de superboard para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas estas, tambien se funde un ciclope que sirve como soporte para las parrillas de las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 23 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor, mezcladora de concreto		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: martes 23 de diciembre. se coloca cinta malla en las juntas de las laminas de superboard para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de estas, se funde un ciclope que servirá como soporte para las parrillas de las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	



FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTERVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		ANOTACIONES 24 DICIEMBRE/2025
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor, mezcla de concreto		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: miercoles 24 de diciembre. se coloca cinta malla en las juntas de las laminas de superboard para que no se dilaten. simultaneamente, se continuan labores electricas, y se rompe el muro liviano instalado para colocar las cajas de los interruptores y tomacorrientes, tambien se continua cableando par dejar listo el componente electrico en el area de tesorería y atencion al ciudadano y por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos, se desinstala el cielo raso que se encontraba en la entrada de recepción. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de estas, se funde un ciclope que servirá como soporte para las parrillas de las zapatas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación y hoy se desarrollaron hasta medio día.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025		BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL		JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA		GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL		JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:		EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :		31-dic-25		
VALOR :		\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL				
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico				
EQUIPOS			CLIMA	
Herramienta menor, mezcladora de concreto			Soleado	
ACTIVIDADES				
<p>Actividades: viernes 26 de diciembre. se siguen colocando cinta malla en las juntas de las laminas de superboard para que no se dilaten. por el lado de los aires, se continua la instalación de los equipos. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de estas, se funde un ciclope que servirá como soporte para las parrillas de las zapatas y se inicia a armar el acero de los pedestales junto con las parrillas que ya estaban armadas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>				
Residente de Obra		Director de Obra		Director de Interventoría
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025		 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025		 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 27 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor, mezcladora de concreto		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: sabado 27 de diciembre. se siguen colocando cinta malla en las juntas de las laminas de superboard para que no se dilaten y por el componente electrico, se coloca el cable encauchetado para las salidas de la iluminación. en el frente de trabajo de la plazoleta, se terminan las excavaciones para las zapatas y se procede a armar el acero para las parrillas de estas, se funde un ciclope que servirá como soporte para las parrillas de las zapatas y se inicia a armar el acero de los pedestales junto con las parrillas que ya estaban armadas. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTERVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	30-abr-26		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		
PERSONAL			
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		lluvias muy fuertes	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: lunes 29 de diciembre. Por el momento se tienen tres frentes de trabajo, uno en la plazoleta, otro en el componente eléctrico y por último uno estucando muro liviano y colocando laminas de superboard para cielo raso. en la plazoleta ya se tiene armado el acero de las zapatas con los pedestales, se va a nivelar este para fundir zapatas e iniciar con la excavación de las vigas riostras. por el lado del componente eléctrico, se sigue colocando cable encauchetado en el área de las secretarías, y por último se inició a colocar laminas de superboard para cielo raso en el área de Tesorería y Atención al ciudadano, en el área de secretarías se continúa estucando el muro liviano. Estas actividades se están realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría	
 DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	30-abr-26		
VALOR :	\$ 2.401.062.171		
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		ANOTACIONES 30 DICIEMBRE/2025
PERSONAL			
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes			
EQUIPOS		CLIMA	
Herramienta menor		Soleado	
ACTIVIDADES			
<p>Actividades: martes 30 de diciembre. Por el momento se tienen tres frentes de trabajo, uno en la plazoleta, otro en el componente eléctrico y por último uno estucando muro liviano y colocando laminas de superboard para cielo raso. en la plazoleta ya se tiene armado el acero de las zapatas y los pedestales, se va a nivelar para fundir las dos zapatas faltantes y empezar con los pedestales, para luego iniciar con la excavación de las vigas riostras. por el lado del componente eléctrico, se sigue colocando cable encauchetado en el área de las secretarías, y por último se continúa colocando laminas de superboard para cielo raso en el área de Tesorería y Atención al ciudadano, en el área de secretarías se continúa estucando el muro liviano que se tiene instalado. Estas actividades se están realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.</p>			
Residente de Obra  DIEGO ALEXANDER IAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	Director de Obra  GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025	Director de Interventoría  JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025		BITACORA DE OBRA		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		ANOTACIONES 31 DICIEMBRE/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025			
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ			
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS			
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS			
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ			
PLAZO :	30-abr-26			
VALOR :	\$ 2.401.062.171			
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO			
PERSONAL				
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico				
EQUIPOS			CLIMA	
Herramienta menor, mezcladora de concreto			Soleado	
ACTIVIDADES				
<p>Actividades: 31 de diciembre. En el primer piso del edificio central de la Gobernación se continúan realizando labores en tres frentes, por un lado el personal electricista continúa instalando cable de cobre aislado para las salidas de tomacorrientes y de iluminación. por otro lado, se continúan labores de instalación de laminas de superboard para cielo raso con sus respectivas carteras ornamentales. en la plazoleta se continúa fundiendo las zapatas y formaleteando para posteriormente fundir los pedestales.</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> Residente de Obra  DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025 </div> <div style="width: 30%;"> Director de Obra  GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA Ingeniero Civil CONSORCIO CAQUETA 2025 </div> <div style="width: 30%;"> Director de Interventoría  JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Ingeniero Civil GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S </div> </div>				



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN:
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.
CONTRATO No. 202500000893
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO
OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 5
PÓLIZA ACTUALIZADA

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: VSAV1U7UMbQSV+eMn5u6wA==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLITICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

Nº. PÓLIZA	CHU-100057685	Nº. ANEXO	3	Nº. CERTIFICADO	533126283	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	09/10/2025	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.390.155-3
DIRECCIÓN	TV 5B 9 180 BRR LA ESTRELLA	TELÉFONO	3112267727
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	No. DOC. IDENTIDAD	800.091.594-4
DIRECCIÓN	CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA FLORENCIA CAQUETÁ	TELÉFONO	4366860
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	No. DOC. IDENTIDAD	800.091.594-4
DIRECCIÓN	CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA FLORENCIA CAQUETÁ	TELÉFONO	4366860

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LOS AMPAROS SEGUN CONDICIONES DEL OTROSÍ NO. 001 DE FECHA 29/12/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.202500000893 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2025	24:00 Horas Del 28/10/2026	16.820.980,00	8.333,33
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2025	24:00 Horas Del 30/04/2029	8.410.490,00	8.333,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/04/2026	24:00 Horas Del 30/04/2031	16.820.980,00	8.333,33
TOTAL ASEGURADO			\$ 42.052.450,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00		24.999,99
			DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2030			

EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 24.999,99
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 4.750,00
TOTAL A PAGAR	\$ 29.749,99

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CHU-100057685	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	533126283	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	29/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/10/2025	24:00 Horas Del	30/04/2031	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

**LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A****CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100057685** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL CAQUETA / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**, expedida por la Compañía en **29/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **29** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial
