



FLORENCIA, ENERO 2026

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1	Localización	7
2.2	Características del proyecto	8
3	DATOS GENERALES	13
3.1	Datos del contrato objeto de interventoría	13
3.2	Datos de la interventoría	14
3.3	Obligaciones del contrato de interventoría	14
4	GARANTÍAS	18
4.1	Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Obra	18
4.2	Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Interventoría	20
5	VERIFICACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO CONTRACTUAL	22
5.1	Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de obra	22
5.2	Verificación de pago de seguridad social y aportes legales	22
5.3	Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de interventoría	23
6	ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	25
6.1	Descripción de actividades ejecutadas en el mes	25
6.2	Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.	43
6.3	Informe de avance físico de la obra	48
7	INFORMACIÓN FINANCIERA	50
7.1	Informe de avance financiero de la obra	50
7.2	Información de manejo del anticipo	50
8	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA	52
8.1	Problemas presentados y mecanismos de solución propuestos	52
8.2	Control de calidad	52
8.3	Documentos suscritos	54
9	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	57

10	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	66
10.1	Desarrollo e implementación de la gestión ambiental	66
10.2	Programa de actividades constructivas	66
10.3	Biodiversidad y servicios ecosistémicos	67
10.4	Programa de gestión social	68
10.5	Gestión de salud y seguridad en el trabajo.	69
11	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	71

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Actividades incluidas en el alcance del proyecto.	8
Tabla 2.	Ficha técnica del Contrato objeto de interventoría	13
Tabla 3.	Ficha técnica del Contrato de Interventoría.	14
Tabla 4.	Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones iniciales.	18
Tabla 5.	Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.	18
Tabla 6.	Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.	19
Tabla 7.	Póliza de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra, condiciones iniciales.	19
Tabla 8.	Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.	19
Tabla 9.	Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.	20
Tabla 10.	Resumen de actualización de pólizas contrato de obra.	20
Tabla 11.	Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones iniciales.	20
Tabla 12.	Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.	21
Tabla 13.	Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.	21
Tabla 14.	Personal mínimo requerido del Contratista de obra.	22
Tabla 15.	Personal del Contrato de Obra.	22
Tabla 16.	Personal de apoyo y operativo sst Enero.	23
Tabla 17.	Personal mínimo requerido de interventoría.	23
Tabla 18.	Personal de Interventoría.	23

Tabla 19. Cantidades de obra, limpieza de fachada.	27
Tabla 20. Cantidades de obra, Desmonte y/o demolición de granito y adoquín.	28
Tabla 21. Cantidades de obra, suministro e instalación de sanitario.	29
Tabla 22. Cantidades de obra, enchape cerámica pared.	29
Tabla 23. Cantidades de obra, enchape cerámica antideslizante piso.	30
Tabla 24. Cantidades de obra, mantenimiento De guarda escoba en granito pulido.	30
Tabla 25. Cantidades de obra, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro.	31
Tabla 26. Cantidades de obra, pintura tipo 1 para muros interiores.	32
Tabla 27. Cantidades de obra, pintura muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada).	34
Tabla 28. Cantidades de obra, cielo raso plano en drywall según diseño	35
Tabla 29. Cantidades de obra, carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielo raso.	36
Tabla 30. Cantidades de obra, suministro e instalación de puertas en vidrio templado 10 mm	38
Tabla 31. Cantidades de obra, suministro e instalación de ventana en aluminio con vidrio 6mm.	38
Tabla 32. Cantidades de obra, suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w	39
Tabla 33. Cantidades de obra, suministro e instalación de unidad condensadora de 76000 BTU.	40
Tabla 34. Cantidades de obra, suministro e instalación de salida tomacorriente regulado 120 V	40
Tabla 35. Cantidades de obra, luminaria de emergencia.	41
Tabla 36. Cantidades de obra, suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A	41
Tabla 37. Cantidades de obra, suministro de estructuras	42
Tabla 38. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.	43
Tabla 39. Resumen de cantidades ejecutadas a la fecha de corte del presente informe.	44
Tabla 40. Tabla de programación vs Ejecución	48
Tabla 41. Plan de inversión del anticipo del contrato de obra.	51
Tabla 42. Informe de inversión del anticipo del contrato de obra.	51
Tabla 43. Relación de equipo empleado en obra.	53
Tabla 44. Documentación del contrato de obra.	54
Tabla 45. Comités de Seguimiento	54
Tabla 46. Control de Correspondencia	55
Tabla 47. Verificación del cumplimiento de Obligaciones contractuales	57

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización del municipio de Florencia	7
Figura 2. Lugar de intervención.	8
Figura 3. Planta arquitectónica primer nivel edificio Gobernación.	26
Figura 4. Curva S - Contrato de obra	49



	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

1 INTRODUCCIÓN


La sede central de la Gobernación del Caquetá constituye un espacio fundamental para la atención al público y el desarrollo de las actividades administrativas del departamento. No obstante, los espacios destinados a la atención ciudadana presentan un deterioro físico y funcional, producto del uso continuo, la falta de mantenimiento periódico y la obsolescencia de algunos elementos constructivos e instalaciones, lo cual incide de manera directa en la calidad del servicio prestado y en las condiciones laborales de los funcionarios.

En respuesta a esta situación, la Gobernación del Caquetá adelantó el proceso de contratación de construcción de obras civiles para el proyecto, mediante el proceso de Licitación Pública No DC-GE-LP.016-2025 cuyo objeto consiste en “Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá” que fue adjudicado al Consorcio Caquetá 2025. La contratación de la interventoría se adelantó mediante Concurso de Méritos Abierto No DC-GE-CMA-012-2025, del cual resultó adjudicatario la empresa Geovial ingeniería Zomac S:A:S

El presente documento corresponde al Informe Mensual de Interventoría No.4, que abarca el periodo comprendido entre el 9 de Octubre y el 30 de enero de 2026. En este informe se describe el avance de las actividades ejecutadas como parte de la interventoría Técnica, Administrativa Jurídica y Financiera del Contrato cuyo Objeto Consiste en: “Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá”, e igualmente describe las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento al Contrato No. 202500000893.

INGENIERIA ZOMAC S.A.S

Figura 2. Lugar de intervención.

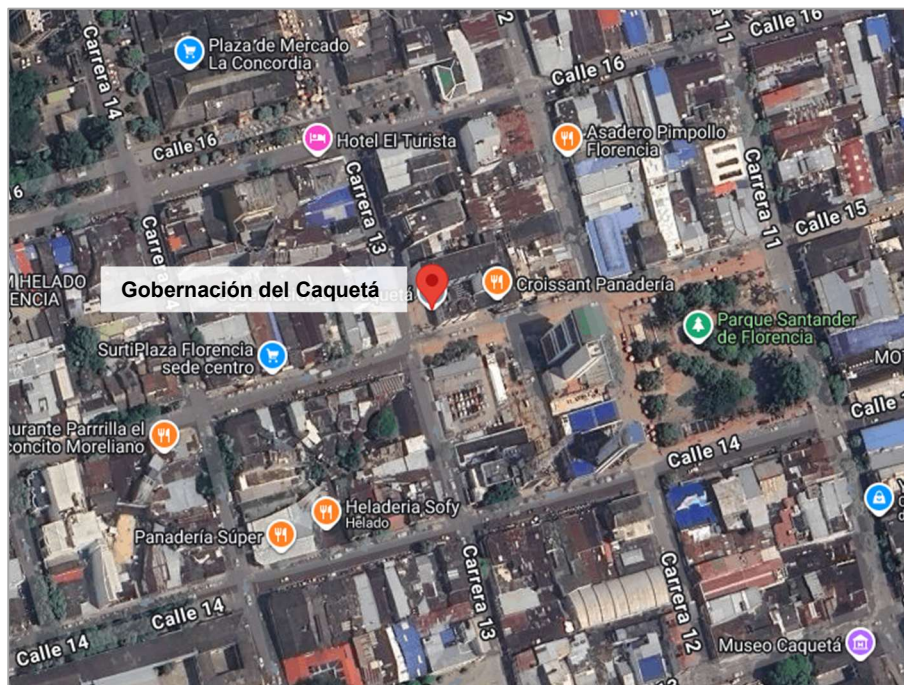

Nota: Tomado de Google Maps, 2025

2.2 Características del proyecto

El contrato de interventoría define el objeto del contrato así: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”, el cual contempla las siguientes actividades:

INGENIERIA ZOMAC S.A.S

Tabla 1. Actividades incluidas en el alcance del proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo	M ²	1,015.00
1.2	Cerramiento en tela verde	ML	102.00
1.3	Limpieza de fachada	M ²	2,230.00
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE		
2.1	Desmonte de marcos y puertas.	UND	35.00
2.2	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	3.00
2.3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M ²	3.50

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
2.4	Desmonte de cielo raso existente	M ²	1,015.00
2.5	Demolición de baldosa cerámica	M ²	76.13
2.6	Desmonte o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	15.00
2.7	Desmonte de vidrio templado	M ²	53.00
2.8	Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M ²	167.00
2.9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M ²	109.54
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M ³	18.00
2.11	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M ²	23.08
3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS		
3.1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	1.00
3.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4".	ML	26.00
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA		
4.1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	3.00
4.2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	3.00
4.3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	3.00
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES		
5.1	Enchape cerámica pared	M ²	60.70
5.2	Enchape cerámica antideslizante piso	M ²	14.78
5.3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M ²	1,324.00
5.4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	205.00
5.5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	152.00
5.6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M ²	180.00
5.7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M ²	126.50
6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA		
6.1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M ²	584.00
6.2	Estuco para muros.	M ²	584.00
6.3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M ²	1,734.48
6.4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M ²	17.00
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL		
7.1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M ²	1,015.00
7.2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	462.00
7.3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M ²	202.57
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS		

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
8.1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	4.00
8.2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M ²	25.60
8.3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M ²	9.24
8.4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M ²	24.11
8.5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	11.00
8.6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	15.00
8.7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	6.00
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS		
9.1	Pañete 1:4	M ²	5.26
9.2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M ³	34.00
9.3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M ³	8.38
9.4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M ³	5.48
9.5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	94.45
9.6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	381.80
9.7	Excavación manual	M ³	41.44
10	OBRAS ELÉCTRICAS		
10.1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	1.00
10.2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	1.00
10.3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	5.00
10.4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 100A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	1.00
10.5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	4.00
10.6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	655.68
10.7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	172.00
10.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	389.00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
10.9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	344.00
10.10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	37.00
10.11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	20.00
10.12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	58.00
10.13	Desmante de aparatos de salidas eléctricas	UND	190.00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	8.00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	15.00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	12.00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	796.00
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	172.00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	25.00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	208.00
10.21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	49.00
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	36.77
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	83.48
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	30.00
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1.00
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en	ML	100.00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
	cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"		
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA		
11.1	Polycarbonato alveolar para cubierta	M²	159.00
11.2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	87.00
11.3	Canal en lámina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	16.93
11.4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	2179.64
11.5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	3518.00
11.6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	26.13
11.7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	2.00
11.8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	4.00
11.9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	2.00

GEOVIAL
INGENIERIA ZOMAC S.A.S

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

3 DATOS GENERALES

FECHA:	Febrero de 2026	INFORME No.	4
---------------	-----------------	--------------------	---

PERIODO No.	4	DEL:	1 de enero de 2026	AL:	31 de enero de 2026
--------------------	---	-------------	--------------------	------------	---------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Florencia, Caquetá

3.1 Datos del contrato objeto de interventoría

Tabla 2. Ficha técnica del Contrato objeto de interventoría

No. DEL PROCESO	DC-GE-LP-016-2025				
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA				
CONTRATO No:	202500000874				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/09/2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
NIT/CC:	901.987.427-5				
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS (\$2.401.062.171) MCTE				
ANTICIPO:	\$ 960,484,868.00				
ADICIONES:	N. A.				
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de Inicio por el Contratista y el Supervisor del contrato.				
AMPLIACIÓN 1:	De acuerdo al OTROSÍ No. 0001 al Contrato de Obra No. 202500000874 del 12 de septiembre de 2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.				
FECHA ACTA DE INICIO:	09/10/2025				
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento catorce (114) días				
No. CDP	2025071266	Fecha exp.	4/07/2024	Valor (\$)	2,571,206,371.00
No. RP	2025094328	Fecha exp.	15/09/2025	Valor (\$)	2,401,062,171.00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

3.2 Datos de la interventoría

Tabla 3. Ficha técnica del Contrato de Interventoría.

No. DEL PROCESO	DC-GE-LP-016-2025				
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
CONTRATO No:	2022500000893 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CONTRATISTA:	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC:	901.390.155-3				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$168.209.800) M/CTE.				
ANTICIPO:	N. A				
ADICIONES:	N. A.				
PLAZO DE INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de Inicio por el Contratista y el Supervisor del contrato.				
AMPLIACIÓN 1:	De acuerdo al OTROSI No. 0001 al Contrato de Interventoría No. 2022500000893 del 25 de septiembre de 2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.				
FECHA ACTA DE INICIO:	09/10/2025				
PLAZO TRANSCURRIDO:	Sesenta (60) días				
No. CDP	2025071266	Fecha exp.	4/07/2025	Valor (\$)	2,571,206,371.00
No. RP	2025094490	Fecha exp.	25/09/2025	Valor (\$)	168,209,800.00

3.3 Obligaciones del contrato de interventoría

Obligaciones generales

De acuerdo con el contrato de interventoría, el interventor asume las siguientes obligaciones:

Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato el Contratista deberá:

- Presentar las garantías exigidas
- Suscribir el Acta de Inicio del contrato
- Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados
- Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas.
- Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

- f. Permitir al supervisor asignado por el Departamento, realizar la inspección del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.
- g. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato, ejecutar el mismo y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el municipio, le imponga multas sucesivas por valor del Uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin superar el Diez por ciento (10%) del mismo, hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- h. Tratándose de personas naturales la base para el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del valor total final del contrato.
- i. El contratista se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual a la suspensión o ampliación del contrato si a ello hay lugar.
- j. Garantizar la calidad del trabajo o servicio realizado.
- k. Presentar un informe final de ejecución del contrato.
- l. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.
- m. Las demás que deriven de la ejecución contractual.

Obligaciones específicas

• Obligaciones Técnicas

- a. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar, según corresponda, la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto pactado,
- b. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario,
- c. Verificar el cumplimiento del alcance del objeto contractual,

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

- d. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad correspondiente (Ordenador del Gasto), previo concepto escrito de la Interventoría o la supervisión,
 - e. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar,
 - f. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos,
 - g. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados por él; constatar su estado y cantidad,
 - h. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato,
 - i. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes,
 - j. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución,
 - k. Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte del Departamento en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en la invitación pública que dieron origen al contrato objeto de interventoría.
- **Obligaciones Administrativas:**
 - a. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato;
 - b. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo,
 - c. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista,
 - d. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual,
 - e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas,
 - f. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados,

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

- g. Coordinar con las dependencias de la entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales,
 - h. Procurar que por causas atribuibles a la entidad no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato,
 - i. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato,
 - j. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos,
 - k. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables,
 - l. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.
- **Obligaciones Financieras:**
 - a. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta inversión (Cuando Aplique). Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la presentación del programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo,
 - b. Revisar, aprobar y tramitar ante la dependencia de la entidad correspondiente, las solicitudes de pago formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados,
 - c. Verificar que el contratista este al día en los pagos de pensiones, ARP, parafiscales y salud de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes,
 - d. Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, registro y reserva presupuestal cuando se requiera.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1	
--	--	--

4 GARANTÍAS

4.1 Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Obra

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra suscrito entre la Entidad Contratante y el Consorcio Caquetá 2025, en la cláusula decima se definieron las características que deben cumplir las garantías expedidas por el contratista. Dichas garantías se describen a continuación y se incluyen como anexo al presente informe.

Tabla 4. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS				
Póliza de cumplimiento – Anexo 0				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	\$ 240,106,217.10	61-44-101061224	12/09/2025	31/12/2030
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 120,053,108.55		12/09/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 480,212,434.20		Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960,424,868.40		12/09/2025	31/12/2025

Tabla 5. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS				
Póliza de cumplimiento – Anexo 2				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	\$ 240,106,217.10	61-44-101061224	9/10/2025	28/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 120,053,108.55		9/10/2025	27/01/2026
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 480,212,434.20		Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960,424,868.40		9/10/2025	27/01/2026

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	--

Tabla 6. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento – Anexo 3				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	\$ 240,106,217.10	61-44-101061224	9/10/2025	29/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 120,053,108.55		9/10/2025	30/09/2029
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 480,212,434.20		Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960,424,868.40		9/10/2025	30/04/2026

Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 0				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	\$ 569,400,000.00	61-40-101022183	12/09/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$ 569,400,000.00		12/09/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	\$ 569,400,000.00		12/09/2025	31/12/2025

Tabla 8. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 2				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	\$ 569,400,000.00	61-40-101022183	9/10/2025	27/01/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	27/01/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	27/01/2026

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

Tabla 9. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS				
Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 3				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	\$ 569,400,000.00	61-40-101022183	9/10/2025	30/04/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	30/04/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 569,400,000.00		9/10/2025	30/04/2026

Tabla 10. Resumen de actualización de pólizas contrato de obra.

Tipo Garantía	Póliza No.	Anexo	Tipo Modificación	Expedición
Cumplimiento	61-44-101061224	0	Original	19/09/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	0	Original	19/09/2025
Cumplimiento	61-44-101061224	1	Según acta de inicio	27/10/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	1	Según acta de inicio	27/10/2025
Cumplimiento	61-44-101061224	2	Según acta de inicio	27/10/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	2	Según acta de inicio	27/10/2025
Cumplimiento	61-44-101061224	3	Según Otrosí No. 001	29/12/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	3	Según Otrosí No. 001	29/12/2025

4.2 Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Interventoría

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Interventoría suscrito entre la Entidad Contratante y Geovial Ingeniería Zomac S.A.S, en la cláusula decima se definieron las características que deben cumplir las garantías expedidas por el contratista. Dichas garantías se describen a continuación y se incluyen como anexo al presente informe.

Tabla 11. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS				
Póliza de cumplimiento - Anexo 0				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato	\$ 16,820,980.00	CHU-100057685	25/09/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 8,410,490.00		25/09/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	\$ 16,820,980.00		31/12/2025	31/12/2030

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

Tabla 12. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento - Anexo 2				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato	\$ 16,820,980.00	CHU-100057685	9/10/2025	14/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 8,410,490.00		9/10/2025	14/01/2029
Calidad del servicio	\$ 16,820,980.00		14/01/2026	14/01/2031

Tabla 13. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento - Anexo 3				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato	\$ 16,820,980.00	CHU-100057685	29/12/2025	28/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	\$ 8,410,490.00		29/12/2025	30/04/2029
Calidad del servicio	\$ 16,820,980.00		30/04/2026	30/04/2031

5 VERIFICACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO CONTRACTUAL

5.1 Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de obra

De acuerdo con los documentos del proyecto el Contratista de obra deberá contar con el personal profesional mínimo y operacional requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.

Tabla 14. Personal mínimo requerido del Contratista de obra.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN MES (%)
Director de obra	1	50%
Residente de obra	1	100%
Especialista en estructuras	1	20%
Ingeniero electricista	1	25%
Profesional SISO	1	50%
Especialista ambiental	1	20%

El contratista de obra presentó el equipo de trabajo que hace parte del personal de obra durante la ejecución del proyecto en cumplimiento con el personal mínimo requerido en los documentos del proyecto.

Tabla 15. Personal del Contrato de Obra.

CARGO	NOMBRE
Director de obra	German Alonso Lozada Lozada
Residente de obra	Diego Alexander Ijaji Figueroa
Especialista en estructuras	German Alonso Lozada Lozada
Ingeniero electricista	Jorge Alonso Romero Giraldo
Profesional SISO	Oriana Andrea Murillo Cotamo
Especialista ambiental	German Alonso Lozada Lozada

El contratista de obra ha realizado el pago de seguridad social del personal anteriormente mencionado, la verificación se realizó para la elaboración del presente informe. Al final de este informe se anexa las planillas de seguridad social donde se vincula el personal de obra y personal mínimo requerido propuesto por el contratista en el contrato. De igual manera se anexa el certificado de paz y salvo de parafiscales a la fecha de corte del presente informe emitido por la contadora del contratista de obra Consorcio Caquetá 2025.

5.2 Verificación de pago de seguridad social y aportes legales

Durante el periodo de ejecución, el contratista de obra contó con el siguiente personal operativo y de apoyo además del personal administrativo del proyecto.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

Tabla 16. Personal de apoyo y operativo sst Enero.

Nombre	Cédula	Cargo	Planilla No.
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Director	9498570814
Diego Alexander Ijaji Figueroa	1.061.792.456	Residente de Obra	
Jorge Alonso Romero Giraldo	10.251.613	Especialista Eléctrico	
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Especialista Estructural	
Oriana Andrea Murillo Cotamo	1.117.543.616	Profesional Siso	
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Especialista Ambiental	
José Elías Rincón Flórez	17.324.685	Maestro	9498929344
Mario Ernesto Alvira Oviedo	1.119.586.124	Oficial	9499144802
Wilson Javier Alvis Alape	96.362.521	Técnico electricista	
Miller Hernán Aguilar Rodríguez	93.342.731	Paletero	
Nicacio Alvira Oviedo	1.119.581.906	Ayudante	

5.3 Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de interventoría

De acuerdo con los documentos del proyecto el interventor cuenta con el equipo que se relaciona a continuación.

Tabla 17. Personal mínimo requerido de interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN MES(%)
Personal de supervisión		
Director de Interventoría	1	50%
Residente de Interventoría	1	100%
Profesional SISO	1	100%
Ingeniero eléctrico	1	50%
Especialista en estructuras	1	50%

La Interventoría presentó el equipo de trabajo que hace parte del proyecto durante el periodo de ejecución en cumplimiento con el personal mínimo requerido en los documentos del proyecto.

Tabla 18. Personal de Interventoría.

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE	PROFESIÓN
Director de Interventoría	50%	Jhonattan Hoyos Márquez	Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
Residente de Interventoría	100%	Mayerly Molina Zambrano	Ingeniera Civil

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE	PROFESIÓN
Profesional SISO	100%	Jennifer Salazar	Administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniero eléctrico	50%	Yoylan Torres	Ingeniero Eléctrico
Especialista en estructuras	50%	Jhonattan Hoyos Márquez	Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras



Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

6 ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

Durante desarrollo del proyecto se han ejecutado las siguientes actividades de obra:

REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

- Limpieza de fachada

REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE

- Desmonte y/o demolición de granito y adoquín

INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

- Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople

INSTALAR PISOS Y ENCHAPES

- Enchape cerámica pared
- Enchape cerámica antideslizante piso
- Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido
- Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro

INSTALAR ESTUCO Y PINTURA

- Pintura tipo 1 para muros interiores
- Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)

INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL

- Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación
- Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.

INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS

- Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM
- Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM


OBRAS ELÉCTRICAS

- Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K

y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70

- Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v
- Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar.

Figura 3. Planta arquitectónica primer nivel edificio Gobernación.

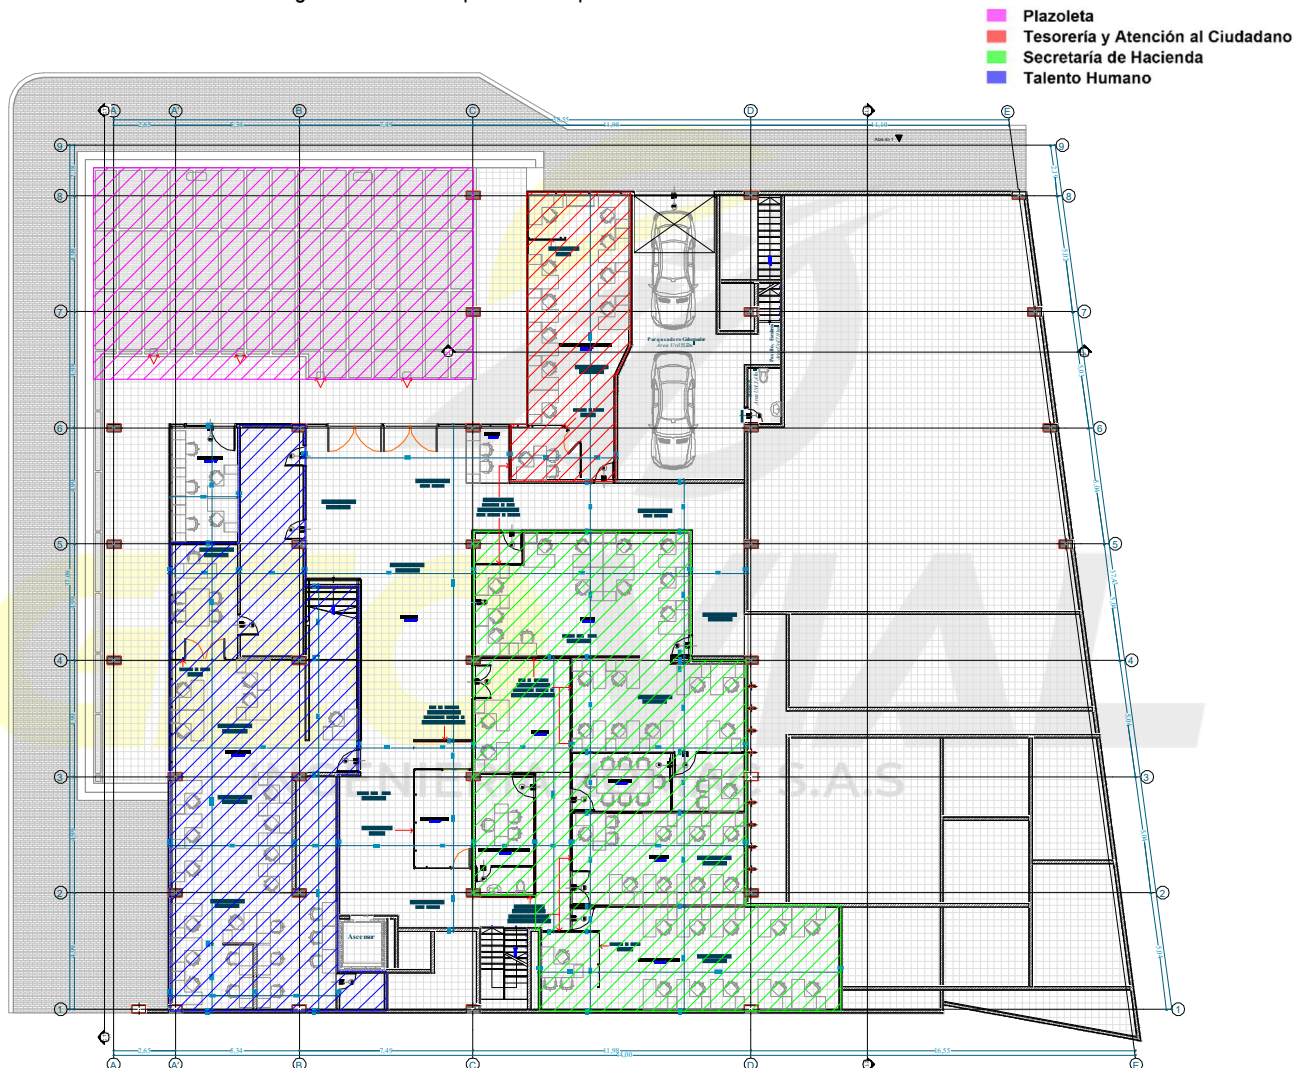

A continuación, se presenta el avance del contratista de obra en el periodo comprendido entre el **1 de enero y el 31 de enero de 2026**.

6.1.1 Limpieza de fachada

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra inicio las labores relacionadas con la limpieza de fachada, para ello se realizó el retiro de polvo , suciedad acumulada, lavado y retiro de manchas y agentes contaminantes de los muros y elementos decorativos de la fachada intervenida. Particularmente se realizaron los trabajos sobre la fachada oeste, donde se encuentra la entrada principal al edificio de la Gobernación.

La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas contractuales y se evidenció la implementación de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificándose por parte de la interventoría el uso adecuado de los elementos de protección personal, la correcta señalización del área intervenida y la aplicación de buenas prácticas para la ejecución segura de trabajos en alturas.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 19. Cantidades de obra, limpieza de fachada.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Fachada Frente					
	1.97	2.50			4.93
	3.26	5.00			16.30
	2.20	7.50			16.50
Ventana	0.70	7.50		2.00	10.50
	6.41	8.40			53.84
	6.41	0.92			5.90
Descuento Ventanas	0.60	1.20		-3.00	-2.16
Bordes Ventanas		0.15	0.60	6.00	0.54
		0.20	1.20	6.00	1.44
Fachada Lateral 1					
	6.41	2.90			18.59
	6.41	4.65			29.81
	6.41	4.65			29.81
Descuento ventanas	0.70	1.20		-1.0	-0.84
Columnas parte inferior	2.50	2.00		3.00	15.00
Columnas parte superior	6.15	0.95		3.00	17.53
Fachada lateral 2	1.70	11.80		2.00	40.12
Descuento de celosías	2.09	0.10		-11.00	-2.30
Celosías parte superior e inferior	2.17	0.5		11	11.94

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Celosías parte de ventana	1.48	0.9		11	14.65
Celosías abajo y arriba		0.1	0.2	11	0.22
Columnas superiores	1.4	0.23		2	0.644
Paredes laterales					
Izquierda	6.41	1.52			9.74
Derecha	9.31	1.52			14.15
Columneta parte derecha	7.35	0.48			3.53
pared derecha parte superior	2.1	1.3			2.73
Fachada lateral 2 parte inferior	2.03	9.4			19.082
parte de rampla	1.65	1.2			1.98
Pared lateral derecha	2.9	1.45			4.205
Alfajías					
fachada frontal		0.38	16.82		6.3916
Fachada lateral 1		0.38	13.25		5.035
Fachada lateral 2		0.24	11.8	3	8.496
TOTAL					358.29

6.1.2 Desmante y/o demolición de granito y adoquín

Durante el periodo de ejecución se realizó el desmante y/o demolición de granito y adoquín en el área correspondiente a la plazoleta del edificio de la gobernación, dicha actividad se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas y en los sitios señalados en los planos y documentos del proyecto.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 20. Cantidades de obra, Desmante y/o demolición de granito y adoquín.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Plazoleta		8.00	8.86	1	70.88
		9.05	7.34	1	66.43
descuento		0.65	0.35	2	-0.46
TOTAL					136.85

6.1.3 Suministro e Instalación de sanitario. Incluye grifería y acople

Se realizó el suministro e instalación de sanitario, de acuerdo con los sitios definidos en los planos del proyecto. Particularmente, se realizó la instalación en el despacho de la Secretaria de Hacienda. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en concordancia con los diseños aprobados, garantizando su correcta integración a las redes hidrosanitarias existentes.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 21. Cantidades de obra, suministro e instalación de sanitario.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
Secretaría de Hacienda				1	1.00
TOTAL					1.00

6.1.4 Enchape cerámica pared

El contratista de obra llevo a cabo la actividad correspondiente a la instalación de enchape cerámica pared en las áreas definidas dentro de los planos arquitectónicos del proyecto, Particularmente, se realizó la instalación de enchape sobre los muros del baño ubicado en el despacho de la Secretaria de Hacienda. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 22. Cantidades de obra, enchape cerámica pared.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
Secretaría de Hacienda					
pared lado 1	2.00	2.08			4.16
pared lado 2	2.00	3.83			7.66
pared lado 3	2.00	1.1			2.20
TOTAL					14.02

6.1.5 Enchape antideslizante piso

Durante el periodo de ejecución, el contratista de obra realizó la instalación de enchape antideslizante piso en las áreas definidas dentro de los planos arquitectónicos del proyecto, Particularmente, se realizó la instalación de enchape de piso del baño ubicado en el despacho de la Secretaria de Hacienda. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 23. Cantidades de obra, enchape cerámica antideslizante piso.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
Secretaría de Hacienda					
Piso área 1		1.1	2.2		2.42
Piso área 2		0.58	0.79		0.46
TOTAL					2.88

6.1.6 Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido

En el transcurso del período reportado, el contratista de obra ejecutó la actividad correspondiente al mantenimiento de guardaescoba en granito pulido en las áreas definidas en los planos del proyecto. Particularmente, se realizó el mantenimiento de guarda escoba en granito pulido en la oficina destinada a Tesorería y Atención al Ciudadano. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 24. Cantidades de obra, mantenimiento De guarda escoba en granito pulido.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
Tesorería y Atención al ciudadano			4.7		4.70
			1.34		1.34
			6.47		6.47
			4.12		4.12
			2.85		2.85
			2.7		2.70
			2.32		2.32
			1		1.00
TOTAL					25.50

6.1.7 Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra ejecutó la actividad correspondiente al suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro en las zonas definidas en los planos del proyecto. Particularmente, se realizó el suministro e instalación de guardaescoba en la oficina destinada a Tesorería y Atención al Ciudadano y en las oficinas destinadas al funcionamiento de la Secretaria de Hacienda. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 25. Cantidades de obra, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro.

Localización	Dimensiones			TOTAL
	Alto	borde muro	Longitud (m) No. Elementos	
Primer piso				
Tesorería y Atención al ciudadano		0.10	1.66 2	3.42
			2.30 2	4.60
Tributaria			2.30 2	4.60
			1.42 2	2.84
			2.42 2	4.84
		0.10	2.64 2	5.38
			1.63 2	3.26
			4 1	4.00
			3.2 2	6.40
		0.10	0.71 2	1.52
		0.10	3.1 2	6.30
			4.65 1	4.65
			4.22 2	8.44
Sala de juntas		0.10	1.52 2	3.14
		0.10	2.04 2	4.18
		0.10	5.45 2	11.00
Secretarias		0.10	3.68 2	7.46
		0.10	2.4 2	4.90
Secretaría de hacienda		0.10	4.23 2	8.56
		0.10	0.40 2	0.90
Contabilidad		0.10	2.86 2	5.82
			7.64 2	15.38
		0.10	3.06 2	6.22
		0.10	1.56 2	3.22
TOTAL				131.03

6.1.8 Pintura tipo 1 para muros interiores

Durante el periodo de ejecución, el contratista de obra ejecuto la actividad correspondiente a la aplicación de pintura en muros interiores en las áreas definidas dentro del alcance del proyecto. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas y en concordancia con los lineamientos aprobados para el proyecto, garantizando uniformidad en los acabados y adecuada presentación de los espacios intervenidos. Particularmente, se realizó la aplicación de pintura sobre los muros de la oficina destinada a Tesorería y Atención al Ciudadano y en las oficinas destinadas al funcionamiento de la Secretaria de Hacienda.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 26. Cantidades de obra, pintura tipo 1 para muros interiores.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	ancho	Long	Alto	No. Elementos	
Primer piso					
Atención al ciudadano		1.66	2.58	2	8.57
		2.12	2.58	2	10.94
		6.47	2.58		16.69
		1.34	2.58		3.46
		4.70	2.58		12.13
		3.30	2.58	2	17.03
Talento humano		1.50	2.58		3.87
Tributaria		7.00	2.58	2	36.12
		1.42	2.58	2	7.33
		2.42	2.58	2	12.49
		2.64	2.58	2	13.62
		1.63	2.58		4.21
		4	1	2	8.00
		3.2	1	2	6.40
		5.45	2.58		14.06
		0.71	1	2	1.42
		3.1	2.58		8.00
		4.22	2.58	2	21.78
		0.95	2.58		2.45
Sala de juntas		1.52	2.58	2	7.84
		2.04	2.58	2	10.53
		1.1	0.52	2	1.14
		5.45	2.58	2	28.12
		1.1	0.52	2	1.14
		1.1	0.52	2	1.14
Secretarias		3.68	2.58	2.00	18.99
		2.4	2.58	2.00	12.38

Localización	Dimensiones				TOTAL
	ancho	Long	Alto	No. Elementos	
Secretaría de Hacienda		1.00	0.52	2.00	1.04
		4.23	2.58	3.00	32.74
		0.40	2.58		1.03
Contabilidad		2.86	2.58	2.00	14.76
		7.64	2.58	2.00	39.42
		1.2	0.52	2.00	1.25
Secretaria de Presupuesto		7.64	2.48		18.95
		10.8	2.48		26.78
		3.16	1.2		3.79
		3.06	2.48	3.00	22.77
		1.56	2.48	2.00	7.74
		1.1	0.52	2.00	1.14
		0.9	0.52	2.00	0.94
Escaleras Recepción		0.55	2.5		1.38
		2.8	2.64		7.39
		2.8	2.64	0.50	3.70
		2.68	1.94	0.50	2.60
		0.32	0.7		0.22
		2.68	0.7		1.88
		1.84	2.64		4.86
Cuarto recepción		0.4	2.58	1.03	1.03
		1	2.58	2.58	2.58
		0.51	0.48	0.24	0.24
TOTAL					488.07

6.1.9 Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra inicio las labores relacionadas con aplicación de pintura tipo 1 para exteriores sobre los muros de la fachada del edificio. Particularmente se realizaron los trabajos sobre la fachada oeste, donde se encuentra la entrada principal al edificio y sur en donde funciona la oficina de ventanilla única de la Gobernación.

La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas y a los lineamientos aprobados para el proyecto, garantizando adecuada cobertura y terminación en las superficies intervenidas. Dado que los trabajos incluyeron labores en altura, se verificó la implementación de las medidas de seguridad correspondientes y el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de actividades.

Los trabajos se realizaron manteniendo condiciones adecuadas de orden y seguridad en el frente de obra, sin afectar el normal desarrollo de las demás actividades programadas.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 27. Cantidades de obra, pintura muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada).

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Fachada Frente					
	1.97	2.50			4.93
	3.26	5.00			16.30
	2.20	7.50			16.50
Ventana	0.70	7.50		2.00	10.50
	6.41	8.40			53.84
	6.41	0.92			5.90
Descuento Ventanas	0.60	1.20		-3.00	-2.16
Bordes Ventanas		0.15	0.60	6.00	0.54
		0.20	1.20	6.00	1.44
Fachada Lateral 1					
	6.41	2.90			18.59
	6.41	4.65			29.81
	6.41	4.65			29.81
Descuento ventanas	0.70	1.20		-1.0	-0.84
Columnas parte inferior	2.50	2.00		3.00	15.00
Columnas parte superior	6.15	0.95		3.00	17.53
Fachada lateral 2	1.70	11.80		2.00	40.12
Descuento de celosías	2.09	0.10		-11.00	-2.30
Celosías parte superior e inferior	2.17	0.5		11	11.94
Celosías parte de ventana	1.48	0.9		11	14.65
Celosías abajo y arriba		0.1	0.2	11	0.22
Columnas superiores	1.4	0.23		2	0.644
Paredes laterales					
Izquierda	6.41	1.52			9.74
Derecha	9.31	1.52			14.15
Columneta parte derecha	7.35	0.48			3.53
pared derecha parte superior	2.1	1.3			2.73
Fachada lateral 2 parte inferior	2.03	9.4			19.082
parte de rampla	1.65	1.2			1.98
Pared lateral derecha	2.9	1.45			4.205
Alfajías					
fachada frontal		0.38	16.82		6.3916
Fachada lateral 1		0.38	13.25		5.035
Fachada lateral 2		0.24	11.8	3	8.496
TOTAL					358.29

6.1.10 .Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra continuo con la instalación del cielo raso plano en drywall según el diseño y de acuerdo a los lineamientos de los documentos del proyecto, la actividad se desarrolló en las áreas de Tesorería y atención al ciudadano y en las oficinas que hacen parte de la Secretaría de hacienda.

A continuación, se muestra las cantidades acumuladas a la fecha de corte del presente informe:

Tabla 28. Cantidades de obra, cielo raso plano en drywall según diseño

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Cant	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
atención al ciudadano		6.47	4.12	1	26.6564
		4.7	3.58	1	16.826
		1.37	3.8	1	5.206
		1	2.12	1	2.12
figura		2	5.8	1	11.6
descuento de aire		0.84	0.84	-3	-2.1168
Tapa		0.12	4.7	2	1.128
		0.12	1.37	1	0.1644
		0.12	6.47	2	1.5528
Dirección de Presupuesto		10.8	4.2	1	45.36
Dirección de Presupuesto-habitación pequeña		2.3	3.04	1	6.992
figura		2.15	8.8	1	18.92
descuento de aire		0.84	0.84	-2	-1.4112
Secretaría de hacienda		2.33	3.92	1	9.1336
baño secretaría		1.1	2.2	1	2.42
		0.58	0.79	1	0.4582
tapa		0.52	3.92	1	2.0384
		0.18	3.92	1	0.7056
Contabilidad		4	7.3	1	29.2
figura		2.75	4.7	1	12.925
descuento de aire		0.84	0.84	-1	-0.7056
tapa		0.14	4	1	0.56
		0.5	4	1	2
Secretaría		4.04	4.81	1	19.4324
figura		2.2	3.4	1	7.48
descuento de aire		0.84	0.84	-1	-0.7056
Tributaria		7	5.45	1	38.15
		3.95	2.42	1	9.559
Figura		2.8	7.6	1	21.28
descuento de aire		0.84	0.84	-2	-1.4112
Sala de Juntas		7.27	3.8	1	27.626

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Cant	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
figura		2.2	5.2	1	11.44
descuento de aire		0.84	0.84	-1	-0.7056
tapa		0.14	3.8	1	0.532
		0.2	3.8	1	0.76
Sala de Juntas		4.12	2.5	1	10.3
figura		1.41	2.97	1	4.1877
descuento de aire		0.84	0.84	-1	-0.7056
Sala de Juntas		3.15	2.5	1	7.875
figura		1.54	1.45	1	2.233
		0.84	0.84	-1	-0.7056
tapa		0.14	2.5	1	0.35
		0.20	2.5	1	0.5
cuarto recepción		1.31	2.2	1	2.882
Recepción		5.00	8.5	1	42.5
Figuras		1.50	1.5	8	18
TOTAL					412.59

6.1.11 Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielo raso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.

El contratista de obra realizó la actividad correspondiente a la construcción de carteras ornamentales para iluminación indirecta, de acuerdo con las especificaciones técnicas y en las zonas definidas en los planos aprobados del proyecto, garantizando su adecuada integración con el sistema arquitectónico proyectado. Particularmente, se realizó la instalación de carteras ornamentales en la oficina destinada a Tesorería y Atención al Ciudadano y en las oficinas destinadas al funcionamiento de la Secretaría de Hacienda.

Los trabajos se ejecutaron manteniendo condiciones adecuadas de orden y seguridad en el frente de obra, sin interferir con el desarrollo de las demás actividades programadas.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 29. Cantidades de obra, carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielo raso.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Cant	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
atención al ciudadano					
borde exterior		11.60	4	1.00	15.60
borde interior		11.00	3.4	1.00	14.40
Dirección de Presupuesto					0.00
exterior		17.6	4.3	1.00	21.90

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Cant	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
interior		17	3.7	1	20.70
					0.00
Contabilidad					0.00
exterior		8	4.3	1	12.30
interior		7.4	3.7	1	11.10
					0.00
Sala de juntas					0.00
exterior		2.2	5.2	1	7.40
interior		1.6	4.6	1	6.20
exterior		1.54	1.45	1	2.99
interior		0.94	0.85	1	1.79
exterior		1.41	2.97	1	4.38
interior		0.81	2.37	1	3.18
Secretaría					0.00
exterior		2.2	3.4	1	5.60
interior		1.6	2.8	1	4.40
					0.00
Tributaria					0.00
exterior		2.8	7.6	1	10.40
interior		2.2	7	1	9.20
Recepción		10.6	7.2	1	17.80
Perímetros carteras recepción		3	3	8	48.00
		2.4	2.4	8	38.40
TOTAL					255.74

6.1.12 Suministro e instalación de puertas en vidrio templado 10 mm

El contratista de obra ejecutó la actividad correspondiente al suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10mm de espesor, en las áreas definidas dentro del alcance contractual. En particular, durante el periodo de ejecución se realizó la instalación de puertas en vidrio en las áreas correspondientes a Tesorería y Atención al Ciudadano y en las oficinas que hacen parte de la Secretaría de hacienda.

La actividad fue desarrollada conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proyecto y en cumplimiento de los lineamientos aplicables, garantizando la adecuada instalación y funcionamiento de los elementos.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 30. Cantidades de obra, suministro e instalación de puertas en vidrio templado 10 mm

Localización	Dimensiones			TOTAL
	Ancho	Altura	No. Elementos	
Primer piso				
Tesorería	1.00	2.10		2.10
Secretaría	1.24	2.10		2.60
	1.00	2.10		2.10
Sala de juntas	1.10	2.10		2.31
Contabilidad	1.20	2.10		2.52
Presupuesto	1.00	2.10		2.10
	0.90	2.10		1.89
Sec Hacienda	1.00	2.10		2.10
TOTAL				17.72

6.1.13 Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 mm

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra realizó la actividad correspondiente al suministro e instalación de ventana en aluminio con vidrio 6 mm de espesor, en las áreas definidas dentro del alcance contractual. En particular, durante el periodo de ejecución se realizó la instalación de ventanas en aluminio en la oficina destinada a Tesorería y Atención al Ciudadano y en las oficinas que hacen parte de la Secretaría de hacienda.

La actividad fue desarrollada conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proyecto y en cumplimiento de los lineamientos aplicables, garantizando la adecuada instalación y funcionamiento de los elementos.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 31. Cantidades de obra, suministro e instalación de ventana en aluminio con vidrio 6mm.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
Tesorería		1.50	0.4		0.6
Secretaría		4.00	1.44		5.76
TOTAL					6.36

6.1.14 Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°k y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70

Durante el periodo de ejecución se realizó suministro e instalación de luminarias tipo bala LED de incrustar conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en los puntos definidos en los planos del proyecto, se continuó con las labres de instalación en las áreas de donde se propone quedar las oficinas de Tesorería y en las oficinas destinadas al funcionamiento de la Secretaria de Hacienda.

Los trabajos fueron realizados bajo condiciones de seguridad y orden en el área intervenida, cumpliendo con los lineamientos aplicables en materia de instalaciones eléctricas.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 32. Cantidades de obra, suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Largo	ancho	Long	cant	
Primer piso					
Tesorería				40	40.00
Pasillo patio				10	10.00
Secretarías				20	20.00
Tributaria				10	10.00
Sala de juntas				20	20.00
Contaduría				10.00	10.00
TOTAL					110.00

6.1.15 Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología invertir para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra llevó a cabo la actividad correspondiente al suministro e instalación de unidad condensadora de acuerdo a las especificaciones técnicas de la actividad y conforme al alcance contractual establecido.

La instalación se efectuó en los sitios indicados en los planos del proyecto, asegurando su correcta articulación con las redes eléctricas y componentes asociados.

Las labores se desarrollaron manteniendo las condiciones de seguridad requeridas y la adecuada organización del frente de trabajo, sin generar interferencias con otras actividades en ejecución.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 33. Cantidades de obra, suministro e instalación de unidad condensadora de 76000 BTU.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Largo	ancho	Long	cant	
Terraza segundo piso				7.00	7.00

6.1.16 Suministro e instalación de salida tomacorriente regulado 120 V

Se hizo la correcta instalación para la salida de los tomacorrientes monofásicos de 120 V en tubería PVC SCH 40 la actividad se desarrolló en el primer piso del edificio Central de La Gobernación, en las áreas de donde se propone quedar Tesorería y Atención al ciudadano y en las oficinas Dirección de presupuesto, Contabilidad y Sala de juntas de la Secretaría de Hacienda, siguiendo las especificaciones del reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

Tabla 34. Cantidades de obra, suministro e instalación de salida tomacorriente regulado 120 V

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Largo	ancho	Long	cant	
Primer piso					
Tesorería				12.00	12.00
Tributaria				13.00	13.00
Sala de juntas				15.00	15.00
Contabilidad				18.00	18.00
Presupuesto				25.00	25.00
Secretaría de hacienda				9.00	9.00
Secretarías				3.00	3.00
TOTAL					95

6.1.17 Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos

Se suministro e instaló correctamente las luminarias de emergencia en los sitios indicados en los planos eléctricos del proyecto, la actividad se desarrolló en el primer piso del edificio Central de La Gobernación, en las áreas de donde se propone quedar Tesorería y Atención al ciudadano Talento humano y la Secretaria de

hacienda, siguiendo las especificaciones del reglamento técnico de instalaciones eléctricas y las especificaciones incluidas en los documentos del contrato.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 35. Cantidades de obra, luminaria de emergencia.

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Largo	ancho	Long	cant	
Primer piso					
Tesorería				1.00	1.00
Tributaria				2.00	2.00
Sala de juntas				3.00	3.00
Contabilidad				1.00	1.00
Presupuesto				1.00	1.00
Secretaría de hacienda				1.00	1.00
Secretarías				3.00	3.00
Talento humano				3	3.00
TOTAL					15.00

6.1.18 Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra realizo la actividad de suministro e instalación del tablero general de condensadoras de aires acondicionados de acuerdo a las especificaciones técnicas de la actividad y conforme al alcance contractual establecido.

La instalación se efectuó en los sitios indicados en los planos del proyecto, asegurando su correcta articulación con las redes eléctricas y componentes asociados.

Los trabajos fueron realizados bajo condiciones de seguridad y orden en el área intervenida, cumpliendo con los lineamientos aplicables en materia de instalaciones eléctricas.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 36. Cantidades de obra, suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Largo	ancho	Long	cant	
Primer piso					
cuarto eléctrico				1	1.00

6.1.19 Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (Incluye esquema de pintura)

Durante el período de ejecución, el contratista realizó el suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50, la actividad se desarrolló conforme a los planos aprobados y especificaciones técnicas del contrato. Se realizó la instalación de acero ASTM A-572 Gr 50 para conformar la estructura de soporte de la cubierta que se instalara en la plazoleta del Edificio.

Por parte de la interventoría se realizó control al material suministrado y seguimiento durante la ejecución de las labores para que las obras realizadas cumplieran con el alcance del proyecto. Se evidenció organización en el frente de trabajo y cumplimiento de los procedimientos de seguridad industrial.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el periodo:

Tabla 37. Cantidades de obra, suministro de estructuras

Localización	Dimensiones				TOTAL
	Largo	KG/ML	Long	cant	
Plazoleta					
IPE 300		43.26	5.96	4	1031.32
IPE 200		22.40	2.87	2	128.58
HEA 200		42.30	5.72	4	967.82
				TOTAL	2127.72

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

6.2 Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.

Tabla 38. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo	M2	694,06
1.2	Cerramiento en tela verde	ML	59,90
1.3	Limpieza de fachada	M2	358,29
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE		
2.1	Desmonte de marcos y puertas.	UND	13,00
2.2	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	1,00
2.3	Demolición de muro mampostería E=0,15m.	M2	2,81
2.4	Desmonte de cielo raso existente	M2	515,08
2.5	Demolición de baldosa cerámica	M2	21,32
2.7	Desmonte de vidrio templado	M2	7,35
2.8	Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M2	136,85
2.9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	19,65
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M3	18,00
2.11	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M2	21,93
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA		
4.1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	1,00
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES		
5.1	Enchape cerámica pared	M2	14,02
5.2	Enchape cerámica antideslizante piso	M2	2,88
5.3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	556,76
5.4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	25,50
5.5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	131,03
6	INSTALAR ESTUCCO Y PINTURA		
6.1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M2	488,07
6.2	Estuco para muros.	M2	488,07
6.3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	358,29
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL		
7.1	Cieloraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	412,59
7.2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cieloraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	255,74
7.3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	202,36
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS		
8.2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	17,72
8.3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	6,36
8.4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M2	11,15
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS		
9.3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	8,38
9.4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	5,26
9.5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	10,50
9.6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	351,25
9.7	Excavación manual	M3	22,28
10	OBRAS ELÉCTRICAS		
10.3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	3,00
10.5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	3,00
10.6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	400,00
10.7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	119,00
10.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	265,00
10.9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	110,00
10.13	Desmonte de aparatos de salidas eléctricas	UND	190,00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	7,00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	10,00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	7,00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	95,00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	15,00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	150,00
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	26,00
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1,00
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA		
11.4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	2127,72
11.8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	4,00
11.9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	2,00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

A continuación, se presenta la tabla consolidada de actividades ejecutadas con sus respectivas cantidades acumuladas al corte correspondiente al período de ejecución No. 4. Se precisa que las cantidades aquí relacionadas corresponden exactamente a las registradas en el Acta Parcial de Obra No. 1, documento que sirve de soporte para el trámite de cobro por parte del contratista. La información ha sido verificada por la interventoría, garantizando su coherencia con el avance físico reportado y con los registros de seguimiento efectuados en obra.

Tabla 39. Resumen de cantidades ejecutadas a la fecha de corte del presente informe.

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				\$ 5.716.225,00
1,1	Localización y replanteo	M2	\$ 3.834,00	694,06	\$ 2.661.026,00
1,2	Cerramiento en tela verde	ML	\$ 8.446,00	59,90	\$ 505.915,00
1,3	Limpieza de fachada	M2	\$ 7.115,14	358,29	\$ 2.549.284,00
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE				\$ 9.234.982,00
2,1	Desmonte de marcos y puertas.	UND	\$ 19.580,00	13,00	\$ 254.540,00
2,2	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	\$ 19.580,00	1,00	\$ 19.580,00
2,3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M2	\$ 16.316,00	2,81	\$ 45.848,00
2,4	Desmonte de cielo raso existente	M2	\$ 10.116,00	515,08	\$ 5.210.549,00
2,5	Demolición de baldosa cerámica	M2	\$ 13.054,00	21,32	\$ 278.311,00
2,6	Desmonte o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	\$ 65.866,00		\$ -
2,7	Desmonte de vidrio templado	M2	\$ 17.516,00	7,35	\$ 128.743,00
2,8	Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M2	\$ 13.985,00	136,85	\$ 1.913.847,00
2,9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	\$ 10.275,00	19,65	\$ 201.904,00
2,10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M3	\$ 49.634,00	18,00	\$ 893.412,00
2,11	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M2	\$ 13.144,00	21,93	\$ 288.248,00
3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS				
3,1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	\$ 645.836,00		
3,2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4".	ML	\$ 46.783,00		
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA				\$ 876.625,00
4,1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	\$ 876.625,00	1,00	\$ 876.625,00
4,2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	\$ 608.074,77		
4,3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	\$ 31.507,00		
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				\$ 25.152.997,00
5,1	Enchape cerámica pared	M2	\$ 91.483,00	14,02	\$ 1.282.592,00
5,2	Enchape cerámica antideslizante piso	M2	\$ 82.713,00	2,88	\$ 238.213,00
5,3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	\$ 36.771,00	556,76	\$ 20.472.622,00
5,4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	\$ 11.594,00	25,50	\$ 295.647,00
5,5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	\$ 21.857,00	131,03	\$ 2.863.923,00
5,6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M2	\$ 136.118,00		\$ -

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
5,7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M2	\$ 51.352,00		\$ -
6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA				\$ 27.099.550,00
6,1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M2	\$ 17.090,00	488,07	\$ 8.341.116,00
6,2	Estuco para muros.	M2	\$ 18.559,00	488,07	\$ 9.058.091,00
6,3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	\$ 27.074,00	358,29	\$ 9.700.343,00
6,4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M2	\$ 32.728,00		\$ -
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL				\$ 70.101.051,00
7,1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	\$ 83.105,00	412,59	\$ 34.288.292,00
7,2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	\$ 56.881,00	255,74	\$ 14.546.747,00
7,3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	\$ 105.090,00	202,36	\$ 21.266.012,00
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS				\$ 23.712.210,00
8,1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.552.005,00		\$ -
8,2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 742.609,00	17,72	\$ 13.159.031,00
8,3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	\$ 590.779,00	6,36	\$ 3.757.354,00
8,4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 609.491,00	11,15	\$ 6.795.825,00
8,5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	\$ 423.869,00		\$ -
8,6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.647.505,00		\$ -
8,7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.747.405,00		\$ -
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS				\$ 17.209.011,00
9,1	Pañete 1:4	M2	\$ 29.427,00		\$ -
9,2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M3	\$ 145.660,00		\$ -
9,3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	\$ 1.007.006,00	8,38	\$ 8.438.710,00
9,4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	\$ 996.389,00	5,26	\$ 5.241.006,00
9,5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	\$ 13.486,00	10,50	\$ 141.603,00
9,6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	\$ 7.030,00	351,25	\$ 2.469.288,00

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
9,7	Excavación manual	M3	\$ 41.221,00	22,28	\$ 918.404,00
10	OBRAS ELÉCTRICAS				\$ 419.123.670,00
10,1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	\$ 8.100.949,00		\$ -
10,2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	\$ 5.711.516,00		\$ -
10,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	\$ 1.342.899,00	3,00	\$ 4.028.697,00
10,4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 100A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	\$ 2.514.715,00		\$ -
10,5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	\$ 1.280.629,00	3,00	\$ 3.841.887,00
10,6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	\$ 30.791,00	400,00	\$ 12.316.400,00
10,7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	\$ 261.708,00	119,00	\$ 31.143.252,00
10,8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	\$ 194.105,00	265,00	\$ 51.437.825,00
10,9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 216.691,00	110,00	\$ 23.836.010,00
10,10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	\$ 189.272,00		\$ -
10,11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 131.181,00		\$ -
10,12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre	UND	\$ 5.325.286,00		\$ -

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
	paneles.				
10.13	Desmante de aparatos de salidas eléctricas	UND	\$ 11.454,00	190,00	\$ 2.176.260,00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	\$15.215.430,00	7,00	\$ 106.508.010,00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	\$ 8.500.713,00	10,00	\$ 85.007.130,00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	\$ 6.398.727,00	7,00	\$ 44.791.089,00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	\$ 77.341,00		\$ -
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	\$ 179.172,00	95,00	\$ 17.021.340,00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	\$ 197.091,00	15,00	\$ 2.956.365,00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	\$ 84.668,00	150,00	\$ 12.700.200,00
10.21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	\$ 132.922,00		\$ -
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	\$ 285.107,00		\$ -
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	\$ 553.810,00	26,00	\$ 14.399.060,00
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	\$ 756.173,00		\$ -
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	\$ 6.960.145,00	1,00	\$ 6.960.145,00
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"	ML	\$ 92.214,00		\$ -
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 47.217.125,00
11,1	Polycarbonato alveolar para cubierta	M2	\$ 132.190,00		\$ -

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	--

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
11,2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 864.806,00		\$ -
11,3	Canal en lamina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	\$ 118.185,00		\$ -
11,4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.838,00	2127,72	\$ 46.465.149,00
11,5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.855,00		\$ -
11,6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	\$ 235.048,00		\$ -
11,7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 3.256.543,00		\$ -
11,8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	\$ 106.393,00	4,00	\$ 425.572,00
11,9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	\$ 163.202,00	2,00	\$ 326.404,00
COSTO DIRECTO TOTAL					\$ 645.443.446,00
	ADMINISTRACIÓN	26,00%			\$ 167.815.295,96
	IMPREVISTOS	1,00%			\$ 6.454.434,46
	UTILIDAD	3,00%			\$ 19.363.303,38
	TOTAL A.I.U. 30%				\$ 193.633.034,00
	Costo certificación RETIE				
	Costo certificación RETILAP				
	Plan de Manejo Ambiental				
	Plan de Manejo de Tránsito				
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				\$ 839.076.480,00


6.3 Informe de avance físico de la obra

A continuación, se muestra el avance físico de la obra durante el período de ejecución, el cual incluye el análisis comparativo entre el avance programado y el avance ejecutado, identificando variaciones, posibles retrasos o adelantos. Lo anterior se realizó a partir de seguimiento y control del cronograma aprobado del proyecto, el cual se incluye como documento anexo al presente informe.

Tabla 40. Tabla de programación vs Ejecución

Fecha de Inicio	9 de octubre de 2025
Fecha Final de corte (según el presente informe)	31 de enero de 2026
% Avance de obra programado	49.10 %
% Avance de obra ejecutado	29.39 %
% Avance durante el periodo	9.77 %

Figura 4. Curva S - Contrato de obra

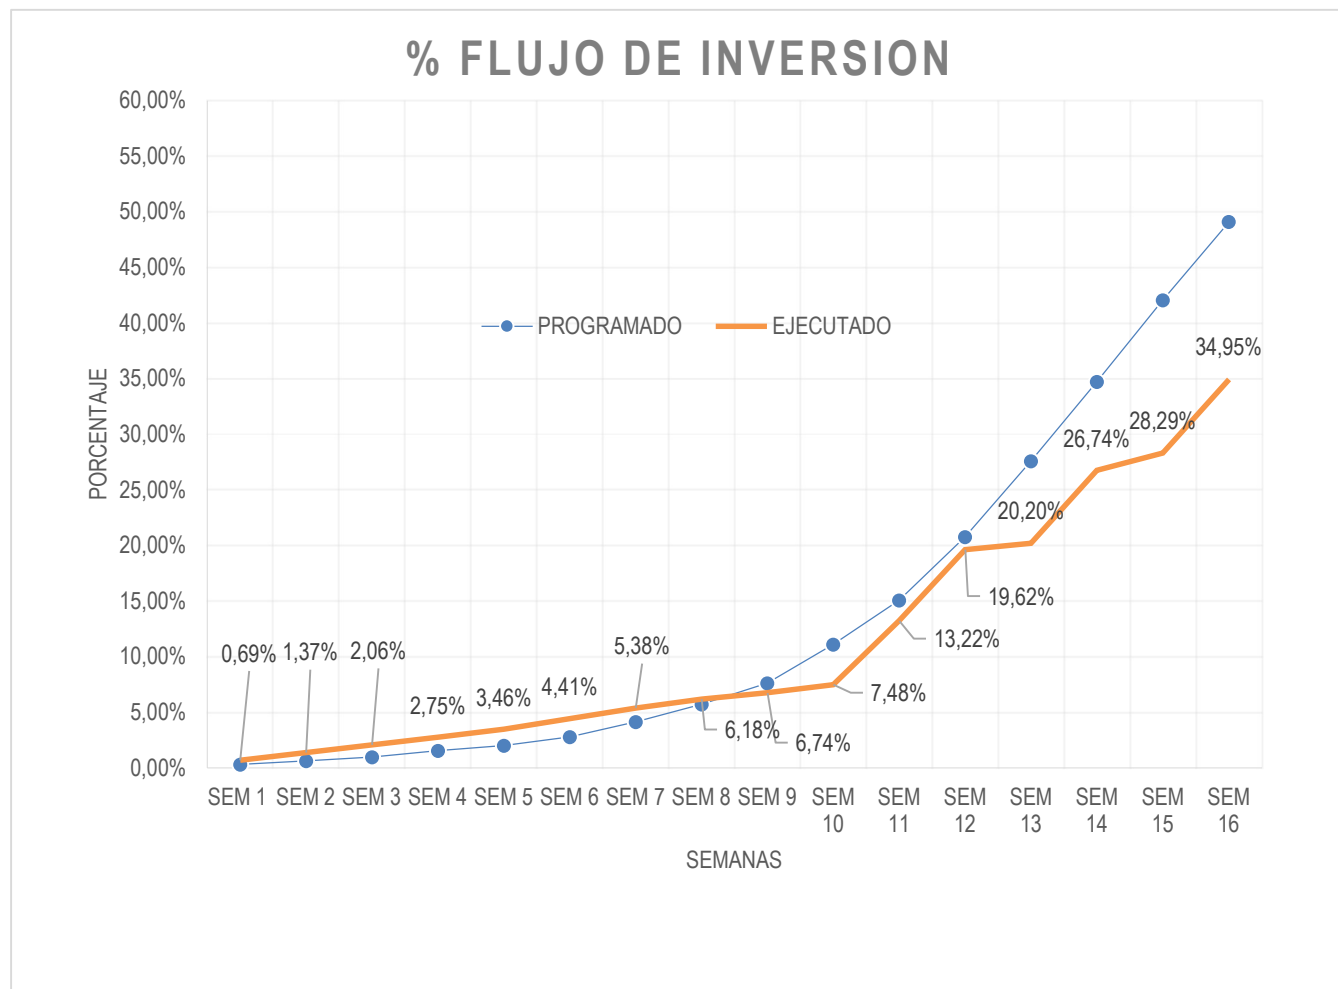

De acuerdo con el análisis del avance físico del proyecto, se evidencia un desempeño inferior en comparación con el avance programado a la fecha de corte. El avance acumulado programado corresponde al 49,10 %, mientras que el avance ejecutado alcanza únicamente el 34,95 %, lo que representa un atraso del 14,15 %.

Adicionalmente, durante las semanas reportadas en el presente informe se observa una desaceleración en el ritmo de ejecución, reflejada en un menor rendimiento respecto a lo planificado. Esta tendencia incrementa el riesgo de incumplimiento del cronograma contractual.

En consecuencia, se hace necesario implementar medidas correctivas inmediatas orientadas a recuperar el atraso presentado, optimizar los recursos disponibles y garantizar el cumplimiento oportuno de las metas establecidas en el cronograma del proyecto.

7 INFORMACIÓN FINANCIERA

7.1 Informe de avance financiero de la obra

Descripción	Valor	Valor	Porcentaje
Valor del contrato	\$ 2,401,062,171.00		100%
Anticipo		\$ 960,424,868.00	40%
Valor Acta Parcial No. 1 por pagar		\$ 714,518,922.00	34,95%
Amortización Acta No. 1		\$ -335.630.592,00	
Saldo Por Cobrar		\$ 1 061 748.973	
Sumas Iguales	\$ 2,401,062,171.00	\$ 2,401,062,171.00	

7.2 Información de manejo del anticipo

En el contrato de obra No. 202500000874, en la cláusula octava **Forma de Pago** se estipula lo siguiente:

"El sistema de pago es a través de precios unitarios El Departamento del Caquetá, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, pagará al Contratista el valor del contrato, de la siguiente manera:

(i) **UN ANTICIPO** hasta del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previa presentación y aprobación de las garantías correspondientes, constitución de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, presentación de un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor y supervisor designado por la entidad.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.

La amortización del anticipo se realizará mediante deducciones del 40% del valor de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a título de anticipo. De igual manera el valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales de avance de obra, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa amortización del porcentaje que se entrega a título de anticipo,

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.</p> <p align="center">CONTRATO No. 202500000893</p> <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

presentación de informe de actividades en medio físico y magnético, con registros fotográficos y certificación de cumplimiento expedida por el interventor externo del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el interventor o el supervisor de solicitar informes cuando lo considere necesario.”

El anticipo fue desembolsado a la cuenta del contratista el 19 de noviembre de 2025. El valor del anticipo es del cuarenta por ciento (40%) correspondiente a novecientos sesenta millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos (\$ 960,424,848.00) M/CTE para lo cual se presentó el siguiente plan de inversión del anticipo.

Tabla 41. Plan de inversión del anticipo del contrato de obra.

No.	Descripción	Valor	Porcentaje
1	Compra de materiales	\$ 620,318,651.00	64.59%
2	Mano de Obra	\$ 282,480,725.00	29.41%
3	Transporte o Alquiler de maquinaria y Equipo	\$ 57,625,492.00	6.00%
	TOTAL	\$ 960,424,868.00	100%

A continuación, se presenta el informe de pagos relacionados con el manejo del anticipo

Tabla 42. Informe de inversión del anticipo del contrato de obra.

Factura No.	Descripción	PROVEEDOR	FECHA	VALOR
FE2773	Suministro e instalación de los sistemas de aire acondicionado y/o ventilación mecánica que acompañaran la reforma y remodelación de la oficina de atención y orientación ciudadana - gobernación del Caquetá ubicada en el municipio de Florencia.	Coll Aires Multi Aires SAS	15/11/25	246.750.262,0
M11938	1 pantalla led p8 exterior 58 cabinets de 96cm x 80cm incluyendo dos cabinets especiales para una integración optima- garantía 2 año- transmisión de imágenes y videos	Zuled Soluciones SAS	18/11/25	271.317.731,10
FE 309	Tubería estructural y Soldadura	Induperfiles y PVC de Colombia SAS	20/11/25	282.480.725,00
FE 310	Tubería estructural y Soldadura		20/1/25	10.300.000,00
FE 319	LAMINAS PVC Blanco Varios (Valor factura 69.750.657,00)		24/11/25	19.328.655,00
1	SUBTOTAL Compra de materiales			569.896.650,10
ALT 96	Mano de obra y construcción para el contrato de obra dc-ge-lp-016-2025 cuyo objeto es "la adecuación y mejoramiento integralde espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá	ALTING INGENIERÍA SAS	25/11/25	282,480,725,00
2	SUBTOTAL Mano de Obra			\$282,480,725,00
	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CONTRATO DE OBRA No DC-GE-LP-016-2025	ALTING INGENIERÍA SAS	25/11/25	\$282,480,725,00
3	SUBTOTAL Transporte o Alquiler de maquinaria y Equipo			\$282,480,725,00
	TOTAL, ANTICIPO PAGADO			\$910.002.867,10

8 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

8.1 Problemas presentados y mecanismos de solución propuestos

- Durante el seguimiento al avance del proyecto, se evidenció atraso en las actividades correspondientes a la adecuación de algunas oficinas, particularmente en las oficinas destinadas al funcionamiento de Talento Humano y Tesorería y Atención al ciudadano. Esta situación obedece a que la instalación de las conexiones de puntos de voz y datos no se encuentra contemplada dentro del alcance contractual, lo cual ha generado una interferencia en la programación de actividades como la instalación de cielorrasos, conformación de muros y demás acabados arquitectónicos. Toda vez que estos sistemas deben quedar debidamente instalados, probados y certificados antes de proceder con el cerramiento definitivo de los elementos constructivos, se ha recomendado definir a la mayor brevedad el mecanismo administrativo que permita la ejecución de estas actividades complementarias, con el fin de mitigar mayores afectaciones al cronograma general y evitar posibles sobrecostos derivados de intervenciones posteriores.
- Durante la ejecución del proyecto se evidenciaron mayores cantidades de obra frente a las inicialmente previstas, las cuales fueron presentadas en un balance general para revisión por parte de la entidad y la interventoría. En este sentido, se ha solicitado evaluar la viabilidad de una posible adición presupuestal, considerando que dichas cantidades adicionales y algunos ítems no contemplados inicialmente resultan necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y adecuación integral del edificio.
- Se evidenció una cantidad reducida de personal ejecutando las actividades del proyecto, situación que limita el avance físico de las obras y podría generar afectaciones en el cumplimiento del cronograma establecido. Ante esta situación, se recomendó al contratista de obra aumentar el número de frentes de trabajo con el fin de optimizar los rendimientos, evitar atrasos y garantizar el desarrollo oportuno de las actividades programadas, minimizando el riesgo de incumplimientos en los plazos contractuales.

8.2 Control de calidad

Para garantizar la calidad de las actividades desarrolladas como parte de la Adecuación y mejoramiento de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación se verificó lo siguiente:

8.2.1 Control de acceso de materiales

Durante el periodo de ejecución se realizaron controles a los materiales tales como revisión de los mismos, solicitud de fichas técnicas, verificación del modo de almacenamiento.

8.2.2 Soporte de los ensayos, pruebas y certificados de calidad de materiales

Para garantizar la calidad de las obras ejecutada se realizó la verificación del cumplimiento en cuanto a especificaciones técnicas de los materiales empleados en la fabricación de concretos. Durante el periodo de ejecución, el contratista de obra presentó los resultados correspondientes al diseño de mezcla de concreto, así como los ensayos de laboratorio realizados al concreto empleado para la construcción del sistema de cimentación de la cubierta proyectada, incluyendo pruebas de resistencia a la compresión conforme a las especificaciones técnicas del contrato. De igual manera, se presentaron las certificaciones de calidad de los materiales pétreos provenientes de cantera, en las cuales se acredita su procedencia y el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para su uso en la obra. Los documentos mencionados se incluyen como anexo al presente informe.

8.2.3 Control de maquinaria y equipos.

Se realizó el control de equipos utilizados durante la ejecución de actividades incluidas en el presente informe

Tabla 43. Relación de equipo empleado en obra.

Equipo	Cumple
Herramienta menor	Sí
Andamios metálicos por sección	Sí
Mezcladora de concreto	Si
Vibrador de concreto	SI
Equipo soldador eléctrico	SI
Grúa	Si

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	--

8.3 Documentos suscritos

8.3.1 Documentación del contrato de obra

Tabla 44. Documentación del contrato de obra.

No.	Referencia	Fecha	Descripción
1	Contrato de obra No. 20250000874	12/09/2025	Contrato suscrito entre la Gobernación del Caquetá y el Consorcio Caquetá 2025.
2	Acta de inicio	9/10/2025	Acta mediante la cual se da inicio a las actividades del contrato de obra No. 20250000874.
3	Acta de pago anticipo	27/10/2025	Acta mediante la cual se autoriza el desembolso del pago del anticipo.
4	Otrosí No. 001 al contrato de obra No. 20250000874	29/12/2025	Acta mediante la cual se modifica el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2026

8.3.2 Comités de seguimiento

Tabla 45. Comités de Seguimiento

No	Referencia	Fecha	Objeto
1	Acta de comité No. 1	21/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento al avance físico y técnico del proyecto Verificar el estado de ejecución en las distintas áreas de trabajo Revisar la documentación requerida Definir compromisos clave para asegurar el cumplimiento de los plazos, la calidad de la obra y los requisitos administrativos, incluyendo la gestión de permisos, la radicación del anticipo, la actualización de pólizas y la coordinación de próximas actividades operativas y técnicas.
2	Acta de comité No. 2	27/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el estado del trámite de la licencia de construcción Socializar las actividades no previstas y los motivos que han generado retraso en la ejecución de las obras, para la solicitud de prórroga del contrato de obra Analizar la solicitud de Adición presupuestal por parte del contratista de obra
3	Acta de comité No. 3	15/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> Socializar el avance del proyecto con respecto a la programación Lectura y verificación del Acta de Comité de obra No 2 Verificación del cumplimiento de compromisos anteriores Solicitud de prórroga del contrato de obra e Interventoría Elaboración de formatos para Solicitud de Prorroga
4	Acta de comité No. 4	21/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de prórroga del contrato de obra e Interventoría Elaboración de formatos para Solicitud de Prorroga

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá Teléfono: 320 9514261 Correo: geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

8.3.3 Relación de correspondencia

Tabla 46. Control de Correspondencia

NO.	REFERENCIA	ASUNTO	FECHA	ENVÍA	RECIBE
1	CQ25-CO0874-0001-09-10-2025	Radicación afiliaciones personal de obra y personal profesional, para el inicio del contrato de obra.	9/10/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
2	GV-CI-00893-001-09-10-2025	Radicación afiliaciones personal, para el inicio de los contratos de obra e interventoría. (Contratos 202500000874 y 202500000893)	9/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
3	GV-CI-00893-001A-20-10-2025	Invitación a primer comité técnico de obra	20/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consorcio Caquetá 2025
4	CQ25-CO0874-003-27-10-2025	Entrega certificación bancaria fiducia	27/10/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
5	GV-CI-00893-002-27-10-2025	Radicación plan de inversión aprobado contrato de obra N° 202500000874	27/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
6	CQ25-CO074-004-05-11-2025	Radicación plan de inversión del anticipo	5/11/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
7	GV-CI-00893-003-10-11-2025	Informe ejecutivo de ejecución	10/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
8	3764	Reiteración por Segunda oportunidad de cumplimiento obligaciones contractuales y compromisos adquiridos en comité técnico del 21 de octubre de 2025 del contrato de obra No. 202500000874	11/11/2025	Gobernación del Caquetá	Geovial Ingeniería Zomac SAS
9	CQ25-CO0874-005-11-11-2025	Solicitud de adición presupuestal y prórroga al contrato de obra N° 202500000874	11/11/2025	Consorcio Caquetá 2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

NO.	REFERENCIA	ASUNTO	FECHA	ENVÍA	RECIBE
10	GV-CI-00893-004-19-11-2025	Aval solicitud de prórroga en tiempo a los contratos de Obra e Interventoría (202500000874 y 202500000893)	19/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
11	GV-CI-00893-005-25-11-2025	Invitación a segundo comité técnico de obra	25/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025
12	CQ25-CO0874-006-28-11-2025	Solicitud de prórroga No. 1	28/11/2025	Consortio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
13	CQ25-CO0874-007-02-12-2025	invitación a primera socialización del contrato de obra	2/12/2025	Consortio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá
14	GV-CI-00893-008-11-12-2025	Invitación a tercer comité técnico de obra	11/12/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025
15	GV-CI-00893-009-19-09-2026	Invitación al cuarto comité técnico de obra	19/01/2026	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025
16	Gmail-GV-CI-00893-009-27-01-2026	Viabilidad y solicitud de adición presupuestal a los contratos de Obra (202500000874) e Interventoría (202500000893)	27/01/2026	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
17	GV-CI-00893-010-10-02-2026	Invitación al quinto comité técnico de obra	10/02/2026	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consortio Caquetá 2025

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

9 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Tabla 47. Verificación del cumplimiento de Obligaciones contractuales

Ítem	Actividad	Cumple
OBLIGACIONES GENERALES		
a	Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.	Si
b	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.	Si, se adoptan los planes de Tránsito y Manejo Ambiental.
c	Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.	Si, se presenta las planillas de pago de seguridad social.
d	Mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	N/A
e	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.	N/A
f	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	N/A
g	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	N/A
h	Notificar a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	N/A
i	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Si, se presenta las garantías con las características establecidas en el contrato de obra.
j	Presentar los documentos que le solicite el supervisor e Interventor.	Si
k	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	N/A
l	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	Si
m	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el supervisor y el Interventor.	Si
n	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de iniciación de obra respectiva, el contratista deberá presentar los documentos técnicos que solicite el interventor y supervisor del contrato.	Si
o	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	Si, se presenta el cronograma de obra del proyecto.

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ". CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
p	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Si
q	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad.	Si
r	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual, evitando dilaciones y retrasos.	Si
s	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho	N/A
t	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Si
u	Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Contratación de la entidad los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del cumplimiento a las leyes que rigen la materia.	Si
v	Informar oportunamente a la interventoría, supervisión y a la entidad sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato.	Si
w	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	Si, se presenta el cronograma de obra del proyecto.
x	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Si
y	Acatar las instrucciones y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del DEPARTAMENTO, la INTERVENTORÍA.	Si
z	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos.	Si
aa	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	N/a
bb	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Si
cc	El contratista deberá contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia lícita de minerales, y deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con relación a las actividades a ejecutar en el presente contrato.	N/a
dd	Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos y de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato.	N/a
ee	Constituir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Si, se presenta las garantías vigentes con las características establecidas en el contrato de obra.
ff	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado garantizando los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. En este orden de ideas, será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con EL DEPARTAMENTO.	Si
gg	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros, operarios, profesionales y todo el	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

Ítem	Actividad	Cumple
	personal de intervienen en cada una de las obras a ejecutar, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.	
hh	Es responsabilidad del contratista ubicar una valla por la obra, con las siguientes características: Dimensiones: Vallas rectangulares de dos (2) metros de ancho por uno metro de altura. Texto: Elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. Contenido: Deberá contener como mínimo el escudo del Departamento del Caquetá, el eslogan del gobierno “OBRAS Y NO PROMESAS”, nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, interventor y fecha de inicio y terminación del proyecto. Instalación de la valla: Se instalará en sitio visible previamente determinados por el interventor. El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la obra.	Si
ii	EL CONTRATISTA, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, deberá abstenerse de celebrar contratos de interventoría con EL DEPARTAMENTO, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del presente contrato.	Si
jj	Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Interventoría de EL DEPARTAMENTO, los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del cumplimiento a las leyes que rigen la materia.	Si
kk	Informar oportunamente a la interventoría y al DEPARTAMENTO sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato de obra.	Si
Respecto a la obra		
a	Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.	Si
b	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	Si, se adoptan los planes de Tránsito y Manejo Ambiental.
c	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	N/a
d	EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.	Si
e	EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.	N/a
f	Aquello permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.	Si, se tramita el permiso de El permiso de Obra Menor.
g	El contratista suministrará junto con cada equipo, una copia de todos aquellos detalles constructivos principales incluyendo también un diagrama unifilar de las redes construidas.	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual		
a	Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato y ofrecidos.	Si
b	En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL DEPARTAMENTO o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si
c	El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
d	El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por EL DEPARTAMENTO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
e	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.	Si, el 100% del personal no calificado corresponde a personas de la región.
f	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cinco por ciento (5%) del personal no calificado, a individuos que se hayan acogido al programa de desmovilización y reinserción impulsado por el Gobierno Nacional o a individuos en condición de desplazamiento.	No
g	Mantener al frente de las obras al profesional idóneo, quien será el director de proyecto y representante de EL CONTRATISTA para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra.	Si
h	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.	N/a
i	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL DEPARTAMENTO.	Si
j	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del contrato.	N/A
Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.		

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
a	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.	Si
b	Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.	Si
c	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	Si
d	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Si
e	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.	Si
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
a	Realizar los trabajos en las condiciones contratadas	Si
b	Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e Instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o Instalaciones	Si
c	Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras	Si
d	Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará la entidad, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Planeación o el Interventor	Si
e	Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato	Si
f	Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, la entidad o la comunidad	Si
g	Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas	N/A
h	Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.	Si, se realizó el trámite del Permiso de Obra Menor ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Florencia
i	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 20250000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	--	---

Ítem	Actividad	Cumple
j	Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.	Si
k	Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.	N/A
l	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o la entidad, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas.	N/A
m	Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.	Si
n	Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.	Si
o	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	N/A
p	EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.	Si
q	EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.	Si
r	Aquellas permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.	Si, se realizó el trámite del Permiso de Obra Menor ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Florencia
s	Realizar ajuste a los diseños, si diere lugar a ello, por algún evento que la obra presente afectación por inestabilidad o necesidad para garantizar su uso o cambio de normas.	N/A
t	Suministrar y mantener, durante la obra, conforme a los porcentajes de dedicación el personal ofrecido y requerido para el proyecto.	Si
u	En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con la entidad o con terceros.	Si
v	El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
w	El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por la entidad. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
	técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	
x	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un ochenta por ciento (80%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.	Si, el 100% del personal no calificado corresponde a personas de la región.
y	EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato en los términos en que fue viabilizado el proyecto.	Si
z	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.	N/A
aa	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la entidad.	Si
bb	Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos Sistemas.	Si
cc	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la entidad, por causa o con ocasión del contrato.	N/A
dd	Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del contrato, utilizando para ello los frentes de trabajo que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.	Si
ee	Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.	Si
ff	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: A) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. B) Ajustar o reajustarse, según sea necesario. C) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. D)	N/A

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
	Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.	
gg	Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.	N/A
hh	El contratista deberá entregar a la entidad, copia de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las obras.	Si, se presenta copia del Permiso de Obra Menor.
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS		
a	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad, el interventor o de los organismos de control.	Si
b	Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría integral y deberá contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Registros fotográficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. D) Fotocopia de la bitácora de obra. E) Resumen de las actividades realizadas. F) Relación del personal empleado en la ejecución de las obras. G) Actualización del programa de ejecución del contrato. H) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.	Si, se presenta el informe mensual de ejecución con los requisitos establecidos
c	Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director del proyecto, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, y el Supervisor del contrato de interventoría, sin perjuicio de que participen otros empleados de las diferentes áreas. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Rectoría.	Si, se incluye copia de las actas de comité realizadas durante el periodo de ejecución.
d	Evaluar, juntamente con el interventor, semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.	Si
e	Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y deberá contener: A) Resumen de actividades y desarrollo del contrato. B) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría. C) Actualización de la Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. E) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación. F) Registro fotográficos definitivos.	N/A
f	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo,	Si, se está llevando la bitácora de obra de acuerdo con el requisito exigido.

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

 <p>GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	 <p>GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S</p>
---	---	---

Ítem	Actividad	Cumple
	personal laborando, estado y relación del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la entidad.	
g	Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.	Si
h	Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría cualquier necesidad de adición de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra o inclusión de ítems no previstos, cuando estos resulten indispensables para la adecuada terminación de la obra. Estas solicitudes deberán ser sustentadas técnica, financiera y jurídicamente, y no darán lugar a modificación contractual alguna mientras no cuenten con la aprobación expresa por parte de la entidad contratante.	N/A
i	Deberá contar con una oficina central en la ciudad de Florencia Departamento del Caquetá, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
a	Verificar junto con el Interventor el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta.	Si
b	Ejecutar el contrato de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto aprobado.	Si
c	Reportar de forma oportuna a la entidad contratante cualquier variación o desbalance en el flujo de recursos que pueda comprometer el normal desarrollo de la obra.	N/A
d	Realizar la legalización del anticipo recibido (si aplica) dentro de los plazos establecidos, mediante la presentación de los documentos contables y financieros que soporten su correcta inversión, conforme a las actividades ejecutadas.	N/A
e	Cumplir con las obligaciones tributarias, parafiscales y de seguridad social derivadas de la ejecución del contrato, y allegar a la entidad los soportes de pago correspondientes, cuando así se requiera.	Si, se Anexan las planillas de pago de seguridad social de los meses de Octubre del 2025 a Enero del 2026 relacionadas en el numeral 5.2 del presente informe y el certificado de paz y salvo de parafiscales emitido por el contador público del Consorcio Caquetá 2025
f	Abstenerse de efectuar modificaciones presupuestales internas o reasignaciones de recursos entre actividades sin autorización previa y por escrito de la entidad contratante.	Si
g	Conservar y custodiar los documentos contables y financieros relacionados con el contrato por el término legal, poniéndolos a disposición de la entidad contratante o de los entes de control cuando sean requeridos.	Si

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

10 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1 Desarrollo e implementación de la gestión ambiental

10.1.1 Conformación del grupo de gestión social y ambiental

El contratista ha realizado la entrega del Plan de Manejo Ambiental, el cual se ciñe y adapta a la ejecución del presente proyecto. Se elaboró bajo la lógica de optimizar, cuidar y racionalizar el uso de los recursos naturales y físicos afectados por el proyecto, desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto durante su ejecución. Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecución y cumplimiento de los programas propuestos en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, tendientes a controlar los impactos generados por el proyecto.

10.1.2 Capacitación y concienciación del personal en obra

Se verificó la ejecución de capacitaciones orientadas a la divulgación del Plan de Manejo Ambiental, protección y cuidado de la flora y fauna de la región, manejo adecuado de materiales y escombros, gestión integral de residuos sólidos, uso correcto de los elementos de protección personal y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Lo anterior se comprobó mediante la revisión de los registros de asistencia, soportes de los contenidos desarrollados y evidencias fotográficas, verificando el cumplimiento de las metas establecidas en el subprograma. De acuerdo con el seguimiento efectuado, se evidenció coherencia entre las actividades ejecutadas y las obligaciones correspondientes al periodo evaluado. Se recomienda mantener la periodicidad de las jornadas de capacitación y reforzar la cultura de prevención y control ambiental de todos los involucrados en la obra.

10.2 Programa de actividades constructivas

10.2.1 Señalización de frentes de obra

Se realizó seguimiento al subprograma de señalización de frentes de obra, verificando la adecuada instalación y mantenimiento de la señalización y de aislamiento en las áreas intervenidas durante el periodo evaluado. Se verificó que el contratista implementara el aislamiento y la demarcación de los frentes de trabajo mediante el uso de malla para cerramiento y cintas demarcadoras, garantizando la separación entre las zonas intervenidas y las áreas de circulación peatonal y vehicular. Durante el periodo de ejecución se verificó que los elementos de la señalización permanecieran en condiciones adecuadas de visibilidad, alineación y

estabilidad, contribuyendo a la prevención de riesgos laborales y a la mitigación de posibles afectaciones al entorno. Adicionalmente, se recomendó al contratista mantener el control permanente sobre el estado de la señalización instalada y efectuar la reposición inmediata de los elementos que presenten deterioro o desplazamiento.

10.2.2 Manejo y disposición final de residuos sólidos

Se realizó seguimiento al subprograma de Manejo y disposición final de residuos sólidos, verificando la implementación de las medidas establecidas para la clasificación, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos generados en los frentes de trabajo. Se comprobó que el contratista dispusiera recipientes debidamente identificados para la separación en la fuente, diferenciando residuos ordinarios, reciclables y residuos metálicos, conforme a lo definido en el programa ambiental. Así mismo, se evidenció que los residuos ordinarios son entregados al sistema de recolección municipal para su disposición final y que los materiales reciclables y residuos metálicos son entregados para su aprovechamiento, evitando su acumulación en obra. Durante las visitas técnicas se verificó el adecuado almacenamiento temporal, el orden en las zonas de acopio y la no disposición de residuos en sitios no autorizados, observándose coherencia entre las actividades ejecutadas y las obligaciones establecidas en los documentos del contrato.

10.3 Biodiversidad y servicios ecosistémicos

10.3.1 Protección de ecosistemas sensibles

Durante el período de ejecución se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con el subprograma de protección de ecosistemas sensibles mediante la verificación de la implementación de medidas orientadas a la sensibilización y prevención de posibles afectaciones sobre los ecosistemas identificados en el área de influencia del proyecto. Para tal fin se verificó el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas al personal de obra sobre la importancia de la preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos y sensibles, así como sobre las buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades constructivas. Se revisaron los registros de asistencia y evidencias fotográficas correspondientes, verificando el cumplimiento de las metas establecidas en el programa.

10.3.2 Recuperación de áreas afectadas

Durante el período de ejecución no se aplicó el programa de Recuperación de Áreas Afectadas ya que las actividades de adecuación y mejoramiento de las oficinas y de la plazoleta se encuentran en desarrollo y no se ha realizado la entrega formal de los espacios intervenidos. En consecuencia, las labores de limpieza final, desmonte de instalaciones temporales y restitución de áreas a condiciones iguales o mejores a las iniciales se verificarán una vez se concluya la totalidad de las actividades constructivas programadas en dichos espacios.

No obstante, se realizó el seguimiento permanente a las condiciones generales de orden y aseo en las áreas intervenidas, verificando la correcta disposición temporal de los residuos generados y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas, con el fin de prevenir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.

10.4 Programa de gestión social

10.4.1 Información y divulgación

Se realizó el seguimiento al subprograma de Información y Divulgación, verificando la implementación de las acciones orientadas a garantizar que la población del área de influencia directa (A.I.D.) se mantenga informada de manera clara y oportuna sobre las actividades del proyecto.

Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento frente a las reuniones programadas, observándose coherencia entre las actividades desarrolladas y las metas establecidas en el programa. Se verificó la ejecución de espacios de socialización, en los cuales se presentó la descripción del proyecto, sus actividades, cronograma y medidas de manejo ambiental aplicables. Se realizó el seguimiento a la logística de las reuniones de información y divulgación, verificando la adecuada programación, convocatoria y disponibilidad de los espacios y recursos necesarios para su desarrollo. Durante el periodo de ejecución no se realizaron reuniones con la comunidad.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”. CONTRATO No. 202500000893 INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--

10.5 Gestión de salud y seguridad en el trabajo.

Durante el periodo de ejecución la gestión del contratista se enfocó principalmente en la charla rutinaria de aspectos relacionados con uso de los implementos de seguridad personal y el manejo de herramientas dentro de los sitios de trabajo, así como la regulación con el orden y el aseo de los sitios de trabajo.

Se verificó la gestión respecto a la afiliación al sistema general de seguridad social de los trabajadores cuyas certificaciones se encuentran anexas en el presente informe.

10.5.1 Afiliaciones y seguimiento de pagos de seguridad social y aportes legales

Se revisó que todo el personal vinculado a la obra contara con la debida afiliación laboral al sistema de seguridad social integral (ARL; EPS y AFP) verificándose que se encuentra al día en cuanto a los pagos de seguridad social y aportes legales para el periodo correspondiente al presente informe. Anexo se encuentra los soportes de afiliación y de planillas de pago del personal relacionado.

10.5.2 Exámenes médicos

Se verificó el cumplimiento de los requisitos relacionados con los exámenes médicos ocupacionales del personal vinculado al contrato de obra. En este sentido, se revisó que el contratista cuenta con los certificados de aptitud laboral vigentes para el personal asignado a las actividades del proyecto, los cuales son expedidos por una entidad competente en salud ocupacional.

El contratista de obra presentó los reportes de los exámenes médicos de salud ocupacional al personal que ingresó y estuvo laborando durante el periodo de ejecución. La documentación fue revisada y se encuentra conforme con lo exigido por la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y se incluye como anexo al presente informe.

10.5.3 Capacitaciones

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra realizó las capacitaciones de inducción dirigidas por la SISO acerca de la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos presentes en el frente de trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), los procedimientos seguros de trabajo, el reporte de actos y condiciones inseguras, y las medidas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ”.</p> <p>CONTRATO No. 202500000893</p> <p>INFORME DE INTERVENTORÍA No.1</p>	
--	--	--


Se verifico los formatos de asistencia firmados por el personal con lo que se establece que las actividades realizadas por el contratista de obra se encuentran alienadas con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

10.5.4 Elementos de protección personal

Al inicio de las actividades se verificó la entrega de los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores por parte del contratista de obra, como soporte se entrega los registros de entrega de dotación y EPP. De igual manera se verifico el correcto uso de los elementos de protección de personal de los trabajadores que participaron en el proyecto durante el periodo de ejecución.


10.5.5 Inspecciones de seguridad

El contratista de obra implementó medidas de prevención y control en los frentes de trabajo, mediante la demarcación de las áreas intervenidas. De igual manera, se evidenció la aplicación de controles para la regulación del flujo peatonal y vehicular en las zonas de influencia del proyecto, y la realización de inspecciones periódicas a los elementos de protección personal (EPP), con el fin de garantizar su correcto uso y estado de conservación.



11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el seguimiento del proyecto se identificó un atraso en la adecuación de las oficinas de Talento Humano, Tesorería y Atención al Ciudadano, debido a que la instalación de puntos de voz y datos no está incluida en el alcance contractual. Esto afectó actividades como la instalación de cielorrasos, muros y acabados. Se recomendó definir con urgencia un mecanismo administrativo para ejecutar estas labores complementarias y así evitar mayores retrasos y posibles sobrecostos.
- Se evidenció una baja cantidad de personal en obra, lo que limita el avance físico del proyecto y pone en riesgo el cumplimiento del cronograma. Por ello, se recomendó al contratista aumentar los frentes de trabajo para mejorar los rendimientos, evitar atrasos y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales, Solicitud que fue acogida por el contratista de obra mejorando así el rendimiento frente a la programación
- Del análisis del avance acumulado del proyecto y de las actividades verificadas por la interventoría durante el periodo evaluado, se obtuvo un avance de obra ejecutado acumulado del 34.95% que corresponde al Acta de Recibo Parcial de Obra No 1; frente a un 49,10% de avance de obra programado, de lo anterior se concluye que el proyecto presenta un retraso con respecto a la reprogramación del 14,15%.
- La documentación soporte de la ejecución del proyecto, incluyendo registros fotográficos, informes de avance y actas de seguimiento, fue revisada y Aprobada por la interventoría para la autorización del pago del Acta de Recibo parcial de Obra No 1, evidenciando trazabilidad y control sobre las actividades ejecutadas.


JOSE GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
CC 17.652.312 de Florencia
RL GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S
INTERVENTORÍA
Contrato de Interventoría 202500000893 del 2025

CONSORCIO CAQUETÁ 2025
NIT 901987427-1

Florencia Caquetá, 16 de Febrero del 2026

CQ25-CO0874-012-16-02-2026

Señor

JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS

Representante Legal

GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

Interventoría


Referencia: Contrato de Obra Pública No. 202500000874 Objeto: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

Asunto: Radicación Acta de Recibo parcial de Obra No 1 y Soportes

Por medio de la presente, radicamos Acta de recibo parcial de obra No 1 por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 839.076.479,80) M /CTE, corresponde a un porcentaje de ejecución del **34,95%**, alcanzado durante el periodo comprendido entre el **9 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026**. Para tal fin, se adjunta la siguiente documentación soporte:

- Prefectura
- Resolución de Facturación
- Rut
- Acta de Recibo Parcial de Obra No 1
- Memorias Acta de Recibo parcial de Obra No1
- Certificado de paz y salvo de parafiscales
- Planillas de Pago de Seguridad Social
- Documento contador público:
 - Certificado de Vigencia Profesional
 - Cedula y Tarjeta Profesional
- Seguridad Social
- Copia Contrato de Obra
- Copia Acta de Inicio
- Copia Otrosí de Obra No 1
- Pólizas
 - Póliza de cumplimiento: Anexos 0,1,2,3
 - Póliza de responsabilidad Civil: Anexos 0,1,2,3
- Informes mensuales de Obra
 - Informe mensual de Obra No 1
 - Informe mensual de Obra No 2
 - Informe mensual de Obra No 3
 - Informe mensual de Obra No 4 y de cobro parcial
- Plan de Manejo Ambiental
 - Licencia y certificados de explotación minera
- Informes SG-SST
 - Informe N1 más Anexos
 - Informe N2 más anexos
 - Informe N3 más Anexos
 - Informe N4 más Anexos
- Bitácora de Obra
- Resultados de Ensayos de Laboratorio

Agradecemos la atención prestada, Cordialmente,



JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ

C.C. 17.324.685 de Villavicencio

Representante legal Consorcio Caquetá 2025

Florencia, 02 de Marzo de 2026

Señora

Att: Ing. NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Supervisora

Departamento del Caquetá

Dirección Calle 13 carrera 14 esquina

Florencia

infraestructura@caqueta.gov.co

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893 del 25 de Septiembre del 2025 Cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

Asunto: Radicación aprobación Acta de Recibo Parcial de Obra No 1 del Contrato de Obra No 202500000874 del 2025

Cordial saludo.


Por medio de la presente, y en calidad de representante legal del contrato de Interventoría de la referencia, hacemos entrega del Acta de recibo Parcial de Obra No 1 del contrato de Obra Pública No1 202500000874 del 2025 debidamente revisado y avalado por esta Interventoría por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 839.076.479,80) M /CTE, corresponde a un porcentaje de ejecución del **34,95%**, alcanzado durante el período comprendido entre el **9 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026**. Para tal fin, se adjunta la siguiente documentación:

- Certificado de Ejecución de Interventoría
- Oficio de radicación del Contratista de Obra
- Prefectura
- Resolución de Facturación
- Rut
- Acta de Recibo Parcial de Obra No 1
- Memorias Acta de Recibo parcial de Obra No1
- Informe Aval de Interventoría
- Certificado de paz y salvo de parafiscales
- Planillas de Pago de Seguridad Social
- Documento contador público:
 - Certificado de Vigencia Profesional
 - Cedula y Tarjeta Profesional
- Seguridad Social
- Copia Contrato de Obra

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florencia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

- Copia Acta de Inicio
- Copia Otrosí de Obra No 1
- Pólizas
 - Póliza de cumplimiento: Anexos 0,1,2,3
 - Póliza de responsabilidad Civil: Anexos 0,1,2,3
- Informes mensuales de Obra
 - Informe mensual de Obra No 1
 - Informe mensual de Obra No 2
 - Informe mensual de Obra No 3
 - Informe mensual de Obra No 4 y de cobro parcial
- Plan de Manejo Ambiental
 - Licencia y certificados de explotación minera
- Informes SG-SST
 - Informe N1 más Anexos
 - Informe N2 más anexos
 - Informe N3 más Anexos
 - Informe N4 más Anexos
- Bitácora de Obra
- Resultados de Ensayos de Laboratorio

Cordialmente,



JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
C.C.17.652.613 De Florencia
Representante legal
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS
NIT: 901.390.155-3
Interventoría contrato 02500000893

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN

Florencia, 1 de febrero de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
Att: Ing. NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisora
Dirección Calle 13 carrera 14 esquina
Florenceia
infraestructura@caqueta.gov.co

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893 del 25 de septiembre del 2025 Cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

No. DEL PROCESO	DC-GE-LP-016-2025				
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA				
CONTRATO No:	202500000874				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/09/2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
NIT/CC:	901.987.427-5				
RL	JOSE ELIAS RINCON FLOREZ				
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS (\$2.401.062.171) MCTE				
ANTICIPO:	\$ 960,484,868.00				
ADICIONES:	N. A.				
MODIFICACIONES:	N. A.				
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de Inicio por el Contratista y el Supervisor del contrato.				
PRÓRROGA 1:	29 de diciembre de 2025 (plazo adicional 04 meses y 9 días)				
PLAZO ACTUALIZADO:	N. A.				
FECHA ACTA DE INICIO:	09/10/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2026				
No. CDP	2025071266	Fecha exp.	4/07/2025	Valor (\$)	2,571,206,371.00
No. RP	2025094328	Fecha exp.	15/09/2025	Valor (\$)	2,401,062,171.00
Polizas	Cumplimiento: 61-44-101061224 - Responsabilidad Civil: 61-40-101022183				

Dirección: Transversal 5B #9-180 B/ Estrella Baja Florenceia-Caquetá **Teléfono:** 320 9514261 **Correo:** geovialingenieria@gmail.com

El suscrito, **JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.652.613 de Florencia, en calidad de representante legal de **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.**, identificada con NIT 901.390.155-3, en su calidad de **Interventoría**, certifica que el contratista **CONSORCIO CAQUETÁ 2025**, identificado con NIT 901.987.427-5, representado legalmente por **JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.324.685 de Villavicencio, ha cumplido parcialmente con el objeto del contrato en mención, alcanzando un porcentaje de ejecución del **34,95 %**. Las obras han sido **recibidas de manera satisfactoria**, cumpliendo con la calidad y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Así mismo, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos y soportes del **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01**, es procedente adelantar el trámite para el pago correspondiente, previa a las siguientes consideraciones:


1.- La factura No. FECC-1 presentada por el contratista CONSORCIO CAQUETÁ 2025 un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 839.076.479,80) M /CTE

2. Avance Financiero:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.401.062.171	
VALOR ADICIONAL	N/A	
VALOR ANTICIPO		\$ 960.424.868,00
VALOR ACTA PARCIAL 1		\$ 839.076.479,80
VALOR AMORTIZACIÓN		-\$ 335.630.592,00
SALDO POR COBRAR		\$ 1.561.985.691,20
SALDO POR AMORTIZAR		-\$ 624.794.276,00
SUMAS IGUALES	\$ 2.401.062.171	\$ 2.401.062.171,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Certificación, el día primero (01) de febrero de 2026.

Cordialmente,



JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS

C.C.17.652.613 De Florencia

Representante legal

GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS

NIT: 901.390.155-3

Interventoría contrato 02500000893

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
	Página: 1 de 13		

Florencia - Caquetá, 31 de enero del 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME No 1 Para pago parcial de Obra No 1 del 9 de octubre del 2025 al 30 de enero del 2026				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-GE-CMA-012-2025 CO1.PCCNTR.8302560				
CONTRATO No.	202500000874	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/09/2025		
TIPO DE PERSONA	CONSORCIO				
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAQUETÁ 2025 Representado Legalmente por: José Elías Rincón Flórez				
	IDENTIFICACIÓN	Nit No. 901.987.427-5			
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.402.996.571) M/CTE.				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	DOS MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.402.996.571) M/CTE.				
No DE CDP	2025071266	FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2025	VALOR	\$2.571206.371,00
No DE RP	2025094328	FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2025	VALOR	\$2.401.062.171,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato				
PRÓRROGA 1	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato. 29/12/2025				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS				
FECHA DE INICIO:	9-10-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31-12-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30-04-2025				

na?

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 2 de 13

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

En mi calidad de Interventor y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el Informe No. 1 correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del 34,95% sobre el Objeto Contractual.

Del análisis del avance acumulado del proyecto y de las actividades verificadas por la interventoría durante el periodo evaluado, se obtuvo un avance de obra ejecutado acumulado del 34.95% frente a un 49,10% de avance de obra programado, de lo anterior se concluye que el proyecto presenta un retraso con respecto a la reprogramación del 14,15% en cuanto a la ejecución Física y o flujo de Inversión.

El proyecto ha presentado una serie de retrasos por circunstancias ajenas la contratista debidamente documentada tanto en bitácora como en cada uno de los comités técnicos de seguimiento realizados conjuntamente con la Supervisión, que llevaron al proceder con la aprobación de una prórroga mediante Otro Si Modificatorio No 1 de fecha 29 de diciembre del 2025, por un plazo adicional de cuatro (04) meses. Por lo tanto, han transcurrido tres meses y veintitrés días que equivale a un 55% del plazo actualizado.

En cuanto la ejecución física el contratista de obra realizó las labores en el área que corresponde a las secretarías de Hacienda y Tributos del primer piso, correspondiente a las labores preliminares; todas las actividades de demolición y desmonte del primer nivel; La instalación de un sanitario en el primer nivel; instalación y mantenimiento de pisos y enchapes; ampliación de estuco y pinturas; instalación de muros divisorios en drywall y cielo rasos con carteras decorativas; instalación de puertas, ventanas y divisiones en vidrio; obras eléctricas que corresponde a las salidas de tomas, luminarias, interruptores y aires acondicionados con sus respectivos tableros de control. En cuanto a la cubierta exterior se construyó la cimentación y se avanzó con la estructura metálica con la instalación de las columnas y platinas.

En cuanto al avance Financiero el contratista de obra recibió el pago del anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato tal como se estipula la cláusula octava del contrato de obra. Previa aprobación del plan de inversión del anticipo de fecha 27 de octubre del 2025, del cual el contratista de obra presenta el correspondiente informe de manejo del anticipo con las facturas de compras y pagos correspondientes anexos. *GP*

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

En la siguiente tabla se resumen las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe *Am?*

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 3 de 13

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR A PAGAR
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				\$ 5.716.225,00
1,1	Localización y replanteo	M2	\$ 3.834,00	694,06	\$ 2.661.026,00
1,2	Cerramiento en tela verde	ML	\$ 8.446,00	59,90	\$ 505.915,00
1,3	Limpieza de fachada	M2	\$ 7.115,14	358,29	\$ 2.549.284,00
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE				\$ 9.234.982,00
2,1	Desmante de marcos y puertas.	UND	\$ 19.580,00	13,00	\$ 254.540,00
2,2	Desmante de aparatos sanitarios con recuperación	UND	\$ 19.580,00	1,00	\$ 19.580,00
2,3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M2	\$ 16.316,00	2,81	\$ 45.848,00
2,4	Desmante de cielo raso existente	M2	\$ 10.116,00	515,08	\$ 5.210.549,00
2,5	Demolición de baldosa cerámica	M2	\$ 13.054,00	21,32	\$ 278.311,00
2,6	Desmante o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	\$ 65.866,00		\$ -
2,7	Desmante de vidrio templado	M2	\$ 17.516,00	7,35	\$ 128.743,00
2,8	Desmante y/o demolición de granito y adoquín	M2	\$ 13.985,00	136,85	\$ 1.913.847,00
2,9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	\$ 10.275,00	19,65	\$ 201.904,00
2,10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M3	\$ 49.634,00	18,00	\$ 893.412,00
2,11	Desmante de divisiones en aluminio y vidrio	M2	\$ 13.144,00	21,93	\$ 288.248,00
3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS				
3,1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	\$ 645.836,00		
3,2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4".	ML	\$ 46.783,00		
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA				\$ 876.625,00
4,1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	\$ 876.625,00	1,00	\$ 876.625,00
4,2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	\$ 608.074,77		
4,3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	\$ 31.507,00		
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				\$ 25.152.997,00
5,1	Enchape cerámica pared	M2	\$ 91.483,00	14,02	\$ 1.282.592,00
5,2	Enchape cerámica antideslizante piso	M2	\$ 82.713,00	2,88	\$ 238.213,00
5,3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	\$ 36.771,00	556,76	\$ 20.472.622,00
5,4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	\$ 11.594,00	25,50	\$ 295.647,00
5,5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	\$ 21.857,00	131,03	\$ 2.863.923,00
5,6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M2	\$ 136.118,00		\$ -
5,7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M2	\$ 51.352,00		\$ -
6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA				\$ 27.099.550,00
6,1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M2	\$ 17.090,00	488,07	\$ 8.341.116,00
6,2	Estuco para muros.	M2	\$ 18.559,00	488,07	\$ 9.058.091,00
6,3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	\$ 27.074,00	358,29	\$ 9.700.343,00
6,4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M2	\$ 32.728,00		\$ -
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL				\$ 70.101.051,00
7,1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	\$ 83.105,00	412,59	\$ 34.288.292,00
7,2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	\$ 56.881,00	255,74	\$ 14.546.747,00

22
Pm?

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 4 de 13

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR A PAGAR
7,3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	\$ 105.090,00	202,36	\$ 21.266.012,00
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS				\$ 23.712.210,00
8,1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.552.005,00		\$ -
8,2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 742.609,00	17,72	\$ 13.159.031,00
8,3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	\$ 590.779,00	6,36	\$ 3.757.354,00
8,4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 609.491,00	11,15	\$ 6.795.825,00
8,5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	\$ 423.869,00		\$ -
8,6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.647.505,00		\$ -
8,7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.747.405,00		\$ -
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS				\$ 17.209.011,00
9,1	Pañete 1:4	M2	\$ 29.427,00		\$ -
9,2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M3	\$ 145.660,00		\$ -
9,3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	\$ 1.007.006,00	8,38	\$ 8.438.710,00
9,4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	\$ 996.389,00	5,26	\$ 5.241.006,00
9,5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	\$ 13.486,00	10,50	\$ 141.603,00
9,6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	\$ 7.030,00	351,25	\$ 2.469.288,00
9,7	Excavación manual	M3	\$ 41.221,00	22,28	\$ 918.404,00
10	OBRAS ELÉCTRICAS				\$ 419.123.670,00
10,1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	\$ 8.100.949,00		\$ -
10,2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	\$ 5.711.516,00		\$ -
10,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	\$ 1.342.899,00	3,00	\$ 4.028.697,00
10,4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 100A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	\$ 2.514.715,00		\$ -
10,5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de	UND	\$ 1.280.629,00	3,00	\$ 3.841.887,00

0227
11/11

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 5 de 13

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR A PAGAR
	uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.				
10,6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	\$ 30.791,00	400,00	\$ 12.316.400,00
10,7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	\$ 261.708,00	119,00	\$ 31.143.252,00
10,8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	\$ 194.105,00	265,00	\$ 51.437.825,00
10,9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 216.691,00	110,00	\$ 23.836.010,00
10,10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	\$ 189.272,00		\$ -
10,11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 131.181,00		\$ -
10,12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	\$ 5.325.286,00		\$ -
10,13	Desmante de aparatos de salidas eléctricas	UND	\$ 11.454,00	190,00	\$ 2.176.260,00
10,14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	\$15.215.430,00	7,00	\$ 106.508.010,00
10,15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	\$ 8.500.713,00	10,00	\$ 85.007.130,00
10,16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	\$ 6.398.727,00	7,00	\$ 44.791.089,00
10,17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	\$ 77.341,00		\$ -
10,18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	\$ 179.172,00	95,00	\$ 17.021.340,00
10,19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	\$ 197.091,00	15,00	\$ 2.956.365,00
10,20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	\$ 84.668,00	150,00	\$ 12.700.200,00
10,21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	\$ 132.922,00		\$ -

PM?

 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 6 de 13

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR A PAGAR
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	\$ 285.107,00		\$ -
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	\$ 553.810,00	26,00	\$ 14.399.060,00
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	\$ 756.173,00		\$ -
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	\$ 6.960.145,00	1,00	\$ 6.960.145,00
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"	ML	\$ 92.214,00		\$ -
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 47.217.125,00
11.1	Policarbonato alveolar para cubierta	M2	\$ 132.190,00		\$ -
11.2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 864.806,00		\$ -
11.3	Canal en lámina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	\$ 118.185,00		\$ -
11.4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.838,00	2127,72	\$ 46.465.149,00
11.5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.855,00		\$ -
11.6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	\$ 235.048,00		\$ -
11.7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 3.256.543,00		\$ -
11.8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	\$ 106.393,00	4,00	\$ 425.572,00
11.9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	\$ 163.202,00	2,00	\$ 326.404,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				\$ 645.443.446,00
	ADMINISTRACIÓN	26,00%			\$ 167.815.295,96
	IMPREVISTOS	1,00%			\$ 6.454.434,46
	UTILIDAD	3,00%			\$ 19.363.303,38
	TOTAL A.I.U. 30%				\$ 193.633.033,80
	Costo certificación RETIE				
	Costo certificación RETILAP				
	Plan de Manejo Ambiental				
	Plan de Manejo de Tránsito				
	TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA				\$ 839.076.479,80

En cuanto a reuniones de Seguimiento se han realizado los siguientes comités técnicos de obra:

7037

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 7 de 13

No	Referencia	Fecha	Objeto
1	Acta de comité No. 1	21/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento al avance físico y técnico del proyecto Verificar el estado de ejecución en las distintas áreas de trabajo Revisar la documentación requerida Definir compromisos clave para asegurar el cumplimiento de los plazos, la calidad de la obra y los requisitos administrativos, incluyendo la gestión de permisos, la radicación del anticipo, la actualización de pólizas y la coordinación de próximas actividades operativas y técnicas.
2	Acta de comité No. 2	27/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el estado del trámite de la licencia de construcción Socializar las actividades no previstas y los motivos que han generado retraso en la ejecución de las obras, para la solicitud de prórroga del contrato de obra Analizar la solicitud de Adición presupuestal por parte del contratista de obra
3	Acta de comité No. 3	15/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> Socializar el avance del proyecto con respecto a la programación Lectura y verificación del Acta de Comité de obra No 2 Verificación del cumplimiento de compromisos anteriores Solicitud de prórroga del contrato de obra e Interventoría Elaboración de formatos para Solicitud de Prorroga
4	Acta de comité No. 4	21/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de prórroga del contrato de obra e Interventoría Elaboración de formatos para Solicitud de Prorroga

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 Informes, seguimientos y actas.

Informe de Obra No 1: del periodo del 9 de octubre el 8 de noviembre del 2025
Informe de Obra No. 2: del periodo del 9 de noviembre al 8 de diciembre del 2025
Informe de Obra No 3: del periodo del 9 de diciembre al 31 de diciembre del 2025
Informe de Obra No 4: del periodo del 1 de enero al 31 de enero del 2026

2.2.2 Modificaciones y/o alteraciones del contrato (Suspensiones, reinicios, modificaciones, requerimientos, Planes de mejoramiento etc.)

No	Descripción	Fecha
1	Acta de Inicio	9/10/2025
2	Otro si Modificatorio No 1: Modificación del Plazo contractual hasta el 30 de abril del 2026	29/12/2025
3	Acta de Recibo Parcial de Obra No 1	30/01/2026

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 8 de 13

2.2.3 Estado del plazo del contrato (de conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes el avance es el siguiente: colocar de manera discriminada el avance). Los avances programados son respecto a la reprogramación:

PERIODO	Fecha	AVANCE EN TIEMPO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
Mes 1	8/11/2025	14,78%	1,99%	3,46 %
Mes 2	8/12/2025	29,56%	7,61	6,74%
Mes 3	31/12/2025	40,89%	34,72%	19,62%
Mes 4	31/01/2026	56,16%	49,10%	34,95%

2.2.4 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE OCTUBRE

VALOR PLANILLA	\$ 4.990.100	\$ 1.605 .700	\$ 510.500
SALUD	\$ 761.100	\$ 207.600	\$ 180.000
PENSIÓN	\$ 2.628.000	\$ 829.600	\$ 230.300
ARL	\$ 839.900	\$ 360.900	\$ 100.200
N° DE PLANILLA	9496087613	9496294790	9494126691
PERSONAL	Profesionales	Mano de Obra	RL

MES DE NOVIEMBRE

VALOR PLANILLA	\$ 4.532.700	\$ 1.763.600	\$ 504.900
SALUD	\$ 272.000	\$ 228.000	\$ 178.000
PENSIÓN	\$ 2.371.400	\$ 911.200	\$ 227.800
ARL	\$ 1.536.000	\$ 396.400	\$ 99.100
N° DE PLANILLA	9496087696	9496295522	9495706937

MES DE DICIEMBRE

VALOR PLANILLA	\$ 3.579.500	\$ 1.763.600	\$ 504.900
SALUD	\$ 557.400	\$ 228.000	\$ 178.000
PENSIÓN	\$ 1.770.900	\$ 911.200	\$ 227.800
ARL	\$ 693.800	\$ 396.400	\$ 99.100
N° DE PLANILLA	9498304548	9496296052	9496314281

PM

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 9 de 13

MES DE ENERO

VALOR PLANILLA	\$ 3.720.100	\$ 2.169.200	\$ 621.000
SALUD	\$ 590.600	\$ 280.400	\$ 218.900
PENSIÓN	\$ 1.799.100	\$ 1.120.800	\$ 280.200
ARL	\$ 739.800	\$ 487.600	\$ 121.900
N° DE PLANILLA	9498570814	9499144802	9498929344

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
German Alonso Lozada Lozada	9496087613	\$ 1.006.200,00
Diego Alexander Ijaji Figueroa		\$ 774.900,00
Jorge Alonso Romero Giraldo		\$ 170.500,00
Oriana Andrea Murillo Cotamo		\$ 1.083.600,00
German Alonso Lozada Lozada	9496087696	\$ 1.006.200,00
Diego Alexander Ijaji Figueroa		\$ 809.300,00
Jorge Alonso Romero Giraldo		\$ 213.100,00
Oriana Andrea Murillo Cotamo		\$ 1.083.600,00
German Alonso Lozada Lozada	9498304548	\$ 1.006.200,00
Diego Alexander Ijaji Figueroa		\$ 696.500,00
Jorge Alonso Romero Giraldo		\$ 213.100,00
Oriana Andrea Murillo Cotamo		\$ 1.083.600,00
German Alonso Lozada Lozada	9498570814	\$ 1.006.200,00
Diego Alexander Ijaji Figueroa		\$ 662.100,00
Jorge Alonso Romero Giraldo		\$ 262.100,00
Oriana Andrea Murillo Cotamo		\$ 1.083.600,00

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
ANTICIPO	\$ 960.424.868,00	2025 - 11 - 19
ADICIÓN	N/A	N/A
(01) PRIMER PAGO	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 839.076.479,80	N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	1.561.985.691,20	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2.401.062.171

ENTIDAD FIDUCIARIA:	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA
No. DE CONTRATO DE FIDUCIA:	18145
FECHA DE CELEBRACIÓN:	20 de octubre del 2025

Handwritten signature/initials

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 10 de 13

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	\$ 960.424.868,00	2025 – 11 - 19		
ADICIÓN	N/A	N/A		
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	839.076.479,80	N/A	N/A	\$ 335.630.952
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	1.561.985.691,20	N/A	N/A	\$ 624.794.276
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 2.401.062.171	

CONCEPTO	VALOR	Periodo en que se genero
INTERÉS GENERADOS POR EL ANTICIPO	N/A	N/A

CONCEPTO	VALOR	Corte en que se genero
INTERÉS REGRESADO A LA ENTIDAD POR ANTICIPO	N/A	N/A

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones

N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias

N/A

2.4.3 Garantías

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 0			
PÓLIZA No.	61-44-101061224	FECHA DE EXPEDICIÓN	19-09-2025
FECHA DE APROBACIÓN	24/09/2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 240.106.217,10	12/09/2025 – 01/07/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	\$ 120.053.108,55	12/09/2025 – 31/12/2028	
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 480.212.434,20	5 años	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960.424.868,40	12/09/2025 – 31/12/2025	

Handwritten signature

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
	Página: 11 de 13		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ANEXO 0			
PÓLIZA No.	61-40-101022183	FECHA DE EXPEDICIÓN	19-09-2025
FECHA DE APROBACIÓN	24/09/2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil	\$ 569.400.000,00	12/09/2025 – 31/12/2025	

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2			
PÓLIZA No.	61-44-101061224	FECHA DE EXPEDICIÓN	27-10-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 240.106.217,10	09/10/2025 – 28/07/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	\$ 120.053.108,55	09/10/2025 – 27/01/2029	
Estabilidad y Calida de la Obra	\$ 480.212.434,20	5 años	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960.424.868,40	09/10/2025 – 27/01/2026	

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ANEXO 2			
PÓLIZA No.	61-40-101022183	FECHA DE EXPEDICIÓN	27-10-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil	\$ 569.400.000,00	09/10/2025 – 27/01/2026	

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3			
PÓLIZA No.	61-44-101061224	FECHA DE EXPEDICIÓN	29-12-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 240.106.217,10	09/10/2025 – 29/10/2026	

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 12 de 13

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	\$ 120.053.108,55	09/10/2025 – 30/04/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 480.212.434,20	5 años
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960.424.868,40	09/10/2025 – 30/04/2026

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ANEXO 3			
PÓLIZA No.	61-40-101022183	FECHA DE EXPEDICIÓN	29-12-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPañía ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil	\$ 569.400.000,00	09/10/2025 – 30/04/2026	

3.CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito INTERVENTOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia Avala el Acta de Recibo Parcial de Obra No 1 del periodo comprendido del 9 de octubre del 2025 al 30 de enero del 2026 por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 839.076.479,80) M /CTE equivalente al 34,95%; Y se AUTORIZA el pago por un valor neto de **QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 503.445.887,80)**

4. OBSERVACIONES


ANEXOS:


- Oficio de radicación de Interventoría
- Certificado de Ejecución de Interventoría
- Oficio de radicación del contratista de Obra
- Factura electrónica
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Rut
- Acta de recibo parcial de obra No 1
- Memorias de cantidades de Obra
- Informe pago Anticipo y anexos
- Recibo de pago de estampillas

Handwritten signature/initials

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 13 de 13

- Certificado de Cumplimiento de pagos de parafiscales
- Documentación contador Público
- Planillas de Pago de Seguridad Social
- Cedula del representante Legal
- Copia del contrato
- Copia del Acta de Inicio
- Copia del Otro si de Prorroga
- Copia Pólizas
- Informes mensuales de Obra 1, 2 , 3 y 4
- PMA
- Licencia de explotación Minera
- Informes SST 1,2,3,4 y anexos
- Bitácora de Obra
- Resultados de Ensayos de Laboratorio

POR LA ENTIDAD	POR LA INTERVENTORÍA
	
NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO CC 1.032.507.321 de Bogotá SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISORA	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS CC 17.652.312. de Florencia GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS NIT.: 901.390.155-3 REPRESENTANTE LEGAL


Proyectó:
ARQ. ALEXANDER MELO RIOS
 Profesional Universitario Cod 219 grado 19
 Apoyo a la Supervisión
 Secretaria de Infraestructura
 Gobernación del Cauca

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Díaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Contratista	Cargo:	Directora Dirección de Contratación	Cargo:	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1		FECHA: 12-08-2025
			Página: 1 de 12

Florencia. Caquetá, 30 de enero del 2026

No DEL PROCESO EN EL SECO	DC-GE-CMA-012-2025 CO1.PCCNTR.8302560				
CONTRATO No.	202500000874	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/09/2025		
TIPO DE PERSONA	CONSORCIO				
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAQUETÁ 2025 Representado Legalmente por: José Elías Rincon Flórez				
	IDENTIFICACIÓN	Nit No. 901.987.427-5			
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR CONTRATO:	INICIAL	DOS MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.402.996.571) M/CTE, es decir 1.688,09 SMLMV			
ADICIÓN CONTRATO	1 DEL	N/A			
VALOR TOTAL	DOS MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.402.996.571) M/CTE, es decir 1.688,09 SMLMV				
No DE CDP	2025071266	FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2025	VALOR	\$2.571206.371,00
No DE RP	2025094328	FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2025	VALOR	\$2.401.062.171,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato				
PRÓRROGA 1	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato. 29/12/2025				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS			
FECHA DE INICIO:		9-10-2025			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		31-12-2025			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:		30-04-2025			

Gr.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 0			
PÓLIZA No.	61-44-101061224	FECHA DE EXPEDICIÓN	19-09-2025
FECHA DE APROBACIÓN	24/09/2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		

Gr.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 2 de 12

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$ 240.106.217,10	12/09/2025 – 01/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	\$ 120.053.108,55	12/09/2025 – 31/12/2028
Estabilidad y Calida de la Obra	\$ 480.212.434,20	5 años
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960.424.868,40	12/09/2025 – 31/12/2025

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ANEXO 0			
PÓLIZA No.	61-40-101022183	FECHA DE EXPEDICIÓN	19-09-2025
FECHA DE APROBACIÓN	24/09/2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil	\$ 569.400.000,00	12/09/2025 – 31/12/2025	

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2			
PÓLIZA No.	61-44-101061224	FECHA DE EXPEDICIÓN	27-10-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 240.106.217,10	09/10/2025 – 28/07/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	\$ 120.053.108,55	09/10/2025 – 27/01/2029	
Estabilidad y Calida de la Obra	\$ 480.212.434,20	5 años	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960.424.868,40	09/10/2025 – 27/01/2026	

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ANEXO 2			
PÓLIZA No.	61-40-101022183	FECHA DE EXPEDICIÓN	27-10-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil	\$ 569.400.000,00	09/10/2025 – 27/01/2026	

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL		FECHA: 12-08-2025
	DE OBRA No. 1		Página: 3 de 12

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3			
PÓLIZA No.	61-44-101061224	FECHA DE EXPEDICIÓN	29-12-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 240.106.217,10	09/10/2025 – 29/10/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	\$ 120.053.108,55	09/10/2025 – 30/04/2029	
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 480.212.434,20	5 años	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 960.424.868,40	09/10/2025 – 30/04/2026	

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ANEXO 3			
PÓLIZA No.	61-40-101022183	FECHA DE EXPEDICIÓN	29-12-2025
FECHA DE APROBACIÓN	03/03/2026		
COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NIT.	860.009.578-6		
DATOS DEL TOMADOR	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil	\$ 569.400.000,00	09/10/2025 – 30/04/2026	

- 1. CANTIDADES ENTREGADAS:** En mi calidad de INTERVENTOR, me permito señalar las cantidades entregadas por el contratista del siguiente modo:

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				\$ 5.716.225,00
1,1	Localización y replanteo	M2	\$ 3.834,00	694,06	\$ 2.661.026,00
1,2	Cerramiento en tela verde	ML	\$ 8.446,00	59,90	\$ 505.915,00
1,3	Limpieza de fachada	M2	\$ 7.115,14	358,29	\$ 2.549.284,00
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE				\$ 9.234.982,00
2,1	Desmante de marcos y puertas.	UND	\$ 19.580,00	13,00	\$ 254.540,00
2,2	Desmante de aparatos sanitarios con recuperación	UND	\$ 19.580,00	1,00	\$ 19.580,00
2,3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M2	\$ 16.316,00	2,81	\$ 45.848,00
2,4	Desmante de cielo raso existente	M2	\$ 10.116,00	515,08	\$ 5.210.549,00
2,5	Demolición de baldosa cerámica	M2	\$ 13.054,00	21,32	\$ 278.311,00
2,6	Desmante o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	\$ 65.866,00		\$ -
2,7	Desmante de vidrio templado	M2	\$ 17.516,00	7,35	\$ 128.743,00



**GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

CÓDIGO: GA-GC-FR- 090

**FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA No. 1**

VERSIÓN: 001

FECHA: 12-08-2025

Página: 4 de 12

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
2,8	Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M2	\$ 13.985,00	136,85	\$ 1.913.847,00
2,9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	\$ 10.275,00	19,65	\$ 201.904,00
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M3	\$ 49.634,00	18,00	\$ 893.412,00
2.11	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M2	\$ 13.144,00	21,93	\$ 288.248,00
3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS				
3,1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	\$ 645.836,00		
3,2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4"	ML	\$ 46.783,00		
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA				\$ 876.625,00
4,1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	\$ 876.625,00	1,00	\$ 876.625,00
4,2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	\$ 608.074,77		
4,3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	\$ 31.507,00		
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				\$ 25.152.997,00
5,1	Enchape cerámica pared	M2	\$ 91.483,00	14,02	\$ 1.282.592,00
5,2	Enchape cerámica antideslizante piso	M2	\$ 82.713,00	2,88	\$ 238.213,00
5,3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	\$ 36.771,00	556,76	\$ 20.472.622,00
5,4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	\$ 11.594,00	25,50	\$ 295.647,00
5,5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	\$ 21.857,00	131,03	\$ 2.863.923,00
5,6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M2	\$ 136.118,00		\$ -
5,7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M2	\$ 51.352,00		\$ -
6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA				\$ 27.099.550,00
6,1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M2	\$ 17.090,00	488,07	\$ 8.341.116,00
6,2	Estuco para muros.	M2	\$ 18.559,00	488,07	\$ 9.058.091,00
6,3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	\$ 27.074,00	358,29	\$ 9.700.343,00
6,4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M2	\$ 32.728,00		\$ -
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL				\$ 70.101.051,00
7,1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	\$ 83.105,00	412,59	\$ 34.288.292,00
7,2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	\$ 56.881,00	255,74	\$ 14.546.747,00
7,3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	\$ 105.090,00	202,36	\$ 21.266.012,00
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS				\$ 23.712.210,00
8,1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.552.005,00		\$ -
8,2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 742.609,00	17,72	\$ 13.159.031,00
8,3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	\$ 590.779,00	6,36	\$ 3.757.354,00
8,4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M2	\$ 609.491,00	11,15	\$ 6.795.825,00

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1		FECHA: 12-08-2025
			Página: 5 de 12

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
8,5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	\$ 423.869,00		\$ -
8,6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.647.505,00		\$ -
8,7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	\$ 1.747.405,00		\$ -
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS				\$ 17.209.011,00
9,1	Pañete 1:4	M2	\$ 29.427,00		\$ -
9,2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M3	\$ 145.660,00		\$ -
9,3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	\$ 1.007.006,00	8,38	\$ 8.438.710,00
9,4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	\$ 996.389,00	5,26	\$ 5.241.006,00
9,5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	\$ 13.486,00	10,50	\$ 141.603,00
9,6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	\$ 7.030,00	351,25	\$ 2.469.288,00
9,7	Excavación manual	M3	\$ 41.221,00	22,28	\$ 918.404,00
10	OBRAS ELÉCTRICAS				\$ 419.123.670,00
10,1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	\$ 8.100.949,00		\$ -
10,2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	\$ 5.711.516,00		\$ -
10,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	\$ 1.342.899,00	3,00	\$ 4.028.697,00
10,4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 100A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	\$ 2.514.715,00		\$ -
10,5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	\$ 1.280.629,00	3,00	\$ 3.841.887,00
10,6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	\$ 30.791,00	400,00	\$ 12.316.400,00
10,7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	\$ 261.708,00	119,00	\$ 31.143.252,00
10,8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	\$ 194.105,00	265,00	\$ 51.437.825,00
10,9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 216.691,00	110,00	\$ 23.836.010,00

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 6 de 12

CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
10.10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	\$ 189.272,00		\$ -
10.11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	\$ 131.181,00		\$ -
10.12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	\$ 5.325.286,00		\$ -
10.13	Desmante de aparatos de salidas eléctricas	UND	\$ 11.454,00	190,00	\$ 2.176.260,00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	\$15.215.430,00	7,00	\$ 106.508.010,00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	\$ 8.500.713,00	10,00	\$ 85.007.130,00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	\$ 6.398.727,00	7,00	\$ 44.791.089,00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	\$ 77.341,00		\$ -
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	\$ 179.172,00	95,00	\$ 17.021.340,00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	\$ 197.091,00	15,00	\$ 2.956.365,00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	\$ 84.668,00	150,00	\$ 12.700.200,00
10.21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	\$ 132.922,00		\$ -
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	\$ 285.107,00		\$ -
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	\$ 553.810,00	26,00	\$ 14.399.060,00
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	\$ 756.173,00		\$ -
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	\$ 6.960.145,00	1,00	\$ 6.960.145,00

7/11/25

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 7 de 12


CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"	ML	\$ 92.214,00		\$ -
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 47.217.125,00
11,1	Policarbonato alveolar para cubierta	M2	\$ 132.190,00		\$ -
11,2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 864.806,00		\$ -
11,3	Canal en lámina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	\$ 118.185,00		\$ -
11,4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.838,00	2127,72	\$ 46.465.149,00
11,5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	\$ 21.855,00		\$ -
11,6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	\$ 235.048,00		\$ -
11,7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	\$ 3.256.543,00		\$ -
11,8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	\$ 106.393,00	4,00	\$ 425.572,00
11,9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	\$ 163.202,00	2,00	\$ 326.404,00
COSTO DIRECTO TOTAL					\$ 645.443.446,00
	ADMINISTRACIÓN	26,00%			\$ 167.815.295,96
	IMPREVISTOS	1,00%			\$ 6.454.434,46
	UTILIDAD	3,00%			\$ 19.363.303,38
	TOTAL A.I.U. 30%				\$ 193.633.033,80
	Costo certificación RETIE				
	Costo certificación RETILAP				
	Plan de Manejo Ambiental				
	Plan de Manejo de Tránsito				
	TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA				\$ 839.076.479,80

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.401.062.171	
VALOR ADICIONAL	N/A	
VALOR ANTICIPO		\$ 960,424,868,00
VALOR ACTA PARCIAL 1		\$ 839.076.479,80
AMORTIZACIÓN 40% VALOR PRESENTE ACTA		-\$ 335.630.592,00
VALOR NETO A PAGAR PREDENTE ACTA PARCIAL 1		\$ 503.445.887,80
SALDO POR COBRAR		\$ 1.561.985.691,20
SALDO POR AMORTIZAR		-\$ 624.794.276,00
SUMAS IGUALES	\$ 2.401.062.171	\$ 2.401.062.171,00



	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 8 de 12

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	\$ 960.424.868,00	2025 /11/19		
ADICIÓN	N/A	N/A		
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 839.076.479,80	N/A	N/A	\$ 335.630.952.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 1.561.985.691,20	N/A	N/A	\$ 624.794.276.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 2.401.062.171.00	

2. RELACIÓN FOTOGRÁFICA

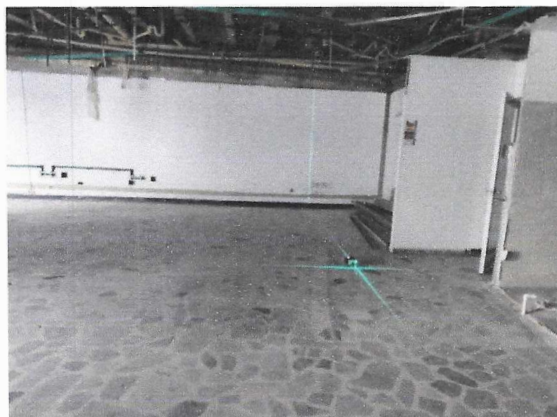ANTES	DESPUÉS
	
Secretaria de Hacienda	
	
Secretaria de Hacienda	

7/2/25

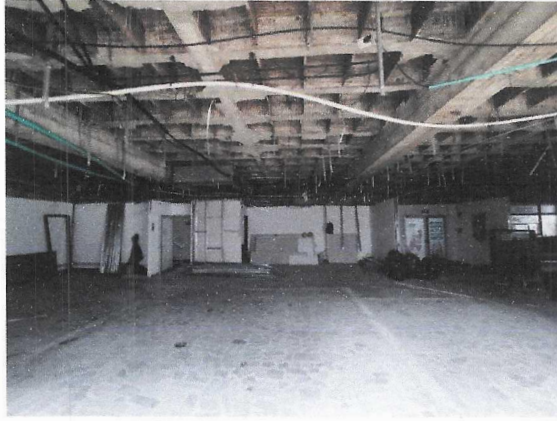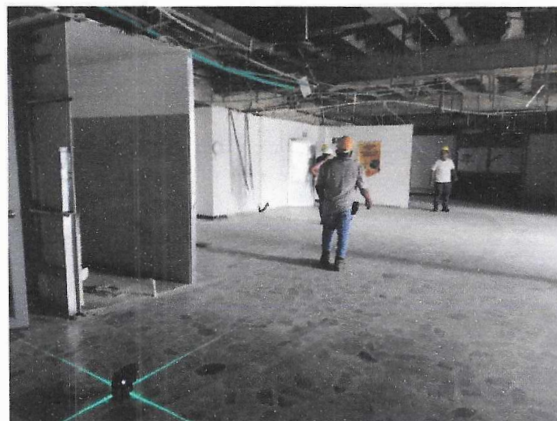ANTES	DESPUÉS
	
Secretaria de Hacienda	
	
Secretaria de Hacienda	
	
Secretaria de Hacienda	

9/8/25


ANTES





DESPUÉS



Plazoleta Exterior

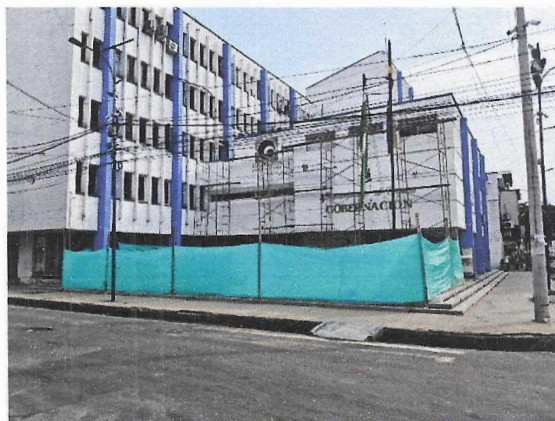


Fachada Exterior

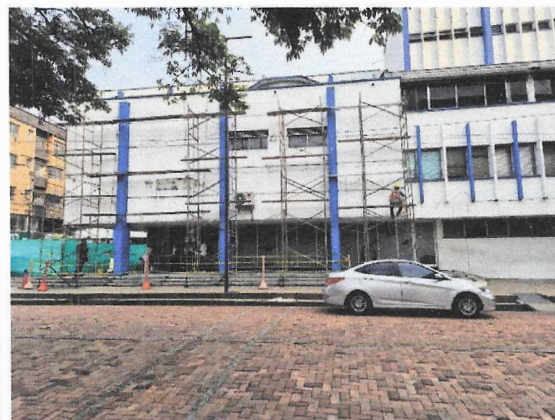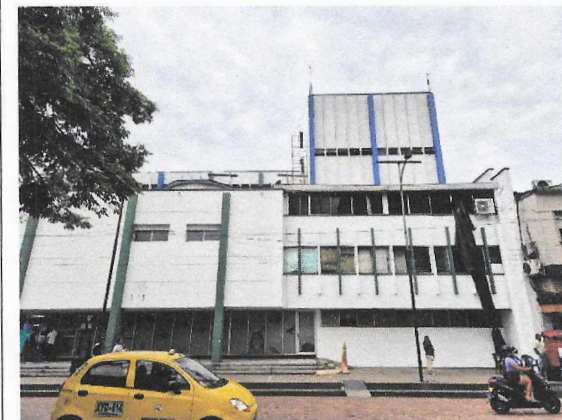

Fachada Exterior

22/8/25

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 11 de 12

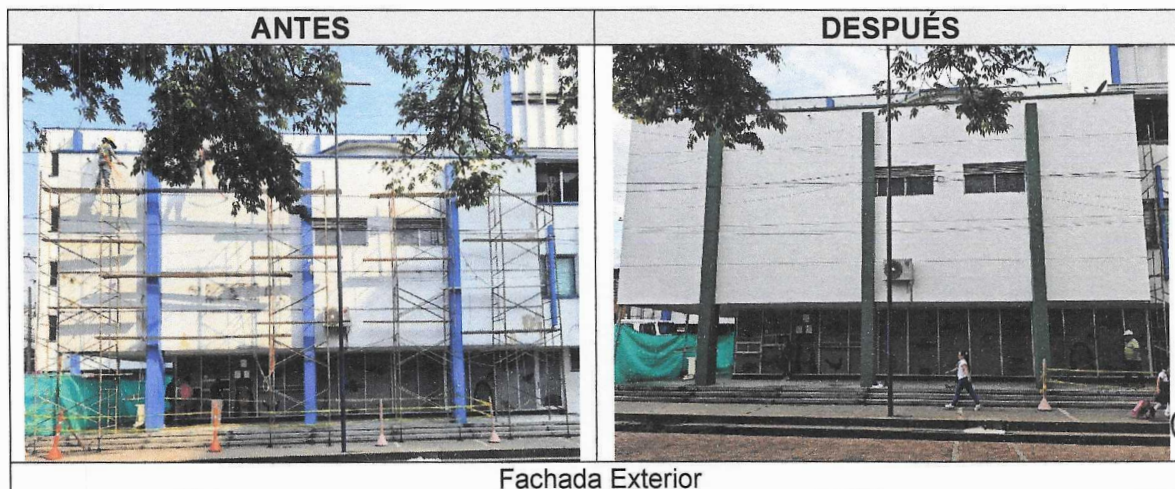

3. OBSERVACIONES:

Los acabados y materiales empleados cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

4. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA:



- Factura electrónica
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Rut
- Acta de recibo parcial de obra No 1
- Memorias de cantidades de Obra
- Informe pago Anticipo y anexos
- Recibo de pago de estampillas
- Certificado de Cumplimiento de pagos de parafiscales
- Documentación contador Público
- Planillas de Pago de Seguridad Social
- Cedula del representante Legal
- Copia del contrato
- Copia del Acta de Inicio
- Copia del Otro si de Prorroga
- Copia Pólizas
- Informes mensuales de Obra 1, 2 , 3 y 4
- PMA
- Licencia de explotación Minera
- Informes SST 1,2,3,4 y anexos
- Bitácora de Obra
- Resultados de Ensayos de Laboratorio


RM

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 090
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 12 de 12

5. CONCLUSIÓN:

El suscrito Interventor **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS** Representado Legalmente por **JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS** Avala el Acta de Recibo Parcial de Obra No 1 del periodo comprendido del 9 de octubre del 2025 al 30 de enero del 2026 por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 839.076.479,80) M /CTE equivalente al 34,95%; Y se AUTORIZA el pago por un valor neto de **QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 503.445.887,80).**

POR LA ENTIDAD	POR LA INTERVENTORÍA	POR EL CONTRATISTA
 NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO CC 1.032.507.321 de Bogotá SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISORA	 JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS CC 17.652.312. de Florencia GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS NIT.: 901.390.155-3	 JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ CC 17.324.685 de Villavicencio (Meta) R.L Consorcio Caquetá 2025 NIT.:901.987.427-5


Vo. Bo. ARQ. ALEXANDER MELO RIOS
 Profesional Universitario Cod 219 grado 19
 Apoyo a la Supervisión
 Secretaria de Infraestructura
 Gobernación del Caquetá

Revisó:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Díaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Contratista	Cargo:	Directora Dirección de Contratación	Cargo:	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA :	No. 20250000874	SUSCRITO	12 de septiembre del 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025 - NIT 901.987.427-5	INTERVENTORÍA	GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS - NIT 901.390.155-3
RL	JOSÉ ELIAS RINCÓN FLÓREZ	RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato		
OTRO SI 1	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato. (29/12/2025)		
FECHA DE INICIO	9 DE OCTUBRE DEL 2025	TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DEL 2026
VALOR :	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE		\$ 2.401.062.171,00
VALOR ACTA PARCIAL	OCHOCIENTOS TREITA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 839.076.480,00)	PORCENTAJE DE ACTA	34,95%
SUPERVISORA	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	FECHA ACTA	30 DE ENERO DEL 2026



CONDICIONES VIGENTES

ACTA PARCIAL 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				\$ 20.619.764,00		\$ 5.716.225,00
1.1	Localización y replanteo	M2	1015,00	\$ 3.834,00	\$ 3.891.510,00	694,06	\$ 2.661.026,00
1.2	Cerramiento en tela verde	ML	102,00	\$ 8.446,00	\$ 861.492,00	59,90	\$ 505.915,00
1.3	Limpieza de fachada	M2	2230,00	\$ 7.115,14	\$ 15.866.762,20	358,29	\$ 2.549.284,00
2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE				\$ 18.636.820,00		\$ 9.234.982,00
2.1	Desmante de marcos y puertas.	UND	35,00	\$ 19.580,00	\$ 685.300,00	13,00	\$ 254.540,00
2.2	Desmante de aparatos sanitarios con recuperación	UND	3,00	\$ 19.580,00	\$ 58.740,00	1,00	\$ 19.580,00
2.3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M2	3,50	\$ 16.316,00	\$ 57.106,00	2,81	\$ 45.848,00
2.4	Desmante de cielo raso existente	M2	1015,00	\$ 10.116,00	\$ 10.267.740,00	515,08	\$ 5.210.549,00
2.5	Demolición de baldosa cerámica	M2	76,13	\$ 13.054,00	\$ 993.801,00	21,32	\$ 278.311,00
2.6	Desmante o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	15,00	\$ 65.866,00	\$ 987.990,00		\$ -
2.7	Desmante de vidrio templado	M2	53,00	\$ 17.516,00	\$ 928.348,00	7,35	\$ 128.743,00
2.8	Desmante y/o demolición de granito y adoquín	M2	167,00	\$ 13.985,00	\$ 2.335.495,00	136,85	\$ 1.913.847,00
2.9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	109,54	\$ 10.275,00	\$ 1.125.524,00	19,65	\$ 201.904,00
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M3	18,00	\$ 49.634,00	\$ 893.412,00	18,00	\$ 893.412,00
2.11	Desmante de divisiones en aluminio y vidrio	M2	23,08	\$ 13.144,00	\$ 303.364,00	21,93	\$ 288.248,00
3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS				\$ 1.862.194,00		\$ -
3.1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	1,00	\$ 645.836,00	\$ 645.836,00		\$ -
3.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4",	ML	26,00	\$ 46.783,00	\$ 1.216.358,00		\$ -
4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA				\$ 4.548.620,00		\$ 876.625,00
4.1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	3,00	\$ 876.625,00	\$ 2.629.875,00	1,00	\$ 876.625,00
4.2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	3,00	\$ 608.074,77	\$ 1.824.224,00		\$ -
4.3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	3,00	\$ 31.507,00	\$ 94.521,00		\$ -
5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				\$ 92.267.177,00		\$ 25.152.997,00
5.1	Enchape cerámica pared	M2	60,70	\$ 91.483,00	\$ 5.553.018,00	14,02	\$ 1.282.592,00
5.2	Enchape cerámica antideslizante piso	M2	14,78	\$ 82.713,00	\$ 1.222.740,00	2,88	\$ 238.213,00
5.3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	1327,00	\$ 36.771,00	\$ 48.795.117,00	556,76	\$ 20.472.622,00
5.4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	205,00	\$ 11.594,00	\$ 2.376.770,00	25,50	\$ 295.647,00
5.5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	152,00	\$ 21.857,00	\$ 3.322.264,00	131,03	\$ 2.863.923,00
5.6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M2	180,00	\$ 136.118,00	\$ 24.501.240,00		\$ -
5.7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M2	126,50	\$ 51.352,00	\$ 6.496.028,00		\$ -
6	INSTALAR ESTUCCO Y PINTURA				\$ 68.334.704,00		\$ 27.099.550,00
6.1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M2	584,00	\$ 17.090,00	\$ 9.980.560,00	488,07	\$ 8.341.116,00
6.2	Estuco para muros.	M2	584,00	\$ 18.559,00	\$ 10.838.456,00	488,07	\$ 9.058.091,00
6.3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	1734,48	\$ 27.074,00	\$ 46.959.312,00	358,29	\$ 9.700.343,00
6.4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M2	17,00	\$ 32.728,00	\$ 556.376,00		\$ -
7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL				\$ 131.918.678,00		\$ 70.101.051,00
7.1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	1015,00	\$ 83.105,00	\$ 84.351.575,00	412,59	\$ 34.288.292,00
7.2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	462,00	\$ 56.881,00	\$ 26.279.022,00	255,74	\$ 14.546.747,00

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA :	No. 20250000874	SUSCRITO	12 de septiembre del 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025 - NIT 901.987.427-5	INTERVENTORÍA	GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS - NIT 901.390.155-3
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ	RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato		
OTRO SI 1	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato. (29/12/2025)		
FECHA DE INICIO	9 DE OCTUBRE DEL 2025	TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DEL 2026
VALOR :	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE		\$ 2.401.062.171,00
VALOR ACTA PARCIAL	OCHOCIENTOS TREITA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 839.076.480,00)	PORCENTAJE DE ACTA	34,95%
SUPERVISORA	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	FECHA ACTA	30 DE ENERO DEL 2026




CONDICIONES VIGENTES

ACTA PARCIAL 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
7,3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	202,57	\$ 105.090,00	\$ 21.288.081,00	202,36	\$ 21.266.012,00
8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS				\$ 85.232.000,00		\$ 23.712.210,00
8,1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	4,00	\$ 1.552.005,00	\$ 6.208.020,00		\$ -
8,2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	25,60	\$ 742.609,00	\$ 19.010.790,00	17,72	\$ 13.159.031,00
8,3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	9,24	\$ 590.779,00	\$ 5.458.798,00	6,36	\$ 3.757.354,00
8,4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M2	24,11	\$ 609.491,00	\$ 14.694.828,00	11,15	\$ 6.795.825,00
8,5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	11,00	\$ 423.869,00	\$ 4.662.559,00		\$ -
8,6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	15,00	\$ 1.647.505,00	\$ 24.712.575,00		\$ -
8,7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	6,00	\$ 1.747.405,00	\$ 10.484.430,00		\$ -
9	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PANETE CONCRETOS				\$ 24.672.153,00		\$ 17.209.011,00
9,1	Pañete 1:4	M2	5,26	\$ 29.427,00	\$ 154.786,00		\$ -
9,2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M3	34,00	\$ 145.660,00	\$ 4.952.440,00		\$ -
9,3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	8,38	\$ 1.007.006,00	\$ 8.438.710,00	8,38	\$ 8.438.710,00
9,4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	5,48	\$ 996.389,00	\$ 5.460.212,00	5,26	\$ 5.241.006,00
9,5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	94,45	\$ 13.486,00	\$ 1.273.753,00	10,50	\$ 141.603,00
9,6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	381,80	\$ 7.030,00	\$ 2.684.054,00	351,25	\$ 2.469.288,00
9,7	Excavación manual	M3	41,44	\$ 41.221,00	\$ 1.708.198,00	22,28	\$ 918.404,00
10	OBRAS ELÉCTRICAS				\$ 1.107.118.545,00		\$ 419.123.670,00
10,1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	1,00	\$ 8.100.949,00	\$ 8.100.949,00		\$ -
10,2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	1,00	\$ 5.711.516,00	\$ 5.711.516,00		\$ -
10,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	5,00	\$ 1.342.899,00	\$ 6.714.495,00	3,00	\$ 4.028.697,00
10,4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 100A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	1,00	\$ 2.514.715,00	\$ 2.514.715,00		\$ -
10,5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	4,00	\$ 1.280.629,00	\$ 5.122.516,00	3,00	\$ 3.841.887,00
10,6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	655,68	\$ 30.791,00	\$ 20.189.043,00	400,00	\$ 12.316.400,00
10,7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	172,00	\$ 261.708,00	\$ 45.013.776,00	119,00	\$ 31.143.252,00
10,8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	389,00	\$ 194.105,00	\$ 75.506.845,00	265,00	\$ 51.437.825,00

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA :	No. 202500000874	SUSCRITO	12 de septiembre del 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025 - NIT 901.987.427-5	INTERVENTORÍA	GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS - NIT 901.390.155-3
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ	RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato		
OTRO SI 1	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato. (29/12/2025)		
FECHA DE INICIO	9 DE OCTUBRE DEL 2025	TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DEL 2026
VALOR :	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE		\$ 2.401.062.171,00
VALOR ACTA PARCIAL	OCHOCIENTOS TREITA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 839.076.480,00)	PORCENTAJE DE ACTA	34,95%
SUPERVISORA	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	FECHA ACTA	30 DE ENERO DEL 2026



CONDICIONES VIGENTES						ACTA PARCIAL 01	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
10,9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	344,00	\$ 216.691,00	\$ 74.541.704,00	110,00	\$ 23.836.010,00
10.10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	37,00	\$ 189.272,00	\$ 7.003.064,00		\$ -
10.11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	20,00	\$ 131.181,00	\$ 2.623.620,00		\$ -
10.12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	58,00	\$ 5.325.286,00	\$ 308.866.588,00		\$ -
10.13	Desmonte de aparatos de salidas eléctricas	UND	190,00	\$ 11.454,00	\$ 2.176.260,00	190,00	\$ 2.176.260,00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	8,00	\$ 15.215.430,00	\$ 121.723.440,00	7,00	\$ 106.508.010,00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	15,00	\$ 8.500.713,00	\$ 127.510.695,00	10,00	\$ 85.007.130,00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	12,00	\$ 6.398.727,00	\$ 76.784.724,00	7,00	\$ 44.791.089,00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	796,00	\$ 77.341,00	\$ 61.563.436,00		\$ -
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	172,00	\$ 179.172,00	\$ 30.817.584,00	95,00	\$ 17.021.340,00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	25,00	\$ 197.091,00	\$ 4.927.275,00	15,00	\$ 2.956.365,00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	208,00	\$ 84.668,00	\$ 17.610.944,00	150,00	\$ 12.700.200,00
10.21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS, 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	49,00	\$ 132.922,00	\$ 6.513.178,00		\$ -
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	36,77	\$ 285.107,00	\$ 10.483.384,00		\$ -
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	83,48	\$ 553.810,00	\$ 46.232.059,00	26,00	\$ 14.399.060,00
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	30,00	\$ 756.173,00	\$ 22.685.190,00		\$ -
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1,00	\$ 6.960.145,00	\$ 6.960.145,00	1,00	\$ 6.960.145,00
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"	ML	100,00	\$ 92.214,00	\$ 9.221.400,00		\$ -
11	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 236.148.938,00		\$ 47.217.125,00
11.1	Policarbonato alveolar para cubierta	M2	159,00	\$ 132.190,00	\$ 21.018.210,00		\$ -
11.2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	87,00	\$ 864.806,00	\$ 75.238.122,00		\$ -
11.3	Canal en lamina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	16,93	\$ 118.185,00	\$ 2.000.872,00		\$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA :	No. 202500000874	SUSCRITO	12 de septiembre del 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025 - NIT 901.987.427-5	INTERVENTORÍA	GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS - NIT 901.390.155-3
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ	RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato		
OTRO SI 1	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato. (29/12/2025)		
FECHA DE INICIO	9 DE OCTUBRE DEL 2025	TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DEL 2026
VALOR :	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE		\$ 2.401.062.171,00
VALOR ACTA PARCIAL	OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 839.076.480,00)	PORCENTAJE DE ACTA	34,95%
SUPERVISORA	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	FECHA ACTA	30 DE ENERO DEL 2026



CONDICIONES VIGENTES


ACTA PARCIAL 01


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
11,4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	2179,64	\$ 21.838,00	\$ 47.598.978,00	2127,72	\$ 46.465.149,00
11,5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	3518,00	\$ 21.855,00	\$ 76.885.890,00		\$ -
11,6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	26,13	\$ 235.048,00	\$ 6.141.804,00		\$ -
11,7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	2,00	\$ 3.256.543,00	\$ 6.513.086,00		\$ -
11,8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	4,00	\$ 106.393,00	\$ 425.572,00	4,00	\$ 425.572,00
11,9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	2,00	\$ 163.202,00	\$ 326.404,00	2,00	\$ 326.404,00
COSTO DIRECTO TOTAL					1.791.359.593,00		\$ 645.443.446,00
	ADMINISTRACIÓN	26,00%			\$ 465.753.494,18		\$ 167.815.295,96
	IMPREVISTOS	1,00%			\$ 17.913.595,93		\$ 6.454.434,46
	UTILIDAD	3,00%			\$ 53.740.787,79		\$ 19.363.303,38
	TOTAL A.I.U. 30%				\$ 537.407.878,00		\$ 193.633.033,80
	Costo certificación RETIE				\$ 8.000.000,00		
	Costo certificación RETILAP				\$ 8.000.000,00		
	Plan de Manejo Ambiental				\$ 31.370.000,00		
	Plan de Manejo de Tránsito				\$ 24.924.700,00		
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				\$ 2.401.062.171,00		\$ 839.076.479,80

Valor anticipo otorgado	\$ 960.424.868,00
Valor amortizado presente acta	\$ 335.630.592,00
Valor amortizado acumulado	\$ 335.630.592,00
Valor saldo por amortizar	\$ 624.794.276,00
Valor acta sin amortización	\$ 839.076.479,80
Valor total a pagar presente acta	\$ 503.445.887,80

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).


 JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ
 Representante Legal
 CONSORCIO CAQUETÁ 2025


 NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
 Secretaria de Infraestructura
 SUPERVISORA


 JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
 Representante Legal
 GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ												
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874		
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893		
CAPÍTULO	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				ITEM : 1,1		Localización y replanteo				UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA
 		Localización		Dimensiones				TOTAL						
				Alto	Ancho	Longitud (m)	Area							
 		Primer piso												
		Taller Humano		1,25				2,1		2,63				
				7,05				4,63		32,64				
				5,37				5,14		27,60				
				4,6				8,23		37,86				
				3,04				4,98		15,14				
		Tesoría Atención al ciudadano		0,9				1		0,90				
				5,15				2,22		11,43				
				6,47				4,12		26,66				
				4,7				3,58		16,83				
				1,37				3,8		5,21				
		Pasillo Patio		1				2,12		2,12				
				10,2				2,01		20,50				
				2,82				2		5,64				
				1,12				2,58		2,89				
				1,31				2,2		2,88				
		Tributaria		7				5,45		38,15				
				3,95				2,82		11,14				
		Secretarías		4,04				4,81		19,43				
				6,9				1,6		11,04				
		Pasillo Secretarías		2,85				3,92		11,17				
				7,27				3,8		27,63				
		Sala de juntas		3,15				2,5		7,88				
				4,12				2,5		10,30				
		Contabilidad		7,3				4		29,20				
				10,8				4,2		45,36				
		Presupuesto		2,3				3,04		6,99				
7				5,09		35,63								
Tributo Impuestos		1,07				3,1		3,32						
		0,96				2,42		2,32						
		8,5				4,96		42,16						
Recepción		9				4,73		42,57						
		2,15				0,72		1,55						
		8,00				8,86		70,88						
Plazoleta		9,05				7,34		66,43						
OBSERVACIONES:		Subtotal										694,06		
		TOTAL										694,06		
GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA														
INGENIERO CIVIL														
DIRECTOR DE OBRA														
JHONATTAN HOYOS MARQUEZ														
INGENIERO CIVIL														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA														

							REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ							
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893			
CAPÍTULO	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES					ITEM : 1.2		Cerramiento en tela verde		UNID.	ML	UBICACIÓN	FLORENCIA	
								Localización		Dimensiones				TOTAL
										Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos	
								Plazoleta		Frente		16,5	1,00	16,50
										Costado derecho		6,6	1,00	6,60
										Costado posterior		16,6	1,00	16,60
										Costado izquierdo		10,3	1,00	10,30
										Recepcion		pasillo		
		5,2	1	5,20										
OBSERVACIONES:														
								Subtotal		59,90				
								TOTAL		59,90				
GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA							JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA							

**OBSERVACIONES:**



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025
-------	----	----	----	-----	----	------	----------------	------------------------	---------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025	NIT ó C.C.	901.987.427-5	CONTRATO No	202500000874
INTERVENTOR	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS	NIT ó C.C.	901.390.155-3	CONTRATO No	202500000893

CAPÍTULO	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE	ITEM : 2.1	Desmante de marcos y puertas.	UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA
----------	----------------------------------	------------	-------------------------------	-------	-----	-----------	-----------



Localización	Dimensiones			TOTAL
	Alto	Ancho	No. Elementos	
Primer piso				
Talento humano			1	1,00
Tesorería y Atención al ciudadano			2	2,00
Módulo recepción			1	1,00
Módulo Lactancia			1	1,00
Secretarías			1	1,00
cuarto de maquinas			1	1,00
Tributaria			1	1,00
Secretaría de hacienda			1	1,00
Baño de hacienda			1	1,00
Sala de juntas			1	1,00
Contabilidad			1	1,00
Presupuesto			1	1,00
Subtotal				13,00
TOTAL				13,00

OBSERVACIONES:


GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE OBRA


JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

[illegible]

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ															
FECHA		DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01		ELABORÓ		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ															
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025						NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS						NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893			
CAPÍTULO		REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE			ITEM : 2.3			Demolición de muro mampostería E=0,15m .				UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA		
   		Localización		Dimensiones				TOTAL									
				Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos										
				Primer piso	0,97	2,17				2,10							
					0,29	2,43				0,70							
OBSERVACIONES:		Subtotal												2,81			
		TOTAL												2,81			
 GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA														 JHONATAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORIA			

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ										
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025		
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ										
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874		
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893		
CAPÍTULO	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE			ITEM : 2.4		Desmorte de cielo raso existente			UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA
 		Localización		Dimensiones			No. Elementos	TOTAL				
				Alto	Ancho	Longitud (m)						
 		Primer piso			1,25	2,1		2,63				
		Talento Humano			7,05	4,63		32,64				
	5,37			5,14		27,60						
	4,6			8,23		37,86						
	3,04			4,98		15,14						
	0,9			1		0,90						
Tesorería Atención al ciudadano			5,15	2,22		11,43						
			6,47	4,12		26,66						
			4,7	3,58		16,83						
			1,37	3,8		5,21						
			1	2,12		2,12						
Pasillo Patio			10,2	2,01		20,50						
			2,82	2		5,64						
			1,12	2,58		2,89						
			1,31	2,2		2,88						
Tributaria			7	5,45		38,15						
			3,95	2,82		11,14						
Secretarías			4,04	4,81		19,43						
			6,9	1,6		11,04						
Pasillo Secretarías			2,85	3,92		11,17						
			7,27	3,8		27,63						
			3,15	2,5		7,88						
Secretaría Hacienda			4,12	2,5		10,30						
			7,3	4		29,20						
Contabilidad			10,8	4,2		45,36						
			2,3	3,04		6,99						
Presupuesto			5,05	8		40,40						
			1,07	3,1		3,32						
Tributo Impuestos			8,5	4,96		42,16						
Recepción		Subtotal						515,08				
		TOTAL						515,08				
OBSERVACIONES:												
												
GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL										JHONATAN HOYOS MARÓQUEZ INGENIERO CIVIL		
DIRECTOR DE OBRA										DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025
-------	----	----	----	-----	----	------	----------------	------------------------	---------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025	NIT ó C.C.	901.987.427-5	CONTRATO No	202500000874
INTERVENTOR	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS	NIT ó C.C.	901.390.155-3	CONTRATO No	202500000893

CAPÍTULO	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE	ITEM : 2.5	Demolición de baldosa cerámica	UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA
----------	----------------------------------	------------	--------------------------------	-------	----	-----------	-----------

[illegible]




JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025											
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																			
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT 6 C.C.	901.987.427-5	CONTRATO No	202500000874											
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT 6 C.C.	901.390.155-3	CONTRATO No	202500000893											
CAPÍTULO	REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE			ITEM : 2.7			Desmante de vidrio templado			UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA								
		Localización		Dimensiones			TOTAL														
				Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos														
		Primer piso																			
		Talento Humano			3,00	2,45		7,35													
OBSERVACIONES:		Subtotal					7,35														
		TOTAL					7,35														
												GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA									
												JHONATTAN HOYOS MARQUEZ									
		INGENIERO CIVIL																			
DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																			

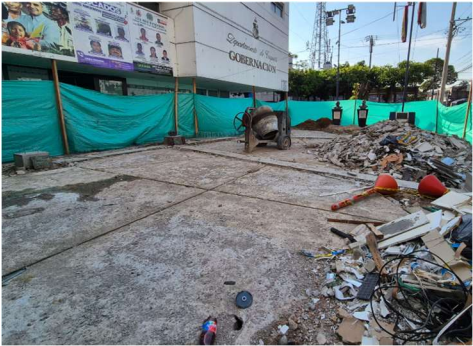						<div>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</div>																		
FECHA		DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01		ELABORÓ		CONSORCIO CAQUETÁ 2025											
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																						
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025						NIT 6 C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874										
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS						NIT 6 C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893										
CAPÍTULO		REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE				ITEM : 2.8		Desmote y/o demolición de granito y adoquín				UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA									
<div></div>																Localización		Dimensiones				TOTAL		
																	Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos				
																Primer piso								
																Plazoleta			8,00	8,86	1	70,88		
																			9,05	7,34	1	66,43		
																descuento			0,65	0,35	2	-0,46		
OBSERVACIONES:								Subtotal						136,85										
								TOTAL						136,85										
																								
GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA								JHONATTAN HOYOS MARQUEZ																
INGENIERO CIVIL								INGENIERO CIVIL																
DIRECTOR DE OBRA								DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																

	
<p>GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA</p>	<p>JHONATTAN HOYOS MARQUEZ</p>
<p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INGENIERO CIVIL</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>




	
<p>GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA</p>	<p>JHONATTAN HOYOS MARQUEZ</p>
<p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INGENIERO CIVIL</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>


	
<p>GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA</p>	<p>JHONATTAN HOYOS MARQUEZ</p>
<p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INGENIERO CIVIL</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p>



	
<p>GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA</p>	<p>JHONATTAN HOYOS MARQUEZ</p>
<p>INGENIERO CIVIL</p>	<p>INGENIERO CIVIL</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p>



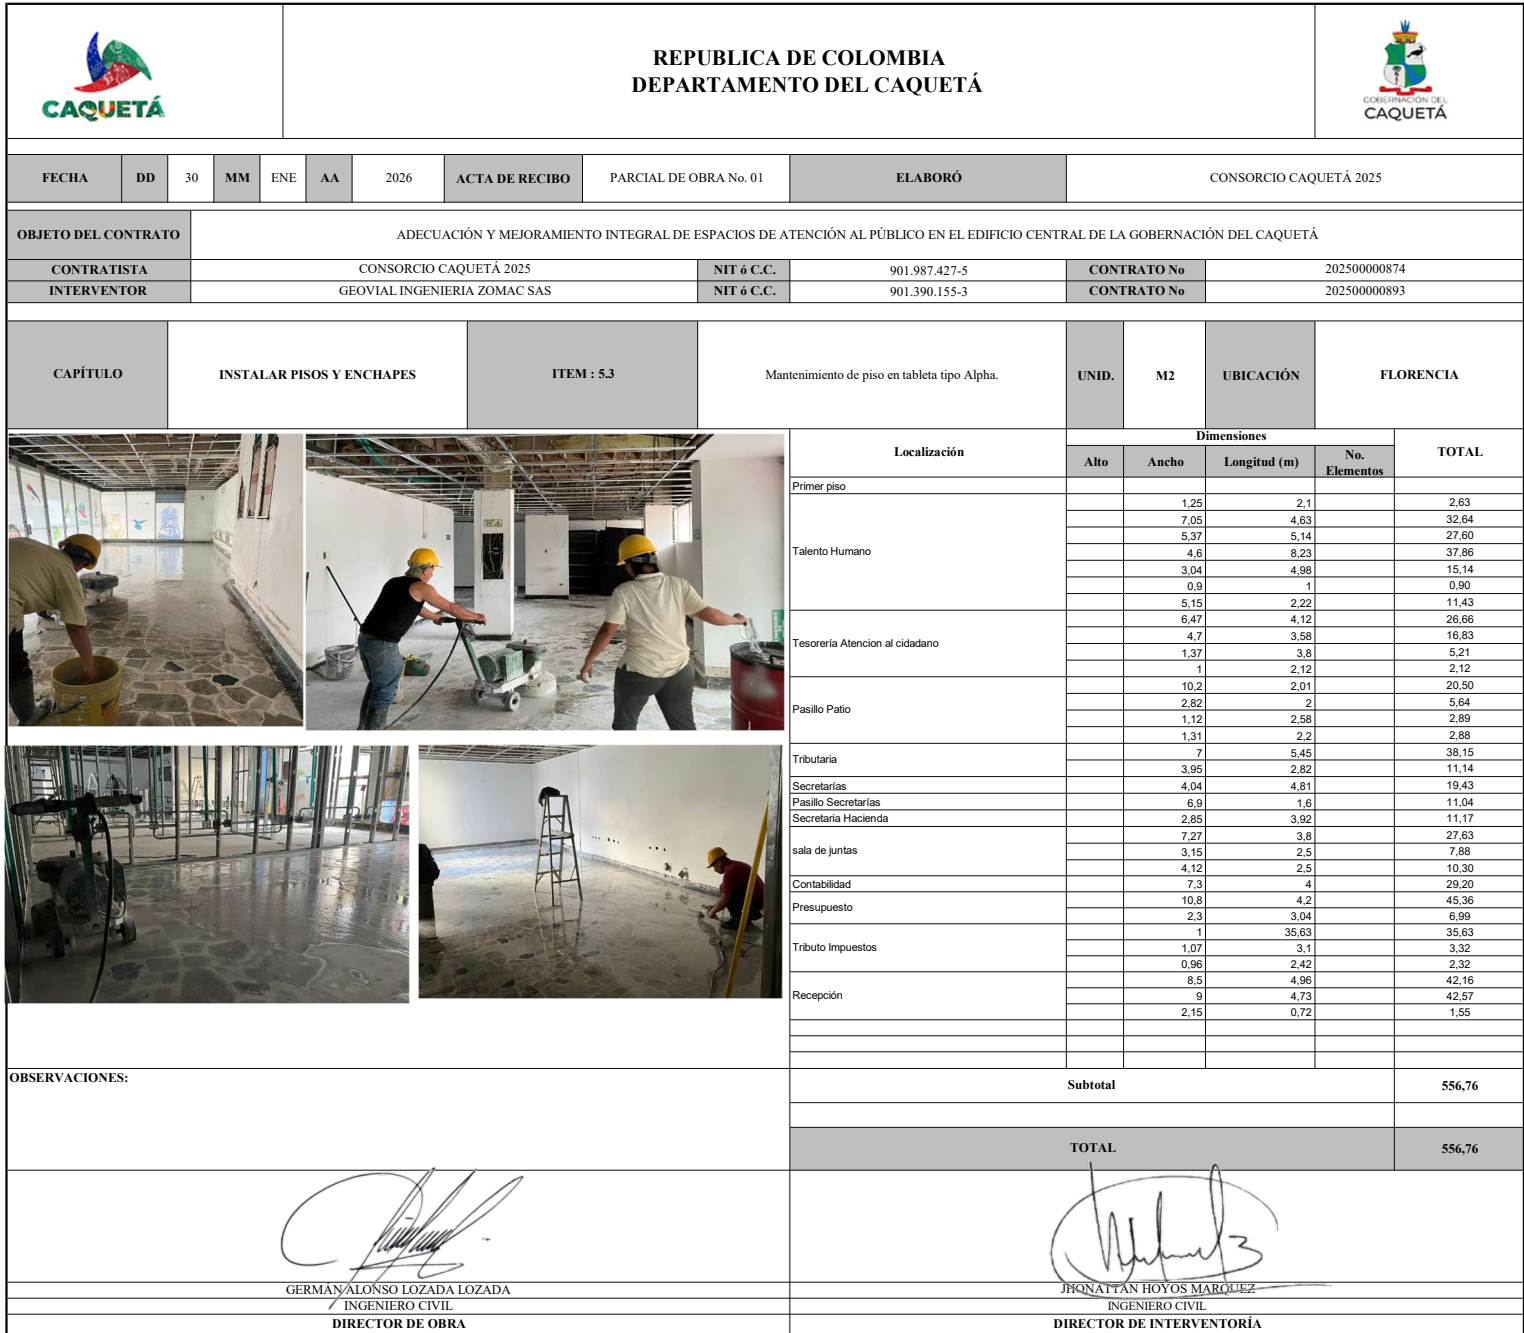

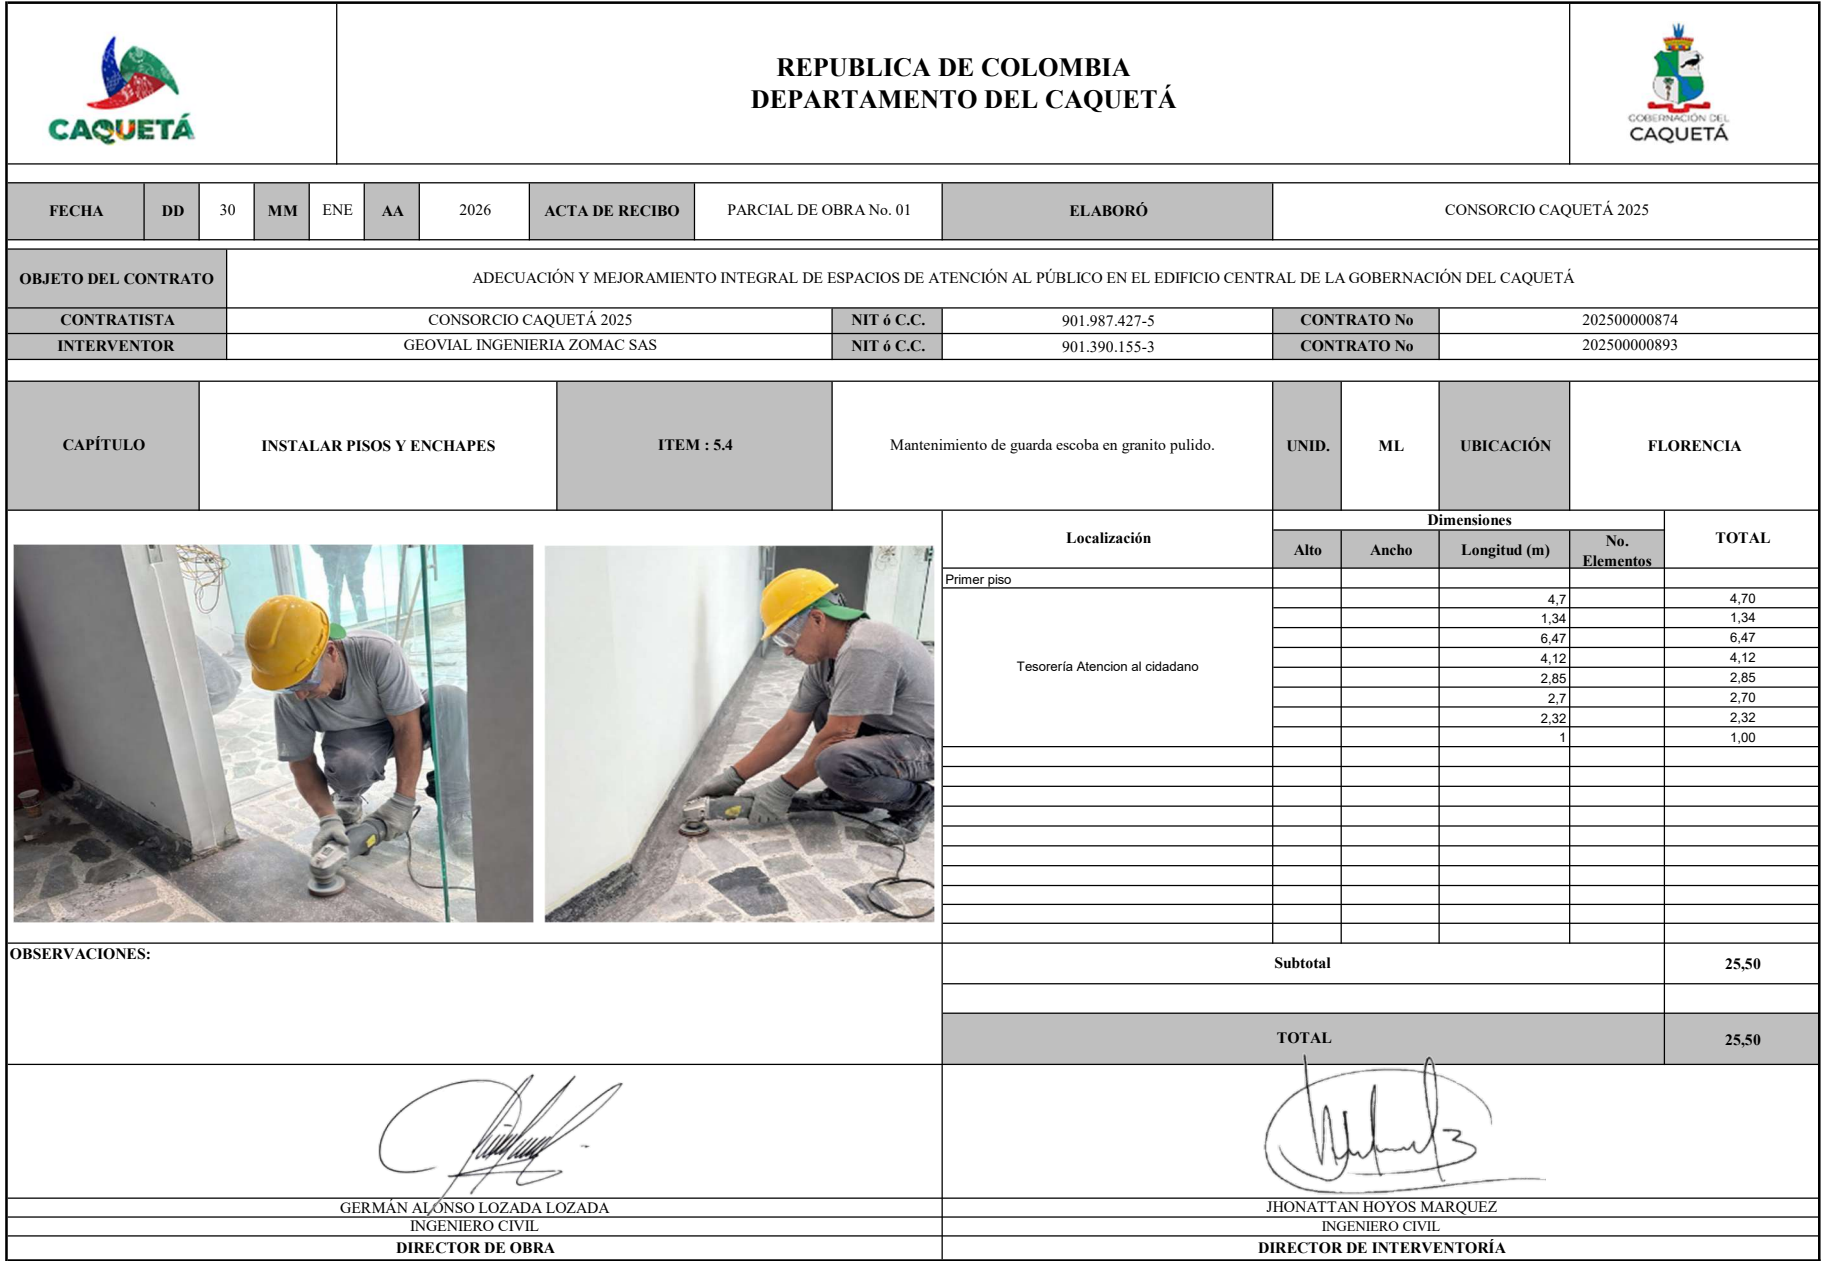



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025
-------	----	----	----	-----	----	------	----------------	------------------------	---------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025	NIT ó C.C.	901.987.427-5	CONTRATO No	202500000874
INTERVENTOR	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS	NIT ó C.C.	901.390.155-3	CONTRATO No	202500000893

CAPÍTULO	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES	ITEM : 5.5	Suministro e instalación de guardaesoba en porcelanato negro	UNID.	ML	UBICACIÓN	FLORENCIA
----------	---------------------------	------------	--	-------	----	-----------	-----------



Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	borde muro	Longitud (m)	No. Elementos	
Primer piso					
Atención al ciudadano		0,10	1,66	2	3,42
			2,30	2	4,60
			2,30	2	4,60
			1,42	2	2,84
			2,42	2	4,84
	0,10		2,64	2	5,38
			1,63	2	3,26
			4	1	4,00
			3,2	2	6,40
	0,10		0,71	2	1,52
	0,10		3,1	2	6,30
			4,65	1	4,65
			4,22	2	8,44
Sala de juntas	0,10		1,52	2	3,14
	0,10		2,04	2	4,18
	0,10		5,45	2	11,00
Secretarías	0,10		3,68	2	7,46
	0,10		2,4	2	4,90
Secretaría de hacienda	0,10		4,23	2	8,56
	0,10		0,40	2	0,90
	0,10		2,86	2	5,82
Contabilidad	0,10		7,64	2	15,38
	0,10		3,06	2	6,22
	0,10		1,56	2	3,22

OBSERVACIONES:	Subtotal	131,03
	TOTAL	131,03

GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA	JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FECHA		DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ		CONSORCIO CAQUETÁ 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025						NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS						NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CAPÍTULO		INSTALAR ESTUCO Y PINTURA				ITEM : 6.1		Pintura tipo 1 para muros interiores.				UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Localización</th><th colspan="3">Dimensiones</th><th rowspan="2">No. Elementos</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>ancho</th><th>Long</th><th>Alto</th></tr><tr><td>Primer piso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Atencion al ciudadano</td><td></td><td>1,66</td><td>2,58</td><td>2</td><td>8,5656</td></tr><tr><td></td><td>2,12</td><td>2,58</td><td>2</td><td>10,9302</td></tr><tr><td></td><td>6,47</td><td>2,58</td><td></td><td>16,6926</td></tr><tr><td></td><td>1,34</td><td>2,58</td><td></td><td>3,4572</td></tr><tr><td rowspan="4">Talento humano</td><td></td><td>4,70</td><td>2,58</td><td></td><td>12,126</td></tr><tr><td></td><td>3,30</td><td>2,58</td><td>2</td><td>17,028</td></tr><tr><td></td><td>1,50</td><td>2,58</td><td></td><td>3,87</td></tr><tr><td></td><td>7,00</td><td>2,58</td><td>2</td><td>36,12</td></tr><tr><td rowspan="10">Tributaria</td><td></td><td>1,42</td><td>2,58</td><td>2</td><td>7,3272</td></tr><tr><td></td><td>2,42</td><td>2,58</td><td>2</td><td>12,4872</td></tr><tr><td></td><td>2,64</td><td>2,58</td><td>2</td><td>13,6224</td></tr><tr><td></td><td>1,63</td><td>2,58</td><td></td><td>4,2054</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>3,2</td><td>1</td><td>2</td><td>6,4</td></tr><tr><td></td><td>5,45</td><td>2,58</td><td></td><td>14,061</td></tr><tr><td></td><td>0,71</td><td>1</td><td>2</td><td>1,42</td></tr><tr><td></td><td>3,1</td><td>2,58</td><td></td><td>7,998</td></tr><tr><td></td><td>4,22</td><td>2,58</td><td>2</td><td>21,7752</td></tr><tr><td rowspan="4">Sala de juntas</td><td></td><td>0,95</td><td>2,58</td><td></td><td>2,451</td></tr><tr><td></td><td>1,52</td><td>2,58</td><td>2</td><td>7,8432</td></tr><tr><td></td><td>2,04</td><td>2,58</td><td>2</td><td>10,5264</td></tr><tr><td></td><td>1,1</td><td>0,52</td><td>2</td><td>1,144</td></tr><tr><td rowspan="4">Secretarias</td><td></td><td>5,45</td><td>2,58</td><td>2</td><td>28,122</td></tr><tr><td></td><td>1,1</td><td>0,52</td><td>2</td><td>1,144</td></tr><tr><td></td><td>1,1</td><td>0,52</td><td>2</td><td>1,144</td></tr><tr><td></td><td>3,68</td><td>2,58</td><td>2,00</td><td>18,9888</td></tr><tr><td rowspan="4">Secretaría de Hacienda</td><td></td><td>2,4</td><td>2,58</td><td>2,00</td><td>12,384</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>0,52</td><td>2,00</td><td>1,04</td></tr><tr><td></td><td>4,23</td><td>2,58</td><td>3,00</td><td>32,7402</td></tr><tr><td></td><td>0,40</td><td>2,58</td><td></td><td>1,032</td></tr><tr><td rowspan="4">Contabilidad</td><td></td><td>2,86</td><td>2,58</td><td>2,00</td><td>14,7576</td></tr><tr><td></td><td>7,64</td><td>2,58</td><td>2,00</td><td>39,4224</td></tr><tr><td></td><td>1,2</td><td>0,52</td><td>2,00</td><td>1,248</td></tr><tr><td></td><td>7,64</td><td>2,48</td><td></td><td>18,9472</td></tr><tr><td rowspan="6">Secretaria de Presupuesto</td><td></td><td>10,8</td><td>2,48</td><td></td><td>26,784</td></tr><tr><td></td><td>3,16</td><td>1,2</td><td></td><td>3,792</td></tr><tr><td></td><td>3,06</td><td>2,48</td><td>3,00</td><td>22,7664</td></tr><tr><td></td><td>1,56</td><td>2,48</td><td>2,00</td><td>7,7376</td></tr><tr><td></td><td>1,1</td><td>0,52</td><td>2,00</td><td>1,144</td></tr><tr><td></td><td>0,9</td><td>0,52</td><td>2,00</td><td>0,936</td></tr><tr><td rowspan="6">Escaleras Recepción</td><td></td><td>0,95</td><td>2,5</td><td></td><td>1,375</td></tr><tr><td></td><td>2,8</td><td>2,64</td><td></td><td>7,392</td></tr><tr><td></td><td>2,8</td><td>2,64</td><td>0,50</td><td>3,696</td></tr><tr><td></td><td>2,68</td><td>1,94</td><td>0,50</td><td>2,5996</td></tr><tr><td></td><td>0,32</td><td>0,7</td><td></td><td>0,224</td></tr><tr><td></td><td>2,68</td><td>0,7</td><td></td><td>1,876</td></tr><tr><td rowspan="4">Cuarto recepción</td><td></td><td>1,84</td><td>2,64</td><td></td><td>4,8576</td></tr><tr><td></td><td>0,4</td><td>2,58</td><td>1,03</td><td>1,032</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,58</td><td>2,58</td><td>2,58</td></tr><tr><td></td><td>0,51</td><td>0,48</td><td>0,24</td><td>0,2448</td></tr><tr><td colspan="5">Subtotal</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">488,07</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">488,07</td></tr><tr><td colspan="16"><div><div> GERMAN ALONSO LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA</div><div> JHONATAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div></div></td></tr></table>																Localización	Dimensiones			No. Elementos	TOTAL	ancho	Long	Alto	Primer piso						Atencion al ciudadano		1,66	2,58	2	8,5656		2,12	2,58	2	10,9302		6,47	2,58		16,6926		1,34	2,58		3,4572	Talento humano		4,70	2,58		12,126		3,30	2,58	2	17,028		1,50	2,58		3,87		7,00	2,58	2	36,12	Tributaria		1,42	2,58	2	7,3272		2,42	2,58	2	12,4872		2,64	2,58	2	13,6224		1,63	2,58		4,2054		4	1	2	8		3,2	1	2	6,4		5,45	2,58		14,061		0,71	1	2	1,42		3,1	2,58		7,998		4,22	2,58	2	21,7752	Sala de juntas		0,95	2,58		2,451		1,52	2,58	2	7,8432		2,04	2,58	2	10,5264		1,1	0,52	2	1,144	Secretarias		5,45	2,58	2	28,122		1,1	0,52	2	1,144		1,1	0,52	2	1,144		3,68	2,58	2,00	18,9888	Secretaría de Hacienda		2,4	2,58	2,00	12,384		1,00	0,52	2,00	1,04		4,23	2,58	3,00	32,7402		0,40	2,58		1,032	Contabilidad		2,86	2,58	2,00	14,7576		7,64	2,58	2,00	39,4224		1,2	0,52	2,00	1,248		7,64	2,48		18,9472	Secretaria de Presupuesto		10,8	2,48		26,784		3,16	1,2		3,792		3,06	2,48	3,00	22,7664		1,56	2,48	2,00	7,7376		1,1	0,52	2,00	1,144		0,9	0,52	2,00	0,936	Escaleras Recepción		0,95	2,5		1,375		2,8	2,64		7,392		2,8	2,64	0,50	3,696		2,68	1,94	0,50	2,5996		0,32	0,7		0,224		2,68	0,7		1,876	Cuarto recepción		1,84	2,64		4,8576		0,4	2,58	1,03	1,032		1	2,58	2,58	2,58		0,51	0,48	0,24	0,2448	Subtotal										488,07		TOTAL										488,07		<div><div> GERMAN ALONSO LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA</div><div> JHONATAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div></div>															
Localización	Dimensiones			No. Elementos	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ancho	Long	Alto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Primer piso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Atencion al ciudadano		1,66	2,58	2	8,5656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,12	2,58	2	10,9302																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		6,47	2,58		16,6926																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,34	2,58		3,4572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Talento humano		4,70	2,58		12,126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3,30	2,58	2	17,028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,50	2,58		3,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		7,00	2,58	2	36,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Tributaria		1,42	2,58	2	7,3272																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,42	2,58	2	12,4872																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,64	2,58	2	13,6224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,63	2,58		4,2054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4	1	2	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3,2	1	2	6,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		5,45	2,58		14,061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0,71	1	2	1,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3,1	2,58		7,998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4,22	2,58	2	21,7752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Sala de juntas		0,95	2,58		2,451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,52	2,58	2	7,8432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,04	2,58	2	10,5264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,1	0,52	2	1,144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Secretarias		5,45	2,58	2	28,122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,1	0,52	2	1,144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,1	0,52	2	1,144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3,68	2,58	2,00	18,9888																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Secretaría de Hacienda		2,4	2,58	2,00	12,384																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,00	0,52	2,00	1,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4,23	2,58	3,00	32,7402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0,40	2,58		1,032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Contabilidad		2,86	2,58	2,00	14,7576																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		7,64	2,58	2,00	39,4224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,2	0,52	2,00	1,248																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		7,64	2,48		18,9472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Secretaria de Presupuesto		10,8	2,48		26,784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3,16	1,2		3,792																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3,06	2,48	3,00	22,7664																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,56	2,48	2,00	7,7376																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1,1	0,52	2,00	1,144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0,9	0,52	2,00	0,936																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Escaleras Recepción		0,95	2,5		1,375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,8	2,64		7,392																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,8	2,64	0,50	3,696																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,68	1,94	0,50	2,5996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0,32	0,7		0,224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2,68	0,7		1,876																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuarto recepción		1,84	2,64		4,8576																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0,4	2,58	1,03	1,032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1	2,58	2,58	2,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0,51	0,48	0,24	0,2448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Subtotal										488,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL										488,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<div><div> GERMAN ALONSO LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA</div><div> JHONATAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ											
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025			
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ											
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT 6 C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874	
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT 6 C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893	
CAPÍTULO	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA			ITEM : 6.2			Estuco para muros.			UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA
				Localización		Dimensiones				TOTAL			
						ancho	Long	Alto	No. Elementos				
				Primer piso		ancho				8,5656			
						Long							
				Antencion al ciudadano		ancho				10,9302			
						Long							
				Talento humano		ancho				17,628			
						Long							
				Tributaria		ancho				3,87			
						Long							
				Sala de Juntas		ancho				36,12			
						Long							
				Secretarias		ancho				7,3272			
						Long							
				Secretaria de Hacienda		ancho				12,4872			
						Long							
				Contabilidad		ancho				13,6224			
						Long							
				Secretaria de Presupuesto		ancho				4,2054			
						Long							
				Escaleras Recepción		ancho				8			
						Long							
				Cuarto recepción		ancho				6,4			
						Long							
				Subtotal		ancho				14,061			
						Long							
				TOTAL		ancho				1,42			
						Long							
				GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA		ancho				7,998			
						Long							
				INGENIERO CIVIL		ancho				21,7752			
						Long							
				DIRECTOR DE OBRA		ancho				2,451			
						Long							
				JHONATTAN HOYOS MARQUEZ		ancho				0			
						Long							
				INGENIERO CIVIL		ancho				7,8432			
						Long							
				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ancho				10,5264			
						Long							
						ancho				1,144			
						Long							
						ancho				28,122			
						Long							
						ancho				1,144			
						Long							
						ancho				18,9888			
						Long							
						ancho				12,384			
						Long							
						ancho				1,04			
						Long							
						ancho				32,7402			
						Long							
						ancho				1,032			
						Long							
						ancho				14,7576			
						Long							
						ancho				39,4224			
						Long							
						ancho				1,248			
						Long							
						ancho				26,784			
						Long							
						ancho				3,792			
						Long							
						ancho				22,7664			
						Long							
						ancho				7,7376			
						Long							
						ancho				1,144			
						Long							
						ancho				0,936			
						Long							
						ancho				1,376			
						Long							
						ancho				7,392			
						Long							
						ancho				3,696			
						Long							
						ancho				2,5996			
						Long							
						ancho				0,224			
						Long							
						ancho				1,876			
						Long							
						ancho				4,8576			
						Long							
						ancho				1,032			
						Long							
						ancho				2,58			
						Long							
						ancho				0,2448			
						Long							
						ancho				488,07			
						Long							
						ancho				488,07			
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							
						ancho							
						Long							

						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ											
FECHA		DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01		ELABORÓ		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ															
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025						NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		20250000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS						NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		20250000893			
CAPÍTULO		INSTALAR ESTUCO Y PINTURA			ITEM : 6.3			Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)				UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA		
						Localización		Dimensiones				TOTAL					
								Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos						
						Fachada Frente		1,97	2,50				4,93				
								3,26	5,00				16,30				
								2,20	7,50				16,50				
						Ventana		0,70	7,50		2,00		10,50				
								6,41	8,40				53,84				
								6,41	0,92				5,90				
						Descuento Ventanas		0,60	1,20		-3,00		-2,16				
						Bordes Ventanas			0,15	0,60	6,00		0,54				
									0,20	1,20	6,00		1,44				
						Fachada Lateral 1											
								6,41	2,90				18,59				
								6,41	4,65				29,81				
								6,41	4,65				29,81				
						Descuento ventanas		0,70	1,20		-1,0		-0,84				
						Columnas parte inferior		2,50	2,00		3,00		15,00				
						Columnas parte superior		6,15	0,95		3,00		17,53				
						Fachada lateral 2		1,70	11,80		2,00		40,12				
						Descuento de celosías		2,09	0,10		-11,00		-2,30				
						Celosías parte superior e inferior		2,17	0,5		11		11,94				
						Celosías parte de ventana		1,48	0,9		11		14,65				
						Celosías abajo y arriba			0,1	0,2	11		0,22				
						Columnas superiores		1,4	0,23		2		0,644				
						Paredes laterales											
						Izquierda		6,41	1,52				9,74				
						Derecha		9,31	1,52				14,15				
						Columneta parte derecha		7,35	0,48				3,53				
						pared derecha parte superior		2,1	1,3				2,73				
						Fachada lateral 2 parte inferior		2,03	9,4				19,082				
						parte de rampla		1,65	1,2				1,98				
						Pared lateral derecha		2,9	1,45				4,205				
						Alfajías											
						fachada frontal			0,38	16,82			6,3916				
						Fachada lateral 1			0,38	13,25			5,035				
						Fachada lateral 2			0,24	11,8	3		8,496				



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025					
OBJETO DEL CONTRATO						ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ									
CONTRATISTA						CONSORCIO CAQUETÁ 2025		NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874		
INTERVENTOR						GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS		NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893		
CAPÍTULO		INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL				ITEM : 7.1		Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.			UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA	
												Dimensiones			TOTAL
												Cant	Ancho	Longitud (m)	
												Primer piso			
												antencion al ciudadano			
												figura			
												descuento de aire			
												Tapa			
												Direccion de Presupuesto			
												Direccion de Presupuesto-habitacion pequena			
												figura			
												descuento de aire			
												Secretaria de hacienda			
												baño secretaria			
												tapa			
												Contabilidad			
												figura			
												descuento de aire			
												tapa			
												Secretaria			
												figura			
												descuento de aire			
												Tributaria			
												Figura			
												descuento de aire			
												Sala de Juntas			
												figura			
												descuento de aire			
												tapa			
												Sala de Juntas			
												figura			
												descuento de aire			
												Sala de Juntas			
												figura			
												descuento de aire			
												Sala de Juntas			
												figura			
												cuarto recepción			
												Recepción			
												Figuras			
												Subtotal			
												TOTAL			
												OBSERVACIONES:			
												GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA			
												INGENIERO CIVIL			
												JHONATAN POYOS MARQUEZ			
												INGENIERO CIVIL			
												DIRECTOR DE OBRA			
												DIRECTOR DE INTERVENTORIA			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025
-------	----	----	----	-----	----	------	----------------	------------------------	---------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETÁ 2025	NIT ó C.C.	901.987.427-5	CONTRATO No	202500000874
INTERVENTOR	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS	NIT ó C.C.	901.390.155-3	CONTRATO No	202500000893

CAPÍTULO	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL	ITEM : 7.2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNID.	ML	UBICACIÓN	FLORENCIA
----------	---	------------	--	-------	----	-----------	-----------




Localización	Dimensiones			No. Elementos	TOTAL
	Cant	Ancho	Longitud (m)		
Primer piso					
atencion al ciudadano					
borde exterior		11,80	4	1,00	15,6
borde interior		11,00	3,4	1,00	14,4
					0
Direccion de Presupuesto					0
exterior		17,6	4,3	1,00	21,9
interior		17	3,7	1	20,7
					0
					0
					0
Contabilidad					0
exterior		8	4,3	1	12,3
interior		7,4	3,7	1	11,1
					0
Sala de juntas					0
exterior		2,2	5,2	1	7,4
interior		1,6	4,6	1	6,2
exterior		1,54	1,45	1	2,99
interior		0,94	0,85	1	1,79
exterior		1,41	2,97	1	4,38
interior		0,81	2,37	1	3,18
Secretaría					0
exterior		2,2	3,4	1	5,6
interior		1,6	2,8	1	4,4
					0
Tributaria					0
exterior		2,8	7,6	1	10,4
interior		2,2	7	1	9,2
Recepción		10,6	7,2	1	17,8
		3	3	8	48
Perímetros carteras recepcion		2,4	2,4	8	38,4

OBSERVACIONES:

Subtotal 255,74

TOTAL 255,74


GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE OBRA


JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ																		
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025										
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																		
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT 6 C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874								
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT 6 C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893								
CAPÍTULO	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL				ITEM : 7.3		Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)				UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA						
														Localización		Dimensiones			TOTAL	
														Ancho	Long	Alto	No. Elementos			
														Primer piso						
														Atencion al ciudadano		1.66	2.58		4.28	
																2.30	2.58		5.93	
																2.08	2.48		5.16	
														Talento humano		1.50	2.58		3.87	
																1.25	2.48		3.10	
																2.30	2.58		5.93	
																1.42	2.58		3.66	
																2.42	2.58		6.24	
																2.64	2.58		6.81	
														Tributaria		1.63	2.58		4.21	
																4	1		4.00	
																3.2	1		3.20	
																0.71	1		0.71	
																3.1	2.58		8.00	
																4.22	2.58		10.89	
																1.52	2.58		3.92	
																2.04	2.58		5.26	
														Sala de Juntas		1.1	0.52		0.57	
																5.45	2.6		14.17	
																1.1	0.52		0.57	
																1.1	0.52		0.57	
														Secretarias		3.68	2.58		9.49	
																2.4	2.58		6.19	
														Secretaria de Hacienda		1.00	0.52		0.52	
																4.23	2.58		10.91	
		0.40	2.58		1.03															
		2.86	2.58		7.38															
Contabilidad		7.64	2.58		19.71															
		1.2	0.52		0.62															
		7.64	2.48		18.95															
Secretaria de Presupuesto		3.06	2.48		7.59															
		1.56	2.48		3.87															
		1.1	0.52		0.57															
		0.9	0.52		0.47															
		0.4	2.58		1.03															
Cuarto recepción		1	2.58		2.58															
		0.51	0.48		0.24															
Recepción		3.75	2.7		10.13															
OBSERVACIONES:										Subtotal			202,36							
										TOTAL			202,36							
GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA																				
INGENIERO CIVIL																				
DIRECTOR DE OBRA																				
JONATHAN HOYOS MARQUEZ																				
INGENIERO CIVIL																				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																				




**OBSERVACIONES:**




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ





FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025															
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																							
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874														
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893														
CAPÍTULO	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS			ITEM : 8.4			Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM			UNID.	M2	UBICACIÓN	FLORENCIA												
		Localización		Dimensiones				TOTAL																	
				Alto	Ancho	Longitud (m)	No. Elementos																		
		Primer piso																							
		Atencion al ciudadano			2,16	2,5		5,4																	
					2,30	2,5		5,75																	
OBSERVACIONES:		Subtotal							11,15																
		TOTAL							11,15																
														GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA											
														JHONATTAN HOYOS MARQUEZ											
		INGENIERO CIVIL																							
		INGENIERO CIVIL																							
		DIRECTOR DE OBRA																							
		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																							

FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025			
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ											
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT 6 C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	20250000874		
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT 6 C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893		
CAPÍTULO	INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS					ITEM : 9.3		Zapata en concreto reforzado 4000 PSI		UNID.	M3	UBICACIÓN	FLORENCIA
						Localización		Dimensiones				TOTAL	
								Ancho	Longitud	Profundidad	No. Elementos		
						Plazoleta							
						Zapatas Eje 3		1,50	1,50	0,80	2	3,	
						Zapatas eje 2 y 1		1,10	1,10	0,80	4	3,87	
						Pedestales eje 3		0,4	0,60	0,81	2	0,388	
						Pedestales 1 y 2		0,4	0,4	0,81	4	0,518	
OBSERVACIONES:						Subtotal					8,38		
						TOTAL					8,38		
 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA						 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA							

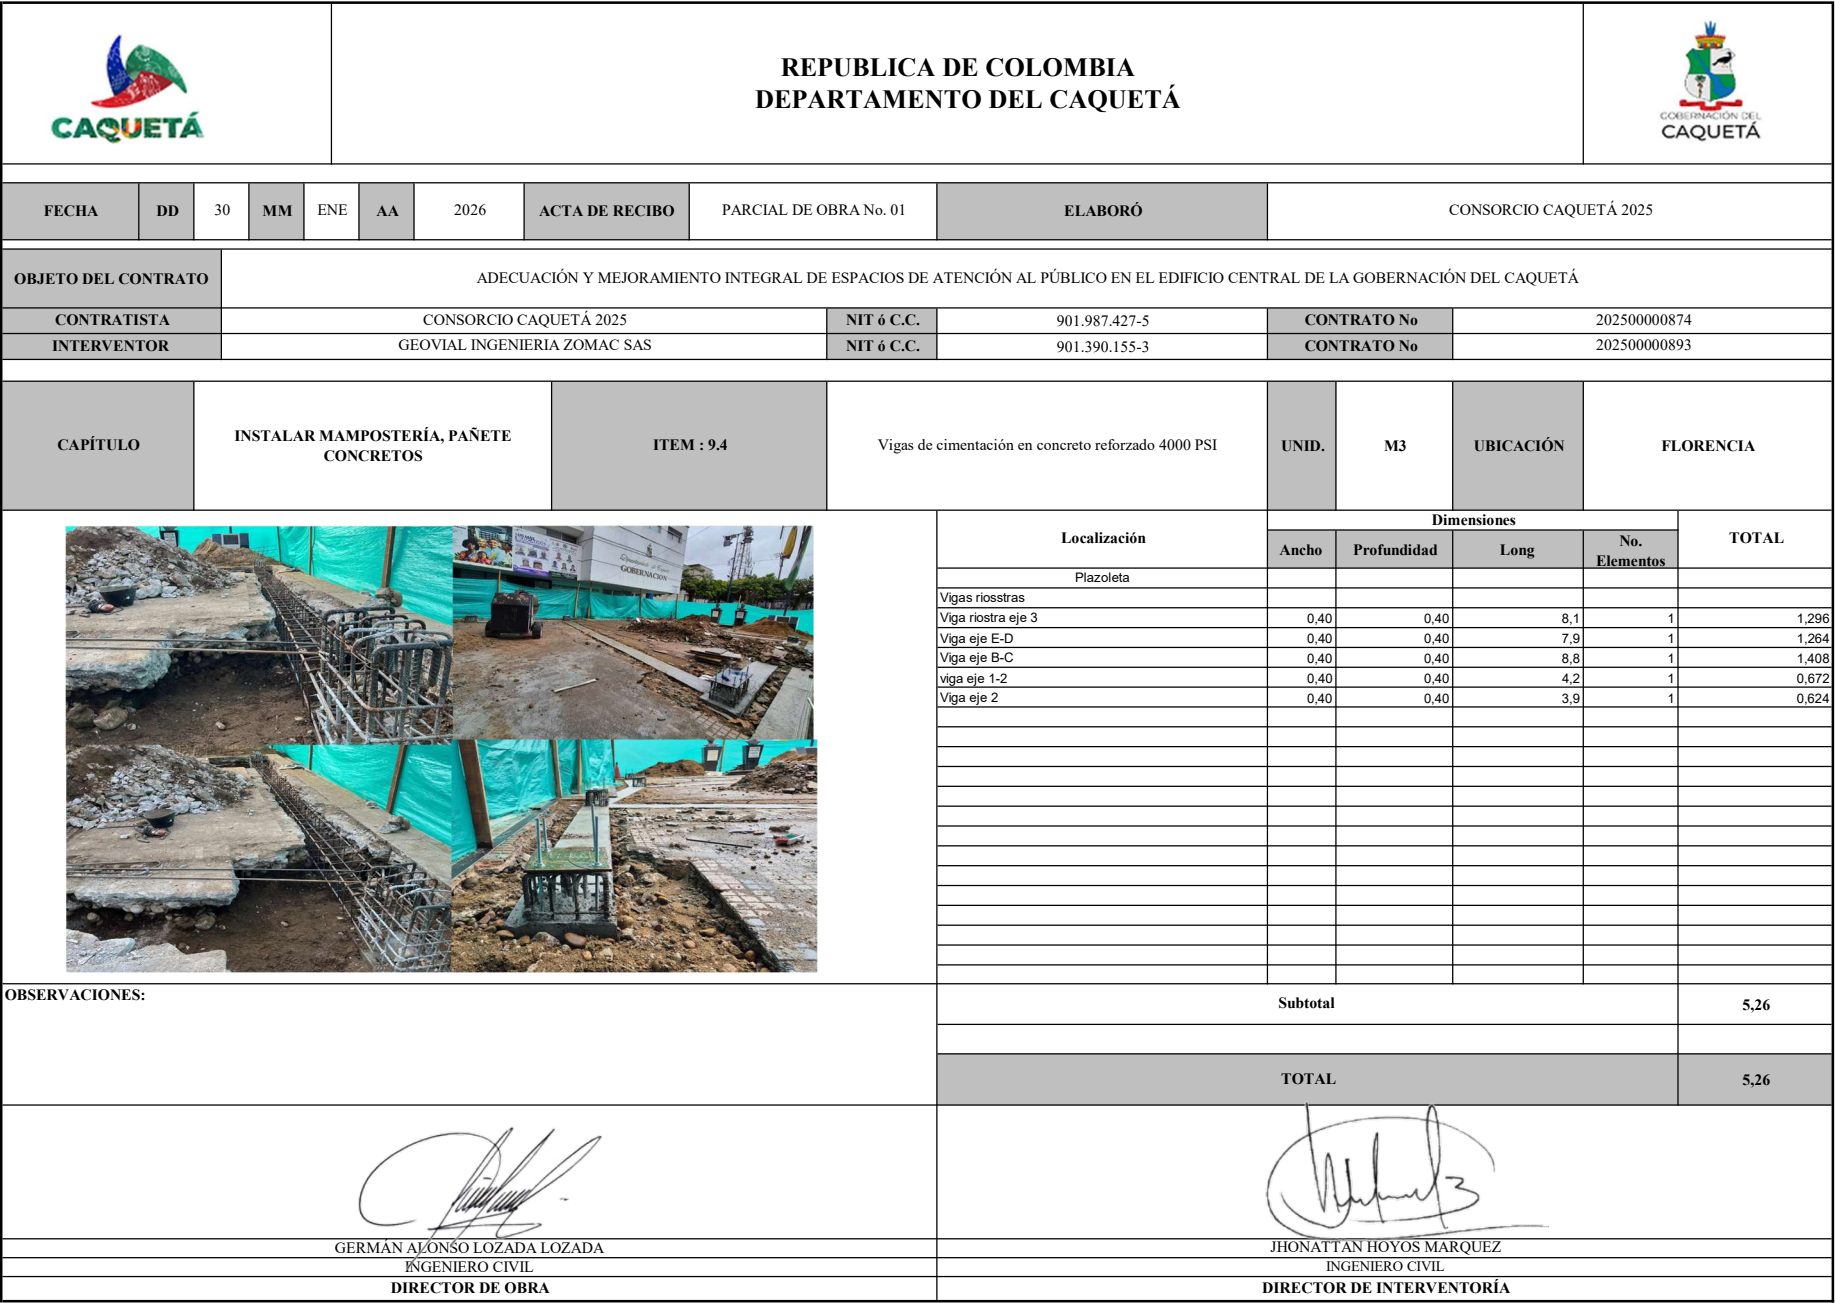

										REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ																																			
FECHA		DD		30		MM		ENE		AA		2026		ACTA DE RECIBO		PARCIAL DE OBRA No. 01		ELABORÓ		CONSORCIO CAQUETÁ 2025																									
OBJETO DEL CONTRATO										ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																																			
CONTRATISTA										CONSORCIO CAQUETÁ 2025										NIT 6 C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874																			
INTERVENTOR										GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC SAS										NIT 6 C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893																			
CAPÍTULO										INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS										ITEM : 9.5		Pañete filos marcos puertas o ventanas										UNID.		ML		UBICACIÓN		FLORENCIA							
																				Localización		Dimensiones				TOTAL																			
																				Ancho		Cant		Long		No. Elementos																			
																				Primer piso																									
																				Talento Humano		3.00		2.10		1		6.3																	
																				Tesorería		2.00		2.10		1		4.2																	
OBSERVACIONES:																				Subtotal		10,50																							
																				TOTAL		10,50																							
																						JONATHAN HOYOS MARQUEZ																							
																						INGENIERO CIVIL																							
																						DIRECTOR DE OBRA																							
																						DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																							

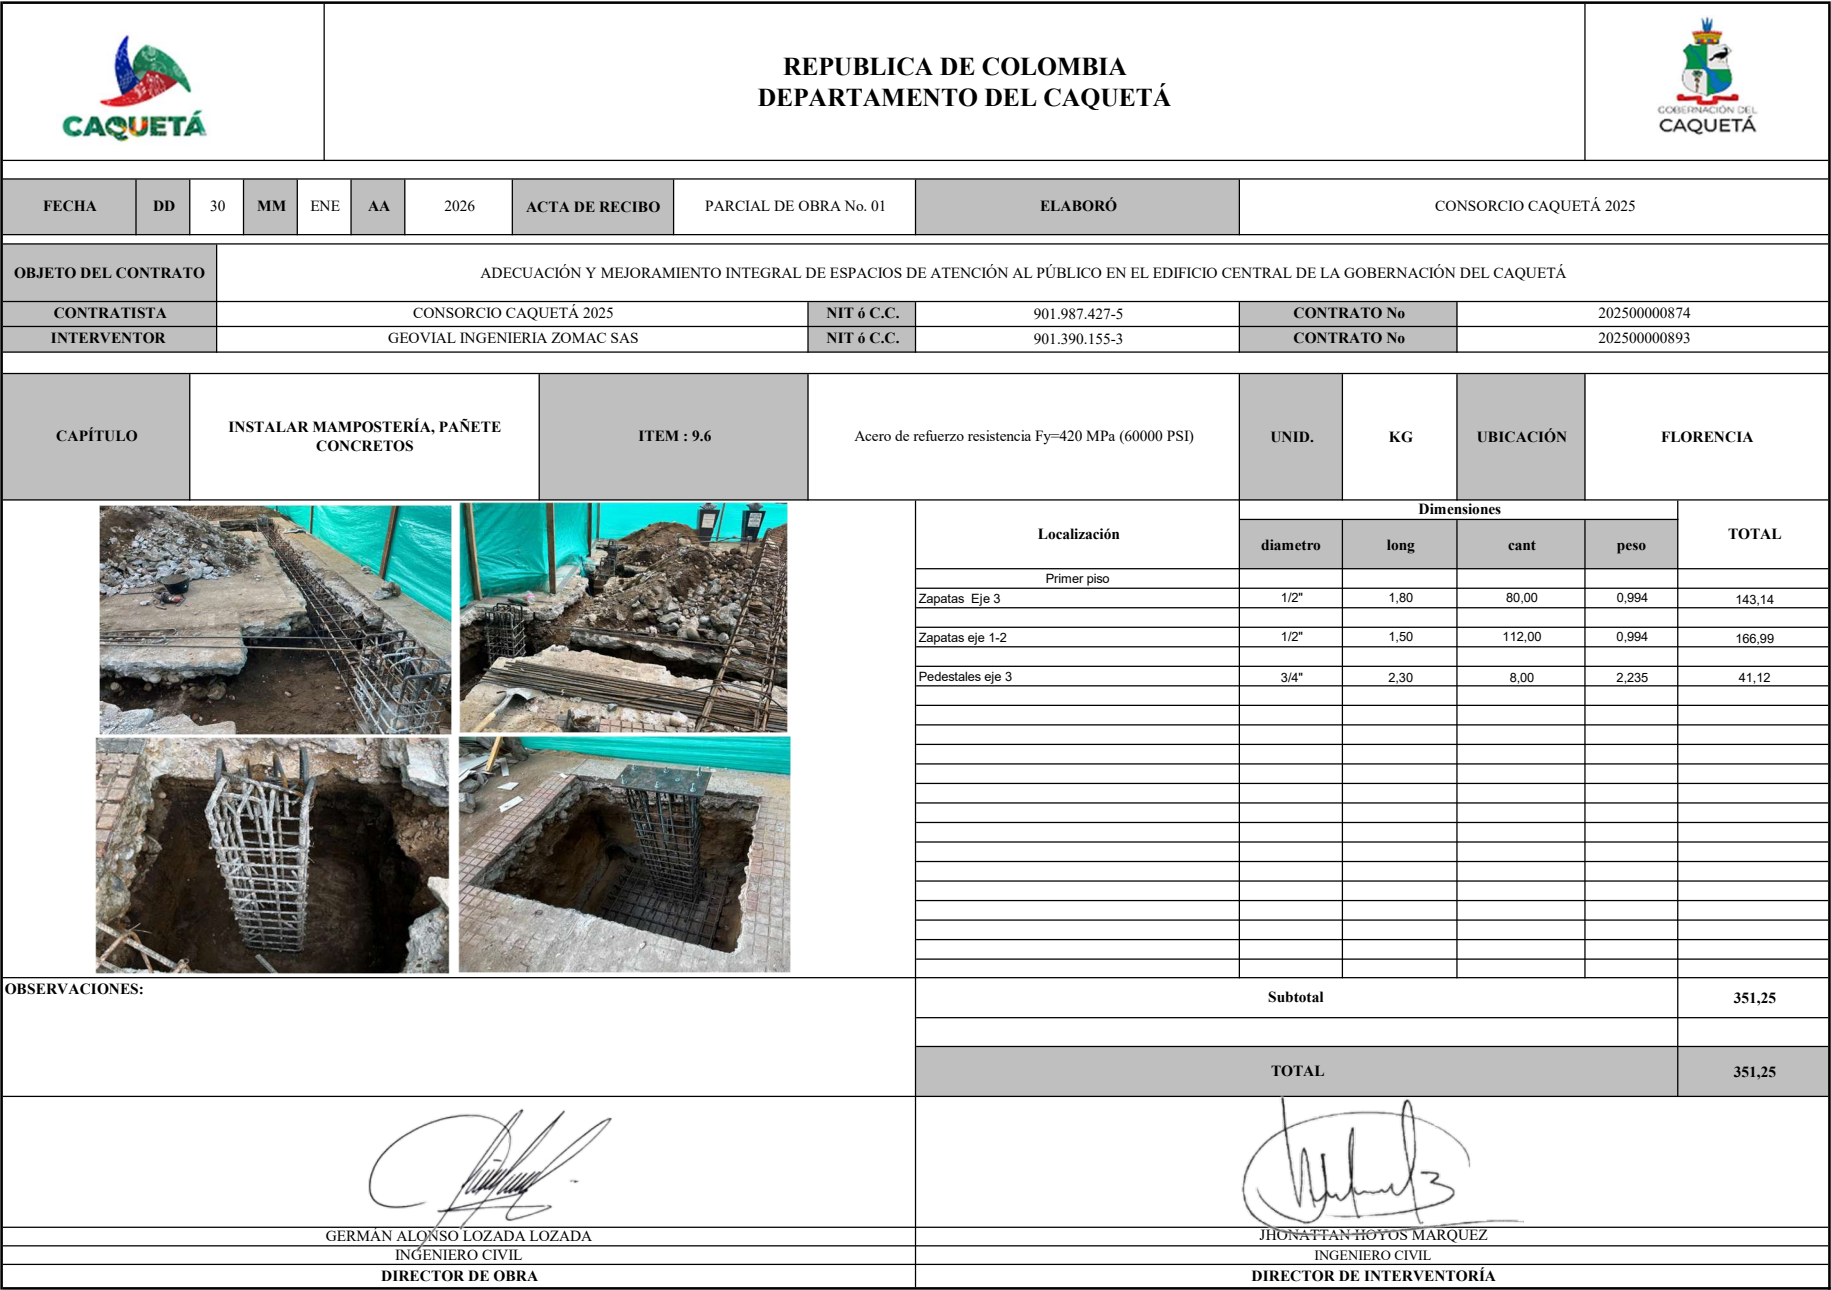



							REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ							
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT 6 C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874				
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT 6 C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893				
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 10.3		Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.			UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA		
						Localización		Dimensiones				TOTAL		
								Largo	ancho	profundidad	No. Elementos			
						Primer piso								
						Talento Humano					1,00	1,00		
						Tesorería					1,00	1,00		
						Secretarías					1,00	1,00		
OBSERVACIONES:						Subtotal						3,00		
						TOTAL						3,00		
 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA						 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA								




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ





FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893			
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS		ITEM : 10.5		Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador de hasta 50A y breakers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.					UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA	
					Localización	Dimensiones				TOTAL				
					Largo	ancho	profundidad	cant						
					Primer piso									
					Talento Humano				1,00	1,00				
					Tesorería				1,00	1,00				
					Secretarías				1,00	1,00				
OBSERVACIONES:					Subtotal					3,00				
					TOTAL					3,00				
 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA					 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA									

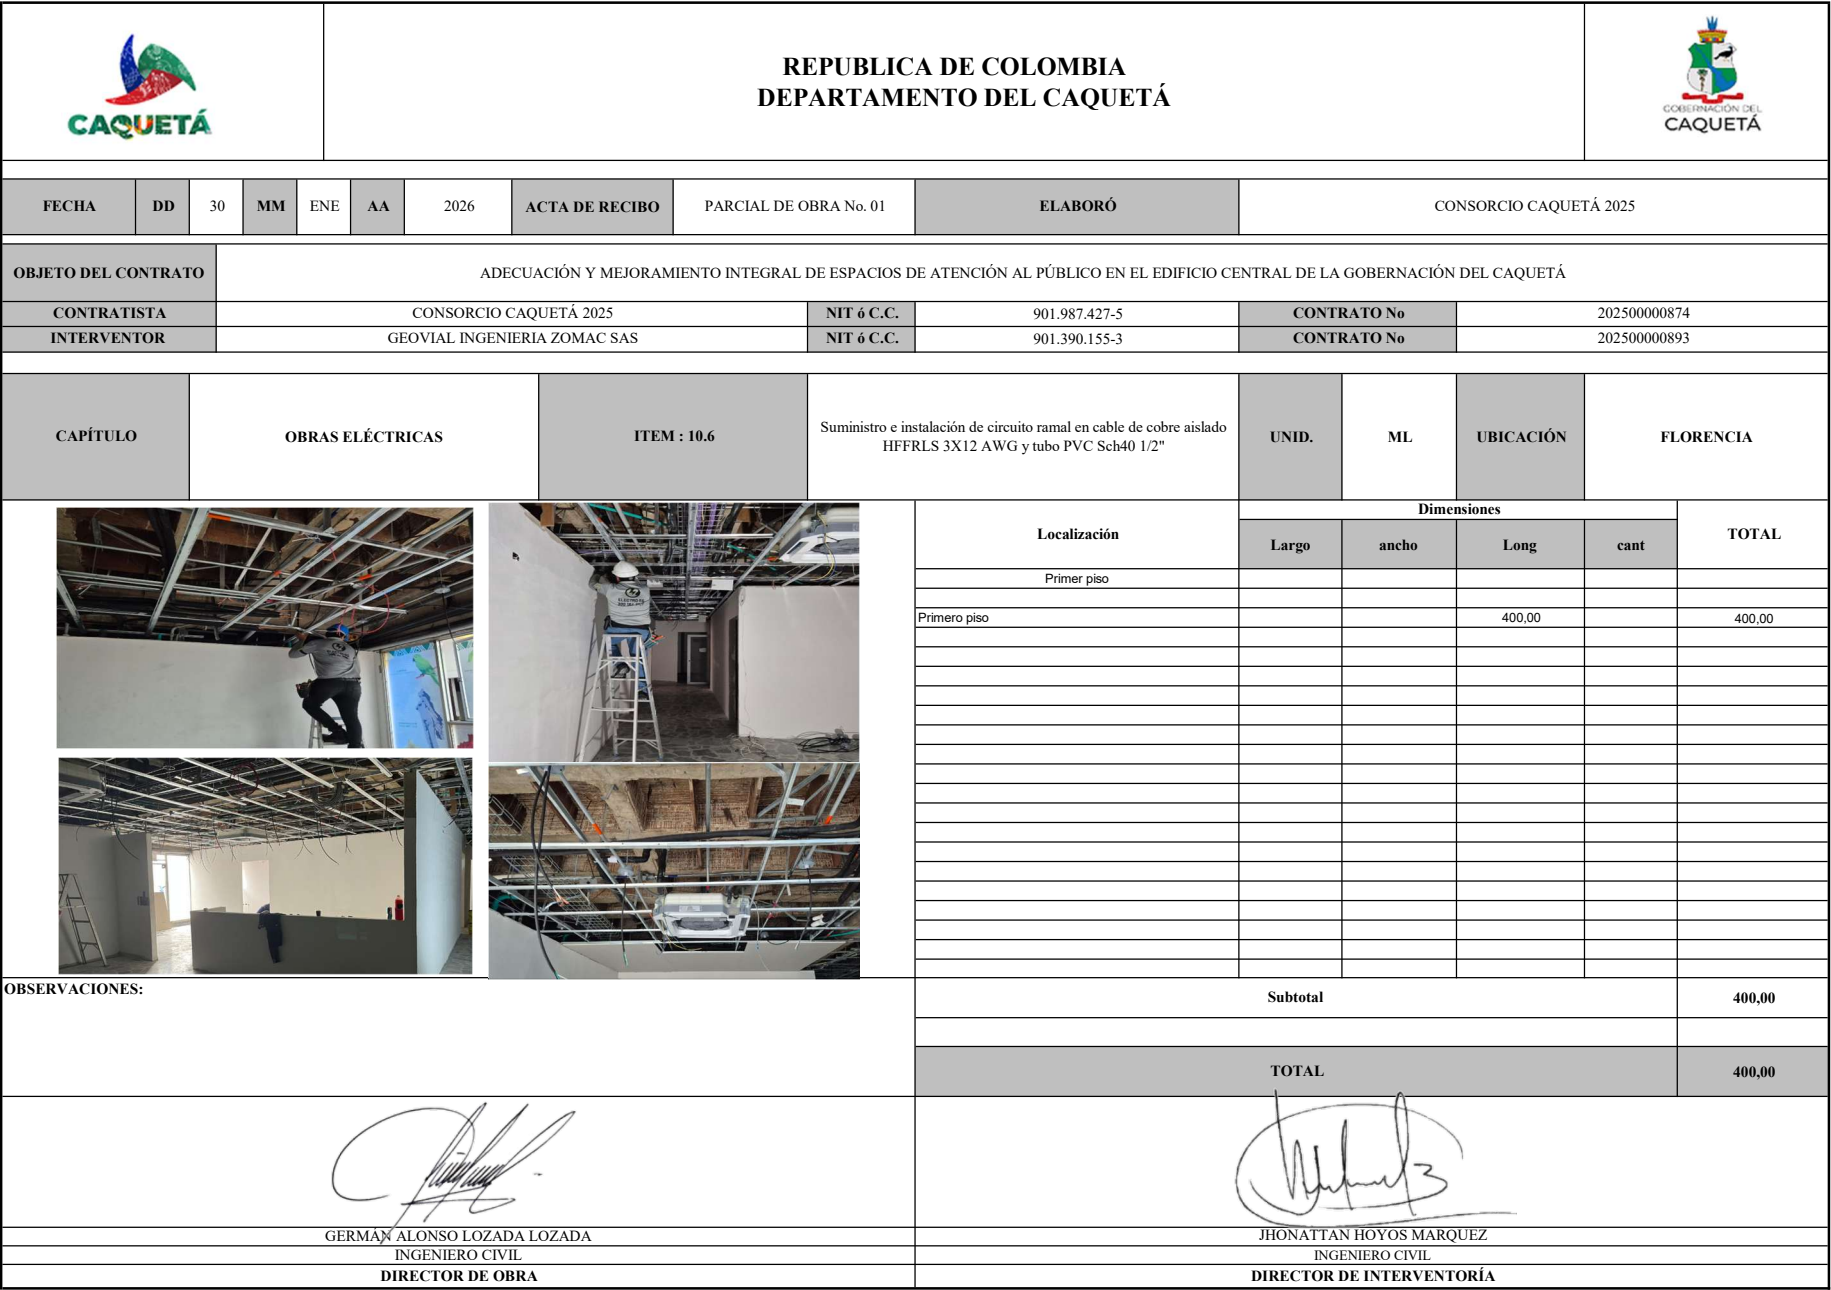

						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874	
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893	
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 10.7		Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12				UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA	
						Localización		Dimensiones				TOTAL		
								Largo	ancho	Long	cant			
						Primer piso								
						Tesorería						13,00	13,00	
						Tributaria						14,00	14,00	
						Secretarías						20,00	20,00	
						Sala de juntas						16,00	16,00	
						Contabilidad						20,00	20,00	
						Presupuesto						26,00	26,00	
						Secretaría de hacienda						10,00	10,00	
						OBSERVACIONES:								Subtotal
		TOTAL										119,00		
GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL						JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL								
DIRECTOR DE OBRA						DIRECTOR DE INTERVENTORÍA								

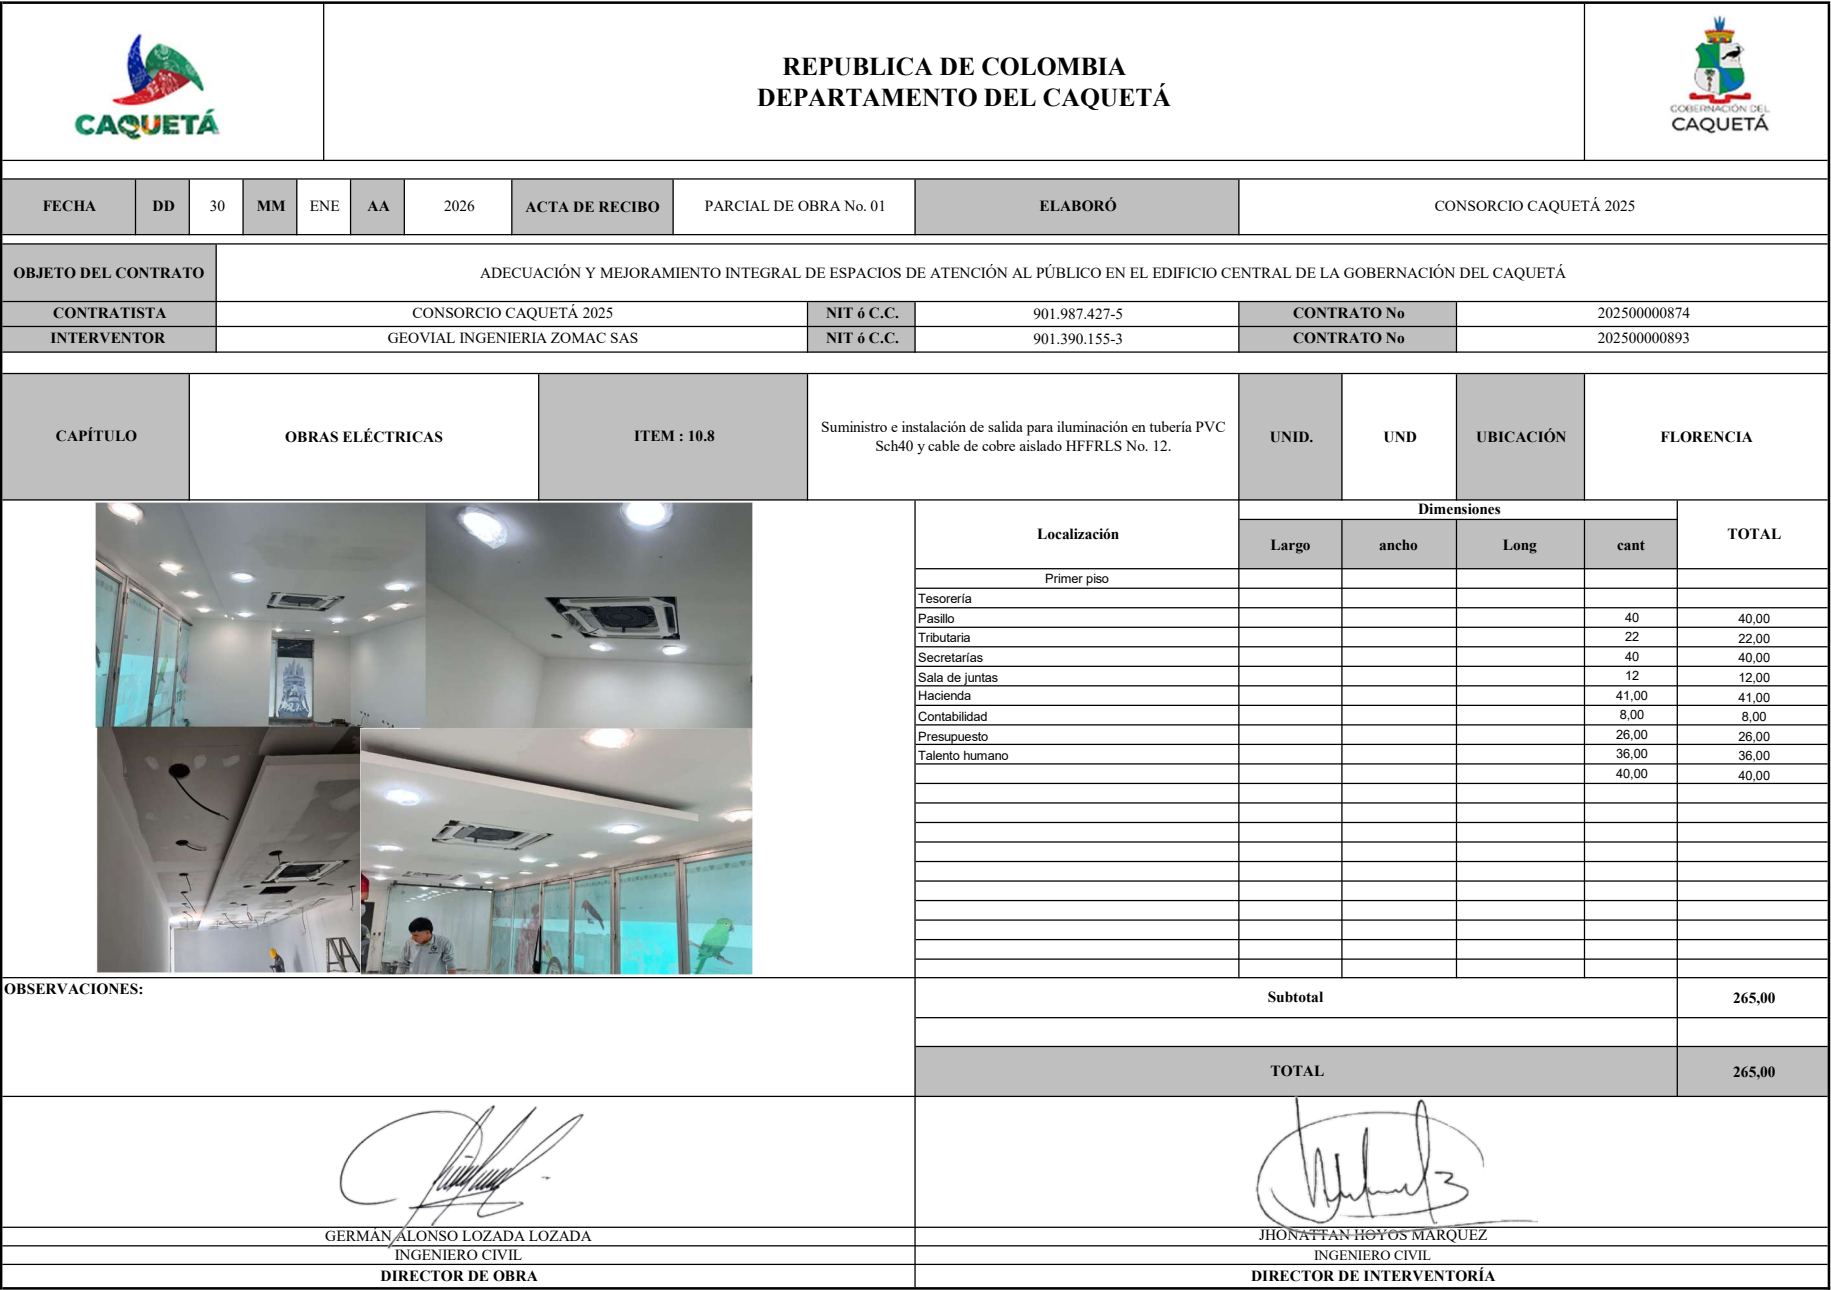

						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ							
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025			
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ											
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874	
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893	
CAPÍTULO		OBRAS ELÉCTRICAS		ITEM : 10.9		Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70				UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA
		Localización		Dimensiones				TOTAL					
				Largo	ancho	Long	cant						
		Primer piso					40	40,00					
		Tesorería					10	10,00					
		Pasillo patio					20	20,00					
		Secretaría					10	10,00					
		Tributaria					20	20,00					
		Sala dev juntas					10,00	10,00					
		Contaduría											
OBSERVACIONES:		Subtotal						110,00					
		TOTAL						110,00					
 GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA		 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA											

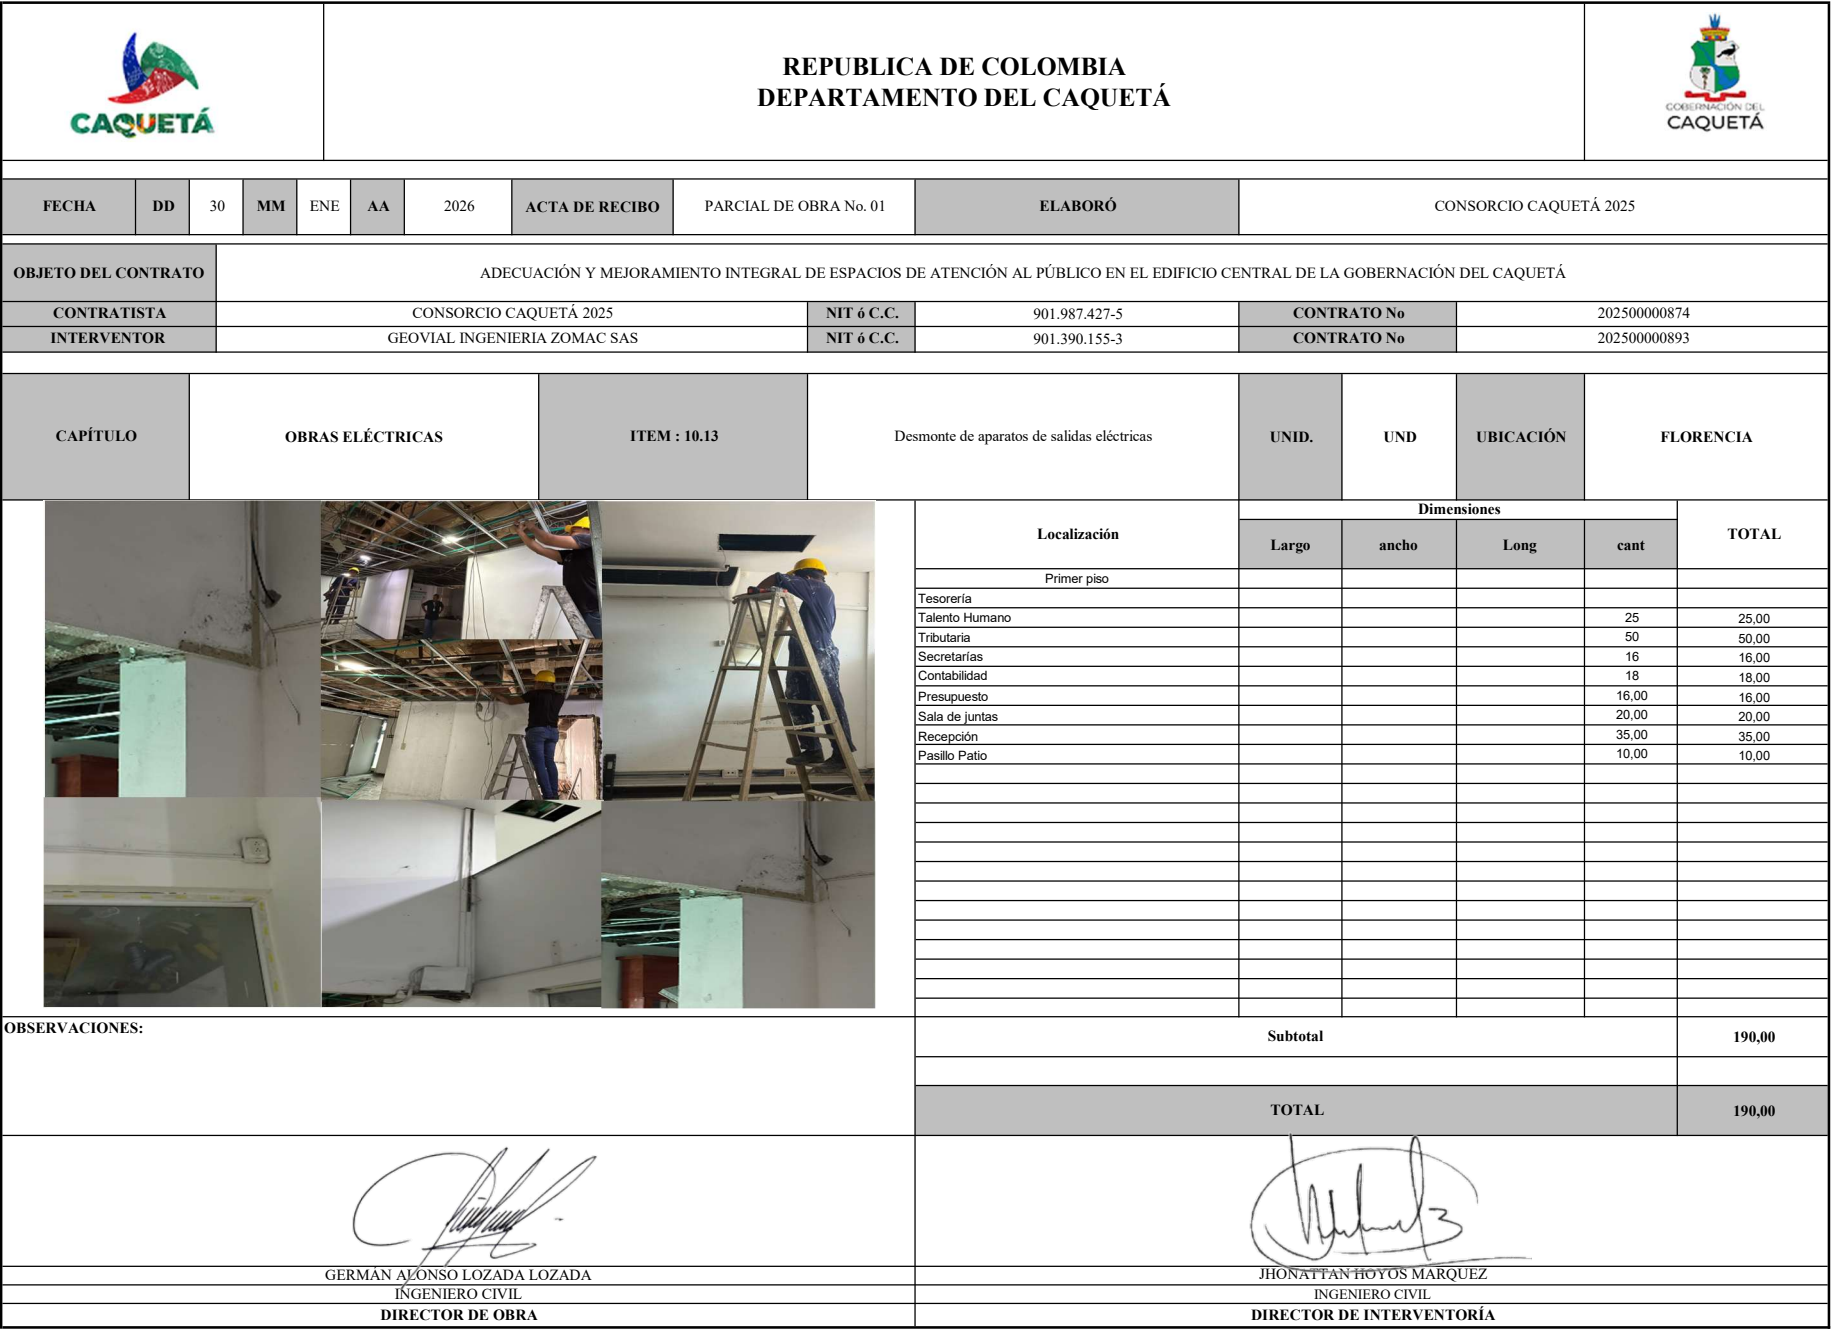






REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893			
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS		ITEM : 10.14		Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v					UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA	
		Localización		Dimensiones				TOTAL						
		Largo		ancho		Long		cant		TOTAL				
		Terraza segundo piso						7,00		7,00				
OBSERVACIONES:		Subtotal				7,00								
		TOTAL				7,00								
														
GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA		JHONATTAN HOYOS MARQUEZ												
INGENIERO CIVIL		INGENIERO CIVIL												
DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA												


						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874		
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893		
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 10.15		Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva				UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA	
		Localización		Dimensiones				TOTAL						
				Largo	ancho	Long	cant							
		Primer piso												
		Tesorería					2,00	2,00						
		Tributaria					3,00	3,00						
		Sala de juntas					1,00	1,00						
		Contabilidad					1,00	1,00						
		Presupuesto					1,00	1,00						
		Talento humano					2,00	2,00						
OBSERVACIONES:		Subtotal				10,00								
		TOTAL				10,00								
GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA						JHONATTAN HOYOS MARQUEZ								
INGENIERO CIVIL						INGENIERO CIVIL								
DIRECTOR DE OBRA						DIRECTOR DE INTERVENTORÍA								

						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893			
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 10.16		Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.			UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA		
						Localización		Dimensiones				TOTAL		
								Largo	ancho		Long	cant		
						Primer piso								
						Tesorería						1,00	1,00	
						Secretarías						1,00	1,00	
						Sala de juntas						1,00	1,00	
						Sec. Hacienda						1,00	1,00	
						Presupuesto						2,00	2,00	
						Talento Humano						1,00	1,00	
OBSERVACIONES:						Subtotal						7,00		
						TOTAL						7,00		
 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA						 JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA								

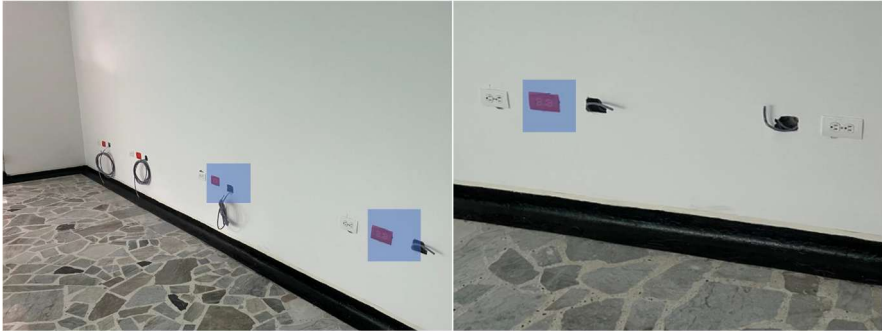						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ							
FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025			
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ											
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874	
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS				NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893	
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 10.18		Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.			UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA	
						Localización		Dimensiones				TOTAL	
								Largo	ancho	Long	cant		
						Primer piso							
						Tesorería						12,00	12,00
						Tributaria						13,00	13,00
						Sala de juntas						15,00	15,00
						Contabilidad						18,00	18,00
						Presupuesto						25,00	25,00
						Secretaría de hacienda						9,00	9,00
						Secretarías						3,00	3,00
						OBSERVACIONES:							
Subtotal												95,00	
TOTAL												95,00	
 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA						 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA							



OBSERVACIONES:	Subtotal	15,00
	TOTAL	15,00

						REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ												
FECHA		DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO		PARCIAL DE OBRA No. 01		ELABORÓ		CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025						NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874				
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS						NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893				
CAPÍTULO		OBRAS ELÉCTRICAS				ITEM : 10.20		Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2 ,TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS , 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".				UNID.	ML	UBICACIÓN	FLORENCIA			
												Localización	Dimensiones				TOTAL	
												Largo	ancho	Long	cant			
												Primer piso			150,00	150,00		
OBSERVACIONES:												Subtotal				150,00		
												TOTAL				150,00		
																		
GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA												JHONATTAN HOYOS MARQUEZ						
INGENIERO CIVIL												INGENIERO CIVIL						
DIRECTOR DE OBRA												DIRECTOR DE INTERVENTORÍA						



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ




FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025											
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																			
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874								
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893								
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 10.23			Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"			UNID.	ML	UBICACIÓN	FLORENCIA								
										Localización		Dimensiones				TOTAL					
												Largo	ancho	Long	cant						
										Primer piso											
										patio							26				26,00
										OBSERVACIONES:										Subtotal	
										TOTAL				26,00							
																					
GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA										JHONATTAN HOYOS MARQUEZ											
INGENIERO CIVIL										INGENIERO CIVIL											
DIRECTOR DE OBRA										DIRECTOR DE INTERVENTORÍA											



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ




FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ												
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.	901.987.427-5		CONTRATO No	202500000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.	901.390.155-3		CONTRATO No	202500000893			
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 10.25			Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar			UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA	
							Localización		Dimensiones				TOTAL	
									Largo	ancho	Long	cant		
							Primer piso							
							cuarto electrico					1	1,00	
							OBSERVACIONES:							Subtotal
TOTAL		1,00												
 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA							 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA							

							<div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> <div>DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</div>												
FECHA		DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO		PARCIAL DE OBRA No. 01		ELABORÓ		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ																	
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874						
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893						
CAPÍTULO		INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA			ITEM : 11.4		Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)					UNID.	KG	UBICACIÓN	FLORENCIA				
<div></div>													Localización		Dimensiones				TOTAL
															Largo	KG/ML	Long	cant	
													Plazoleta						
													IPE 300			43,26	5,96	4	1031,32
													IPE 200			22,40	2,87	2	128,58
													HEA 200			42,30	5,72	4	967,82
OBSERVACIONES:													Subtotal		2127,72				
													TOTAL		2.127,72				
<div></div> <div>GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA</div> <div>INGENIERO CIVIL</div> <div>DIRECTOR DE OBRA</div>													<div></div> <div>JHONATTAN HOYOS MARQUEZ</div> <div>INGENIERO CIVIL</div> <div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div>						



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ




FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ													
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874		
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893		
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS					ITEM : 11.8		Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"			UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA	
		Localización		Dimensiones				TOTAL							
				Largo	ancho	Long	cant								
				Primer piso											
				Pedestales Eje 1-2											
				OBSERVACIONES:								Subtotal			
								TOTAL				4,00			
 GERMAN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA								 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA							



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



FECHA	DD	30	MM	ENE	AA	2026	ACTA DE RECIBO	PARCIAL DE OBRA No. 01	ELABORÓ	CONSORCIO CAQUETÁ 2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ														
CONTRATISTA		CONSORCIO CAQUETÁ 2025					NIT ó C.C.		901.987.427-5		CONTRATO No		202500000874			
INTERVENTOR		GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS					NIT ó C.C.		901.390.155-3		CONTRATO No		202500000893			
CAPÍTULO	OBRAS ELÉCTRICAS			ITEM : 11.9			Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"			UNID.	UND	UBICACIÓN	FLORENCIA			
										Localización		Dimensiones				TOTAL
												Largo	ancho	Long	cant	
										Primer piso						
										Pedestales Eje 3					2	2,00
OBSERVACIONES:										Subtotal				2,00		
										TOTAL				2,00		
 GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA										 JHONATTAN HOYOS MARQUEZ INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA						



I.N.V. E - 408 - 13 I.N.V. E - 410 - 13

Laboratorista Nombre/Firma

Elaboró



GEOCON INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

GI - RE - CC - 027

ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO

I.N.V. E - 408 - 13 I.N.V. E - 410 - 13

EMPRESA:	CONSORCIO CAQUETÁ 2025	FECHA:	11/02/26
OBRA:	CONTRATO No. 202500000874: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DEL CAQUETA.		

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Gms)	Volumen (cm3)	Densidad (Gm/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple Si/No	Observaciones
7	08/01/26	15/01/26	7	366,2	3006	4000	4376	3"		15	30	176,7	12528	5301,5	2,363	2	75	SI	VIGA CIMENTACIÓN
8	08/01/26	22/01/26	14	444,5	3648	4000	4232	3"		15	30	176,7	12543	5301,5	2,366	2	91	SI	
9	08/01/26	05/02/26	28	513,4	4214	4000	4214	3"		15	30	176,7	12565	5301,5	2,370	3	105	SI	
10	10/01/26	17/01/26	7	370,3	3039	4000	4417	3"		15	30	176,7	12658	5301,5	2,388	2	76	SI	VIGA CIMENTACIÓN
11	10/01/26	24/01/26	14	450,8	3700	4000	4292	3"		15	30	176,7	12686	5301,5	2,393	2	92	SI	
12	10/01/26	07/02/26	28	520,5	4272	4000	4272	3"		15	30	176,7	12676	5301,5	2,391	2	107	SI	
13	14/01/26	21/01/26	7	360,1	2955	4000	4315	3"		15	30	176,7	12601	5301,5	2,377	2	74	SI	PEDESTALES
14	14/01/26	28/01/26	14	438,9	3602	4000	4179	3"		15	30	176,7	12621	5301,5	2,381	2	90	SI	
15	14/01/26	11/02/26	28	492,4	4041	4000	4041	3"		15	30	176,7	12635	5301,5	2,383	2	101	SI	

LUIS ANTONIO AVILEZ

Laboratorista Nombre/Firma

Elaboró

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649

E-mail: geoconingenieria@hotmail.com

Florencia - Caquetá

	GEOCON INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES																GI - RE - CC - 027	
	ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO I.N.V. E - 408 - 13 I.N.V. E - 410 - 13																	
	EMPRESA: GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S FECHA: 05/02/26																	
OBRA: CONTRATO No. 2022500000893: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"																		

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad días	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Gms)	Volumen (cm3)	Densidad (Gm/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple Si/No	Observaciones
1	27/12/25	03/01/26	7	373,6	3066	4000	4451	3"		15	30	176,7	12654	5301,5	2,387	3	77	SI	ZAPATAS
2	27/12/25	10/01/26	14	451,2	3703	4000	4296	3"		15	30	176,7	12723	5301,5	2,400	2	93	SI	
3	27/12/25	24/01/26	28	508,7	4175	4000	4175	3"		15	30	176,7	12731	5301,5	2,401	2	104	SI	
4	02/01/26	09/01/26	7	359,1	2947	4000	4304	3"		15	30	176,7	12709	5301,5	2,397	2	74	SI	ZAPATAS
5	02/01/26	16/01/26	14	437,6	3592	4000	4166	3"		15	30	176,7	12701	5301,5	2,396	2	90	SI	
6	02/01/26	30/01/26	28	525,7	4315	4000	4315	3"		15	30	176,7	12723	5301,5	2,400	3	108	SI	
7	08/01/26	15/01/26	7	372,8	3060	4000	4443	3"		15	30	176,7	12535	5301,5	2,364	3	76	SI	VIGA CIMENTACIÓN
8	08/01/26	22/01/26	14	441,8	3626	4000	4206	3"		15	30	176,7	12559	5301,5	2,369	2	91	SI	
9	08/01/26	05/02/26	28	516,9	4242	4000	4242	3"		15	30	176,7	12582	5301,5	2,373	2	106	SI	



Elaboró	LUIS ANTONIO AVILEZ
	Laboratorista Nombre/Firma

	GEOCON INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES																GI - RE - CC - 027			
	ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO I.N.V. E - 408 - 13 I.N.V. E - 410 - 13																			
	EMPRESA: GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S																FECHA: 11/02/26			
OBRA:		CONTRATO No. 2022500000893: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"																		

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad días	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Gms)	Volumen (cm3)	Densidad (Gm/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple Si/No	Observaciones
10	10/01/26	17/01/26	7	375,8	3084	4000	4473	3"		15	30	176,7	12599	5301,5	2,377	2	77	SI	VIGA CIMENTACIÓN
11	10/01/26	24/01/26	14	452,6	3715	4000	4309	3"		15	30	176,7	12601	5301,5	2,377	2	93	SI	
12	10/01/26	07/02/26	28	526,1	4318	4000	4318	3"		15	30	176,7	12634	5301,5	2,383	2	108	SI	
13	14/01/26	21/01/26	7	367,8	3019	4000	4392	3"		15	30	176,7	12645	5301,5	2,385	2	75	SI	PEDESTALES
14	14/01/26	28/01/26	14	441,0	3619	4000	4199	3"		15	30	176,7	12667	5301,5	2,389	2	90	SI	
15	14/01/26	11/02/26	28	501,4	4115	4000	4115	3"		15	30	176,7	12687	5301,5	2,393	2	103	SI	



Elaboró	LUIS ANTONIO AVILEZ
	Laboratorista Nombre/Firma
