



INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No. 47

LOTE COP No.18



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEMANA N°

47

DEL

24/08/2026

AL

30/08/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato

331

días

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

CO1.PCCNTR.8168931

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°

CO1.PCCNTR.8155350

LOTE COP

18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	GAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"NO ELABORAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.551.797.866.00
AU	33.17%
COSTO DIRECTO	\$ 1.705.306.380.19
OFERTADO	\$ 2.332.866.487.00
EMERGENCIAS	\$ 100.000.000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$ 2.432.866.487.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$ 128.932.199.50
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$ 258.932.199.50
Valor adicional No. 1:	\$ 645.761.548.00
Valor adicional No. 1 emergencias:	\$ 200.000.000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	\$ 445.761.548.00
Valor adicional No. 2:	\$ 481.699.955.00
Valor adicional No. 2 emergencias:	\$ 200.000.000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	\$ 281.699.955.00
Valor adicional No. 3:	\$ -
Valor adicional No. 3 emergencias:	\$ -
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	\$ -
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3.969.259.269.50
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$ 638.932.199.50
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$ 3.630.327.070.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/01/2027


INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de Interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	\$ 796.278.922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$ 136.026.666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$ 219.541.737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.154.847.325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/01/2027

AVANCE DEL CONTRATO

Obra Programada (%)	SEMANAL	1.50%	ACUMULADO	100.00%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	0.01%	ACUMULADO	98.07%
Valor de la Obra Programada:	\$	45.317.164.00	\$	3.969.078.848.00	Valor de la Obra Ejecutada:	\$	303.033.00	\$	3.692.652.565.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	98.50%	98.06%	
Durante el periodo	1.50%	0.01%	-1.93%
Acumulado actual	100.00%	98.07%	

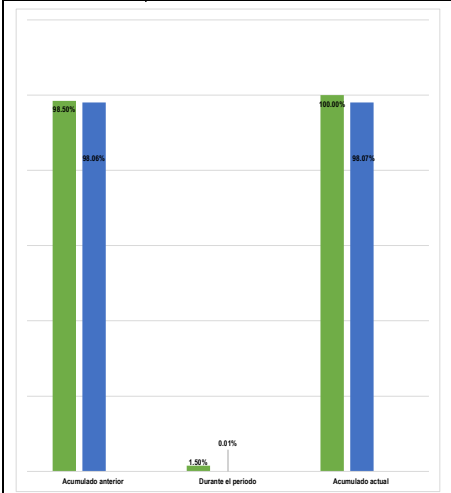

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTERES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1086	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JOSÉ GANTAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTERES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTERES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TELSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1032	ENGATIVA	BERNARDO DE CORTES - SEDE B	0.00%	0.11%	-16.34%	100.00%	99.77%	-21.27%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES ADICION No. 02			0.00%	0.06%	-8.17%	100.00%	99.37%	-19.64%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			1.50%	0.01%	-1.49%	100.00%	98.07%	-1.93%
EMERGENCIAS Y OBRAS PRIORITARIAS								
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 1.202.176.38		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 34.970.364.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 12.894.594.56		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 2.867.866.44		
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	\$ 23.666.324.45		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 6.347.316.24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 16.445.268.58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGLIA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 126.636.146.95		
1080	ENGATIVA	LUCILIA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 5.668.378.00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	85.00%	85.00%	0.00%	\$ 104.218.947.00		
ENGATIVA	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE B	70.00%	70.00%	0.00%	\$ 10.066.280.00		
1016	ENGATIVA	JOSÉ GANTAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 98.338.909.00		
ENGATIVA	ENGATIVA	SAN JOSÉ NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 90.938.420.00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 6.823.040.00		
ENGATIVA	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE A	90.00%	90.00%	0.00%	\$ 123.079.032.60		
ENGATIVA	ENGATIVA	PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 149.667.331.20		
ENGATIVA	ENGATIVA	NESTOR FORERO DE ALCALÁ - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	\$ 59.664.771.00		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y OBRAS PRIORITARIAS			73.24%	71.61%	-1.62%	\$ 676.975.263.38	\$ 638.932.199.50	\$ 62.598.635.62

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		\$	3.969.259.269,00
VALOR PARCIAL N°1	\$	401.759.151,00	
VALOR PARCIAL N°2	\$	392.605.354,00	
VALOR PARCIAL N°3	\$	419.080.656,00	
VALOR PARCIAL N°4	\$	335.248.214,00	
VALOR PARCIAL N°5	\$	340.158.088,00	
VALOR PARCIAL N°6	\$	962.858.748,00	
VALOR PARCIAL N°7	\$	267.388.536,00	
VALOR PARCIAL N°8	\$	220.148.211,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	\$	3.339.246.968,00	
SUMAS IGUALES		\$	630.012.301,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO		% DE AVANCE FINANCIERO
	\$	3.339.246.968,00	
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR		84,13%
	\$	630.012.301,00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO -
			% ADELANTO +
	100.00%	98.07%	-1.93%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DÍAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	457	-8.84

CURVA S

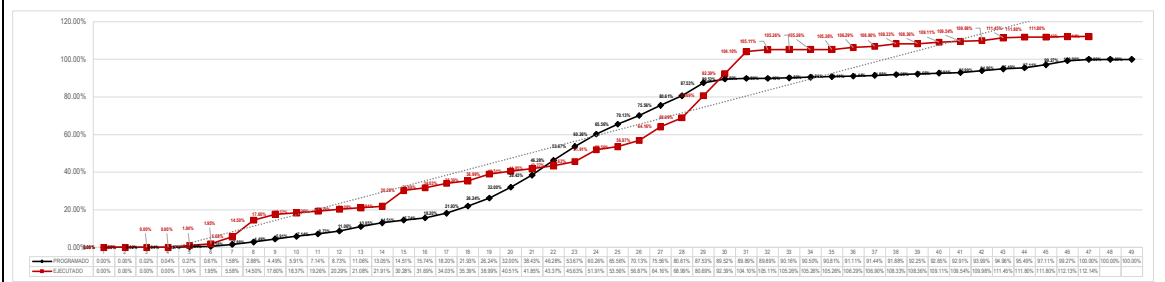

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2026	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
2	SEM 2	21/10/2026	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
3	SEM 3	28/10/2026	\$ 452,000.00	0.02%	0.00%	\$ -	\$ 452,000.00	0.02%	\$ 452,000.00	0.00%	\$ -
4	SEM 4	4/11/2026	\$ 726,000.00	0.03%	0.00%	\$ -	\$ 726,000.00	0.04%	\$ 1,178,000.00	0.00%	\$ -
5	SEM 5	11/11/2026	\$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	\$ 29,416,873.00	\$ - 23,027,622.00	0.27%	\$ 7,567,251.00	1.04%	\$ 29,416,873.00
6	SEM 6	18/11/2026	\$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	\$ 25,779,255.00	\$ - 16,158,429.00	0.61%	\$ 17,188,077.00	1.95%	\$ 55,196,128.00
7	SEM 7	25/11/2026	\$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	\$ 102,559,453.00	\$ - 75,009,262.00	1.58%	\$ 44,738,268.00	5.58%	\$ 157,755,581.00
8	SEM 8	2/12/2026	\$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	\$ 251,731,418.00	\$ - 215,239,886.00	2.88%	\$ 81,229,800.00	14.50%	\$ 409,486,999.00
9	SEM 9	9/12/2026	\$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	\$ 87,572,933.00	\$ - 41,890,856.00	4.49%	\$ 126,911,877.00	17.60%	\$ 497,059,932.00
10	SEM 10	16/12/2026	\$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	\$ 21,793,589.00	\$ - 18,107,871.00	5.91%	\$ 166,813,337.00	18.37%	\$ 518,853,521.00
11	SEM 11	23/12/2026	\$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	\$ 25,093,898.00	\$ - 9,806,811.00	7.14%	\$ 201,714,046.00	19.26%	\$ 543,947,419.00
12	SEM 12	30/12/2026	\$ 44,803,303.00	1.59%	1.03%	\$ 29,099,062.00	\$ - 15,704,241.00	8.73%	\$ 246,517,349.00	20.29%	\$ 573,046,481.00
13	SEM 13	6/01/2027	\$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	\$ 22,343,565.00	\$ - 43,447,367.00	11.06%	\$ 312,308,281.00	21.08%	\$ 595,390,046.00
14	SEM 14	13/01/2027	\$ 56,247,989.00	1.99%	0.83%	\$ 23,469,005.00	\$ - 32,778,984.00	13.05%	\$ 368,556,270.00	21.91%	\$ 618,859,051.00
15	SEM 15	20/01/2027	\$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	\$ 236,488,719.00	\$ - 195,253,991.00	14.51%	\$ 409,790,998.00	30.28%	\$ 855,347,770.00
16	SEM 16	27/01/2027	\$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	\$ 39,956,792.00	\$ - 4,998,002.00	15.74%	\$ 444,749,788.00	31.69%	\$ 895,304,562.00
17	SEM 17	3/02/2027	\$ 69,362,324.00	2.46%	2.34%	\$ 66,086,806.00	\$ - 3,275,518.00	18.20%	\$ 514,112,112.00	34.03%	\$ 961,391,368.00
18	SEM 18	10/02/2027	\$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	\$ 38,340,595.00	\$ - 67,001,791.00	21.93%	\$ 619,454,498.00	35.39%	\$ 999,731,963.00
19	SEM 19	17/02/2027	\$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	\$ 101,726,291.00	\$ - 20,122,747.00	26.24%	\$ 741,303,536.00	38.99%	\$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	24/02/2027	\$ 162,551,206	5.75%	1.52%	\$ 42,982,940.00	\$ - 119,568,266.00	32.00%	\$ 903,854,742.00	40.51%	\$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	3/03/2027	\$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	\$ 37,731,200.00	\$ - 144,068,779.00	38.43%	\$ 1,085,654,721.00	41.85%	\$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	10/03/2027	\$ 221,633,716	7.85%	1.52%	\$ 42,847,295.00	\$ - 178,786,421.00	46.28%	\$ 1,307,288,437.00	43.37%	\$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	17/03/2027	\$ 208,747,364	7.39%	2.26%	\$ 63,951,186.00	\$ - 144,796,178.00	53.67%	\$ 1,516,035,801.00	45.63%	\$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	24/03/2027	\$ 186,145,269	6.59%	6.28%	\$ 177,464,542.00	\$ - 8,680,727.00	60.26%	\$ 1,702,181,070.00	51.91%	\$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	31/03/2027	\$ 149,758,087	5.30%	1.65%	\$ 46,684,366.00	\$ - 103,073,721.00	65.56%	\$ 1,851,939,157.00	53.56%	\$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	7/04/2027	\$ 129,089,554	4.57%	3.31%	\$ 93,368,732.00	\$ - 35,720,822.00	70.13%	\$ 1,981,028,711.00	56.87%	\$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	14/04/2027	\$ 153,455,255	5.43%	7.29%	\$ 205,922,820.00	\$ - 52,467,565.00	75.56%	\$ 2,134,483,966.00	64.16%	\$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	21/04/2027	\$ 142,675,377	5.05%	4.83%	\$ 136,535,783.00	\$ - 6,139,594.00	80.61%	\$ 2,277,159,343.00	68.99%	\$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	28/04/2027	\$ 195,438,873	6.92%	11.70%	\$ 330,548,693.00	\$ - 135,109,820.00	87.53%	\$ 2,472,598,216.00	80.69%	\$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	5/05/2027	\$ 56,148,389	1.99%	11.70%	\$ 330,548,693.00	\$ - 274,400,304.00	89.52%	\$ 2,528,746,605.00	92.39%	\$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	12/05/2027	\$ 10,449,797	0.37%	11.70%	\$ 330,548,693.00	\$ - 320,098,896.00	89.89%	\$ 2,539,196,402.00	104.10%	\$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	19/05/2027	\$ -	0.00%	1.01%	\$ 28,542,222.29	\$ - 28,542,222.29	89.89%	\$ 2,539,196,402.00	105.11%	\$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	26/05/2027	\$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	\$ 4,238,766.24	\$ - 3,372,230.95	90.16%	\$ 2,546,807,399.19	105.26%	\$ 2,973,374,185.53
34	SEM 34	2/06/2027	\$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	\$ 77,556.48	\$ - 9,691,273.35	90.50%	\$ 2,556,576,229.02	105.26%	\$ 2,973,451,742.01
35	SEM 35	9/06/2027	\$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	\$ 77,556.48	\$ - 8,670,939.98	90.81%	\$ 2,565,324,725.48	105.26%	\$ 2,973,529,298.49
36	SEM 36	16/06/2027	\$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	\$ 29,141,324.08	\$ - 20,705,872.29	91.11%	\$ 2,573,760,177.27	106.29%	\$ 3,002,670,622.57
37	SEM 37	23/06/2027	\$ 9,377,523.99	0.33%	0.60%	\$ 17,088,844.05	\$ - 7,711,320.06	91.44%	\$ 2,583,137,701.26	106.90%	\$ 3,019,759,466.62
38	SEM 38	30/06/2027	\$ 12,438,524.11	0.44%	1.44%	\$ 40,567,420.99	\$ - 28,128,896.88	91.88%	\$ 2,595,576,225.37	108.33%	\$ 3,060,326,887.61
39	SEM 39	7/07/2027	\$ 10,342,404.12	0.37%	0.03%	\$ 759,662.73	\$ - 9,582,741.39	92.25%	\$ 2,605,918,629.49	108.36%	\$ 3,061,086,550.34
40	SEM 40	14/07/2027	\$ 11,368,920.36	0.40%	0.74%	\$ 21,019,420.25	\$ - 9,650,499.89	92.65%	\$ 2,617,287,549.85	109.11%	\$ 3,082,105,970.59
41	SEM 41	21/07/2027	\$ 7,414,110.12	0.26%	0.44%	\$ 12,298,490.01	\$ - 4,884,379.89	92.91%	\$ 2,624,701,659.97	109.54%	\$ 3,094,404,460.60
42	SEM 42	28/07/2027	\$ 30,285,878.89	1.07%	0.44%	\$ 12,458,803.48	\$ - 17,827,075.41	93.99%	\$ 2,654,987,538.86	109.98%	\$ 3,106,863,264.08
43	SEM 43	4/08/2027	\$ 27,404,109.91	0.97%	1.47%	\$ 41,599,471.97	\$ - 14,195,362.06	94.96%	\$ 2,682,391,648.77	111.45%	\$ 3,148,462,736.05
44	SEM 44	11/08/2027	\$ 14,952,840.10	0.53%	0.35%	\$ 9,829,625.97	\$ - 5,123,214.13	95.49%	\$ 2,697,344,488.87	111.80%	\$ 3,158,292,362.02
45	SEM 45	18/08/2027	\$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	\$ -	\$ - 45,762,755.02	97.11%	\$ 2,743,107,243.89	111.80%	\$ 3,158,292,362.02
46	SEM 46	25/08/2027	\$ 61,169,408.68	2.17%	0.33%	\$ 9,379,500.35	\$ - 51,789,908.33	99.27%	\$ 2,804,276,652.57	112.13%	\$ 3,167,671,862.37
47	SEM 47	1/09/2027	\$ 20,603,614.88	0.73%	0.01%	\$ 171,214.75	\$ - 20,432,400.13	100.00%	\$ 2,824,880,267.45	112.14%	\$ 3,167,843,077.12
48	SEM 48	8/09/2027	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,167,843,077.12
49	SEM 49	15/09/2027	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,167,843,077.12



\$ 2,824,880,267.45

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP'S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 47 LOTE COP No 18		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEMANA No. <u>47</u> Consecutivo	DEL <u>24/8/2026</u> dd-mm-aa	AL <u>30/8/2026</u> dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>331</u> días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155350</u> (Número de Contrato)	LOTE COP: <u>18</u>
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR			
<p>1. Actividades Técnicas: Frente de obra entregado</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se realizaron actividades de adecuación y mantenimiento en aulas, laboratorio y aula de informática, a los cuales se les realizó el cambio de cubierta. De igual manera, se efectuó el suministro e instalación de un aula modular y ejecución de carcamo en parte posterior a las aulas intervenidas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B			
<p>1. Actividades Técnicas: Frente de obra entregado</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se realizó el desmonte de las canchas existentes, seguido de actividades de excavación, conformación de subbase y ejecución de placa de concreto. Posteriormente, se efectuaron trabajos de pintura y demarcación de la cancha, incluyendo la señalización de los juegos infantiles. De igual manera, se realizó la pintura de las fachadas de todo el bloque y se ejecutó la adecuación de un cuarto de basuras y de un espacio destinado para los guardas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Frente de obra entregado</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el día 26 de mayo</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B			
<p>1. Actividades Técnicas: Las obras fueron ejecutadas y entregadas mediante acta de reunión al almacenista, sin registrarse novedades.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se realizó la instalación de una estructura metálica independiente para la cubierta de las aulas modulares, con el fin de independizar este bloque y garantizar el soporte de la cubierta mediante su propia estructura. Adicionalmente, se ejecutaron muros aligerados para dividir y aislar el área destinada a las aulas, así como la pintura interna de los salones. También se intervino el salón de archivo ubicado en la zona de oficinas, realizando trabajos de pintura.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ			
<p>1. Actividades Técnicas: De acuerdo con la visita de verificación de labores, se solicitó corregir el empalme de la tubería eléctrica e instalar un flotador eléctrico adicional en uno de los tanques de almacenamiento de agua, con el fin de generar la alerta en caso de rebosamiento de cualquiera de los dos tanques.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 47LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.47	DEL24/8/2026	AL30/8/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato331 días
Consecutivo	66-mm-aa	66-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
(Número de Contrato)			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA			
<p>1. Actividades Técnicas: Se continúa con la elaboración de muro en mampostería, armado de acero para viga y aseo</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al levantamiento de muro en mampostería, así como jornadas de orden y aseo en el frente de obra. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y las condiciones de seguridad implementadas. Asimismo, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las labores ejecutadas. De igual manera, se reiteró la importancia de continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo, garantizando el adecuado almacenamiento de materiales y herramientas, así como el retiro oportuno de residuos y escombros, con el fin de mantener condiciones seguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO) LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA) ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos y material de construcción, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Se definió que esta sede debiera encontrarse finalizada el 2 de septiembre</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO			
<p>1. Actividades Técnicas: Frente de obra entregado</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución, en consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST. La Interventoría recomienda que, en caso de requerirse el ingreso de personal para la atención de observaciones o actividades pendientes, se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo el uso adecuado de los EPP, la señalización y delimitación de las áreas de trabajo y las condiciones adecuadas de orden y aseo.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES			
<p>* LA PALESTINA - SEDE B: Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A: Ficha SAE remitida el 04 de junio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A: Ficha SAE remitida el 08 de julio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A: Ficha SAE remitida el 15 de diciembre del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* TABORA - SEDE A: Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p>			
<p>1. Actividades Técnicas:</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría</p> <p>6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVIA (DILE)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la SED de NP</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: Se ejecutaron rampas de acceso que permiten la comunicación entre la zona verde y las aulas de primera infancia, facilitando el ingreso y tránsito hacia los salones. Adicionalmente, se construyeron columnetas como elementos de soporte para las puertas de acceso a las aulas, las cuales permiten delimitar y garantizar la seguridad entre la zona verde y los espacios destinados a primera infancia.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra:</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 47 LOTE COP No 18		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEMANA No. <u>47</u> Consecutivo	DEL <u>24/8/2026</u> dd-mm-aa	AL <u>30/8/2026</u> dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>331</u> días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155350</u> (Número de Contrato)	LOTE COP: <u>18</u>
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se ejecutó actividad de desmonte de puertas existentes y suministro e instalación de puertas nuevas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato)			
1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina)			
1. Actividades Técnicas: La segunda etapa incluye una intervención eléctrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: La zona fue entregada a la institucion y a la fecha no se reportan novedades			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño)			
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realizaron actividades de actividades de pintura en electrostática y suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUCILA RUBIO LA VERDE			
1. Actividades Técnicas: Las labores ya se finalizaron 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realizó el suministro e instalación de baños portátiles como medida de contingencia ante la afectación de los baños principales de la sede			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas: La interventoría solicita al contratista realizar correcciones relacionadas con el enchape y win metálico. Se realizaron las actividades de cambio de enchape previamente solicitadas. Sin embargo, se encuentra pendiente la instalación de las divisiones, la cual se tiene prevista para la próxima semana. 2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al desmonte de puerta y cambio de enchapes en los baños de hombres y mujeres ubicados en la planta 3. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de desmonte y enchape. De igual manera, se recomendó implementar jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno de escombros, residuos y materiales producto de las actividades, con el fin de mantener condiciones seguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: 5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental 6. Generales: La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, requiriendo mayor cuidado en la ejecución. En atención a estas observaciones, se han adelantado actividades de corrección y mejora del enchape. Adicionalmente, se evidenció movimiento en las divisiones fijas, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad. Se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: 5. Ambiental: N/A 6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tubería RCI. A la espera de aprobacion de NP.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B			
1. Actividades Técnicas: Se realiza reemboquillado, junta de dilatacion y lavado de mamposteria en aula No.10 2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al reemboquillado y lavado de mamposteria en el aula 10, así como a la elaboración de junta de dilatación en la misma área. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que los materiales se encontraban adecuadamente acopiados y organizados. Sin embargo, se recomendó al contratista implementar la respectiva señalización y delimitación de los materiales acopiados, con el fin de facilitar su identificación y evitar condiciones inseguras para el personal y la comunidad educativa. Asimismo, se reiteró la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas. 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencio el retiro de los residuos y material de construcción, al igual realizo jornada de orden y aseo e implemento todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental 6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se identificó que el caudal actual no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La supervisión solicita aplazar la intervención debido a aspectos presupuestales. Por lo anterior, no se realizará la intervención en la sede hasta contar con la respectiva autorización.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A			
1. Actividades Técnicas: El día 21 de agosto se realizó una reunión con los especialistas eléctricos, en la cual se revisó la necesidad de intervención de las redes eléctricas en zonas de circulación y áreas externas. Como resultado, el contratista remitirá un NP asociado al ítem de tubería metálica IMC conduit galvanizado, requerido para la ejecución de las redes en las zonas mencionadas. Se encuentra pendiente que el contratista remita la propuesta final y el respectivo NP, con el fin de continuar con el debido proceso para su revisión y aprobación. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 47LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No. 47	DEL 24/8/2026	AL 30/8/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 días
Consecutivo	CO1.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP: 18
CONTRATO DE INTERVENTORIA No (Número de Contrato)			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. (Número de Contrato)			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realiza el desmonte de las láminas transparentes existentes en el punto fijo de la cubierta y su reemplazo mediante el suministro e instalación de policarbonato translúcido, conservando las condiciones y características requeridas para la zona.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Actividades terminada sin novedad.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección de tanques por solicitud de la supervisión.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó el suministro e instalación de piso en el área de la pérgola. De igual manera, se avanzó en el mantenimiento del cerramiento y se continuó con la aplicación de pintura en el área de contingencia.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a cada una de las actividades ejecutadas. De igual manera, se recomendó implementar jornadas de orden y aseo durante y al finalizar la jornada laboral, realizando el adecuado almacenamiento de materiales y herramientas y el retiro oportuno de residuos, con el fin de mantener condiciones seguras en las áreas intervenidas y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen medio), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Se realizan observaciones de la estructura de la pérgola, la cual debe ser rematada correctamente. De igual manera, se presentan observaciones sobre la placa ejecutada frente al aula modular, debido a la presencia de una caja que genera un desnivel y puede ocasionar tropiezos, representando una condición de riesgo. Se solicita realizar el ajuste correspondiente para garantizar una superficie segura y adecuada para la circulación.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó visita conjunta con la supervisión, interventoría y obra, en la cual se definieron la ubicación y las condiciones para la instalación del cerramiento. La supervisión informó que notificará con anticipación la fecha de evacuación de los habitantes del lote, con el fin de que el contratista coordine el ingreso temprano del material y este se encuentre disponible en sitio para iniciar oportunamente la instalación del cerramiento rígido. De igual manera, se estableció la instalación de concertina sobre el cerramiento, el cual contará con dos puertas, así como la disposición de un baño y campamento.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: El lote actualmente presenta ocupación informal, por lo que posterior al retiro de la población que habita el espacio se realizara cerramiento.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA - SEDE C			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó visita de verificación conjunta contratista e interventoría en compañía de la coordinadora y se levanta acta de vecindad</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
Se realizó mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervisión con el fin de unificar criterios entre las partes y así radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.			
ANEXOS			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FIRMAS			
 ARQ. LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA	 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ARQ. PAULA ANDREA MARTÍNEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN ESPECIALISTA AMBIENTAL	 ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	 ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRÁULICO	 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	
 DRA. SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ ASESOR JURÍDICO			

 PROBINTEC S.A.S.	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 47</div> <div>LOTE COP No 18</div>	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
<div>SEMANA No. 47</div> <div>DEL 24/8/2026 AL 30/8/2026</div> <div>Consecutivo</div> <div>dd-mm-aa</div> <div>dd-mm-aa</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931</div> <div>(Número de Contrato)</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350</div> <div>(Número de Contrato)</div> <div>LOTE COP: 18</div>			
ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A			
 <p>26 de agosto de 2026 87a-60 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</p>		 <p>24 de agosto de 2026 8618 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</p>	
Corte, desmonte y sustitución de un tramo de malla eslabonada deteriorada en el cerramiento perimetral (0.80 X 2.50).		Se realiza la fabricación in situ de la tapa de concreto reforzado y la fijación del marco metálico para una caja de inspección de alcantarillado.	
 <p>26 de agosto de 2026 87a-60 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</p>		 <p>27 de agosto de 2026 8618 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</p>	
Ejecución de segunda mano de pintura tipo vinilo sobre muros interiores en el área del aula múltiple, previa preparación de superficie y resanes puntuales.		Replanteo, figuración e instalación de piso en tablón de gres (0.30 X 0.30) sobre placa de contrapiso en el área de la pérgola metálica.	



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 36 24/8/2026 AL 30/8/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Levantamiento de muro en mampostería



Armado de estructura y formaletas para fundida de viga de amarre



Relleno perimetral al muro



Limpeza de area y retiro de escombros



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 DEL 24/8/2026 AL 30/8/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO SEDE A



Retiro de la hilada de ladrillo a la vista adosada a la cara inferior de la viga de concreto reforzado para permitir la junta de dilatación



Afinado y reposición de junta de mortero en muros de ladrillo a la vista que presentaban desgaste o faltantes de pega.



Elaboración de junta de dilatación en el aula 10.

 PROBINTEC S.A.S.	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 47</div> <div>LOTE COP No 18</div>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
<div>SEMANA No. 47</div> <div>DEL 24/8/2026 AL 30/8/2026</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350</div> <div>LOTE COP: 18</div>			
ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUAN DE CORRAL SEDE A			
 <p>24 de agosto de 2026 69-7 Avenida Calle 80 Engativá Bogotá Cundinamarca IED Colegio Juan del Corral</p>		 <p>27 de agosto de 2026 # 69-15 Calle 79a Engativá Bogotá, D.C. IED Colegio Juan del Corral</p>	
Desmonte de puerta y reposición de enchape en los baños de la planta 3		Instalación total de enchape en baño del polideportivo	
