

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780	VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--

Acta No:	11	Tema:	Comité Obra Contrato 2025-2780
Fecha:	21/04/2026	Ubicación:	Calle 74 No 20c-04
Hora Inicio:	02:00 PM	Hora Fin:	04:00 PM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato No. 2025-2780
Agenda	1. Presentación y registro de asistencia 2. Temas para desarrollar en el comité 3. Varios 4. Conclusiones

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

No.	Descripción	Responsable	Estado
1	El Contratista deberá gestionar el cierre formal de los PMT que no serán ejecutados, mediante la emisión de comunicación oficial (radicado) en la cual se certifiquen los sitios efectivamente entregados a la fecha. (relacionar correo enviado el 19/03/2026 asunto: compromisos comité quincenal)	Contratista	No cumplió
2	Se deberá emitir notificación formal al predio ubicado en la intersección TV 42 x CL 4A (costado suroccidental, restaurante Tres Cerditos), informando el sellamiento del ducto que actualmente descarga aguas residuales hacia la caja de semaforización. La notificación será expedida por CBM, copia a CMC y SDM	Contratista	Cumplido
3	Se deberá solicitar a la Supervisión del contrato (equipos GICE) la definición de los parámetros e información técnica que deberán contener los códigos QR asociados a los elementos instalados.	Interventoría	Cumplido
4	El Contratista deberá elaborar y remitir a la Interventoría un cuadro consolidado que detalle el personal asignado en cada una de las intersecciones actualmente activas, y por iniciar de acuerdo con el cronograma y a los tiempos establecidos de cada intersección.	Contratista	No cumplió
5	El Contratista deberá incrementar el personal en obra, garantizando la asignación de inspectores permanentes por intersección y el fortalecimiento del personal operativo en los frentes activos.	Contratista	No cumplió
6	El Contratista deberá dar respuesta y atender las observaciones formuladas al informe mensual de febrero de 2026 (emitidas el 12/02/2026).	Contratista	Cumplido

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780	VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--

7	Gestionar de manera prioritaria el cruce de información y conciliación del corte de obra correspondiente a dicho periodo	Contratista / Interventoría	No cumplido
8	La Interventoría deberá realizar la valorización de los mantenimientos pendientes, incluyendo actividades de perforación dirigida, y remitir el respectivo soporte técnico y económico.	Interventoría	Cumplido

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación y registro de asistencia

Se registró la asistencia a la reunión en el listado de asistencia (se adjunta listado de asistencia).

2. Temas para desarrollar en el comité

La Interventoría presentó el informe actualizado de compromisos, identificando el no cumplimiento de todos los compromisos que se tenían del comité pasado.

Avance de cada una de las intersecciones verificando una a una el avance que se tiene de ejecución a la fecha y pactando con el Contratista fechas de entrega en los complementos que se tiene retraso.

PMT - TRÁNSITO

✓ PMT General

A la fecha del 21 de abril de 2026, por PMT general se tuvo aprobado por SDM las siguientes intersecciones:

Tabla 1. PMT General aprobados a la fecha

FECHA DE SOLICITUD	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	COI - APROBADO	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
10/04/2026	17	1169	AK 9 X AC 134	Usaquén	Aprobado por SDM	16	16/04/2026	17-abr-26	30-abr-26
10/04/2026	-	-	AK 50 X CL 63	Teusaquillo	Aprobado por SDM	16	16/04/2026	17-abr-26	30-abr-26
12/03/2026	447	2735	TV 21 X DG 45D	Teusaquillo	Plazo Finalizado	12	19/03/2026	20-mar-26	9-abr-26
12/03/2026	1172	1001	KR 11 X CL 66	Chapinero	Plazo Finalizado	12	19/03/2026	20-mar-26	9-abr-26
12/03/2026	-	-	AK 50 X CL 63	Teusaquillo	Plazo Finalizado	12	19/03/2026	20-mar-26	9-abr-26
12/03/2026	17	1169	AK 9 X AC 134	Usaquén	Plazo Finalizado	12	19/03/2026	27-mar-26	9-abr-26
12/03/2026	162	1010	AK 7 XCL 70	Chapinero	Plazo Finalizado	12	19/03/2026	25-mar-26	1-abr-26

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

✓ **PMT Específicos**

A la fecha del 21 de abril de 2026, el estado de los PMT específicos es el siguiente:

Tabla 2. PMT estado PMT específicos autorizados por la entidad, otros en revisión y con observaciones

TIPO DE OBRA	CANTIDAD	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORIA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO	COI -APROBADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	COI 14	COI 15	COI 16	COI 17	COI 18	
													ABRIL					
													2/04/2026	9/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	30/04/2026	
NUEVAS	2	1927	2184	KR 100 XCL 18	Fontibón	18/02/2026	202661200641872	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		759	1176	KR 70GXCL 72	Engativá	9/01/2026	202661200096562	9/01/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
COMPLEMENTOS	14	477	2735	TV21XDG45D YCL 45CBIS	Teusaquillo	26/02/2026	202661200860232	5/03/2026	Aprobado por SDM	13	27-mar-26	30-abr-26						
		354	2749	KR 19A XAC 63	Barrios Unidos	3/03/2026	202661200839302	4/03/2026	Aprobado por SDM	11	13-mar-26	30-abr-26						
		424	2152	KR 24 XAC 63	Barrios Unidos	8/01/2026	202661200663662	19/02/2026	Aprobado por SDM	10	6-mar-26	30-abr-26						
							202661200099822											
		404	2762	KR 17 XAC 32	Teusaquillo	16/01/2026	202661200708542	23/02/2026	Aprobado por SDM	10	6-mar-26	30-abr-26						
							202661200247352											
		203	1002	KR 11XCL 69	Chapinero	18/02/2025	202661200642372	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		589	1359	KR 68 H XAC 72	Engativá	18/02/2026	202661200644782	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		670	1372	KR 77 A x AC 72	Engativá	18/02/2026	202661200649052	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		274	2056	KR 13 XCL 50	Chapinero	16/01/2026	202661200189852	17/01/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		298	2132	KR 16 XAC 63	Teusaquillo	18/02/2026	202661200647782	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		318	2132	KR 17 XAC 63	Teusaquillo	18/02/2026	202661200647782	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		857	2918	KR 103 A XCL 17	Fontibón	18/02/2026	202661200646152	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		1167	2961	KR 121XCL 64	Engativá	18/02/2026	202661200649492	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
354	1151	AK 24 XCL 66	Barrios Unidos	18/02/2026	202661200648452	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26								
213	1002	KR 11XCL 67	Chapinero	18/02/2025	202661200642372	18/02/2026	Aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26								
COMPLEMENTOS	2	267	2055	KR 13 XCL 53	Chapinero	18/02/2026	202661200646742	18/02/2026	PMT sin Cancelar-aprobado por SDM	9	27-feb-26	30-abr-26						
		432	2762	KR 16 XAC 32	Teusaquillo	16/01/2026	202661200708542 202661200247352	23/02/2026	PMT sin Cancelar-aprobado por SDM	10	6-mar-26	30-abr-26						
COMPLEMENTOS	2	297	1029	KR 20 XCL 69	Barrios Unidos	18/02/2026	202661200647232	18/02/2026	La SDM da por terminado los PMT autorizados en el coi09-26-con radicado sdm-202661201084782	14								
		282	1029	KR 19 XCL 69	Barrios Unidos	18/02/2026	202661200647232	18/02/2026	La SDM da por terminado los PMT autorizados en el coi09-26-con radicado sdm-202661201084782	14								
							PMT Aprobado por SDM											
							PMT Sin Cancelar											
							PMT Negado por SDM											

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

✓ **Seguimientos a PMT**

- Mediante comunicado SEM-CMC-CBM-238-26, radicado ORFEO n° 202661201384872 del 15 de abril de 2026 y comunicado SEM-CMC-CBM-245-26, radicado ORFEO n° 202600000176812 del 17 de abril de 2026, se requirió formalmente al Contratista del Consorcio Belzcon la remisión de las copias de los oficios pendientes de respuesta a la SDM-SPMT sobre incumplimientos de PMTs, los cuales se han solicitado reiteradamente una y otra vez en los comités pasados (quincenal y mensual) y a la fecha aún continúan pendientes de responder por el Contratista.
- Según el registro fotográfico mostrado en la presente reunión por la interventoría del contrato, a la fecha se encuentra pendiente subsanar por parte del Contratista del Consorcio Belzcon, los cerramientos de poli sombra derrumbados y recoger los escombros acumulados en las siguientes intersecciones: EXT_1151 - KR 24 con CL 66, EXT_1001 – KR 11 con CL 66 y CL 67 y EXT_2749 - KR 19A X AC 63. Se solicita al Contratista mañana mismo 22/04/2026 corregir esta situación en terreno y reportar a los inspectores de interventoría en cada uno de estos frentes.
- Por parte de interventoría se deja constancia que mediante comunicado SEM-CMC-CBM-257-26 del 21 de abril de 2026, radicado ORFEO n° 202661201462982, se solicitó formalmente al Contratista del Consorcio Belzcon iniciar de manera inmediata los trámites correspondientes ante el IDU para la obtención de las **actas de recibo de espacio público y los paz y salvos ante las empresas de servicios públicos domiciliarios (ESP)**. Es importante señalar que la obtención de estos documentos constituye un requisito indispensable para el proceso de liquidación del contrato de obra pública n.° 2025-2780, a su vez para el pago de las retenciones en garantía.

EJECUCIÓN DE OBRA

Se presenta el estado actual de cada una de las intersecciones indicando en cada una que actividades se tienen pendientes, cuales se encuentran con días de atraso.

Tabla 3. Avance de obras

N.º	EXT	INTERSECCIÓN	INICIO	FECHA PROGRAMACIÓN FINALIZACIÓN	FECHA PROGRAMACIÓN FINALIZACIÓN (PLAN DE MEJORAMIENTO)	DÍAS DE ATRASO	DÍAS DE ATRASO (PLAN DE MEJORAMIENTO)	% AVANCE
INTERSECCIONES NUEVAS								
1	1162	Av Boyacá X CL 152	05/05/2025	03/09/2025		N/A		100%
2	1175	Av Cali X CL 135A	05/05/2025	06/10/2025		N/A		100%
3	1176	KR 70G X CL 72	5/05/2025	12/12/2025	24/01/2026	130	87	93%
4	2184	KR 100 X CL 18	3/06/2025	16/02/2026	31/01/2026	64	80	79%
5	2185	TV 42 X CL 4A	2/10/2025	10/12/2025	12/01/2026	98	65	100%
COMPLEMENTOS								
1	3664	AK 50 x CL 8S	7/07/2025	13/08/2025	5/01/2026	155	N/A	100%
2	3658	AK 50 x CL 2C	7/07/2025	20/08/2025	5/01/2026	148	N/A	100%
3	3660	AK 50 x CL 1G	14/07/2025	1/09/2025	19/01/2026	136	N/A	100%
4	3659	AK 50 x DG 16S	28/07/2025	1/09/2025	19/01/2026	136	N/A	100%

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780	VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--

5	2911	AK 50 x CL 5A	4/08/2025	20/09/2025	19/01/2026	117	N/A	100%
6	2950	AK 50 x CL 4F	4/08/2025	15/09/2025	5/01/2026	122	N/A	100%
7	3410	KR 56 x AC 3	1/09/2025	1/10/2025	29/12/2025	106	N/A	100%
8	1564	AK 101 CL 72	25/08/2025	9/10/2025	17/01/2026	98	N/A	100%
9	2843	AV CALI x CL 23	1/09/2025	10/10/2025	29/12/2025	97	N/A	100%
10	1151	AK 24 X CL 66 (BZC) IDPC	22/09/2025	23/10/2025	31/01/2026	140	N/A	100%
11	1002	AK 11 x CL 67 - IDPC	16/10/2025	3/01/2026	24/01/2026	74	N/A	100%
12	1002	AK 11 X CL 69 (CFG) - IDPC	16/10/2025	13/01/2026	24/01/2026	98	87	89%
13	1557	KR 106 X CL 132	22/11/2025	5/12/2025	24/01/2026	86	N/A	100%
14	2057	KR 13 X CL 47 (NUE) IDPC	16/10/2025	31/01/2026	24/01/2026	123	N/A	100%
15	2057	KR 13 X CL 46	16/10/2025	31/01/2026	24/01/2026	123	N/A	100%
16	2056	KR 13 X CL 50	16/10/2025	23/02/2026	N/A	40	N/A	100%
17	1001	AK 11 X CL 66	16/10/2025	26/01/2026	N/A	85	N/A	50%
18	1359	KR 68H X AC 72	22/01/2026	04/02/2026	N/A	76	N/A	61%
19	1372	KR 77A X AC 72	25/01/2026	10/02/2026	N/A	70	N/A	43%
20	2918	KR 103A X CL 17 (NUE) – IDPC	07/04/2026*	19/02/2026	27/04/2026*	61	-6	0%
21	2735	TV 21 X DG 45 D X CL 45C BIS	09/04/2026*	28/02/2026	28/04/2026*	52	-7	22%
22	2132	KR 16 X AC 63	23/03/2026*	19/02/2026	22/04/2026*	61	-1	100%
23	2152	AK 24 x CL 63 (IDPC)	17/03/2026*	19/02/2026	18/04/2026*	61	3	47%
24	2961	KR 121 X CL 64 (CFG) – IDPC	07/04/2026*	19/02/2026	24/04/2026*	61	-3	0%
25	2762	KR 17 X AC 32	28/03/2026*	19/02/2026	28/04/2026*	61	-7	0%
26	2749	KR 19A x CL 63 (CFG) IDPC	15/03/2026*	9/02/2026	27/04/2026*	71	-6	56%
27	2132	KR 17 x AC 63 (NUE)	23/03/2026*	9/02/2026	24/04/2026*	71	-3	43%

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

*Fechas prórroga

Tabla 4. Inicio de actividades horario

HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES ACTIVAS											
Fecha	AK 11 X CL 69	AK 11 X CL 66	KR 70G X CL 72	AK 24 X CL 63	KR 68H X AC 72	KR 77A X AC 72	KR 100 X CL 18	KR 19A x CL 63	KR 17 X AC 63	TV 21 X DG 45 D X CL 45C BIS	AK 9 X CL 134 (Mantenimiento)
1 abril	8 AM	Sin actividades	8 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	9 AM	8 AM			Sin actividades
2 abril	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades			Sin actividades
3 abril	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades			Sin actividades
4 abril	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades			Sin actividades

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780		VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--	--

6 abril	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	9 AM	8 AM	INICIO 8 AM		Sin actividades
7 abril	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	9 AM	8 AM	8 AM		Sin actividades
8 abril	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	9 AM	8 AM	8 AM		Sin actividades
9 abril	Sin actividades	8 AM	8 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	9 AM	8 AM	8 AM		Sin actividades
10 abril	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	INICIO 8 AM	Sin actividades
11 abril	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	9 AM	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades
12 abril	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	10 AM	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades
13 abril	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	8 AM	8 AM	9 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	Sin actividades
14 abril	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	8 AM	8 AM	9 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	Sin actividades
15 abril	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	8 AM	8 AM	9 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	Sin actividades
16 abril	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	8 AM	9 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	Sin actividades
17 abril	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	8 AM	8 AM	9 AM	8 AM	Sin actividades	8 AM	Sin actividades
18 abril	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	9 AM	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	8 AM
19 abril	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades
20 abril	Sin actividades	Sin actividades	9 AM	Sin actividades	9 AM	9 AM	9 AM	Sin actividades	Sin actividades	10 AM	8 AM
21 abril	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	8 AM	Sin actividades	9 AM	Sin actividades	Sin actividades	8 AM	8 AM

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

- KR 70G X CL 72: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 23 de abril.
- KR 100 X CL 18: El Contratista informa que las actividades pendientes corresponden a excavaciones a cielo abierto, las cuales iniciarán el 22 de abril. Se ejecutarán en jornada nocturna con el fin de cumplir con la entrega prevista para el 27 de abril.
Se establece la necesidad de solicitar un PMT de emergencia para la intervención de calzadas, dado que el plan actualmente aprobado no presenta claridad suficiente para la ejecución de estas actividades. Así mismo, se acuerda que el 22 de abril a las 22:00 horas se realizará encuentro en sitio entre el Contratista y la interventoría para iniciar las labores.
- AK 11 X CL 67: Se informa que se ha recibido un derecho de petición relacionado con la construcción de una base ubicada en la mitad de la ciclorruta. El Contratista manifiesta que realizará la demolición de dicha base el 22 de abril y remitirá correo electrónico el jueves 23 de abril con registro fotográfico como soporte, con el fin de dar respuesta a la SDQS dentro de los términos establecidos.
- AK 11 X CL 69: Contratista indica que termina obras civiles el viernes 24 de abril.
- AK 11 X CL 66: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.
- KR 68H X AC 72: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.
- KR 77A X AC 72: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.
- KR 103A X CL 17: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.
- TV 21 X DG 45D X CL 45C BIS: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.
- AK 24 X CL 63: Contratista indica que retoma actividades el jueves 23 de abril y termina obras civiles el jueves 30 de abril.
- KR 121 X CL 64: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.
- KR 17 X AC 32: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.


- KR 19A X CL 63: Contratista indica que termina obras civiles el viernes 24 de abril.
- KR 17 X AC 63: Contratista indica que termina obras civiles el jueves 30 de abril.

El Contratista informó que ha presentado atrasos en los frentes de obra, correspondientes a las situaciones climáticas presentadas el primer trimestre del año, especialmente para los meses de marzo y abril de 2026, por lo cual plantea la posibilidad de presentar una solicitud de prórroga al menos por quince días para finalizar la ejecución de las obras.

Tabla 5. Requerimientos previos y presuntos incumplimientos

REQUERIMIENTOS PREVIOS Y PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS		
Presunto incumplimiento programación de obras según cronograma– AK 24 X CL 63 – Cto 2025-2780	SEM-CMC-CBM-248-26	202661201456602
Presunto incumplimiento programación de obras según cronograma– KR 17 X CL 32 – CTO 2025-2780	SEM-CMC-CBM-249-26	202661201457052
Presunto incumplimiento programación de obras según cronograma– KR 121 X CL 64 – CTO 2025-2780	SEM-CMC-CBM-250-26	202661201457862
Presunto incumplimiento programación de obras según cronograma– TV 21 X DG 45D X CL 45C BIS – CTO 2025-2780	SEM-CMC-CBM-251-26	202661201458362
Requerimiento previo programación de obras según cronograma – KR 103A X CL 17	SEM-CMC-CBM-252-26	202661201458662
Requerimiento previo programación de obras según cronograma – KR 17 X CL 63	SEM-CMC-CBM-254-26	202661201459942
Requerimiento previo programación de obras según cronograma – KR 19A X AC 63	SEM-CMC-CBM-255-26	202661201460742

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

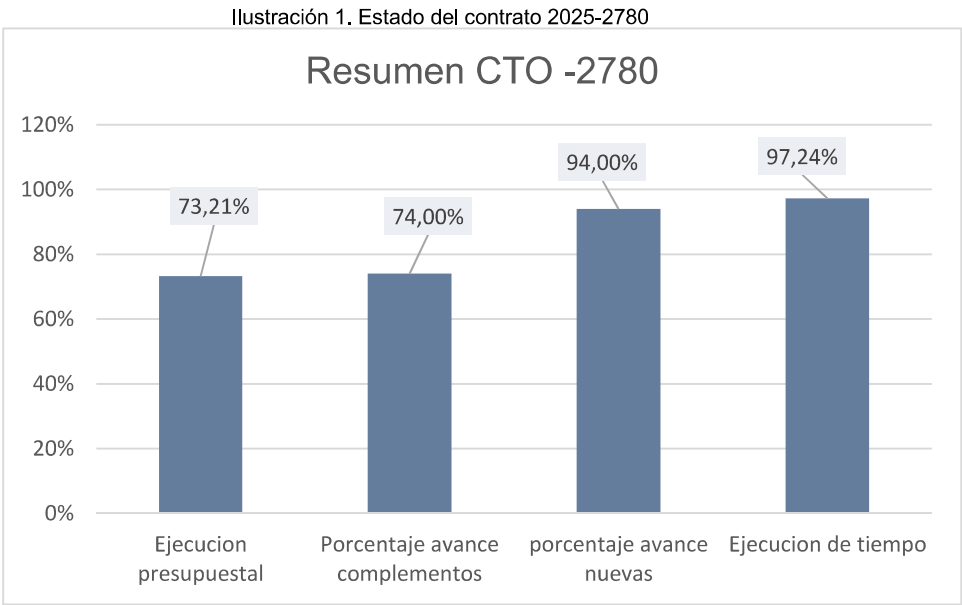

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

• **Mantenimientos**

La Interventoría Consorcio Movilidad Capital informa que, con corte al 20 de abril de 2026, se presenta el balance general de mantenimientos, el cual se detalla a continuación:

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780	VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--

Tabla 6. Balance general mantenimientos

DETALLE	CANTIDAD
Solicitados	47
Ejecutados al 20/04/26	37
Pendientes por ejecutar al 20/04/26	2
En Ejecución	1

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

*Se hace claridad que 7 mantenimientos no requieren atención, con su respectiva justificación

Ítem No.	ORDEN DE RABAJO	EXTERNO	ID	FECHA SOLICITUD	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	3	2378	608	16/06/2025	AK 36 X AC 20	Demolición cinta en concreto Limpieza de caja Instalación de marco caja sencilla con fundida de cinta Instalación de tapa sencilla antivandálica Limpieza de la AUCE	1/07/2025	Finalizado y Recibido
2	3	2912	708	16/06/2025	TV 42 AC 6	Reparar de Caja de paso deteriorada	Se encontró caja de paso en buenas condiciones	Se encontró caja de paso en buenas condiciones
3	3	1169	17	16/06/2025	AK 9 X AC 134	Verificar la subida a poste obstruida ya que la ducteria se encontró a menos de 20 cm de profundidad Se recomienda subir la base del poste y que obras civiles baje la ducteria por lo menos unos 30 cm	03/07/2025	Finalizado y Recibido
4	3	1552	671	16/06/2025	AK 104 X AC 132	Verificar canalización entre caja y caja que alimenta el flujo 5 se encuentra obstruida, las llegadas de caja a poste de los giros posibles (91, 92 y 93) se encuentran obstruidos, cámara de paso de alimentación al poste T2 del flujo 5 se encuentra inundada	22/10/2025	Finalizada inspección y verificación realizadas, dando como resultado la necesidad de definir la situación de la tubería obstruida en la base existente. Durante la inspección se evidenció obstrucción en el codo de la base; sin embargo, técnicamente no es viable efectuar la desobstrucción desde la misma base. Adicionalmente, no se cuenta contractualmente con un ítem de demolición para intervenir dicha estructura.
5	3	1304	101	16/06/2025	AK 19 X AC 116	Verificar ducteria obstruida del flujo 3	3/07/2025	Se realiza verificación de la

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780		VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--	--

								intersección basados en el diseño eléctrico, sin evidenciar obstrucción en el flujo 3. Asimismo, se efectúa la verificación de continuidad, evidenciando en sitio la existencia de caja de semaforización que permite la continuidad de la infraestructura semafórica, ya que en el diseño eléctrico se observaba una obstrucción.
6	4	1119	113	2/07/2025	AK 11 X AC 85	Se encontró daño en el cable de la cámara Narrow del flujo (4A), se realiza seguimiento al cableado y no es posible realizar correctivo por obstrucción en la tubería, es necesario correctivo por obra civil.	16/09/2025	Finalizado y Recibido
7	4	1199	106	2/07/2025	KR 9 X AC 82	Normalización de Caja de paso	22/07/2025	Finalizado y Recibido
8	4	2014	238	2/07/2025	AK 7 X CL 53	Normalización de Caja de paso	1/10/2025	Finalizado y Recibido
9	4	1148	242	2/07/2025	AK 24 X AV. MEDELLÍN	Desnivel en anden por bases de postes	N.A	Sujeto a exclusión de pólizas por parte del IDU
10	5	2380	642	12/07/2025	AK 40 X AC 20	Reparación y reposición de marco y tapas caja semaforización	14/07/2025	Finalizado y Recibido
11	6	1877	167	15/07/2025	AK 58 X CL 169B	Obstrucción de la atravesada del flujo 23	N.A	Se hace verificación en campo, evidenciando sitio operativo, conforme al seguimiento técnico-financiero del contrato presentado en el Comité Extraordinario No. 1 del 02/03/26, se establece la no ejecución del complemento mencionado, por disponibilidad presupuestal agotada.
12	6	1302	79	15/07/2025	AK 19 X AC 134	Se requieren actividades de mantenimiento para su implementación. Se requiere mantenimiento por ductos y cajas obstruidos (Ver inspección de canalizaciones eléctricas), se debe garantizar que todo el circuito de	30/12/2025	Finalizado y Recibido

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780		VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--	--

						<p>canalización sea funcional, y las bases existentes sin uso sean aprovechables. Demoler bases existentes que no se van a usar en el escenario futuro. En el enlace encuentran última inspección de canalizaciones y esquema de complemento. Se encuentra cámara de paso Enel Colombia obstruida en separador del flujo 7 costado izquierdo, es necesario grupo de obra civil para dejarla habilitada ya que esa Cámara de paso es esencial, ya que el cableado de la mitad de la intersección pasa por esa cámara de paso. Se encontró daño en el cable de las cámaras Wide de los flujos (1, 2 y 4), no se logra realizar el cambio del cable BPL 3x18 ya que se evidencia obstrucción en la canalización, es necesaria la revisión por parte de grupo de obras civiles.</p>		
13	6	1492	105	2/07/2025	KR 49 B X CL 170	<p>-Reubicación del gabinete de conexiones ubicado sobre el andén del costado sur de la Avenida Calle 170 con carrera 51ª (frente al Colegio Bilingüe Abraham Lincoln – sede primaria), toda vez que este se encuentra en el espacio público, sobre la vía peatonal, obstaculizando el normal tránsito de las personas por el andén mencionado (...)”</p>	1/10/2025	Finalizado y Recibido
14	7	3410	779	15/07/2025	KR 60 CL 2C AC 3	Reparación franja ajuste marco caja semaforización	23/07/2025	Finalizado y Recibido
15	8	1199	106	18/07/2025	KR 9 AC 82	Reparación tapa cajas semáforos	22/07/2025	Finalizado y Recibido
16	8	1107	165	18/07/2025	KR 9 AC 72	Reparación muros caja de semáforos	13/10/2025	Finalizado y Recibido
17	10	2808	1721	2/07/2025	AC 63 X KR 90 TV 63	Se instala (1) tapa provisional, una	24/07/2025	Finalizado y Recibido

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780		VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--	--

						sobre otra, hasta que llegue contrato de obras civiles y puedan fabricar tapas antivandálicas		
18	10	1230	12	2/07/2025	AK 7 X CL 121	- Revisión de cámaras de semaforización y limpieza	24/07/2025	Finalizado y Recibido
19	10	2560	714	2/07/2025	AK 86 X CL 69B	Se presenta obstrucción en el flujo 722.1, Limpieza y lavado AUCE, Retiro e instalación de tapa	1/10/2025	Finalizado y Recibido
20	10	2483	762	2/07/2025	AK 96 X CL 66a	Se requiere bajante, Retiro e instalación de tapa antivandálica, Retiro de pedestal e identificación de tapa, Limpieza y lavado AUCE	1/10/2025	Finalizado y Recibido
21	10	2379	627	2/07/2025	TV 39A BIS X AC 20	1. Obstrucción de cámara de paso en el flujo 4. 2. Retiro e instalación de tapa en zona verde 3. Limpieza e instalación de tapa y marco	25/10/2025	Finalizado y Recibido
22	10	1302	79	2/07/2025	AK 19 X CL 134	Se requieren actividades de mantenimiento para su implementación. Se requiere mantenimiento por ductos y cajas obstruidos (Ver inspección de canalizaciones eléctricas), se debe garantizar que todo el circuito de canalización sea funcional, y las bases existentes sin uso sean aprovechables. Demoler bases existentes que no se van a usar en el escenario futuro. En el enlace encuentran última inspección de canalizaciones y esquema de complemento.	12/10/2025	Finalizado y Recibido
23	10	2788	848	2/07/2025	KR 99 X CL 17	2, Retiro e instalación tapa antivandálica	28/11/2025	Finalizado y Recibido
24	11	2324	723	28/07/2025	AK 86 X CL 66A – KR 83 X CL 66A	Instalación marco tapa de paso	13/10/2025	Finalizado y Recibido
25	13	1196	114	8/08/2025	CL 81 - KR 9	Reparación muros caja de semaforización	13/10/2025	Finalizado y Recibido
26	14	2133	335	8/08/2025	KR 16 X AC 57	Instalación de marco, Confinamiento en	8/08/2025	Finalizado y Recibido

	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780						VIGENCIA: 10/04/2025
							VERSIÓN: 1

						concreto, Cinta para caja de paso		
27	16	1492	127	15/08/2025	KR 55 X CL 170	Construcción Base Caja Para Traslado De Auce Sobre El Separador Costado Sur De La Calle 170	16/09/2025	Finalizado y Recibido, en OT 6
28	16	1169	17	15/08/2025	KR 9 X CL 134	Instalación Ducteria De 2" Anden Oriental, Con Cajas De Paso Semafóricas Desde La Calle 134 Hasta; Perforación Dirigida En Zonas De Paso Peatonal Hasta Entrada Principal Universidad Del Bosque	26/12/2025	% de avance del 85% del mantenimiento.
29	16	1488	258	15/08/2025	KR 55 X CL 127	Reparación Base Poste Semafórico	26/02/2026	finalizado
30	18	1476	202/212	25/08/2025	AK 20 X CL 80 BIS – KR 21 X AC 80	Reparación marco de caja de semaforización	20/03/2026	Se realiza verificación en campo por parte de la interventoría, sin evidenciarse requerimiento alguno en el sitio.
31	18	2326	1294	25/08/2025	AK 30 X AC 6	Reparación concreto marco para tapa caja semaforización	25/10/2025	Finalizado y Recibido
32	21	2957	1891	10/10/2025	Av Américas KR60	Retiro de una base portátil en el separador de la Av Américas con Kr 60 sitio de disposición patio 4 SDM		Actividad realizada por otro grupo de semaforización
33	22	2804	201	13/10/2025	TV 3 X AC 53	Construcción franja de confinamiento marco caja semaforización, reemplazo tapa	20/03/2026	Finalizado y Recibido
34	24	2866	660	5/12/2025	KR 32 X AC 6	Suministro e instalación de marco de caja y tapa antivandálica en la esquina sur oriental de la intersección	5/12/2025	Finalizado y Recibido
35	25A	1150	359	15/12/2025	AK 24 X AC 68	Reinstalación del marco vandalizado en caja de paso	16/12/2025	Finalizado y Recibido
36	26	1005	95	26/12/2025	AK 7 X CL 81	Revisión y mantenimiento a la caja de paso. Si es pertinente colocar el marco de la caja y la tapa respectiva	20/03/2026	Finalizado y Recibido
37	27	2843	797	02/01/2026	AK 86 X CL 23	Atención Mto instalación ducto intersección	Pendiente por programar	Se programa ejecución el 20/04/2026

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780		VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--	--

38	28	1010	162	07/01/2026	AK 7 X CL 70	Flujo 2 esquina suroriental hay una tapa de semaforización levantada y al parecer hay obstrucción en el grupo 2, grupo 21 y el grupo 31. El Flujo 4 grupo 24 esquina suroriental hay dos cámaras de CODENSA levantadas por raíces de árboles. Actividades a realizar revisión y ajuste del marco de la caja que tiene la tapa levantada. Revisión del ducto grupo 2 grupo 21 y grupo 31 Si está obstruido la construcción de un nuevo ducto	20/03/2026	Finalizado y recibido ajuste de marco de tapas afectadas. Adicionalmente, se verifica obstrucción en el flujo en el tramo 2, aproximadamente a 3 m del punto de lanzamiento. No obstante, conforme al seguimiento técnico-financiero del contrato presentado en el Comité Extraordinario No. 1 del 02/03/26, se establece la no ejecución del complemento mencionado, por disponibilidad presupuestal agotada.
39	29	2041	342	06/01/2026	KR 16 X CL 49	Limpieza caja de paso	06/01/2026	Finalizado y Recibido
40	30	1438	19	06/01/2026	AK 7 X CL 112	Canalización Obstruida, se requiere la liberación de los ductos reportados: se presenta la novedad que no se puede realizar el cableado del flujo 41C debido a que la canalización presenta obstrucción sobre la calzada del flujo 2 y sobre el flujo 4 como se evidencia en las imágenes adjuntas.	Sin ejecución	conforme al seguimiento técnico-financiero del contrato presentado en el Comité Extraordinario No. 1 del 02/03/26, se establece la no ejecución del complemento mencionados, por disponibilidad presupuestal agotada
41	31	1037	1252	17/02/2026	AK 9 X CL 163A	Limpieza de cajas existentes y verificar ductos desde el AUCE hasta el flujo 2	19/02/2026	Finalizado y Recibido
42	33	2378	608	23/02/2026	AK 36 X AC 20	Reparación y verificación de estructuras de tapa y marco cajas de paso	27/02/2026	Finalizado y Recibido
43	34	2912	708	25/02/2026	TV 42 X AC 6	Instalación de marco, cinta y tapa antivandálica, verificar que no queden expuestos	25/02/2026	Finalizado y Recibido
44	35	1028	271	27/02/2026	KR 17 X CL 69	Instalación de bajante y capacete	02/03/2026	Finalizado y Recibido
45	36	2379	627	12/03/2026	TV 39 BIS A X AC 20	Limpieza, suministro e instalación marco de caja y tapa	Pendiente por programar	Programado para el 20/04/2026
46	37	1296	120	19/03/2026	AK 15 X AC 92	Reacondicionamiento marco de caja y tapa	24/03/2026	Finalizado y Recibido
47	38	2029	400	27/03/2026	AK 10 X CL 24	Limpieza e instalación de marco y tapa antivandálica	27/03/2026	Finalizado y Recibido

Nota:

	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780	VIGENCIA: 10/04/2025 VERSIÓN: 1
---	--	--

De los 47 mantenimientos requeridos, se evidenció que los correspondientes a los externos 2912, 1148, 2957 y 1476, habían sido atendidos, razón por la cual no requirieron una nueva intervención.

Para la OT 16 – EXT 1492 KR 55 X CL 170 la solicitud era la misma que se había dado en la OT 6, la cual se finalizó y se recibió en la OT 6 el 16/09/2025.

Respecto del requerimiento asociado al EXT. 1877 (AK 58 x CL 169B), se contempló inicialmente la ejecución del mantenimiento de manera articulada con las obras de complemento previstas para la intersección, con el fin de optimizar recursos y actividades constructivas. No obstante, al realizar la revisión de la disponibilidad presupuestal del contrato, se evidenció que no era posible ejecutar el mantenimiento requerido.

Finalmente, en relación con el requerimiento correspondiente al EXT. 1438 (AK 7 x CL 112), el mantenimiento no se ejecutó debido a que, al realizar la revisión de la disponibilidad presupuestal del contrato, se evidenció el agotamiento del presupuesto asignado, lo cual no permitió su ejecución.

3. Varios

- Se relacionan de manera general la documentación final y actividades para liquidación del contrato: Informe final del contrato, planos récord (as-built), actas de recibo de obra (IDU), paz y salvos de las ESP e IDPC, inventario final actualizado, registro fotográfico final Bitácoras de obra cerradas, certificaciones de calidad completas de materiales, cierre de PMT's para cierre del contrato.
- Respuesta de PQRS y respuesta a cada uno de los oficios remitidos por la SPMT
- Soportar recuperación de espacio intervenido en el mantenimiento de la AK 9 X AC 134.
- La supervisión reitera a la interventoría la presentación de las actas de recibo de las obras y su valorización de cada intersección.


4. COMPROMISOS

N.º	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Repuestas a SPMT con copia a la Interventoría de los oficios SEM-CMC-CBM-238-26 con radicado ORFEO n.º 202661201384872 del quince de abril de 2026 y del oficio SEM-CMC-CBM-245-26, radicado ORFEO n.º 202600000176812 del 17 de abril de 2026.	Contratista	22/04/2026
2	Frente a la SDQS correspondiente a la AK 11 x CL 67, el Contratista se compromete a realizar la demolición de la base el día 22 de abril y a remitir la respuesta el 23 de abril, adjuntando el respectivo registro fotográfico como soporte.	Contratista	23/04/2026

5. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adriana Lucía Rodríguez Fonseca	Profesional Especializada - Secretaría Distrital de Movilidad	
Nancy Mateus Ráquira	Contratista - Secretaría Distrital de Movilidad	

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2780	VIGENCIA: 10/04/2025
		VERSIÓN: 1

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Willy Patrick Belzher Salazar	Representante Legal - Consorcio Belzcon – Movilidad	
Andrés Valderrama Padilla	Director de Obra - Consorcio Belzcon – Movilidad	
Sergio Andrés Torres Toloza	Residente de Obra - Consorcio Belzcon – Movilidad	
Nestor Bautista	Gerente Técnico - Consorcio Belzcon – Movilidad	
Valentín Eduardo Barajas	Director de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Luis Carlos Daza	Especialista de Tránsito – Consorcio Movilidad Capital	
Wilson Pineda	Residente de obra – Consorcio Movilidad Capital	
