

Medellín, 01 de septiembre 2026

1300 2634

Señor:
Juan Diego Aguirre Londoño
Director de Desarrollo Físico Gobernación de

Radicado: R 2026010591343

Fecha: 02/09/2026 11:28:14.0

Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero Juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y trámite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260029 lote # 5 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.


Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- febrero de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 1 - pág. 1- 12
- Anexo USB Informe No 1
- marzo de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 2 – pág. 13-28
- Anexo USB Informe No 2
- abril de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 3 - pág. 29-44
- abril de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 3 - pág. 45-59
- Anexo memoria USB informes No 3
- mayo de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 4 - pág. 60-76
- mayo de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 4 - pág. 77-91
- Anexo memoria USB informes No 4
- junio de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 5 - pág. 92-108
- junio de 2026 corredor salgar-la quiebra-concordia No 1- pág. 109- 124
- junio de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 5 - pág. 125-139
- Anexo memoria USB informes No 5 y No 1


Recibí
[Firma]
02.09.2026
11:00 am

ARCHIVO SIT
2026 SEP 15 15:32:14

Cordialmente



CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Duberney Concha Marin		31/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 03
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES



20/4/2026 10:57 a.m.
5°42'3.98373"N 75°52'49.85657"
Pueblorrico_San José_Andes

**INFORME MENSUAL SST No. 03
INTERVENTORIA
PUEBLO RICO SAN JOSÉ - ANDES**

**GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA**

Secretaría de
Infraestructura Física

**CONTRATO DE OBRA
No. 2500111B2824 de 2025**
Mejoramiento y mantenimiento
para la estabilización de las vías
en la Subregión Suroeste (Lote 5)
a cargo del Departamento
Antioquia.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 20260029**

Interventoría técnica,
administrativa, ambiental,
financiera y legal al contrato de
actividades de mejoramiento y
mantenimiento para la
estabilización de las vías en la
Subregión Suroeste (Lote 5) a
cargo del Departamento
Antioquia.


ABRIL DE 2026

**INTERVENTORÍA: SADING
GROUP S.A.S**


	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	
---	--	---

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25
CONTRATO DE OBRA N°	2500111B2824 de 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)
INTERVENTORÍA	SADING GROUP S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20260029
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA.
PERIODO	ABRIL DE 2026

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría	Nubia Barragán Reyes	ABRIL 2026	01
REVISÓ	Director de interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST Rentan			

Recibe SIF Jesus David Jimenez


Supervision SST
Procedimental SST

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	ALCANCE.....	5
2.2.	CORREDORES VIALES ESPECÍFICOS (LOTE 5)	5
2.3.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	5
2.4.	REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SUROESTE	6
3.	OBJETIVOS	7
3.1.	OBJETIVO GENERAL	7
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	9
4.1.	LOCALIZACIÓN SUBREGIONES DE SUROESTE ANTIOQUEÑO:.....	9
4.2.	ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:	9
4.3.	SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.....	11
4.4.	SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS EN OBRA.....	11
5.	INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	12
5.1.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
5.2.	INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA.....	13
6.	LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO	14
7.	LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA	15
8.	SUBPROGAMAS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA DE OBRA DEACUERDO A LA GUIA DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL	16
8.1.	SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.....	16
8.2.	SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIA	16
9.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL PERIDO DEL MES DE ABRIL DE 2026.....	22
10.	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	27
10.1.	ANÁLISIS.....	27
10.2.	EVALUACIÓN.....	27
11.	CONCLUSIONES	29
12.	RECOMENDACIONES.....	30
13.	ANEXOS DOCUMENTALES.....	31

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	
---	--	---

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de ejecutar el **mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia**, se suscribió el Contrato de Obra No. 2500111B2824 de 2025 entre la Gobernación de Antioquia y el CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025, cuyo objeto corresponde a la ejecución de las **actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 5 – Suroeste)**.

De igual manera, el 05 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 20260029 entre RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. y la empresa SADING GROUP S.A.S., cuyo objeto es **la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal** del contrato de obra para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento en la subregión Suroeste (Lote 5) Pueblorrico/San José/Andes, a cargo del Departamento de Antioquia.

El presente informe tiene como propósito describir las actividades ejecutadas y el estado del tramo Pueblorrico/San José/Andes, abarcando los componentes técnicos, administrativos y financieros, así mismo, describir las actividades ejecutadas por el contratista de obra desde el componente de seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en lo corrido de la ejecución del proyecto.

Adicionalmente, se presentan las principales dificultades y/o novedades registradas durante el periodo reportado, junto con las acciones implementadas por la Entidad Contratante, el Contratista y la Interventoría.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

2. ALCANCE

El alcance específico para el corredor vial Pueblo Rico – San José – Andes que hace parte de la subregión del Suroeste (identificada como el Lote 5 en el proceso de contratación) es el siguiente:

2.1. EXTENSIÓN Y OBJETIVOS EN EL SUROESTE

Longitud a intervenir: Se tiene proyectada la intervención de 68,26 km, lo que representa el 7% del total de la red vial a cargo del departamento en esta subregión. Municipios beneficiados: La subregión está conformada por 23 municipios, entre ellos Amagá, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Jardín, Jericó, Salgar, Támesis, Tarso, Urrao y Venecia.

Objetivo técnico: Realizar el mantenimiento de corredores de Bajo Volumen de Tránsito (LVR) utilizando técnicas de estabilización de suelos con cemento o cal, en lugar de la recarga tradicional con materiales granulares.

2.2. CORREDORES VIALES ESPECÍFICOS (LOTE 5)

El proyecto detalla los tramos exactos de intervención en el Suroeste y el tiempo estimado de obra para cada uno:

- Abejorral – Santa Bárbara: Plazo de obra de 4 meses.
- Titiribí – Armenia: Plazo de obra de 8 meses.
- Salgar – La Quiebra – Concordia: Plazo de obra de 10 meses.
- Valparaíso – Támesis: Plazo de obra de 12 meses.
- Andes – San José – Pueblorrico: Plazo de obra de 12 meses.

2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las siguientes obras o actividades:

PRODUCTO LOTES 5:

- Realizar estudio de caracterización del suelo de subrasante, material superficial y diseño de la formula trabajo de la estabilización siguiendo la normativa vigente del INVIAS
- Construcción de Alcantarillas

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

- Construcción de Cunetas
- Construcción de Bordillos
- Construcción de Filtros para Cunetas
- Construcción de Disipadores
- Construcción Estabilización con Material Granular
- Construcción de una superficie de rodadura en tratamiento superficial doble.
- Construcción Señalización vial

2.4. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SUROESTE

Para la ejecución en esta zona, el contratista debe garantizar:

Frentes de trabajo: Como mínimo dos (2) frentes de trabajo realizando actividades de estabilización, más un frente adicional para actividades complementarias.

Personal clave: Un Director de Obra dedicado por 12 meses y dos profesionales del área social (uno por 8 meses y otro por 12 meses). Cada tramo específico deberá contar con su propio Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST, Topógrafo y Profesional de Calidad.

32

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	
---	--	---

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento mediante la técnica de estabilización de suelos en las vías a cargo del Departamento de Antioquia, en el corredor vial Pueblo Rico – San José – Andes, con el fin de garantizar la transitabilidad, seguridad vial y conectividad de la subregión bajo criterios de sostenibilidad técnica y económica.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Técnicos y Operativos:**

Ejecutar la estabilización de la estructura de la vía utilizando materiales químicos (cemento o cal) según el diseño de mezcla establecido para corredor vial Pueblo Rico – San José – Andes.

Aplicar una superficie de rodadura mediante doble riego asfáltico para proteger la base estabilizada y mejorar el confort del tránsito.

Intervenir y mantener las obras de drenaje (cunetas y alcantarillas) para asegurar la evacuación de aguas y prolongar la vida útil de la calzada.

Garantizar la correcta señalización horizontal y vertical de los corredores intervenidos para mejorar la seguridad de los usuarios.

- **Socio-Ambientales y de Seguridad:**

Implementar el Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) exigido por la Gobernación de Antioquia.

Prevenir la incidencia de accidentalidad y de enfermedades laborales durante la ejecución del proyecto, mediante la implementación efectiva de medidas de prevención y control de riesgos, el fortalecimiento de las competencias del personal a través de capacitaciones continuas, el cumplimiento de la normatividad vigente en SST y el seguimiento permanente a las condiciones de trabajo, promoviendo una cultura de autocuidado y mejora continua.

Garantizar la seguridad integral de los trabajadores y comunidades aledañas mediante el

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

cumplimiento estricto de la normativa de riesgos laborales.

- **Administrativos y de Información:**

Cumplir con los plazos de ejecución establecidos para cada tramo (que oscilan entre 4 y 12 meses según el corredor).


Realizar el inventario y caracterización técnica de las vías intervenidas para alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Secretaría de Infraestructura Física.

Estos objetivos están alineados con el propósito del Lote 5 del contrato, que busca una solución más duradera que el mantenimiento tradicional en una de las regiones con topografía más exigente del departamento.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la ejecución de intervenciones de mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo en corredores viales estratégicos del Suroeste de Antioquia. A diferencia del mantenimiento rutinario tradicional, esta iniciativa se centra en la estabilización físico-química de suelos para transformar vías de afirmado (tierra) en corredores con una estructura más resistente y duradera, mejorando la competitividad agrícola y turística de la región.

4.1. LOCALIZACIÓN SUBREGIONES DE SUROESTE ANTIOQUEÑO:

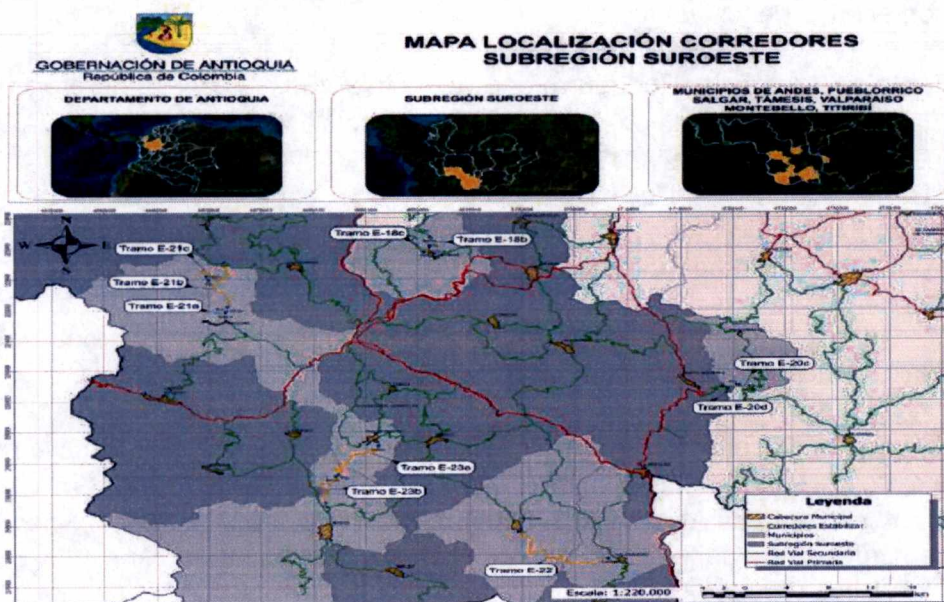

4.2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

1. Actividades Preliminares y de Soporte Localización y Replanteo:

- Definición técnica de los ejes viales y áreas de intervención exacta según los planos.
- Gestión Socio-Ambiental y SST: Implementación de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto incluye la señalización preventiva de obra y la protección del personal y la comunidad.
- Caracterización de Suelos: Ensayos de laboratorio para determinar si la estabilización se hará con cemento o con cal, dependiendo de la plasticidad y humedad del terreno.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

2. Estabilización de la Subrasante o Afirmado es la actividad principal del proyecto. El alcance incluye:

- Escarificación y Homogeneización: Se disgrega el material existente en la vía (suelo o afirmado).
- Distribución del Conglomerante: Aplicación controlada de cemento o cal sobre el material escarificado.
- Mezclado: Uso de maquinaria especializada (recicladora o motoniveladora) para integrar el químico con el suelo.
- Compactación: Nivelación y compactación con rodillo vibratorio hasta alcanzar la densidad máxima permitida, asegurando que la vía no se deforme con el peso de los vehículos.

3. Tratamiento de Superficie (Rodadura) una vez estabilizada la base, se protege con:

- Imprimación: Aplicación de una emulsión asfáltica que penetra en la base estabilizada para sellarla.
- Doble Riego Asfáltico: Aplicación de dos capas de ligante asfáltico intercaladas con agregados pétreos (gravilla). Su alcance es proporcionar una superficie impermeable, mejorar la tracción y eliminar el polvo.

4. Obras de Drenaje y Manejo de Aguas Dado que el Suroeste es una zona de alta pluviosidad, el alcance incluye:

- Limpieza y Reconstrucción de Cunetas: Asegurar que el agua de lluvia no se empoce ni sature la estructura de la vía.
- Mantenimiento de Alcantarillas: Limpieza de obras transversales existentes y construcción de cabezales o extensiones si el diseño lo requiere.

5. Señalización y Seguridad Vial

- Demarcación Horizontal: Pintura de líneas centrales y de borde con materiales retro reflectivos.
- Señalización Vertical: Instalación de señales preventivas, reglamentarias e informativas.
- Hitos y Defensas: Instalación de elementos de protección en zonas de abismos o curvas peligrosas.

6. Gestión de Información (SIG)

- Levantamiento Post-Obra: Recolección de coordenadas y datos técnicos de la vía finalizada para alimentar el Sistema de Información Geográfica de la Gobernación de Antioquia.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

4.3. SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

1. La señalización se define como un componente esencial para garantizar una circulación segura y fluida, reduciendo accidentes en zonas de intervención. Los puntos clave son:

- **Implementación Obligatoria:** El contratista debe suministrar, transportar e instalar tanto señalización vertical (preventivas, reglamentarias e informativas de 75x75 cm) como demarcación horizontal con pintura acrílica reflectiva y microesferas de vidrio.
- **Señalización de Obra:** Es responsabilidad absoluta del contratista colocar y mantener vallas informativas, iluminación nocturna y dispositivos de seguridad durante toda la ejecución.
- **Control de Tráfico (Pare-Siga):** Para actividades iniciales como localización y replanteo, es obligatorio contar con auxiliares de "pare-siga" a ambos lados y delimitar la zona con conos para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía.
- **Normativa Aplicable:** Se debe cumplir estrictamente con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte (actualizado a 2024).

2. Elementos de Protección y Seguridad (SST)

Gestión de Seguridad: El contratista debe seguir la "Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia".

Responsabilidad Civil y Sanciones: El ejecutor es el único responsable de cualquier multa o sanción derivada de la falta de señalización o dispositivos de seguridad adecuados.

4.4. SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS EN OBRA.

De acuerdo a lo antes mencionado en el corredor vial Pueblo Rico – San José – Andes para el presente periodo del mes de abril de 2026, no sé evidenció.

- Señalización obligatoria
- Control de tráfico.
- Dispositivos de canalización.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

5. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Información del contrato de obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	2500111B2824 de 2025
Objeto	Actividades de mejoramiento y Mantenimiento para la estabilización de las Vías a cargo del de Antioquia (Lote 5 Suroeste)
Contratista	Consortio Vías Antioquia MM 2025, integrado por Wilmar José Moncada Arcila (90%) y Meyan S.A. (10%)
Nit.	902017071-1
Representante Legal	Wilmar Moncada Arcila
Valor del contrato	SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$72.870.090.400) y un A.I.U. del 32,57%.
Anticipo entregado al contratista (15%)	DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$ 10.930.513.560) y el porcentaje (en 15%) del valor del Contrato
Fecha de inicio	05 de febrero de 2026
Fecha de terminación	05 de febrero de 2027
Plazo inicial	DOCE (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Interventor	SADING GROUP SAS

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	
---	--	---

5.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 2. Información del contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR	
Contrato No.	20260029
Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Contratista	RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Nit.	9011922745
Representante Legal	Juan Carlos Reyes Vanegas
Valor del contrato	Cinco mil seiscientos noventa millones setecientos cincuenta y dos mil trece pesos ml (\$ 5.690.752.013), IVA incluido.
Anticipo entregado al contratista (15%)	N.A.
Fecha de inicio	14 de enero de 2026
Fecha de terminación	14 de febrero de 2027
Plazo inicial	Trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Interventor	SADING GROUP SAS

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	
---	--	---

6. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

Tabla 3. Listado del personal del contratista

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO ANDES/PUEBLORRICO						
CONTRATO No. 2500111B2824 de 2025						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	ALONSO ACOSTA ACEVEDO	AYUDANTE OBRA	15.526.237	CVAMM25	19-02-26	
2	CARLOS ALBERTO ACOSTA	LIDER COMPRAS	1.065.596.504	CVAMM25	02-02-26	
3	CRISTIAN DAVID MONTOYA	AYUDANTE OBRA	1.001-145-117	CVAMM25	19-02-26	
4	FRANKLIN REINA	AYUDANTE OBRA	1.084.576.112	CVAMM25	17-02-26	
5	JAN CARLOS ALVAREZ	AYUDANTE OBRA	1.000.099.471	CVAMM25	17-02-26	
6	JHON SEBASTIAN GALVIZ	AYUDANTE OBRA	1.007.634.048	CVAMM25	09-02-26	
7	JHON JAIRO CANO	ING RESIDENTE	15.527.325	CVAMM25	06-02-26	28-02-26
8	JORGE IVAN ECHAVERRIA	RESIDENTE SOCIAL	71.667.805	CVAMM25	19-02-26	
9	JUAN JOSE FERNANDEZ	CONDUCTOR	71.648.067	CVAMM25	13-02-26	
10	VICTOR ALVAREZ OSPINA	AYUDANTE OBRA	1.001.395.792	CVAMM25	19-02-26	
11	WILSON GONZALEZ	TOPOGRAFO	70.732.036	CVAMM25	13-02-26	25-02-26
12	CARLOS MARIO SILVA	RESIDENTE SST	83.258.453	CVAMM25	24-02-26	
13	JEAN PAUL RETAT	RESIDENT AMBIENTAL	71.773.455	CVAMM25	02-03-26	14-04-26
14	EDISSON ANDRES CAÑON	TOPOGRAFO	1.072.749.495	CVAMM25	02-03-26	14-03-26
15	JOSE FRANCISCO ZORRO	ING RESIDENTE	19.258.957	CVAMM25	02-03-26	
16	LUIS FERNANDO CADAVID	AYUDANTE OBRA	15.529.870	CVAMM25	02-03-26	
17	LUIS FERNANDO OSORNO	DIRECTOR DE OBRA	98.494.655	CVAMM25	28-02-26	
18	EDWIN BARRAGAN ARIAS	TOPOGRAFO	11323949	CVAMM25	30-03-26	

Listado de personal autorizado de INTEINSA_CRM						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	Eibar Valoyes	Ayudante	1048015807	CRM CONS	17-03-26	
2	Yon Fredys Mena	Ayudante	1128426694	CRMCONS	17-03-26	
3	Carlos Andrés Riascos	Auxiliar topografía	1036604727	Inteinsa	17-03-26	

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

7. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 4. Listado del personal técnico de Interventoría

Listado personal de Interventoría Andes/Pueblorrico						
CONTRATO No. 20260029						
No	Nombre	Cargo	Cedula	Empresa	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
1	John Fredy Henao Londoño	Director Interventoría	70.419.829	SADING GROUP S.A.S	6/02/2026	
2	Sandra Patricia García González	Residente Técnica	1.033.646.794	SADING GROUP SAS.	13/02/2026	
3	Henry Pineda Arango	Profesional Social	13.990.560	SADING GROUP SAS.	06/02/2026	
4	Kadir Jalkh Fonseca	Profesional Ambiental	18.928.839	SADING GROUP SAS.	13/02/2026	11/03/2026
5	Diego Ferney Monsalve Hoyos	Tecnólogo Civil	1.017.132.030	SADING GROUP SAS.	13/02/2026	
6	Nubia Barragán Reyes	Profesional SST	65.769.531	SADING GROUP SAS.	19/02/2026	
7	Javier Ernesto Rodríguez Díaz	Topógrafo	79.353.827	SADING GROUP SAS.	03/03/2026	
8	Jonny Alexander Zúñiga Quiceno	Conductor	15534763	SADING GROUP SAS.	10/03/2026	
9	Angelica María Barón Zapata	Profesional Ambiental	43264909	SADING GROUP SAS.	1/04/2026	

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

8. SUBPROGAMAS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA DE OBRA DEACUERDO A LA GUIA DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

8.1. SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

Es un componente del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) enfocado en promover, proteger y mantener la salud de los trabajadores.

Se encarga de prevenir enfermedades laborales, detectar de manera temprana alteraciones en la salud y vigilar las condiciones físicas y mentales de los trabajadores, mediante actividades como exámenes médicos ocupacionales, vigilancia epidemiológica y programas de promoción de la salud.

8.2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIA.

El subprograma de Higiene Industrial es una disciplina preventiva centrada en identificar, evaluar y controlar factores ambientales (físicos, químicos o biológicos) en el lugar de trabajo para prevenir enfermedades laborales. Su objetivo principal es proteger la salud del trabajador mejorando las condiciones ambientales, como ventilación, ruido y contaminantes.

Llevando a cabo la gestión de seguridad y salud en el trabajo, durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2026 el consorcio Vías Antioquia MM25, realizo la entrega de la siguiente documentación administrativa y operativa, de acuerdo con los programas establecidos y conforme al Manual de Presentación Informe mensual SST de Secretaria de Infraestructura Física para contratistas, el cual se presenta en el siguiente orden por carpetas en anexos

- **Soporte documental plan de trabajo anual;** mediante el ciclo PHVA, deacuerdo a lo expuesto por el contratista de obra, se relacionan las actividades a ejecutar para el periodo 2026, así mismo deacuerdo a esto, la interventoría, velara por el seguimiento de la ejecución del programa establecido por el contratista, por lo consiguiente se realizan las observaciones que den a lugar de acuerdo con lo programado/ejecutado por cada mes. **Ver anexo 3. Cronograma de actividades_2026/obra/ interventoría**
- **Alturas 4272 de 2021.** El contratista mediante documento firmado el 30 de abril, por el Representante legar del consorcio expresa que, esta actividad no se ejecutó en el periodo citado ya que, por la naturaleza de la obra, no se realizan actividades de alto riesgo, **ver Anexo 4. Alturas 4272_21. Obra / interventoría.**

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

- **Espacios confinados 0491 de 20220.** El contratista mediante documento firmado el 30 de abril, por el Representante legal del consorcio expresa que la actividad de espacios confinados no se ejecutó en este periodo ya que, por la naturaleza de la obra, no se realizan actividades de alto riesgo. **Ver anexo 5. Espacios confinados 0491_2020. Obra/ interventoría.**
- **COPASST.** Es de precisar que, el contratista incluyó en su plan de trabajo anual la conformación del comité interno para el proyecto, dentro de la gestión interna de nombramiento incluye los siguientes soportes.
 - Convocatoria conformación del COPASST
 - Acta de cierre votaciones
 - Acta divulgación conformación COPASST; desde el inicio hasta su formalización. **Ver anexo 8. Comité COPASST 2013_1986. Obra/interventoría**
- **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLAB).** Es de precisar que, el contratista incluyó en su plan de trabajo anual la conformación del comité interno COCOLAB para el proyecto, dentro de la gestión interna de nombramiento incluye los siguientes soportes.
 - FRSST-011 Inscripción de candidatos al COCOLAB
 - FRSST-016 Nombramiento del COCOLAB
 - FRSST-010 Elección y registro COCOLAB
 - FRSST-015 Acta de conformación del COCOLAB

De acuerdo a lo anterior, el contratista mediante soporte documental, firmada por el Representante legal del Consorcio, informa que la implantación de comité Se realizara a partir del mes de mayo, esto con acompañamiento de la ARL, correspondiente. **Ver anexo 9. Comité Convivencia Laboral _3461_2025 obra /interventoría.**

- **Plan Estratégico de Seguridad vial (PESV).** El contratista para el presente periodo del mes de abril de 2026, No adjunta soportes de la gestión del PESV, no se remite por el contratista inspecciones a vehículos, No obstante, en documento firmado por el representante legal se expresa que, el documento guía Plan Estratégico de Seguridad vial, se encuentra en proceso de elaboración, y por

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

consiguiente se implementara a partir de la segunda semana del mes de mayo de 2026. **Ver anexo 12. PESV obra / interventoría.**

- **Protocolo de bioseguridad.** Reporte procedimiento protocolo de bioseguridad para el riesgo biológico, documento aportado por el contratista de obra con los insumos del mes de abril de 2026. Es de resaltar que este soporte por la presente interventoría, se adjuntó con los anexos del mes de marzo de 2026. **Ver anexo 14. Protocolo de bioseguridad obra**
- **Documentos de ingreso.** Información de total de ingresos del mes de abril de 2026. **Ver anexo 15 documentos de ingreso obra/ interventoría**

Tabla 5. Ingreso de personal frente de obra Andes/Pueblorrico abril de 2026

FRENTE DE OBRA	EMPRESA	# TRABAJADORES
Andes _Pueblo Rico	Consortio Vías Antioquia MM2025	1

FRENTE DE OBRA	EMPRESA	# TRABAJADORES
Andes _Pueblo Rico	SADING GROUP SAS	1

- **Anexo contratos o certificaciones laborales;** el contratista para el mes de abril reporta una certificación laboral del trabajador que ingreso en el mes descrito. **Ver Anexo 16. Contrato o certificación laboral obra/ interventoría**
- **Inducciones.** Se aportó por el contratista de obra una inducción del trabajador que ingreso para el periodo del mes de abril de 2026 **Ver anexo 17. inducción y evaluación obra/ interventoría**
- **Suministro o reposición de EPP.** El contratista para este el periodo del mes de abril de 2026, reportó gestión y soporte de suministro y reposición de EPP a 3 trabajadores en lo corrido del mes de abril de 2026. **Ver anexo 18. Entrega EPP obra / interventoría.**
- **Suministro de dotación.** Para el periodo del mes de abril de 2026, el contratista no realizó reporte de suministro de dotación a su personal nuevo. **Ver anexo 19. Dotación obra/ Interventoría.**
- **Perfil sociodemográfico.** Conforme a lo establecido, se lleva a cabo la identificación de las características de la población trabajadora que ingresa mensualmente al proyecto, se mantiene diligenciamiento del perfil sociodemográfico de forma

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

mensual, así como el personal retirado que ha ingresado al proyecto en lo corrido de la ejecución del mismo, por lo anterior, el contratista en el perfil sociodemográfico, relaciona 18 ingresos, con 4 retiros. **Ver anexo 20. Perfil sociodemográfico obra / interventoría**

- Seguridad Social Correspondiente al mes vencida. **Ver anexo 21. Seguridad social obra/interventoría**

Tabla 6. Reporte de seguridad social mes marzo _2026

Empresa	No planilla
CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25	6016576190
GRUPO INTERVIALES INTERVENTORIA (SADING GROUP)	84901919/ 84236081

- Reporte de nóminas mensual. El contratista Consorcio Vías Antioquia MM2025, no reporta soportes de pagos de nóminas causados en el periodo del mes de marzo, es de preciar que, este soporte debió haberse adjuntado con los insumos del mes de abril de 2025, de acuerdo al documento remitido por el contratista donde expresa que las nóminas serán reportadas en este periodo.

Por otra parte, se reportan nominas de la primera quincena del mes de abril, no obstante, en este reporte no están todos los trabajadores del frente de obra, las nóminas sin reportar corresponden a los siguientes trabajadores: (JORGE IVAN ECHAVARRIA, CARLOS ALBERTO ACOSTA ANGARITA, JOSE FRANCISCO ZORRO CUBIDES, LUIS FERNANDO OSORNO RESTREPO, EDWIN BARRAGÁN ARIAS) Ver anexo 22. Nominas mes abril obra/interventoría.

- **Inspecciones del mes de abril 2026**, las cuales se describen de la siguiente manera. Por otra parte, la contratista adjunta soportes de ATS de las actividades ejecutadas. **Ver anexo 23. Inspecciones de seguridad obra/interventoría**

Tabla 7. Relación inspecciones de seguridad del mes de abril_2026

INSPECCIONES LABORALES ANDES/PUEBLORRICO			
CLASE DE INSPECCION	FECHA	PROFESIONAL SST	CANTIDAD
Inspección de EPP	6-04-26	CARLOS MARIO SILVA	1
Inspección orden y aseo	21-04-26	CARLOS MARIO SILVA	1
Inspección de herramienta menor	9-04-26	CARLOS MARIO SILVA	1




Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 03
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES



- **Anexo de registros fotográficos.** Reporte evidencia fotográfica de actividades SST relevantes en el transcurso del mes de abril 2026. **Ver anexo 24. Registros fotográficos obra/interventoría.**
- **Liquidaciones del periodo:** Para el periodo del mes de abril de 2026, el contratista de obra no reporta las liquidaciones del personal que ha salido del proyecto, No obstante, dentro del proceso de esta interventoría se remitirá comunicado de cumplimiento de estos insumos mensuales. NOTA. Se expresa por esta interventoría que, no hubo personal retirado en el periodo. **Ver anexo 25. Liquidaciones obra/Interventoría**
- **Listado de personal:** Se reporta personal de todo el proyecto a corte del 28 de abril de 2026, Con un consolidado de catorce (14) personas por Andes/Pueblorrico. **Ver anexo 26. Listado de personal obra/interventoría**
- **Reportes diarios y semanales.** Anexo soporte actividades diarias ejecutadas en el transcurso del mes de abril, se adjunta Excel con las actividades diarias ejecutadas, por la Interventoría se anexan soportes de actividades diarias desde el 01 de abril al 30 de abril, adicional se anexan los soportes de informes semanales, ejecutadas en el transcurso del mes de abril de 2026. **Ver anexo 27. Reportes diarios Obra/interventoría**
- **Presupuesto PMT y SST.** Para el periodo del mes de abril de 2026, el contratista de obra no ha remitido el presupuesto para revisión por la interventoría, se anexa documento soporte en el cual expresa que este insumo empezara a partir del mes de mayo. **Ver anexo 28. Presupuesto PMT y SST. Obra; por parte de la interventoría este ítem no aplica.**
- **Certificados de Revisor Fiscal y representante Legal;** Se anexa documento firmado por el representante legal del consorcio Vías Antioquia MM 2025, igual que por el revisor fiscal. Este soporte data los parafiscales del mes marzo de 2026. **Ver anexo 30. Certificados Revisor fiscal y representante legal Obra/interventoría**
- **Anexo reporte de accidentalidad:** En el periodo del mes de abril de 2026, el contratista no reporta accidentalidad con el personal del frente de obra Andes/Pueblorrico. **Ver anexo 31 accidentalidad obra/interventoría, esta última sin eventos.**
- **Reporte de ausentismo laboral.** Para el presente periodo del mes de abril de 2026, no se presentó ausentismo en el frente de trabajo Andes/Pueblorrico. **Ver anexo 32. Ausentismo general Obra/interventoría,** por parte de la interventoría se presenta un día de ausentismo por enfermedad general.

Gráfica 1. Indicador de ausentismo general abril_2026

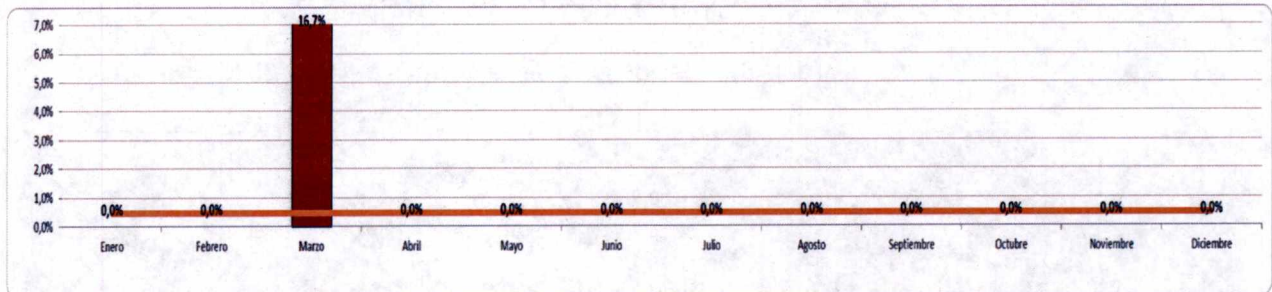

- **Capacitaciones y charlas de seguridad.** De acuerdo con el plan de capacitaciones anual proyectado, para el mes de abril, se ejecutaron actividades de capacitaciones y charlas diarias, No obstante, se contempla capacitación a la brigada de emergencia, esta no se ejecutó en el periodo mencionado. **Ver anexo 33. Capacitaciones y charlas de seguridad obra/interventoría**

Tabla 8. Consolidado de charlas de seguridad y Capacitaciones_ abril_2026

Frente de obra	Capacitador	# de charlas ejecutadas.
ANDES/PUEBLORRICO	Carlos Mario Silva	12 temas
CAPACITACIONES		
Temas	Capacitador	# de asistentes
Comité de convivencia laboral	Carlos Mario Silva	13
Funciones y responsabilidades del COPASST	Carlos Mario Silva	12

- **Comunicaciones.** En el mes de abril de 2026, se aportó la información correspondiente a comunicaciones, estos soportes corresponden a correos emitidos y recibidos a la presente interventoría. **Ver anexo 35. Compunciones obra/interventoría**



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 03
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES



9. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL PERIDO DEL MES DE ABRIL DE 2026

Tabla 9. Relación fotográfica del mes de abril_2026



Foto1. Suministro de EPP para actividades con contacto con agua



Foto 2. Reposición de guantes al personal

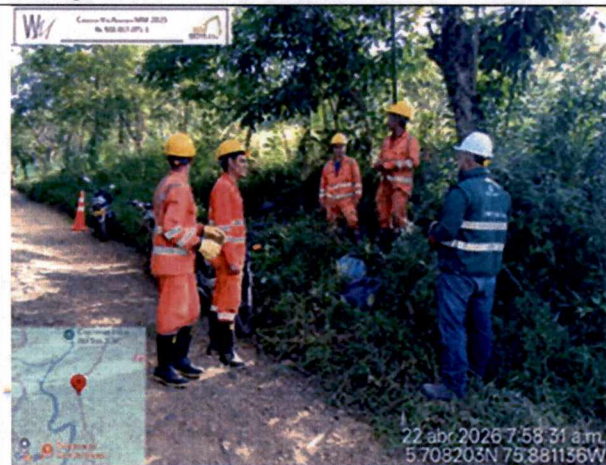


Foto 3. Charla de seguridad SST obra



Foto 4. Reposición de delimitación de áreas de peligro

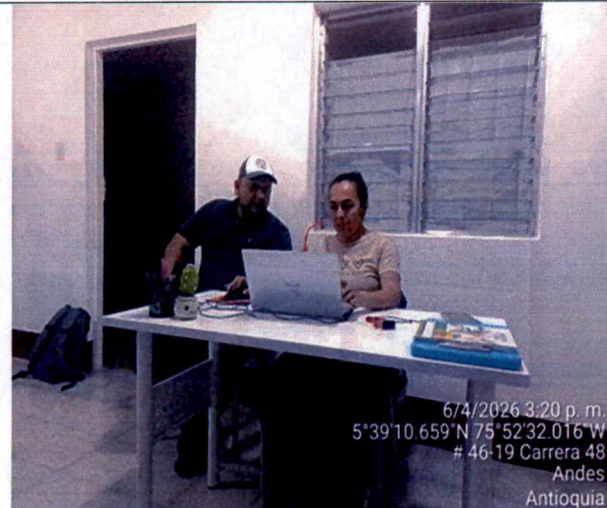


Foto 5. Mesa de trabajo conjunta SST obra/interventoría



Foto 6. Recorrido frente de obra, verificación de actividades constructivas



Foto 7. Suministro de dotación interventoría



Foto 8. Inspección de botiquín oficina Andes Interventoría



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 03
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES



Foto 9. Socialización charlas diarias interventoría



Foto 10. Pausas activas interventoría



Foto 11. Recorrido de obra, verificación de uso de EPP y personal de obra



Foto 12. Capacitación a conductor Interventoría Andes



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 03
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ – ANDES



Foto 13. Inspección de extintor ejecutado por interventoría Andes



Foto 14. Mesa de trabajo interna Obra/interventoría



Foto 15. Recorrido a obra, verificación de uso de EPP



Foto 16. Permanencia de señalética interna de obra.



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 03
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES



SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES



Foto 17. Recorrido a obra verificación actividades, peligros existentes y uso de EPP



Foto 18. Charlas de seguridad del 27 al 30 de abril-26

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

10.1. ANÁLISIS.

Durante el periodo evaluado se desarrollaron principalmente actividades de carácter administrativo, orientadas a la revisión, actualización y organización documental del sistema. Estas acciones incluyen el ajuste de formatos, consolidación de registros y verificación de soportes asociados al SG-SST diseñado para el proyecto.

En cuanto a la ejecución de las actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo Anual del SG-SST, el cual se estableció una programación mensual, se identifica un cumplimiento parcial. Si bien algunas actividades fueron adelantadas, no se evidencia una ejecución integral conforme a lo planificado, lo que denota debilidades en la gestión, seguimiento y control del cronograma establecido. Esta situación puede afectar la eficacia del sistema, en la medida en que no se garantiza la implementación oportuna de las medidas de prevención y control de riesgos.

Respecto a las actividades de campo, se observa una limitada o nula ejecución durante el mes de abril, debido a que el contratista no realizó ingreso de personal operativo para el desarrollo de actividades constructivas. Esta condición restringe la implementación de controles en sitio, inspecciones, capacitaciones presenciales y demás acciones propias de la gestión operativa en SST.

No obstante, es importante señalar que, aun en ausencia de personal en obra, el contratista debe garantizar el cumplimiento de las actividades administrativas y de gestión estratégica del SG-SST, tales como la planificación, seguimiento a indicadores, actualización de matriz de peligros, revisión de procedimientos y fortalecimiento del sistema documental, con el fin de asegurar su adecuada implementación una vez se incorpore personal operativo a las actividades constructivas.

En síntesis, la gestión del contratista presenta avances en el componente administrativo; sin embargo, evidencia oportunidades de mejora en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y en la ejecución integral del SG-SST, particularmente en lo relacionado con la planificación efectiva y el aseguramiento del cumplimiento de las actividades programadas, independientemente de la dinámica operativa del proyecto.

10.2. EVALUACIÓN.

Con base en el seguimiento efectuado a las actividades desarrolladas por el contratista Consorcio Vías Antioquia MM 2025, durante el periodo del mes de abril de 2026, se

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	
---	--	---

determina que la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) presenta un nivel de cumplimiento parcial.

Se concluye que la gestión del contratista requiere fortalecimiento en la ejecución integral del sistema, asegurando el cumplimiento de las actividades programadas, aseguramiento de recorridos a obra, acompañamiento y ejecución de controles, evidencia de la gestión mediante registros fotográficos, indistinto que el número de trabajadores sea reducido.

Por lo anterior se espera que, para el próximo periodo del mes de mayo, se realice una gestión más amplia y se cumpla con la programación establecida

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	
---	--	---

11. CONCLUSIONES

- Durante el mes de abril de 2026, la gestión del contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se caracterizó por un enfoque principalmente administrativo, evidenciándose avances administrativos del SGSST
- Se identificó un cumplimiento parcial del Plan de Trabajo Anual, en tanto las actividades programadas para ejecución mensual no fueron desarrolladas en su totalidad, lo que refleja debilidades en la planificación, seguimiento y control de la gestión SST.
- La no vinculación de personal operativo durante el periodo del mes de abril, no puede generarse como una limitación de la ejecución de actividades de campo, afectando la implementación práctica del SG-SST, especialmente en lo relacionado con inspecciones, capacitaciones presenciales y control de riesgos.
- Para el presente periodo el contratista consorcio Vías Antioquia MM 2025, no presentó el presupuesto SST formalmente, esta situación limita la implementación de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades programadas, afectando la trazabilidad del presupuesto; así mismo, impide a la interventoría ejercer de manera integral su función de seguimiento sobre la correcta inversión de la bolsa destinada al componente SST.
- La interventoría realizó seguimiento y acompañamiento al contratista de obra, enfocando sus actividades en la revisión documental, verificación de cumplimiento normativo y control de la ejecución de las actividades programadas, conforme a los lineamientos establecidos en el marco del proyecto

De manera general, la interventoría cumplió con su rol de implementación del SG-SST, evidenció cumplimiento en la ejecución de actividades propias, tales como, inducción de ingreso y evaluación, diligenciamiento de perfil sociodemográfico, ejecución de charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones, seguimiento a indicadores de ausentismo, así como recorridos a obra, mesas de trabajo, apoyo al contratista y verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y Salud en el Trabajo.

- La interventoría informa que los soportes de nómina correspondientes al mes de abril de 2026 serán enviados junto con los insumos del mes de mayo de 2026, debido a que el tiempo disponible para la entrega de informes es limitado y no ha permitido completar su digitalización oportunamente.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

12. RECOMENCACIONES

- Se recomienda al contratista de obra acatar lo estipulado en los lineamientos generales de seguridad y salud en el Trabajo, emitidos por la Gobernación de Antioquia, en los cuales se estipula el procedimiento de la entrega de insumos para el informe de la interventoría
- Se le solicita al contratista de obra remitir los documentos pendientes correspondientes a las nóminas de las quincenas del mes de marzo y de la segunda quincena del mes de abril, los cuales deberán ser incluidos dentro de los insumos documentales del mes de mayo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el corte de la información se realiza cada 25 días del mes, razón por la cual las nóminas correspondientes a la segunda quincena no alcanzan a ser recibidas dentro del periodo de evaluación en curso. En este sentido, es importante precisar que dichas nóminas deben ser aportadas de manera oportuna junto con los insumos del periodo inmediatamente siguiente, garantizando así la trazabilidad y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.

- Conforme a los insumos reportados por el contratista para el informe del mes de abril de 2026, se le recomienda al contratista para el próximo periodo dar cumplimiento a lo contemplado en plan anual de trabajo, el desarrollo e implementación de la matriz de peligros aterrizada al proyecto y a las actividades contempladas, por otra parte, como se contempla en los lineamientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, las capacitaciones realizadas al personal, deben ser evaluadas y remitir los soportes de estas en los insumos del mes .

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORREDOR VIAL PUEBLO RICO – SAN JOSÉ - ANDES	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

13. ANEXOS DOCUMENTALES CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25/INTERVENTORIA SADING GROUP SAS.

Dentro del informe mensual del mes de abril 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden.

- Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra/interventoría
- Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del contratista).
- Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra. Se indica por el contratista que no se realizan actividades de alto riesgo para este periodo de abril_26
- Anexo 8. Comité Copasst 2013/86.
- Anexo 9. Comité Cocola 3461 de 2025
- Anexo 12. PESV.
- Anexo 13. Plan de manejo de tránsito (PMT)
- Anexo 14. Protocolo de bioseguridad obra
- Anexo 15. Documentos de ingreso abril 2026
- Anexo 16. Contrato o certificado laboral abril 2026
- Anexo 17. Inducción y evaluación abril de 2026
- Anexo 18. Entrega de EPP abril de 2026
- Anexo 19. Dotación interventoría
- Anexo 20. Perfil Sociodemográfico.
- Anexo 21. Seguridad Social mes vencido
- Anexo 22. Nóminas.
- Anexo 23. Inspecciones de seguridad
- Anexo 24. Registro Fotográfico.
- Anexo 25. Liquidaciones, sin soportes
- Anexo 26. Listado de personal.
- Anexo 27. Reportes diarios abril de 2026
- Anexo 28. Presupuesto obra abril de 2026
- Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Legal
- Anexo 31. Accidentalidad.
- Anexo 32. Ausentismo Andes/Pueblorrico.
- Anexo 33. Capacitaciones.
- Anexo 34. Análisis y conclusiones, contenidos en el documento informe numero 3 mes de abril de 2026.
- Anexo 35. Comunicaciones.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
