

Medellín, 01 de septiembre 2026

1300 2659

Señor:

Juan Diego Aguirre Londoño

Director de Desarrollo Físico Gobernación d

Radicado: R 2026010591332

Fecha: 02/09/2026 11:24:55.0

Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero Juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y tramite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260072 lote # 2 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.

Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- Informe No 1 del 23 de enero de 2026 a el 31 de enero de 2026 titiribí- armenia
- pág. 1 – 19
- Anexo memoria USB informe No 1
- Informe No 2 del 01 febrero de 2026 a el 28 febrero de 2026 titiribí- armenia
- pág. 20 – 42
- Anexo memoria USB informe No 2
- Informe No 3 del 01 marzo de 2026 a el 30 marzo de 2026 titiribí- armenia
- pág. 43 – 68
- Anexo memoria USB informe No 3
- Informe No 4 del 01 abril de 2026 a el 30 abril de 2026 titiribí- armenia
- pág. 69 – 96
- Anexo memoria USB informe No 4

Recibí


02-09-2026
11:00 am

ARCHIVO SIE
2026 SEP 15 7:49:34

- Informe No 5 del 01 mayo de 2026 a el 31 de mayo de 2026 titiribí- armenia
- pág. 97 – 127
- Anexo memoria USB informe No 5
- Informe No 6 del 01 junio de 2026 a el 30 de junio de 2026 titiribí- armenia
- pág. 128 – 201
- Anexo memoria USB informe No 6

Cordialmente


CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Duberney Concha Marin		31/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES <i>Contrato de Interventoría</i> <i>No 20260072 DE 2025</i> INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	---	---



**INFORME SST MENSUAL
DE INTERVENTORÍA No 04**

**GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA**

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**CONTRATO DE OBRA
N° 2500111B2821 DE 2025**

ANTIOQUIA

INTERVENTORÍA




ANTIOQUIA,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	--	---

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 04

ENTIDAD CONTRATANTE	Gobernación de Antioquia – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EL PROGRESO
CONTRATO DE OBRA N°	2500111B2821 de 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)
INTERVENTORÍA	CONSORCIO TEMPORALES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	20260072 de 2025
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2) A CARGO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PERIODO	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	--	---

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría	 Nubia Inés Gil Carmona	1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	1
REVISÓ	Representante legal	 Juan Guillermo Tobón Posada		
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF			

↓
David David Jiménez.
Profesional SST



Tabla de contenido

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 04.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. Alcance.....	5
2. OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo General.....	5
2.2. Objetivos Específicos.....	5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
3.1. Localización Subregiones de Occidente Antioqueño:	6
3.2. Actividades por ejecutar y alcance:.....	8
3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección	9
4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	10
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	10
4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA.....	10

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	--	---

LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO 11

6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA..... 17

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST..... 19

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO 19

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO: 19

 a. Seguridad Social..... 20

 b. Presupuestos 21

c. Anexos contratista e interventoría: 21

 d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: 22

 e. Subprograma de higiene industrial: 22

 f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo..... 22

 g. Accidentes laborales presentados en el periodo..... 22

 h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos..... 23

 i. Registro fotográfico:..... 23

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN..... 26

12. RECOMENDACIONES..... 27

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	---	---

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Alcance

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

SUBREGIÓN OCCIDENTE	
CORREDOR	CÓDIGO (S) DE VÍA
Ebéjico - Heliconia - Medellín	62AN17
Sopetrán - Horizontes - Belmira	62AN15
Frontino - Nutibara	62AN08, 05284VT66
Titiribí - Armenia	60AN08-1
Miserenga - Ebéjico	62AN17

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la subregión occidente (lote 2) a cargo del departamento de Antioquia.

2.2. Objetivos Específicos

- Verificar, controlar y certificar que la ejecución de las obras se realice dentro de los plazos establecidos.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

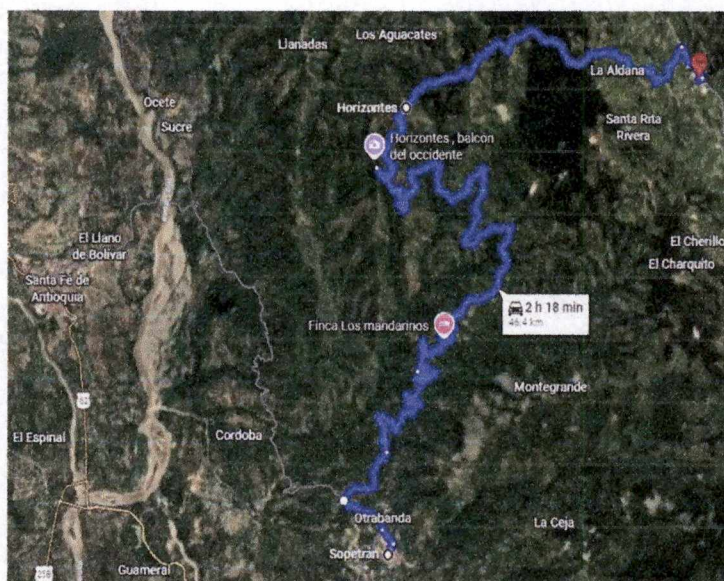
- Hacer cumplir los estándares técnicos, normativos y de calidad requeridos, asegurando la correcta aplicación de los materiales, la metodología constructiva, los procedimientos de control de calidad y la adecuada gestión ambiental, de modo que se preserven la capacidad estructural y la seguridad vial de los corredores objeto del contrato.
- Asegurar que se realice una correcta utilización de los recursos económicos asignados a las obras y realizar un seguimiento integral al avance de las mismas para generar los respectivos informes detallados sobre el estado del proyecto y proponer las acciones correctivas a que haya lugar.
- verificar y garantizar que todas las actividades desarrolladas por el contratista de obra se ejecuten conforme a las especificaciones generales de construcción.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización Subregiones de Occidente Antioqueño:



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---



Fuente: Google Maps

Ilustración 1 Vía Sopetrán – Horizontes _ Belmira

Sopetrán es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Olaya, por el este con el municipio de Belmira, por el sur con los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, y por el oeste con el municipio de Santa Fe de Antioquia. Su cabecera dista 40 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 223 kilómetros cuadrados.

La vía objeto de intervención es tradicionalmente una trocha de tierra, transitable en motos de enduro/trail y vehículos altos, con tramos en regular estado. Actualmente, se encuentran pavimentados algunos tramos entre el corregimiento de Horizontes y Sopetrán.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

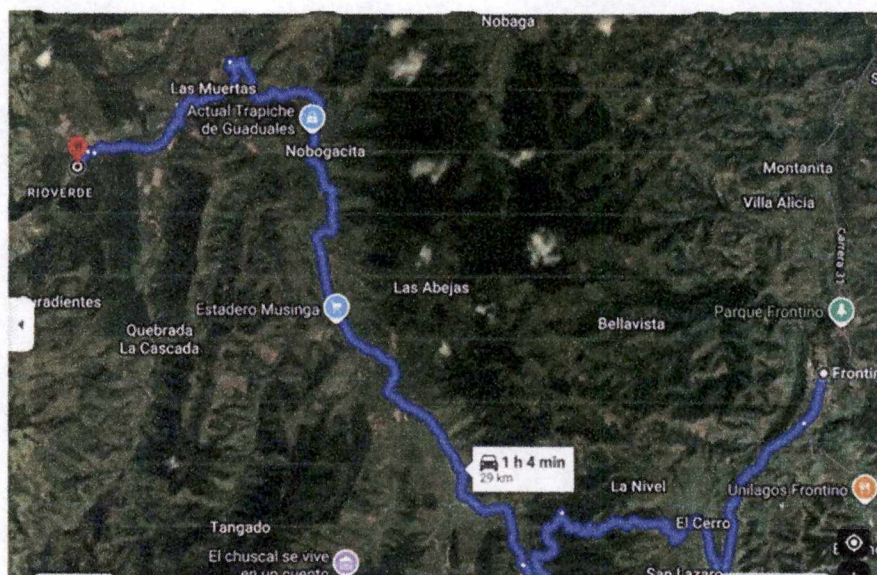


Ilustración 2 Vía Frontino Nutibara

Frontino es un municipio de Colombia ubicado en el occidente del departamento de Antioquia, conocido como "el tesoro oculto" o el páramo antioqueño. Fundado en 1806, destaca por sus paisajes montañosos, cultura panelera, fuerte presencia indígena Emberá Catío y su centro histórico colonial con la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

El corredor vial objeto de intervención es tradicionalmente una trocha de tierra, transitable en motos de enduro/trail y vehículos altos, con tramos en regular estado. Actualmente, se encuentra pavimentado un tramo 1,5 km entre la cabecera municipal y la salida hacia zona rural.

3.2. Actividades por ejecutar y alcance:

Con la presente intervención, se pretende incrementar la calidad de vida y bienestar para los habitantes del sector y los potenciales usuarios de las vías, garantizando la conectividad local y regional, lo que permitirá mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente, alcanzando los factores de operación, seguridad y confort mínimos exigidos por la normatividad, esto se proyecta mediante la ejecución de las siguientes productos generales que se encuentran y dependen de los presupuestos de cada lote y cada tramo vial correspondiente, para el caso de la vía Sopetrán – Horizontes

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES <i>Contrato de Interventoría</i> <i>No 20260072 DE 2025</i> INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	---	---

– Belmira y el otro frente de trabajo Frontino – Horizontes, se pretende la ejecución de las siguientes actividades constructivas:

- Realizar estudio de caracterización del suelo subrasante, material superficial y diseño de la fórmula de trabajo de La estabilización siguiendo la normativa vigente del INVIAS.
- Construcción de alcantarillas.
- Construcción de cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de filtros para cunetas
- Construcción de disipadores
- Construcción y estabilización con material granular
- Construcción de una superficie de rodadura en tratamiento superficial doble
- Construcción de señalización vial

3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

Desde la interventoría se verificó la instalación y mantenimiento de la señalización vial (PMT) simultáneamente a las labores de ampliación de vía, garantizando la visibilidad de los puntos críticos para usuarios y trabajadores. El contratista Consorcio el progreso contó con personal auxiliar de tránsito certificados, quienes apoyaron el ingreso y salida de vehículos y maquinaria en la obra.

Elementos de protección personal

La interventoría realizó verificación del suministro de los elementos de protección personal a los auxiliares de tránsito y ayudantes de obra del contratista y las reposiciones por deterioro de los mismos.

El contratista para el mes de abril de 2026 realizó la entrega de dotación (camisa, pantalón, calzado de seguridad y elementos de protección personal) al personal nuevo. La evidencia de esta entrega se puede verificar en el anexo 18. Entrega de EPP y anexo 19. Entrega de dotación.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	2500111B2821 de 2025
Fecha de Suscripción	10 DE FEBRERO DE 2026
Identificación del Proceso en SECOP	
Objeto	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)
Contratista	CONSORCIO EL PROGRESO
Nit.	902.017.242-2
Representante Legal	SANDRA GARCIA
Valor del contrato	\$104.855.613.958
Anticipo entregado al contratista (15%)	\$15.728.342.093.7 (Aun no se entrega)
Fecha de inicio	10 DE FEBRERO de 2026
Plazo inicial	18 MESES
Fecha de terminación	10 DE AGOSTO 2027
Fecha de reinicio	
Fecha de terminación	
Interventor	CONSORCIO TEMPORALES

4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
--

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	---	---

Contrato de Interventoría No.	20260072 de 2025
Fecha de Suscripción	23 DE ENERO DE 2026
Identificación del Proceso en SECOP	
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA SUBREGION OCCIDENTE (LOTE2) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Interventoría	CONSORCIO TEMPORALES
Nit.	902.022.661-5
Representante Legal	JUAN GUILLERMO TOBON POSADA
Valor del contrato	\$ 7.853.059.284
Anticipo entregado al contratista (15%)	
Fecha de inicio	23 DE ENERO DE 2026
Plazo inicial	19 MESES
Fecha de terminación	23 DE AGOSTO DE 2027
Fecha de reinicio	
Fecha de terminación	
Supervisor	

LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

Tabla 3 LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	LEIDY MARCELA PIEDRAHITA SERNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.000.411.687	CONSORCIO EL PROGRESO	5/02/2026	

Objeto del contrato de interventoría.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

2	JESUS MARIA AYALA GONZALEZ	ENCARGADO DE OBRA	70928011	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
3	RENZO FERNANDO CASTRILLON JIMENEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	98504487	CONSORCIO EL PROGRESO	23/02/2026	
4	KATHERINE GARCIA RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1042708755	CONSORCIO EL PROGRESO	27/02/2026	14/03/2026
5	OSCAR MARIO MUÑETON MACIAS	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1007074966	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
6	CRISTIAN CAMILO MURIEL USUGA	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1042709773	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
7	ANDRES FELIPE PAJARO PATIÑO	INGENIERO RESIDENTE CIVIL	1067865644	CONSORCIO EL PROGRESO	5/01/2026	
8	MARICELLY LOPEZ ZAPATA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.038.332.594	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
9	ANA ARLENY SILVA GARCES	RESIDENTE SST	1.038.336.371	CONSORCIO EL PROGRESO	23/02/2025	
10	JAIRO JAVIER LOPEZ GALVIS	OPERADOR	15.961.990	CONSORCIO EL PROGRESO	24/02/2026	
11	MANUEL LORENZO MURILLO ANDRADE	OPERADOR	1.039.686.627	CONSORCIO EL PROGRESO	20/02/2026	
12	JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO	RESIDENTE OBRA	4.180.080	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
13	CESAR AUGUSTO ISAZA CASTRILLON	SUPERVISOR DE OBRA	3.588.787	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	
14	JUAN FERNANDO SARRAZOLA ROLDAN	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	3482877	CONSORCIO EL PROGRESO	17/02/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

15	BELARMIN ANTONIO LOPEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	71023580	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	31/03/2026
16	DIEGO LEON MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1038337721	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
17	EMERSON GONZALEZ CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1038927240	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
18	HECTOR HERNAN RAMIREZ ALVAREZ	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	98698790	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
19	DUVAN ALCIDES HERRERA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	1041631427	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
20	WILSON DAVID BAILARIN DOMICO	AYUDANTE DE OBRA	1007440327	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
21	MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1001581076	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
22	SEBASTIAN MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1038927085	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
23	JOSE ARMANDO MONTOYA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	1001580411	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
24	JUAN CARLOS PENAGOS REYES	RESIDENTE SST	1106483875	CONSORCIO EL PROGRESO	21/02/2026	
25	YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO	RESIDENTE CIVIL DE OBRA	28951310	CONSORCIO EL PROGRESO	2/26/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

26	NIDIA SORAIDA VASQUEZ ARTEAGA	RESIDENTE SOCIAL	43452148	CONSORCIO EL PROGRESO	24/02/2026	
27	HERNAN DE JESUS LONDOÑO PEÑA	CONDUCTOR	15322099	CONSORCIO EL PROGRESO	10/12/2012	
28	MATEO URREGO LAINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1020457132	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
29	EMERSON ANDREY LARA ESPINOSA	AYUDANTE DE OBRA	1000875066	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA EGRESO DE
30	LUIS ELMER ORTIZ MENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	94462511	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
31	JHAN CARLOS ORTIZ MÚNERA	AYUDANTE DE OBRA	1001845530	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
32	LEONANRDO ECHEVERRY BEDOYA	AYUDANTE DE OBRA	3538332	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
33	SANDRO DE JESUS SERNA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	98454198	CONSORCIO EL PROGRESO	26/02/2026	
34	COLORADO PARRA DUBER EDWIN	OPERADOR	75060447	MINOICA	10/03/2026	
35	NOHABA GRACIANO VICTOR IVAN	AYUDANTE DE OBRA	1038927534	CSC EL PROGRESO	10/03/2026	
36	DOMICO MILTON	AYUDANTE DE OBRA	1040794352	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
37	VELASQUEZ SALAS JUAN ESTEBAN	AYUDANTE DE OBRA	1001581118	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

38	SALAS PEREZ IVAN DARIO	AYUDANTE DE OBRA	8085531	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
39	SEPULVEDA SEPULVEDA FELIPE ESNEIDER	AYUDANTE DE OBRA	1038926986	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
40	POSSO VARELAS DIOMAR ALEXIS	AYUDANTE DE OBRA	1039284669	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
41	RAMOS NUÑEZ IVAN ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	14135215	CSC EL PROGRESO	18/03/2026	
42	GARCIA POSADA PAOLA ANDREA	AYUDANTE DE OBRA	1038926693	CSC EL PROGRESO	17/03/2026	

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
43	CARLOS ANDRES RIASCOS RAMIRES	LABORATORISTA	1036604727	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
44	RENTERIA MORENO CIPRIAN	LABORATORISTA	11794184	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
45	JAIRO ALONSO URREGO	LABORATORISTA	1128478336	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
46	ASPRILLA MENA WILBER	LABORATORISTA	1077444142	CONSORCIO EL PROGRESO	2/03/2026	12/03/2026
47	YOJAN ESTIVEN AGUIRRE TOBON	AYUDANTE DE OBRA	1002103301	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	
48	IVAN DARIO FLOREZ FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	1013537040	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	
49	ALEJANDRO GARCIA FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	1042709410	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	
50	JONATHAN METAUTE MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	1042706786	CONSORCIO EL PROGRESO	14/03/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

51	ERMINSON GUISAO DELGADO	OFICIAL DE OBRA	1045520233	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
52	JUAN JOSE ESTRADA URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1011512757	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
53	YEISON ADRIAN MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	1018230523	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
54	JAIME ALONSO SAUCEDA	AYUDANTE DE OBRA	98481182	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
55	OMAR TAMAYO NUNO	AYUDANTE DE OBRA	1017930018	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
56	SANTIAGO VAHOS SAMPEDRO	AYUDANTE DE OBRA	1042710025	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
57	JUAN JOSE ESTRADA URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1011512757	CONSORCIO EL PROGRESO	10/03/2026	
58	JOSE DAVID SEPULVEDA SALAZAR	CONDUCTOR	71379420	INTRAMAQ	10/03/2026	
59	ELKIN RUEDA HERRERA	OPERADOR	1049349592	CONSORCIO EL PROGRESO	5/03/2026	
60	DAYRON RIVERA VARGAS	CONDUCTOR	71054125	CONSORCIO EL PROGRESO	16/03/2026	23/03/2026
61	DEIBY ALEXANDER MARIN TORRES	OPERADOR	71387590	CONSORCIO EL PROGRESO	26/03/2026	
62	DANIEL FERNANDO FLOREZ	CONDUCTOR	1054996193	CONSORCIO EL PROGRESO	26/03/2026	
63	OSCAR ALEXANDER SEPULVEDA CANO	CONDUCTOR	71310972	CONSORCIO EL PROGRESO	26/03/2026	
64	JHON FREDY HENAO	CONDUCTOR	1059815037	CONSORCIO EL PROGRESO	11/03/2026	
65	RENDON CARLOS ANDRES	OPERADOR	1037323292	INTRAMAQ	10/04/2026	
66	PEREA VALENCIA BLANCA NIEVE	TOPOGRAFIA	1077436785	CONSORCIO EL PROGRESO	11/04/2026	
67	ARANGO LOPEZ SANTIAGO	CONDUCTOR	1002620334	CONSORCIO EL PROGRESO	6/04/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	--	---

68	SANDY LORENA VARGAS CRISTANCHO	TOPOGRAFA	1105611361	CONSORCIO EL PROGRESO	13/04/2026	
69	JHOAN CAMILO HENAO ARIAS	CONDUCTOR	1047973032	CONSORCIO EL PROGRESO	17/04/2026	

6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En la tabla No 4, se relaciona el listado de personal técnico de interventoría.

Nota: Se evidencia Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría y Anexo 26. Listado de personal de obra e interventoría

Tabla 4 LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	JUAN GUILLERMO TOBON POSADA	RESIDENTE CIVIL	71776136	CONSORCIO TEMPORALES	23/01/2026	
2	CARLOS MEJIA	RESIDENTE CIVIL	112836805	CONSORCIO TEMPORALES	23/01/2026	
3	JHON ALEXANDER GOMEZ	TOPOGRAFO	1096956411	CONSORCIO TEMPORALES	16/02/2026	
4	JHON FREDY CUARTAS MEJIA	AUX TOPOGRFIA	1040733652	CONSORCIO TEMPORALES	16/02/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

5	DIANA CAROLINA VASQUEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	1020447060	CONSORCIO TEMPORALES	16/02/2026	17/03/2027
6	YULIANIS MARRIET SIERRA LONDOÑO	DIRECTORA INTERVENTORIA	32182315	CONSORCIO TEMPORALES	03/03/2026	17/04/2026
7	FRAMBEY CUELLO	PROFESIONAL AMBIENTAL	1122404244	CONSORCIO TEMPORALES	16/03/2026	
8	NUBIA INES GIL CARMONA	PROFESIONAL SST	42683118	CONSORCIO TEMPORALES	9/03/2026	
9	DIANA MILENA HERNANDEZ	PROFESIONAL SOCIAL	1017169820	CONSORCIO TEMPORALES	3/03/2026	17/03/2026
10	NATALIA RIOS GIRALDO	PROFESIONAL SOCIAL	1053797926	CONSORCIO TEMPORALES	16/03/2026	
11	BRAYAN GRAJALES	TECNOLOGO AUX INTERV	1094942155	CONSORCIO TEMPORALES	9/03/2026	
12	OMAR ZACARIAS AMAYA	TECNOLOGO AUX INTERV	71780175	CONSORCIO TEMPORALES	2/03/2026	
13	MARIA CAMILA CANO VELEZ	SECRETARIA ADMON	1006635089	CONSORCIO TEMPORALES	7/03/2026	
14	MARIANA OTALVARO ZEA	SECRETARIA ADMON	1000412842	CONSORCIO TEMPORALES	2/03/2026	
15	PAULA ANDREA HERNANDEZ DUCUARA	RESIDENTE SST	52198193	CONSORCIO TEMPORALES	06/04/2026	30/04/2026
16	FABIAN LEANDRO FORERO MARTINEZ	RESIDENTE CIVIL	5428444	CONSORCIO TEMPORALES	16/04/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES <i>Contrato de Interventoría</i> No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	--	---

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST

Se evidencia el Sistema de Gestión SST totalmente implementado por el contratista, Consorcio El Progreso basado en el Decreto 1072 de 2015 y su estructura se organiza de acuerdo al cumplimiento de los Estándares Mininos, establecidos en el de la resolución 0312 de 2019. Desarrollados bajo la metodología del ciclo PHVA.

Se verificó el plan de trabajo anual, cuenta con la matriz de peligros, cronograma de actividades, se presentaron actas de comités de convivencia y COPASST. Presentó auto evaluación a los estándares mínimos, no presentan la calificación por la ARL por ser un consorcio creado hace menos de un año. Se evidenció implementación del PMT, del PESV, se tiene el protocolo de bioseguridad, se revisó el presupuesto de sst, se tiene la metodología para registrar el seguimiento al ausentismo y la accidentalidad, se realizaron capacitaciones al personal, se evidencia la entrega de dotación y la entrega de epp, se evidencia seguimiento a las recomendaciones y restricciones de los exámenes médicos.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la interventoría, se encuentra en construcción, siguiendo los lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019.

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO

Desde la interventoría se realizó seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se verificó el cumplimiento de las disposiciones legales, contractuales en materia de seguridad y salud ocupacional, buscando prevenir accidentes, enfermedades laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores. Se verificó el cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares de seguridad dispuestos en SG-SST del contratista Consorcio El Progreso.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:

El contratista en los frentes de trabajo Frontino y Sopetran realizaron inspecciones de maquinaria amarilla, vehículos, inducciones, charlas 5 min, entrega de dotación y de epp,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	---	---

pausas activas, acompañamiento sst a las actividades. Estas actividades se pueden verificar en el anexo 24. Registro fotográfico de obra de las actividades ejecutadas en la gestión sst.

La interventoría realizó trabajo administrativo con la revisión de ingresos de personal, maquinaria y equipo, acompañamiento en campo y seguimiento a la gestión SST del contratista.

Correos: Con el contratista se tuvo comunicación vía correo electrónico para autorización de ingresos y envío de informes sst mensuales. En el anexo 35. Comunicaciones se puede evidenciar estos.

Oficios: En el anexo 35. Comunicaciones, se pueden evidenciar el oficio enviado con numero consecutivo 098 y el consecutivo 102.

a. Seguridad Social

Para el mes de abril, El Consorcio El Progreso ha realizado los pagos de la seguridad social conforme a los plazos establecidos por la normatividad. Como interventoría, hemos validado que cada trabajador cuente con su cobertura de ARL, salud, pensión, CCF se encuentre al día, con el fin de dar cumplimiento a este requisito legal.

Contratista: En el anexo 21. Seguridad social de obra e interventoría. Se evidencia los aportes al sistema de seguridad social con los radicados de afiliación.

Interventoría: Para el periodo evaluado abril de 2026, la interventoría contó con 2 ingresos de profesionales, los demás integrantes de la interventoría cuentan con planilla de seguridad social.

En el nexo 21. Seguridad Social, se evidencia los aportes al sistema de seguridad social y con los radicados de afiliación.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

b. Presupuestos

La gobernación de Antioquia designó un presupuesto para el corredor **Sopetran - Belimira** un valor de \$ 15.003.305. El contratista Consorcio el progreso ha solicitada un reajuste en este valor ya que es un presupuesto muy limitado para asumir los costos de este componente.

Para el PMT en Sopetran (incluye IVA) un estimado de \$ 291.964.241,00.

Para el corredor **Frontino – Nutibara** Se tiene un presupuesto asignado por la gobernación de Antioquia un valor de \$ 14.414.630 Plan SST.

Para el PMT en Frontino (incluye IVA) un estimado de \$236.983.041,00

c. Anexos contratista e interventoría:

Dentro del informe mensual del mes de abril de 2026, se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden:

- Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra e Interventoría.
- Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del contratista).
- Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
- Anexo 8. Comité Copasst 2013/86 obra e interventoría.
- Anexo 9. Comité Cocola 1010/06 obra e Interventoría.
- Anexo 15. Documentos de ingreso de obra e interventoría.
- Anexo 17. Inducción y evaluación de obra e Interventoría.
- Anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría.
- Anexo 19. Dotación de obra e Interventoría.
- Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría.
- Anexo 21. Seguridad Social de obra e Interventoría.
- Anexo 22. Nóminas de obra e interventoría.
- Anexo 23. Inspecciones de seguridad de obra e interventoría.
- Anexo 24. Registro Fotográfico de obra e interventoría.
- Anexo 25. Liquidaciones de obra e Interventoría.
- Anexo 26. Listado de personal de obra e interventoría.
- Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.
- Anexo 32. Ausentismo general de obra e interventoría.
- Anexo 33. Capacitaciones obra e interventoría.
- Anexo 34. Análisis y conclusiones de obra e interventoría.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES <i>Contrato de Interventoría</i> No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
--	--	---

Anexo 35. Comunicaciones.

d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

El consorcio El Progreso para este periodo realizó las evaluaciones ocupacionales de acuerdo a la legislación vigente y a los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Los resultados de las evaluaciones médicas se le comunican al trabajador por escrito para posterior seguimiento.

Para el periodo en estudio abril de 2026 el contratista realizó 02 exámenes médicos de ingreso para el frente de Frontino y para el frente de Sopetran se realizaron 03 exámenes médicos de ingreso todos con concepto medico aceptable para el cargo.

La interventoría realizó 02 exámenes de ingreso con concepto medico aceptable para el cargo.

e. Subprograma de higiene industrial:

Para este periodo del informe no se realizaron estudios ambientales por parte del contratista, ni por parte de interventoría.

f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista realizó la inducción a (5) personas que ingresaron al proyecto, se capacitaron 34 personas sobre prevención de lavado de activos, 4 trabajadores recibieron capacitación virtual del curso 50 horas SG-SST. Las evidencias de la inducción se encuentran en el Anexo 17. Inducción y evaluación y las evidencias de las capacitaciones en el **Anexo 33**. Capacitaciones

g. Accidentes laborales presentados en el periodo

En el mes de abril de 2026, el indicador de accidentalidad se conserva en cero (0), se refleja la excelente gestión SST en el acompañamiento, divulgación de riesgos, supervisión efectiva al comportamiento y a las condiciones inseguras, se evidenció el compromiso de los trabajadores con el autocuidado, el cumplimiento estricto de los

	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

permisos de trabajo y charlas de seguridad impartidas al personal operativo y de maquinaria.

Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.

h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos

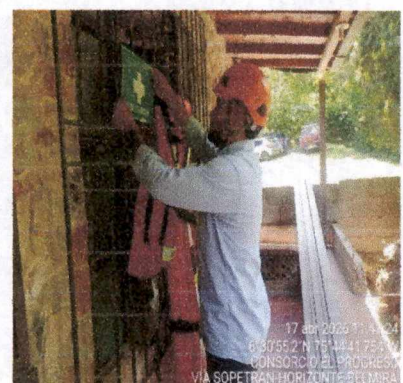
Para este periodo en estudio mes de abril, el consorcio El Progreso siguió el cumplimiento del PESV, se realizaron inspecciones y preoperacionales a los vehículos y maquinaria, se evidenció que los conductores y operadores de maquinaria cumplieron con los requisitos para el desempeño de sus labores.

i. Registro fotográfico:

A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista e interventoría para el mes de abril de 2026:

		
Charla - frente de trabajo de Sopetran	Inducción - frente de trabajo Sopetran	Señalización plan de emergencias - frente de trabajo Sopetran

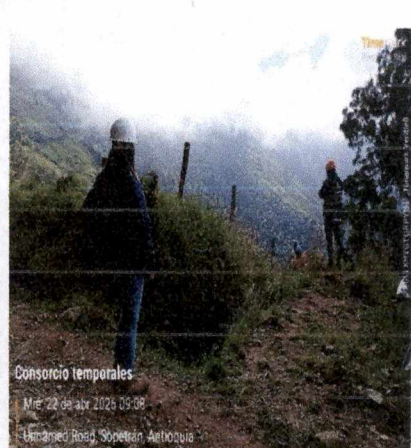
 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

 17 abr 2026 12:01:42 6°30'55.476"N 75°44'42.078"W CONSORCIO EL PROGRESO VIA SOPETRAN-HORIZONTE-BELMIRA	 17 abr 2026 12:01:42 6°30'55.016"N 75°44'42.078"W CONSORCIO EL PROGRESO VIA SOPETRAN-HORIZONTE-BELMIRA	 17 abr 2026 12:01:42 6°30'55.016"N 75°44'42.078"W CONSORCIO EL PROGRESO VIA SOPETRAN-HORIZONTE-BELMIRA
Señalización R. Electrico – frente de trabajo Sopetran	Inspecciones de vehículos – frente de trabajo Sopetran	Mantenimiento a la señalización – frente de trabajo Sopetran
 10 abr 2026 12:01:42 6°30'31.002"N 75°44'33.000"W CONSORCIO EL PROGRESO VIA SOPETRAN-HORIZONTE-BELMIRA	 17 abr 2026 12:01:42 6°30'55.016"N 75°44'42.078"W CONSORCIO EL PROGRESO VIA SOPETRAN-HORIZONTE-BELMIRA	 23 abr 2026 15:29:27 6°58'20.192"N 75°42'33.173"W CONSORCIO EL PROGRESO VIA SOPETRAN-HORIZONTE-BELMIRA
Capacitación virtual _ frente de trabajo Sopetran	Hidratación al personal – frente de trabajo Sopetran	Pausas – frente de trabajo Sopetran
		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

Charla de seguridad– frente de trabajo Frontino	Inducción – frente de trabajo Frontino	Calistenia – frente de trabajo Frontino
 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst	 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst	 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst
Capacitación – frente de trabajo Frontino	Diligenciamiento documental – frente de trabajo Frontino	Punto de emergencia _ frente de trabajo frontino
 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst	 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst	 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst
Implementación PMT– frente de trabajo - Frontino	Señalización de seguridad – frente de trabajo Frontino	PMT – frente de trabajo Frontino
 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst	 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst	 6.776162° N, 76.201089° W 16 de abr 2026 07:11 Frontino Correg. Nutibara / RD62-08, Frontino, Antioquia Paula.sst

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

Acompañamiento SST interventoría - Frontino	Verificación por interventoría - Frontino	Verificación por interventoría - Frontino
		
Verificación PMT - Sopetran	Verificación preoperacionales - Sopetran	Verificación uso de EPP - Sopetran

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

- Se realizó seguimiento y acompañamiento SST al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista Consorcio El Progreso.
- En este periodo abril de 2026 se realizó la revisión de la documentación para el ingreso del personal.
- Se verificó la realización de inducción y capacitación al personal que ingreso al proyecto.
- Se verificó la gestión SST, charlas, capacitaciones, entrega de los EPP, inspecciones a vehículos y maquinaria, hidratación del personal, diligenciamiento de los preoperacionales.
- Durante este periodo, los riesgos identificados en las actividades desarrolladas en la obra fueron: Riesgos Locativos, Riesgos químicos, Riesgos mecánicos, Riesgos Ergonómicos, Riesgos físicos (Ruido, Vibración).
- El periodo cierra con un indicador de cero (0) accidentes de trabajo y cero (0) enfermedades laborales. Este resultado valida la eficacia de la cultura de autocuidado y supervisión de tareas como la limpieza de alcantarillas, ejecución de transversales, ampliación y conformación de la vía.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES Contrato de Interventoría No 20260072 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	--	---

- Se generó dos (2) días de incapacidad por EG de un trabajador por golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo.
- Se verificó la señalización y demarcación en los frentes de trabajo.
- Desde la interventoría se identificó el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito, cuenta con el personal idóneo como auxiliares de tránsito.
- Para este periodo se realizaron preoperacionales e inspecciones de la siguiente maquinaria:
 - 2. Retroexcavadora
 - 2. Vibro compactador
 - 2. Motoniveladora
 - 4. Camionetas
 - 7. volquetas
 - 1. Camión

12. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda al contratista continuar promoviendo hábitos de autocuidado enfocado en una cultura en la prevención de accidentes laborales y enfermedades laborales.
- Se recomienda al contratista continuar con el acompañamiento SST en las actividades constructivas.
- Se recomienda al contratista continuar con la ejecución del cronograma de actividades.
- Asegurar que el punto de acopio de sustancias químicas cuente con la señalización de seguridad, con todos los elementos de contención necesarios (kits de derrames), dique contención derrames.
- Hacer seguimiento a las recomendaciones medicas emitidas en los conceptos médicos ocupacionales.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	CONSORCIO TEMPORALES <i>Contrato de Interventoría</i> <i>No 20260072 DE 2025</i> INFORME SST MENSUAL N° 04	
---	---	---

- Se recomienda seguir con el diligenciamiento de inspecciones periódicas, preoperacionales de maquinaria, equipos y vehículos.
- Se recomienda realizar mantenimiento permanente a la señalización vial.
- Se recomienda instalar cartelera informativa SST con información relevante.
- Se le recomienda al contratista capacitar personal en trabajo seguro en alturas y en espacios confinados.
- Para iniciar cualquier labor ya sea rutinaria o no rutinaria es obligatoria presentar y diligenciar correctamente la documentación reglamentaria de seguridad. Esto garantiza la identificación de riesgos, el cumplimiento legal y la protección del personal.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
