

Medellín, 01 de septiembre 2026

1300 2634

Señor:
Juan Diego Aguirre Londoño
Director de Desarrollo Físico Gobernación de

Radicado: R 2026010591343

Fecha: 02/09/2026 11:28:14.0

Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero Juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y trámite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260029 lote # 5 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.


Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- febrero de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 1 - pág. 1- 12
- Anexo USB Informe No 1
- marzo de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 2 – pág. 13-28
- Anexo USB Informe No 2
- abril de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 3 - pág. 29-44
- abril de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 3 - pág. 45-59
- Anexo memoria USB informes No 3
- mayo de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 4 - pág. 60-76
- mayo de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 4 - pág. 77-91
- Anexo memoria USB informes No 4
- junio de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 5 - pág. 92-108
- junio de 2026 corredor salgar-la quiebra-concordia No 1- pág. 109- 124
- junio de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 5 - pág. 125-139
- Anexo memoria USB informes No 5 y No 1


Recibí
[Firma]
02.09.2026
11:00 am

ARCHIVO SIT
2026 SEP 15 15:32:14

Cordialmente



CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Duberney Concha Marin		31/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 05
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS



**INFORME MENSUAL SST No. 05
INTERVENTORIA
VALPARAÍSO - TÁMESIS**

**GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA**

Secretaría de
Infraestructura Física

**CONTRATO DE OBRA
No. 2500111B2824 de 2025**
Mejoramiento y mantenimiento
para la estabilización de las vías
en la Subregión Suroeste (Lote 5)
a cargo del Departamento
Antioquia.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 20260029**

Interventoría técnica,
administrativa, ambiental,
financiera y legal al contrato de
actividades de mejoramiento y
mantenimiento para la
estabilización de las vías en la
Subregión Suroeste (Lote 5) a
cargo del Departamento
Antioquia.

JUNIO DE 2026




**INTERVENTORÍA: SADING
GROUP S.A.S**



	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 05

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25
CONTRATO DE OBRA N°	2500111B2824 de 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)
INTERVENTORÍA	SADING GROUP S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20260029
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA.
PERIODO	JUNIO DE 2026

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría		Junio 2026	001
REVISÓ	Director de interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST Rentan			


 Reside SIF
 Supervisor SIF
 Jesus David Jimenez
 Profesional SIF

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	ALCANCE.....	5
2.2.	CORREDORES VIALES ESPECÍFICOS (LOTE 5)	5
2.3.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	5
2.4.	REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SUROESTE	6
3.	OBJETIVOS	7
3.1.	OBJETIVO GENERAL	7
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	9
4.1.	LOCALIZACIÓN SUBREGIONES DE SUROESTE ANTIOQUEÑO.....	9
4.2.	ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:	9
4.3.	SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.....	11
5.	INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	12
5.1.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
5.2.	INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA.....	13
6.	LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO	14
7.	LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA.....	15
8.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25.....	16
8.1.	SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.....	16
8.2.	SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL	16
9.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL PERIDO DEL MES DE ABRIL DE 2026.....	21
10.	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	26
10.1.	ANÁLISIS.....	26
10.2.	EVALUACIÓN.....	27
11.	CONCLUSIONES	28
12.	RECOMENCACIONES.....	29
13.	ANEXOS DOCUMENTALES CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25/INTERVENTORIA SADING GROUP SAS.....	30

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de ejecutar el **mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia**, se suscribió el Contrato de Obra No. 2500111B2824 de 2025 entre la Gobernación de Antioquia y el CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025, cuyo objeto corresponde a la ejecución de las **actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 5 – Suroeste)**.

De igual manera, el 05 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 20260029 entre RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. y la empresa SADING GROUP S.A.S., cuyo objeto es **la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal** del contrato de obra para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento en la subregión Suroeste (Lote 5), a cargo del Departamento de Antioquia.

El presente informe tiene como objetivo presentar un panorama claro y conciso de las acciones implementadas y los resultados obtenidos en la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el período evaluado.

Asimismo, se exponen las principales dificultades y/o novedades registradas en dicho período, junto con las acciones adoptadas por la Entidad Contratante, el Contratista y la Interventoría para su atención y seguimiento.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

2. ALCANCE

El alcance específico para el corredor vial Valparaíso – Támesis que hace parte de la subregión del Suroeste (identificada como el Lote 5 en el proceso de contratación) es el siguiente:

2.1. EXTENSIÓN Y OBJETIVOS EN EL SUROESTE

Longitud a intervenir: Se tiene proyectada la intervención de 68,26 km, lo que representa el 7% del total de la red vial a cargo del departamento en esta subregión. Municipios beneficiados: La subregión está conformada por 23 municipios, entre ellos Amagá, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Jardín, Jericó, Salgar, Támesis, Tarso, Urrao y Venecia.

Objetivo técnico: Realizar el mantenimiento de corredores de Bajo Volumen de Tránsito (LVR) utilizando técnicas de estabilización de suelos con cemento o cal, en lugar de la recarga tradicional con materiales granulares.

2.2. CORREDORES VIALES ESPECÍFICOS (LOTE 5)

El proyecto detalla los tramos exactos de intervención en el Suroeste y el tiempo estimado de obra para cada uno:

- Abejorral – Santa Bárbara: Plazo de obra de 4 meses.
- Titiribí – Armenia: Plazo de obra de 8 meses.
- Salgar – La Quiebra – Concordia: Plazo de obra de 10 meses.
- Valparaíso – Támesis: Plazo de obra de 12 meses.
- Andes – San José – Pueblorrico: Plazo de obra de 12 meses.

2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las siguientes obras o actividades:

PRODUCTO LOTES 5:

- Realizar estudio de caracterización del suelo de subrasante, material superficial y diseño de la formula trabajo de la estabilización siguiendo la normativa vigente del INVIAS
- Construcción de Alcantarillas
- Construcción de Cunetas

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

- Construcción de Bordillos
- Construcción de Filtros para Cunetas
- Construcción de Disipadores
- Construcción Estabilización con Material Granular
- Construcción de una superficie de rodadura en tratamiento superficial doble.
- Construcción Señalización vial

2.4. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SUROESTE

Para la ejecución en esta zona, el contratista debe garantizar:

Frentes de trabajo: Como mínimo dos (2) frentes de trabajo realizando actividades de estabilización, más un frente adicional para actividades complementarias.

Personal clave: Un Director de Obra dedicado por 12 meses y dos profesionales del área social (uno por 8 meses y otro por 12 meses). Cada tramo específico deberá contar con su propio Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST, Topógrafo y Profesional de Calidad.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento mediante la técnica de estabilización de suelos en las vías a cargo del Departamento de Antioquia, en el corredor vial Valparaíso – Támesis, con el fin de garantizar la transitabilidad, seguridad vial y conectividad de la subregión bajo criterios de sostenibilidad técnica y económica.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Técnicos y Operativos:**

Ejecutar la estabilización de la estructura de la vía utilizando materiales químicos (cemento o cal) según el diseño de mezcla establecido para corredor vial Valparaíso – Támesis.

Aplicar una superficie de rodadura mediante doble riego asfáltico para proteger la base estabilizada y mejorar el confort del tránsito.

Intervenir y mantener las obras de drenaje (cunetas y alcantarillas) para asegurar la evacuación de aguas y prolongar la vida útil de la calzada.

Garantizar la correcta señalización horizontal y vertical de los corredores intervenidos para mejorar la seguridad de los usuarios.

- **Socio-Ambientales y de Seguridad:**

Implementar el Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) exigido por la Gobernación de Antioquia.

Mitigar los impactos ambientales y sociales negativos que puedan surgir durante la ejecución de las obras en los municipios beneficiados.

Garantizar la seguridad física y la salud de los trabajadores y comunidades aledañas mediante el cumplimiento estricto de la normativa de riesgos laborales.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

- **Administrativos y de Información:**

Cumplir con los plazos de ejecución establecidos para cada tramo (que oscilan entre 4 y 12 meses según el corredor).

Realizar el inventario y caracterización técnica de las vías intervenidas para alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Secretaría de Infraestructura Física.


Estos objetivos están alineados con el propósito del Lote 5 del contrato, que busca una solución más duradera que el mantenimiento tradicional en una de las regiones con topografía más exigente del departamento.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la ejecución de intervenciones de mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo en corredores viales estratégicos del Suroeste de Antioquia. A diferencia del mantenimiento rutinario tradicional, esta iniciativa se centra en la estabilización físico-química de suelos para transformar vías de afirmado (tierra) en corredores con una estructura más resistente y duradera, mejorando la competitividad agrícola y turística de la región.

4.1. LOCALIZACIÓN SUBREGIONES DE SUROESTE ANTIOQUEÑO:

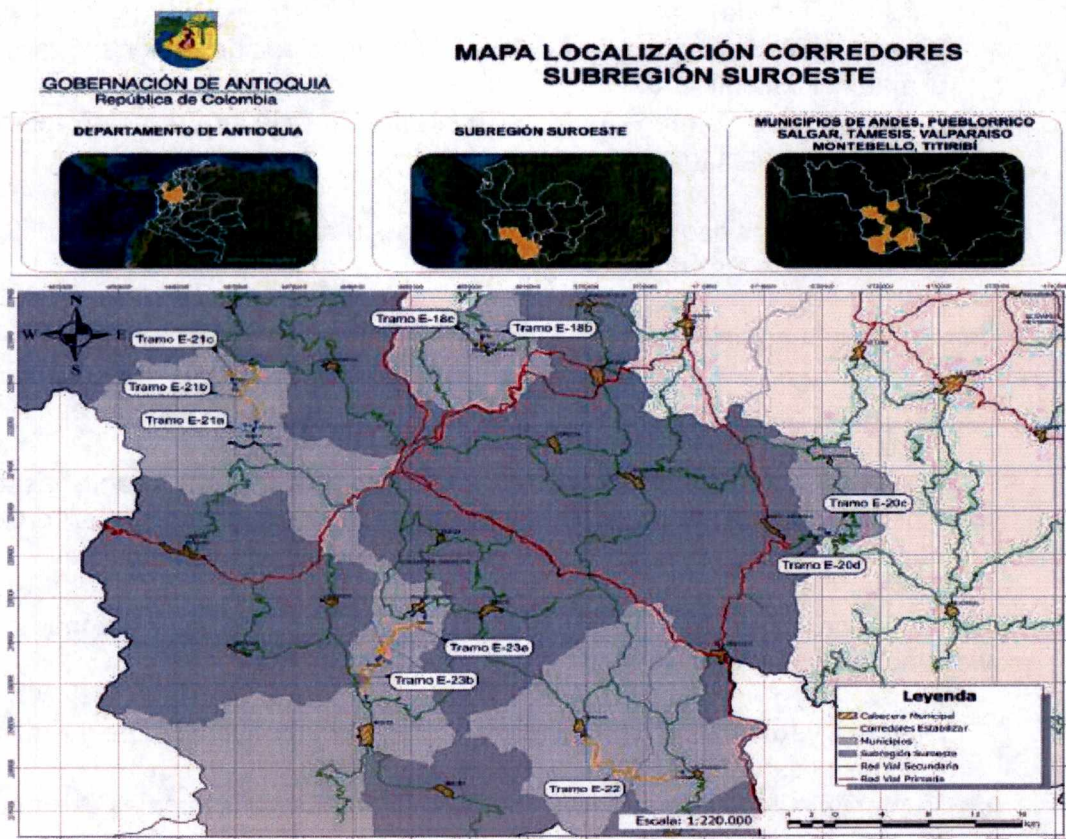

4.2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

1. Actividades Preliminares y de Soporte Localización y Replanteo:

- Definición técnica de los ejes viales y áreas de intervención exacta según los planos.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

- Gestión Socio-Ambiental y SST: Implementación de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto incluye la señalización preventiva de obra y la protección del personal y la comunidad.
 - Caracterización de Suelos: Ensayos de laboratorio para determinar si la estabilización se hará con cemento o con cal, dependiendo de la plasticidad y humedad del terreno.
2. Estabilización de la Subrasante o Afirmado es la actividad principal del proyecto. El alcance incluye:
- Escarificación y Homogeneización: Se disgrega el material existente en la vía (suelo o afirmado).
 - Distribución del Conglomerante: Aplicación controlada de cemento o cal sobre el material escarificado.
 - Mezclado: Uso de maquinaria especializada (recicladora o motoniveladora) para integrar el químico con el suelo.
 - Compactación: Nivelación y compactación con rodillo vibratorio hasta alcanzar la densidad máxima permitida, asegurando que la vía no se deforme con el peso de los vehículos.
3. Tratamiento de Superficie (Rodadura) una vez estabilizada la base, se protege con:
- Imprimación: Aplicación de una emulsión asfáltica que penetra en la base estabilizada para sellarla.
 - Doble Riego Asfáltico: Aplicación de dos capas de ligante asfáltico intercaladas con agregados pétreos (gravilla). Su alcance es proporcionar una superficie impermeable, mejorar la tracción y eliminar el polvo.
4. Obras de Drenaje y Manejo de Aguas Dado que el Suroeste es una zona de alta pluviosidad, el alcance incluye:
- Limpieza y Reconstrucción de Cunetas: Asegurar que el agua de lluvia no se empoce ni sature la estructura de la vía.
 - Mantenimiento de Alcantarillas: Limpieza de obras transversales existentes y construcción de cabezales o extensiones si el diseño lo requiere.
5. Señalización y Seguridad Vial
- Demarcación Horizontal: Pintura de líneas centrales y de borde con materiales retro reflectivos.
 - Señalización Vertical: Instalación de señales preventivas, reglamentarias e informativas.

130

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

- Hitos y Defensas: Instalación de elementos de protección en zonas de abismos o curvas peligrosas.
6. Gestión de Información (SIG)
- Levantamiento Post-Obra: Recolección de coordenadas y datos técnicos de la vía finalizada para alimentar el Sistema de Información Geográfica de la Gobernación de Antioquia.

4.3. SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

1. La señalización se define como un componente esencial para garantizar una circulación segura y fluida, reduciendo accidentes en zonas de intervención. Los puntos clave son:

- Implementación Obligatoria: El contratista debe suministrar, transportar e instalar tanto señalización vertical (preventivas, reglamentarias e informativas de 75x75 cm) como demarcación horizontal con pintura acrílica reflectiva y microesferas de vidrio.
- Señalización de Obra: Es responsabilidad absoluta del contratista colocar y mantener vallas informativas, iluminación nocturna y dispositivos de seguridad durante toda la ejecución.
- Control de Tráfico (Pare-Siga): Para actividades iniciales como localización y replanteo, es obligatorio contar con auxiliares de "pare-siga" a ambos lados y delimitar la zona con conos para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía.
- Normativa Aplicable: Se debe cumplir estrictamente con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte (actualizado a 2024).

2. Elementos de Protección y Seguridad (SST)

Gestión de Seguridad: El contratista debe seguir la "Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia".

Responsabilidad Civil y Sanciones: El ejecutor es el único responsable de cualquier multa o sanción derivada de la falta de señalización o dispositivos de seguridad adecuados.

Protección de la Infraestructura: Las labores de transporte de materiales deben realizarse dentro de los límites de carga permitidos para evitar daños a las vías públicas, lo cual es parte integral de la seguridad operativa del proyecto.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

5. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Información del contrato de obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	2500111B2824 de 2025
Objeto	Actividades de mejoramiento y Mantenimiento para la estabilización de las Vías a cargo del de Antioquia (Lote 5 Suroeste)
Contratista	Consortio Vías Antioquia MM 2025, integrado por Wilmar José Moncada Arcila (90%) y Meyan S.A. (10%)
Nit.	902017071-1
Representante Legal	Wilmar Moncada Arcila
Valor del contrato	SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$72.870.090.400) y un A.I.U. del 32,57%.
Anticipo entregado al contratista (15%)	DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$ 10.930.513.560) y el porcentaje (en 15%) del valor del Contrato
Fecha de inicio	05 de febrero de 2026
Fecha de terminación	05 de febrero de 2027
Plazo inicial	DOCE (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Interventor	SADING GROUP SAS

191

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

5.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 2. Información del contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR	
Contrato No.	20260029
Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Contratista	RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Nit.	9011922745
Representante Legal	Juan Carlos Reyes Vanegas
Valor del contrato	Cinco mil seiscientos noventa millones setecientos cincuenta y dos mil trece pesos ml (\$ 5.690.752.013), IVA incluido.
Anticipo entregado al contratista (15%)	N.A.
Fecha de inicio	14 de enero de 2026
Fecha de terminación	14 de febrero de 2027
Plazo inicial	Trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Interventor	SADING GROUP SAS

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

6. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

Tabla 3. listado del personal del contratista

Listado personal contratista Valparaiso_Tamesis						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	Maricela Úsuga Bedoya	Residente	42.123.035	CVAMM25	23/02/2026	
2	Uver Arley Álzate González	Ayudante de obra	1.041.610.847	CVAMM25	6/03/2026	
3	Víctor Hugo Tascón Tascón	Ayudante de obra	1.041.610.261	CVAMM25	6/03/2026	
4	Yefferson Sepúlveda Tangarife	Topógrafo	1.035.857.993	CVAMM25	5/03/2026	
5	Ricardo Martínez López	Conductor	71.330.370	CVAMM25	5/03/2026	
6	Alexander Quinchía Betancur	Ayudante	1.001.772.534	CVAMM25	9/03/2026	
7	Diana Patricia Marín	Ayudante	43.792.427	CVAMM25	12/03/2026	
8	Guillermo Augusto Tascón Vélez	Ayudante	1.001.772.488	CVAMM25	12/03/2026	
9	María Alejandra Bedoya Gonzales	Ayudante	1.045.048.618	CVAMM25	20/04/2026	
10	Jesús Antonio López Zuluaga	Cadenero 1	1.152.190.550	CVAMM25	20/04/2026	
11	Erika Natalia Auzaque García	Residente ambiental	1.049.632.149	CVAMM25	21/04/2026	
12	Beatriz Jackeline Suarez	Residente Social	43.656.020	CVAMM25	19/05/2026	30/06/2026
13	Carlos Alberto Naranjo Barrios	Residente SST	1.110.454.261	CVAMM25	4/05/2026	
14	Cristian Alejandro Correa Barahona	AUX CIVIL	1128386185	CVAMM25	4/05/2026	

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

7. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 4. Listado del personal técnico de interventoría

Listado personal de Interventoría						
CONTRATO No. 20260029						
No	Nombre	Cargo	Cedula	Empresa	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
1	Gamal Cuesta Londoño	Ingeniero Ambiental	8026052	SADING GROUP S.A.S	26/03/2026	
2	Carlos Eduardo Ortiz Vera	Residente interventoría	1110540768	SADING GROUP S.A.S.	14/04/2026	
3	Sandra Milena Giraldo Agudelo	Profesional SST	31430623	SADING GROUP S.A.S.	26/03/2026	
4	Eliane López Portilla	Profesional Social	1098632763	SADING GROUP S.A.S.	26/03/2026	
5	Diego Andrés Suarez Arrubla	Tecnólogo Civil	1152187904	SADING GROUP S.A.S.	21/03/2026	
6	Edilson Antonio Ospina Ruiz	Conductor	70855090	SADING GROUP S.A.S.	12/05/2026	

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

8. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25

Este informe resume la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) presentada por el consorcio Vías Antioquia MM25, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2026, destacando el cumplimiento de la documentación administrativa y operativa de acuerdo con los subprogramas de medicina preventiva y seguridad industrial.

8.1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

- Gestión Documental: continuo la estructuración del soporte documental del plan de trabajo anual bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) para el periodo 2026. La interventoría realizará seguimiento continuo a esta ejecución.
- Exámenes Médicos (Resolución 1843 de 2025): Se gestionó la realización de exámenes ocupacionales de ingreso y egreso, ajustados a la nueva normativa vigente en 2026 que regula el seguimiento a recomendaciones médicas laborales y el acompañamiento de la EPS.
- Vigilancia y Salud: Se establecieron las bases para el perfil sociodemográfico, la realización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el programa de prevención de alcoholismo, tabaquismo y fármaco dependencia.

8.2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL.

Este subprograma, integrado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tiene como objetivo principal la identificación, evaluación y control de los factores ambientales en el entorno laboral para prevenir la aparición de enfermedades laborales.

- Plan de Trabajo Anual: Se presentó el soporte documental correspondiente al Plan de Trabajo Anual para la vigencia 2026, estructurado bajo el ciclo PHVA. La interventoría realizó seguimiento estricto al cumplimiento de las actividades programadas para el mes, evidenciando que estas fueron ejecutadas conforme al cronograma establecido. (Ver Anexo 3. Cronograma de actividades_2026/obra/interventoría).
- Actividades de Alto Riesgo (Alturas): El contratista certificó mediante comunicación escrita que, debido a la naturaleza actual de las obras, no se ejecutaron tareas relacionadas con trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Ver Anexo 4. Alturas

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

4272_21. Obra/ interventoría.

- Espacios confinados: No se reportan evidencias documentales, toda vez que durante el periodo informado no se ejecutaron labores ni ingresos a espacios confinados de acuerdo con el alcance actual de la obra. No obstante, el contratista presentó una certificación que acredita la ausencia de estas actividades en el mes. Ver Anexo 5. Espacios confinados 0491_21. Obra/ interventoría.
- COPASST: Durante el presente periodo se llevó a cabo la reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, dando cumplimiento a la normativa legal vigente aplicable al proyecto y dejando el respectivo soporte documental de su realización. Ver anexo 8. Comité COPASST 2013_1986. Obra/interventoría.
- Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB): Durante el presente periodo se llevó la reunión del comité, cumpliendo con los lineamientos legales orientados a promover un ambiente de trabajo sano y prevenir el acoso laboral. Ver anexo 9. Comité CCL_3461_2025 obra /interventoría.
- Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV): El plan se encuentra en fase de estructuración, diseño e implementación, proceso que inició durante la segunda semana de mayo y que a la fecha continúa en desarrollo. Como avance de esta gestión, el contratista hizo entrega de la autoevaluación correspondiente, la cual permite evidenciar el estado actual del PESV y orientar las acciones necesarias para su cumplimiento (Ver Anexo 12. PESV obra /interventoría).
- Documentos de ingreso del mes junio de 2026: Durante este periodo no se registró ingreso de personal del Contratista como de la interventoría. (Ver Anexo 15 documentos de ingreso obra/interventoría).
- Tabla 5. Consolidado de ingresos de personal hasta el mes de junio de 2026.

FRENTE DE OBRA	EMPRESA	MES	# TRABAJADORES
Valparaiso_Tamesis	Consortio Vías Antioquia MM2025	Marzo	7
Valparaiso_Tamesis	Consortio Vías Antioquia MM2025	Abril	4
Valparaiso_Tamesis	Consortio Vías Antioquia MM2025	Mayo	3
Valparaiso_Tamesis	Consortio Vías Antioquia MM2025	Junio	0

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

- Contratos o certificaciones laborales Durante el presente periodo no se registraron ingresos de personal tanto del Contratista como de la interventoría; por lo tanto, no se adjuntan soportes documentales asociados a contratos o certificaciones laborales Ver Anexo 16. Contrato o certificación laboral obra/ interventoría
- Inducciones SST. Durante el presente periodo, tanto el contratista como la interventoría no realizaron nuevas contrataciones de personal; por lo tanto, no se adjuntan evidencias correspondientes a procesos de inducción. Ver anexo 17. inducción y evaluación obra/ interventoría
- Suministro o reposición de EPP y dotación: Durante el mes de junio se realizó la reposición de elementos de protección personal EPP, tales como guantes de vaqueta. La dotación inicial del personal que ingresó al proyecto fue entregada en el mes de abril, en cumplimiento del artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, al personal de la interventoría se le suministraron gafas de seguridad, protección auditiva, pava para casco y mascarilla para material particulado. Ver anexo 18 y 19. Entrega de EPP y dotación Obra/interventoría
- Perfil sociodemográfico. En cumplimiento de los lineamientos establecidos, se realiza mensualmente la identificación de las características de la población trabajadora que ingresa al proyecto. Se mantiene actualizado el registro tanto del personal activo como de aquel retirado durante la ejecución. El contratista reporta catorce (14) personas registradas en el municipio de Valparaíso. Ver anexo 20. Perfil sociodemográfico obra / interventoría
- Seguridad Social Correspondiente al mes vencida. **Ver anexo 21. Seguridad social obra/interventoría**

Tabla 6. Reporte de seguridad social mes mayo periodo de servicio junio_2026

Empresa	No planilla
CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25	6024702065

- Reporte de nóminas mensual: El contratista Consorcio Vías Antioquia MM2025 entregó una certificación en la que argumenta la reserva de las colillas de pago y los comprobantes de seguridad social. Esto se debe a que dichos documentos contienen información personal y sensible, cuyo tratamiento y divulgación están estrictamente limitados por la Constitución Política de Colombia y la normativa vigente sobre protección de datos. Ver anexo 22. Nóminas mes junio obra/interventoría
- Inspecciones de seguridad: De acuerdo con el programa de inspecciones mensuales establecido para la vigencia 2026, en el siguiente cuadro se relacionan

1934

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

las inspecciones de seguridad realizadas durante el periodo. Ver Anexo 23.
Inspecciones de seguridad obra/interventoría.

Tabla 7. Relación inspecciones de seguridad del mes de junio_2026

Registro de inspecciones			
Orden y aseo	fecha	profesional SST	cantidad
Camilla de emergencia	15-06-26	Carlos Naranjo	1
Extintores	14-06-26	Carlos Naranjo	1
Herramientas	20-06-26	Carlos Naranjo	1
Instalaciones	13-06-26	Carlos Naranjo	1
Botiquín de primeros auxilios	14-06-26	Carlos Naranjo	1
EPP	20-06-26	Carlos Naranjo	1
Orden y aseo	20-06-26	Carlos Naranjo	1

- Anexo de registro fotográfico Este apartado contiene la evidencia fotográfica de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) más relevantes ejecutadas durante el mes de junio de 2026. Ver anexo 24. Registros fotográficos obra/interventoría
- Liquidaciones del periodo: Durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2026, no se registraron novedades de retiro de personal en el proyecto, tanto por parte del contratista como de la interventoría; por lo cual, no se adjuntan soportes asociados a liquidaciones laborales.
- Listado de personal: Con fecha de corte al 25 de junio de 2026, el proyecto cuenta con un consolidado de 14 trabajadores localizados en el frente de obra de Valparaíso. Ver anexo 26. Listado de personal obra/interventoría
- Reportes informes diarios: Se consolidaron los informes diarios de obra, los cuales documentan las actividades ejecutadas por el contratista en el frente de trabajo durante el mes de abril. Ver anexo 27. Reportes diarios Obra/interventoría
- **Certificados de Revisor Fiscal y representante Legal;** El contratista aportó la documentación contable debidamente suscrita por el profesional; sin embargo, adjuntó una carta en la que justifica la no entrega del certificado reglamentario. En dicho documento, manifiesta que este se encuentra en trámite de actualización de datos y validación de antecedentes ante la Junta Central de Contadores. Con el fin de acreditar la idoneidad pactada en el contrato, el contratista se comprometió a radicar el soporte faltante como un alcance al informe mensual durante la segunda

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

semana de junio, una vez sea expedido por la plataforma estatal. (Ver anexo 30).
Certificados Revisor fiscal y representante legal Obra/interventoría

- **Anexo reporte de accidentalidad:** Durante el mes de junio no se registraron accidentes de trabajo en el proyecto. Asimismo, el personal de la interventoría no reportó novedades asociadas a accidentalidad durante el periodo evaluado. (Ver anexo 3). Accidentalidad Obra/interventoría
- **Reporte de ausentismo laboral:** Durante el periodo en mención, no se registraron novedades de ausentismo por enfermedad general ni por accidente de trabajo (AT). El seguimiento se realiza mediante el formato de indicadores de gestión, cuyos detalles se encuentran en el Anexo 32. Se aclara que el personal de interventoría no reportó ausentismos durante este mes.
- **Capacitaciones y charlas de seguridad:** Capacitaciones y charlas de seguridad: En cumplimiento del Plan Anual de Capacitación, durante el periodo se ejecutaron las sesiones programadas relacionadas con Atención Prehospitalaria APH y enfermedades causadas por exposición a polvos de sílice. Asimismo, se reportó el desarrollo de las charlas de seguridad correspondientes para el personal de obra e interventoría. Ver Anexo 33. Capacitaciones y charlas de seguridad obra/interventoría. obra/

Tabla 8. Consolidado de charlas de seguridad_junio_2026

Frente de obra	Capacitador	# de charlas ejecutadas.
Valparaiso_Tamesis	Carlos Mario Silva	25 temas tratados

- **Comunicaciones.** En el mes de junio de 2026, se aportó la información correspondiente a comunicaciones, estos soportes corresponden a correos emitidos y recibidos a la presente interventoría en el transcurso del mes. Ver anexo 35. Comunicaciones obra/interventoría
- **ATS (Análisis de Trabajo Seguro):** Durante el mes de junio de 2026, no se ejecutaron procesos de Análisis de Trabajo Seguro en el frente de Valparaíso, debido a que no se realizaron actividades de alto riesgo que requirieran este control específico.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL PERIDO DEL MES DE ABRIL DE 2026

Tabla 9. Registro fotográfico junio_2026



Foto1. Evidencia Charlas diaria SST Interventoría



Foto 2. Evidencia de capacitación mensual código nacional de tránsito Interventoría.



Foto 3. Evidencia ejecución de pausas activas interventoría.



Foto 4. Asistencia a comité participativo ciudadano.



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 05
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS

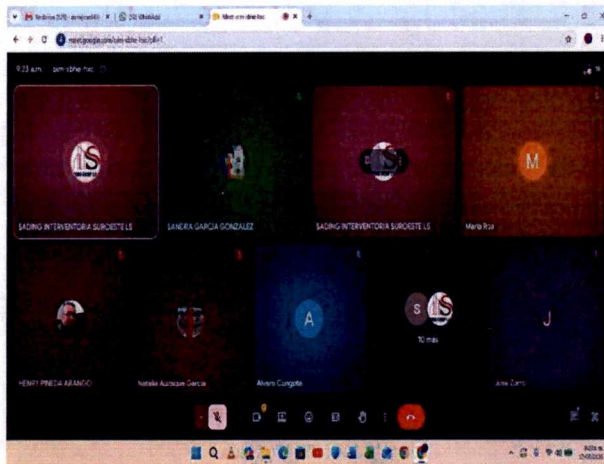


Foto 5. Asistencia a comité de obra.



Foto 6. Acompañamiento a las actividades realizadas por el Contratista de obra.



Foto 7. Recorrido a campo, verificación el suministro de hidratación.



Foto 8. Verificación de uso adecuado de EPP.



Foto 9. Recorrido a campo, verificación condiciones seguridad.



Foto 10. Evidencia de capacitación sobre primeros auxilios.



Foto 11. Señalización de rutas de evacuación



Foto 12. Señalización de rutas de evacuación



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.

INFORME MENSUAL SST No. 05
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS

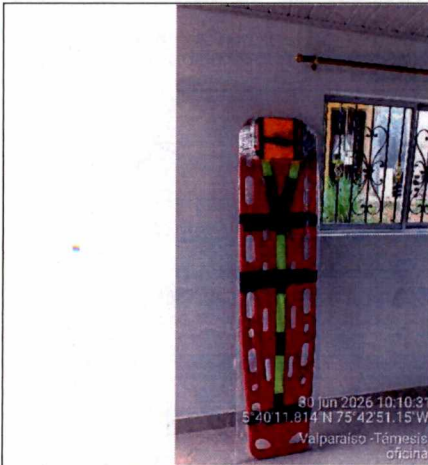


Foto 13. Inspección de camilla de emergencias.



Foto 14. Asistencia a coite de obra.

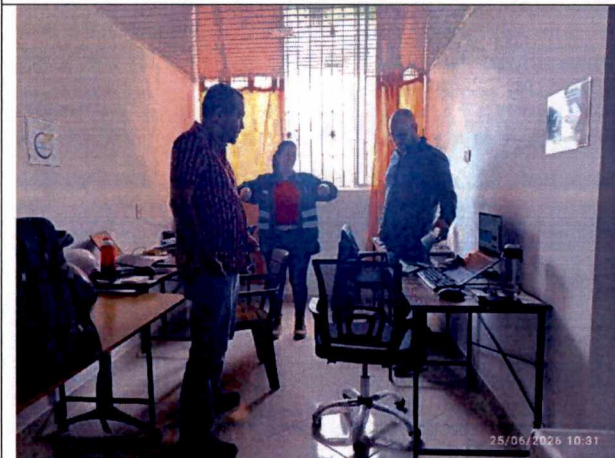


Foto 13. Pausas activas interventoría



Foto 14. Señalización preventiva mediante conos reflectivos.



Foto 15. Charlas preventivas de seguridad.



Foto 16. Inspección de extintores.



Foto 17. Inspección de extintores



Foto 18. Pausas activas.



Foto 19. Ejercicios de calistenia .

Foto 20. Capacitación APH.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

10.1. ANÁLISIS.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, el Contratista de Obra Consorcio Vías Antioquia MM2025 adelantó las actividades programadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con énfasis en el componente documental y administrativo.

Dentro de las actividades desarrolladas, el contratista presentó el soporte documental correspondiente al Plan de Trabajo Anual para la vigencia 2026, el cual se encuentra estructurado bajo el ciclo PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar y establece las acciones a ejecutar durante el desarrollo del proyecto.

La Interventoría Sading Group realizó la revisión, control y seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para el mes, evidenciando que estas fueron ejecutadas conforme al cronograma establecido.

El plan estratégico de seguridad vial se encuentra en fase de estructuración, diseño e implementación, proceso que inició durante la segunda semana de mayo y que a la fecha continúa en desarrollo. Como avance de esta gestión, el contratista hizo entrega de la autoevaluación correspondiente, la cual permite evidenciar el estado actual del PESV y orientar las acciones necesarias para su cumplimiento,

En cuanto, a las tareas de alto riesgo, el contratista informó mediante comunicación escrita que durante el periodo evaluado no se desarrollaron actividades clasificadas dentro de esta categoría, teniendo en cuenta que las condiciones y el alcance actual de la obra no lo requerían.

Sin embargo, la interventoría continuará realizando seguimiento permanente, con el fin de verificar que, en caso de presentarse la necesidad de ejecutar este tipo de labores, se dé cumplimiento estricto a la normatividad vigente, incluyendo la disponibilidad de personal certificado, exámenes médicos ocupacionales con el énfasis correspondiente y procedimientos operativos debidamente aprobados.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

10.2. EVALUACIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, el Contratista de Obra Consorcio Vías Antioquia MM2025 presentó los soportes documentales correspondientes a la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, evidenciando cumplimiento en las actividades programadas dentro del Plan de Trabajo Anual bajo el ciclo PHVA. La interventoría verificó la ejecución de las actividades previstas para el mes, así como el desarrollo de reuniones del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral, el avance en la estructuración e implementación del PESV, la actualización del perfil sociodemográfico, el pago de seguridad social, la ejecución de inspecciones de seguridad, la entrega y reposición de EPP, y el desarrollo de capacitaciones y charlas de seguridad.

Así mismo, se constató que durante el periodo no se presentaron ingresos ni retiros de personal, no se ejecutaron actividades de alto riesgo, trabajos en alturas, espacios confinados ni ATS asociados a dichas tareas. Tampoco se reportaron accidentes de trabajo, ausentismos laborales ni novedades relevantes en materia de accidentalidad. En términos generales, el contratista dio cumplimiento a los requerimientos documentales y operativos evaluados para el mes de junio; no obstante, se mantiene seguimiento a los compromisos pendientes, especialmente frente a la consolidación del PESV y la entrega de soportes complementarios relacionados con certificaciones administrativas.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	
---	--	---

11. CONCLUSIONES

- Durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2026, el Contratista de Obra Consorcio Vías Antioquia MM2025 presentó los soportes documentales asociados a la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, evidenciando avance en el cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan de Trabajo Anual bajo el ciclo PHVA. La interventoría verificó el desarrollo de las actividades previstas, incluyendo reuniones de COPASST y Comité de Convivencia Laboral, avance del PESV, actualización del perfil sociodemográfico, pago de seguridad social, inspecciones de seguridad, entrega y reposición de EPP, y ejecución de capacitaciones y charlas de seguridad.
- Se concluye que durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo, ausentismo laboral ni novedades relevantes en materia de accidentalidad, lo cual refleja un comportamiento favorable frente a la gestión preventiva del proyecto. Así mismo, se evidenció que no se ejecutaron actividades de alto riesgo, trabajos en alturas, espacios confinados ni Análisis de Trabajo Seguro ATS asociados a dichas labores.
- No obstante, se identifican aspectos que requieren continuidad en el seguimiento por parte de la interventoría, especialmente en lo relacionado con la consolidación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, así como la entrega oportuna de soportes complementarios administrativos y documentales requeridos para el adecuado control del contrato.
- Finalmente, se evidencia que el contratista ha avanzado en el cumplimiento de los requerimientos documentales y operativos del SG-SST; sin embargo, debe fortalecer el componente de preparación y respuesta ante emergencias, teniendo en cuenta que el informe registra pendientes asociados a planos de evacuación, socialización del plan de emergencias y programación del simulacro anual.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

12. RECOMENCACIONES

.Se recomienda al Contratista de Obra Consorcio Vías Antioquia MM2025 continuar dando estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Gobernación de Antioquia y a los requerimientos efectuados por la interventoría, especialmente en lo relacionado con la presentación oportuna de soportes administrativos, técnicos y documentales necesarios para el seguimiento del contrato.

- Se recomienda continuar con la implementación, seguimiento y actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, garantizando que las acciones formuladas en la autoevaluación sean ejecutadas de manera progresiva y soportadas documentalmente, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo vial en el proyecto.
- Se recomienda elaborar, instalar y socializar los planos técnicos de rutas de evacuación, así como realizar la socialización integral del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias a la totalidad del personal vinculado al proyecto. De igual manera, se deberá presentar el cronograma para la ejecución del simulacro anual, conforme a los estándares mínimos aplicables.
- Se recomienda mantener la ejecución periódica de inspecciones de seguridad, charlas preoperacionales, capacitaciones y seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección personal, con el fin de conservar el comportamiento favorable frente a la accidentalidad y prevenir la materialización de riesgos laborales.
- Se recomienda que, en caso de iniciar actividades de alto riesgo, trabajos en alturas, ingreso a espacios confinados o tareas que requieran ATS, el contratista garantice previamente la disponibilidad de personal certificado, exámenes médicos ocupacionales con el énfasis correspondiente, procedimientos operativos aprobados y demás soportes exigidos por la normatividad vigente.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 05 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CORREDOR VIAL VALPARAÍSO – TÁMESIS	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

13. ANEXOS DOCUMENTALES CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25/INTERVENTORIA SADING GROUP SAS.

Dentro del informe mensual del mes de junio 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden.

- Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra/interventoría
- Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del contratista).
- Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
- Anexo 8. Comité Copasst 2013/86.
- Anexo 9. Comité Cocola 3461 de 2025
- Anexo 12. PESV.
- Anexo 15. Documentos de ingreso.
- Anexo 16. Contrato o certificado laboral.
- Anexo 17. Inducción y evaluación.
- Anexo 18. Entrega de EPP.
- Anexo 19. Dotación.
- Anexo 20. Perfil Sociodemográfico.
- Anexo 21. Seguridad Social.
- Anexo 22. Nóminas.
- Anexo 23. Inspecciones de seguridad.
- Anexo 24. Registro Fotográfico.
- Anexo 26. Listado de personal.
- Anexo 27. Reportes diarios.
- Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Legal
- Anexo 31. Accidentalidad.
- Anexo 32. Ausentismo general.
- Anexo 33. Capacitaciones.
- Anexo 35. Comunicaciones.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
