

Medellín, 01 de septiembre 2026

1300 2659

Señor:

**Juan Diego Aguirre Londoño**

Director de Desarrollo Físico Gobernación d

Radicado: R 2026010591332

Fecha: 02/09/2026 11:24:55.0

Tipo: OFICIO  
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



**Asunto:** Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

**Referencia:** contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero Juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y tramite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260072 lote # 2 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.

Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- Informe No 1 del 23 de enero de 2026 a el 31 de enero de 2026 titiribí- armenia
- pág. 1 – 19
- Anexo memoria USB informe No 1
- Informe No 2 del 01 febrero de 2026 a el 28 febrero de 2026 titiribí- armenia
- pág. 20 – 42
- Anexo memoria USB informe No 2
- Informe No 3 del 01 marzo de 2026 a el 30 marzo de 2026 titiribí- armenia
- pág. 43 – 68
- Anexo memoria USB informe No 3
- Informe No 4 del 01 abril de 2026 a el 30 abril de 2026 titiribí- armenia
- pág. 69 – 96
- Anexo memoria USB informe No 4

Recibí


02-09-2026  
11:00 am

ARCHIVO SIE  
2026 SEP 15 7:49:34

- Informe No 5 del 01 mayo de 2026 a el 31 de mayo de 2026 titiribí- armenia
- pág. 97 – 127
- Anexo memoria USB informe No 5
- Informe No 6 del 01 junio de 2026 a el 30 de junio de 2026 titiribí- armenia
- pág. 128 – 201
- Anexo memoria USB informe No 6

Cordialmente

  
**CATALINA CASTRILLON TORRES**  
Subgerente de Ejecución de Proyectos

|                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE                | FIRMA                                                                                | FECHA      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Elaboró:                                                                                                                                                                                                         | Duberney Concha Marin |  | 31/08/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. |                       |                                                                                      |            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/><i>Contrato de Interventoría</i><br/><i>No 20260072 DE 2025</i><br/><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**INFORME SST MENSUAL  
DE INTERVENTORÍA No 06**

**GOBERNACIÓN DE  
ANTIOQUIA**

**SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**CONTRATO DE OBRA  
N° 2500111B2821 DE 2025**

**ANTIOQUIA**

**INTERVENTORÍA**





|                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br>Contrato de Interventoría<br>No 20260072 DE 2025<br><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


### INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>          | Gobernación de Antioquia – SIF                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA</b>          | CONSORCIO EL PROGRESO                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATO DE OBRA N°</b>          | 2500111B2821 de 2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO</b>                       | ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)                                                                                                                       |
| <b>INTERVENTORÍA</b>                | CONSORCIO TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°</b> | 20260072 de 2025                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO</b>                       | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA SUBREGION OCCIDENTE (LOTE 2) A CARGO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| <b>PERIODO</b>                      | DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|         | CARGO                           | FIRMA                                                                                                            | PERÍODO                  | VERSIÓN |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| ELABORÓ | Residente SST de Interventoría  | <br>Nubia Inés Gil Carmona      | 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026 | 1       |
| REVISÓ  | Representante legal             | <br>Juan Guillermo Tobón Posada |                          |         |
| APROBÓ  | Supervisor SST del proyecto SIF | <br>Jesus David Jimenez        |                          |         |

Jesus David Jimenez  
profesional SST-SIF



## Tabla de contenido

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06.....              | 2  |
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                         | 5  |
| 1.1. Alcance.....                                            | 5  |
| 2. OBJETIVOS .....                                           | 5  |
| 2.1. Objetivo General.....                                   | 5  |
| 2.2. Objetivos Específicos.....                              | 5  |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....                             | 6  |
| 3.1. Localización Subregiones de Occidente Antioqueño: ..... | 6  |
| 3.2. Actividades por ejecutar y alcance:.....                | 9  |
| 3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección .....       | 9  |
| 4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....        | 10 |
| 4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....           | 10 |
| 4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA.....               | 11 |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br><i>Contrato de Interventoría</i><br>No 20260072 DE 2025<br>INFORME SST MENSUAL N° 06 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO .....                                                                                                              | 12 |
| 6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA.....                                                                                                                     | 21 |
| 7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST.....                                                                                                                           | 23 |
| 8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO .....                                                                 | 24 |
| 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO: ..... | 24 |
| a. Seguridad Social.....                                                                                                                                         | 24 |
| b. Presupuestos .....                                                                                                                                            | 25 |
| c. Anexos contratista e interventoría: .....                                                                                                                     | 26 |
| d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: .....                                                                                                       | 26 |
| e. Subprograma de higiene industrial: .....                                                                                                                      | 27 |
| f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.....                                                                                                        | 27 |
| g. Accidentes laborales presentados en el periodo.....                                                                                                           | 27 |
| h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos.....                                                                                                        | 27 |
| i. Registro fotográfico:.....                                                                                                                                    | 28 |
| 10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.....                                                                                                                                   | 32 |
| 11. RECOMENDACIONES.....                                                                                                                                         | 33 |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br><i>Contrato de Interventoría</i><br>No 20260072 DE 2025<br><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Alcance

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

| SUBREGIÓN OCCIDENTE             |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| CORREDOR                        | CÓDIGO (S) DE VÍA |
| Ebéjico - Heliconia - Medellín  | 62AN17            |
| Sopetrán - Horizontes - Belmira | 62AN15            |
| Frontino - Nutibara             | 62AN08, 05284VT66 |
| Titiribí - Armenia              | 60AN08-1          |
| Miserenga - Ebéjico             | 62AN17            |

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo General

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la subregión occidente (lote 2) a cargo del departamento de Antioquia.

### 2.2. Objetivos Específicos

- Verificar, controlar y certificar que la ejecución de las obras se realice dentro de los plazos establecidos.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


- Hacer cumplir los estándares técnicos, normativos y de calidad requeridos, asegurando la correcta aplicación de los materiales, la metodología constructiva, los procedimientos de control de calidad y la adecuada gestión ambiental, de modo que se preserven la capacidad estructural y la seguridad vial de los corredores objeto del contrato.
- Asegurar que se realice una correcta utilización de los recursos económicos asignados a las obras y realizar un seguimiento integral al avance de las mismas para generar los respectivos informes detallados sobre el estado del proyecto y proponer las acciones correctivas a que haya lugar.
- verificar y garantizar que todas las actividades desarrolladas por el contratista de obra se ejecuten conforme a las especificaciones generales de construcción.

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### 3.1. Localización Subregiones de Occidente Antioqueño:



|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

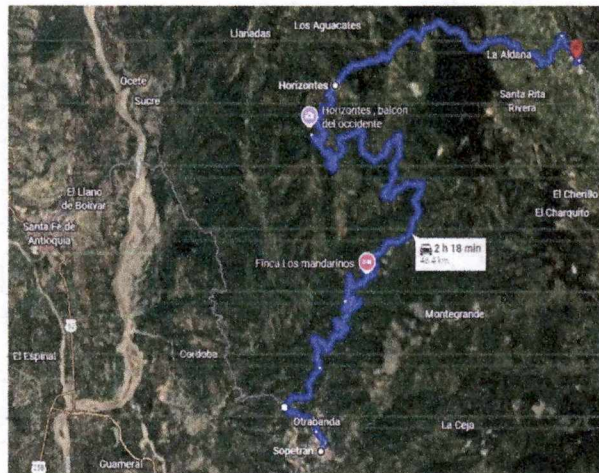

Fuente: Google Maps

Ilustración 1. Vía Sopetrán – Horizontes \_ Belmira

Sopetrán es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Olaya, por el este con el municipio de Belmira, por el sur con los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, y por el oeste con el municipio de Santa Fe de Antioquia. Su cabecera dista 40 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 223 kilómetros cuadrados.

La vía objeto de intervención es tradicionalmente una trocha de tierra, transitable en motos de enduro/trail y vehículos altos, con tramos en regular estado. Actualmente, se encuentran pavimentados algunos tramos entre el corregimiento de Horizontes y Sopetrán.

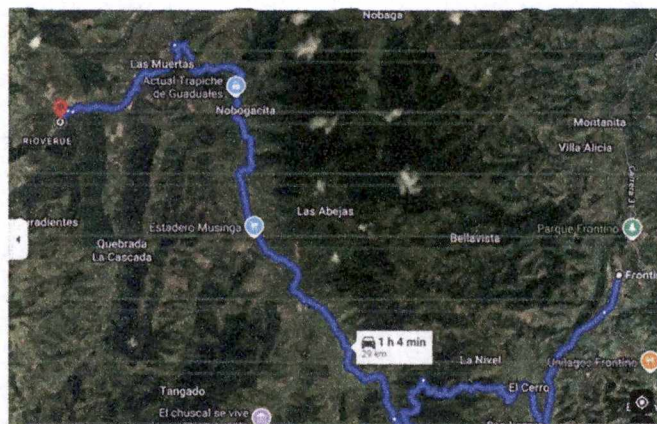


Ilustración 2. Vía Frontino Nutibara

|                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br><i>Contrato de Interventoría</i><br>No 20260072 DE 2025<br><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Frontino es un municipio de Colombia ubicado en el occidente del departamento de Antioquia, conocido como "el tesoro oculto" o el páramo antioqueño. Fundado en 1806, destaca por sus paisajes montañosos, cultura panelera, fuerte presencia indígena Emberá Catío y su centro histórico colonial con la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. El corredor vial objeto de intervención es tradicionalmente una trocha de tierra, transitable en motos de enduro/trail y vehículos altos, con tramos en regular estado. Actualmente, se encuentra pavimentado un tramo 1,5 km entre la cabecera municipal y la salida hacia zona rural.

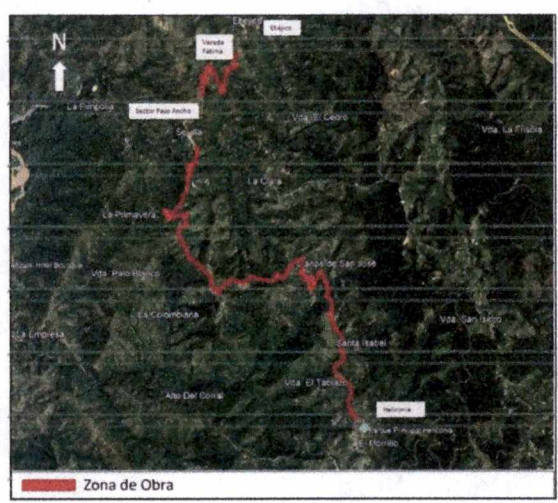


Ilustración 3. Vía Ebéjico- Heliconia- Medellín

Ebéjico es un municipio colombiano ubicado en el occidente del departamento de Antioquia, a tan solo 42 kilómetros (1 hora y 10 minutos) de Medellín. Conocido como el "Distrito Panelero", tiene una temperatura promedio de 23° y se destaca por sus imponentes paisajes montañosos, su cultura cafetera y su tranquilidad. Los trabajos por desarrollar estarán localizados sobre la caizada vehicular de la vía de segundo orden Ebéjico – Heliconia – Medellín (62AN17) puntualmente entre Heliconia y el sector vereda Fátima (Ebéjico), en los municipios de Ebéjico y Heliconia, en el departamento de Antioquia,

|                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br><i>Contrato de Interventoría</i><br>No 20260072 DE 2025<br><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2. Actividades por ejecutar y alcance:

Con la presente intervención, se pretende incrementar la calidad de vida y bienestar para los habitantes del sector y los potenciales usuarios de las vías, garantizando la conectividad local y regional, lo que permitirá mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente, alcanzando los factores de operación, seguridad y confort mínimos exigidos por la normatividad, esto se proyecta mediante la ejecución de las siguientes productos generales que se encuentran y dependen de los presupuestos de cada lote y cada tramo vial correspondiente, para el caso de la vía Sopetrán – Horizontes– Belmira; Frontino – Horizontes - Belmira y el otro frente de trabajo Ebéjico – Heliconia - Medellín, se pretende la ejecución de las siguientes actividades constructivas:

- Realizar estudio de caracterización del suelo subrasante, material superficial y diseño de la fórmula de trabajo de La estabilización siguiendo la normativa vigente del INVIAS.
- Construcción de alcantarillas.
- Construcción de cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de filtros para cunetas
- Construcción de disipadores
- Construcción y estabilización con material granular
- Construcción de una superficie de rodadura en tratamiento superficial doble
- Construcción de señalización vial

### 3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

Desde la interventoría se verificó la instalación y mantenimiento de la señalización vial (PMT) simultáneamente a las labores de ampliación de vía, garantizando la visibilidad de los puntos críticos para usuarios y trabajadores. El contratista Consorcio el progreso contó con personal auxiliar de tránsito certificados, quienes apoyaron el ingreso y salida de vehículos y maquinaria en la obra.

|                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br><i>Contrato de Interventoría</i><br>No 20260072 DE 2025<br>INFORME SST MENSUAL N° 06 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Elementos de protección personal**

La interventoría realizó verificación del suministro de los elementos de protección personal a los auxiliares de tránsito y ayudantes de obra del contratista y las reposiciones por deterioro de los mismos.

El contratista para el mes de junio de 2026 realizó la entrega de dotación (camisa, pantalón, calzado de seguridad y elementos de protección personal) al personal nuevo. La evidencia de esta entrega se puede verificar en el anexo 18. Entrega de EPP y anexo 19. Entrega de dotación.

**4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

**4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA**

**Tabla 1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

| FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato de Obra No.                    | 2500111B2821 de 2025                                                                                                                    |
| Fecha de Suscripción                    | 10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                   |
| Identificación del Proceso en SECOP     |                                                                                                                                         |
| Objeto                                  | ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE) |
| Contratista                             | CONSORCIO EL PROGRESO                                                                                                                   |
| Nit.                                    | 902.017.242-2                                                                                                                           |
| Representante Legal                     | SANDRA GARCIA                                                                                                                           |
| Valor del contrato                      | \$104.855.613.958                                                                                                                       |
| Anticipo entregado al contratista (15%) | \$15.728.342.093.7 (Aun no se entrega)                                                                                                  |
| Fecha de inicio                         | 10 DE FEBRERO de 2026                                                                                                                   |
| Plazo inicial                           | 18 MESES                                                                                                                                |
| Fecha de terminación                    | 10 DE AGOSTO 2027                                                                                                                       |
| Fecha de reinicio                       |                                                                                                                                         |
| Fecha de terminación                    |                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br>Contrato de Interventoría<br>No 20260072 DE 2025<br>INFORME SST MENSUAL N° 06 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor</b> | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b> |
|--------------------|-----------------------------|

#### 4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

**Tabla 2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato de Interventoría No.</b>           | 20260072 de 2025                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de Suscripción</b>                    | 23 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificación del Proceso en SECOP</b>     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objeto</b>                                  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA SUBREGION OCCIDENTE (LOTE2) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| <b>Interventoría</b>                           | CONSORCIO TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nit.</b>                                    | 902.022.661-5                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Representante Legal</b>                     | JUAN GUILLERMO TOBON POSADA                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valor del contrato</b>                      | \$ 7.853.059.284                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anticipo entregado al contratista (15%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de inicio</b>                         | 23 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Plazo inicial</b>                           | 19 MESES                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de terminación</b>                    | 23 DE AGOSTO DE 2027                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de reinicio</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de terminación</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Supervisor</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

**Tabla 3 LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO**

| LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO |                                   |                            |               |                       |                  |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| CONTRATO                                |                                   |                            |               |                       |                  |                 |
| No,                                     | NOMBRE                            | CARGO                      | CEDULA        | EMPRESA               | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
| 1                                       | LEIDY MARCELA PIEDRAHITA SERNA    | AUXILIAR ADMINISTRATIVA    | 1.000.411.687 | CONSORCIO EL PROGRESO | 5/02/2026        |                 |
| 2                                       | JESUS MARIA AYALA GONZALEZ        | ENCARGADO DE OBRA          | 70928011      | CONSORCIO EL PROGRESO | 17/02/2026       |                 |
| 3                                       | RENZO FERNANDO CASTRILLON JIMENEZ | RESIDENTE AMBIENTAL        | 98504487      | CONSORCIO EL PROGRESO | 23/02/2026       |                 |
| 4                                       | KATHERINE GARCIA RODRIGUEZ        | AUXILIAR ADMINISTRATIVA    | 1042708755    | CONSORCIO EL PROGRESO | 27/02/2026       | 14/03/2026      |
| 5                                       | OSCAR MARIO MUÑETON MACIAS        | CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO | 1007074966    | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026       |                 |
| 6                                       | CRISTIAN CAMILO MURIEL USUGA      | CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO | 1042709773    | CONSORCIO EL PROGRESO | 17/02/2026       |                 |
| 7                                       | ANDRES FELIPE PAJARO PATIÑO       | INGENIERO RESIDENTE CIVIL  | 1067865644    | CONSORCIO EL PROGRESO | 5/01/2026        |                 |
| 8                                       | MARICELLY LOPEZ ZAPATA            | AUXILIAR ADMINISTRATIVA    | 1.038.332.594 | CONSORCIO EL PROGRESO | 17/02/2026       |                 |
| 9                                       | ANA ARLENY SILVA GARCES           | RESIDENTE SST              | 1.038.336.371 | CONSORCIO EL PROGRESO | 23/02/2025       |                 |
| 10                                      | JAIRO JAVIER LOPEZ GALVIS         | OPERADOR                   | 15.961.990    | CONSORCIO EL PROGRESO | 24/02/2026       |                 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                |                            |               |                       |            |            |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 11 | MANUEL LORENZO MURILLO ANDRADE | OPERADOR                   | 1.039.686.627 | CONSORCIO EL PROGRESO | 20/02/2026 |            |
| 12 | JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO | RESIDENTE OBRA             | 4.180.080     | CONSORCIO EL PROGRESO | 17/02/2026 |            |
| 13 | CESAR AUGUSTO ISAZA CASTRILLON | SUPERVISOR DE OBRA         | 3.588.787     | CONSORCIO EL PROGRESO | 17/02/2026 |            |
| 14 | JUAN FERNANDO SARRAZOLA ROLDAN | CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO | 3482877       | CONSORCIO EL PROGRESO | 17/02/2026 |            |
| 15 | BELARMIN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ   | AYUDANTE DE OBRA           | 71023580      | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026 | 31/03/2026 |
| 16 | DIEGO LEON MONTOYA RIVERA      | AYUDANTE DE OBRA           | 1038337721    | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026 |            |
| 17 | EMERSON GONZALEZ CARVAJAL      | AYUDANTE DE OBRA           | 1038927240    | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026 |            |
| 18 | HECTOR HERNAN RAMIREZ ALVAREZ  | OPERADOR MAQUINARIA PESADA | 98698790      | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026 |            |
| 19 | DUVAN ALCIDES HERRERA VARGAS   | AYUDANTE DE OBRA           | 1041631427    | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026 |            |
| 20 | WILSON DAVID BAILARIN DOMICO   | AYUDANTE DE OBRA           | 1007440327    | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026 |            |
| 21 | MONTOYA RIVERA SEBASTIAN       | AYUDANTE DE OBRA           | 1001581076    | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026 |            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                          |                            |            |                             |            |  |
|----|------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| 22 | JOSE<br>ARMANDO<br>MONTROYA<br>RIVERA    | AYUDANTE DE<br>OBRA        | 1038927085 | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 26/02/2026 |  |
| 23 | JUAN CARLOS<br>MONTROYA<br>RIVERA        | AYUDANTE DE<br>OBRA        | 1001580411 | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 26/02/2026 |  |
| 24 | GUSTAVO<br>PENAGOS<br>REYES              | RESIDENTE SST              | 1106483875 | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 21/02/2026 |  |
| 25 | YENNI<br>YOBHANA<br>VARGAS<br>CRISTANCHO | RESIDENTE<br>CIVIL DE OBRA | 28951310   | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 2/26/2026  |  |
| 26 | NIDIA<br>SORAIDA<br>VASQUEZ<br>ARTEAGA   | RESIDENTE<br>SOCIAL        | 43452148   | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 24/02/2026 |  |
| 27 | HERNAN DE<br>JESUS<br>LONDOÑO<br>PEÑA    | CONDUCTOR                  | 15322099   | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 10/12/2012 |  |
| 28 | MATEO<br>URREGO<br>LAINEZ                | AYUDANTE DE<br>OBRA        | 1020457132 | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 26/02/2026 |  |
| 29 | EMERSON<br>ANDREY LARA<br>ESPINOSA       | AYUDANTE DE<br>OBRA        | 1000875066 | CONSORCIO<br>EL<br>PROGRESO | 26/02/2026 |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO |                                     |                  |            |                       |                  |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| CONTRATO                                |                                     |                  |            |                       |                  |                 |
| No,                                     | NOMBRE                              | CARGO            | CEDULA     | EMPRESA               | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
| 30                                      | LUIS ELMER ORTIZ MENDEZ             | AYUDANTE DE OBRA | 94462511   | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026       |                 |
| 31                                      | JHAN CARLOS ORTIZ MÚNERA            | AYUDANTE DE OBRA | 1001845530 | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026       |                 |
| 32                                      | LEONANRDO ECHEVERRY BEDOYA          | AYUDANTE DE OBRA | 3538332    | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026       |                 |
| 33                                      | SANDRO DE JESUS SERNA MUÑOZ         | AYUDANTE DE OBRA | 98454198   | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/02/2026       |                 |
| 34                                      | COLORADO PARRA DUBER EDWIN          | OPERADOR         | 75060447   | MINOICA               | 10/03/2026       |                 |
| 35                                      | NOHABA GRACIANO VICTOR IVAN         | AYUDANTE DE OBRA | 1038927534 | CSC EL PROGRESO       | 10/03/2026       |                 |
| 36                                      | DOMICO MILTON                       | AYUDANTE DE OBRA | 1040794352 | CSC EL PROGRESO       | 18/03/2026       |                 |
| 37                                      | VELASQUEZ SALAS JUAN ESTEBAN        | AYUDANTE DE OBRA | 1001581118 | CSC EL PROGRESO       | 18/03/2026       |                 |
| 38                                      | SALAS PEREZ IVAN DARIO              | AYUDANTE DE OBRA | 8085531    | CSC EL PROGRESO       | 18/03/026        |                 |
| 39                                      | SEPULVEDA SEPULVEDA FELIPE ESNEIDER | AYUDANTE DE OBRA | 1038926986 | CSC EL PROGRESO       | 18/03/2026       |                 |
| 40                                      | POSSO VARELAS DIOMAR ALEXIS         | AYUDANTE DE OBRA | 1039284669 | CSC EL PROGRESO       | 18/03/2026       |                 |
| 41                                      | RAMOS NUÑEZ IVAN ALEXANDER          | AYUDANTE DE OBRA | 14135215   | CSC EL PROGRESO       | 18/03/2026       |                 |
| 42                                      | GARCIA POSADA PAOLA ANDREA          | AYUDANTE DE OBRA | 1038926693 | CSC EL PROGRESO       | 17/03/2026       |                 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO |                               |                            |            |                       |                  |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| CONTRATO                                |                               |                            |            |                       |                  |                 |
| No,                                     | NOMBRE                        | CARGO                      | CEDULA     | EMPRESA               | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
| 43                                      | CARLOS ANDRES RIASCOS RAMIRES | LABORATORISTA              | 1036604727 | CONSORCIO EL PROGRESO | 2/03/2026        | 12/03/2026      |
| 44                                      | RENTERIA MORENO CIPRIAN       | LABORATORISTA              | 11794184   | CONSORCIO EL PROGRESO | 2/03/2026        | 12/03/2026      |
| 45                                      | JAIRO ALONSO URREGO           | LABORATORISTA              | 1128478336 | CONSORCIO EL PROGRESO | 2/03/2026        | 12/03/2026      |
| 46                                      | ASPRILLA MENA WILBER          | LABORATORISTA              | 1077444142 | CONSORCIO EL PROGRESO | 2/03/2026        | 12/03/2026      |
| 47                                      | YOJAN ESTIVEN AGUIRRE TOBON   | AYUDANTE DE OBRA           | 1002103301 | CONSORCIO EL PROGRESO | 14/03/2026       |                 |
| 48                                      | IVAN DARIO FLOREZ FLOREZ      | AYUDANTE DE OBRA           | 1013537040 | CONSORCIO EL PROGRESO | 14/03/2026       |                 |
| 49                                      | ALEJANDRO GARCIA FLOREZ       | AYUDANTE DE OBRA           | 1042709410 | CONSORCIO EL PROGRESO | 14/03/2026       |                 |
| 50                                      | JONATHAN METAUTE MUÑOZ        | AYUDANTE DE OBRA           | 1042706786 | CONSORCIO EL PROGRESO | 14/03/2026       |                 |
| 51                                      | ERMINSON GUISAO DELGADO       | OFICIAL DE OBRA            | 1045520233 | CONSORCIO EL PROGRESO | 10/03/2026       |                 |
| 52                                      | JUAN JOSE ESTRADA URIBE       | AYUDANTE DE OBRA           | 1011512757 | CONSORCIO EL PROGRESO | 10/03/2026       |                 |
| 53                                      | YEISON ADRIAN MACHADO         | AYUDANTE DE OBRA           | 1018230523 | CONSORCIO EL PROGRESO | 10/03/2026       |                 |
| 54                                      | JAIME ALONSO SAUCEDA          | AYUDANTE DE OBRA           | 98481182   | CONSORCIO EL PROGRESO | 10/03/2026       |                 |
| 55                                      | OMAR TAMAYO NUNO              | AYUDANTE DE OBRA           | 1017930018 | CONSORCIO EL PROGRESO | 10/03/2026       |                 |
| 56                                      | SANTIAGO VAHOS SAMPEDRO       | AYUDANTE DE OBRA           | 1042710025 | CONSORCIO EL PROGRESO | 10/03/2026       |                 |
| 57                                      | SANDRA COLONIA                | RESIDENTE AMBIENTAL FRONT. | 43866036   | INTRAMAQ              | 12/02/2026       |                 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                 |                 |            |                       |            |            |
|----|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 58 | JOSE DAVID SEPULVEDA SALAZAR    | CONDUCTOR       | 71379420   | INTRAMAQ              | 10/03/2026 |            |
| 59 | ELKIN RUEDA HERRERA             | OPERADOR        | 1049349592 | CONSORCIO EL PROGRESO | 5/03/2026  |            |
| 60 | DAYRON RIVERA VARGAS            | CONDUCTOR       | 71054125   | CONSORCIO EL PROGRESO | 16/03/2026 | 23/03/2026 |
| 61 | DEIBY ALEXANDER MARIN TORRES    | OPERADOR        | 71387590   | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/03/2026 |            |
| 62 | DANIEL FERNANDO FLOREZ          | CONDUCTOR       | 1054996193 | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/03/2026 |            |
| 63 | OSCAR ALEXANDER SEPULVEDA CANO  | CONDUCTOR       | 71310972   | CONSORCIO EL PROGRESO | 26/03/2026 |            |
| 64 | JHON FREDY HENAO                | CONDUCTOR       | 1059815037 | CONSORCIO EL PROGRESO | 11/03/2026 |            |
| 65 | RENDON CARLOS ANDRES            | OPERADOR        | 1037323292 | INTRAMAQ              | 10/04/2026 |            |
| 66 | PEREA VALENCIA BLANCA NIEVE     | TOPOGRAFIA      | 1077436785 | CONSORCIO EL PROGRESO | 11/04/2026 |            |
| 67 | ARANGO LOPEZ SANTIAGO           | CONDUCTOR       | 1002620334 | CONSORCIO EL PROGRESO | 6/04/2026  |            |
| 68 | SANDY LORENA VARGAS CRISTANCHO  | TOPOGRAFA       | 1105611361 | CONSORCIO EL PROGRESO | 13/04/2026 |            |
| 69 | JHOAN CAMILO HENAO ARIAS        | CONDUCTOR       | 1047973032 | CONSORCIO EL PROGRESO | 17/04/2026 |            |
| 70 | RAMON ARMANDO ALVAREZ QUICENO   | CONDUCTOR       | 1042706842 | MACOTUORS             | 7/05/2026  |            |
| 71 | DEISY KATHERINE ESCUDERO MENDEZ | AUX SST         | 1002103259 | CSC EL PROGRESO       | 12/05/2026 |            |
| 72 | RICHAR ERNEY AVILA VARGAS       | CADENERO        | 1048847082 | CSC EL PROGRESO       | 21/05/2026 |            |
| 73 | YEIDER BRITO GRACIANO           | OFICIAL DE OBRA | 1039291251 | CSC EL PROGRESO       | 25/05/2026 |            |
| 74 | HECTOR WILLIAN AGUDELO          | ENCARGADO       | 15406632   | CSC EL PROGRESO       | 11/05/2026 |            |
| 75 | SANTIAGO GIRON GOEZ             | CADENERO        | 1039289552 | CSC EL PROGRESO       | 15/05/2026 |            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                              |            |                    |            |            |
|----|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 76 | VILLA CARO JORGE<br>EDUARDO        | OFICIAL DE OBRA              | 10187857   | CSC EL<br>PROGRESO | 21/05/2026 |            |
| 77 | JUAN PABLO GÓMEZ<br>GOMEZ          | RESIDENTE CIVIL              | 1055753270 | CSC EL<br>PROGRESO | 20/04/2026 |            |
| 78 | TATIANA ROJAS MATUTE               | AUXILIAR SST                 | 1051746711 | INTRAMAQ           | 20/04/2026 | 10/05/2026 |
| 79 | YEISON VILLADIEGO<br>BORJA         | CONDUCTOR                    | 92640916   | CSC SAN<br>ALONSO  | 20/04/2026 | 26/05/2026 |
| 80 | CARLOS MARIO ARENAS<br>ARAQUE      | CONDUCTOR                    | 15263623   | CSC EL<br>PROGRESO | 22/04/2026 |            |
| 81 | ANDRES ESTEBAN<br>LOPEZ SANCHEZ    | AYUDANTE DE OBRA             | 1037617802 | CSC EL<br>PROGRESO | 22/04/2026 | 13/05/2026 |
| 82 | OSCAR LEALDO<br>VASQUES CHAVERRA   | AYUDANTE DE OBRA             | 15264174   | CSC EL<br>PROGRESO | 23/04/2026 |            |
| 83 | ADRIAN ALONSO CASAS<br>VASQUEZ     | AYUDANTE DE OBRA             | 1007518431 | CSC EL<br>PROGRESO | 23/04/2026 | 20/05/2026 |
| 84 | JOSE FREDY LOPEZ<br>OJEDA          | ENCARGADO DE<br>OBRA         | 12983746   | INTRAMAQ           | 23/04/2026 |            |
| 85 | JUAN JOSE RODRIGUEZ<br>CASAS       | AYUDANTE DE OBRA             | 1007991250 | CSC EL<br>PROGRESO | 27/04/2026 | 6/05/2026  |
| 86 | ANNABEL REDONDO<br>MENDOZA         | RESIDENTE SOCIAL             | 40935381   | CSC EL<br>PROGRESO | 28/04/2026 |            |
| 87 | LAURA MILEXI FAJARDO<br>MARTINEZ   | RESIDENTE SST                | 1057606961 | CSC EL<br>PROGRESO | 4/05/2026  | 16/05/2026 |
| 88 | VICTOR ALFONSO<br>SEPÚLVEDA CANO   | OPERADOR<br>RETROCARGADOR    | 1035520414 | CSC EL<br>PROGRESO | 4/05/2026  |            |
| 89 | JHONATAN CHACON<br>BETANCUR        | OPERADOR<br>VIBROCOMPACTADOR | 1036133421 | INTRAMAQ           | 4/05/2026  |            |
| 90 | HERMAN ARIEL<br>CASTRILLON NARANJO | OPERADOR<br>MOTONIVELADORA   | 75059893   | INTRAMAQ           | 4/05/2026  |            |
| 91 | JHON BAYRON LOPEZ<br>BOLIVAR       | TOPOGRAFO                    | 98672156   | VTR                | 4/05/2026  | 22/05/2026 |
| 92 | JULIO CESAR ARTEAGA<br>VASQUEZ     | CONDUCTOR                    | 71951683   | CSC EL<br>PROGRESO | 5/05/2026  |            |
| 93 | LUIS ALBERTO GARCIA<br>ACEVEDO     | CONDUCTOR                    | 1058844006 | MINOICA            | 5/05/2026  |            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO |                               |                  |            |                 |                  |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| CONTRATO                                |                               |                  |            |                 |                  |                 |
| No,                                     | NOMBRE                        | CARGO            | CEDULA     | EMPRESA         | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
| 94                                      | MARIA CAMILA MAYA MUÑOZ       | AUXILIAR ADMON   | 1001233957 | CSC EL PROGRESO | 23/04/2026       | 11/05/2026      |
| 95                                      | MARTIN ALONSO VAQUEZ GOMEZ    | AYUDANTE DE OBRA | 1037750675 | CSC EL PROGRESO | 6/05/2026        |                 |
| 96                                      | MILTON CESAR OSPINA           | AYUDANTE DE OBRA | 1039884787 | CSC EL PROGRESO | 7/05/2026        |                 |
| 97                                      | JULIAN ANDRES VASQUEZ VASQUEZ | AYUDANTE DE OBRA | 1037750345 | CSC EL PROGRESO | 7/05/2026        |                 |
| 98                                      | RUBEN DARIO PALOMINO TICORA   | CONDUCTOR        | 10177636   | INTRAMAQ        | 7/05/2026        |                 |
| 99                                      | CESAR AUGUSTO ALVAREZ URIBE   | AYUDANTE DE OBRA | 71951468   | CSC EL PROGRESO | 8/05/2026        |                 |
| 100                                     | CARLOS EDUARDO GAVIRIA CANO   | AYUDANTE DE OBRA | 1037750308 | CSC EL PROGRESO | 8/05/2026        |                 |
| 101                                     | SEBASTIAN MONTOYA MORENO      | AYUDANTE DE OBRA | 1017197024 | CSC EL PROGRESO | 16/05/2026       |                 |
| 102                                     | LEIDY DANIELA LOPEZ VELASQUEZ | RESIDENTE SST    | 1152710084 | CSC EL PROGRESO | 19/05/2026       |                 |
| 103                                     | SILVIO PALACIOS RENTERIA      | TOPOGRAFO        | 1077437836 | CSC EL PROGRESO | 20/05/2026       |                 |
| 104                                     | LUZ MAIDE CANO JARAMILLO      | AUXILIAR ADMON   | 1036937360 | CSC EL PROGRESO | 20/05/2026       |                 |
| 105                                     | NEPTALY GAFARO                | OPERADOR         | 88160936   | CSC EL PROGRESO | 18/06/2026       |                 |
| 106                                     | OSCAR DARIO DURANGO ROBLEDO   | AYUDANTE DE OBRA | 1022098248 | CSC EL PROGRESO | 24/06/2026       |                 |
| 107                                     | YILMER STIVEN LONDOÑO MIRANDA | AYUDANTE DE OBRA | 1011592015 | CSC EL PROGRESO | 24/06/2026       |                 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                  |                              |            |                 |            |  |
|-----|----------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|--|
| 108 | JORGE MANRIQUE SANCHEZ           | CONDUCTOR                    | 1059811603 | INTRAMAQ        | 24/06/2026 |  |
| 109 | HUGO ALBERTO VASQUEZ ZAPATA      | AYUDANTE DE OBRA             | 71951328   | CSC EL PROGRESO | 3/06/2026  |  |
| 110 | JUAN CAMILO SANIN ALVAREZ        | AYUDANTE DE OBRA             | 1007304712 | CSC EL PROGRESO | 3/06/2026  |  |
| 111 | ANDRES FELIPE ANGEL AGUDELO      | AYUDANTE DE OBRA             | 1039887284 | CSC EL PROGRESO | 3/06/2026  |  |
| 112 | DEICY MARCELA ESTRADA HOLGUIN    | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 1039885297 | CSC EL PROGRESO | 3/06/2026  |  |
| 113 | CARLOS FABIAN CHAVARRIAGA CORREA | AYUDANTE DE OBRA             | 1037750161 | CSC EL PROGRESO | 4/06/2026  |  |
| 114 | JORGE IVAN ECHAVARRIA AGUDELO    | RESIDENTE SOCIAL             | 71667805   | CSC EL PROGRESO | 9/06/2026  |  |
| 115 | DEVINSON PALACIOS ROMAÑA         | AUX TOPOGRAFIA               | 11814278   | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 116 | JUAN CAMILO CALDERON ROJAS       | AUX LABORATORIO              | 1047231112 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 117 | ALEJANDRO FLOREZ TOBON           | AYUDANTE DE OBRA             | 1013341602 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 118 | RUBEN ALVEIRO MEJIA GRISALES     | OFICIAL DE OBRA              | 70783692   | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 119 | JHON BYRON SANCHEZ ESTRADA       | AYUDANTE DE OBRA             | 1039887232 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 120 | JAIME MARIO GUERRA PUERTA        | AYUDANTE DE OBRA             | 15265753   | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 121 | JUAN FELIPE GALLEGU HOLGUN       | AYUDANTE DE OBRA             | 1007518605 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 122 | MIGUEL ANGEL BEDOYA BERMUDEZ     | AYUDANTE DE OBRA             | 1007304726 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 123 | DUBAN DARIO GONZALEZ BEDOYA      | AYUDANTE DE OBRA             | 1039884829 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |

|                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br>Contrato de Interventoría<br>No 20260072 DE 2025<br>INFORME SST MENSUAL N° 06 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                 |                  |            |                 |            |  |
|-----|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|--|
| 124 | CRISTIAN DAVID PIÑERES GONZALEZ | AYUDANTE DE OBRA | 1002130942 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 125 | CRISTIAN MARIN MONTOYA          | AYUDANTE DE OBRA | 1037751490 | CSC EL PROGRESO | 25/06/2026 |  |
| 126 | JHON MARIO BEDOYA LOPEZ         | DIRECTOR DE OBRA | 15539545   | INTRAMAQ        | 10/02/2026 |  |

## 6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En la tabla No 4, se relaciona el listado de personal técnico de interventoría.

**Nota:** Se evidencia Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría y Anexo 26. Listado de personal de obra e interventoría

**Tabla 4 LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO**

| LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA |                             |                 |            |                      |                  |                 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|
| CONTRATO                       |                             |                 |            |                      |                  |                 |
| No                             | NOMBRE                      | CARGO           | CEDULA     | EMPRESA              | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
| 1                              | JUAN GUILLERMO TOBON POSADA | RESIDENTE CIVIL | 71776136   | CONSORCIO TEMPORALES | 23/01/2026       |                 |
| 2                              | CARLOS MEJIA                | RESIDENTE CIVIL | 112836805  | CONSORCIO TEMPORALES | 23/01/2026       |                 |
| 3                              | JHON ALEXANDER GOMEZ        | TOPOGRAFO       | 1096956411 | CONSORCIO TEMPORALES | 16/02/2026       |                 |
| 4                              | JHON FREDY CUARTAS MEJIA    | AUX TOPOGRFIA   | 1040733652 | CONSORCIO TEMPORALES | 16/02/2026       |                 |

Objeto del contrato de interventoría.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                 |                         |            |                      |            |            |
|----|---------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|------------|
| 5  | DIANA CAROLINA VASQUEZ          | RESIDENTE AMBIENTAL     | 1020447060 | CONSORCIO TEMPORALES | 16/02/2026 | 17/03/2027 |
| 6  | YULIANIS MARRIET SIERRA LONDOÑO | DIRECTORA INTERVENTORIA | 32182315   | CONSORCIO TEMPORALES | 03/03/2026 | 17/04/2026 |
| 7  | FRAMBEY CUELLO                  | PROFESIONAL AMBIENTAL   | 1122404244 | CONSORCIO TEMPORALES | 16/03/2026 |            |
| 8  | NUBIA INES GIL CARMONA          | PROFESIONAL SST         | 42683118   | CONSORCIO TEMPORALES | 9/03/2026  |            |
| 9  | DIANA MILENA HERNANDEZ          | PROFESIONAL SOCIAL      | 1017169820 | CONSORCIO TEMPORALES | 3/03/2026  | 17/03/2026 |
| 10 | NATALIA RIOS GIRALDO            | PROFESIONAL SOCIAL      | 1053797926 | CONSORCIO TEMPORALES | 16/03/2026 |            |
| 11 | BRAYAN GRAJALES                 | TECNOLOGO AUX INTERV    | 1094942155 | CONSORCIO TEMPORALES | 9/03/2026  |            |
| 12 | OMAR ZACARIAS AMAYA             | TECNOLOGO AUX INTERV    | 71780175   | CONSORCIO TEMPORALES | 2/03/2026  |            |
| 13 | MARIA CAMILA CANO VELEZ         | SECRETARIA ADMON        | 1006635089 | CONSORCIO TEMPORALES | 7/03/2026  |            |
| 14 | MARIANA OTALVARO ZEA            | SECRETARIA ADMON        | 1000412842 | CONSORCIO TEMPORALES | 2/03/2026  |            |
| 15 | PAULA ANDREA HERNANDEZ DUCUARA  | RESIDENTE SST           | 52198193   | CONSORCIO TEMPORALES | 06/04/2026 | 30/04/2026 |
| 16 | NATHALY GRISALES PINO           | RESIDENTE AMB FRONTINO  | 43910940   | CONSORCIO TEMPORALES | 09/04/2026 |            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                          |                         |            |                      |            |            |
|----|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|------------|
| 17 | DIANA MARCELA ARANGO     | RESIDENTE SST EBEJICO   | 1128467103 | CONSORCIO TEMPORALES | 13/04/2026 |            |
| 18 | FABIAN FORERO MARTINEZ   | RESIDENTE CIVIL         | 5428444    | CONSORCIO TEMPORALES | 16/04/2026 | 12/06/2026 |
| 19 | CAROLINA BEDOYA          | RESIDENTE SST FRONTINO  | 1017128903 | CONSORCIO TEMPORALES | 04/05/2026 |            |
| 20 | JOSE LUIS DE ALBA VARELA | RESIDENTE CIVIL EBEJICO | 72144020   | CONSORCI TEMPORALES  | 12/06/2026 |            |
| 21 | NATALIA GUTIERREZ        | TECN. CIVIL             | 1152196667 | CONSORCIO TEMPORALES | 16/06/2026 |            |

## 7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST

Se evidencia el Sistema de Gestión SST totalmente implementado por el contratista, Consorcio El Progreso basado en el Decreto 1072 de 2015 y su estructura se organiza de acuerdo al cumplimiento de los Estándares Mininos, establecidos en el de la resolución 0312 de 2019. Desarrollados bajo la metodología del ciclo PHVA.

Durante el periodo de junio de 2026, la Interventoría realizó acompañamiento sst a las actividades constructivas, inspecciones de seguridad, revisión documental y seguimiento en los diferentes frentes de trabajo ubicados en los corredores viales de Sopetrán, Frontino, Ebéjico, verificando aspectos relacionados con identificación de peligros, control de riesgos, implementación de medidas preventivas, condiciones locativas, señalización, uso de elementos de protección personal (EPP), control operacional y cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo.

Así mismo, la Interventoría efectuó seguimiento al cumplimiento de actividades relacionadas en el plan de trabajo de los tres corredores.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la interventoría, se encuentra en construcción, siguiendo los lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019.

|                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br><i>Contrato de Interventoría</i><br>No 20260072 DE 2025<br><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO

Desde la interventoría se realizó seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se verificó el cumplimiento de las disposiciones legales, contractuales en materia de seguridad y salud ocupacional, buscando prevenir accidentes, enfermedades laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores. Se verificó el cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares de seguridad dispuestos en SG-SST del contratista Consorcio El Progreso.

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:

Las evidencias de la gestión realizada por el contratista en los frentes de trabajo Sopetrán, Frontino, Ebéjico, se pueden verificar en el anexo 24. Registro fotográfico de obra de las actividades ejecutadas en la gestión SST.

La interventoría realizó trabajo administrativo con la revisión de ingresos de personal, maquinaria y equipo, acompañamiento en campo y seguimiento a la gestión SST del contratista.

**Correos:** Con el contratista se tuvo comunicación vía correo electrónico para autorización de ingresos y envío de informes SST mensuales. En el anexo 35. Comunicaciones se puede evidenciar estos.

**Oficios:** En el anexo 35. Comunicaciones, se pueden evidenciar el oficio enviado con numero consecutivo 150 con respuesta a este oficio por parte del contratista.

### a. Seguridad Social

Para el mes de junio, El Consorcio El Progreso ha realizado los pagos de la seguridad social conforme a los plazos establecidos por la normatividad. Como interventoría, hemos

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

validado que cada trabajador cuente con su cobertura de ARL, salud, pensión, CCF se encuentre al día, con el fin de dar cumplimiento a este requisito legal.

Contratista: En el anexo 21. Seguridad social de obra e interventoría. Se evidencia los aportes al sistema de seguridad social con los radicados de afiliación.

**Interventoría:** Para el periodo evaluado junio de 2026, la interventoría contó con 1 ingreso de la tecnóloga civil, los demás integrantes de la interventoría cuentan con planilla de seguridad social.

#### **b. Presupuestos**

La interventoría verificó que los recursos ejecutados para SST y PMT fueran aplicados conforme a las necesidades operativas del proyecto, dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable al sector de infraestructura vial y a los lineamientos técnicos establecidos para la gestión de riesgos y seguridad vial.

Para el corredor **Sopretrán – Belmira**, la interventoría verificó una ejecución presupuestal por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.943.078), correspondientes a gastos de dotación, chaquetas, hidratación, cinta de señalización.

Para el PMT en Sopetrán se ejecutó un presupuesto de \$ 34.070.305

Para el corredor **Frontino – Nutibara**, la interventoría verificó una ejecución presupuestal por valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.083.167), correspondientes a actividades orientadas a la prevención de riesgos laborales, suministro de elementos de protección personal (EPP), capacitaciones, inspecciones de seguridad y controles operacionales.

Para el PMT en Frontino se ejecutó un presupuesto de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$39.819.159).

Para el corredor **Ebéjico – Heliconia – Medellín** a la fecha del informe no se ha generado el acta de cobro calcular estos valores.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### c. Anexos contratista e interventoría:

Dentro del informe mensual del mes de junio de 2026, se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden:

- Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra e Interventoría.
- Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del contratista).
- Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
- Anexo 8. Comité Copasst 2013/86 obra e interventoría.
- Anexo 9. Comité Cocola 1010/06 obra e Interventoría.
- Anexo 15. Documentos de ingreso de obra e interventoría.
- Anexo 17. Inducción y evaluación de obra e Interventoría.
- Anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría.
- Anexo 19. Dotación de obra e Interventoría.
- Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría.
- Anexo 21. Seguridad Social de obra e Interventoría.
- Anexo 22. Nóminas de obra e interventoría.
- Anexo 23. Inspecciones de seguridad de obra e interventoría.
- Anexo 24. Registro Fotográfico de obra e interventoría.
- Anexo 25. Liquidaciones de obra e Interventoría.
- Anexo 26. Listado de personal de obra e interventoría.
- Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.
- Anexo 32. Ausentismo general de obra e interventoría.
- Anexo 33. Capacitaciones obra e interventoría.
- Anexo 34. Análisis y conclusiones de obra e interventoría.
- Anexo 35. Comunicaciones.

### d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

El consorcio El Progreso para este periodo realizó las evaluaciones ocupacionales de ingreso y de retiro, de acuerdo a la legislación vigente y a los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Los resultados de las evaluaciones médicas se le comunican al trabajador por escrito para posterior seguimiento.

Para el periodo en estudio junio de 2026 el contratista realizó 01 examen médicos de ingreso para el frente de Frontino y para el frente de Sopetrán se realizaron 4 exámenes y para el frente Ebéjico realizaron 17 exámenes médicos de ingreso todos con concepto medico aceptable para el cargo.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Para el periodo la interventoría realizó 2 exámenes médicos de ingreso con concepto aceptable para los cargos.

**e. Subprograma de higiene industrial:**

Para este periodo del informe no se realizaron estudios ambientales por parte del contratista, ni por parte de interventoría.

**f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo**

El contratista realizó la inducción a (22) personas que ingresaron al proyecto, se realizó capacitación por parte de la ARL a 14 personas en el frente de Sopetrán sobre Riesgo mecánico y en caliente. (1) persona en Frontino, recibió certificación de auxiliar vial. Las evidencias de la inducción se encuentran en el Anexo 17. Inducción y evaluación y las evidencias de las capacitaciones en el Anexo 33. Capacitaciones  
La interventoría realizó capacitación sobre las políticas corporativas.

**g. Accidentes laborales presentados en el periodo**

En el mes de junio de 2026, no se presentaron accidentes de trabajo ni reporte de enfermedades laborales, demostrando una excelente gestión de los riesgos y seguimiento a todos los controles establecidos para mitigar los riesgos en las actividades. Los indicadores de accidentalidad se pueden mirar en el:

**Anexo 31.** Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.

**h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos**


Para este periodo en estudio mes de junio, el consorcio El Progreso siguió el cumplimiento del PESV, se realizaron inspecciones y preoperacionales a los vehículos y maquinaria, se evidenció que los conductores y operadores de maquinaria cumplieron con los requisitos para el desempeño de sus labores.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**i. Registro fotográfico:**

A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista e interventoría para el mes de junio de 2026:

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>27 Jun 2026 11:04 a.m.<br/>6°32'43.914" N 75°44'58.88" W<br/>Sopetrán<br/>Antioquia<br/>CONSORCIO EL PROGRESO<br/>VIA SOPETRAN</p> |  <p>18 Jun 2026 9:54:26<br/>6°30'55.404" N 75°44'41.736" W<br/>CONSORCIO EL PROGRESO<br/>VIA SOPETRAN-HORIZONTE-BELMIRA</p>                 |  <p>18 Jun 2026 7:44:30 a.m.<br/>6°30'55.404" N 75°44'41.736" W<br/>CONSORCIO EL PROGRESO<br/>VIA SOPETRAN</p>                              |
| <p>Charla de seguridad - Sopetrán</p>                                                                                                                                                                                    | <p>Inducción - Sopetrán</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>Calistenia - Sopetrán</p>                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>27 Jun 2026 7:09:21 a.m.<br/>6°32'43.914" N 75°44'58.88" W<br/>Sopetrán<br/>Antioquia<br/>CONSORCIO EL PROGRESO<br/>SOPETRAN</p>  |  <p>18 Jun 2026 11:05:21 p.m.<br/>6°32'22.468" N 75°44'10.159" W<br/>Sopetrán<br/>Antioquia<br/>CONSORCIO EL PROGRESO<br/>VIA SOPETRAN</p> |  <p>27 Jun 2026 11:05:21 p.m.<br/>6°32'22.468" N 75°44'10.159" W<br/>Sopetrán<br/>Antioquia<br/>CONSORCIO EL PROGRESO<br/>VIA SOPETRAN</p> |
| <p>Capacitación ARL- Sopetrán</p>                                                                                                                                                                                        | <p>PMT - Sopetrán</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Hidratación del personal - Sopetrán</p>                                                                                                                                                                                      |

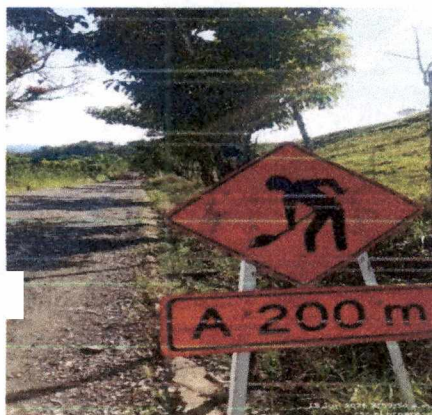


Demarcación acopios \_ Sopetrán




Entrega de dotación – Sopetrán



PMT – Sopetrán

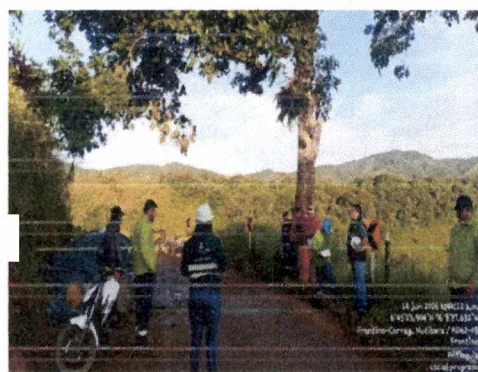

Charla de seguridad – Frontino

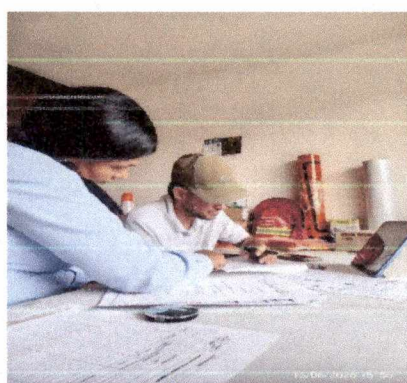


Inducción – Frontino




Calistenia – Frontino



|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
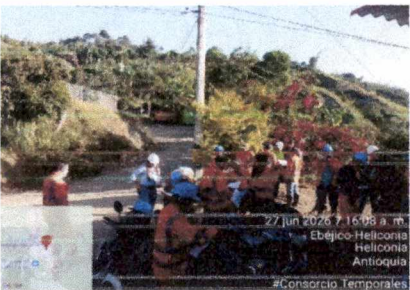
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Alcoholimetría - Frontino-</p>                                                   | <p>Diligenciamiento documental – Frontino</p>                                        | <p>Inspección botiquín - Frontino</p>                                                                           |
|    |   |                             |
| <p>Uso de EPP – Frontino</p>                                                        | <p>Señalización de seguridad - Frontino</p>                                          | <p>Preoperacionales – Frontino</p>                                                                              |
|   |  |  |
| <p>Preoperacionales - Ebéjico</p>                                                   | <p>Acompañamiento sst a las actividades - Ebéjico</p>                                | <p>Charla sst sst - Ebéjico</p>                                                                                 |
|  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
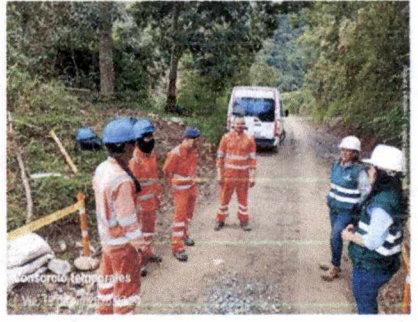
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Charla sst sst - Ebejico                                                            | Diligenciamiento preoperacionales - Ebejico                                          | Verificación PMT - Sopetrán                                                           |
|    |    |    |
| Verificación PMT - Ebejico                                                          | Inspección elementos de emergencias - Ebéjico                                        | Verificación diligenciamiento de preoperacionales _ Ebéjico                           |
|    |   |   |
| Verificación PMT - Frontino                                                         | Verificación gestión sst - Frontino                                                  | Acompañamiento sst - Frontino                                                         |
|  |  |  |
| Verificación acopios - Sopetran                                                     | Acompañamiento sst - Sopetran                                                        | Acompañamiento sst - Sopetran                                                         |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/>Contrato de Interventoría<br/>No 20260072 DE 2025<br/>INFORME SST MENSUAL N° 06</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contrato de obra No. 2500111B2821 de 2025 se enfocó el desempeño del sistema se evalúa bajo los siguientes criterios:

- Se evidenció el inicio de actividades de organización y adecuación operativa por parte del contratista, orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Durante las inspecciones y recorridos realizados por la interventoría SST, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de los controles en actividades desarrolladas en brechas y zonas de tránsito. En atención a las observaciones realizadas, el contratista acordó implementar el uso de dos escaleras para garantizar un ascenso y descenso seguro de los trabajadores, considerando que durante la evaluación de peligros, no se evidenció riesgo de caída que requiriera la utilización de arnés y línea de vida. Esta medida busca fortalecer las condiciones de seguridad y facilitar la movilidad del personal en las áreas intervenidas.
- En cuanto al manejo del tránsito y señalización vial, se realizaron observaciones frente a la implementación del PMT, solicitando mayor control y supervisión en las actividades de “pare y siga”, con el propósito de garantizar condiciones seguras para trabajadores, peatones y usuarios de la vía.
- La interventoría requirió al contratista la entrega de certificados de capacitación y competencias laborales del personal expuesto a actividades de alto riesgo, específicamente en trabajo seguro en alturas, espacios confinados y brigadas de emergencia, con el fin de verificar la idoneidad y cumplimiento legal del personal operativo.
- La Interventoría realizó la recomendación al contratista de implementar el proceso de carnetización para todo el personal operativo vinculado al proyecto, con el fin de fortalecer los controles de identificación, ingreso y permanencia del personal autorizado en los diferentes frentes de trabajo.
- En términos generales, la gestión SST presentó un avance acorde con la etapa inicial del proyecto; sin embargo, la interventoría continuará realizando seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas propuestas, con el fin de garantizar condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento integral del SG-SST durante la ejecución contractual.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br><i>Contrato de Interventoría</i><br>No 20260072 DE 2025<br><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

- Se realizó seguimiento y acompañamiento SST al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista Consorcio El Progreso.
- En este periodo junio de 2026 se realizó la revisión de la documentación para el ingreso del personal.
- Se verificó la realización de inducción y capacitación al personal que ingreso al proyecto.
- Se verificó la gestión SST, charlas, capacitaciones, entrega de los EPP, inspecciones a vehículos y maquinaria, hidratación del personal, diligenciamiento de los preoperacionales.

## 11. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda al contratista continuar promoviendo hábitos de autocuidado enfocado en una cultura en la prevención de accidentes laborales y enfermedades laborales.
- Fortalecer el seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, garantizando la implementación efectiva de los controles operacionales establecidos para las actividades ejecutadas en obra.
- Se recomienda al contratista continuar con el acompañamiento SST en las actividades constructivas.
- Continuar realizando inspecciones periódicas en campo con el fin de verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal, especialmente en actividades de alto riesgo como trabajos en alturas, excavaciones y labores en brecha.
- Se recomienda al contratista continuar con la ejecución del cronograma de actividades.
- Asegurar que el punto de acopio de sustancias químicas cuente con la señalización de seguridad, con todos los elementos de contención necesarios (kits de derrames), dique contención derrames.
- Hacer seguimiento a las recomendaciones médicas emitidas en los conceptos médicos ocupacionales.
- Se recomienda seguir con el diligenciamiento de inspecciones periódicas, preoperacionales de maquinaria, equipos y vehículos.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br/>República de Colombia</p> | <p><b>CONSORCIO TEMPORALES</b><br/><i>Contrato de Interventoría</i><br/>No 20260072 DE 2025<br/><b>INFORME SST MENSUAL N° 06</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

- Se recomienda realizar mantenimiento permanente a la señalización vial.
- Se recomienda actualizar a cartelera informativa SST con información relevante.
- Para iniciar cualquier labor ya sea rutinaria o no rutinaria es obligatoria presentar y diligenciar correctamente la documentación reglamentaria de seguridad. Esto garantiza la identificación de riesgos, el cumplimiento legal y la protección del personal.

# **Observación** **de Archivo**

**EN ESTE FOLIO VA UNA USB**  
**VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO**
