

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 1 de 34

CONTRATO DE OBRA No. CLOPIH221 de 2024

INFORME DE OBRA No. 008

MENSUAL

☒

FINAL

☐

Objeto Contrato: “CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA”



MUNICIPIO: GUADALUPE

DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 2 de 34


CONTRATO DE (OBRA) No. CLOPIH221 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA FIRMA V&M INGENIERÍA SAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS MIGUEL CAQUIMBO	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLOPIH221DE 2024		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Entre 15 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.
CONTRATISTA	V&M INGENIERÍA SAS	NIT:	900.062.688 -7
REPRESENTANTE LEGAL:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	C.C:	7.713.933 NEIVA HUILA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	27/09/2024		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12/11/2024		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato será TRES (03) meses, contados a partir del acta e inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	31/01/2025 Dos (02) meses		
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	10/04/2025 Dos (02) meses		
PLAZO TOTAL SEGÚN OTRO SI No. 2	El plazo estimado para la ejecución del contrato será Siete (07) meses, contados a partir del acta e inicio, conforme a la adicional en tiempo mediante prorroga No.2.		
ACTA DE SUSPENSIÓN (No.1) (D/M/A):	20/05/2025		
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1) (D/M/A):	19/08/2025		
ACTA DE REINCIO (No.1) (D/M/A):	15/09/2025		
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1	17/09/2025		
FECHA DE TERMINACION (D/M/A):	07/10/2025		
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.453.038.929,00) MCTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 79,971,854.00) MCTE		
VALOR TOTAL:	MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$1,533,010,783.00) MCTE		
INTERVENTOR:	CONSTRUMAC INGENIERÍA SAS	NIT:	900.116.571-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA	C.C:	1.007.750.886 DE ARMENIA (Q)
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
El proyecto Construcción Cancha Sintética Villa Olímpica del Municipio de Guadalupe, Departamento del Huila se ubica en el municipio de Guadalupe - Huila, en la región andina de Colombia.			

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 3 de 34

Esta localidad se encuentra rodeada de paisajes montañosos y ríos, es conocida por su belleza natural y su enorme herencia cultural. La cancha sintética se construirá dentro de las instalaciones del proyecto macro Villa Olímpica, área designada para actividades deportivas y recreativas que beneficiarán a la comunidad local.

MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA, ESPECÍFICAMENTE EN EL KM 3 VÍA MUNICIPIO DE GUADALUPE AL MUNICIPIO DE ALTAMIRA.

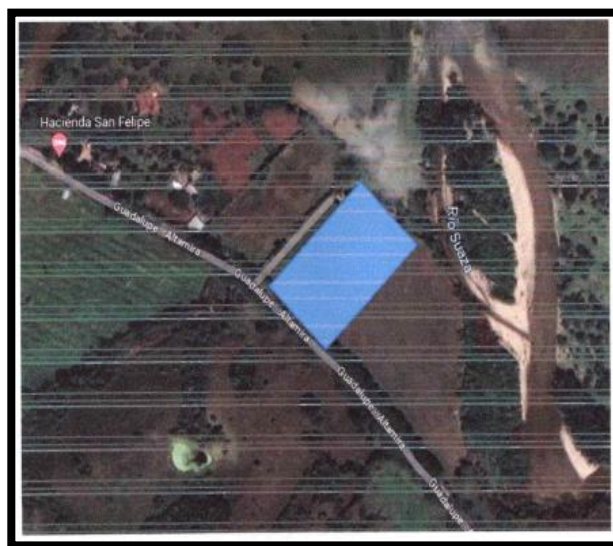

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La cancha sintética tendrá una superficie total de 1750 m² y contará con una serie de características y componentes, incluyendo:

- Red de aguas lluvias con cuneta perimetral de concreto de 3000 psi, cajas de inspección y filtros laterales.
- Placa de piso de 3000 PSI.
- Instalación de césped.
- Demarcación de la cancha.
- Cerramiento perimetral.
- Iluminación.

El proyecto busca proporcionar un espacio seguro y de alta calidad para la práctica deportiva y recreativa, así como para la realización de eventos culturales y comunitarios.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realizó reunión de seguimiento junto con el Comité de Veeduría, la Secretaría de Planeación municipal y el equipo directivo de la obra CLOPIH 221/2024, con el objetivo de evaluar el avance físico y la calidad del proceso constructivo. Para lo cual el director de obra presentó un informe detallado sobre el estado actual del proyecto, destacando los logros alcanzados y las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia en la ejecución del proyecto.

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
	Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 4 de 34	

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
FECHA DE INICIO	12/11/2024			
OTROSÍ No.1 – PRORROGA	31/01/2025	80		13/04/2025
OTROSÍ No.2 - PRORROGA	10/04/2025	69		12/06/2025
SUSPENSIÓN No.1	20/05/2025	39		
PRORROGA SUSPENSION No.1	19/08/2025		92	
REINICIACIÓN No.1	15/09/2025		26	07/10/2025
BALANCE DE OBRA No. – MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17/09/2025	3		
TOTAL DIAS		191	118	
6. ACTAS				
Tipo de Acta		No.	Fecha	
Acta De Inicio			12 de noviembre de 2024	
Acta De Justificación No. 1 De Prórroga		1	31 de enero de 2025	
Acta De Justificación No. 2 De Prórroga		2	10 de abril de 2025	
Acta De Suspensión No. 1		3	20 de mayo de 2025	
Acta De Justificación No. 3 Para La Suspensión No.1		4	20 de mayo de 2025	
Acta De Prórroga No. 2 Al Acta De Suspensión No.1		5	19 de agosto de 2025	
Acta De Reinicio No. 1		6	15 de septiembre de 2025	
Acta De Justificación No. 4 Reinicio No. 1		7	15 de septiembre de 2025	
Acta De Justificación No. 5 De Mayores Y Menores Cantidades De Obra.		8	17 de septiembre de 2025	
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO				

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 5 de 34

a). Actividades administrativas	<ul style="list-style-type: none"> - Registro en la bitácora de obra de las actividades realizadas durante el periodo del informe. - Presentación de informes mensuales para revisión y aprobación de la interventoría, según los lineamientos contractuales. - Respuesta oportuna mediante oficios a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor o la supervisión. - Revisión y trámite oportuno de las actas levantadas en el periodo del informe - Suscripción acta de justificación No.4 – reinicio No.1 - Aprobación acta de mayores y menores cantidades - Acta de justificación No.5 Mayores y menores cantidades de obra - Reprogramación de actividades y ejecución de acuerdo al balance de obra No.1 - Control financiero de las obras ejecutadas y control presupuestal. - Pago de servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra. - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se encuentra laborando para la ejecución de la obra. - Cumplimiento con obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculadora a la obra. - Afiliación de personal directo, verificando que se ubique en el nivel de riesgo correspondiente.
b). Actividades operativas	<p>Durante el periodo comprendido del 15 al 30 de septiembre de 2025, Se adelanta acto administrativo en las instalaciones del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA. Con el fin de tratar temas relevantes sobre la ejecución del contrato CLOPIH 221 DE 2024 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA” las partes interesadas V&M INENIERIA SAS R/L Yerson Fernando Camacho Ladino en calidad de contratista, CONSTRUCCMAC INGENIEROS SAS R/L Daniela Carrillo Tavera en calidad de interventor y Luis Miguel Caquimbo Gómez como apoyo a la Supervisión del contrato de interventoría,</p> <p>Donde acuerdan dar reinicio al contrato de obra e interventoría, toda vez que se habían superado los motivos que originaron la suspensión temporal del contrato. Adicionalmente, el 17 de septiembre de 2025, se suscribió la Acta de Justificación No. 5, relativa a mayores y menores cantidades de obra, lo que permitió la aprobación de la adición presupuestal correspondiente.</p> <p>Con la aprobación de la adición presupuestal, se garantizó la continuidad y ejecución de las actividades pendientes, incluyendo el inicio de la instalación del sistema eléctrico, que se encontraba supeditado a la aprobación de mayores y menores cantidades. En consecuencia, a lo anterior, se realizó una reprogramación de actividades para dar cumplimiento al cronograma establecido y garantizar la funcionalidad y calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con los lineamientos técnicos y las especificaciones del contrato.</p> <p>Del mismo modo, en el marco de la ejecución del contrato, durante el periodo en mención se llevaron a cabo las actividades programadas según el cronograma de ejecución actualizado.</p> <p>Se da continuidad a las actividades pendientes de ejecución según la aprobación de mayores y menores cantidades No.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Localización y replanteo manual 1.2. Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material 2. MOVIMIENTO DE TIERRA <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Excavación manual incluye retiro

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 6 de 34

	<p>2.2. Excavación mecánica incluye retiro 1 km</p> <p>2.3. Rellenos con recebo compactado mecánicamente</p> <p>3. RED AGUAS LLUVIAS</p> <p>3.2. Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable.</p> <p>3.3. Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón.</p> <p>3.4. Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"</p> <p>3.5. Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable</p> <p>4. PLACA CANCHA</p> <p>4.3. Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dux, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fábrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.</p> <p>4.4. Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm</p> <p>4.5 Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50</p> <p>5. CERRAMIENTO</p> <p>5.4. Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación</p> <p>5.5. Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa</p> <p>5.7. Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en Angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m</p> <p>5.8. Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.</p> <p>5.9. Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta.</p> <p>6. ILUMINACIÓN</p> <p>6.3. Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"</p> <p>6.4. Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)</p> <p>6.5. Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada</p> <p>Es importante destacar que estas actividades se ejecutaron en estricto cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad establecidas, garantizando la calidad de la obra.</p>
--	--

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO


MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA

SEPTIEMBRE 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 7 de 34

Durante el mes septiembre de 2025, el municipio de Guadalupe, Huila, experimentó condiciones climáticas favorables que permitieron el desarrollo y ejecución óptimos de las actividades propuestas según el cronograma de actividades de obra. Las temperaturas oscilaron entre 18 °C y 31 °C, lo que significó un entorno propicio para el avance de los trabajos.

Con ello se logró cumplir los plazos establecidos para la ejecución de actividades de obra evitando reprocesos y retrasos lo cual ha sido fundamental para garantizar la calidad y eficiencia en la obra.

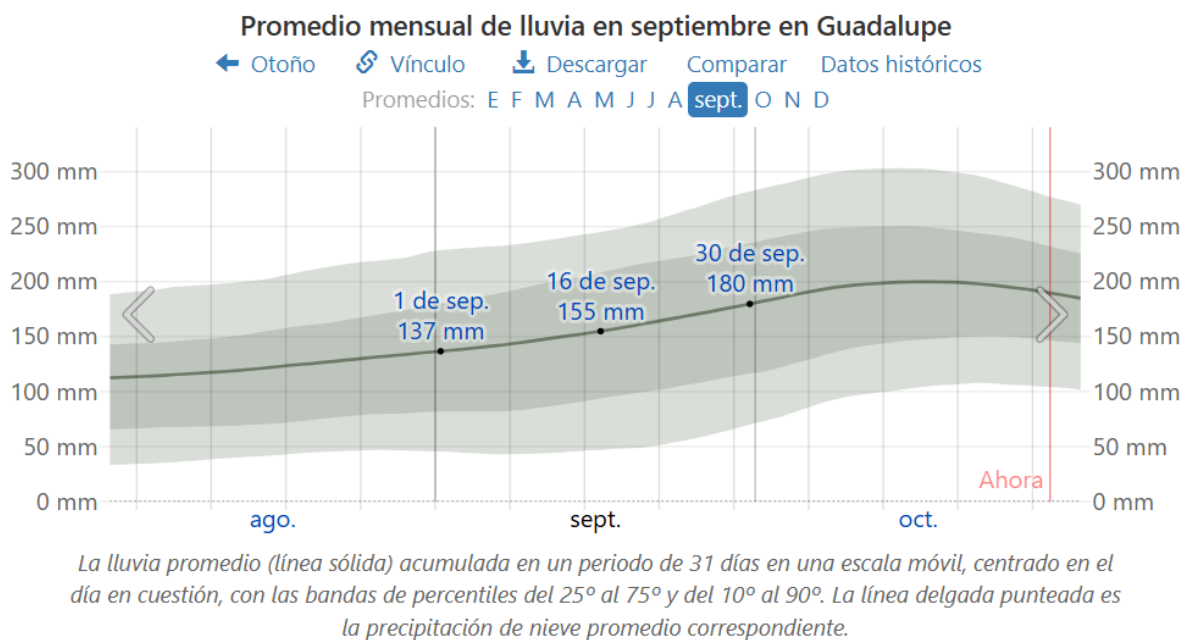

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI	CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 18Mpa CEMENTO: 6,78 Bulto Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,22 m3 AGUA:175 Litros
Diseños de mezcla para base.	3000 PSI	CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 21Mpa CEMENTO: 7,49 Bulto Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,2 m3 AGUA:175 Litros

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2
		Página 8 de 34

Compresión simple al concreto.	2500 PSI CONCRETO CICLOPEO
	3000 PSI VIGA DE CIMENTACION
	3000 PSI PLACA DE PISO
Ensayo de compactación de campo	DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3)
	HUMEDAD ÓPTIMA (%)
	Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) $R^2 = 0.9954$ 2.145 6.00
	2.56
Proctor compactación modificada material de relleno	DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3)
	HUMEDAD ÓPTIMA (%)
	Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) $R^2 = 0.9954$ 2.145 6.00
	2.56

NOTA: Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Andén, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
Placa de piso polideportivo	04/03/2025	11/03/2025	x			2100 PSI	2399 PSI	CUMPLE
		11/03/2025	x			2100 PSI	2290 PSI	CUMPLE
		01/04/2025			x	3000 PSI	3087 PSI	CUMPLE
		01/04/2025			x	3000 PSI	3159 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	05/03/2025	12/03/2025	x			2100 PSI	2460 PSI	CUMPLE
		12/03/2025	x			2100 PSI	2499 PSI	CUMPLE
		02/04/2025			x	3000 PSI	3531 PSI	CUMPLE
		02/04/2025			x	3000 PSI	3619 PSI	CUMPLE
Viga de cimentación cerramiento	11/03/2025	18/03/2025	x			2100 PSI	2568.95 PSI	CUMPLE
		18/03/2025	x			2100 PSI	2603.43 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3820.44 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3774.89 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	15/03/2025	22/03/2025	x			2100 PSI	2029.94 PSI	NO CUMPLE
		22/03/2025	x			2100 PSI	1950.58 PSI	NO CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3080.31 PSI	CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3138.43 PSI	CUMPLE

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA		Versión: 2
			Página 9 de 34

Placa de piso polideportivo	18/03/2025	25/03/2025	x			2100 PSI	2123.86 PSI	CUMPLE
		25/03/2025	x			2100 PSI	2031.63 PSI	CUMPLE
		15/04/2025			x	3000 PSI	3221.44 PSI	CUMPLE
		15/04/2025			x	3000 PSI	3145.13 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	20/03/2025	27/03/2025	x			2100 PSI	1857.42 PSI	NO CUMPLE
		27/03/2025	x			2100 PSI	1842.53 PSI	NO CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3022.05 PSI	CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3005.63 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	22/03/2025	29/03/2025	x			2100 PSI	2215.39 PSI	CUMPLE
		29/03/2025	x			2100 PSI	2221.70 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3197.64 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3056.12 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	25/03/2025	01/04/2025	x			2100 PSI	2229.13 PSI	CUMPLE
		01/04/2025	x			2100 PSI	2170.02 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3045.84 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3072.10 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	27/03/2025	03/04/2025	x			2100 PSI	1947.24 PSI	NO CUMPLE
		03/04/2025	x			2100 PSI	2093.61 PSI	NO CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3051.59 PSI	CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3130.33 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	31/03/2025	07/04/2025	x			2100 PSI	2451.60 PSI	CUMPLE
		07/04/2025	x			2100 PSI	2402.31 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3565.25 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3072.98 PSI	CUMPLE

DENSIDADES MÉTODO CONO DE ARENA					
No. ENSAYO	ABSCISA/EJE	PROFUNDIDAD/ALTURA - DEL ENSAYO EN CM.	MATERIAL	PORCENTAJE COMPACTACIÓN (%)	CUMPLE/ NO CUMPLE
D-0001	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.26%	CUMPLE
D-0002	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.37%	CUMPLE

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
	Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 10 de 34	

D-0003	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.80%	CUMPLE
D-0004	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.17%	CUMPLE
D-0005	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.95%	CUMPLE
D-0006	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.14%	CUMPLE

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (20%)	04/03/2025	\$ 290.607.785, 80	\$	\$
Acta Parcial No. 1	19/05/2025	\$1,263,090,597.00	\$ 233,257,727.80	\$ 933,030,911.20
Acta Recibo Final No.	N/A	\$	\$	\$
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 1,453,038,929.00	\$ 79,971,854.00	\$ 1,533,010,783.00	\$1,263,090,597.0	\$ 366,722,144.00

11. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	En el municipio de Guadalupe se desarrolló socialización del contrato de obra e interventoría y se realizó constitución de veeduría ciudadana. Asistentes: Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría)
26 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física,	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el avance del contrato de obra CLOPIH 221 de 2024. Asistentes:

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
	Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 11 de 34	

	la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	- Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría) Objetivo: Solicitar avances de ejecución del contrato y discutir dificultades presentadas.
23 DE DICIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría Objetivo: Analizar las respuestas de la Alcaldía de Guadalupe sobre topografía y diseños, revelando una nueva localización del proyecto que difiere de la etapa precontractual.
23 DE ENERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	En instalaciones de INDER Neiva se realizó comité técnico para socializar el avance de la obra hasta la fecha, que abarca actividades de localización, replanteo y descapote de la zona. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría
25 DE FEBRERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se realizó comité técnico el pasado 25 de febrero de 2025 para evaluar el desarrollo y avance de las actividades, del mismo desprendieron ciertos compromisos a evaluar por parte del ente supervisor del contrato, el contratista de obra y la evaluación y aprobación de la interventoría. En el marco del comité, se acordó revisar y actualizar los estudios y diseños del sistema eléctrico para su implementación en la cancha sintética del municipio de Guadalupe. El objetivo es realizar una cuantificación y distribución adecuada del sistema eléctrico mediante la revisión de estudios y diseños para dar cumplimiento al marco contractual de las actividades y que este sea acorde a las necesidades del escenario deportivo.
02 DE ABRIL DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
	Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 12 de 34	

	Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA) Objetivo: Revisar el avance del contrato y discutir dificultades presentadas. Se estipula que la obra se desarrolla a un ritmo inferior al estipulado debido a condiciones externas y cambios en el diseño eléctrico, por ende, se solicita y aprueba prorrogar el contrato por 2 meses, con el fin de presentar el balance de obra aprobado por interventoría y gestionar la modificación del proyecto y adición presupuestal.
15 DE MAYO 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se llevó a cabo comité técnico en las instalaciones de la obra cuyo objeto es construcción de cancha sintética Villa olímpica del municipio de Guadalupe Huila. Asistentes: - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA) - Deiber Calderón Rojas: (secretario de planeación) Objetivo: Se realizó un análisis detallado del avance del contrato, identificando retrasos debido a condiciones externas y cambios en el diseño eléctrico. Se determinó la necesidad de suspender temporalmente el contrato para presentar el balance de obra aprobado por interventoría y gestionar la modificación del proyecto y adición presupuestal.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Correspondencia (periodo del (15 al 30 de septiembre 2025)	30/09/2025		Físico – Digital
Copia de Bitácora de Obra (periodo del (15 al 30 de septiembre de 2025)	30/09/2025		Físico – Digital
Informe HSEQ periodo del (01 al 30 de septiembre de 2025)	30/09/2025		Físico – Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP)	30/05/2025		Físico – Digital

13. RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE EL PERIODO

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
--------------------	--------------------	-------	---------------------------

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 13 de 34

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933<	REPRESENTANTE LEGAL	Indefinido
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	DIRECTOR DE OBRA	Indefinido
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	1.079.409.298	RESIDENTE DE OBRA	Prestación de servicios
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	1.075.213.839	PROFESIONAL SST	Prestación de servicios
JORGE HUMBERTO ALDANA ROSERO	1.082.131.133	AYUDANTE	Obra o Labor
OSCAR OBEIMAR CABEZAS GALINDEZ	1.082.773.317	AYUDANTE	Obra o Labor
YILBER LEANDRO CORTES NIETO	1.007.659.754	AYUDANTE	Obra o Labor
JESUS OBEIMAR LOPEZ GALINDEZ	1.082.776.715	MAESTRO DE OBRA	Obra o Labor

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	191796625 - P.A. ANT V&M INGENIERIA SAS	04/03/2025
ACTA PARCIAL No.1	202775925 - SPGR	14/08/2025

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	\$ 455.600	\$ 113.900	\$ 198.200	\$ 113.900	\$ 0.00	34524910	15/09/2025
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	\$ 275.200	\$ 215.000	\$ 99.100	\$ 0.00	\$ 0.00	PY-34692815 PI-9492640240	09/10/2025 30/09/2025
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 52.900	\$ 0.00	\$ 0.00	PY-35148865 PI-34427540	28/10/2025 04/09/2025
JORGE HUMBERTO ALDANA ROSERO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	34886753	07/10/2025
OSCAR OBEIMAR CABEZAS GALINDEZ	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	34886753	07/10/2025
YILBER LEANDRO CORTES NIETO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	34886753	07/10/2025
JESUS OBEIMAR LOPEZ GALINDEZ	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	34886753	07/10/2025

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO: CLOPIH221 DE 2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	AMPARO	VIGENCIA
-------------	-----	--------	--------	----------

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 14 de 34	

			FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):		DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-10155753	Anexo 0	27/09/2024	Cumplimiento del contrato	27/09/2024	27/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/09/2024	27/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/09/2024	27/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	Anexo 0	27/09/2024	27/09/2024	27/12/2024	
Póliza actualizada ACTA DE INICIO						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	Anexo 1-2	19/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	Anexo 1-2	19/11/2025	12/11/2024	11/02/2025	
Póliza actualizada x PRORROGA No. 1						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No.1 31/01/2025						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	Anexo 3	12/02/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/10/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/10/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/04/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD OTRO SI No.1 31/01/2025						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101020276	Anexo 3-4	12/02/2025	12/11/2024	12/04/2025	
Póliza actualizada x PRORROGA No. 2						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No.2 10/04/2025						

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 15 de 34	

ASEGURADORA	No.	ENDOSO		AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 3	16/04/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/12/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/12/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/06/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD OTRO SI No. 2 10/04/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101020276	ANEXO 4	16/04/2025	12/11/2024	12/06/2025

Póliza actualizada según ACTA DE REINICIO No.1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO –REINICIO No.1 15/09/2025

ASEGURADORA	No	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 5 - 6	17/09/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/04/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/04/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD – REINICIO No. 1 15/09/2025

ASEGURADORA	No	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101022174	ANEXO 0	17/09/2025	15/09/2025	31/10/2025

Póliza actualizada según OTRO SI No. 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No. 3 23/09/2025

ASEGURADORA	No	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):


 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 16 de 34

SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 7	23/09/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/04/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD OTRO SI No. 3 23/09/2025

ASEGURADORA	No	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101022174	ANEXO 1	23/09/2025	15/09/2025	31/10/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

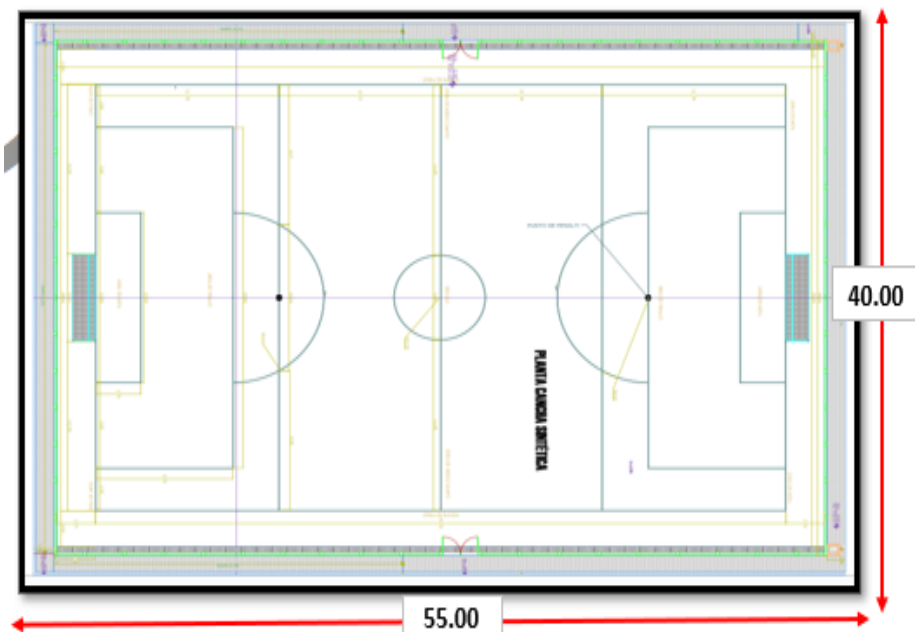

Localización y replanteo - Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material.



SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG







Código: DIH-CGID-F23

Versión: 2


Fecha Aprobación:
13/02/2023

INFORME DE OBRA

Página 17 de 34



Excavación manual





4

Materiales 0+063.00			
Nombre de Material	Área (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acum
CORTE	0.00	0.00	353.60
RELLENO	0.00	35.23	391.20




Excavación mecánica




Materiales 0+063.00			
Nombre de Material	Área (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acum
CORTE	0.00	0.00	353.60
RELLENO	0.00	35.23	391.20


Relleno con rebase compactado mecánicamente

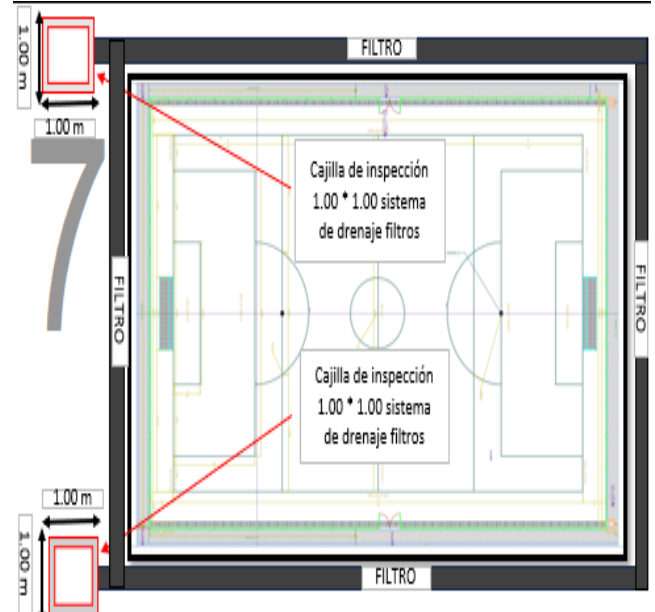

Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable

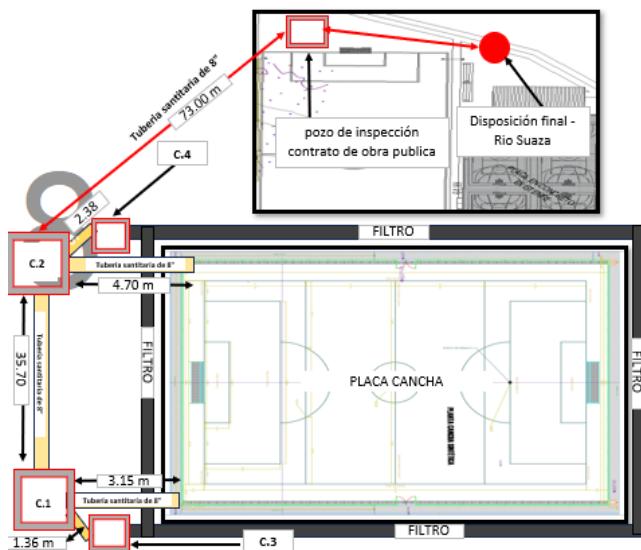

Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón

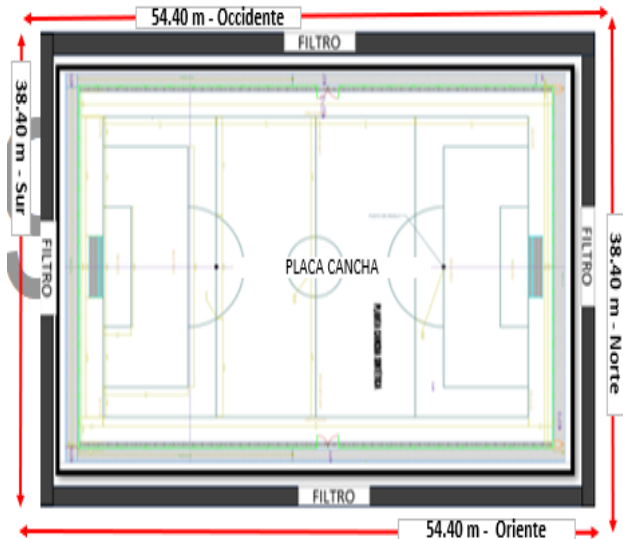


Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería pvc drenajes de 6"




Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable




Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fábrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.

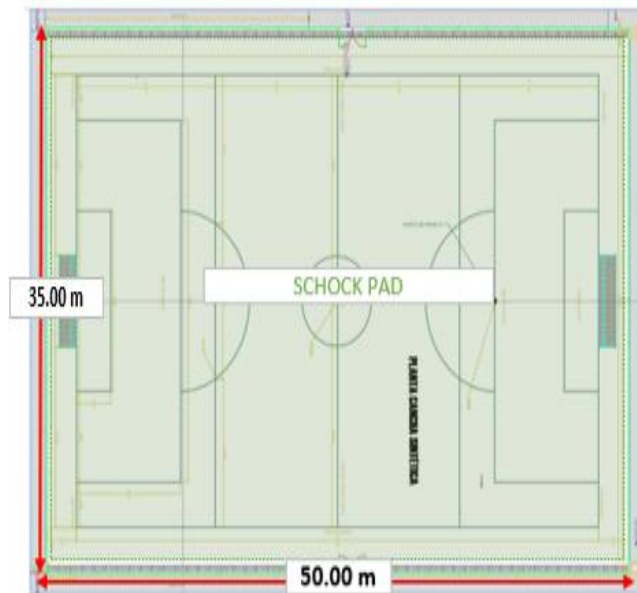


Suministro e instalacion de almohadilla de choque shock pad 20 mm

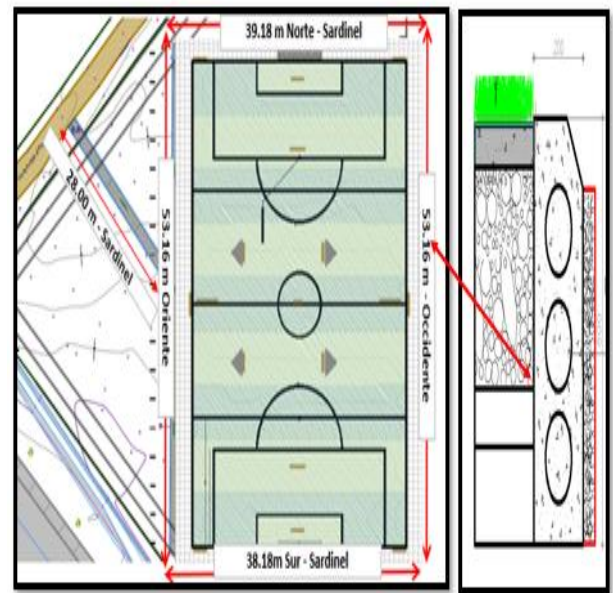


Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50

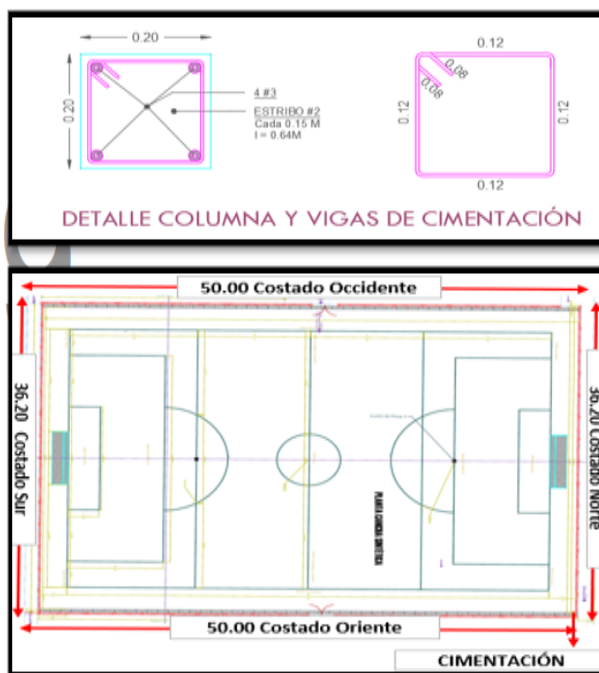


Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación

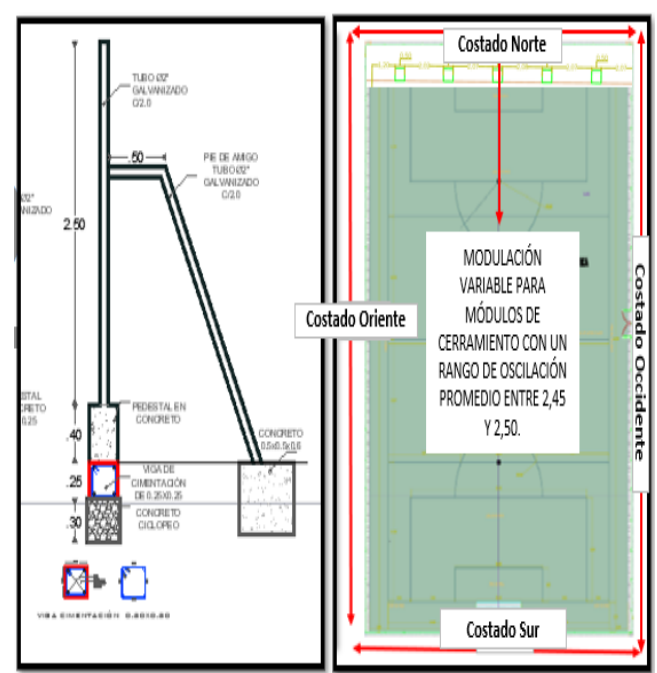


Tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa

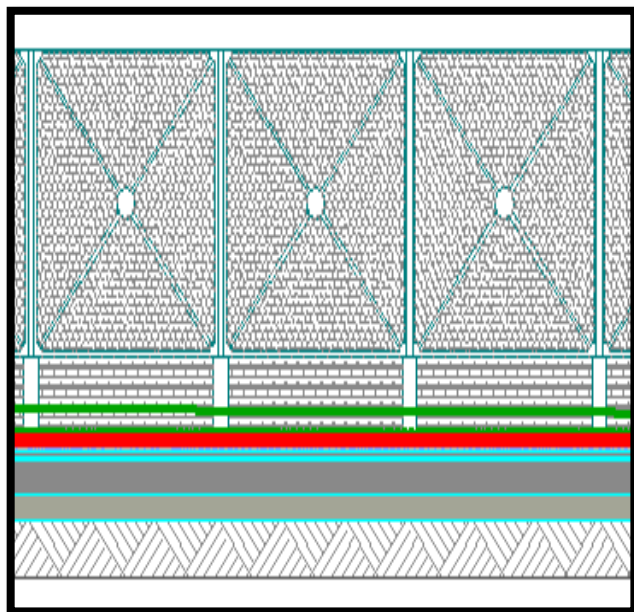


Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en Angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m

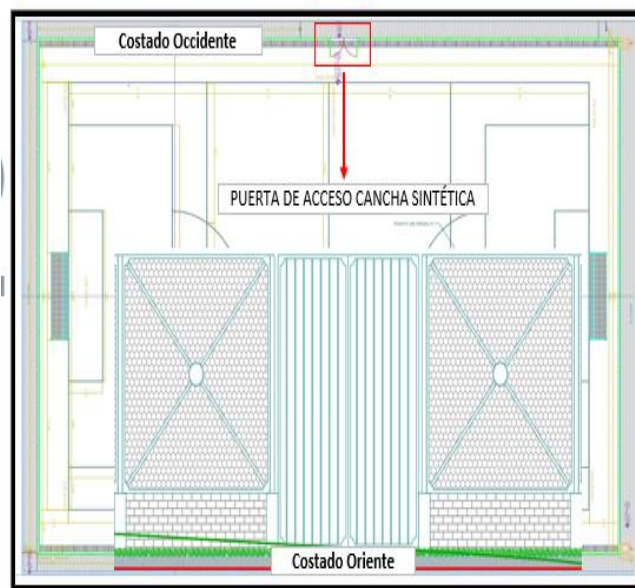

Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.

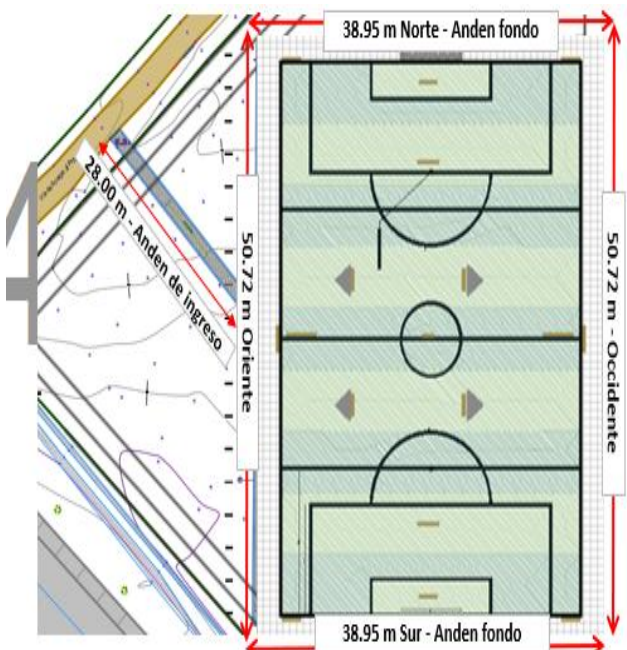



Concreto 3000 psi andenes perimenterales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta

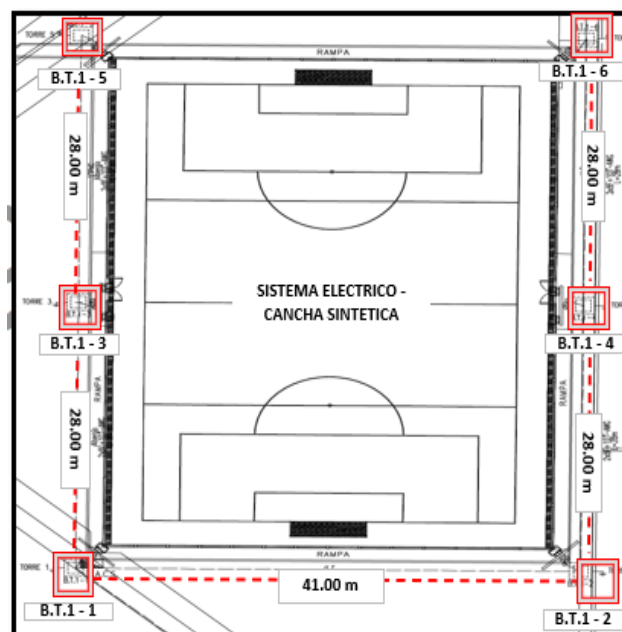

Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1



Salida Parcial Electrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)

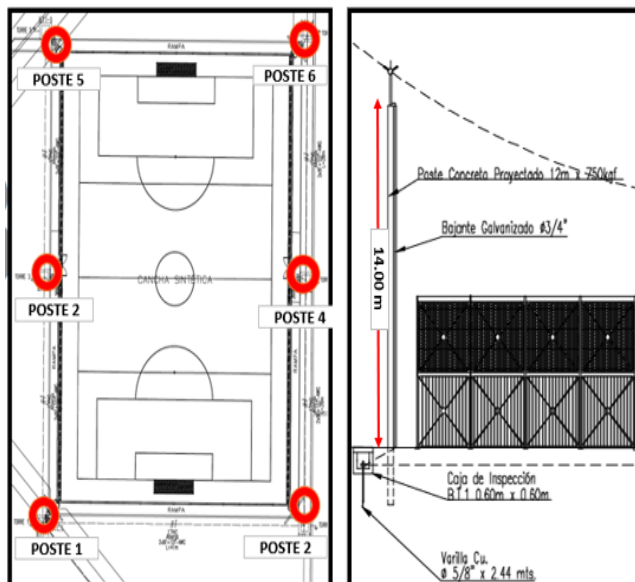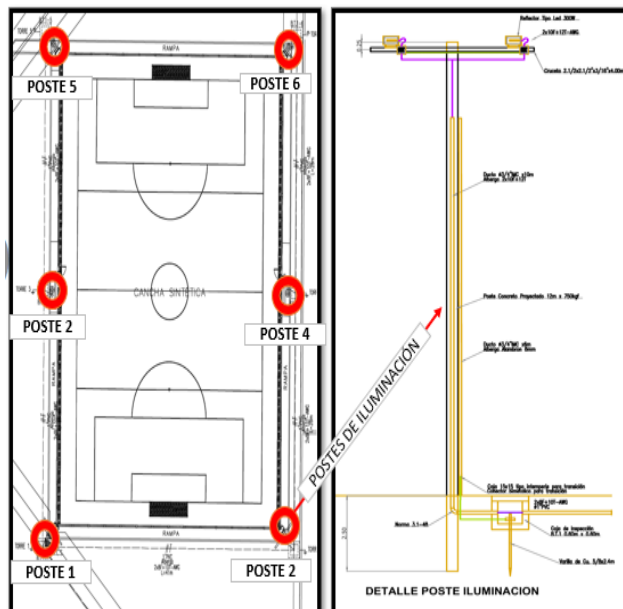

Suministro e instalacion de postes de concreto pretensado L= 12 m
750 kg incluye transporte e izada

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 22 de 34	

DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS														
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO SEPT 2025			EJECUTADO ACUMULADO			
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1	1.1	Localización y replanteo manual	m²	1,924.00	\$ 2,226	\$ 4,282,824	2,200.00	\$ 4,897,200	276.00	\$ 614,376.00	13%	2,200.00	\$ 4,897,200	100%
2	1.2	Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material	m²	1,924.00	\$ 4,770	\$ 9,177,480	2,200.00	\$ 10,494,000	276.00	\$ 1,316,520.00	13%	2,200.00	\$ 10,494,000	100%
		Subtotal				\$ 13,460,304		\$ 15,391,200		\$ 1,930,896	13%		\$ 15,391,200	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA													
3	2.1	Excavación manual incluye retiro	m³	119.94	\$ 31,545	\$ 3,783,507	295.67	\$ 9,326,910	175.73	\$ 5,543,403.00	59%	295.67	\$ 9,326,910	100%
4	2.2	Excavación mecánica incluye retiro 1 km	m³	384.80	\$ 19,793	\$ 7,616,346	420.03	\$ 8,313,654	35.23	\$ 697,307.00	8%	420.03	\$ 8,313,654	100%
5	2.3	Rellenos con recebo compactado mecánicamente	m³	384.80	\$ 190,829	\$ 73,430,999	466.49	\$ 89,019,820	81.69	\$ 15,588,821.00	18%	466.49	\$ 89,019,820	100%
		Subtotal				\$ 84,830,852		\$ 106,660,384		\$ 21,829,531	20%		\$ 106,660,384	
3	RED AGUAS LLUVIAS													
6	3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104.00	\$ 137,428	\$ 14,292,512	100.54	\$ 13,817,011	0.00	\$ 0.00	0%	100.54	\$ 13,817,011.00	100%
7	3.2	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4.00	\$ 657,029	\$ 2,628,116	2.00	\$ 1,314,058	2.00	\$ 1,314,058.00	100%	2.00	\$ 1,314,058.00	100%
8	3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y	ml	30.00	\$ 79,488	\$ 2,384,640	120.29	\$ 9,561,612	90.29	\$ 7,176,972.00	75%	120.29	\$ 9,561,612.00	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 23 de 34	

DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS														
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO SEPT 2025			EJECUTADO ACUMULADO		
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
		relleno material de la excavación a zanjón												
9	3.4	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"	ml	178.00	\$ 99,727	\$ 17,751,406	185.60	\$ 18,509,331	7.60	\$ 757,925.00	4%	185.60	\$ 18,509,331.00	100%
10	3.5	Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2.00	\$ 713,327	\$ 1,426,654	2.00	\$ 1,426,654	2.00	\$ 1,426,654.00	100%	2.00	\$ 1,426,654.00	100%
Subtotal						\$ 38,483,328		\$ 44,628,666		\$ 10,675,609	24%		\$ 44,628,666.00	
4	PLACA CANCHA													
11	4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m²	1,750.00	\$ 87,325	\$ 152,818,750	1,750.00	\$ 152,818,750	0.00	\$ 0.00	0%	1,750.00	\$ 152,818,750.00	100%
12	4.2	Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2.00	\$ 2,344,832	\$ 4,689,664	2.00	\$ 4,689,664	0.00	\$ 0.00	0%	0.00	\$ 0.00	0%
13	4.3	Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con	m²	1,750.00	\$ 181,076	\$ 316,883,000	1,750.00	\$ 316,883,000	289.45	\$ 52,412,448.00	17%	1,750.00	\$ 316,883,000.00	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 24 de 34	

DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS														
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO SEPT 2025			EJECUTADO ACUMULADO		
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
		1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dux, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.												
14	4.4	Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m²	1,750.00	\$ 146,659	\$ 256,653,250	1,750.00	\$ 256,653,250	289.45	\$ 42,450,448.00	17%	1,750.00	\$ 256,653,250.00	100%
15	4.5	Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186.00	\$ 55,658	\$ 10,352,388	240.68	\$ 13,395,768	54.68	\$ 3,043,379.00	23%	240.68	\$ 13,395,767.00	100%
Subtotal						\$ 741,397,052		\$ 744,440,432		\$ 97,906,275	13%		\$ 739,750,767.00	
5 CERRAMIENTO														
16	5.1	Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento	m³	16.74	\$ 376,028	\$ 6,294,709	15.52	\$ 5,835,955	0.00	\$ 0.00	0%	15.52	\$ 5,835,955.00	100%
17	5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m	m³	37.40	\$ 659,191	\$ 24,653,743	12.41	\$ 8,180,560	0.00	\$ 0.00	0%	12.41	\$ 8,180,560.00	100%
18	5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m²	112.50	\$ 105,765	\$ 11,898,563	93.28	\$ 9,865,759	0.00	\$ 0.00	0%	93.28	\$ 9,865,759.00	100%
19	5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación	kg	1,057.11	\$ 6,647	\$ 7,026,597	1,259.32	\$ 8,370,700	218.08	\$ 1,449,578.00	17%	1,259.32	\$ 8,370,700.00	100%
20	5.5	Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220.40	\$ 44,432	\$ 9,792,813	316.20	\$ 14,049,398	95.80	\$ 4,256,586.00	30%	316.20	\$ 14,049,398.00	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 25 de 34	

DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS														
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO SEPT 2025			EJECUTADO ACUMULADO		
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
21	5.6	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en Angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m²	200.00	\$ 109,070	\$ 21,814,000	196.27	\$ 21,407,169	0.00	\$ 0.00	0%	196.27	\$ 21,407,169.00	100%
22	5.7	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en Angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m²	268.75	\$ 54,091	\$ 14,536,956	409.25	\$ 22,136,742	143.33	\$ 7,752,863.00	35%	409.25	\$ 22,136,742.00	100%
23	5.8	Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1.00	\$ 802,805	\$ 802,805	2.00	\$ 1,605,610	2.00	\$ 1,605,610	100%	2.00	\$ 1,605,610.00	100%
24	5.9	Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m²	148.80	\$ 80,868	\$ 12,033,158	263.32	\$ 21,294,162	116.13	\$ 9,391,201.00	44%	263.32	\$ 21,294,162.00	100%
25	5.10	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m²	3,031.00	\$ 37,545	\$ 113,798,895	2,408.00	\$ 90,408,360	0.00	\$ 0.00	0%	2,408.00	\$ 90,408,360.00	100%
26	5.11	Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32.00	\$ 263,483	\$ 8,431,456	30.00	\$ 7,904,490	0.00	\$ 0.00	0%	30.00	\$ 7,904,490.00	100%

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 26 de 34	

DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS														
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO SEPT 2025			EJECUTADO ACUMULADO		
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
Subtotal					\$ 231,083,695		\$ 211,058,905		\$ 24,455,838	12%		\$ 211,058,905		
6	ILUMINACIÓN													
27	6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6.00	\$ 1,718,814	\$ 10,312,884	0.00	\$ 0	0.00	\$ 0.00	0%	0.00	\$ 0	0%
28	6.2	Suministro e Instalación de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1.00	\$ 511,864	\$ 511,864	0.00	\$ 0	0.00	\$ 0.00	0%	0.00	\$ 0	0%
29	6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"	ml	50.00	\$ 45,333	\$ 2,266,650	153.00	\$ 6,935,949	153.00	\$ 6,935,949.00	100%	153.00	\$ 6,935,949	100%
30	6.4	Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50.00	\$ 42,110	\$ 2,105,500	84.00	\$ 3,537,240	84.00	\$ 3,537,240.00	100%	84.00	\$ 3,537,240	100%
31	6.5	Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada	und	6.00	\$ 2,884,636	\$ 17,307,816	6.00	\$ 17,307,816	6.00	\$ 17,307,816.00	100%	6.00	\$ 17,307,816	100%
32	6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1.00	\$ 513,186	\$ 513,186	0.00	\$ 0	0.00	\$ 0	0%	0.00	\$ 0	0%
33	6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1.00	\$ 377,230	\$ 377,230	1.00	\$ 377,230	0.00	\$ 0	0%	0.00	\$ 0	0%
34	6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6.00	\$ 266,806	\$ 1,600,836	6.00	\$ 1,600,836	0.00	\$ 0	0%	0.00	\$ 0	0%

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	
	Página 27 de 34	

DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS														
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO SEPT 2025			EJECUTADO ACUMULADO		
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
35	6.9	Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)	und	8.00	\$ 336,951	\$ 2,695,608	5.00	\$ 1,684,755	0.00	\$ 0	0%	0.00	\$ 0	0%
36	6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1.00	\$ 15,484,338	\$ 15,484,338	1.00	\$ 15,484,338	0.00	\$ 0	0%	0.00	\$ 0	0%
Subtotal					\$ 53,175,912		\$ 46,928,164		\$ 27,781,005	59%		\$ 27,781,005		
7	ITEMS NO PREVISTOS													
37	NP 01	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte	und	0.00	\$ 2,212,694	\$ 0	8.00	\$ 17,701,552	0.00	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0%
38	NP 02	Suministro e Instalación de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OFF	und	0.00	\$ 3,725,612	\$ 0	1.00	\$ 3,725,612	0.00	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0%
39	NP 03	Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra	ml	0.00	\$ 131,557	\$ 0	159.00	\$ 20,917,593	0.00	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0%
40	NP 04	Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión eléctrica	ml	0.00	\$ 48,355	\$ 0	72.00	\$ 3,481,574	0.00	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0%
41	NP 05	Actividades profesionales y documentales propias del constructor con objeto de tramite de Certificación RETIE Y RETILAP (Levantamiento, elaboración de planos y entrega de formatos)	und	0.00	\$ 3,382,545	\$ 0	1.00	\$ 3,382,545	0.00	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0%
Subtotal					\$ 0		\$ 49,208,876		\$ 0			\$ 0		
SUBTOTAL OBRAS					\$ 1,162,431,143		\$ 1,218,316,627		\$ 184,579,154			\$ 1,145,270,927		

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila


 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2
		Página 28 de 34

Fecha Aprobación:
13/02/2023

INFORME DE OBRA

DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS														
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO SEPT 2025			EJECUTADO ACUMULADO			
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
		SUBTOTAL OBRAS				\$ 1,162,431,143		\$ 1,218,316,627		\$ 184,579,154			\$ 1,145,270,927.00	
		ADMINISTRACIÓN			20%	\$ 232,486,229		\$ 243,663,325		\$ 36,915,831			\$ 229,054,185.00	
		IMPREVISTO			1%	\$ 11,624,311		\$ 12,183,166		\$ 1,845,792			\$ 11,452,709.00	
		UTILIDAD			4%	\$ 46,497,246		\$ 48,732,665		\$ 7,383,166			\$ 45,810,837.00	
		Tramite de inspección y certificación RETIE Y RETILAP				\$ 0		\$ 10,115,000		\$ 0			\$ 0.00	
		VALOR TOTAL				\$ 1,453,038,929		\$ 1,533,010,783		\$ 230,723,943			\$ 1,431,588,658.00	
		PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO								15.05%			93.38%	
		PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO								15.05%			93.38%	
		PORCENTAJE DE RETRASO Y/O AVANCE								0.00%			0.00%	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


 ING. YERSON FERNANDO CAMACHO
 DIRECTOR DE OBRA


 ING. DANIELA CARRILLO TAVERA
 R/L CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
		Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 29 de 34

18. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización y replanteo



Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material



Excavación manual incluye retiro



Excavación mecánica incluye retiro 1 km



Rellenos con recebo compactado mecánicamente




 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
	Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 30 de 34	



Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable



Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable

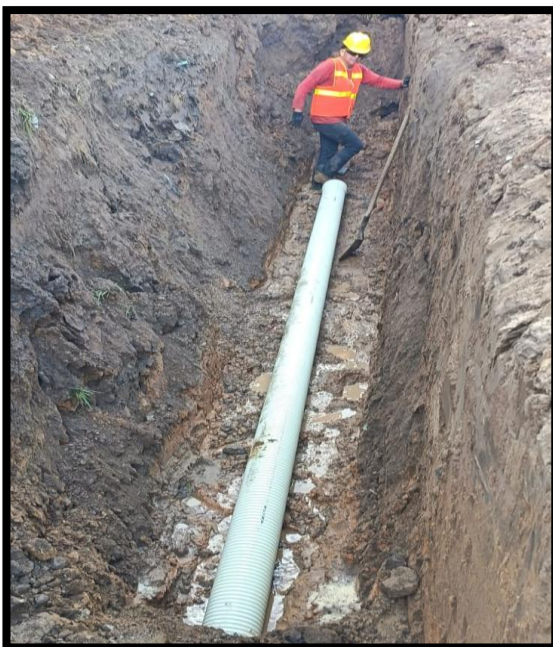

Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón



Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
		Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 31 de 34



Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dux, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fabrica, incluye gramo de caucho, pegamento importado.



Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm



Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50



Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	
	Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 32 de 34	



Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa



Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en Angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m

Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
		Página 33 de 34




Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta



Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"



Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)

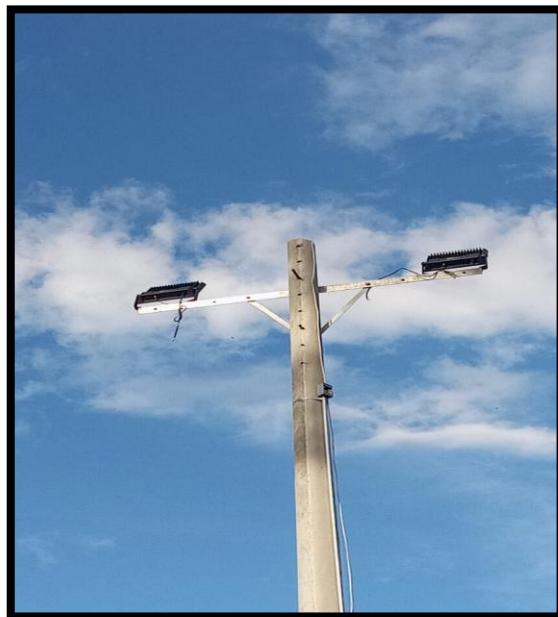

Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 34 de 34

19. ANEXOS

- SE ANEXA BITACORA DE OBRA.
- SE ANEXA SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- SE ANEXA CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- SE ANEXA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- SE ENTREGA UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.

		
ING. YERSON FERNANDO CAMACHO	(30/09/2025)	ING. DANIELA CARRILLO TAVERA
FIRMA ORIGINAL DIRECTOR DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo R/L DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL HSEQ

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

CONTRATO CLOPIH221-2024

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

SEPTIEMBRE 2025

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) se ha convertido en una de las gestiones más esenciales de una empresa para la mejora continua y la protección de los colaboradores, este incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora; Es por ello, que el objetivo de la implementación del SG-SST es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los colaboradores de la organización, sin importar su tamaño. Todo este proceso está sustentado en el ciclo conocido como PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, está en constante cambio, debe ser gestionado por la organización para incrementar el nivel de eficacia frente a la disminución de accidentes y enfermedades laborales, para mantener y aumentar el bienestar integral del trabajador, respecto a nuevos procesos, nuevas formas de trabajo, exigencias de clientes y sugerencias de las partes interesadas.

La mejora continua se puede entender mediante la metodología del ciclo PHVA, en la cual, una vez establecido el criterio a mejorar, se planean las actividades y se ejecutan; se analiza o verifica si se cumplió el objetivo, se toman nuevamente medidas de acuerdo con los resultados, es decir que es un proceso cíclico, donde no solo se verifica la disminución de accidentalidad y enfermedades laborales o la eficiencia de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) sino también contribuye positivamente en el bienestar integral del trabajador

Conforme lo anterior, y comprometido con la seguridad y salud de sus trabajadores, basado en la normativa vigente y con la disposición de cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud laboral **V&M INGENIERIA S.A.S.** implementa su SG-SST para identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, lo que contribuye a prevenir accidentes y enfermedades laborales. promoviendo unas condiciones de salud y trabajo sanas y seguras para todos sus colaboradores y demás actores involucrados en el proyecto en marcha cuyo objeto es el **“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”**, correspondiente a la ejecución del contrato de obra pública **CLOPIH221-2024**.

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

2. OBJETO Y ALCANCE

2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y estructurar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en el **V&M INGENIERIA S.A.S.**, y de preservar un estado de salud físico, mental y social de los trabajadores, previniendo accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Minimizar la ocurrencia de incidentes que puedan causar lesiones o enfermedades incapacitantes a los trabajadores.
- Fomentar la participación activa de todos los colaboradores en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo la conciencia y el compromiso con la seguridad y la salud.
- Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo, evaluando los riesgos asociados y establecer medidas de control necesarias para reducirlos o eliminarlos.

3. ALCANCE

V&M INGENIERIA S.A.S., planifica, desarrolla, controla y documenta las actividades realizadas en el proyecto **“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”**. Implementando las medidas de manejo (prevención, mitigación y compensación) para garantizar la ejecución de la obra y la preservación del medio ambiente.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

El contrato **CLOPIH221-2024** deberá ejecutarse en el término de siete (07) meses calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Datos generales del Contrato de Obra son:

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

Contrato N°:	CLOPIH221-2024
Objeto:	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
Plazo:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Contratante:	MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA
Contratista:	V & M INGENIERIA S.A.S Nit. 900.062.688-7 YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO C.C N° 7.713.933 de Neiva - Huila
Fecha del acta de Inicio:	12 DE NOVIEMBRE 2024
Prorroga 1:	DOS (2) MESES (31/01/2025)
Prorroga 2:	DOS (2) MESES (10/04/2025)
Suspensión 1:	UN (1) MES (20/05/2025)
Prorroga Suspensión 1:	DOS (2) MESES (19/06/2025)
Prorroga Suspensión 2:	DOS (2) MESES (19/08/2025)
Fecha Acta Reinicio 1:	15 DE SEPTIEMBRE 2025
Fecha de finalización:	07 DE OCTUBRE DEL 2025

Tabla N. 1. Información General del Proyecto

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Guadalupe es un municipio colombiano ubicado al sur del departamento de Huila, a margen izquierda del valle del río Suaza, sobre los flancos de la cordillera Oriental. Su extensión territorial es de 242 km², se encuentra a una altura de 940 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 22 °C. Cuenta con una población de 19.508 habitantes de acuerdo con proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el 2024. Hace parte de la Región Subcentro del departamento. Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, ganadería, piscicultura, pequeña industria artesanal y el comercio.

La vereda Los Cauchos Guadalupe es una vereda rica en agricultura, ocupa un área importante con cultivos de maracuyá, ahuyama, tomate, cítricos, maíz, frijol y hortalizas. Al interior de este sistema de producción se destaca también el manejo de praderas en forma intensiva, y algunas especies menores como aves, cerdos y estanques para peces. Se encuentra a 5 minutos del casco urbano con una población de más de 400 habitantes entre los que se destaca la producción de sombreros de paja, artículos en fique y artículos de alfarería.

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

4.3. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se realizará la Construcción de la Cancha Sintética Villa Olímpica del Municipio de Guadalupe, donde será un lugar recreativo tanto para niños como adultos, donde van a pasar momentos agradables en familia, gracias al desarrollo de dicho contrato.

El proyecto se desarrollará en el municipio de Guadalupe



Imagen 1 Departamento del Huila



Imagen 2 Municipio de Guadalupe

El objeto del contrato **“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”**. tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Las actividades a ejecutar para el cumplimiento de este proyecto pueden presentar conflictos con el medio ambiente tales como contaminación atmosférica, alteración del espacio público, entre otras; la programación está hecha para controlar y mitigar dichos efectos.

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

V&M INGENIERIA S.A.S., estructuró el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para el contrato de obra **CLOPIH221-2024**, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar el estado de salud físico, mental y social de los trabajadores, en la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

V&M INGENIERIA S.A.S., en su función a la aplicación del SG-SST en el frente de obra del proyecto **“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”**, contrato de obra pública **CLOPIH221-2024**, ejecuto las actividades programadas durante el periodo, a través de medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el periodo del presente informe.

6. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COMPONENTE SST

6.1. AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es un marco normativo y organizativo en Colombia que tiene como fin regular el servicio público esencial de salud. Su finalidad es crear condiciones para que la población del país acceda a la atención médica en todos los niveles. Su principal objetivo es proteger la salud de los colombianos garantizando la universalidad del aseguramiento y el acceso efectivo a los servicios de salud. Es por ello que **V&M INGENIERIA S.A.S.** durante el mes de **SEPTIEMBRE de 2025**, se realizaron los debidos pagos al Sistema de Seguridad Social a cada uno de los trabajadores involucrados al contrato de obra pública **CLOPIH221-2024**, y se verificó que los subcontratistas estén afiliados al Sistema General de Riesgos y Seguridad Social.

PERSONAL SEPTIEMBRE 2025				
N.	ID	EMPLEADO	TIPO VINCULACIÓN	PLANILLA SS
1	CC 7713933	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	DEPENDIENTE	34524910
2	CC 1079409298	ADRIANA LISSETH MAYORCA PEERDOMO	INDEPENDIENTE	PY-34692815 PI-9492640240
3	CC 1075213839	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	INDEPENDIENTE	PY-35148865 PI-34427540
4	CC 1082131133	JORGE HUMBERTO ALDANA ROSERO	DEPENDIENTE	34886753
5	CC 1082773317	OSCAR OBEIMAR CABEZAS GALINDEZ	DEPENDIENTE	34886753
6	CC 1007659754	YILBER LEANDRO CORTES NIETO	DEPENDIENTE	34886753
7	CC 1082776715	JESUS OBEIMAR LOPEZ GALINDEZ	DEPENDIENTE	34886753

Tabla N. 2. Listado de Personal en Relación a Planillas de SS

ANEXO SST 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

6.2. EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y /O PERIÓDICOS

Los exámenes médicos ocupacionales al ingreso permiten detectar cualquier condición médica o de salud que el trabajador pueda tener antes de comenzar su labor; esto son de vital importancia para evaluar si están en condiciones de desempeñar su trabajo de manera segura, determinan si el trabajador es apto para realizar las tareas específicas de su puesto y si se identifican limitaciones o riesgos, se pueden tomar medidas preventivas o asignar tareas adecuadas, por ello que **V&M INGENIERIA S.A.S.** dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, del personal y de los subcontratistas basados en cargo que desempeña o ejecuta el colaborador.

V&M INGENIERIA S.A.S. para el mes **SEPTIEMBRE** de **2025**, no se registraron ingresos de personal nuevo, ni egresos, por lo cual no se reportan exámenes médicos ocupacionales. Por lo anterior no se tienen soportes de exámenes del mes en mención. Solo se generó traslado de personal antiguo para la culminación del proyecto.

6.3. RELACIÓN DE PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO			
N.	ID	EMPLEADO	CARGO
1	CC 7713933	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	DIRECTOR
2	CC 1079409298	ADRIANA LISSETH MAYORCA PEERDOMO	RESIDENTE
3	CC 1075213839	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	SST

Tabla N. 3. Personal Administrativo

PERSONAL OPERATIVO						
N.	ID	EMPLEADO	Fecha ING	RET	Fecha RET	Razón Social
1	CC 1084900110	CLAROS RODRIGUEZ JOSE OTAIN	2025/05/14	X	30/05/2025	VAMECOL INGENIERIA SAS
2	CC 1007451455	MAHECHA GUACA YOHAN ESTIH	2025/05/07	X	30/05/2025	VAMECOL INGENIERIA SAS
3	CC 1082131133	JORGE HUMBERTO ALDANA ROSERO	2025/09/15			VAMECOL INGENIERIA SAS
4	CC 1082773317	OSCAR OBEIMAR CABEZAS GALINDEZ	2025/09/15			VAMECOL INGENIERIA SAS
5	CC 1007659754	YILBER LEANDRO CORTES NIETO	2025/09/15			VAMECOL INGENIERIA SAS
6	CC 1082776715	JESUS OBEIMAR LOPEZ GALINDEZ	2025/09/15			VAMECOL INGENIERIA SAS

Tabla N. 4. Personal Operativo

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

6.4. INDUCCIONES SST

V&M INGENIERIA S.A.S. durante el periodo del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**, no se registraron ingresos de personal nuevo, solo trasladados al proyecto para culminación del mismo, por lo cual se realizó inducción correspondiente al contrato en ejecución, donde se evidencio el cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El objetivo de realizar este proceso es ayudar a los nuevos colaboradores a sentirse integrados, conocer más sobre el proyecto que se ejecutara y la empresa, tener una mejor comprensión y adaptación para la ejecución de sus actividades de obra.

6.5. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Decreto 1072 de 2015 establece claramente las pautas que deben seguirse, incluyendo la frecuencia y los plazos para la entrega. Este cumplimiento no solo asegura un ambiente laboral seguro y cómodo, sino que también demuestra el compromiso de la empresa con su equipo humano. Recordar las fechas clave para la entrega de dotaciones es crucial para evitar sanciones y mantener una relación positiva con los empleados. En última instancia, el respeto por estas regulaciones fortalece la cultura organizacional y contribuye al éxito empresarial a largo plazo.

V&M INGENIERIA S.A.S. durante el periodo del mes de **SEPTIEMBRE** del **2025** realizó reposiciones en entrega de elementos de protección personal – EPP a personal operativo, suministrando los elementos de protección personal necesarios que se requieren para el desarrollo de sus actividades.

6.6. SEÑALIZACION EN OBRA – CUMPLIMIENTO PMT Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN

V&M INGENIERIA S.A.S. con el fin de dar cumplimiento al PMT y a su objetivo principal que es “Presentar las medidas para el manejo del tránsito, a fin de mitigar el impacto negativo en los índices de movilidad y disminuir en el mayor grado posible el riesgo de accidentabilidad que se pueda generar a causa de la ejecución del contrato “CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”, De igual forma se busca establecer condiciones seguras para los usuarios, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito, se verifica la señalización en el frente de trabajo, garantizando la seguridad tanto de los trabajadores como de las personas aledañas a la obra.

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

6.7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Dentro del periodo del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**, se realizaron inspecciones de seguridad con el fin de identificar oportunidades de mejora y condiciones inseguras que puedan generar accidentes de trabajo o generar algún riesgo en la ejecución de las actividades, y con ello implementar medidas de control o acciones preventivas. Por lo anterior se realizaron las siguientes inspecciones de seguridad:

- Personal en campo: Se verificó que todo el personal que labora en obra cuente con las afiliaciones de seguridad social, cuente con EPP apropiados para la tarea y dotación mínima.
- Señalización de obra: Se verifica la señalización instalada diariamente y se reporta para llevar un control y garantizar que se cumpla lo trazado en el PMT.
- Uso de EPP y dotación: Se verifica que el personal cuenta con los elementos de protección requeridos para las actividades que se está desarrollando.
- Botiquín – Camilla – Extintor: Se verificó que los elementos del botiquín se encontraran vigentes y completos, así como también que la camilla y el extintor estén en condiciones óptimas para ser usados en caso de cualquier eventualidad.
- Orden y aseo: Las inspecciones de orden y aseo ayudan a verificar que los procesos, actividades y tareas se desempeñen según lo planificado, procedimientos, estándares y políticas, buscando la mejora dentro de los procesos o espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores.

6.8. CAPACITACIONES EN SST

V&M INGENIERIA S.A.S. en las labores propias del proyecto y dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cronograma de actividades, se realizaron capacitaciones para la retroalimentación en la prevención de los riesgos asociados a las actividades que se ejecutan en obra, a todo el personal que labora para el proyecto con el fin de generar conciencia frente a la responsabilidad, autocuidado y el compromiso de contribuir al logro de los objetivos del SST, garantizando áreas seguras de trabajo y productivo.

Durante el periodo en mención se realizaron charlas de seguridad según programadas. A continuación, se relacionan las charlas y capacitaciones realizadas en el mes de **SEPTIEMBRE** del **2025**.

N°	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	FECHA	DURACIÓN
1	Estilo de vida saludable	19-09-2025	45 minutos
2	Manejo adecuado de los residuos	29-09-2025	50 minutos

Tabla N. 5. Capacitaciones

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

CUMPLIMIENTO

$$\frac{\text{Capacitaciones realizadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} * 100 = 100\% = 10/10 * 100 = 100\%$$

$$\frac{\text{Asistentes 5}}{\text{Personas programadas 5}} * 100 = 100\%$$

6.9. PAUSAS ACTIVAS

De acuerdo con el objetivo de la política de responsabilidad social de **V&M INGENIERIA S.A.S**, que se enfoca en los buenos hábitos de descanso, nutrición y ejercicio se llevaron a cabo varias actividades de pausas activas con el personal que estuvo dispuesto a realizarlas, cuyo objetivo fue dar un tiempo de reposo o cambio de actividad rutinaria para desestresar y relajar al personal, implementando una metodología de ejercicios de relajación corporal minimizando las consecuencias de riesgo psicolaboral por factores de estrés y condiciones de la tarea (monotonía y rutinaria).

7. PLAN DE EMERGENCIAS

El plan de Prevención y Preparación para afrontar emergencias que presenta el **V&M INGENIERIA S.A.S**, consiste en un conjunto de estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo colectivo que comprende las políticas, la organización, normas y procedimientos que debe tener la empresa, para prevenir y disminuir los niveles de riesgo ante una situación de emergencia que afecten las personas, los recursos, los procesos productivos y el medio ambiente, incluyendo actividades que deben ser administradas de una manera adecuada y eficiente, tales como la formulación y ejecución de programas, planes y proyectos relacionados con: la adopción de medidas tendientes a prevenir y mitigar los efectos que las diferentes amenazas (internas o externas) puedan generar. Incluye acciones relacionadas con la legislación, la organización para afrontar situaciones de emergencia, las acciones relacionadas con los planes operativos de emergencia, la capacitación, el entrenamiento, el suministro de los recursos necesarios para hacer frente a una emergencia y la recuperación del proceso productivo en el menor tiempo posible, con acciones que disminuyan el lucro cesante y la susceptibilidad a sufrir nuevos efectos dañinos en el futuro.

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8.1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se cuenta con la instalación de punto ecológico con su respectiva señalización y deposito (blanca, verde, negra). Dichos residuos son recogidos por las empresas autorizadas en el municipio los días establecidos.



Imagen 3 Punto ecológico

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

9. CONCLUSIONES

Durante el periodo de tiempo evaluado en el presente informe, se han evidenciado prácticas implementadas en el **“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”**, que propenden al cumplimiento, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Ambiental. Se establece una relación directa entre la SALUD y el TRABAJO entendida como el vínculo del individuo con la labor que desempeña y la influencia que sobre la salud acarrea dicha labor. El conjunto de variables que definen la realización de la tarea y el entorno en que ésta se realiza se denominan CONDICIONES DE TRABAJO, constituidas por factores del ambiente, de la tarea y de la organización.

V&M INGENIERIA S.A.S, justifica la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que garantice el mejoramiento continuo de las condiciones de salud, trabajo y bienestar de sus trabajadores, para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente permitiendo su crecimiento personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la productividad de la empresa.

Durante este periodo se realizaron actividades propias de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (medicina preventiva y del trabajo y de higiene y seguridad industrial), establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad de Salud en el Trabajo de **V&M INGENIERIA S.A.S.**, dando cumplimiento así en lo dispuesto en la normatividad legal aplicable vigente.

Se evidencia que para el periodo comprendido entre el 15 al 30 de SEPTIEMBRE del 2025, el porcentaje de cumplimiento según nuestro cronograma de actividades planeadas fue del 100%.

Elaboró:


OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
 PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Ingeniera Industrial
 Especialista en SST

	“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.	VERSIÓN 01
	INFORME MENSUAL SST	CÓDIGO:003

ANEXO SST 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34524910

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 17 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6335646
FAX	8643535	SUCURSAL	01oficina	NOMBRE SUCURSAL	01oficina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$11.388.000		34524910

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7713933	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO	\$2.847.000
CC-36312881	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MONJE FLOR LINA CONSTANZA	\$1.423.500
CC-7714529	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO	\$1.423.500
CC-52033387	01	No	No	No	41	1	1661901	Fijo	ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA	\$2.847.000
CC-1084923149	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	SANCHEZ RIVERA HERMIDES	\$1.423.500
CC-1084869075	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO	\$1.423.500

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7713933																													0		
CC - 36312881																													0		
CC - 7714529																													0		
CC - 52033387																													0		
CC - 1084923149																													0		
CC - 1084869075																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7713933	PORVENIR	30	\$2.847.000	0.1600000	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$0
CC - 36312881	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 7714529	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52033387	COLPENSIONES	30	\$2.847.000	0.1600000	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1084923149	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1084869075	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7713933	SANITAS	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.847.000	5	0.0696000	\$198.200
CC - 36312881	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 7714529	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 52033387	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.847.000	1	0.0052200	\$14.900
CC - 1084923149	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1084869075	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7713933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36312881	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7714529	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52033387	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084923149	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084869075	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$455.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$455.600
PORVENIR	5	\$1.366.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.366.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$170.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$170.900	0	\$0	\$0	\$170.900	\$0	0	\$0	\$0	\$170.900	\$0	\$0	\$170.900
SANITAS	3	\$227.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$227.900	0	\$0	\$0	\$227.900	\$0	0	\$0	\$0	\$227.900	\$0	\$0	\$227.900
ESSC ASMET SALUD	1	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.000	0	\$0	\$0	\$57.000	\$0	0	\$0	\$0	\$57.000	\$0	\$0	\$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$609.500	0	\$0	\$0	\$609.500	0	\$0	\$609.500	0	\$0	\$0	\$609.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFAMILIAR DEL HUILA		6		\$455.800	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$455.800
PENSIONES	2	\$1.822.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$609.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$455.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.343.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34692815

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	221	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO CANCHA SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		34692815

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1079409298	59	No	No	No	41	206	5711001	Salario	MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH		\$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079409298																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079409298	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079409298	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5711001	0.0696000	\$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079409298	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜACIÖN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$99.100	0	\$0	\$0	\$99.100	0	\$0	\$99.100	0	\$0	\$0	\$99.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$99.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$99.100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1812533058		9492640240	I	2025/10/23	2025/09/30	BANCOLOMBIA	
								0	\$490,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																																																		
1	CC	1079409298	MAYORCA ADRIANA																	231001	30	EP5005	30			0		0	0.000%	0	No																			
Total Afiliados(1)																																																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1812533058		9492640240	I	2025/10/23	2025/09/30	BANCOLOMBIA	
								0	\$490,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000	
TOTAL				1	\$490,200	\$0	\$0	\$490,200	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35148865

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	221	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO CANCHA SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		35148865

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1075213839	59	No	No	No	41	1	5711001	Salario	TRUJILLO POLANCO OMAIRA ANDREA		\$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TAD	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSL	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075213839	R	2025-09-15																									0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075213839	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075213839	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$759.200	5711001	0.0696000	\$52.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075213839	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	6	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜACIÖN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$52.900	0	\$0	\$0	\$52.900	6	\$200	\$53.100	0	\$0	\$531	\$53.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	6	\$0	\$0
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	6	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$53.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$53.100



RAZÓN SOCIAL :	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075213839
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34427540
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34427540
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025
----------------------------------	------------

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34886753

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VAMECOL INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901614817	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR42-85 KM32 PLAERMO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123255722
FAX	0	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATISTA03JES US
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075303013	PRIMER APELLIDO	CUELLAR	SEGUNDO APELLIDO	PASTRANA
PRIMER NOMBRE	CAROLINA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$8.541.000		34886753

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1082131133	01	No	No	No	41	359	5711001	Fijo	ALDANA ROSERO JORGE HUMBERTO	\$1.423.500
CC-1082773317	01	No	No	No	41	359	5711001	Fijo	CABEZAS GALINDEZ OSCAR OBEIMAR	\$1.423.500
CC-1007659754	01	No	No	No	41	359	5711001	Fijo	CORTES NIETO YILBER LEANDRO	\$1.423.500
CC-1083873917	01	No	No	No	41	359	5711001	Fijo	GALINDEZ GUZMAN FABIAN CAMILO	\$1.423.500
CC-1004418535	01	No	No	No	41	359	5711001	Fijo	LOPEZ DORADO LUIS ARLEY	\$1.423.500
CC-1082776715	01	No	No	No	41	359	5711001	Fijo	LOPEZ GALINDEZ JESUS OBEIMAR	\$1.423.500

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1082131133																													0		
CC - 1082773317																													0		
CC - 1007659754																													0		
CC - 1083873917																													0		
CC - 1004418535																													0		
CC - 1082776715																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1082131133	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1082773317	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1007659754	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1083873917	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1004418535	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1082776715	COLFONDOS	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082131133	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1082773317	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1007659754	FAMISANAR	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1083873917	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1004418535	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1082776715	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	5	0.0696000	\$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1082131133	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082773317	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007659754	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1083873917	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004418535	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082776715	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$200	\$0	\$0	\$228.000
PORVENIR	5	\$1.139.000	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$700	\$0	\$0	\$1.139.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$114.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$114.0 00	1	\$100	\$0	\$114.1 00	\$0	0	\$0	\$0	\$114.1 00	\$0	\$0	\$114.1 00
ESSC ASMET SALUD	3	\$171.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$171.0 00	1	\$200	\$0	\$171.2 00	\$0	0	\$0	\$0	\$171.2 00	\$0	\$0	\$171.2 00
FAMISANAR	1	\$57.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.00 0	1	\$100	\$0	\$57.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$57.10 0	\$0	\$0	\$57.10 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ UACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$594.600	0	\$0	\$0	\$594.600	1	\$400	\$595.000	0	\$0	\$5.950	\$595.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$342.000	1	\$300	\$342.300
SENA	0	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	1	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	1	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$342.400
PENSIONES	2	\$1.367.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$595.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$342.300
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.647.400

**PLANILLAS DE
SEGURIDAD SOCIAL
(SEPTIEMBRE)**

**YERSON FERNANDO
CAMACHO LADINO**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34892176

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 17 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6335646
FAX	8643535	SUCURSAL	01oficina	NOMBRE SUCURSAL	01oficina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$11.388.000		34892176

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7713933	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO	\$2.847.000
CC-36312881	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MONJE FLOR LINA CONSTANZA	\$1.423.500
CC-7714529	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO	\$1.423.500
CC-52033387	01	No	No	No	41	1	1661901	Fijo	ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA	\$2.847.000
CC-1084923149	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	SANCHEZ RIVERA HERMIDES	\$1.423.500
CC-1084869075	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO	\$1.423.500

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7713933																													0		
CC - 36312881																													0		
CC - 7714529																													0		
CC - 52033387																													0		
CC - 1084923149																													0		
CC - 1084869075																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7713933	PORVENIR	30	\$2.847.000	0.1600000	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$0
CC - 36312881	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 7714529	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52033387	COLPENSIONES	30	\$2.847.000	0.1600000	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1084923149	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1084869075	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7713933	SANITAS	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.847.000	5	0.0696000	\$198.200
CC - 36312881	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 7714529	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 52033387	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.847.000	1	0.0052200	\$14.900
CC - 1084923149	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1084869075	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7713933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36312881	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7714529	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52033387	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084923149	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084869075	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$455.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$455.600
PORVENIR	5	\$1.366.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.366.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	\$227.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$227.9 00	0	\$0	\$0	\$227.9 00	\$0	0	\$0	\$0	\$227.9 00	\$0	\$0	\$227.9 00
ESSC ASMET SALUD	1	\$57.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.00 0	0	\$0	\$0	\$57.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$57.00 0	\$0	\$0	\$57.00 0
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$170.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$170.9 00	0	\$0	\$0	\$170.9 00	\$0	0	\$0	\$0	\$170.9 00	\$0	\$0	\$170.9 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ UACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$609.500	0	\$0	\$0	\$609.500	0	\$0	\$609.500	0	\$0	\$0	\$609.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$455.800	0	\$0	\$455.800
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$455.800
PENSIONES	2	\$1.822.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$609.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$455.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.343.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35148899

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-27

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	221	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO CANCHA SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$0		35148899

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079409298	59	No	No	No	41	206	5711001	Salario	MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	\$1.423.500
CC-1075213839	59	No	No	No	41	1	5711001	Salario	TRUJILLO POLANCO OMAIRA ANDREA	\$1.423.500

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TA	TD	TP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VT	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079409298			T	2025-10-30																								0			
CC - 1075213839			T	2025-10-07																								0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079409298	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1075213839	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079409298	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5711001	0.0696000	\$99.100
CC - 1075213839	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$332.150	5711001	0.0696000	\$23.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079409298	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075213839	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	2	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	\$122.300	0	\$0	\$0	\$122.300	0	\$0	\$122.300	0	\$0	\$0	\$122.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
SIN CCF		2		\$0	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$122.300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$122.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1883917025	9494030591	I	2025/11/26	2025/10/28	BANCOLOMBIA	\$499,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,720,000	\$275,200			\$1,720,000	\$215,000			\$0	\$0			\$1,720,000	\$9,000		\$0	\$0		\$499,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,720,000	\$275,200			\$1,720,000	\$215,000			\$0	\$0			\$1,720,000	\$9,000		\$0	\$0		\$499,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							\$1,720,000	\$275,200			\$1,720,000	\$215,000			\$0	\$0			\$1,720,000	\$9,000		\$0	\$0		\$499,200
1	CC	1079409298	MAYORCA ADRIANA																	231001	30	\$1,720,000	\$275,200	EPS005	30	\$1,720,000	\$215,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,720,000	0.522%	\$9,000	0	\$0	\$0	No	\$499,200
Total Afiliados(1)																							\$1,720,000	\$275,200			\$1,720,000	\$215,000			\$0	\$0			\$1,720,000	\$9,000		\$0	\$0		\$499,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1883917025	9494030591	I	2025/11/26	2025/10/28	BANCOLOMBIA	\$499,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000
TOTAL				1	\$499,200	\$0	\$0	\$499,200



RAZÓN SOCIAL :	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075213839
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34758216
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34758216
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2025
----------------------------------	------------

**ADRIANA LISETH MAYORCA
PERDOMO**

**OMAIRA ANDREA
TRUJILLO POLANCO**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34524910

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 17 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6335646
FAX	8643535	SUCURSAL	01oficina	NOMBRE SUCURSAL	01oficina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$11.388.000		34524910

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7713933	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO	\$2.847.000
CC-36312881	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MONJE FLOR LINA CONSTANZA	\$1.423.500
CC-7714529	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO	\$1.423.500
CC-52033387	01	No	No	No	41	1	1661901	Fijo	ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA	\$2.847.000
CC-1084923149	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	SANCHEZ RIVERA HERMIDES	\$1.423.500
CC-1084869075	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO	\$1.423.500

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7713933																													0		
CC - 36312881																													0		
CC - 7714529																													0		
CC - 52033387																													0		
CC - 1084923149																													0		
CC - 1084869075																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7713933	PORVENIR	30	\$2.847.000	0.1600000	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$0
CC - 36312881	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 7714529	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52033387	COLPENSIONES	30	\$2.847.000	0.1600000	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1084923149	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1084869075	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7713933	SANITAS	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.847.000	5	0.0696000	\$198.200
CC - 36312881	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 7714529	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 52033387	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.847.000	1	0.0052200	\$14.900
CC - 1084923149	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100
CC - 1084869075	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7713933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36312881	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7714529	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52033387	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.847.000	0.0400000	\$113.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084923149	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084869075	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$455.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$455.600
PORVENIR	5	\$1.366.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.366.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$170.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$170.900	0	\$0	\$0	\$170.900	\$0	0	\$0	\$0	\$170.900	\$0	\$0	\$170.900
SANITAS	3	\$227.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$227.900	0	\$0	\$0	\$227.900	\$0	0	\$0	\$0	\$227.900	\$0	\$0	\$227.900
ESSC ASMET SALUD	1	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.000	0	\$0	\$0	\$57.000	\$0	0	\$0	\$0	\$57.000	\$0	\$0	\$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$609.500	0	\$0	\$0	\$609.500	0	\$0	\$609.500	0	\$0	\$0	\$609.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFAMILIAR DEL HUILA		6		\$455.800	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$455.800
PENSIONES	2	\$1.822.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$609.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$455.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.343.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34692815

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	221	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO CANCHA SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		34692815

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO																			Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres										Salario Básico
CC-1079409298	59	No	No	No	41	206	5711001	Salario	MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH										\$1.423.500

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDAE	TDDP	TADP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079409298																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079409298	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079409298	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5711001	0.0696000	\$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079409298	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜACIÖN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$99.100	0	\$0	\$0	\$99.100	0	\$0	\$99.100	0	\$0	\$0	\$99.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$99.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$99.100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1812533058		9492640240	I	2025/10/23	2025/09/30	BANCOLOMBIA	
								0	\$490,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																																																
1	CC	1079409298	MAYORCA ADRIANA																	231001	30	EP5005	30			0		0	0.000%	0		No																
Total Afiliados(1)																																																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1812533058		9492640240	I	2025/10/23	2025/09/30	BANCOLOMBIA	
								0	\$490,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000	
TOTAL				1	\$490,200	\$0	\$0	\$490,200	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35148865

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-10-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	221	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO CANCHA SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		35148865

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075213839	59	No	No	No	41	1	5711001	Salario	TRUJILLO POLANCO OMAIRA ANDREA	\$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TAD	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSL	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVC	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075213839	R	2025-09-15																									0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075213839	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075213839	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$759.200	5711001	0.0696000	\$52.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075213839	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	6	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$52.900	0	\$0	\$0	\$52.900	6	\$200	\$53.100	0	\$0	\$531	\$53.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	6	\$0	\$0
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	6	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$53.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$53.100



RAZÓN SOCIAL :	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075213839
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34427540
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34427540
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025
----------------------------------	------------

CORRESPONDENCIA

ACTAS DE COMITÉ

BITACORA DE OBRA
