



CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4
CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA
MEDELLÍN
TEL- 4440568
FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE16
Documento Ref.:
Código CIU / Actividad Económica: 4210
Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	Fecha Documento :	9 - Sep - 2026
NIT:	901387801-2	Hora Documento:	15:44:48-05:00
Dirección:	CL 35 SUR 40 35 - Envigado - Antioquia	Fecha Vencimiento:	9 - Oct - 2026
Teléfono:	6044801300	Condición Pago:	Crédito
		Lugar de Pago:	MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANOGRADA	ACTA DE OBRA NO GRAVADA	1	144,691,203.00	3,144,691,203.00	



Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-012664-R Id: 119347
Fecha: 2025-09-14 10:15
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0



ACTA N7 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN NDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24"

ifs17

Sub Total:	3,144,691,203.00
Amortización:	972,104,163.00
IVA:	0.00
Retención:	0.00
Retención AMB:	0.00
Retención: ICA	25,157,529.62
Valor Total:	2,147,429,510.38



Firma Digital : 9fe5807650e692886d878259a1686fe5757598e8f6f1c7c68f4316b20e81535135a8e5375a6efe8a8e4702f94ff4c2ae
Cufe : 364762a23163968cb33f52c6fce06edd4f7fa666e17576ef21f765d8aad8131758c78ca8a883d809473291eb068642a6

SON : TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS Y CERO CENTAVO M/L

Documento Ref.: -
Esta Factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio
Resolución No. 18764100452377 Fecha:22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000

ELABORADO POR

APROBADO

FECHA RECIBIDO:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										CONDICIONES ACTUALIZADAS									
Item	Antes	Unidad	Cant.	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant.	Valor (\$)	Cant.	Valor (\$)	Item	Después	Unidad	Cant.	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant.	Valor (\$)		
1.1	1.1	m	540	\$ 764.816	\$ 413.022,72	540	\$ 764.816	540	\$ 413.022,72	2.1	2.1	m	1600	\$ 35.100	\$ 56.160,00	1600	\$ 35.100		
1.2	1.2	m2	338	\$ 483.500	\$ 163.403,00	338	\$ 483.500	338	\$ 163.403,00	2.2	2.2	m	100	\$ 123.474	\$ 12.347,40	100	\$ 123.474		
2	2	m	2.113.393,90			2.113.393,90				2.3	2.3	m2	1000	\$ 10.860	\$ 10.860,00	1000	\$ 10.860,00		
2.1	2.1	m	1600	\$ 35.100	\$ 56.160,00	1600	\$ 35.100	1600	\$ 56.160,00	2.4	2.4	m2	1406	\$ 43.842	\$ 61.732,32	1406	\$ 61.732,32		
2.2	2.2	m	100	\$ 123.474	\$ 12.347,40	100	\$ 123.474	100	\$ 12.347,40	2.5	2.5	m	1606	\$ 19.302	\$ 30.999,91	1606	\$ 30.999,91		
2.3	2.3	m2	1000	\$ 10.860	\$ 10.860,00	1000	\$ 10.860	1000	\$ 10.860,00	2.6	2.6	m3	1406	\$ 169.041	\$ 237.800,06	1406	\$ 237.800,06		
2.4	2.4	m2	1406	\$ 43.842	\$ 61.732,32	1406	\$ 43.842	1406	\$ 61.732,32	2.7	2.7	un	28	\$ 174.432	\$ 3.524,76	28	\$ 3.524,76		
2.5	2.5	m	1606	\$ 19.302	\$ 30.999,91	1606	\$ 19.302	1606	\$ 30.999,91	2.8	2.8	m3	8169	\$ 197.994	\$ 1.616.511,04	8169	\$ 1.616.511,04		
2.6	2.6	m3	1406	\$ 169.041	\$ 237.800,06	1406	\$ 169.041	1406	\$ 237.800,06	2.9	2.9	un	1	\$ 90.700,00	\$ 90.700,00	1	\$ 90.700,00		
2.7	2.7	un	28	\$ 174.432	\$ 3.524,76	28	\$ 174.432	28	\$ 3.524,76	3.1	3.1	m3	3384	\$ 84.381	\$ 285.393,94	3384	\$ 285.393,94		
2.8	2.8	m3	8169	\$ 197.994	\$ 1.616.511,04	8169	\$ 197.994	8169	\$ 1.616.511,04	3.2	3.2	m3	812	\$ 93.348	\$ 99.857,52	812	\$ 99.857,52		
2.9	2.9	un	1	\$ 90.700,00	\$ 90.700,00	1	\$ 90.700,00	1	\$ 90.700,00	3.3	3.3	m3	150	\$ 354.176	\$ 53.126,40	150	\$ 53.126,40		
3	3	m3	1.612.511,04			1.612.511,04				3.4	3.4	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 66.564,60		
3.1	3.1	m3	3384	\$ 84.381	\$ 285.393,94	3384	\$ 84.381	3384	\$ 285.393,94	3.5	3.5	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 66.564,60		
3.2	3.2	m3	812	\$ 93.348	\$ 99.857,52	812	\$ 93.348	812	\$ 99.857,52	3.6	3.6	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 66.564,60		
3.3	3.3	m3	150	\$ 354.176	\$ 53.126,40	150	\$ 354.176	150	\$ 53.126,40	3.7	3.7	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 66.564,60		
3.4	3.4	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 443.764	150	\$ 66.564,60	3.8	3.8	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 66.564,60		
3.5	3.5	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 443.764	150	\$ 66.564,60	3.9	3.9	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 66.564,60		
3.6	3.6	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 443.764	150	\$ 66.564,60	4	4	m3	150	\$ 443.764	\$ 66.564,60	150	\$ 66.564,60		



CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAYAMA, GUAYAMA, P.R.										FECHA: 05-05-2023										ACTA 1										ACTA 2										ACTA 3										ACTA 4										ACTA 5										ACTA 6										ACTA 7										ACTA 8										ACTA 9										ACTA 10										ACTA 11										ACTA 12										ACTA 13										ACTA 14										ACTA 15										ACTA 16										ACTA 17										ACTA 18										ACTA 19										ACTA 20										ACTA 21										ACTA 22										ACTA 23										ACTA 24										ACTA 25										ACTA 26										ACTA 27										ACTA 28										ACTA 29										ACTA 30										ACTA 31										ACTA 32										ACTA 33										ACTA 34										ACTA 35										ACTA 36										ACTA 37										ACTA 38										ACTA 39										ACTA 40										ACTA 41										ACTA 42										ACTA 43										ACTA 44										ACTA 45										ACTA 46										ACTA 47										ACTA 48										ACTA 49										ACTA 50										ACTA 51										ACTA 52										ACTA 53										ACTA 54										ACTA 55										ACTA 56										ACTA 57										ACTA 58										ACTA 59										ACTA 60										ACTA 61										ACTA 62										ACTA 63										ACTA 64										ACTA 65										ACTA 66										ACTA 67										ACTA 68										ACTA 69										ACTA 70										ACTA 71										ACTA 72										ACTA 73										ACTA 74										ACTA 75										ACTA 76										ACTA 77										ACTA 78										ACTA 79										ACTA 80										ACTA 81										ACTA 82										ACTA 83										ACTA 84										ACTA 85										ACTA 86										ACTA 87										ACTA 88										ACTA 89										ACTA 90										ACTA 91										ACTA 92										ACTA 93										ACTA 94										ACTA 95										ACTA 96										ACTA 97										ACTA 98										ACTA 99										ACTA 100										ACTA 101										ACTA 102										ACTA 103										ACTA 104										ACTA 105										ACTA 106										ACTA 107										ACTA 108										ACTA 109										ACTA 110										ACTA 111										ACTA 112										ACTA 113										ACTA 114										ACTA 115										ACTA 116										ACTA 117										ACTA 118										ACTA 119										ACTA 120										ACTA 121										ACTA 122										ACTA 123										ACTA 124										ACTA 125										ACTA 126										ACTA 127										ACTA 128										ACTA 129										ACTA 130										ACTA 131										ACTA 132										ACTA 133										ACTA 134										ACTA 135										ACTA 136										ACTA 137										ACTA 138										ACTA 139										ACTA 140										ACTA 141										ACTA 142										ACTA 143										ACTA 144										ACTA 145										ACTA 146										ACTA 147										ACTA 148										ACTA 149										ACTA 150										ACTA 151										ACTA 152										ACTA 153										ACTA 154										ACTA 155										ACTA 156										ACTA 157										ACTA 158										ACTA 159										ACTA 160										ACTA 161										ACTA 162										ACTA 163										ACTA 164										ACTA 165										ACTA 166										ACTA 167										ACTA 168										ACTA 169										ACTA 170										ACTA 171										ACTA 172										ACTA 173										ACTA 174										ACTA 175										ACTA 176										ACTA 177										ACTA 178										ACTA 179										ACTA 180										ACTA 181										ACTA 182										ACTA 183										ACTA 184										ACTA 185										ACTA 186										ACTA 187										ACTA 188										ACTA 189										ACTA 190										ACTA 191										ACTA 192										ACTA 193										ACTA 194										ACTA 195										ACTA 196										ACTA 197										ACTA 198										ACTA 199										ACTA 200										ACTA 201										ACTA 202										ACTA 203										ACTA 204										ACTA 205										ACTA 206										ACTA 207										ACTA 208										ACTA 209										ACTA 210										ACTA 211										ACTA 212										ACTA 213										ACTA 214										ACTA 215										ACTA 216										ACTA 217										ACTA 218										ACTA 219										ACTA 220										ACTA 221										ACTA 222										ACTA 223										ACTA 224										ACTA 225										ACTA 226										ACTA 227										ACTA 228										ACTA 229										ACTA 230										ACTA 231										ACTA 232										ACTA 233										ACTA 234										ACTA 235										ACTA 236										ACTA 237										ACTA 238										ACTA 239										ACTA 240										ACTA 241										ACTA 242										ACTA 243										ACTA 244										ACTA 245										ACTA 246										ACTA 247										ACTA 248										ACTA 249										ACTA 250										ACTA 251										ACTA 252										ACTA 253										ACTA 254										ACTA 255										ACTA 256										ACTA 257										ACTA 258										ACTA 259										ACTA 260										ACTA 261										ACTA 262										ACTA 263										ACTA 264										ACTA 265										ACTA 266										ACTA 267										ACTA 268										ACTA 269										ACTA 270										ACTA 271										ACTA 272										ACTA 273										ACTA 274										ACTA 275										ACTA 276										ACTA 277										ACTA 278										ACTA 279										ACTA 280										ACTA 281										ACTA 282										ACTA 283										ACTA 284										ACTA 285										ACTA 286										ACTA 287										ACTA 288										ACTA 289										ACTA 290										ACTA 291										ACTA 292										ACTA 293										ACTA 294										ACTA 295										ACTA 296										ACTA 297										ACTA 298										ACTA 299										ACTA 300										ACTA 301										ACTA 302										ACTA 303										ACTA 304										ACTA 305										ACTA 306										ACTA 307										ACTA 308										ACTA 309										ACTA 310										ACTA 311										ACTA 312										ACTA 313										ACTA 314										ACTA 315										ACTA 316										ACTA 317										ACTA 318										ACTA 319										ACTA 320										ACTA 321										ACTA 322										ACTA 323										ACTA 324										ACTA 325										ACTA 326										ACTA 327										ACTA 328										ACTA 329										ACTA 330										ACTA 331										ACTA 332										ACTA 333										ACTA 334										ACTA 335										ACTA 336										ACTA 337										ACTA 338										ACTA 339										ACTA 340										ACTA 341										ACTA 342										ACTA 343										ACTA 344										ACTA 345										ACTA 346										ACTA 347										ACTA 348										ACTA 349										ACTA 350										ACTA 351										ACTA 352										ACTA 353										ACTA 354										ACTA 355										ACTA 356										ACTA 357										ACTA 358										ACTA 359										ACTA 360										ACTA 361										ACTA 362										ACTA 363										ACTA 364										ACTA 365										ACTA 366										ACTA 367										ACTA 368										ACTA 369										ACTA 370										ACTA 371										ACTA 372										ACTA 373										ACTA 374										ACTA 375										ACTA 376										ACTA 377										ACTA 378										ACTA 379										ACTA 380										ACTA 381										ACTA 382										ACTA 383										ACTA 384										ACTA 385										ACTA 386										ACTA 387										ACTA 388										ACTA 389										ACTA 390										ACTA 391										ACTA 392										ACTA 393										ACTA 394										ACTA 395										ACTA 396										ACTA 397										ACTA 398										ACTA 399										ACTA 400										ACTA 401										ACTA 402										ACTA 403										ACTA 404										ACTA 405										ACTA 406										ACTA 407										ACTA 408										ACTA 409										ACTA 410										ACTA 411										ACTA 412										ACTA 413										ACTA 414										ACTA 415										ACTA 416										ACTA 417										ACTA 418										ACTA 419										ACTA 420										ACTA 421										ACTA 422										ACTA 423										ACTA 424										ACTA 425										ACTA 426										ACTA 427										ACTA 428										ACTA 429										ACTA 430										ACTA 431										ACTA 432										ACTA 433										ACTA 434										ACTA 435										ACTA 436										ACTA 437										ACTA 438										ACTA 439										ACTA 440										ACTA 441										ACTA 442										ACTA 443										ACTA 444										ACTA 445										ACTA 446										ACTA 447										ACTA 448										ACTA 449										ACTA 450										ACTA 451										ACTA 452										ACTA 453										ACTA 454										ACTA 455										ACTA 456										ACTA 457										ACTA 458										ACTA 459										ACTA 460										ACTA 461										ACTA 462										ACTA 463										ACTA 464										ACTA 465										ACTA 466										ACTA 467										ACTA 468										ACTA 469										ACTA 470										ACTA 471										ACTA 472										ACTA 473										ACTA 474										ACTA 475										ACTA 476										ACTA 477										ACTA 478										ACTA 479										ACTA 480										ACTA 481										ACTA 482										ACTA 483										ACTA 484										ACTA 485										ACTA 486										ACTA 487										ACTA 488										ACTA 489										ACTA 490										ACTA 491										ACTA 492										ACTA 493										ACTA 494										ACTA 495										ACTA 496										ACTA 497										ACTA 498										ACTA 499										ACTA 500										ACTA 501										ACTA 502										ACTA 503										ACTA 504										ACTA 505										ACTA 506										ACTA 507										ACTA 508										ACTA 509										ACTA 510										ACTA 511										ACTA 512										ACTA 513										ACTA 514										ACTA 515										ACTA 516										ACTA 517										ACTA 518										ACTA 519										ACTA 520										ACTA 521										ACTA 522										ACTA 523										ACTA 524										ACTA 525										ACTA 526										ACTA 527										ACTA 528										ACTA 529										ACTA 530										ACTA 531										ACTA 532										ACTA 533										ACTA 534										ACTA 535										ACTA 536										ACTA 537										ACTA 538										ACTA 539										ACTA 540										ACTA 541										ACTA 542										ACTA 543										ACTA 544										ACTA 545										ACTA 546										ACTA 547										ACTA 548										ACTA 549										ACTA 550										ACTA 551										ACTA 552										ACTA 553										ACTA 554										ACTA 555										ACTA 556										ACTA 557										ACTA 558										ACTA 559										ACTA 560										ACTA 561										ACTA 562										ACTA 563										ACTA 564										ACTA 565										ACTA 566										ACTA 567										ACTA 568										ACTA 569										ACTA 570										ACTA 571										ACTA 572										ACTA 573										ACTA 574										ACTA 575										ACTA 576										ACTA 577										ACTA 578										ACTA 579										ACTA 580										ACTA 581										ACTA 582										ACTA 583										ACTA 584										ACTA 585										ACTA 586										ACTA 587										ACTA 588										ACTA 589										ACTA 590										ACTA 591										ACTA 592										ACTA 593										ACTA 594										ACTA 595										ACTA 596										ACTA 597										ACTA 598										ACTA 599										ACTA 600										ACTA 601										ACTA 602										ACTA 603										ACTA 604										ACTA 605										ACTA 606										ACTA 607										ACTA 608										ACTA 609										ACTA 610										ACTA 611										ACTA 612										ACTA 613										ACTA 614										ACTA 615										ACTA 616										ACTA 617										ACTA 618										ACTA 619										ACTA 620										ACTA 621										ACTA 622										ACTA 623										ACTA 624										ACTA 625										ACTA 626										ACTA 627										ACTA 628										ACTA 629										ACTA 630										ACTA 631										ACTA 632										ACTA 633										ACTA 634										ACTA 635										ACTA 636										ACTA 637										ACTA 638										ACTA 639										ACTA 640										ACTA 641										ACTA 642										ACTA 643										ACTA 644										ACTA 645										ACTA 646										ACTA 647										ACTA 648										ACTA 649										ACTA 650										ACTA 651										ACTA 652										ACTA 653										ACTA 654										ACTA 655										ACTA 656										ACTA 657										ACTA 658										ACTA 659										ACTA 660										ACTA 661										ACTA 662										ACTA 663										ACTA 664										ACTA 665										ACTA 666										ACTA 667										ACTA 668										ACTA 669										ACTA 670										ACTA 671										ACTA 672										ACTA 673										ACTA 674										ACTA 675										ACTA 676										ACTA 677										ACTA 678										ACTA 679										ACTA 680										ACTA 681										ACTA 682										ACTA 683										ACTA 684										ACTA 685										ACTA 686										ACTA 687										ACTA 688										ACTA 689										ACTA 690										ACTA 691										ACTA 692										ACTA 693										ACTA 694										ACTA 695										ACTA 696										ACTA 697										ACTA 698										ACTA 699										ACTA 700										ACTA 701										ACTA 702										ACTA 703										ACTA 704										ACTA 705										ACTA 706										ACTA 707										ACTA 708										ACTA 709										ACTA 710										ACTA 711										ACTA 712										ACTA 713										ACTA 714										ACTA 715										ACTA 716										ACTA 717										ACTA 718										ACTA 719										ACTA 720										ACTA 721										ACTA 722										ACTA 723										ACTA 724										ACTA 725										ACTA 726										ACTA 727										ACTA 728										ACTA 729										ACTA 730										ACTA 731										ACTA 732										ACTA 733										ACTA 734										ACTA 735										ACTA 736										ACTA 737										ACTA 738										ACTA 739										ACTA 740										ACTA 741										ACTA 742										ACTA 743										ACTA 744										ACTA 745										ACTA 746										ACTA 747										ACTA 748										ACTA 749										ACTA 750										ACTA 751										ACTA 752										ACTA 753										ACTA 754										ACTA 755										ACTA 756										ACTA 757										ACTA 758										ACTA 759										ACTA 760										ACTA 761										ACTA 762										ACTA 763										ACTA 764										ACTA 765										ACTA 766										ACTA 767										ACTA 768										ACTA 769										ACTA 770										ACTA 771										ACTA 772										ACTA 773										ACTA 774										ACTA 775										ACTA 776										ACTA 777										ACTA 778										ACTA 779										ACTA 780										ACTA 781										ACTA 782										ACTA 783										ACTA 784										ACTA 785										ACTA 786										ACTA 787										ACTA 788										ACTA 789										ACTA 790										ACTA 791										ACTA 792										ACTA 793										ACTA 794										ACTA 795										ACTA 796										ACTA 797										ACTA 798										ACTA 799										ACTA 800										ACTA 801										ACTA 802										ACTA 803										ACTA 804										ACTA 805										ACTA 806										ACTA 807										ACTA 808										ACTA 809										ACTA 810										ACTA 811										ACTA 812										ACTA 813										ACTA 814										ACTA 815										ACTA 816										ACTA 817										ACTA 818										ACTA 819										ACTA 820										ACTA 821										ACTA 822										ACTA 823										ACTA 824										ACTA 825										ACTA 826										ACTA 827										ACTA 828									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 7

En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de JULIO de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GRAVIRA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO, representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de JULIO de 2026:

JUSTIFICACION

Ítem 15.8 – Muros de aproximación en concreto de 3000 psi

La menor cantidad corresponde al cambio de la solución constructiva inicialmente contemplada para los muros de aproximación. Durante el desarrollo del proyecto se determinó reemplazar la solución de muros en concreto reforzado por un sistema de muros en escamas de concreto, de acuerdo con las condiciones y requerimientos definidos para la ejecución de la obra. La implementación de esta alternativa constructiva reduce significativamente el volumen de concreto requerido frente a la solución inicialmente prevista, razón por la cual se presenta una disminución de 209,25 m³ en el ítem de concreto para muros de aproximación.

Ítem 3.1 – Cargue mecánico, transporte y botada de escombros

Es necesario el uso de mayores cantidades en este ítem para contemplar el cargue y botada de escombros provenientes de las excavaciones de los pilotes, ya que el ítem de excavación con piloteadora no incluye su disposición final.

Ítem 12.7 – Tubería PVC Novafort 315 mm

La cantidad adicional corresponde a la necesidad de ejecutar un tramo adicional de red de alcantarillado, identificado durante el desarrollo de las actividades de obra y requerido para garantizar la continuidad, conexión y adecuado funcionamiento del sistema de drenaje. La longitud adicional fue definida de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y los requerimientos de la solución finalmente ejecutada.

Ítem 14.17 – Vestida primaria RA2-304

La cantidad adicional corresponde a la necesidad de implementar elementos de vestida primaria requeridos para la adecuación y configuración de la red eléctrica existente, de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y la solución definitiva de intervención de la infraestructura eléctrica.

Ítem 14.22 – Vestida primaria RA6-010

La cantidad adicional se genera como consecuencia de los ajustes requeridos en la configuración de la red eléctrica durante la ejecución de las obras, siendo necesario incorporar las vestidas primarias correspondientes para garantizar la correcta disposición y operación de la infraestructura, conforme a la norma EPM aplicable.

Ítem 14.23 – Viento convencional RA6-001 para 44 kV

La cantidad adicional corresponde a la necesidad de instalar vientos convencionales adicionales para garantizar la estabilidad y soporte mecánico de la red primaria de 44 kV, de acuerdo con la configuración definitiva de la infraestructura y las condiciones encontradas durante la ejecución.

Ítem 14.24 – Viento convencional RA6-001 para 13,2 kV

La cantidad adicional se requiere para complementar el sistema de soporte de la red primaria de 13,2 kV, de acuerdo con la configuración definitiva de la red y las condiciones de campo identificadas durante la ejecución de las actividades.

Ítem 14.39 – Cuadrilla línea viva

La cantidad adicional corresponde a las horas requeridas para la ejecución de actividades sobre la red eléctrica mediante cuadrilla especializada de línea viva, necesarias para realizar las maniobras, adecuaciones y trabajos de intervención requeridos, minimizando la afectación del servicio y garantizando condiciones seguras para la ejecución.

Ítem 14.48 – Retiro de vientos primarios

La cantidad adicional corresponde al retiro y reintegro de vientos primarios existentes que interfieren con la configuración definitiva de la infraestructura eléctrica. Esta actividad fue requerida para permitir la adecuación de la red conforme a las condiciones finales de la obra.

Ítem 14.50 – Traslado línea primaria 4 hilos

La cantidad adicional corresponde al traslado de un tramo de la línea primaria de cuatro hilos, requerido para adecuar la infraestructura eléctrica a la configuración definitiva de la obra y garantizar las distancias y condiciones técnicas necesarias para su correcta operación.

OE1 – Piedra Rajón

La actividad adicional se requiere como parte de la solución constructiva definitiva para garantizar las condiciones de estabilidad, conformación y manejo de las obras en vías. La utilización de piedra rajón permite conformar y mejorar las condiciones del terreno de acuerdo con las necesidades identificadas durante la ejecución.

OE13 – TecDren

La actividad extra corresponde a la necesidad de implementar un sistema de drenaje mediante lámina drenante tipo TecDren o equivalente, con el fin de garantizar la adecuada captación, conducción y evacuación del agua en las zonas asociadas a la solución constructiva finalmente adoptada.

Esta actividad resulta necesaria para controlar la presencia de agua y contribuir al adecuado comportamiento y durabilidad de la estructura y de los rellenos asociados.

OE74 – Rellenos con material de excavación para brechas

Durante la ejecución de las obras y como resultado de las condiciones encontradas en campo, se identificó la necesidad de ejecutar actividades de relleno con material de excavación para brechas, las cuales no se encontraban contempladas dentro de los ítems y cantidades inicialmente contratados. La ejecución de esta actividad se hace necesaria para realizar la adecuada recuperación y conformación de las brechas intervenidas, una vez culminados los trabajos de excavación y las actividades asociadas a la instalación y/o construcción de los elementos previstos en el proyecto. El relleno permite restituir las condiciones del terreno intervenido y garantizar la estabilidad, nivelación y correcta terminación de las áreas afectadas.

OE15 – Demolición y desmantelamiento de viviendas

La actividad extra corresponde a la demolición y desmantelamiento de viviendas existentes que se encontraron dentro del área requerida para la ejecución de las obras. Estas actividades no se encontraban contempladas en las cantidades inicialmente contratadas y fueron necesarias para liberar las áreas de intervención y permitir la ejecución de las obras proyectadas.

OE16 – Relleno con material de fresado para brechas (No incluye material)

La cantidad adicional corresponde a la necesidad de realizar rellenos y conformación de brechas en las zonas intervenidas. Esta actividad fue requerida para restituir y conformar las áreas afectadas por las actividades constructivas, garantizando condiciones adecuadas de nivelación, compactación y transitabilidad.

OEE4 – Cajas en bloque para acometidas 13,2 kV

La actividad extra corresponde a la necesidad de construir cajas para las acometidas y salida de circuitos de 13,2 kV, requeridas para complementar y garantizar la correcta operación de la infraestructura eléctrica ejecutada, de acuerdo con las normas técnicas EPM aplicables.



CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 7

OEE5 -- Inspección y localización de tuberías con cámara

La actividad fue requerida para realizar la inspección y localización de las redes existentes mediante cámara de video, debido a la necesidad de verificar las condiciones, trazados y posibles interferencias de las tuberías de alcantarillado antes y durante la ejecución de las actividades. La información obtenida permitió definir las intervenciones requeridas y evitar afectaciones a las redes existentes.

OEE6 -- Reflectores LED 150 W

La actividad extra corresponde a la necesidad de complementar la infraestructura de iluminación del área intervenida mediante la instalación de reflectores LED de 150 W, requeridos para garantizar los niveles de iluminación y las condiciones de funcionamiento previstas para la zona.

OEE7 -- Trenza cuádruplex AL 3 No. 2 + 1 No. 4 ACSR

La actividad adicional corresponde a la necesidad de instalar un tramo de conductor de red aérea requerido para completar la configuración eléctrica definitiva y garantizar la continuidad y correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo los elementos complementarios necesarios para su montaje.

OEE8 -- Cable encauchetado 3x12 para reflectores


La cantidad extra corresponde al cableado requerido para realizar la conexión eléctrica de los reflectores LED adicionales. La longitud se determina de acuerdo con la ubicación definitiva de los equipos y los recorridos necesarios para su correcta conexión, instalación y funcionamiento."□

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15.8	Construcción de MUROS DE APROXIMACIÓN en concreto de 3000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	-253.18	\$ 1,752,345.00	-\$ 443,661,560.00
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					-\$ 443,661,560.00

OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12.7	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC Novafort S8 315mm 12" Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	60.00	\$ 222,432.00	\$ 13,345,920.00
3.1	CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, repaleo, transporte interno y externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	519.00	\$ 45,805.00	\$ 23,772,795.00
14.17	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-304 de EPM	un	5.00	\$ 3,428,219.00	\$ 17,141,095.00
14.22	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA6-010 de EPM	un	5.00	\$ 485,817.00	\$ 2,429,085.00
14.23	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria: Viento convencional según norma RA6-001 para 44KV de EPM.	un	15.00	\$ 1,015,051.00	\$ 15,225,765.00
14.24	Viento convencional según norma RA6-001 para 13.2KV	un	5.00	\$ 718,255.00	\$ 3,591,275.00
14.39	Suministro, transporte y montaje cuadrilla línea viva en día festivo y/o no festivo	h	40.00	\$ 1,816,519.00	\$ 72,660,760.00
14.48	Retiro (incluye reintegro) de vientos primarios	un	4.00	\$ 27,201.00	\$ 108,804.00
14.50	Traslado línea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv	ml	25.00	\$ 54,402.00	\$ 1,360,050.00
TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA					\$ 149,635,549



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



CONTRATO N° DESur-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 7

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
OE1	Suministro, transporte e instalación de piedra Rajón	m3	300.00	\$ 303,395.00	\$ 91,018,500.00
OE13	Instalación de TecDren o equivalente, lámina drenante con alta resistencia a la compresión y a la acción de agentes químicos para la captación, conducción y evacuación de fluidos. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	200.00	\$ 51,840.35	\$ 10,368,069.00
OE15	Demolición y desmantelamiento de vivienda existente, incluyendo cargue, transporte y disposición final de escombros	und	6.00	\$ 3,712,721.00	\$ 22,276,326.00
OE16	Rellenos con material de fresado para brechas, incluye transporte, extendido, conformación y compactación. No incluye suministro de material.	m3	400.00	\$ 168,701.10	\$ 67,480,440.00
OE74	Rellenos con material de excavación para brechas, incluye extendido, conformación y compactación.	m3	350.00	\$ 152,046.00	\$ 53,216,100.00
QEE4	Caja en bloque de concreto para acometidas y salida de circuitos a 13,2kv según Norma EPM NC-RS3-005 (Caja 2T) + Tapa sencilla en concreto en zona verde o andén. Norma técnica epm NC-RS4-001	Unidad	6.00	\$ 6,064,490.00	\$ 36,386,940.00
QEE5	Servicio de inspección y localización de tuberías con cámara de video para alcantarillado	hr	6.00	\$ 340,661.00	\$ 2,043,966.00
QEE6	Suministro, transporte e instalación de reflectores Led 150W. Incluye reflector led y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento	Unidad	15.00	\$ 455,786.00	\$ 6,836,790.00
QEE7	Suministro y transporte e instalación de trenza cuadruplex AL 3N*2 + 1N*4 ACRS 600V. Incluye percha canal, Aislador carrete y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	20.00	\$ 75,152.00	\$ 1,503,040.00
QEE8	Suministro transporte e instalación de cable encauchetado 3x12 para reflectores.	ml	120.00	\$ 24,132.00	\$ 2,895,840.00

TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA \$ 294,026,011.00

TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA \$ 443,661,560.00

DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA \$ -

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empresa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESur-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

JESÚS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

LARBA QUINTERO GRAVIRIA
Supervisora del Contrato
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO DESUR

ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoria
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



CONTRATO N° DESur-IA-168-2025

OBJETO:

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24

ACTA N°4 - APROBACION OBRA EXTRA

En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de julio de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GRAVIRIA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO, representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025; con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026:

OBRAS EXTRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO UNITARIO	FECHA
OE15	Demolición y desmantelamiento de vivienda existente, incluyendo cargue, transporte y disposición final de escombros	und	\$ 3,712,721.00	jul-26
OE16	Rellenos con material de fresado para brechas, incluye transporte, extendido, conformación y compactación. No incluye suministro de material.	m3	\$ 168,701.10	jul-26
OE74	Rellenos con material de excavación para brechas, incluye extendido, conformación y compactación.	m3	\$ 152,046.00	jul-26
OE44	Caja en bloque de concreto para acometidas y salida de circuitos a 13,2kv según Norma EPM NC-RS3-005 (Caja 2T) + Tapa sencilla en concreto en zona verde o andén. Norma técnica epm NC-RS4-001	Unidad	\$ 6,064,490.00	jul-26
OE55	Servicio de inspección y localización de tuberías con cámara de video para alcantarillado	hr	\$ 340,661.00	jul-26
OE66	Suministro, transporte e instalación de reflectores Led 150W. Incluye reflector led y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento	Unidad	\$ 455,786.00	jul-26
OE77	Suministro y transporte e instalación de trenza cuadruplex AL 3N°2 + 1N° 4 ACRS 600V. Incluye percha canal, Aislador carrete y todos los elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	\$ 75,152.00	jul-26
OE88	Suministro transporte e instalación de cable encauchetado 3x12 para reflectores.	ml	\$ 24,132.00	jul-26

OBSERVACIONES:

La construcción de estas obras extras se realizarán de acuerdo a las indicaciones del supervisor asignado por DESur; y deben cumplir con las normas y especificaciones generales de construcción.

Se anexan los A.P.U de Obras Extras revisados y aprobados.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Los precios unitarios de Obra Extra fueron aprobados por la interventoría y representantes de la Empresa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESur-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESur


LAURA QUINTERO GRAVIRIA
Supervisora del Contrato
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESur

JESUS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA


ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:	6/07/2026	
Demolición y desmantelamiento de vivienda existente, incluyendo cargue, transporte y disposición final de escombros			UNIDAD:	Und	
			CANTIDAD:	7.00	
			ITEM:	QE15	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Pulidora manual eléctrica con disco	día	0.50	\$ 41,650.00	\$ 20,825.00
	Compresor neu+martillo	hr	8.00	\$ 6,850.00	\$ 54,800.00
	Andamios	día	2.00	\$ 11,372.00	\$ 22,744.00
	Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP	hr	8.00	\$ 170,468.00	\$ 1,363,744.00
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 846,464.52	\$ 42,323.00
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 1,504,436.00
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MATERIALES					\$ -
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Transporte de material y derecho de botadero.	m3	30.00	\$ 45,394.00	\$ 1,361,820.00
					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 1,361,820.00
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla demoliciones (1 Of + 2 Ayu)	jor	2.000	423,232	\$ 846,464.52
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 846,464.52
OBSERVACIONES					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 846,464.52
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 3,712,721.00


 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA



 CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:		6/07/2026
			UNIDAD:		m3
Rellenos con material de fresado para brechas, incluye transporte, extendido, conformación y compactación. No incluye suministro de material.			CANTIDAD:		310.00
			ITEM:		OE16
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 105,116.51	\$ 5,255.83
	Compactador tipo Canguro. Incluye combustible y transporte.	día	0.333	\$ 125,021.00	\$ 41,673.67
SUBTOTAL MAQ. EQ Y HTA					\$ 46,929.49
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MATERIALES					\$ -
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Acarreo interno materiales	m3	\$ 1.05	15862.00	\$ 16,655.10
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 16,655.10
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla 1 Of + 1 Ayu	jor	0.333	\$ 315,349.53	\$ 105,116.51
OBSERVACIONES					\$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 105,116.51
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 168,701.10


 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA


 CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:		5/07/2026
Rellenos con material de excavación para brechas, incluye extendido, conformación y compactación.			UNIDAD:		m3
			CANTIDAD:		310.00
			ITEM:		0574
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 105,116.51	\$ 5,255.83
	Compactador tipo Canguro. Incluye combustible y transporte.	día	0.333	\$ 125,021.00	\$ 41,673.67
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 46,929.49
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MATERIALES					\$ -
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ -
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla 1 Of + 1 Ayu	jor	0.333	\$ 315,349.53	\$ 105,116.51
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 105,116.51
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 152,046.00
OBSERVACIONES					


 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA



 CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
DESCRIPCIÓN:				FECHA:	6/07/2026	
				UNIDAD:	und	
Caja en bloque de concreto para acometidas y salida de circuitos a 13,2kv según Norma EPM NC-RS3-005 (Caja 2T) + Tapa sencilla en concreto en zona verde o anden. Norma tecnica epm NC-RS4-001				CANTIDAD:	5.00	
				ITEM:	0EE4	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL	
	Vibrador concreto tipo aguja	día	1.00	\$ 83,300.00	\$ 83,300.00	
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 3,266,540.81	\$ 163,327.00	
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 246,627.00	
MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL	
	BLOQUE CONCRETO 40X20X20 CM	un	72.00	\$ 6,227.3	\$ 448,363.00	
	Mortero 1:4 en obra	m3	0.15	\$ 391,600.0	\$ 58,740.00	
	Concreto Grouting de 17.5 Mpa preparado en obra	m³	0.41	\$ 477,186.5	\$ 195,647.00	
	Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000 PSI)	m3	0.69	\$ 474,453.0	\$ 327,335.00	
	Concreto de 14 Mpa preparado en obra (2000 PSI)	m3	0.18	\$ 419,323.0	\$ 75,479.00	
	Acero refuerzo G-60 figurado	kg	101.90	\$ 4,700.0	\$ 478,930.00	
	Alambre recocido C 18	kg	5.10	\$ 8,600.00	\$ 43,817.00	
	HERRAJE 120X80 ANTIFRAUDE DISTRIBUCION	Und	1.00	\$ 763,189.8	\$ 763,190.00	
	Grava + tte	m3	0.19	\$ 96,762.5	\$ 18,733.00	
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 2,410,234.00	
TRANSPORTES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL	
	Transporte material	un	0.400	\$ 352,721	\$ 141,088.40	
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 141,088.40	
MANO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL	
	Cuadrilla eléctrica	Jor	9.091	\$ 359,319	\$ 3,266,540.81	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 3,266,540.81	
OBSERVACIONES					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 6,064,490.00	


 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA


 CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:	6/07/2026	
			UNIDAD:	hr	
Servicio de inspección y localización de tuberías con cámara de video para alcantarillado			CANTIDAD:	6.00	
			ITEM:	0005	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 44,914.94	\$ 2,246.00
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 2,246.00
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Sistema CCTV para inspección interna, diagnóstico y localización de tuberías de alcantarillado, registro audiovisual	hr	1.000	\$ 293,500	\$ 293,500.0
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 293,500.00
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ -
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla eléctrica	Jor	0.125	\$ 359,319	\$ 44,914.94
OBSERVACIONES					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 44,914.94
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 340,661.00



 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA


 CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA


CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:	6/07/2026	
			UNIDAD:	m	
Suministro y transporte e instalacion de trenza cuadruplex AL 3Nº2 + 1Nº 4 ACRS 600V. Incluye percha canal, Aislador carrete y todos los elementos necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.			CANTIDAD:	15.00	
			ITEM:	0007	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Carro canasta 14 m	hr	0.07	\$ 383,333.00	\$ 25,556.00
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 23,954.63	\$ 1,198.00
			SUBTOTAL MAQ. EQ Y HTA		\$ 26,754.00
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Trenza Cuádruplex AL 3xNo.2 + 1xNo.4 ACSR 600V	m	1.000	\$ 19,338	\$ 19,337.5
	PERCHA 3 1/2" CANAL CON NORMA	un	0.067	\$ 18,143	\$ 1,209.5
	ES28 - ESPACIADOR 5/8" X 8" 2 TUERCAS 2 ARANDELAS	un	0.067	\$ 8,635	\$ 575.7
	AISLADOR CARRETE	un	0.067	\$ 5,058	\$ 337.2
					\$ -
					\$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		\$ 21,459.85
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Transporte material	un	0.05	\$ 59,663.00	\$ 2,983.2
					\$ -
			SUBTOTAL TRANSPORTES		\$ 2,983.15
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla eléctrica	Jor	0.067	\$ 359,319	\$ 23,954.63
OBSERVACIONES			SUBTOTAL MANO DE OBRA		\$ 23,954.63
			TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 75,152.00

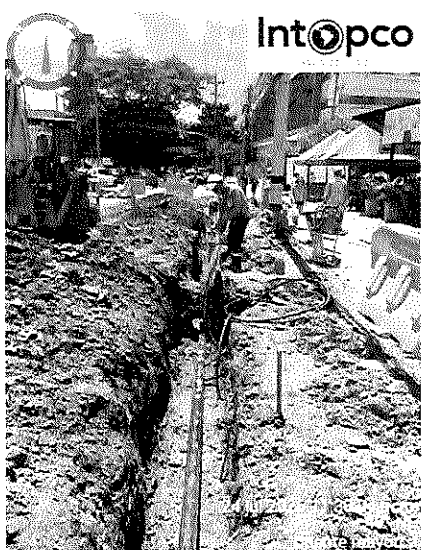
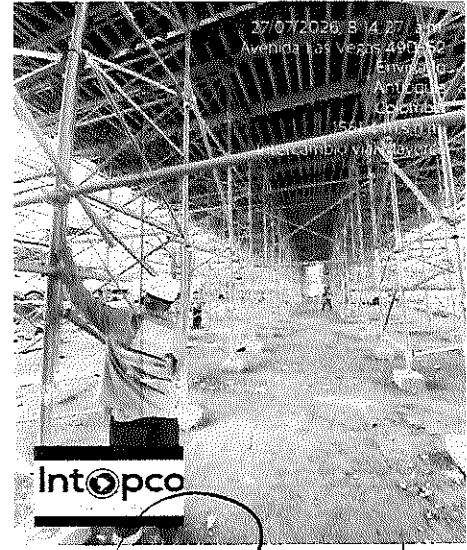


 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA


 CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:	6/07/2026	
			UNIDAD:	m	
Suministro transporte e instalacion de cable encauchetado 3x12 para reflectores			CANTIDAD:	108.00	
			ITEM:	0008	
ITEM	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 8,982.99	\$ 449.00
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 449.00
ITEM	MATERIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Cable encauchetado 3x12	m	1.000	\$ 11,717	\$ 11,716.7
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 11,716.74
ITEM	TRANSPORTES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Transporte material	un	0.05	\$ 59,663.00	\$ 2,983.2
					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 2,983.15
ITEM	MANO DE OBRA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla eléctrica	Jor	0.025	\$ 359,319	\$ 8,982.99
OBSERVACIONES			SUBTOTAL MANO DE OBRA		
			\$ 8,982.99		
			TOTAL COSTO DIRECTO		
			\$ 24,132.00		


 CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA


 CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	540.00	
1.1												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)											Cant. Total	540.00	
dia												Saldo por Ejecutar	363.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	177.00	
10/02/2026	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026								
23.00	20.00	21.00	25.00	25.00	30.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Localizacion, trazado y replanteo.	Levantamiento general del proyecto - comision puente					25.00						
7	10/08/2026	Localizacion, trazado y replanteo.	Levantamiento general del proyecto - comision redes humedas - vias					8.00						
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												33.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 1.1														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°S DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,606.00	
2.5	Desmante y retiro de cordones en concreto o bordillos existentes 0.15x0.10 m. Manual o mecánico. Incluye cargue, transporte, botada y disposición de los escombros a sitios definidos por la interventoría.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	1,606.00	
m												Saldo por Ejecutar	1,364.45	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	241.55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026								
0.00	0.00	4.80	26.00	33.86	45.49	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Separador intersección av las vegas - calle 49 sur - sector S48		28.00	0.40			11.20		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Separador intersección av las vegas - calle 49 sur - sector S48		1.00	0.40			0.40		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Separador intersección av las vegas - calle 49 sur - sector S48		1.00	0.10			0.10		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Separador intersección av las vegas - calle 49 sur - sector S48		28.00	0.40			11.20		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Separador intersección av las vegas - calle 49 sur - sector S48		1.00	0.40			0.40		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Separador intersección av las vegas - calle 49 sur - sector S48		1.00	0.10			0.10		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - civita		62.00	0.40			24.80		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - civita		1.00	0.20			0.20		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - civita		62.00	0.40			24.80		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - civita		1.00	0.20			0.20		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - civita		57.00	0.40			34.80		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - civita		1.00	0.20			0.20		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - ingreso civita		57.00	0.40			22.80		
7	10/08/2026	Retiro de cordonería				Eje 2 vial - costado occidental - ingreso civita		1.00	0.20			0.20		
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7													131.40	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 2.5														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8,160.00
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	8,160.00
m3												Saldo por Ejecutar	7,901.05
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	258.95
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026							
0.00	0.00	5.28	45.15	54.15	105.59	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema									
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total	
7	10/08/2026	Demoliciones						48.78	







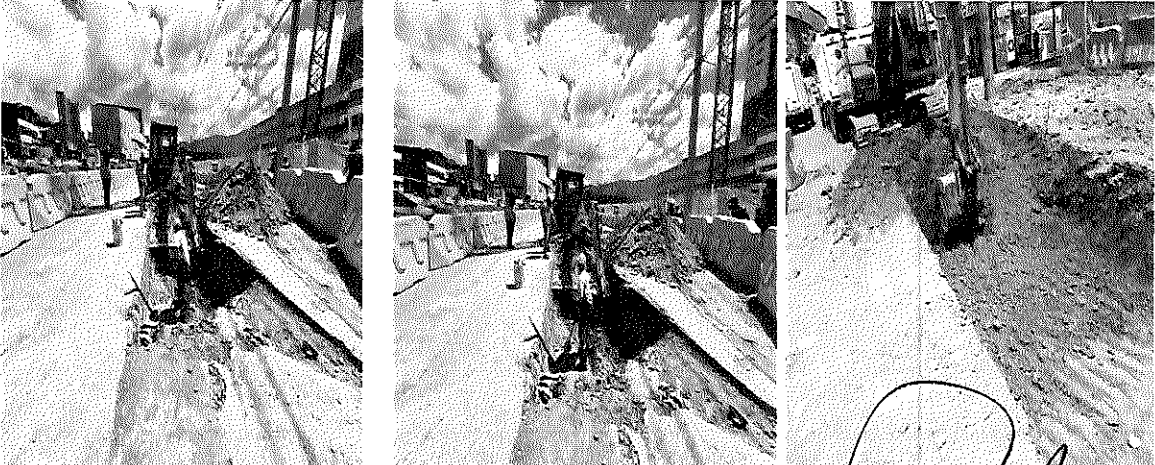
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7								48.78
---	--	--	--	--	--	--	--	-------



OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 2.8



CONSORCIO MAYORCA CONECTA
 Ing. Jorge Restrepo Sulez
 CONTRATISTA



CONSORCIO METROPOLITANO ILA
 Ing. Alvaro Hernando Vera
 INTERVENTORIA

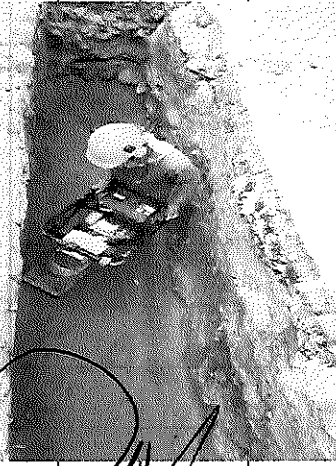


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	3,384.00	
3.1	Excavación manual en tierra de 0 a 2m bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	3,384.00	
m3												Saldo por Ejecutar	3,261.21	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	122.79	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	10/03/2026	10/04/2026		10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026								
	17.65	0.00	0.00	0.54	34.93	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Excavacion manual	Eje 2 vial - sentido sur - norte - civita				4.32	4.80	0.90	1.00	4.32			
7	10/08/2026	Excavacion manual	Eje 2 vial - sentido sur - norte - civita				6.62	4.80	1.38	1.00	6.62			
7	10/08/2026	Excavacion manual	Acueducto - Eje 3 Vial N9-N7				12.21	18.50	0.60	1.10	12.21			
7	10/08/2026	Excavacion manual	Acueducto Eje 3 Vial N8-N8				15.60	26.00	0.60	1.00	15.60			
7	10/08/2026	Excavacion manual residual acometidas	R13-R14				6.73	3.40	0.90	2.20	6.73			
7	10/08/2026	Excavacion manual Lluvias	CO1E-L9				20.49	4.00	2.60	1.97	20.49			
7	10/08/2026	Excavación Manual residual	CO1E-R15A				3.70	2.40	1.10	1.40	3.70			
 												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		69.67
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 3.1														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA											
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-158-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	10,878.00
3.12	Excavación mecánica hasta 4,00m de profundidad, incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	10,878.00
m3												Saldo por Ejecutar	5,106.31
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	5771.69
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026							
0.00	195.03	645.28	928.53	1768.26	1352.57	882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Excavacion	Eje 3 vial - civita				315.76				315.76		
7	10/08/2026	Excavacion	Eje 2 vial - civita				566.26				566.26		
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												882.02	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 3.12													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	500.00	
3.13	CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS. Incluye, el cargue con máquina, repaleo, transporte interno y externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.											Cant. Adicional	118.44	
Unidad												Cant. Total	618.44	
m3												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	618.44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.44								
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Diametro	Alto	Total						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 1	Pilote 1	21.33		1.2	18.85	21.33						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 1	Pilote 2	21.71		1.2	19.20	21.71						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 1	Pilote 3	23.84		1.2	21.08	23.84						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 1	Pilote 4	23.77		1.2	21.02	23.77						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 1	Pilote 5	21.49		1.2	19.00	21.49						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 2	Pilote 6	18.94		1.2	16.75	18.94						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 2	Pilote 7	17.44		1.2	15.42	17.44						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 2	Pilote 8	25.22		1.2	22.30	25.22						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 2	Pilote 9	25.18		1.2	22.26	25.18						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 2	Pilote 10	17.16		1.2	15.17	17.16						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 2	Pilote 11	16.17		1.2	14.30	16.17						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 3	Pilote 12	17.00		1.2	15.03	17.00						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 3	Pilote 13	17.15		1.2	15.16	17.15						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 3	Pilote 14	17.37		1.2	15.36	17.37						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 3	Pilote 15	16.98		1.2	15.01	16.98						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 3	Pilote 16	17.10		1.2	15.12	17.10						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 3	Pilote 17	17.21		1.2	15.22	17.21						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 4	Pilote 18	13.62		1.2	12.04	13.62						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 4	Pilote 19	13.36		1.2	11.81	13.36						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 4	Pilote 20	13.75		1.2	12.16	13.75						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 4	Pilote 21	13.41		1.2	11.86	13.41						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 4	Pilote 22	13.23		1.2	11.70	13.23						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 4	Pilote 23	13.74		1.2	12.15	13.74						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 5	Pilote 24	15.04		1.2	13.30	15.04						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 5	Pilote 25	15.04		1.2	13.30	15.04						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 5	Pilote 26	15.04		1.2	13.30	15.04						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 5	Pilote 27	15.04		1.2	13.30	15.04						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 5	Pilote 28	15.16		1.2	13.40	15.16						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 5	Pilote 29	15.04		1.2	13.30	15.04						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 6	Pilote 30	21.27		1.2	18.81	21.27						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 6	Pilote 31	20.96		1.2	18.53	20.96						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 6	Pilote 32	20.83		1.2	18.42	20.83						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 6	Pilote 33	22.16		1.2	19.59	22.16						
7	10/08/2026	Excavacion Pilotes - Eje 6	Pilote 34	26.68		1.2	23.59	26.68						
 														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7													618.44	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 3.13														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	5,387.00	
4.3	Instalación de GEOTEXTIL tipo TR 3000 tipo Pavco o equivalente muro en tierra armada, muro de contención o actividades similares. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapes, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	5,387.00	
m2												Saldo por Ejecutar	4,355.70	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1031.30	
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 195.00	10/07/2026 195.00	10/08/2026 641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Instalacion	Eje 3 vial	1.00	31.68	3.82		121.0						
7	10/08/2026	Instalacion	Eje 2 vial	1.00	136.20	3.82		520.28						
												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.		641.30
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 4.3														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

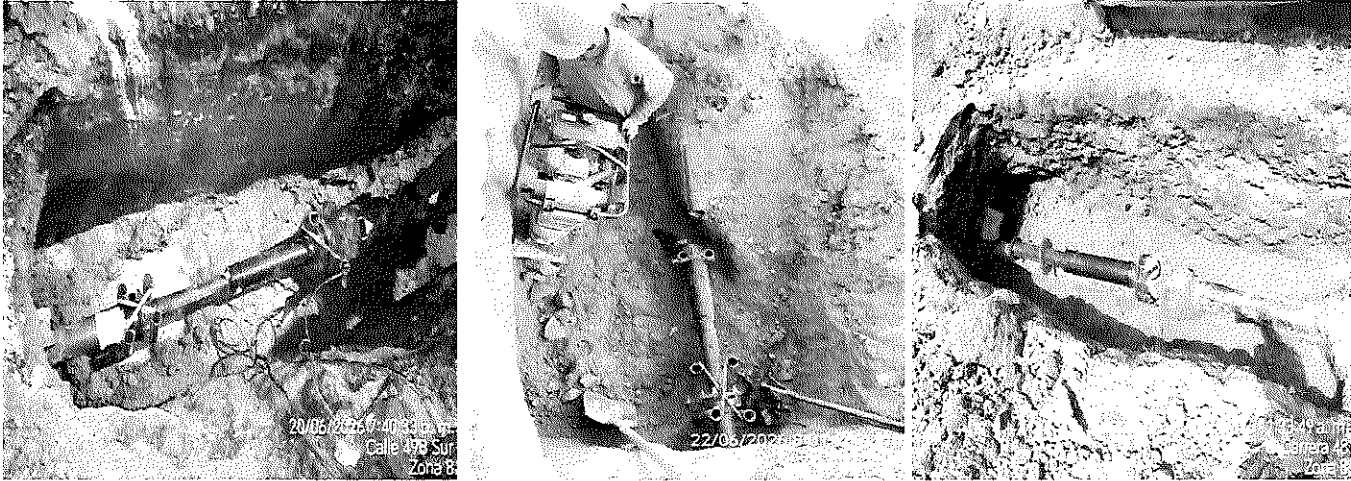
CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	6,086.00		
5.1												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Suministro, transporte e instalación de base granular clase a material tipo norma invias, compactada al 100% del p.m. Obras de pavimentación.											Cant. Total	6,086.00		
m3												Saldo por Ejecutar	5,851.31		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	234.69		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.12	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Piano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Lleno	Eje 2 vial - civita				162.57				162.57				
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.											7	162.57			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 5.1															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,704.00
5.3	Suministro, transporte, instalación y compactación sub base granular tipo C (Art. 320 INVIAS) compactada al 95% del p.m.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	1,704.00
m3												Saldo por Ejecutar	1,291.41
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	412.59
0.00	0.00	0.00	0.00	195.42	145.67	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle			Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Relleno de subbase L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 6-18.5			6.48	12.00	0.90	0.60	6.48			
7	10/08/2026	Relleno de subbase L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 18.5-24.5			4.32	6.00	1.20	0.60	4.32			
7	10/08/2026	Relleno de subbase L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 24.5-34			7.20	10.00	1.20	0.60	7.20			
7	10/08/2026	Relleno de subbase C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 13-19.5			11.83	6.50	1.82	1.00	11.83			
7	10/08/2026	Relleno de subbase L23E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 0-6			10.77	6.00	1.23	1.46	10.77			
7	10/08/2026	Relleno de subbase L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 12-18			11.62	6.00	1.10	1.76	11.62			
7	10/08/2026	Relleno de subbase L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 18-25			10.31	7.10	0.83	1.75	10.31			
7	10/08/2026	Excavación C10E-L9	Tubería Novafort 12" Abscisa 6.5-14			4.68	6.50	1.20	0.60	4.68			
7	10/08/2026	Excavación C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 0-6.5			4.29	6.50	1.10	0.60	4.29			
  						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		71.50					
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorías detalladas 20260810 ítem 5.3													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA						


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	24.00		
11.1	Corte, retiro y botada de material sobrante de acometidas que salen de servicio. Incluye caja medidor y accesorios											Cant. Adicional	0.00		
Unidad												Cant. Total	24.00		
un												Saldo por Ejecutar	13.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	11.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Acometidas domiciliarias	N9-N7 - Eje 3 vial				6.00				6.00				
7	10/08/2026	Acometidas domiciliarias	N9-N7 - Eje 3 vial				1.00				1.00				
7	10/08/2026	Acometidas domiciliarias	Eje 3 Vial N4-N7				4.00				4.00				
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												11.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 11.1															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

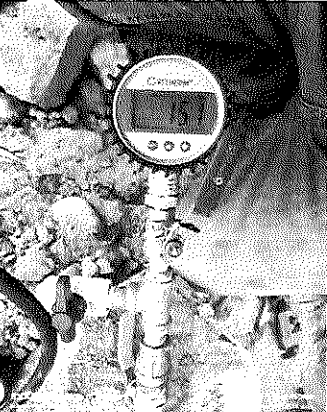

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	604.00		
11.2												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Excavación material común húmedo < 2m mecánica. Incluye el cargue, transporte interno y externo y botada.											Cant. Total	604.00		
m3												Saldo por Ejecutar	462.42		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	141.58		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total							
7	10/08/2026	Excavación N11-N9	Tubería PEAD 125 mm PE100	28.80	30.00	0.80	1.20	28.80							
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.								28.80							
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 11.2															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA					CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA										

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	533.00		
11.3	Lleno final de alcantarillas y apisonado zanjas y apiques en recebo, según norma INVIAS, Art. 610, (CBR>10%). Incluye suministro, transporte interno y compactación con densidad seca igual o mayor al 95% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.											Cant. Adicional	0.00		
Unidad												Cant. Total	533.00		
m3												Saldo por Ejecutar	472.15		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	60.85		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Acueducto N5-N6	9.64	29.40	0.85	0.40	9.64							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Nicho de empalme N6	1.28	3.30	1.00	0.40	1.28							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Nicho de empalme N3	1.09	2.80	1.00	0.40	1.09							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Nicho de empalme N5	0.44	1.14	1.00	0.40	0.44							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Nicho de empalme N6'	2.06	5.20	1.02	0.40	2.06							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Nicho de empalme N4	1.37	2.50	1.40	0.40	1.37							
7	10/09/2026	Lleno arenilla	Acueducto N5-N4	5.37	16.40	0.85	0.40	5.37							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Acueducto N4-N3	9.23	30.00	0.80	0.40	9.23							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Acueducto N4-N3	5.54	18.00	0.80	0.40	5.54							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Acueducto N11-N9	10.86	28.00	0.80	0.50	10.86							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Acueducto N9-N7	5.72	18.00	0.60	0.55	5.72							
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Acueducto N8-N6	8.26	26.00	0.60	0.55	8.26							
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												60.85			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 ítem 11.3															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			



CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORCA CONECTA		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	6.00	
11.4												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Suministro, transporte y colocación de tubería 90mm PEAD, PE 100, PN 16. Incluye termofusión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento											Cant. Total	6.00	
m												Saldo por Ejecutar	4.70	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.30	
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Instalacion tubería	Tubería 90 mm - nicho para empalme N6	0.40				0.40						
7	10/08/2026	Instalacion tubería	Tubería 90 mm - nicho para empalme N5	0.50				0.50						
7	10/08/2026	Instalacion tubería	Tubería 90 mm - nicho para empalme N4	0.40				0.40						
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												7	1.30	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 11.4														
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA		

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.											DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	188.00
11.5												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Suministro, transporte y colocación de tubería 125mm PEAD, PE 100, PN 16. Incluye termofusión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento											Cant. Total	188.00
m												Saldo por Ejecutar	4.80
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	183.20
0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	6.70	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Instalación	Tubería 125 mm - nicho para empalme N5				0.50				0.50		
7	10/08/2026	Instalación	Tubería 125 mm - nicho para empalme N6				12.00				12.00		
7	10/08/2026	Instalación	Tubería 125 mm - N11-N9				30.00				30.00		
7	10/08/2026	Instalación	Tubería 125mm - EJE 3 VIAL N9-N7				18.00				18.00		
7	10/08/2026	Instalación	Tubería 125 mm - EJE 3 VIAL N8-N6				26.00				26.00		
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												86.50	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 11.5													
 CONSORCIO MAYORÍA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

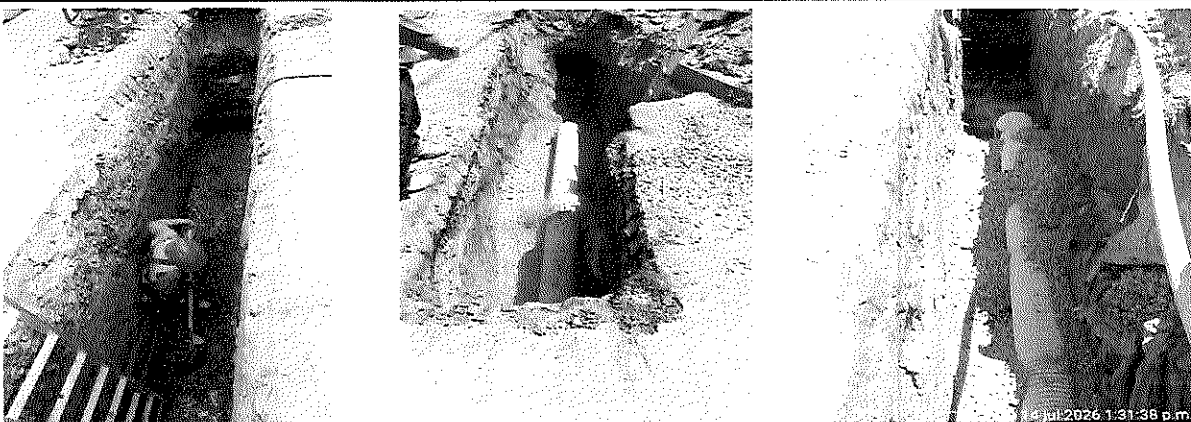
CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORCA CONECTA		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	649.10	
11.17	Retiro tubería de gas PE 80 hasta de 160 mm. Incluye taponamiento donde se requiera.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	649.10	
m												Saldo por Ejecutar	624.10	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	25.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/08/2026	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Retiro de tubería	Eje 2 vial - civita				25.00					25.00		
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												7	25.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 11.17														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

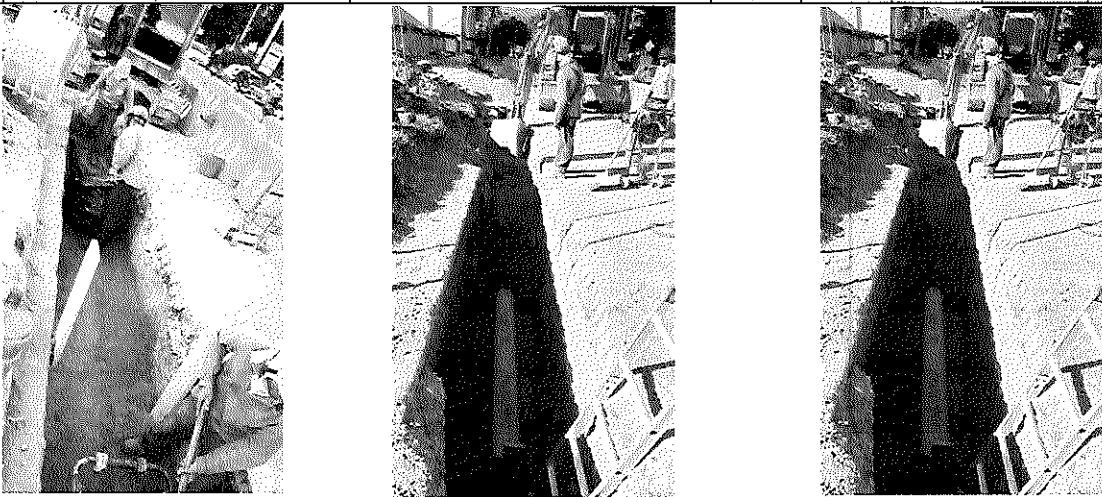
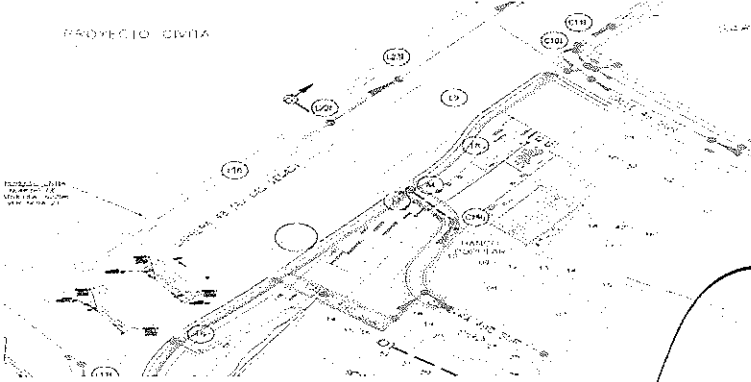

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	16.00
11.25	Lavado y deinfeccion de tubería de acueducto											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	16.00
hora												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	16.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad		Detalle			Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Lavado		N3 - N6			8.00				8.00		
7	10/08/2026	Lavado		N11 - N6			8.00				8.00		
  													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												7	16.00
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 11.25													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

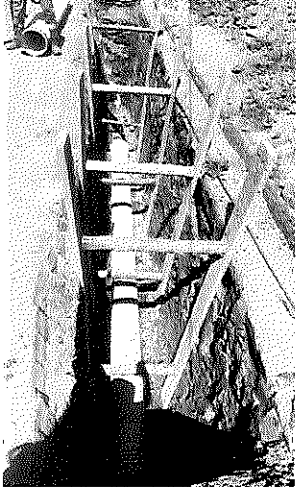
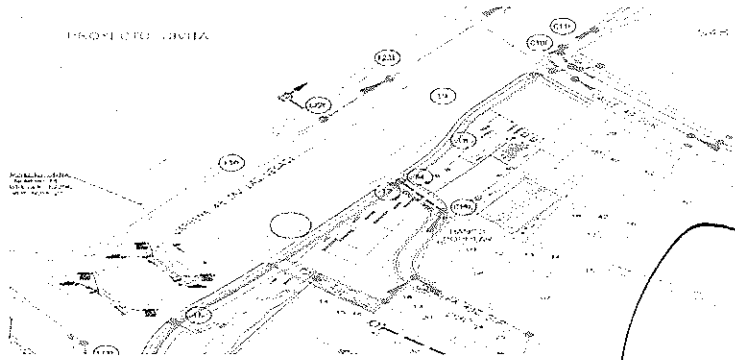

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	890.74
12.2												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Excavación material común húmedo < 2m mecánica. Retiro, cargue y botada de material											Cant. Total	890.74
m3												Saldo por Ejecutar	426.40
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	464.34
0.00	0.00	0.00	76.92	102.21	119.76	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Excavación L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 6-18.5		22.50	12.50	0.90	2.00	22.50				
7	10/08/2026	Excavación L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 18.5-24.5		15.60	6.50	1.20	2.00	15.60				
7	10/08/2026	Excavación L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 24.5-34		23.94	10.50	1.20	1.90	23.94				
7	10/08/2026	Excavación C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 13-19.5		26.57	7.30	1.82	2.00	26.57				
7	10/08/2026	Excavación L23E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 0-6		17.22	7.00	1.23	2.00	17.22				
7	10/08/2026	Excavación L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 12-18		15.40	7.00	1.10	2.00	15.40				
7	10/08/2026	Excavación L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 18-25		11.79	7.10	0.83	2.00	11.79				
7	10/08/2026	Excavación C10E-L9	Tubería Novafort 12" Abscisa 6.5-14		17.04	7.10	1.20	2.00	17.04				
7	10/08/2026	Excavación C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 0-6.5		15.40	7.00	1.10	2.00	15.40				
													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												7	165.46
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 12.2													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

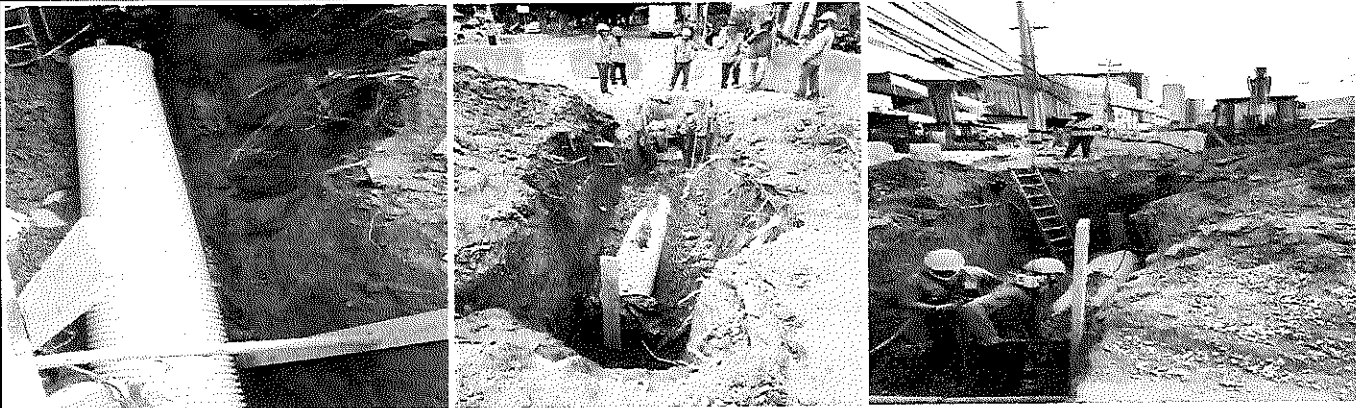
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	333.40
12.3												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Excavación mecánica material común húmedo 2 - 4 m. Retiro, cargue y botada de material											Cant. Total	333.40
m3												Saldo por Ejecutar	197.45
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	135.95
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 23.14	10/06/2026 55.39	10/07/2026 26.28	10/08/2026 31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Excavacion L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 6-18.5				1.35	12.50	0.90	0.12	1.35		
7	10/08/2026	Excavacion L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 18.5-24.5				0.31	6.50	1.20	0.04	0.31		
7	10/08/2026	Excavacion C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 13-19.5				12.89	7.30	1.82	0.97	12.89		
7	10/08/2026	Excavacion L23E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 0-6				1.81	7.00	1.23	0.21	1.81		
7	10/08/2026	Excavacion L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 12-18				3.93	7.00	1.10	0.51	3.93		
7	10/08/2026	Excavacion L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 18-25				2.95	7.10	0.83	0.50	2.95		
7	10/08/2026	Excavacion C10E-L9	Tubería Novafort 12" Abscisa 6.5-14				5.45	7.10	1.20	0.64	5.45		
7	10/08/2026	Excavacion C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 0-6.5				2.46	7.00	1.10	0.32	2.46		
													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												31.15	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 ítem 12.3													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

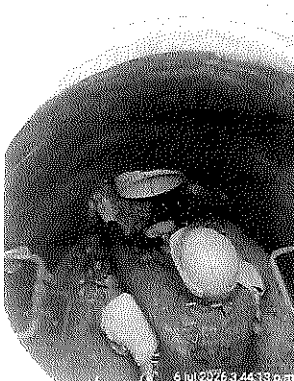

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2,521.00
12.4												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Entibados o trinchos en madera temporal											Cant. Total	2,521.00
m2												Saldo por Ejecutar	2,158.08
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	362.92
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026							
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Entibado Iluvias C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abcisa 13-19.5				6.00	0.60		2.97	10.69		
7	10/08/2026	Entibado Iluvias L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abcisa 12-18				6.00	0.30		2.51	4.52		
7	10/08/2026	Entibado Iluvias C10E-L9	Tubería Novafort 12" Abcisa 6.5-14				2.00	2.64		0.60	3.17		
7	10/08/2026	Entibado Iluvias C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abcisa 0-6.5				2.00	2.32		0.60	2.78		
7	10/08/2026	Entibado Iluvias C10E-L9	Tubería Novafort 24" NICH0 RED RESIDUAL 24"				8.00	0.60		2.60	12.48		
													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												7	33.64
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 12.4													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	183.00		
12.5												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Material granular con mezcla de arena y gravas para cimentación y relleno inicial de alcantarillas compactado al 98% del p.m.											Cant. Total	183.00		
m3												Saldo por Ejecutar	64.11		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	118.89		
0.00	0.00	0.00	0.00	30.21	63.66	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total							
7	10/08/2026	Relleno de triturado Acometidas red	R14-R13	0.88	3.40	0.90	0.30	0.88							
7	10/08/2026	Relleno de triturado L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 6-18.5	2.80	12.00	0.90	0.30	2.80							
7	10/08/2026	Relleno de triturado L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 18.5-24.5	1.94	6.00	1.20	0.30	1.94							
7	10/08/2026	Relleno de triturado L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 24.5-34	3.24	10.00	1.20	0.30	3.24							
7	10/08/2026	Relleno de triturado C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 13-19.5	4.61	6.50	1.82	0.47	4.61							
7	10/08/2026	Relleno de triturado L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 0-6	2.00	6.00	1.23	0.30	2.00							
7	10/08/2026	Relleno de triturado L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 12-18	1.76	6.00	1.10	0.30	1.76							
7	10/08/2026	Relleno de triturado L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 18-25	1.51	7.10	0.83	0.30	1.51							
7	10/08/2026	Triturado para Excavación C10E-L9	Tubería Novafort 12" Abscisa 6.5-14	3.67	6.50	1.20	0.50	3.67							
7	10/08/2026	Triturado para Excavación C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 0-6.5	2.63	6.50	1.10	0.50	2.63							
															
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												25.02			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 ítem 12.5															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	457.00	
12.6												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Lleno final de alcantarillas y apisonado zanjas y apiques en recebo, segun norma INVIAS, Art. 610, (CBR>10%). Incluye suministro, transporte interno y compactación con densidad seca igual o mayor al 95% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.											Cant. Total	457.00	
m3												Saldo por Ejecutar	315.99	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	141.01	
0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	64.39	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 6-18.5	4.42	12.00	0.90	0.45	4.42						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 18.5-24.5	3.02	6.00	1.20	0.45	3.02						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 24.5-34	5.04	10.00	1.20	0.45	5.04						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 13-19.5	6.39	6.50	1.82	0.62	6.39						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla L23E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 0-6	3.10	6.00	1.23	0.45	3.10						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 12-18	2.75	6.00	1.10	0.45	2.75						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 18-25	2.39	7.10	0.83	0.45	2.39						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla para Excavacion C10E-L9	Tubería Novafort 12" Abscisa 6.5-14	7.09	6.50	1.20	0.94	7.09						
7	10/08/2026	Relleno de arenilla para Excavacion C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 0-6.5	3.48	6.50	1.10	0.62	3.48						
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												37.69		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 12.6														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

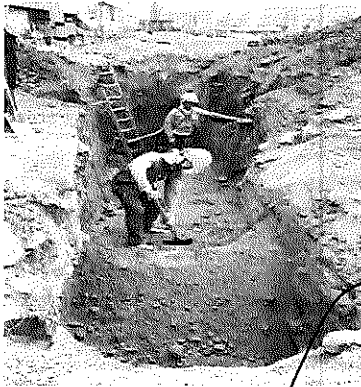
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.											DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN										Cant. Contractual	95.70	
12.7	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC Novafort S8 315mm 12" Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.										Cant. Adicional	33.90	
Unidad											Cant. Total	129.60	
m											Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	129.60
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 18.00	10/06/2026 34.00	10/07/2026 24.00	10/08/2026 53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Instalacion de tubería L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 6-18.5		1.00	12.00			12.00				
7	10/08/2026	Instalacion de tubería L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 18.5-24.5		1.00	6.00			6.00				
7	10/08/2026	Instalacion de tubería L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 24.5-34		1.00	10.00			10.00				
7	10/08/2026	Instalacion de tubería L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 0-6		1.00	6.00			6.00				
7	10/08/2026	Instalacion de tubería L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 12-18		1.00	6.00			6.00				
7	10/08/2026	Instalacion de tubería L23E-L22E	Tubería Novafort 12" Abscisa 18-25		1.00	7.10			7.10				
7	10/08/2026	Instalacion tubería residual CO1E-L9	Tubería Novafort 12" Abscisa 6.5-14		1.00	6.50			6.50				
 													
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.											7	53.60	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 12.7													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

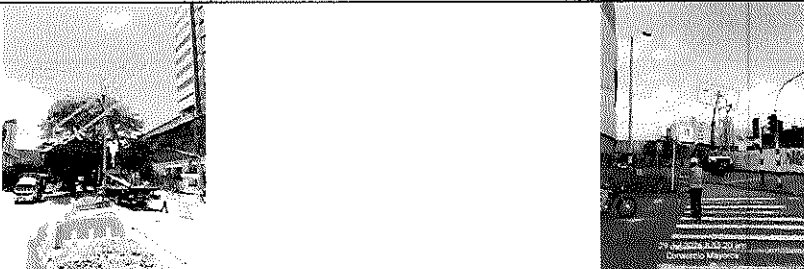
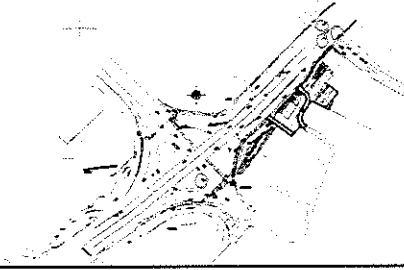
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	286.90	
12.10												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC Novafort S8 625mm 24" Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.											Cant. Total	286.90	
m												Saldo por Ejecutar	273.90	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	13.00	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10/08/2026 13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Instalacion tubería residual CO1E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 0-6.5	1.00	6.50			6.50						
7	10/08/2026	Instalacion tubería lluvias CO1E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 13-19.5	1.00	6.50			6.50						
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												13.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 12.10														
72. CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	35,00
12.17												Cant. Adicional	0,00
Unidad	Perforación y emboquillado de pared para camara de inspección											Cant. Total	35,00
un												Saldo por Ejecutar	30,00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	5,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10/09/2025 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Perforación y emboquillado par cámaras	CAMARAS L22E-L23E-L24E				5,00				5,00		
   													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												5,00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 12.17													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						




CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	3,071.00		
13.3												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Entibados o trinchos en madera temporal											Cant. Total	3,071.00		
m2												Saldo por Ejecutar	3,064.46		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	6.54		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total							
7	10/08/2026	Residual Entibado R15-R15A	Tubería Novafort 12" Abcisa 12 - 14	8.00	1.90		0.30	4.56							
7	10/08/2026	Residual Entibado R12-R13	Tubería Novafort 12" Abcisa 6 - 12	4.00	2.47		0.20	1.98							
												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.		6.54	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 13.3															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			



CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	137.00			
13.4	Material granular tipo base granular INVIAS para cimentación y relleno inicial de alcantarillas compactado al 98% del p.m. Incluye suministro, transporte, colocación y compactación.											Cant. Adicional	0.00			
Unidad												Cant. Total	137.00			
m3												Saldo por Ejecutar	14.32			
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	122.68			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico / Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 6	2.16	6.00	0.80	0.45	2.16								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 6 - 12	2.70	6.00	1.00	0.45	2.70								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 12 - 19.5	4.45	7.60	1.30	0.45	4.45								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R13-R14	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 8	2.88	8.00	0.80	0.45	2.88								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R13-R14	Tuberia Novafort 12" Abscisa 8 - 10	0.58	1.60	0.80	0.45	0.58								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 28 - 42	5.04	14.00	0.80	0.45	5.04								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 10 - 28	6.48	18.00	0.80	0.45	6.48								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 10	3.60	10.00	0.80	0.45	3.60								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R15-R15A	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 6	2.30	6.00	0.85	0.45	2.30								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R15-R15A	Tuberia Novafort 12" Abscisa 6 - 12	2.16	6.00	0.80	0.45	2.16								
6	10/07/2026	Lleno redes humedas R15-R15A	Tuberia Novafort 12" Abscisa 12 - 14	1.12	3.10	0.80	0.45	1.12								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 6	6.24	6.00	0.80	1.30	6.24								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 6 - 12	7.62	6.00	1.00	1.27	7.62								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 12 - 19.5	12.55	7.60	1.30	1.27	12.55								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R13-R14	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 8	8.00	8.00	0.80	1.25	8.00								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R13-R14	Tuberia Novafort 12" Abscisa 8 - 10	1.66	1.60	0.80	1.30	1.66								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 28 - 42	13.66	14.00	0.80	1.22	13.66								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 10 - 28	14.11	18.00	0.80	0.98	14.11								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 10	6.80	10.00	0.80	0.85	6.80								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R15-R15A	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 6	2.24	6.00	0.85	0.44	2.24								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R15-R15A	Tuberia Novafort 12" Abscisa 6 - 12	3.94	6.00	0.80	0.82	3.94								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R15-R15A	Tuberia Novafort 12" Abscisa 12 - 14	1.98	3.10	0.80	0.80	1.98								
7	10/08/2026	Lleno redes humedas Exo Acometidas	Tuberia Novafort 12" R14-R13	4.44	3.40	0.90	1.45	4.44								
7	10/08/2026	Lleno red de lluvias C10E-L9	Tuberia Novafort 12" Abscisa 6.5-14	3.12	6.50	1.20	0.40	3.12								
7	10/08/2026	Lleno red de lluvias C10E-L9	Tuberia Novafort 24" Abscisa 0-6.5	2.86	6.50	1.10	0.40	2.86								
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.													89.23			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 13.4																
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA													 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA			





		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	565.00
13.5												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Lleno final de alcantarillas y apisonado zanjas y apiques en recebo, según norma INVIAS, Art. 610, (CBR>10%). Incluye suministro, transporte interno y compactación con densidad seca igual o mayor al 95% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.											Cant. Total	565.00
m3												Saldo por Ejecutar	523.82
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	41.18
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 0.00	10/07/2026 39.82	10/08/2026 1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Lleno arenilla	Tubería Novafort 6" R14-R13				1.36	3.40	0.90	0.45	1.36		
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												1.36	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 ítem 13.5													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						





CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-4A-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	51.00		
14.1													Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Retiro y reintegro de luminarias propiedad de EPM												Cant. Total	51.00		
un													Saldo por Ejecutar	29.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	22.00			
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 4.00	10/06/2026 14.00	0.00	10/08/2026 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico /Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total					
7	10/08/2026	Retiro Luminarias	Retiro con brazo largo				3.00				3.00					
7	10/08/2026	Retiro Luminarias	Retiro con brazo largo				1.00				1.00					
																
																
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												4.00				
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.1																
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA																




CONTROL CANTIDADES DE OBRA														
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
 														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN														
DESUR-IA-168-2025														
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	35.00	
14.2												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Retiro y reintegro de postes propiedad de EPM, no incluye retiro de vestidas											Cant. Total	35.00	
un												Saldo por Ejecutar	28.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	7.00	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	0.00	0.00	10/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total					
7	10/08/2026	Retiro postes	Propiedad de eprn (1)		3.00				3.00					
														
														
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 item 14.2										TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7				3.00
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

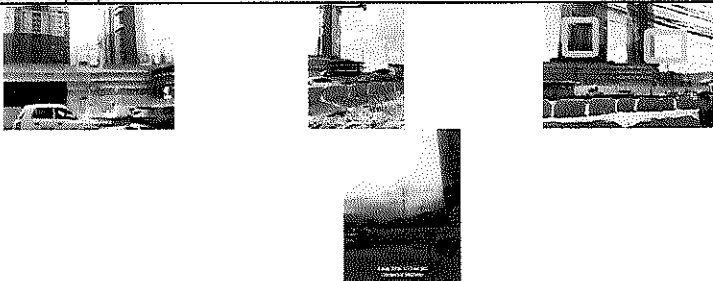

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,446.00		
14.4												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Excavación de material común húmedo < 2m manual. Retiro, cargue y botada de material											Cant. Total	1,446.00		
												Saldo por Ejecutar	1,203.11		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	242.90		
0.00	0.00	0.00		10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Total				
7	10/08/2026	Excavación de material	rotonda canalización desvío agua (1)				2.10	7.00	0.60	0.50	2.10				
7	10/08/2026	Excavación de material	Para traslado circuito R09-25 (2)				17.28	12.00	1.20	1.20	17.28				
7	10/08/2026	Excavación de material	Caja 2t (3)				17.14				17.14				
7	10/08/2026	Excavación de material	Comunicaciones eje 3, frente a panadería (4)				1.42	4.50	0.45	0.70	1.42				
 															
 															
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												37.93			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.4															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA									
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																							
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025											
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	100.00										
14.6	Lleno y apisonado zanjas y apiques con arenilla											Cant. Adicional	0.00										
Unidad																						Cant. Total	100.00
m3																						Saldo por Ejecutar	76.55
Cant. Acta Nro. 1												Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum
0.00	0.00	0.00	0.00	10/08/2026 1.04	10/07/2026 15.79	10/08/2026 6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Registro Fotográfico /Plano / Esquema																							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total												
7	10/0826	lleno	Tuberí 4" caja glorieta				1.10				1.10												
7	10/08/2026	lleno	Lleno eje 3 circulo R09-25				5.52				5.52												
																							
																							
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												6.62											
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.6																							
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA																

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	18.00
14.7	Atrake de tubería en concreto											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	18.00
m3												Saldo por Ejecutar	16.56
Cant. Acta Nro. 1												Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 0.00	10/07/2026 0.00	10/08/2026 1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant.	Largo	Ancho	Alto	Total	
7	10/08/2026	Atrake	Eje 3 canalización circuito R09-25					1.44				1.44	
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												1.44	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.7													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA						





CONTROL CANTIDADES DE OBRA														
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
  														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2,070.00	
14.10	Suministro y montaje canalización en tubería PVC de 6", para red de media tensión. Incluye brecha, tela peligro alta tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												mi	Cant. Total	2,070.00
													Saldo por Ejecutar	1,874.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	196.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Instalacion de tubo de 6 pulgadas	En el eje 3 y 11				55.00				55.00			
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												55.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.10														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA																					
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																					
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESur-IA-168-2025											
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8.00										
14.16	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-003 de EPM											Cant. Adicional	0.00										
Unidad																						Cant. Total	8.00
un																							Saldo por Ejecutar
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	6.00										
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 2.00	10/06/2026 1.00	0.00	10/08/2026 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Registro Fotográfico /Plano / Esquema																							
Acta Nro. 7	Fecha Corte 10/08/2026	Actividad Vestida primaria	Detalle Terminal				Cant 3.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 3.00												
																							
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.16												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7 3.00											
 CONSORCIO MAYORÍA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA																							


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	3.00		
14.17												Cant. Adicional	3.00		
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-304 de EPM											Cant. Total	6.00		
un												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	6.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Vestidas primaria	Referencia 13.2kv				3.00					3.00			
7	10/08/2026	Vestidas primaria	Referencia 44kv				3.00					3.00			
NOTA: La referencia de 44kv se pasa por norma RA2-305 de 13.2kv referencia, en mutuo acuerdo															
															
												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		6.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.17															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
		OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN										DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	5.00	
14.18	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-019 de EPM											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	5.00	
un												Saldo por Ejecutar	1.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	4.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico (Plano / Esquema)														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Instalacion cuchillas	Norma RA2-019				2.00					2.00		
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												2.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 item 14.18														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hemando Vera INTERVENTORIA							



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-166-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8.00	
14.22												Cant. Adicional	3.00	
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA6-010 de EPM											Cant. Total	11.00	
un												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	11.00	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	0.00	0.00	10/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Díámetro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Vestido Tierras	Tierra en poste				4.00					4.00		
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												4.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.22														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														




		CONTROL CANTIDADES DE OBRA													
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
		OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN										DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCION											Cant. Contractual	3.00		
14.23												Cant. Adicional	3.00		
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria: Viento convencional según norma RA6-001 para 44KV de EPM.											Cant. Total	6.00		
un												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	6.00		
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 0.00	10/06/2026 0.00	10/07/2026 0.00	10/08/2026 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro. 7	Fecha Corte 1008/2026	Actividad Instalacion de viento	Detalle viento Para 44kv				Cant 6.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 6.00				
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												6.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.23															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA								




		CONTROL CANTIDADES DE OBRA													
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCION											Cant. Contractual	6.00		
14.24												Cant. Adicional	9.00		
Unidad	Viento convencional según norma RA6-001 para 13.2KV											Cant. Total	15.00		
un												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	15.00		
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 9.00	10/06/2026 1.00	10/07/2026 1.00	10/08/2026 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro. 7	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
7		Viento	Suministro viento convencional 13.2kv				4.00					4.00			
															
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.24												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		4.00	
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

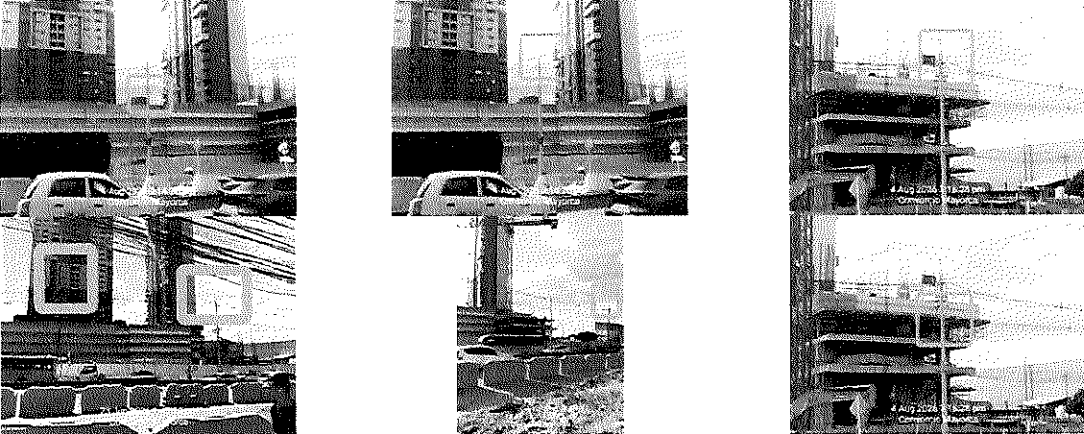

CONTROL CANTIDADES DE OBRA														
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO														
DESUR														
CONSORCIO MAYORCA CONECTA														
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN														
DESUR-IA-166-2025														
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	6.00	
14.25												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Viento Farol según norma RAS-002 para 13.2KV de EPM											Cant. Total	6.00	
un												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	6.00	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 3.00	10/06/2026 1.00	0.00	10/08/2026 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Instalacion	Viento Farol				2.00					2.00		
  														
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.25												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		2.00
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00		
14.30												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Adecuación salida de circuito según norma RA2-019 de EPM											Cant. Total	1.00		
												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00		
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Instalación	cuchillas, emergencia				1.00					1.00			
 															
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.30												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		1.00	
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			




		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	60.00	
14.37												Cant. Adicional	244.00	
Unidad	Suministro, transporte y montaje línea primaria aérea trifásica 3No.266.8 ecológico+1/0 AWAC 6 4/0 ACSR											Cant. Total	304.00	
ml												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	304.00	
0.00	0.00	0.00	200.00	22.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Instalacion	Cruce de via cable 266.8 (1)				40.00				40.00			
7	10/08/2026	Instalacion	Tramo de cable 266.8 (2)				19.00				19.00			
7	10/08/2026	Instalacion	Tramo de cable 266.8 (3)				23.00				23.00			
   												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		82.00
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.37														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



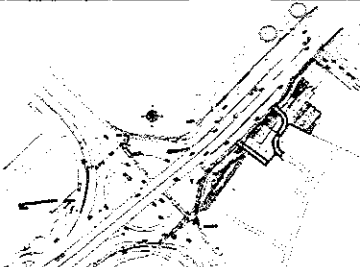
CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	40.00		
14.39												Cant. Adicional	30.88		
Unidad	Suministro, transporte y montaje cuadrilla línea viva en día festivo y/o no festivo											Cant. Total	70.88		
un												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	70.88		
0.00	0.00	0.00		10/06/2026	0.00	10/07/2026	39.38	10/08/2026	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle						hora	Largo	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Línea viva	Apoyo Suspensión del 26 línea viva						4.36				4.36		
7	10/08/2026	EPM	Instalación de cuchillas eje 11						1.61				1.61		
7	10/08/2026	EPM	Conexión mayorca eje 12						25.53				25.53		
 															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												31.50			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.39															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA								


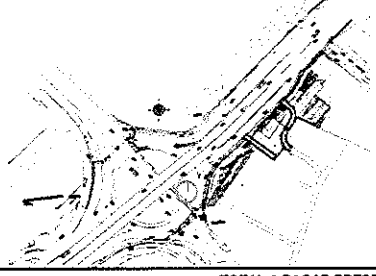
CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,180.00		
14.46												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Retiro (incluye reintegro) línea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv											Cant. Total	1,180.00		
ml												Saldo por Ejecutar	883.50		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	296.50		
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 30.00	10/06/2026 31.50	0.00	10/08/2026 235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro. 7	Fecha Corte 10/08/2026	Actividad Retiro línea primaria	Detalle retiro				Cant 235.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 235.00				
 															
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.46												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7		235.00	
															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			

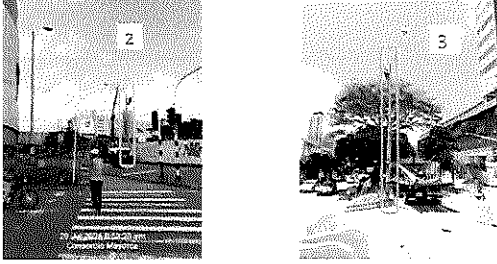
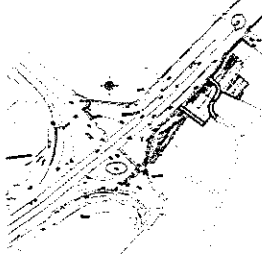
CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCION											Cant. Contractual	25.00		
14.47												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Retiro (incluye reintegro) vestidas primarias trifasicas 13.2 y/o 44Kv											Cant. Total	25.00		
ml												Saldo por Ejecutar	9.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	16.00		
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 5.00	10/05/2026 2.00	0.00	10/08/2026 9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Retiro de vestidas			13.2Kv y 44kv			9.00				9.00			
												0.00			
 															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												9.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.47															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

CONTROL CANTIDADES DE OBRA													
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
  													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN													
DESUR-IA-168-2025													
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	20.00
14.48												Cant. Adicional	2.00
Unidad	Retiro (incluye reintegro) de vientos primarios											Cant. Total	22.00
un												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	22.00
0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro. 7	Fecha Corte 10/08/2026	Actividad Retiro	Detalle Retiro viento					Cant 12.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 12.00	
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7													12.00
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.48													
													
													
CONTRATISTA							INTERVENTORIA						


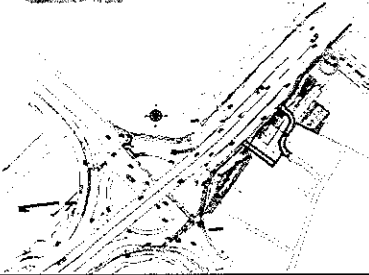


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-4A-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	70.00	
14.50												Cant. Adicional	449.00	
Unidad	Traslado línea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv											Cant. Total	519.00	
ml												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	519.00	
0.00	0.00	0.00	398.00	24.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Traslado de línea	13.2kv Y 44Kv				97.00					97.00		
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												97.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.50														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

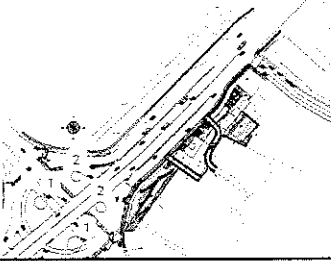




		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	4.00
14.51												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Traslado desconectores RA2-010 para 13.2 y/o 44KV, incluye conectores, mangueras y demás elementos para su correcto funcionamiento											Cant. Total	4.00
un												Saldo por Ejecutar	2.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10/08/2026 2.00	0.00	10/08/2026 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Traslado	Cuchillas y aisladero				2.00				2.00		
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												2.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 ítem 14.51													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2.00
14.53	Traslado Transformador trifásico según norma RA2-026 desde 30 hasta 75 KVA, incluye suministro de mangueras para el barraje primario y puesta a tierra nuevas.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	2.00
un												Saldo por Ejecutar	1.00
Cant. Acta Nro. 1												Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
7	10/08/2025	Traslado	Traslado trafó rotonda					1.00				1.00	
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												1.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.53													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	25.00		
14.57												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Retiro (incluye reintegro) postes de concreto de 12m y/o 14m											Cant. Total	25.00		
un												Saldo por Ejecutar	10.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	15.00		
0.00	0.00	0.00	10/05/2026 3.00	10/06/2026 9.00	10/07/2026 1.00	10/08/2026 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Retiro poste	poste en el eje11 (2)				1.00				1.00				
7	10/08/2026	Retiro de postes	poste en el eje 9 (3)				1.00				1.00				
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												2.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.57															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

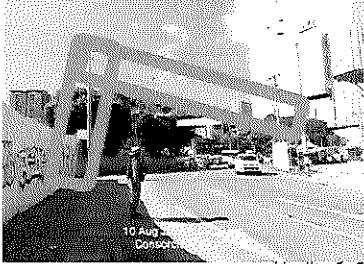
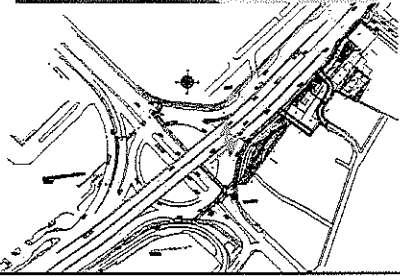

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-4A-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	26.00
14.66	Suministro, transporte y montaje poste en fibra de vidrio de 10m, 510 kgfr, según norma alumbrado público de EPM, incluye grua, hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	26.00
un												Saldo por Ejecutar	23.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10062026	2.00	0.00	10062026	1.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro. 7	Fecha Corte 10/08/2026	Actividad Instalacion	Detalle poste de fibra				Cant 1.00	Diametro	Ancho	Alto	Total 1.00		
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												1.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.66													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

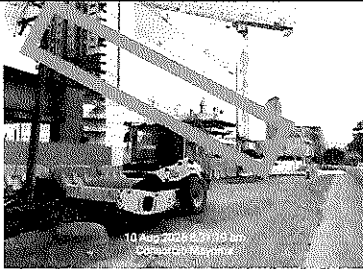

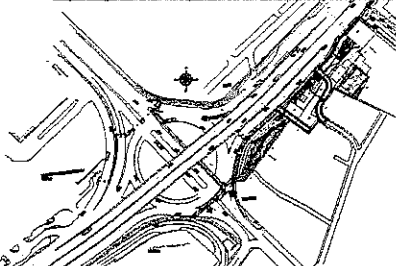

CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	1,510.00		
14.98	Suministro, transporte y montaje canalización en tubería PVC de 3", para telecomunicaciones TDP o DB. Incluye adaptadoras campana, y demás elementos para su correcto funcionamiento.												Cant. Adicional	0.00		
Unidad													Cant. Total	1,510.00		
mi													Saldo por Ejecutar	1,492.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	18.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/082026	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico /Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total					
7	10/06/2026	Tubo	3"				18.00					18.00				
 																
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												18.00				
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 14.98																
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA									

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA													
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual			
OEE4	Caja en bloque de concreto para acometidas y salida de circuitos a 13,2kv según Norma EPM NC-RS3-005 (Caja 2T) + Tapa sencilla en concreto en zona verde o andén. Norma técnica epm NC-RS4-001											Cant. Adicional	4.00		
Unidad												Cant. Total	4.00		
Unidad												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	4.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/08/2026	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
7	10/08/2026	Localización Caja electrica				Caja electrica de 13.2kv				4.00				4.00	
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7													4.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OEE4															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

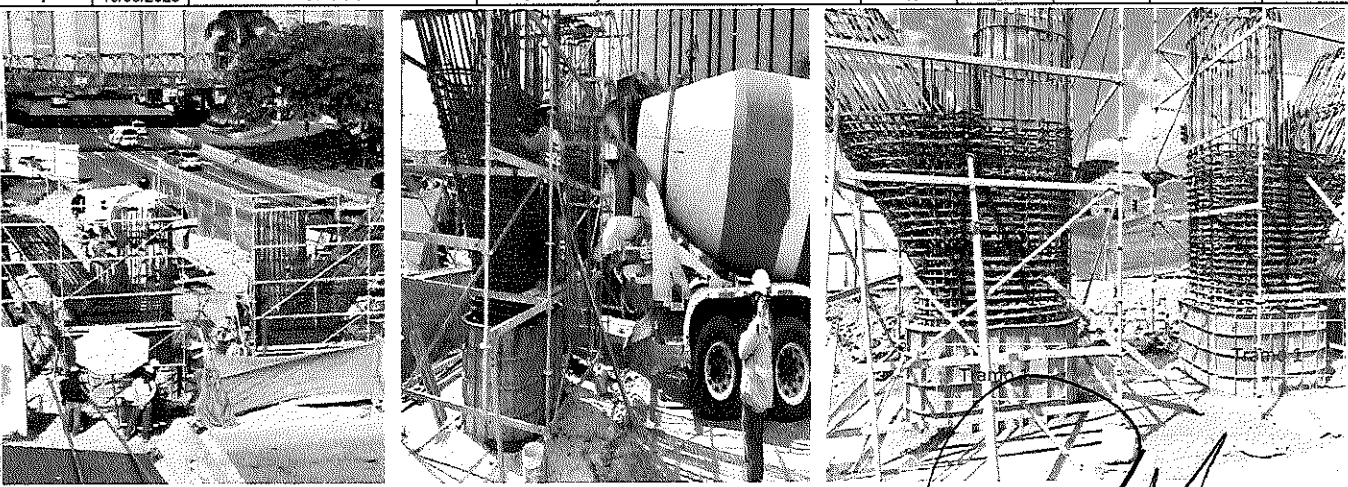

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	
OEE5												Cant. Adicional	6.00
Unidad	Servicio de inspección y localización de tuberías con cámara de video para alcantarillado											Cant. Total	6.00
hr												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	5.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Localizacion Caja electrica	Caja electrica de 13.2kv				6.00					6.00	
												0.00	
   													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												6.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OEE5													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

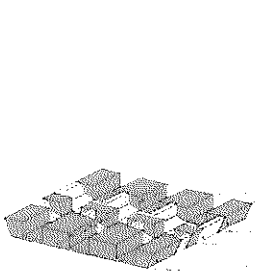
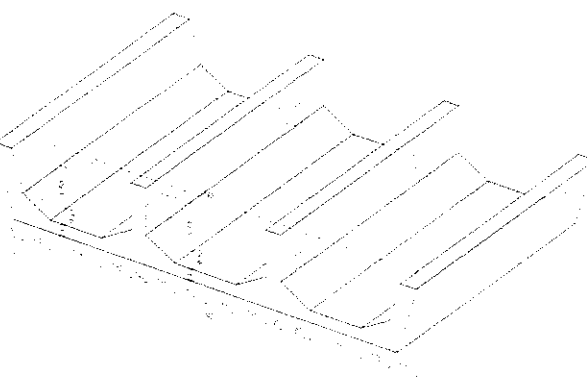
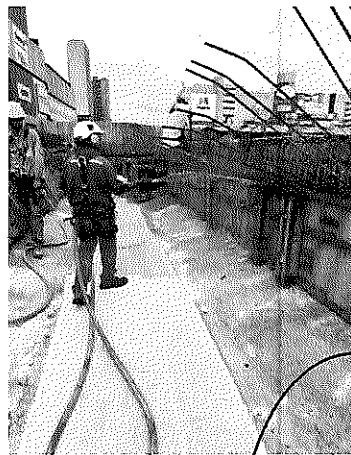
CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORCA CONECTA		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual		
OEE6												Cant. Adicional	13.00	
Unidad	Suministro, transporte e instalacion de reflectores Led 150W. Incluye reflector led y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento											Cant. Total	13.00	
Unidad												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	13.00	
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/05/2026	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Instalacion reflectores	Reflectores provisionales				13.00				13.00			
											0.00			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												13.00		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OEE6														
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

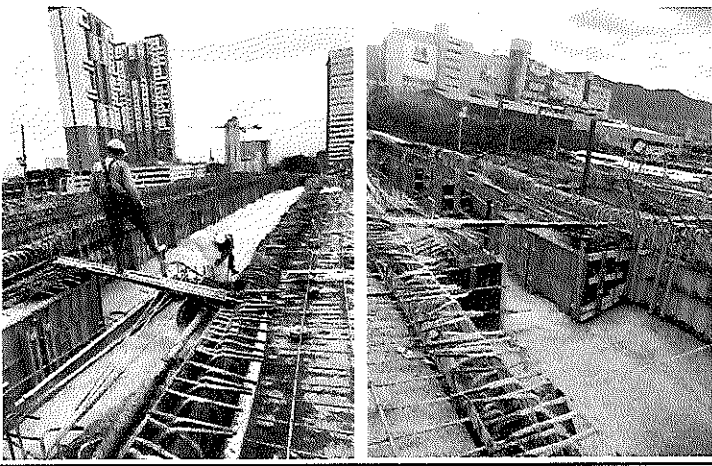
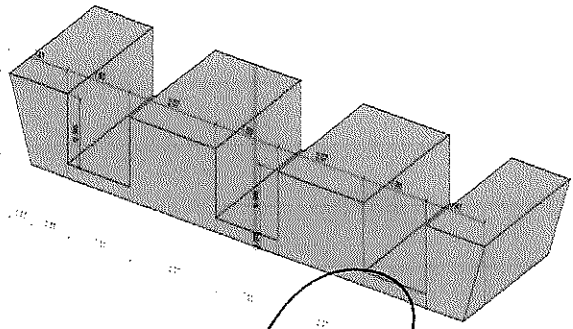


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	
OEE7	Suministro y transporte e instalacion de trenza cuadruplex AL 3N°2 + 1N° 4 ACRS 600V. Incluye percha canal, Aislador carrete y todos los elementos necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.											Cant. Adicional	15.00
Unidad												Cant. Total	15.00
ml												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	15.00
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Trenza	Trenza faltante x cobar provisional				15.00					15.00	
												0.00	
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												15.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OEE7													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

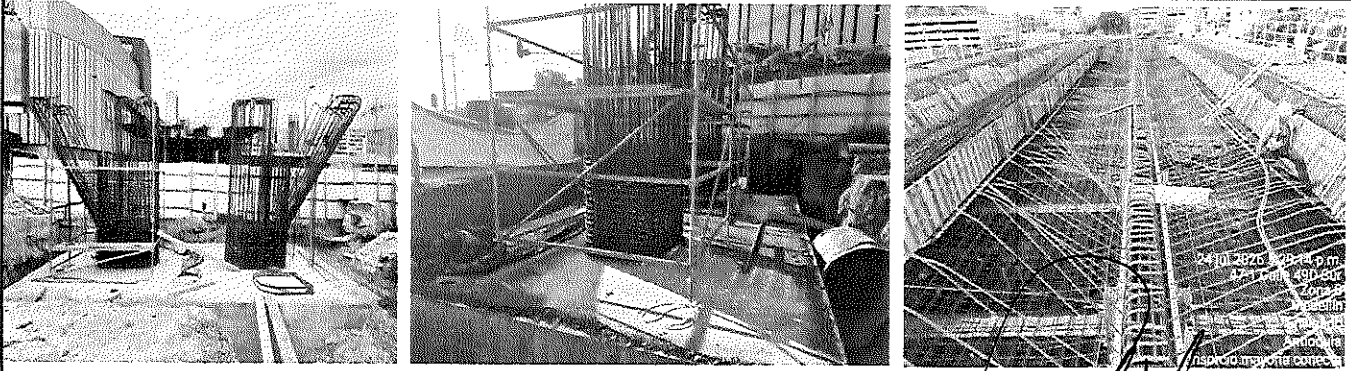


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	
OEE8	Suministro transporte e instalacion de cable encauchetado 3x12 para reflectores.											Cant. Adicional	100.00
Unidad												Cant. Total	100.00
ml												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	100.00
0.00	0.00	0.00	10/05/2026	10/06/2026	0.00	10/08/2026	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Encauchetado	Para instalacion de reflectores				100.00				100.00		
											0.00		
   													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												100.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OEE8													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													



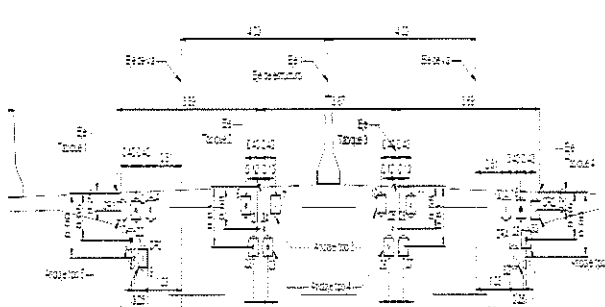

CONTROL CANTIDADES DE OBRA													DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	580.00		
15.4	Construcción de DADOS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.												Cant. Adicional	0.00		
Unidad													Cant. Total	580.00		
m3													Saldo por Ejecutar	220.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	360.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2026 180.00	10/07/2026 90.00	10/08/2026 90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Registro Fotográfico /Plano / Esquema																
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total					
7	10/08/2026	Concreto	Zapata - eje 5				90.0	10.0	6.0	1.5	90.0					
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7													90.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 15.4																
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA									



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	192.00	
15.6	Construcción de COLUMNAS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	192.00	
m3												Saldo por Ejecutar	65.00	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	127.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					10/07/2026	10/08/2026								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.38	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle			Cant	Area	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Concreto	Columna eje 2 - tramo 1 - Costado oriental			3.3	3.1		1.06	3.3				
7	10/08/2026	Concreto	Columna eje 2 - tramo 1 - Costado occidental			3.3	3.1		1.06	3.3				
7	10/08/2026	Concreto	Columna eje 2 - tramo 1 - Costado oriental			1.9	3.1		0.62	1.9				
7	10/08/2026	Concreto	Columna eje 2 - tramo 2 - Costado oriental			6.5	23.7		0.3	6.5				
7	10/08/2026	Concreto	Columna eje 2 - tramo 1 - Costado occidental			1.9	3.1		0.62	1.9				
7	10/08/2026	Concreto	Columna eje 2 - tramo 2 - Costado occidental			6.5	23.7		0.3	6.5				
7	10/08/2026	Concreto	Columna eje 2 - tramo 3 - Costado oriental			4.3	2.0		2.1	4.3				
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.													27.62	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 15.6														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,469.00		
15.7	Construcción de VIGAS TIPO CAJÓN en concreto de 5000 psi. Incluye la colocación de concreto para vigas tipo cajón (incluye tabique interior, tabique exterior, losa inferior y losa superior). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección, curado y obra falsa para puente en cruce de vías principales, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. Acabado a la vista, bordes biselados.											Cant. Adicional	0.00		
Unidad												Cant. Total	1,469.00		
m3												Saldo por Ejecutar	1,207.27		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	261.73		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Concreto	Viga cajon luz 3 - 4				261.73				261.73				
    															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												7	261.73		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 15.7															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

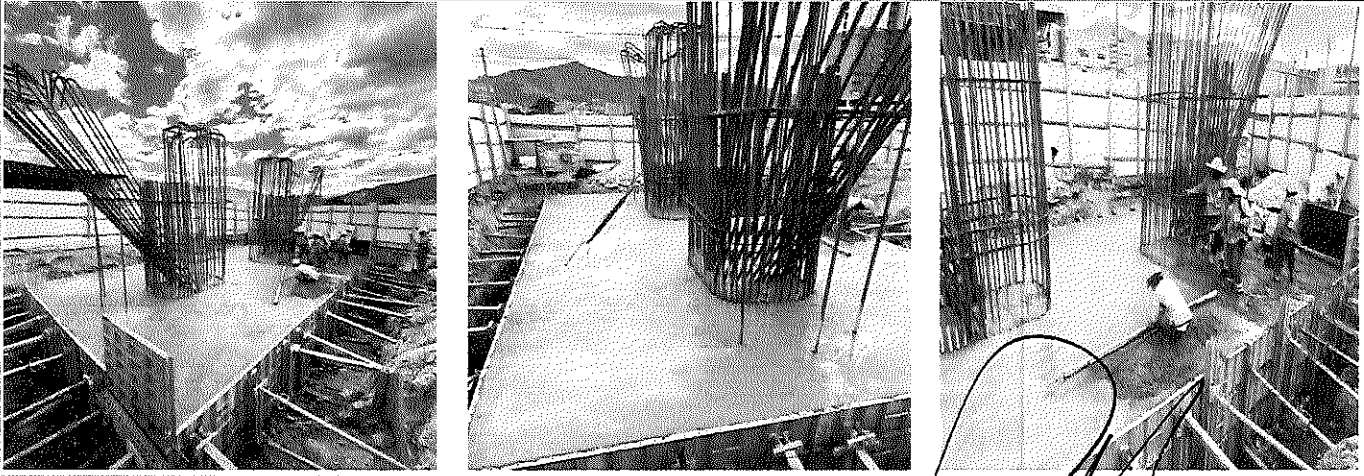
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	146.00
15.11	Construcción de DIAFRAGMAS en concreto de 5000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	146.00
m3												Saldo por Ejecutar	125.90
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	20.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Concreto	Diafragmas Viga cajon luz 3 - 4				20.10				20.10		
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7											20.10		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 15.11													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	861,540.00	
16.1	Acero de refuerzo de fy=60,000 psi. Suministro, transporte e instalación. Acero según especificaciones particulares y de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero pdr-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos (herramienta menor), transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. Incluye separadores que garanticen el recubrimiento mínimo especificado.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	861,540.00	
kg												Saldo por Ejecutar	589,715.54	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	271824.46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026								
0.00	6680.72	17410.19	36502.00	77962.00	48762.60	84506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
7	10/08/2026	Acero de refuerzo				Viga cajon luz 3-4-apoyo 5-apoyo 2				84506.95				84506.95
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.													84506.95	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 ítem 16.1														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	660,240.00
17.1	Postensionamiento para superestructura fu=1860 MPa ASTM A -416 GR 270 baja relajación. Incluye el suministro, transporte e instalación de: cables de 5/8" de diámetro, anclajes, inyección de lechada, ductos metálicos galvanizados con uniones y transiciones, bloques, guías, cuñas, servicio de tensionamiento con gato multitorón y para inyección, con equipos y operarios y transporte interno. Anclajes de acuerdo con los planos.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	660,240.00
Ton.m												Saldo por Ejecutar	629,040.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	31200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/08/2026	31200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Instalación de Torón	Seccion E-E hasta K-K - luz 3 - 4				31200				31200		
  SECCIÓN E-E  SECCIÓN K-K 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												31200.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item 17.1													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

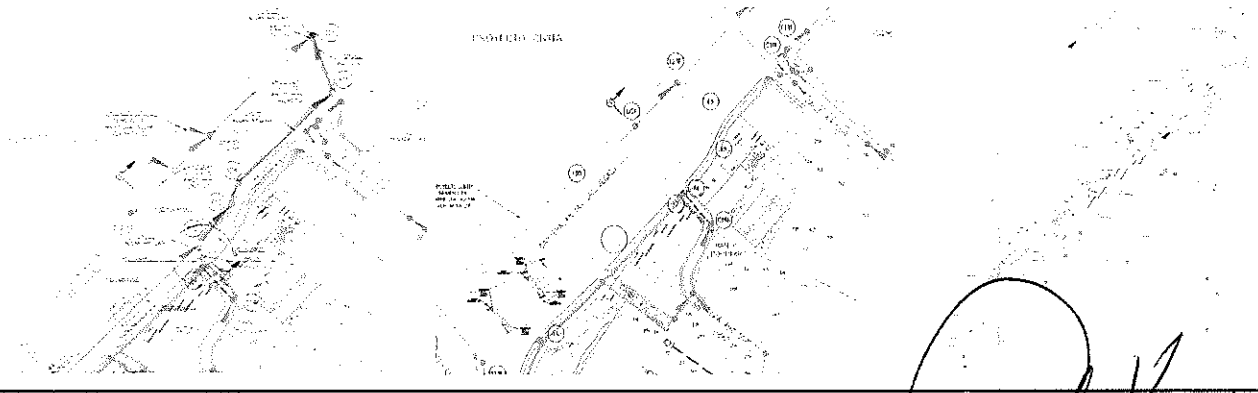
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
OE1												Cant. Adicional	636.15
Unidad	Suministro, transporte e instalación de piedra Rajón											Cant. Total	636.15
m3												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	636.15
		10/04/2026		10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026							
0.00	0.00	155.00	0.00	96.44	91.84	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle			Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
7	10/08/2026	Lleno	Eje 3 vial			95.46				95.46			
7	10/08/2026	Lleno	Eje 2 vial			197.41				197.41			
													
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7 292.87							
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OE1													
													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA						CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA							

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORÍA CONECTA	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
OE7	Suministro, transporte e instalación de Apoyo elastomérico en neopreno reforzado dureza 60 para apoyo superestructura Dim 0,90x0,90x0,10 m. reforzado con 3 planitas de (3mm) 1/8" en acero A36, o equivalente, de acuerdo con los planos y especificaciones del fabricante.											Cant. Adicional	8.00
Unidad												Cant. Total	8.00
Und												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	8.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/07/2026 4.00	10/08/2026 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/07/2026	Neopreno	Columna eje 3				4.00	0.90	0.90	0.10	4.00		
 14 jul 2026 7:56:51 p.m. 128 Calle 50 Sur Sabaneta Antioquia consorcio mayoría conecta  14 jul 2026 8:29:05 p.m. 23 Calle de Las Castas Sabaneta Antioquia consorcio mayoría conecta													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												7	4.00
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OE7													
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													





		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00	
OE12												Cant. Adicional	341.53	
Unidad	Adiciones para manejo de concreto masivo.											Cant. Total	341.53	
m3												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	341.53
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00		0.00	0.00	180.00	90.00	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total
7	10/08/2026	Adicion				Zapata - eje 5				71.5	10.0	6.0	1.5	71.5
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.													71.53	
OBSERVACIONES: Se resta valor equivalente a termocupia. Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OE12														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

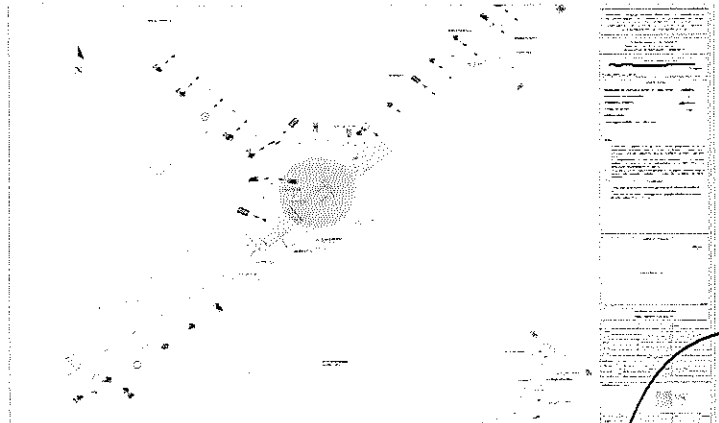


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00		
OE13	instalación de TecDren o equivalente, lámina drenante con alta resistencia a la compresión y a la acción de agentes químicos para la captación, conducción y evacuación de fluidos. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.											Cant. Adicional	451.50		
Unidad												Cant. Total	451.50		
m2												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	451.50		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/07/2026 257.88	10/08/2026 193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Tecdren	Eje 3 vial				47.25	45.00	1.05		47.25				
7	10/08/2026	Tecdren	Eje 2 vial				146.37	139.40	1.05		146.37				
												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.		193.62	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OE13															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00		
OE15	Demolición y desmantelamiento de vivienda existente, incluyendo cargue, transporte y disposición final de escombros											Cant. Adicional	3.00		
Unidad												Cant. Total	3.00		
und												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total							
7	10/08/2026	Desmantelamiento viviendas eje 3	Parqueadero de motos- Escuela conducción- Casa	3.00				3.00							
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												3.00			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OE15															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00		
OE16	Rellenos con material de fresado para brechas, incluye transporte, extendido, conformación y compactación. No incluye suministro de material.											Cant. Adicional	19.63		
Unidad												m3	Cant. Total	19.63	
												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	19.63		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 6		0.96	6.00	0.80	0.20	0.96						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 6 - 12		1.20	6.00	1.00	0.20	1.20						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R12-R13	Tuberia Novafort 12" Abscisa 12 - 19.5		2.34	6.00	1.30	0.30	2.34						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R13-R14	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 8		1.92	8.00	0.80	0.30	1.92						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R13-R14	Tuberia Novafort 12" Abscisa 8 - 10		0.26	1.60	0.80	0.20	0.26						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 28 - 42		3.36	14.00	0.80	0.30	3.36						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 10 - 28		4.32	18.00	0.80	0.30	4.32						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R14-R15	Tuberia Novafort 12" Abscisa 0 - 10		2.40	10.00	0.80	0.30	2.40						
7	10/08/2026	Lleno redes humedas R15-R15A	Tuberia Novafort 12" Abscisa 6 - 12		1.44	6.00	0.80	0.30	1.44						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias C10E-L9	Tuberia Novafort 24" Abscisa 0-6.5		1.43	6.50	1.10	0.20	1.43						
															
															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7												19.63			
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item OE16															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												CONSORCIO MAYORCA CONECTA		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00	
OE74												Cant. Adicional	347.15	
Unidad	Rellenos con material de excavación para brechas, incluye extendido, conformación y compactación.											Cant. Total	347.15	
m3												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	347.15	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N5-N6	16.85	30.50	0.85	0.65	16.85						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N6	4.27	3.30	1.00	0.58	4.27						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N3	2.88	2.80	1.00	0.40	2.88						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N5	0.70	1.14	1.00	0.50	0.70						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N6	1.59	5.20	1.02	0.30	1.59						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N4	5.85	2.50	1.40	1.45	5.85						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N5-N4	17.43	16.40	0.85	1.25	17.43						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N4-N3	37.20	30.00	0.80	1.55	37.20						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto N11-N9	15.68	28.00	0.80	0.70	15.68						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto Eje 3 Vial N9-N7	5.94	18.00	0.60	0.55	5.94						
7	10/08/2026	Llenos en limo	Tubería PEAD Acueducto Eje 3 Vial N8-N6	7.02	26.00	0.60	0.45	7.02						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 6-18.5	6.16	12.00	0.90	0.57	6.16						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 18.5-24.5	3.60	6.00	1.20	0.50	3.60						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L22E-L10	Tubería Novafort 12" Abscisa 24.5-34	4.20	10.00	1.20	0.35	4.20						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias C10E-L9	Tubería Novafort 24" Abscisa 13-19.5	10.41	6.50	1.82	0.88	10.41						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias C10E-L9	NICHO RED RESIDUAL 24"	20.49	4.00	2.60	1.97	20.49						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L7-L6	Tubería Novafort 12" Abscisa 24 - 30	3.05	6.00	1.45	0.35	3.05						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L7-L6	Tubería Novafort 12" Abscisa 30 - 36	2.52	6.00	1.20	0.35	2.52						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L7-L6	Tubería Novafort 12" Abscisa 36 - 42	2.64	6.00	1.10	0.40	2.64						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L7-L6	Tubería Novafort 12" Abscisa 42- 48	8.78	6.00	1.33	1.10	8.78						
7	10/08/2026	Relleno red lluvias L7-L6	Tubería Novafort 12" Abscisa 52-58	8.95	6.00	1.57	0.95	8.95						
7	10/08/2026	Lleno zapata	Apoyo 4	160.96				160.96						
														
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												347.15		
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 item OE74														
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA		

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
PMT 001	Elaboración del Plan de Manejo de Tránsito de cada una de las etapas constructivas del proyecto, incluye recopilación secundaria y primaria así como la coordinación con los resultados del estudio de tránsito.											Cant. Adicional	1.00
Unidad												Cant. Total	1.00
Und												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/07/2026	10/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Elaboración PMT	ETAPA 3A				1.00				1.00		
       Resolución 2026030715 2010-03-01 El presente documento tiene por objeto la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito de cada una de las etapas constructivas del proyecto, incluye recopilación secundaria y primaria así como la coordinación con los resultados del estudio de tránsito. La Junta de Secretaría de Inspección del Municipio de Envigado, en uso de sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 104, inciso 1, de la Ley 712 de 2002. CONSIDERANDO QUE El artículo segundo de la Constitución Política de Colombia establece que la función de la administración pública es garantizar el bienestar de la ciudadanía, lo que implica la prestación de servicios públicos de calidad. En consecuencia, se considera que la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito es una actividad esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía durante la ejecución de las obras. Los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 712 de 2002, en concordancia con el artículo 104, inciso 1, de la Ley 712 de 2002, exigen a la administración pública la elaboración de planes de manejo de tránsito para las obras de infraestructura vial. Por lo tanto, se declara que la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito es una actividad esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía durante la ejecución de las obras.													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												1.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 ítem PMT 001													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00	
PMT 002	Elaboración de los planos de señalización vial para el manejo de tránsito de la obra en cada una de sus etapas constructivas y correspondientes modificaciones.											Cant. Adicional	7.00	
Unidad												Cant. Total	7.00	
Und												Saldo por Ejecutar	0.00	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	7.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Elaboración planos		7.00				7.00						
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 7.00														
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item PMT 002														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA											
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	0.00
PMT 003A	Planeación semafórica de la hora de máxima demanda con base en los estudios y diseños.	Cant. Adicional	3.00
Unidad		Cant. Total	3.00
Und		Saldo por Ejecutar	0.00
		Cant. Ejecutada Acum	3.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico / Plano / Esquema									
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total	
7	10/08/2026	Planeación semafórica		3.00				3.00	

COORDINACION PLAN 60 SEG

PLAN PROPUESTO 2 43AX46SR V0



PLAN PROPUESTO 2 43AX50SR V1


Representar el conflicto

Schlotzhauer & Wauer


TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro/		3.00
---------------------------------------	--	------



 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA	 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA
---	---


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA											
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
ARQ01	Ejecución del monitoreo arqueológico permanente durante las actividades de descapote, excavación, movimiento de tierras y obras civiles asociadas al proyecto, conforme a los lineamientos del ICANH y el Programa de Arqueología Preventiva (PAP). No incluye entrega de informe final ni socialización.											Cant. Adicional	2.00
Unidad												Cant. Total	2.00
Mes												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total		
7	10/08/2026	Monitoreo arqueológico	Mes Julio				1.00				1.00		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												1.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas 20260810 Item ARQ01													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR1												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Ensayos de laboratorio (Ver anexo "Ens. Lab. + póliza")											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.93
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.07
0.00	0.00	0.010	0.0128	0.03	0.007	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alt	Total					
7	10/08/2026	Laboratorio	Actividades de Julio	0.019				0.0185					
				TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.				0.02					
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR2												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación Social (Ver anexo "Subanálisis AU")											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.86
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.14
		10/04/2026	10/05/2026	10/06/2025	10/07/2025	10/08/2025							
0.00	0.00	0.0774	0.0008	0.0059	0.05	0.0039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad		Detalle			Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
7	10/06/2026	Implementación actividades social		Actividades de Julio			0.004				0.0039		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.							7	0.00					
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA							 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA						

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA													
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00		
GR3	Implementación Plan de Manejo Ambiental (Ver anexo PMA)											Cant. Adicional	0.00		
Unidad												Cant. Total	1.00		
GL												Saldo por Ejecutar	0.85		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.15		
		10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026									
0.00	0.00	0.0867	0.0026	0.003	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico / Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
7	10/08/2026	Implementación Plan manejo ambiental	Actividades de Julio				0.01				0.01				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.															
0.01															
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas															
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00	
GR4	Implementación Plan de Manejo de Tránsito (Ver anexo PMT)											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	1.00	
GL												Saldo por Ejecutar	0.70	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.30	
0.00	0.00	0.0689	0.0408	0.095	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total						
7	10/08/2026	Implementación Plan manejo de tránsito	Actividades de Julio	0.05				0.05						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.								0.05						
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00	
GR5												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Implementación SST (Ver anexo "Subanálisis AU")											Cant. Total	1.00	
GL												Saldo por Ejecutar	0.76	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.24	
		10/04/2026	10/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	10/08/2026								
0.00	0.00	0.0316	0.0072	0.08	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
7	10/08/2026	Implementación SST				Actividades de junio				0.051				0.0511
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.										7				0.05
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

FECNA 10/03/2026

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	SALDO
Diseñalivos y Planes de divulgación a la Comunidad					\$ 681,841,840.00		\$ 3,020,847.00		\$ 18,565,377.00	\$ 424,130,463.00
Estandares de PMT (Nanderos)							-		-	
Logotipo		un	22.00	\$ 6,000,000.00	\$ 132,000,000.00		-	5.00	-	17.00
Logotipo		un	22.00	\$ 3,000,000.00	\$ 66,000,000.00	1.00	3,000,000.00	7.00	21,000,000.00	15.00
Ayudas Nanderos (uno por)		un	132.00	\$ 2,715,000.00	\$ 358,284,000.00	11.00	29,667,000.00	38.50	63,118,377.00	93.45
Bogotá de Arica		un	44.00	\$ 2,215,000.00	\$ 97,460,000.00	2.00	4,431,000.00	12.00	26,587,000.00	32.00
Sedatización y canalización del terreno					\$ -		-		-	
Suministro, transporte, instalación y desinstalación de señales reglamentarias, informativas o preventivas según PMT, estructura de soporte tubular y pedestal		und	80.00	\$ 306,000.00	\$ 24,480,000.00	10.00	3,060,000.00	43.00	13,048,200.00	37.00
Barricadas con señal		und	12.00	\$ 420,000.00	\$ 5,040,000.00		-	1.00	420,000.00	11.00
Maletines (2 50x1x0.5 m)		und	300.00	\$ 290,000.00	\$ 87,000,000.00		-	175.00	52,785,400.00	125.00
Cota de elevación (cota de 500 m)		und	100.00	\$ 38,000.00	\$ 3,800,000.00		-	4.00	147,600.00	96.00
Señalización bidireccional (Señales)		und	370.00	\$ 48,000.00	\$ 17,760,000.00		-	32.00	1,584,800.00	648.00
Pinta de pared y logotipo		und	20.00	\$ 55,000.00	\$ 1,100,000.00		-	5.00	275,000.00	15.00
Aplicación pintura acrílica con base agua o base solvente en la construcción de líneas de 0.40 m continua en Cables, zona peatonal, líneas de Pava, Líneas de Aterrizaje, Líneas autobloques, líneas logotipo, cuerdas, Agujas y otros, incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.		m	300.00	\$ 14,280.00	\$ 4,284,000.00		-	-	-	300.00
Aplicación de pintura acrílica con base agua o base solvente en la construcción de líneas de 0.12 m para líneas centrales, líneas de carril, líneas de borde de pavimento entre otros. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.		m	300.00	\$ 6,920.00	\$ 2,076,000.00		-	-	-	300.00
Aplicación de pintura acrílica con base agua o base solvente en la construcción de marcas viales para flechas direccionales, flechas de fin de carril, líneas, pases, triangulo cada 50 m, diamantes cada 50 m, entre otros. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.		m2	300.00	\$ 22,360.00	\$ 6,708,000.00		-	-	-	300.00
Suministro y colocación de Hios para desvío de tránsito		un	100.00	\$ 50,240.00	\$ 5,024,000.00		-	-	-	100.00
Reño y traslado de mobiliario semafórico, donde lo indique la interventoría		cruce	4.00	\$ 2,000,000.00	\$ 8,000,000.00		-	-	-	4.00
Permisos de cierre de vías.				\$ -	\$ 6,300,000.00		-	-	-	
Permisos para el cierre de vías en los momentos en que se requiere, ante la autoridad competente en los Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí.		un	18.00	\$ 350,000.00	\$ 6,300,000.00		-	5.00	1,740,000.00	13.00
TOTAL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO				\$	\$ 784,689,840.00		\$ 30,716,647.00		\$ 215,803,577.00	\$ 548,886,263.00


CONSORCIO MAYORCA CONECTA
David Eduardo Cardona Acevedo
CONTRATISTA

Santiago Zuluaga Ciro
CONSEJO METROPOLITANO ILA
Santiago Zuluaga
INTERVENTORIA

MEMORIA CÁLCULO		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 59 SUP. DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV/33-59-1413-24					
ACTIVIDADES					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
7	31/07/2026	Ayudantes bandereros	CONTROL TRANSITO DE OBRA PMT JUNIO Y EXTRAS PRIMER SEMESTRE	11 55	11 55
Registro Fotográfico /Soporte					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
7	31/07/2026	Brigada de señalización	DOS (02) MANTENIMIENTOS DE SEÑALES	2.00	2.00
Registro Fotográfico /Soporte					

Acta Nro.		Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
7		31/07/2026	Inspector PMT	Se anexa seguridad social	1.00	1.00

Registro Fotográfico / Soporte

enlace | **SuAporte** | **AUTOLICUACIÓN CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2026 06 01 08 42 04 AM | Tipo Planilla: C PLANILLA EMPLEADOS (EMPRESAS) | Numero Planilla: 854 98 752

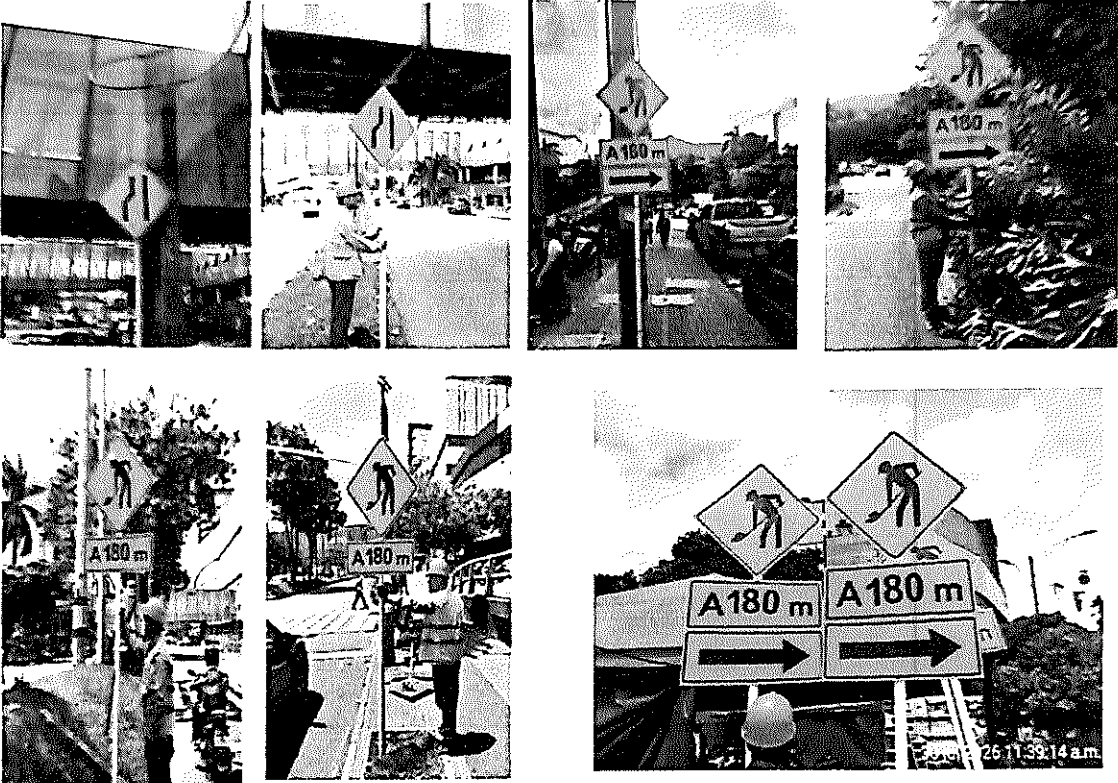


Periodo Cotización: Junio de 2026 | Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 17/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE	
Razon Social	CONSORCIO CONECTA MAYORCA
Documento	Nº901999695
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	MEDELLIN
Representante Legal	ANGEL MACHADO CAMILO
Total Afiliados	47

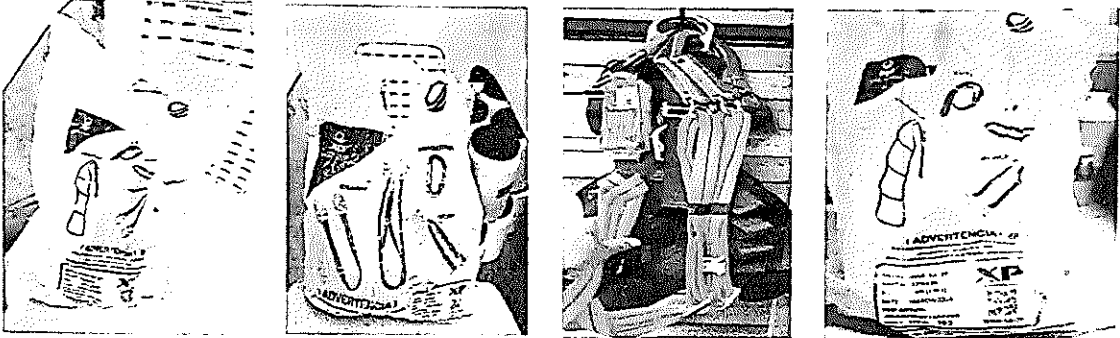
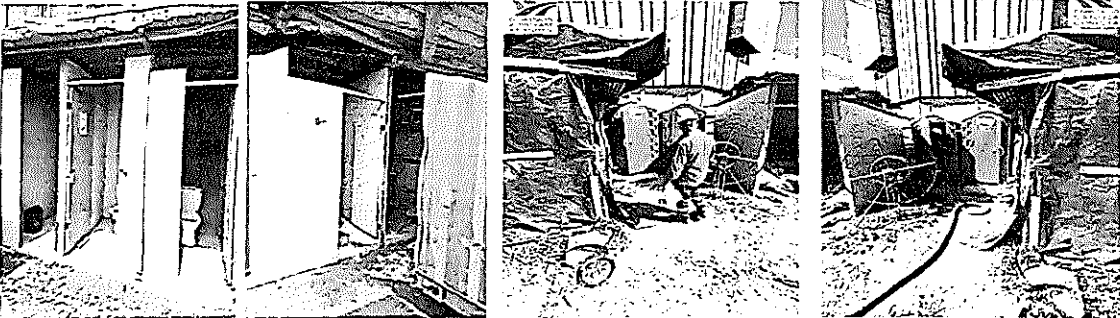


Direccion	CR 35A #15 B - 35 ED PRISMA OF410
Telefono	5044440568
Forma Presentación	UNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 8161089
ARP	SEGUROS BOLIVAR

Acta Nro.		Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
7		31/07/2026	Suministro, transporte, instalación y desinstalación de señales reglamentaria, informativas o preventivas según PMT, estructura de soporte tubular y pedestal.	PMT	10.00	10.00

	MEMORIA CÁLCULO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 3ª SUP. DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENVIGADO 1413.24	
	
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA David Eduardo Cardona Acevedo CONTRATISTA	 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Santiago Zuluaga INTERVENTORIA

CONSEJO MAYORISTA CONECTA
Carrera Nueva Piedad, R. Puerto
CONTRATISTA

Amplio Yungfong Karmay
Conservador General de Fulle
INTERVENCION

		MEMORIA CÁLCULO					
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO					
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.							
ACTIVIDADES							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total		
7	31/07/2026	ESLINGA DOBLE EN Y DE 90 CM CERTIFICADA Y CON ABSORVEDOR DE IMPACTO (30 unidades)	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DE 1.80 MTS (15 unidades)	45,00	45,00		
Registro Fotográfico /Soporte							
							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total		
7	31/07/2026	UNIDADES SANITARIAS PORTATILES	Se cobran 2 unidades portatiles del mes de mayo y 1 Unidad adicional por el mantenimiento de los baños construidos	3,00	3,00		
Registro Fotográfico /Soporte							
							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total		
Registro Fotográfico /Soporte							
OBSERVACIONES:							
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA German Alonso Ramirez Restrepo CONTRATISTA				 Amparo Yaneth Rammos Consorcio Metropolitano ILA 2025 INTERVENTORIA			

Implementación Social (Anexo Social)

FECHA 30/04/2018

Acción Social		Programa al cual pertenece en el PASO		COMPONENTE SOCIAL			ACTA 7			ACUMULADO		SALDO	
SOCIALIZACION				Detalle	Cant	Unid	Valor Unitario	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Valor Total
SOCIALIZACION	Programa de participación ciudadana			Reuniones con comunidad involucrada y fines obra. Incluye refrigerio,sbo de reunión,Refrero y medio audiovisual requerido. (100 Personas)	11,00	reunión	\$ 500,000	\$ 5,500,000		\$ -	1,00	\$ 500,000	\$ 5,000,000
				Reuniones y capacitaciones comitá ciudadano de obra. Esto incluye refrigerio, sbo de reunión, estufa y medio audiovisual requerido.	22,00	reunión	\$ 600,000	\$ 11,000,000	1	\$ 500,000	3,00	\$ 1,800,000	\$ 8,500,000
INFORMACION Y DIVULGACION				Volantes de obra, papel propalado, mote de 80 volantes, 100 volantes a costo total, refuellos, en tamaño medio carta	20,000,00	un	\$ 520	\$ 10,400,000		\$ -	502,00	\$ 261,040	\$ 10,138,960
INFORMACION Y DIVULGACION	Programa de información y comunicación a la comunidad			Según PORS	6,00	un	\$ 50,000	\$ 300,000		\$ -	2,00	\$ 100,000	\$ 200,000
				Publicación de información: madera o corte de 1 metro x80 cms	8,00	un	\$ 140,000	\$ 1,120,000		\$ -	1,00	\$ 140,000	\$ 980,000
				Perifoneos institucionales para volantes. (Da 2 x 1 mts)	24,00	un	\$ 50,000	\$ 1,200,000		\$ -	18,00	\$ 900,000	\$ 640,000
				Publicaciones impresas en periódicos en página por en tamaño cuarto de página a blanco y negro con el visto bueno del Área de Comunicaciones.	5,00	un	\$ 5,635,000	\$ 28,175,000		\$ -	0,00	\$ -	\$ 28,175,000
ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO				Actas de vecindad y clima (para de influencia directa y cuando se requiera realizar en el área de influencia edilicia). Incluye registro fotográfico, video, foto y digital.			\$ -	\$ 0,000,000		\$ -		\$ -	\$ 0,000,000
ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO	Programa institución de bienes alicuota				200,00	un	\$ 300,000	\$ 60,000,000		\$ -	45,00	\$ 13,500,000	\$ 46,500,000
EVENTO DE ENTREGA DE OBRA				Tarima 4x3 con cubierta, mesa central y sbo (6 personal), micrófono, alimentación, alif con intenciones, sondo bitácula (500 personas), ceta y sbo para dar apertura simbólica en la vía entre la plaza y la obra, incluye placa conmemorativa y pedestal para la placa conmemorativa			\$ -	\$ 0,000,000		\$ -		\$ -	\$ 0,000,000
EVENTO DE ENTREGA DE OBRA	Social				2,00	un	\$ 4,500,000	\$ 9,000,000		\$ -	0,00	\$ -	\$ 9,000,000
TOTAL COMPONENTE SOCIAL							\$ -	\$ 117,668,000,00		\$ 900,000		\$ 17,421,040,00	\$ 110,833,860,00



CONTRATISTA


CONSORCIO METROPOLITANO
INTERVENTORIA

		MEMORIA CÁLCULO		 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.					
ACTIVIDADES					
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
6	31/07/2026	Reuniones y capacitaciones comité ciudadano de obra. Esto incluye refrigerio, sitio de reunión, silletería y medio audiovisual requerido.	Reunion # 3 con el comité Ciudadano de obra	1,00	1,00
Registro Fotográfico /Soporte					
 jul 22, 2026, 14:07:33 Avenida Las Vegas 47-21 Envigado Antioquia Colombia Xiomara Contreras Prof. social		 jul 22, 2026, 16:26:34 Carrera 47-49A-6 Envigado Antioquia Colombia Xiomara Contreras Prof. social			



Xiomara Contreras Chavarria
 Contratista de obra
 Consorcio Mayorca Conecta



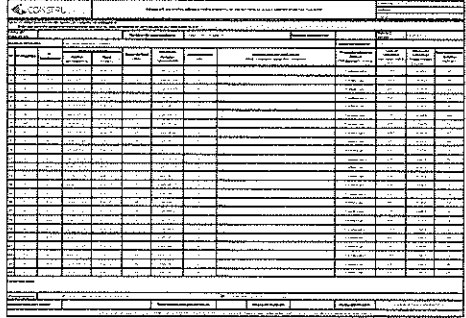



Verónica Athéortúa
 Interventoría
 Consorcio Metropolitano ILA 2025

[illegible]

J. SEBASTIAN GARIZALES A.
CONSORCIO MAYORCA CONECTA
CONTRATISTA

JUAN CAMILO PEREZ GONZALEZ,
INTERVENTORIA

		MEMORIA CÁLCULO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO					
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.							
ACTIVIDADES							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total		
7	10/08/2026	Resistencia a la compresión cilindros 4" (Ensayo Acreditado) ☐	Resistencia a la compresión cilindros 4"	99	99		
Registro Fotográfico /Soporte							
							
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total		
7	10/08/2026	Transporte (recolección de cilindros)	Transporte y recolección de cilindros para ensayo	3	3		
Registro Fotográfico /Soporte							
							
OBSERVACIONES:							
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA J. SEBASTIAN CAÑIZALES A. CONTRATISTA				 JUAN CAMILO PEREZ GONZALEZ INTERVENTORIA			

P.E. CHA 132912028

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE

CONSORCIO FORCA CONECTA

CONTRATISTA

CONSEJO METROPOLITANO LA 2025

INTERVENTORIA

	MEMORIA CÁLCULO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO  
---	--

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Total
7	5/08/2026	Protección de sumideros - instalación de malla de protección tipo polisombra (Incluye sumideros del corredor y bocacalles)		m2	70.00	70.00

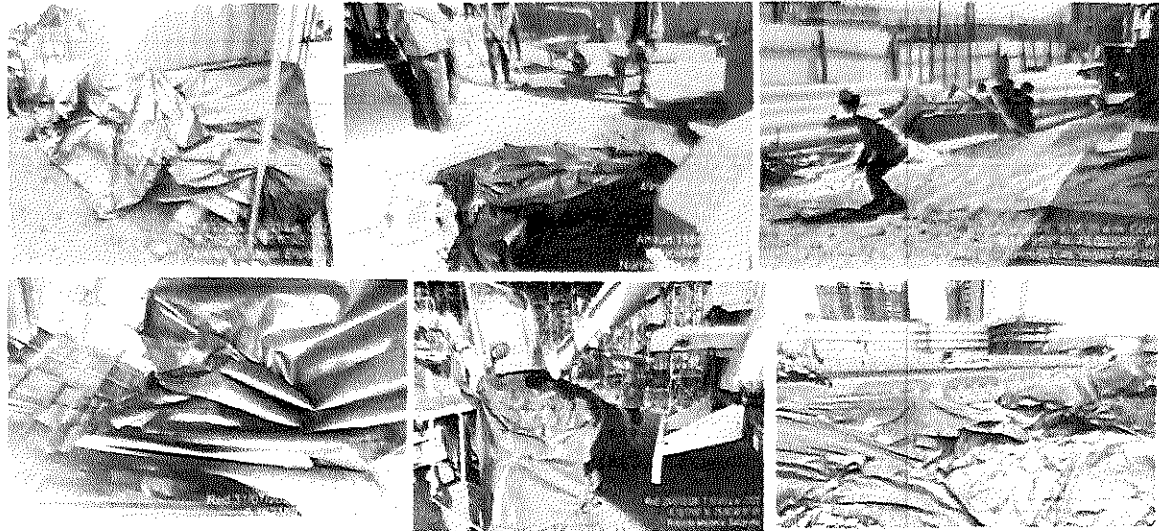
Registro Fotográfico /Soporte



Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Total
7	5/08/2026	Cubrimiento de escombros con plástico calibre 4. Se paga 1 sola vez		m2	400.00	400.00

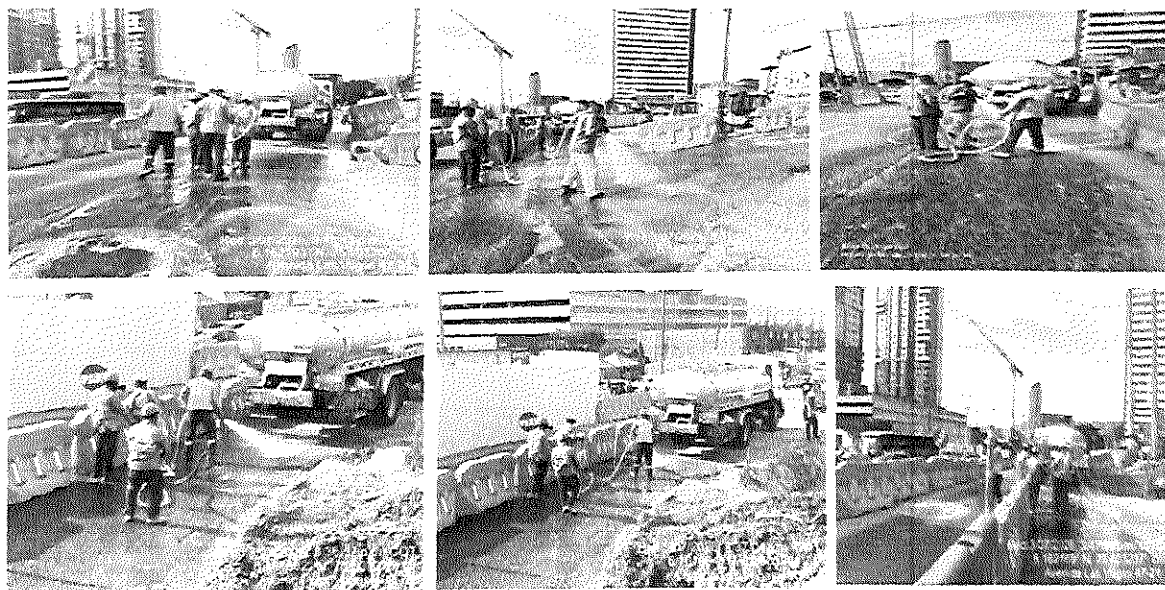
Registro Fotográfico /Soporte







Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Total
7	5/05/2025	Humectación vías, incluye camión tanque y conductor durante todo el tiempo de ejecución de la obra y las horas que la interventoria lo consideren necesario		m2	0.19	0.19

Registro Fotográfico / Soporte



OBSERVACIONES: Facturas


 CONSORCIO FUERZA CONECTA
 CONTRATISTA


 CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025
 INTERVENTORIA

**FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO identificada con C.C. 42.961.311 de Medellín y con Tarjeta Profesional No 9622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. identificada con Nit 811006928-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ABURRÁ SUR, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en el Municipio de Envigado a los tres (03) días del mes septiembre del año 2026.

Atentamente,



NOMBRE: MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO
CARGO: REVISOR FISCAL de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. en
nombre de FM CONASESORES S.A.S
C.C. 42.961.311 de Medellín
Tarjeta Profesional No 9622-T

Medellín, 02 de septiembre de 2026.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.


Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6, certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,



Daniel Flórez Osorio

Revisor fiscal

T.P. 237007-T

Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A




+57 604 266 6474
+57 301 208 5777



www.ochgroup.co



Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito revisor fiscal de **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, identificada con **NIT 900.240.169-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al personal vinculado y contratado por Servicios Profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la firma de dicha certificación, y a la fecha de este certificado se encuentra al día en sus pagos y respectivos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 3 días del mes de septiembre del 2026. —

JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C 98.578.337
T.P 106587-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A identificada con NIT 800.014.246-8, declaro bajo la gravedad de juramento, que la sociedad ha cumplido en los últimos meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Medellín Antioquia, a los tres (03) día de septiembre de 2026. /

Cordialmente,



Raúl A. Menco V.

Revisor fiscal designado por Auren Consultores Medellín
Tarjeta Profesional No. 66200-T
C.C. 19.872.348 de Magangué Bolívar



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal del **Consorcio Mayorca Conecta** identificado con nit 901.999.695 - 4, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089**, y el suscrito contador público, **CARLOS MARIO ALVAREZ CANO** identificado con cédula de ciudadanía **1.152.185.206**, certifican que el consorcio en mención se encuentra al día a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (3) tres días del mes de septiembre de 2026. ✓

Cordialmente,

Camilo Angel Machado.
Representante legal.
Consorcio Mayorca Conecta

Carlos Mario Alvarez Cano.
Contador Público.
T.P 207249 – T



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito revisor fiscal de **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, identificada con **NIT 900.240.169-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al personal vinculado y contratado por Servicios Profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la firma de dicha certificación, y a la fecha de este certificado se encuentra al día en sus pagos y respectivos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 3 días del mes de septiembre del 2026. ✓

JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C 98.578.337
T.P 106587-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A identificada con NIT 800.014.246-8, declaro bajo la gravedad de juramento, que la sociedad ha cumplido en los últimos meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Medellín Antioquia, a los tres (03) día de septiembre de 2026. —

Cordialmente,



Raúl A. Menco V.

Revisor fiscal designado por Auren Consultores Medellín
Tarjeta Profesional No. 66200-T
C.C. 19.872.348 de Magangué Bolívar

**FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO identificada con C.C. 42.961.311 de Medellín y con Tarjeta Profesional No 9622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. identificada con Nit 811006928-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ABURRÁ SUR, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en el Municipio de Envigado a los tres (03) días del mes septiembre del año 2026.

Atentamente,



NOMBRE: MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO
CARGO: REVISOR FISCAL de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. en
nombre de FM CONASESORES S.A.S
C.C. 42.961.311 de Medellín
Tarjeta Profesional No 9622-T

Medellín, 02 de septiembre de 2026. ✓

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.


Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6, certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,



Daniel Flórez Osorio
Revisor fiscal
T.P. 237007-T
Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A





CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscriptor representante legal del **Consorcio Mayorca Conecta** identificado con nit 901.999.695 - 4, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089**, y el suscrito contador público, **CARLOS MARIO ALVAREZ CANO** identificado con cédula de ciudadanía **1.152.185.206**, certifican que el consorcio en mención se encuentra al día a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (3) tres días del mes de septiembre de 2026. /

Cordialmente,

Camilo Angel Machado.
Representante legal.
Consorcio Mayorca Conecta

Carlos Mario Alvarez Cano.
Contador Público.
T.P 207249 – T

[illegible]

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC



III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 162.123.616	\$ 162.123.616	\$ 162.123.616	\$ 159.201.027	\$ 26.028.200	\$ 6.416.200	\$ 10.766.600	\$ 6.197.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.408.900	\$ 0	\$ 49.408.900

Certificación Bancaria

Señores


CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/07/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefania Niño Piza

 **Bancolombia**

Certificación Bancaria

Señores


CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/07/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefania Niño Piza

 **Bancolombia**



CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4
CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA
MEDELLÍN
TEL- 4440568
FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE16
Documento Ref.:
Código CIIU / Actividad Económica: 4210
Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	Fecha Documento :	9 - Sep - 2026
NIT:	901387801-2	Hora Documento:	15:44:48-05:00
Dirección:	CL 35 SUR 40 35 - Envigado - Antioquia	Fecha Vencimiento:	9 - Oct - 2026
Teléfono:	6044801300	Condición Pago:	Crédito
		Lugar de Pago:	MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANOGRADA	ACTA DE OBRA NO GRAVADA	1	144,691,203.00	3,144,691,203.00	

ACTA N7 CONTRATO DESur-IA-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN NDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24"

fs17



Sub Total: 3,144,691,203.00
Amortización: 972,104,163.00
IVA: 0.00
Retención: 0.00
Retención AMB: 25,157,529.62
Retención ICA: 2,147,429,510.38
Valor Total:

Firma Digital : 9fe5807650e692886d878259a1686fe5757598e8f6f1c7c68f4316b20e81535135a8e5375a6efe8a8e4702f94ff4c2ae
Cufe : 364762a23163968cb33f52c6fce06edd4f7fa666e17576ef21f765d8aad8131758c78ca8a883d809473291eb068642a6

SON : TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS Y CERO CENTAVO M/L

Documento Ref.: -
Esta Factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio
Resolución No. 18764100452377 Fecha:22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000

ELABORADO POR	APROBADO	FECHA RECIBIDO:
---------------	----------	-----------------
