



CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 40
Periodo: 01 al 31 de agosto 2026

AGOSTO DE 2026
SANTIAGO DE CALI

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	6
2. ASPECTOS TÉCNICOS	7
2.1. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	7
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.....	8
2.3. ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL.	8
2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. 9	
2.4.1. TOPOGRAFÍA	9
2.4.2. COMPONENTE TÉCNICO	12
2.4.2.1 TUBERÍA	12
.....	15
2.4.2.2. FRENTE GUACARÍ.....	15
2.4.2.3. BOCATOMA.....	15
2.4.2.4. DESARENADOR.....	15
2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL	15
2.6. REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES	17
2.7. COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	21
2.7.1. DESEMBOLSOS DEL ANTICIPO	21
2.7.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	21
2.7.3 FACTURACIÓN	22
2.8. PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO	23
2.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO- ÁREA TÉCNICA.....	25
3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	28
3.1. ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL.....	28
3.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	28
3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC	28
3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS	29
3.2.4. ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD.....	30
3.3. CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES	32
3.3.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.	

3.4. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO	34
3.5. REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS	35
3.6. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	36
3.7. COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL	37
3.8. COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL	38
4. PROGRAMA SST	39
4.1. OBJETIVOS	39
4.2. ALCANCE	39
4.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	39
4.4. RELACIÓN PERSONAL VINCULADO Y DESVINCULADO	40
4.5. RELACIÓN TOTAL PERSONAL EN EL PROYECTO	40
4.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	42
4.6.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	42
4.6.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	43
4.6.3. PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	43
4.6.4. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	43
4.6.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	44
4.6.6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	47
4.6.7. AUSENTISMO	48
4.6.8. PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS	48
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	49
5.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	49
5.2. PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES	49
5.3. PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL	52
5.3.1. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA ...	52
5.3.2. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA	53
5.3.3. PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE	53
5.3.4. PERMISO DE ROTURA DE VÍAS – MUNICIPIO DE GINEBRA	53
5.3.5. PERMISO ROTURA DE VÍAS – MUNICIPIO DE GUACARÍ	53
5.3.6. COMPENSACIÓN AMBIENTAL PTAP GINEBRA	54
5.4. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRENTE RCD	54

5.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	55
5.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	55
5.7. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES	56
5.8. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS	56
5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL	57
6. ANEXOS	59

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>ILUSTRACIÓN 1. Y 2. SEGUIMIENTO AL ASENTAMIENTO DEL TANQUE ALBANIA Y GINEBRA</i>	9
<i>ILUSTRACIÓN 3. CHEQUEO NIVELES FILTROS BATERÍA A</i>	10
<i>ILUSTRACIÓN 4. ACOMPAÑAMIENTO LABORES TRAMO 1</i>	10
<i>ILUSTRACIÓN 5. REFERENCIACIÓN INSTALACIÓN ACCESORIOS ABCISA K4+560</i>	11
<i>ILUSTRACIÓN 6. ILUSTRACIÓN 7. REFERENCIACIÓN INSTALACIÓN ACCESORIOS ABCISA K3+570</i>	11
<i>ILUSTRACIÓN 8. ACTIVIDADES INSTALACIÓN TUBERÍA TRAMO 1</i>	12
<i>ILUSTRACIÓN 9. CRUCE DE TUBERÍA AL COSTADO OPUESTO DE LA VÍA- TRAMO 1</i>	12
<i>ILUSTRACIÓN 10. CONSTRUCCIÓN PASE ABCISA K2+787</i>	13
<i>ILUSTRACIÓN 11. CONSTRUCCIÓN PASE ABCISA K2+902</i>	13
<i>ILUSTRACIÓN 12. REALIZACIÓN PRUEBAS HIDROSTÁTICAS- TRAMO 3</i>	14
<i>ILUSTRACIÓN 13. INSTALACIÓN UNIONES ELECTRO FUSIÓN</i>	14
<i>ILUSTRACIÓN 14. ANCLAJE DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO</i>	15
<i>ILUSTRACIÓN 15. VISITA DEL INSPECTOR RETIE A LA PTAP DE GUACARÍ</i>	17
<i>ILUSTRACIÓN 16 RECORRIDO DE OBRA</i>	18
<i>ILUSTRACIÓN 17. COMITÉ OBRA INSTALACIONES VALLECAUCANA DE AGUAS</i>	18
<i>ILUSTRACIÓN 18. COMITÉ VEEDURÍA – AGOSTO 2026</i>	19
<i>ILUSTRACIÓN 19. RECORRIDO COMPONENTE ELÉCTRICO CONTRATISTA E INTERVENTORÍA</i>	19
<i>ILUSTRACIÓN 20. RECORRIDO PARA VERIFICACIÓN CONEXIONES A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO</i>	20
<i>ILUSTRACIÓN 21. CUMPLIMIENTO COMPROMISO RECORRIDO E INASISTENCIA COMUNIDAD</i>	20
<i>ILUSTRACIÓN 22. OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD</i>	29
<i>ILUSTRACIÓN 23. BUZÓN DE SUGERENCIAS GUACARÍ Y GINEBRA</i>	30
<i>ILUSTRACIÓN 24. VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO EN LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA</i>	30
<i>ILUSTRACIÓN 25. CARTELERIA INFORMATIVA Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO EN LA PERSONERÍA DE GUACARÍ</i>	31
<i>ILUSTRACIÓN 26. VOLANTE INVITACIÓN COMITÉ VEEDURÍA</i>	31
<i>ILUSTRACIÓN 27 REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA GINEBRA Y GUACARÍ 20 DE AGOSTO -26</i>	33
<i>ILUSTRACIÓN 28. VOLANTE CONVOCATORIA RECORRIDO EN OBRA</i>	34
<i>ILUSTRACIÓN 29. REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO 12 DE AGOSTO 2026</i>	37
<i>ILUSTRACIÓN 30 CAPACITACIÓN TRABAJADORES TEMA LA ARQUITECTURA DE LA CONFIANZA -13 DE AGOSTO</i>	38
<i>ILUSTRACIÓN 31. PAUSAS ACTIVAS MES DE AGOSTO</i>	44

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. PÓLIZAS Y COBERTURAS	9
TABLA 2. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA – AGOSTO 2026	16
TABLA 3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA – AGOSTO 2026	16
TABLA 4. RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO.	21
TABLA 5. RESUMEN AMORTIZACIÓN ANTICIPO.	21
TABLA 6. ACTAS PARCIALES FACTURADAS	22
TABLA 7. ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL	28
TABLA 8. TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD	32
TABLA 9. TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO.	35
TABLA 10. CONSOLIDADO DE ACTAS DE VECINDAD.	35
TABLA 11. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO	36
TABLA 12. PERSONAL POR GENERO.....	36
TABLA 13. TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA ZONA	36
TABLA 14 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	39
TABLA 15 PERSONAL VINCULADO – AGOSTO 2026	40
TABLA 16. PERSONAL DESVINCULADO –AGOSTO 2026	40
TABLA 17. RELACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40
TABLA 18. RELACIÓN PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA.....	41
TABLA 19.. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.	42
TABLA 20.. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	44
TABLA 21.. PERMISOS CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	50
TABLA 22.. PERMISOS TERCERIZADOS CONSORCIO REDES Y PTAPS.....	51
TABLA 23.. NÚMERO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS POR ESPECIE A SEMBRAR	54

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933) M/CTE
Valor adición reformulación No.1:	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$2.571.146.616) M/CTE
Valor adición reformulación No.2:	TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$13.531.646.339) M/CTE
Valor total del Contrato:	CUARENTA Y CINCO MIL QUINIETOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$45.534.873.888) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S. P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación:	1 de enero de 2024
Plazo de ejecución del proyecto:	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Suspensión No.1:	Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023.
Prórroga No. 1 Suspensión No. 1:	Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023
Prórroga No. 2 Suspensión No. 1:	Un mes a partir del 27 de octubre de 2023
Prórroga No. 3 Suspensión No. 1:	Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de enero de 2024
Fecha de Terminación:	14 de junio de 2024
Adicional en Tiempo No. 1:	Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024
Adicional en Tiempo No. 2:	Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025
Adicional en Tiempo No. 3:	Seis (6) meses a partir del 22 de enero de 2026
Adicional en Tiempo No. 4:	Seis (6) meses a partir del 22 de julio de 2026
Nueva fecha de terminación:	22 de enero de 2027

INFORME CON CORTE A:

31 agosto de 2026

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en los municipios de Ginebra y Guacarí.

• GINEBRA:

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca (ver ilustración 1).

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 "Por medio de la cual se confirma la creación del Municipio de Ginebra" está definida de la siguiente manera.

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites con el Municipio de Guacarí.

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las coordenadas: 3°45'50" Latitud N 76°16.7'20" Longitud O.

• **GUACARÍ:** Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 2).

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 3°45'55" Latitud N 76°20'1" Longitud O.

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río Cauca.



2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento (captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

2.3. ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL.

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y actividades bajo las siguientes especificaciones.

- Cumplimiento del contrato.
- Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
- Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
- Estabilidad y calidad de la obra.
- Responsabilidad civil extracontractual.

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas modificaciones del contrato.

Tabla 1. Pólizas y coberturas

AMPARO	FECHA DE COBERTURA	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA	ANEXO
Cumplimiento	22/07/2026 - 22/07/2027	\$9.106.974.777,60	C-100050102	12
Buen manejo del anticipo	22/07/2026 - 22/07/2027	\$8.829.624.279,90	C-100050102	12
Prestaciones sociales	22/07/2026- 22/01/2030	\$2.276.743.694,40	C-100050102	12
Estabilidad de la obra	22/01/2026 - 22/01/2032	\$13.660.462.166,40	C-100050102	12
Responsabilidad civil extracontractual	31/10/2022 - 22/01/2027	\$2.276.743.694,40	C-100012551	11

2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

2.4.1. TOPOGRAFÍA

Durante el mes de agosto del 2026 la comisión de topografía ha realizado acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes de obras que se están realizando en el proyecto:

Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de la PTAP Ginebra y Tanque Albania:

- Se realiza seguimiento a la toma de cotas para evaluar el asentamiento de los tanques.

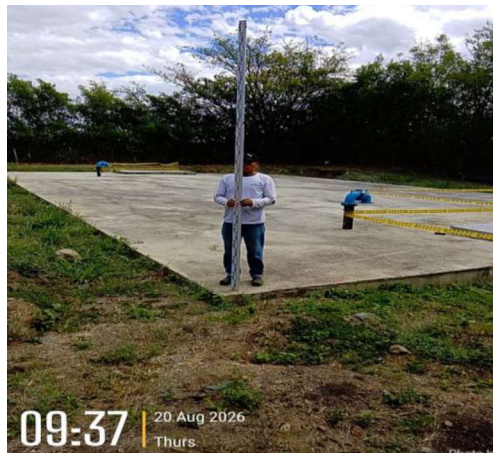


Ilustración 1. Y 2. Seguimiento al asentamiento del tanque Albania y Ginebra

Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí:

- Chequeo de medidas y niveles para la intervención de la batería A.



Ilustración 3. Chequeo niveles filtros batería A

Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 1):

- Acompañamiento en la instalación de tubería de 18" PEAD entre las abscisas K2+610 a ala K2+910 sector puente amarillo – sky blue, se verifican las profundidades de excavación, el colchón de arena, el recubrimiento del tubo y el material de lleno.
- Chequeo de niveles del pase ubicado en la abscisa k2+900

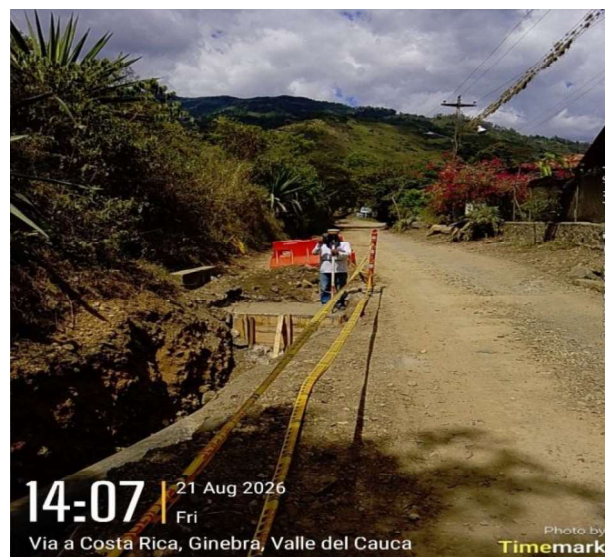


Ilustración 4. Acompañamiento labores tramo 1

Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 1):

- Referenciación de accesorio (unión electrofusión) abscisa K4+560

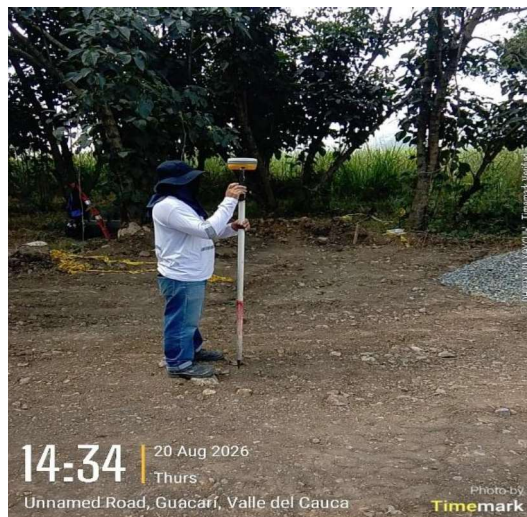


Ilustración 5. Referenciación instalación accesorios abscisa K4+560

- Referenciación de accesorio (unión electrofusión) abscisa K3+570



Ilustración 6. Ilustración 7. Referenciación instalación accesorios abscisa K3+570

2.4.2.COMPONENTE TÉCNICO

2.4.2.1 TUBERÍA

Tamo No.1 (Tubería de 18" PEAD")

- Se comienza con las actividades de excavación entre las abscisas K2+610 a la K2+910 sector puente amarillo – sky blue, se realiza instalación de material filtrante para poder instalar la tubería que previamente fue unida por medio termofusión, luego se procede al relleno y compactación.



Ilustración 8. Actividades instalación tubería Tramo 1

- Instalación de tubería y ejecución de cruce vial para el paso de la conducción hacia el costado opuesto de la vía.



Ilustración 9. Cruce de tubería al costado opuesto de la vía- Tramo 1

- Se realiza construcción de pase de tubería en concreto reforzado en la abscisa K2+787



Ilustración 10. Construcción pase abscisa K2+787

- Se realiza construcción de pase de tubería en concreto reforzado en la abscisa K2+902



Ilustración 11. Construcción pase abscisa K2+902

Tamo No.2 (Tubería de 10" PEAD")

- Las actividades se encuentran suspendidas sobre la vía pavimentada entre el callejón y Puente Rojo (sector El Alto), desde el 20 de enero de 2026 por solicitud de la comunidad.

Tamo No.3 (Tubería de 14" PEAD")

- Se realiza la adecuación de las zonas donde se realizaron las cámaras purgas, ventosas y cámaras de quiebre de presión
- Se realizan pruebas hidrostáticas en los tramos conformados por las siguientes abscisas:
 - K4 + 560 - K4 + 060 L= 500 ml
 - K2 + 560 – K3+ 060 L= 500 ml



Ilustración 12. Realización pruebas hidrostáticas- Tramo 3

- Posterior a la ejecución de las pruebas hidrostáticas, se realizó el empalme de la tubería mediante instalación de uniones electro fusión, en las siguientes abscisas:
 - K4 + 560
 - K3 + 570

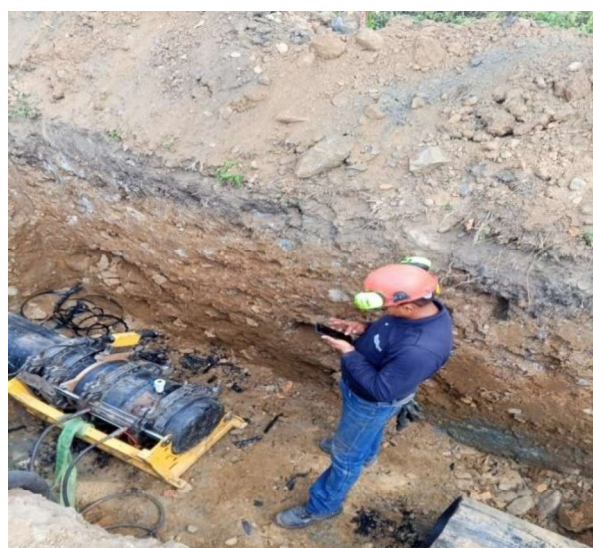


Ilustración 13. Instalación uniones electro fusión

- Se realiza la construcción de un anclaje en concreto reforzado en la abscisa K4+553



Ilustración 14. Anclaje de tubería en concreto reforzado

2.4.2.2. FRENTE GUACARÍ

- Se realiza nivelación de en la zona de ubicación de las canaletas metálicas en acero inoxidable filtro 1 batería A
- Se realiza limpieza de los falsos fondo
- Continúa en trámite la certificación RETIE de las actividades eléctricas

2.4.2.3. BOCATOMA

- Debido a que los diseños iniciales presentan una bocatoma tipo convencional que no cumple con algunos lineamientos constructivos, al momento se encuentra en evaluación el presupuesto de una bocatoma tipo coanda, de acuerdo con el nuevo diseño.

2.4.2.4. DESARENADOR

- Se encuentra en evaluación de acuerdo con el nuevo diseño de la bocatoma tipo coanda.

2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría:

- Informe mensual agosto 2026.

- Bitácoras de obra.
 - Bitácora de línea de conducción.
 - Bitácora de optimización planta Guacarí.
- Oficios:

Tabla 2. Control de correspondencia enviada – agosto 2026

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA				
 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
Consecutivo No.	ASUNTO	DESTINATARIO	FECHA	ELABORÓ
Cons299	NOTIFICACIÓN CAMBIO PROFESIONAL INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA	01 agosto de 2026	CMD
Cons300	ENTREGA DE POLIZAS ACTUALIZADAS	VALLECAUCANA	05 agosto de 2026	CMD
Cons301	RECORDATORIO DE NOTIFICACIÓN - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	ALCADIA DE GINEBRA	06 agosto de 2026	MCG
Cons302	SOLICITUD PLAZO PARA ENTREGA- REFORMULACIÓN No.3	INTERVENTORIA	10 agosto de 2026	CMD
Cons303	RESPUESTA AL OFICIO No. CI-162-2026 – SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN TÉCNICA	INTERVENTORIA	11 agosto de 2026	JC
Cons303A	REMISIÓN DE APUS PARA APROBACIÓN – TRAMO 1 DEL PROYECTO	INTERVENTORIA	21 agosto de 2026	JC
Cons304	CONVOCATORIA REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA	COMITÉ VEEDURÍA GINEBRA	13 agosto de 2026	MFM
Cons305	CONVOCATORIA REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA	SECRETARIA PLANEACIÓN GUACARÍ	13 agosto de 2026	MFM
Cons306	CONVOCATORIA REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA	PLANEACIÓN GINEBRA	13 agosto de 2026	MFM
Cons307	CONVOCATORIA REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA	COMITÉ VEEDURÍA GUACARÍ	13 agosto de 2026	MFM
Cons308	PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL OFICIO CI-167-2026 DEL 30 DE JULIO DEL 2026	INTERVENTORIA	21 agosto de 2026	WM
Cons309	ENTREGA DE INFORME #39	INTERVENTORIA	21 agosto de 2026	CMD
Cons310	SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA	JIMMY SINISTERRA	25 agosto de 2026	MFM
Cons311	ENVÍOIN FORMACIÓN OFICIO No. CI-162-2026	INTERVENTORIA	25 agosto de 2026	JC
Cons312	HOJAS DE VIDA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA	26 agosto de 2026	CMD
Cons313	INVITACIÓN A REUNIÓN	LUIS HUMBERTO VASQUEZ	28 agosto de 2026	CMD
Cons314	CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES TRAMO 1	INTERVENTORIA	31 agosto de 2026	JC
Cons315	TRAZABILIDAD DE GESTIONES ADELANTADAS ANTE LAS ALCALDÍAS DE GINEBRA Y GUACARÍ	MOISES CEPEDA	31 agosto de 2026	JC
Cons316	CONSTANCIA DE CONVOCATORIAS E INASISTENCIA DE LA COMUNIDAD	INTERVENTORIA	31 agosto de 2026	JC

Tabla 3. Control de correspondencia recibida – agosto 2026

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
Consecutivo No.	ASUNTO	REMITENTE	FECHA	No. DOCUMENTO
Rec-015	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA - REFORMULACIÓN #3	CONSORCIO INTERGUACARÍ	2/08/2026	CI-171-2026
Rec-016	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE OBRA	CONSORCIO INTERGUACARÍ	2/8/2026	CI-171-2026
Rec-017	RESPUESTA A SU OFICIO No. CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Con303-2026	CONSORCIO INTERGUACARÍ	25/8/2026	CI-174-2026
Rec-018	RESPUESTA A SU OFICIO No. CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Con302-2026	CONSORCIO INTERGUACARÍ	25/8/2026	CI-176-2026
Rec-019	RESPUESTA A SU OFICIO No. CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Con308-2026	CONSORCIO INTERGUACARÍ	25/8/2026	CI-177-2026

2.6. REUNIONES, RECORRIDOS Y VISIDAS DE OBRA CON ENTIDADES

Durante el mes de agosto de 2026 se realizaron las siguientes reuniones:

03 de agosto del 2026:

Se llevó a cabo la segunda visita del Inspector RETIE a la PTAP de Guacarí, en el marco del proceso de certificación. Durante la visita se realizó la verificación de las No Conformidades (NC) identificadas como resultado de la primera inspección. Como resultado de esta visita, se evidenció el cumplimiento de los requisitos establecidos y se logró el cierre de la totalidad de las No Conformidades reportadas.

Actualmente, se encuentra pendiente la recepción del Dictamen de Certificación Plena RETIE, con el fin de continuar con el proceso ante el Operador de Red (OR) Celsia.

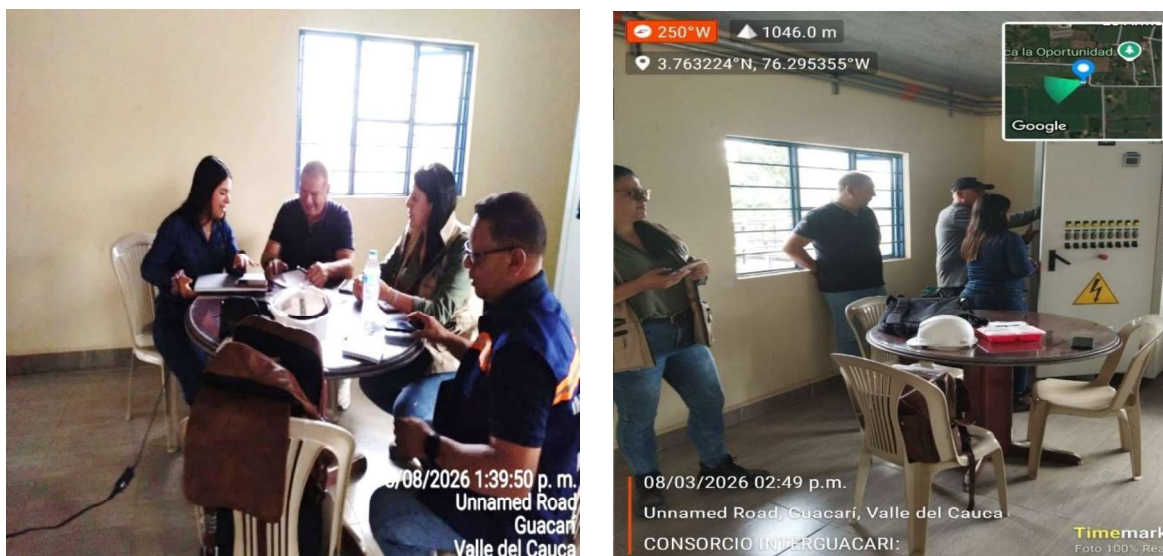


Ilustración 15. visita del Inspector RETIE a la PTAP de Guacarí

11 de agosto del 2026: Debido al terremoto que se presentó en todo el territorio nacional el día 10 de agosto de 2026, se programó con interventoría realizar recorrido de obra para revisar las estructuras que el consorcio ha construido, como son, los tanques de almacenamiento y casetas eléctricas.

Se evidencia que no se presenta ninguna afectación a las estructuras, en el tanque de la Albania se evidencia desplazamiento de tierra sin ocasionar afectaciones a la estructura.



Ilustración 16 Recorrido de obra

12 de agosto del 2026: Se realizó el comité de obra en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas, en la ciudad de Cali, con la participación de la Supervisión del Contrato, la Interventoría y el Contratista. Durante la reunión se revisó el estado general del proyecto, los porcentajes de avance de obra y los compromisos establecidos. Asimismo, se revisaron las actividades pendientes por ejecutar y se reportó el estado actual de la obra posterior al evento ocurrido el 10 de agosto de 2026.



Ilustración 17. Comité obra instalaciones Vallecaucana de Aguas

20 de agosto del 2026: Se llevó a cabo la reunión del Comité de Veeduría correspondiente al mes de agosto, con la participación de representantes de las comunidades de Ginebra y Guacarí, así como del equipo social de la Interventoría, el Contratista y el equipo técnico. Durante la reunión se presentó el avance de la obra a la fecha, se atendieron y resolvieron las inquietudes planteadas por la comunidad y se presentó la programación de las actividades

a ejecutar. Asimismo, los representantes de la comunidad solicitaron realizar un recorrido en obra con el propósito de socializar las nuevas actividades a ejecutar con las personas aledañas a las zonas de intervención, buscando prevenir posibles bloqueos, inconvenientes o malentendidos con la comunidad. En atención a esta solicitud, se realizó la convocatoria para llevar a cabo el recorrido el 26 de agosto de 2026.



Ilustración 18. Comité Veeduría – agosto 2026

26 de agosto del 2026: Se llevó a cabo un recorrido de seguimiento con la Interventoría y el Contratista, correspondiente al componente eléctrico, con el propósito de verificar el avance de las actividades ejecutadas en la PTAP de Ginebra.



Ilustración 19. Recorrido componente eléctrico Contratista e Interventoría

- Se realizó un recorrido de seguimiento en compañía del Supervisor Técnico de Acuavalle, la Interventoría, el Contratista y la comisión de Topografía, con el propósito de verificar

en campo las conexiones que se deben ejecutar en los tanques de almacenamiento ubicados en Albania y en la PTAP de Ginebra, así como las condiciones requeridas para su correcta ejecución.



Ilustración 20. Recorrido para verificación conexiones a los tanques de almacenamiento

- Dando cumplimiento al compromiso establecido en el Comité de Veeduría del 20 de agosto, se asistió al punto de encuentro dispuesto para realizar el recorrido con la comunidad, con la participación del componente social de la Interventoría, el Contratista y el componente técnico. Sin embargo, pese a la convocatoria realizada, no se contó con la asistencia de representantes de la comunidad, por lo cual no fue posible llevar a cabo el recorrido de socialización programado.



Ilustración 21. Cumplimiento compromiso recorrido e inasistencia comunidad

2.7. COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2.7.1. DESEMBOLSOS DEL ANTICIPO

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados.

Tabla 4. Resumen desembolsos anticipo.

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO						
No.	FECHA	NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DESEMBOLSO	CONCEPTO	VR. A DESEMBOLSAR	
No. 1	ENERO 23 DE 2023	901.378.127-8	CAL SAS	Bocatoma, línea de aducción y micromedidor	\$ 1.330.764.263	
		900.521.827-4	CONSTRUCTOR A NBI SAS	Tanque de almacenamiento Ginebra	\$ 825.783.347	
		805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Suministro e instalación pantallas deflectoras en fibra, canaletas en fibra	\$ 1.744.905.660	
No. 2	FEBRERO 22 DE 2023	900.618.239-1	INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES SAS	Suministro accesorios y tubería PEAD	\$ 2.955.952.978	\$ 3.379.115.874
		900.618.239-1	INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES SAS	Obras, instalación tubería conducción	\$ 423.162.896	
No. 3	MARZO 4 DE 2024	900.521.827-4	CONSTRUCTOR A NBI SAS	Suministro e Instalación de Sopladores	\$ 237.610.687	\$ 1.097.031.250
		805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Suministro e Instalación de barre lodos plantas Ginebra y Guacarí	\$ 752.820.600	
		805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Suministro e Instalación de Floculadores mecánicos	\$ 106.599.963	
No. 5	MAYO 5 DE 2025	901.648.319-4	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	Montajes eléctricos	\$ 10.542.664	\$ 10.542.664
				TOTAL	\$ 8.388.143.058	

2.7.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización total del anticipo se terminó de efectuar en el acta 15 tal como se evidencia en el siguiente cuadro.

Tabla 5. Resumen amortización anticipo.

ACTA No.	FECHA CORTE	VR. AMORTIZACIÓN
1	31/05/2023	\$ 2.511.320.053
2	30/06/2023	\$ 265.804.757
3	31/01/2024	\$ 272.313.639
4	31/03/2024	\$ 151.167.886
5	30/04/2024	\$ 110.785.818
6	31/05/2024	\$ 2.211.334.610

7	31/07/2024	\$	181.239.470
8	31/08/2024	\$	115.636.686
9	30/09/2024	\$	206.702.983
10	31/10/2024	\$	364.968.330
11	30/11/2024	\$	620.506.131
12	31/01/2025	\$	207.104.917
13	28/02/2025	\$	694.041.763
14	30/06/2025	\$	497.952.376
15	31/07/2025	\$	418.744.861
TOTA AMORTIZADO A LA FECHA		\$	8.829.624.279,90
VALOR TOTAL ANTICIPO		\$	8.829.624.279,90
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$	-

2.7.3 FACTURACIÓN

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. hasta la fecha del presente informe:

Tabla 6. Actas parciales facturadas

ACTA No.	FECHA CORTE	VR. FACTURADO	% AVANCE	% AVANCE ACUMULADO
1	31/05/2023	\$ 8.371.066.842	18,38%	18,38%
2	30/06/2023	\$ 886.015.856	1,95%	20,33%
3	31/01/2024	\$ 907.712.127	1,99%	22,32%
4	31/03/2024	\$ 503.892.952	1,11%	23,43%
5	30/04/2024	\$ 369.286.058	0,81%	24,24%
6	31/05/2024	\$ 7.371.115.364	16,19%	40,43%
7	31/07/2024	\$ 604.131.566	1,33%	41,76%
8	31/08/2024	\$ 385.455.620	0,85%	42,60%
9	30/09/2024	\$ 689.009.943	1,51%	44,11%
10	31/10/2024	\$ 1.216.561.098	2,67%	46,79%
11	30/11/2024	\$ 2.068.353.769	4,54%	51,33%
12	31/01/2025	\$ 690.349.724	1,52%	52,85%
13	28/02/2025	\$ 2.313.472.543	5,08%	57,93%
14	30/06/2025	\$ 1.659.841.253	3,65%	61,57%
15	31/07/2025	\$ 4.230.011.773	9,29%	70,86%
16	30/09/2025	\$ 534.405.953	1,17%	72,03%
17	31/10/2025	\$ 736.963.238	1,62%	73,65%
18	11/03/2026	\$ 431.777.557	0,95%	74,60%
19	30/11/2025	\$ 722.083.648	1,59%	76,19%

20	20/04/2026	\$	502.017.049	1.1%	77,29 %
21	18/06/2026	\$	460.365.240	1.01%	78,30 %
VALOR TOTAL FACTURADO		\$	35.653.889.173		78.30 %
VALOR CONTRATO		\$	45.534.873.888		
PENDIENTE POR FACTURAR		\$	9.880.984.715		

A la fecha se lleva un avance financiero al acta 21 de 78.3% y un avance físico de 81%

2.8. PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO

La programación de obra durante la ejecución del contrato se ha visto considerablemente afectada debido a la problemática social, legalización de servidumbres y optimizaciones de algunos diseños requeridos como la estructura de la bocatoma.

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.

A continuación, se detallan las condiciones presentadas:

- Se encuentra en trámite las servidumbres de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los rediseños de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, se requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya que se encuentran en predios con viviendas aledañas.
- La presencia de invasores en las áreas de construcción de la bocatoma y viaducto de Puente Rojo, representan una afectación directa para la ejecución de las actividades de estas estructuras. De igual forma se tiene inconveniente para la construcción de la línea de conducción en un tramo de la salida de la bocatoma, ya que el propietario del predio aledaño no permite el ingreso en la parte posterior de su predio.
- En el tramo comprendido entre puente rojo y la entrada al callejón de la PTAP de ginebra aún no se ha podido intervenir por dos situaciones presentadas el 20 de noviembre de 2025, y el 20 de enero de 2026, donde se ha tenido que suspender temporal de las actividades del frente de obra en el tramo 2 (instalación de tubería PEAD de 10"), dicha situación continúa sin resolverse y, a pesar de contar con todos los permisos otorgados por la administración local, así como con el respaldo técnico y administrativo que garantiza la reposición de la vía, la comunidad mantiene su negativa a permitir la ejecución de la actividad de instalación de la tubería. Esta condición impide el normal desarrollo de las obras y afecta de manera significativa el avance general del proyecto. Cabe resaltar que, en la reunión de veeduría realizada en el mes de agosto, se acuerda informar y citar a la comunidad para el mes de septiembre y realizar un recorrido para explicar los avances de obra y plantear alternativas que nos dejen continuar con las actividades programadas.

- Por último, durante la instalación de la tubería en el Tramo 1, entre La Batea Bananos y Puente Amarillo, se ha presentado una situación con la comunidad del Cañón del Río Guabas y sus líderes, quienes han solicitado la suspensión de las actividades de instalación en este sector hasta nueva orden. Esta situación ha generado afectaciones al cronograma contractual y sobrecostos asociados al retiro, traslado y reasignación de maquinaria, equipos y personal hacia otros frentes de trabajo.

A la fecha, como alternativa para dar continuidad a las actividades, se realizó la construcción de un cárcamo en concreto de aproximadamente 24 metros lineales, ubicado a un costado de la vía, sin afectar el asfalto existente. No obstante, permanece suspendida la intervención de aproximadamente 2 kilómetros de tubería, situación que genera preocupación debido al impacto que representa sobre el normal desarrollo de las actividades programadas y el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto.

2.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO- ÁREA TÉCNICA

	
Fotografía 1. Instalación material para encamado para tubería, en cruce vial	Fotografía 2. Excavación a máquina sector Sky Blue
	
Fotografía 3. Demolición pase existente.	Fotografía 4. Instalación tubería PEAD DN=450MM PN 10



Fotografía 5. Instalación filtro granular



Fotografía 6. Instalación tubería. PEAD DN=355MM
PN 10



Fotografía 7. Instalación de cinta de señalización en
zanja para advertir la presencia de tubería instalada en
el sector.



Fotografía 8. Instalación accesorios electro fundibles DN
450mm



Fotografía 9. Presencia de rocas de gran tamaño en la excavación.



Fotografía 10. Retiro de rocas de la zona de excavación



Fotografía 11. Compactación material relleno



Fotografía 12. Demolición pases



Fotografía 13. Recorridos y supervisión actividades

Fotografía 14. Regulación tráfico

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.1. ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

El siguiente cuadro presenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo correspondiente al presente informe en los municipios de Ginebra y Guacarí, Valle del Cauca.

Tabla 7. Actividades gestión social

DESCRIPCIÓN	AVANCES / LOGROS	PERIODICIDAD	CUMPLIMIENTO	REGISTRO / VERIFICACIÓN
Con el fin de promover la participación de la comunidad en la fiscalización del uso de los recursos aportados por el fondo para el desarrollo del objeto contractual, se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la estrategia de auditorías visibles.	Durante este periodo se realizaron visitas a los municipios y a los puntos de atención a la comunidad, incluyendo la revisión de buzones, con el fin de identificar posibles inquietudes de la población.	Se realizaron visitas los días 27 de agosto en los municipios de Ginebra y Guacarí.	Se ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos en el contrato y en el Plan de Gestión social.	Registro fotográfico
Comité de veeduría del municipio de Ginebra a una reunión informativa y de control social.	Se realizó el comité de veeduría en la oficina ubicada en Costa Rica, el 20 de agosto.		Se da cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de gestión social.	Actas de reunión de los comités de veeduría de los municipios de Ginebra y Guacarí.
Reconocimiento del territorio donde se ejecuta el proyecto	Se realiza visita 27 de agosto con el fin de identificar posibles inquietudes de la comunidad en los puntos donde se encuentran ubicados los buzones de sugerencias en los municipios de Ginebra y Guacarí.			Registro fotográfico

3.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC

Con el propósito de mantener canales de comunicación directos, transparentes y accesibles, el contratista garantiza el funcionamiento continuo del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). Este espacio permite la recepción de hojas de vida para empleo local, la atención de consultas y el trámite de solicitudes.

La oficina del SAC opera bajo los siguientes parámetros de atención:

- Horario de Atención Presencial: martes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y jueves de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

- Dirección Física: Calle 11 No. 4-39, Tercer Piso, Edificio La Piscina, Barrio El Centro, corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, Valle del Cauca.
- Línea de Atención Telefónica / WhatsApp: Celular 320 573 0542.

Este punto de atención es ampliamente reconocido por la comunidad, presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y los líderes comunitarios de las áreas de influencia directa de las obras. La familiaridad con este espacio se ha consolidado gracias a su uso como sede recurrente para el desarrollo de las reuniones mensuales de los comités de veeduría ciudadana de Ginebra y Guacarí.



Ilustración 22. Oficina de atención a la comunidad

3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS

Los buzones de sugerencias permanecen ubicados en las oficinas de personería del municipio de Guacarí y Ginebra, están instalados cada uno en lugares donde hay movilidad de personas, hasta el momento no se han presentaron PQRS.

El día 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo la inspección física y apertura de los buzones, se evidenció que las estructuras físicas se encuentran en perfecto estado de conservación y a la fecha de corte de este informe, no se registraron Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS). Ello constata que la comunidad prefiere canalizar sus inquietudes mediante atención presencial o vía telefónica directa.

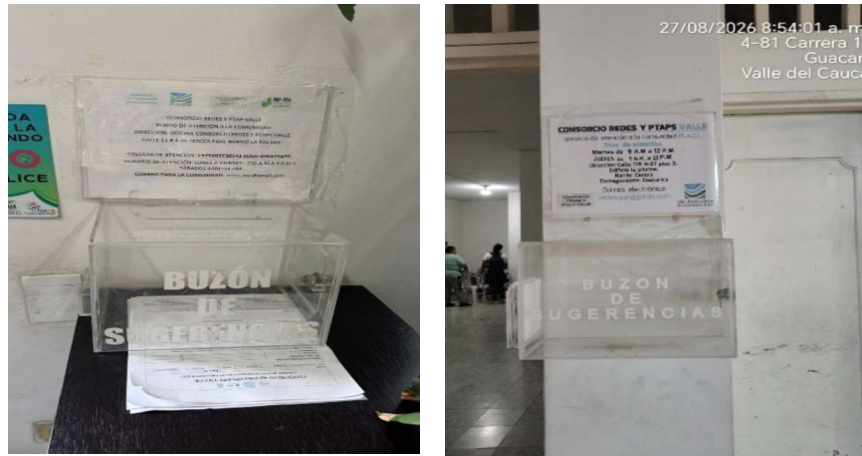


Ilustración 23. Buzón de sugerencias Guacarí y Ginebra

3.2.3. Las vallas: Son de carácter publicitario e informativo se encuentran debidamente instaladas en las principales vías de acceso de las cabeceras municipales de Ginebra y Guacarí, cumpliendo a cabalidad con la obligación contractual de divulgación e identidad visual del proyecto.



Ilustración 24. Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra

3.2.4. ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Durante el mes de agosto se realizó la actualización de las carteleras informativas ubicadas en las oficinas de atención a la comunidad, incorporando la información presentada en las reuniones de los Comités de Veeduría de Ginebra y Guacarí.



Ilustración 25. Cartelera informativa y divulgación del proyecto en la Personería de Guacarí.

La cartelera informativa ubicada en la Personería de Guacarí fue completamente actualizada y retroalimentada el día 27 de agosto de 2026, fijándose allí el registro fotográfico y el resumen descriptivo de los avances físicos de la obra correspondientes al mes, cumpliendo con los medios de divulgación del Plan de Gestión Social.

Como parte del seguimiento a los Comités de Veeduría, se elaboraron y remitieron a las Alcaldías los oficios de convocatoria correspondientes, con consecutivos CRYPT-COP 2000.13.05.003-2022-Cons-304, 305, 306 y 307-2026, cuyo asunto corresponde a “Invitación a la reunión de Comité de Veeduría para ejercer control y vigilancia al contrato”. En estos se programaron las reuniones para el 20 de agosto de 2026, en jornada de la tarde, correspondientes a los Comités de Veeduría de Ginebra y Guacarí. Adicionalmente, se distribuyeron volantes informativos a los integrantes de los Comités a través de los canales de comunicación disponibles, con el propósito de reforzar la convocatoria y facilitar la participación de la comunidad, logrando la confirmación de asistencia de los integrantes convocados.



Ilustración 26. Volante invitación comité veeduría

El componente social, en conjunto con el área técnica del Contratista, emitió el oficio con consecutivo CRYPT-COP 2000.13.05.003-2022-Cons-314-2026, cuyo asunto corresponde a “Constancia de convocatorias e inasistencia de la comunidad a espacios de socialización y seguimiento de obra”. Lo anterior, en atención al compromiso establecido durante el Comité de Veeduría del 20 de agosto, en el cual, por solicitud de los representantes de la comunidad, se acordó realizar un recorrido en obra para socializar las actividades programadas con la población aledaña a las zonas de intervención.

En cumplimiento de dicho compromiso, se realizó la convocatoria para llevar a cabo el recorrido el 26 de agosto de 2026; sin embargo, no se contó con la asistencia de ningún representante de la comunidad. En consecuencia, se emitió el oficio mencionado con el propósito de dejar constancia de la convocatoria realizada, de la disposición y cumplimiento del compromiso adquirido por parte del Consorcio y de la inasistencia de la comunidad al espacio de socialización programado.

Igualmente, se proyectó y remitió a la entidad contratante el Oficio No. CRYPV-COP 2000.13.05.003-2022-Cons-316-2026, mediante el cual se presentó la trazabilidad de las gestiones adelantadas ante las Alcaldías de Ginebra y Guacarí frente a las situaciones de ocupación y tenencia irregular de predios y espacios públicos que interfieren con la ejecución de las obras. Asimismo, se solicitó el apoyo de la entidad contratante para fortalecer la articulación institucional y dar seguimiento a las actuaciones pendientes, teniendo en cuenta las restricciones que estas situaciones continúan generando sobre la programación y ejecución del proyecto.

Con estas acciones se da cumplimiento a los medios de divulgación establecidos dentro del Plan de Gestión Social.

Tabla 8. Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad

Actividad	Programado	Ejecutado	Pendiente	Porcentaje de Ejecución
Distribución entrega de volantes de Inicio de obra en tramo 2 y recolección de hojas ve vida para vincular en obra	2	2		100%
Reunión inicial (Socialización del proyecto)	0	0		
Reuniones con la veeduría ciudadana	2		1	50%

3.3. CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES

3.3.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.

El 20 de agosto de 2026 se coordinó y llevó a cabo la sesión de seguimiento de los Comités de Veeduría de Ginebra y Guacarí, con la participación de la residente social

de la interventoría, representantes de las comunidades de ambos municipios y personal técnico del contratista, generando un espacio de articulación y diálogo entre los actores involucrados en el desarrollo del proyecto.



Ilustración 27 Reunión comité de veeduría Ginebra y Guacarí 20 de agosto -26

Gestión institucional: Para el desarrollo de la jornada se extendió invitación formal a los secretarios de Infraestructura y Planeación de las administraciones municipales de Ginebra y Guacarí, con el propósito de abordar directamente los asuntos prediales y de espacio público de competencia municipal. No obstante, no se contó con su participación, situación que limita la posibilidad de avanzar con mayor celeridad en la gestión y definición de las situaciones identificadas.

En el marco del comité de veeduría se socializó la formalización de la prórroga contractual, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del proyecto hasta el 22 de enero de 2027. Asimismo, se presentaron los principales avances físicos de obra con corte al mes de agosto de 2026:

Se informó a los comités de veeduría sobre las decisiones adoptadas frente a la construcción del cárcamo previsto en el Tramo 1 como parte de las actividades ejecutadas.

Con el propósito de evitar afectaciones sobre la placa huella, considerada uno de los principales puntos de preocupación manifestados por la comunidad y el colectivo social Proterritorio, se definió como alternativa técnica la instalación de la tubería de conducción de manera subterránea, a un costado de la vía. Esta solución permite evitar la intervención directa de la estructura existente y reducir las afectaciones sobre la movilidad y las condiciones actuales de la vía.

Durante el Comité de Veeduría, por parte del colectivo Proterritorio únicamente se contó con la participación del concejal y facilitador Brayan Rodríguez, quien realiza labores de coordinación y diálogo con dicho colectivo. Ante la ausencia de los demás integrantes del colectivo, uno de los comisionados solicitó la programación de un recorrido técnico de campo, con el propósito de explicar directamente en el sitio las consideraciones

técnicas, el método constructivo propuesto y las medidas previstas para evitar afectaciones sobre la placa huella y prevenir nuevas restricciones a la ejecución de las obras.

Asimismo, se reiteró a los representantes del comité que el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el colectivo Proterritorio, Vallecaucana de Aguas y la Gobernación del Valle del Cauca no hace parte del alcance contractual del Consorcio de Obra. No obstante, teniendo en cuenta que esta situación constituye un factor que puede generar restricciones y afectar la continuidad de las actividades constructivas, se gestionó un espacio de diálogo directo con el colectivo.

En este sentido, se programó un recorrido técnico conjunto para el 26 de agosto de 2026 a las 3:00 p. m.; sin embargo, la actividad no pudo desarrollarse de manera integral debido a que únicamente se contó con la asistencia del concejal y facilitador Brayan Rodríguez.



Ilustración 28. Volante convocatoria recorrido en obra

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente la confirmación y realización definitiva de dicho espacio. Se considera prioritario concretar esta reunión con el fin de socializar y aclarar las condiciones técnicas de la alternativa propuesta y prevenir nuevas situaciones que puedan generar la suspensión o restricción de las actividades de obra en este sector.

3.4. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO

El objetivo de este programa es garantizar la protección y la conservación del patrimonio inmobiliario privado y público localizado en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto de acueducto.

Como mecanismo preventivo de control de reclamaciones y protección de los inmuebles, se realiza la elaboración de actas de vecindad y fachada. Estas actas constituyen un registro técnico pormenorizado del estado de cada predio previo al inicio de las excavaciones y el uso de maquinaria pesada. Se incluye una descripción detallada y soporte fotográfico de grietas, fisuras, humedades o deterioros preexistentes, salvaguardando la responsabilidad del contratista frente a daños anteriores al proyecto.

Al mes de agosto de 2026, el programa registra un avance de ejecución consolidado del 77.14%, distribuyéndose las actas elaboradas por sectores de la siguiente manera:

Tabla 9. Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado.

Regaderos Ginebra	15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo	6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda	23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra	7 actas de inicio
Tanque la Albania	2 actas de vecindad 1 acta de entorno Albania 1 acta de entorno sector la esmeralda. 1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta Costa Rica*tramo 1

Tabla 10. Consolidado de actas de vecindad.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de actas de vecindad y fachada de apertura	70	54	16	77.14%

3.5. REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS

Este programa está orientado a la transferencia de información a la comunidad urbana de los municipios de Ginebra y Guacarí, beneficiarios directos del proyecto. Para fortalecer la divulgación y el acceso a la información, se mantiene comunicación con líderes comunitarios y con las dependencias de las administraciones municipales relacionadas con el proyecto.

Durante el mes de agosto los espacios de articulación desarrollados con los alcaldes y sus dependencias han permitido mantenerlos informados sobre los avances del proyecto y gestionar, dentro de sus competencias, las situaciones que pueden afectar su ejecución. No obstante, se evidencia demora en la atención y gestión de algunos procedimientos requeridos por el contratista, principalmente aquellos relacionados con situaciones de ocupación irregular de predios e invasión del espacio público.

Se mantiene una preocupación crítica debido a la demora en la atención y resolución por parte de las administraciones frente a la ocupación irregular de predios y la invasión de espacio público en los sectores donde se requiere instalar la tubería de conducción de agua potable:

- **Municipio de Ginebra:** Se remitieron oficios a la alcaldía para urgir gestiones con predios con tenencia irregular. En este municipio, la Secretaría de Planeación realizó visitas técnicas a las propiedades de los señores Danilo Bermúdez y Luis Fernando Marmolejo. Sin embargo, no se han emitido resoluciones de servidumbre ni actas de entrega de las áreas afectadas, lo que impide al contratista ingresar a instalar la tubería, generando importantes retrasos físicos y sobrecostos operativos.
- **Municipio de Guacarí:** Se presenta una situación análoga por invasión de espacio público en la franja de servidumbre de la tubería. A la fecha, las inspecciones de policía locales no han reportado el inicio formal de procedimientos legales para la recuperación de las áreas públicas invadidas.

3.6. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

El programa de fomento al empleo local prioriza la contratación de mano de obra calificada y no calificada proveniente del área de influencia directa e indirecta del proyecto en Ginebra y Guacarí. El objetivo central es promover el desarrollo socioeconómico, mitigar el desempleo regional y generar ingresos tanto directos como indirectos a las familias durante la vigencia del contrato de obra.

A continuación, se detalla el censo completo del personal activo contratado para las obras de infraestructura durante el periodo de agosto:

Tabla 11. Información personal contratado

NOMBRE COMPLETO	CARGO	MUNICIPIO	FECHA DE INGRESO
Manuel Carvajal	Aux. Topografía	Costa Rica	17/08/2026

Tabla 12. Personal por genero

	FEMENINO	MASCULINO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6	2
PERSONAL OPERATIVO	2	19
TOTAL	8	21

Tabla 13. Total, personal activo en la zona

MUNICIPIO	# PERSONAS CONTRATADAS
Ginebra	4
Guacarí:	7

Costa Rica	13
Otros municipios	5
TOTAL	29

3.7. COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL

El 12 de agosto de 2026 se llevó a cabo el comité técnico de seguimiento para evaluar de manera integral el avance físico del componente social y sus posibles puntos de fricción e interferencias. En este espacio de articulación técnica se priorizaron las siguientes conclusiones:

- **Supervisor a administraciones locales:** Se identificó la necesidad apremiante de que la interventoría y la supervisión del contrato realicen un seguimiento riguroso a las acciones pendientes de las alcaldías de Ginebra y Guacarí frente a los predios de tenencia irregular e invasión de espacios públicos. A la fecha de la reunión, no se registran procedimientos activos reportados en las Inspecciones de Policía correspondientes.
- **Acción de requerimiento:** Se determinó que el contratista remitirá oficios formalmente argumentados a los alcaldes para concertar una mesa de trabajo conjunta y hacer un seguimiento definitivo al problema de servidumbres y ocupación irregular de predios que entorpece las obras físicas. De igual manera, se consolidará el historial del componente social, incluyendo las suspensiones e interrupciones forzadas causadas en el pasado por el colectivo Pro-territorio.

En la ilustración se observa la participación a la reunión del comité técnico e informando desde este componente las áreas de vulnerabilidad que se generan desde la parte comunitaria. Y reunión de seguimiento por parte de la residente social de interventoría a la ejecución del Plan de Gestión Social.



Ilustración 29. Reunión comité técnico 12 de agosto 2026

- **Charla personal operativo:** Se realizó capacitación dirigida a los trabajadores sobre la diferencia entre ética y moral, destacando la importancia de estos principios como fundamentos para el adecuado desarrollo de las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, así como para fortalecer un ambiente laboral basado en el respeto, la responsabilidad, la integridad y la sana convivencia en todos los niveles de relacionamiento.



Ilustración 30 capacitación trabajadores tema la arquitectura de la confianza -13 de agosto

3.8. COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL

Factores clave de riesgo identificados:

- **Presión colectiva externa:** El grupo comunitario 'Pro-territorio' mantiene una persistente actitud de desconfianza ante el avance y cumplimiento de los acuerdos sociales y de inversión que dicho colectivo suscribió en el pasado de manera autónoma con las administraciones locales y con la entidad supervisora del proyecto.
- **Desbordamiento del alcance contractual:** Dado que estos acuerdos e inversiones extrapolan completamente las obligaciones contractuales vigentes del Consorcio, no cuenta con las facultades legales ni financieras para darles cumplimiento directo. No obstante, Pro-territorio utiliza los bloqueos de frentes de obra como su principal mecanismo de presión institucional contra los entes gubernamentales.
- **Impacto en ejecución:** Este veto de intervención en áreas estratégicas del proyecto genera parálisis físicas, retrasos acumulados en el cronograma general y significativos sobre costos operativos por stand-by de cuadrillas y maquinaria.

Recomendación de Gestión: Esta matriz de riesgo social crítico se mantiene inalterada. Es imperativo que las entidades gubernamentales, la Gobernación del Valle, Vallecaucana de Aguas y las alcaldías de Ginebra y Guacarí intervengan de manera inmediata, definitiva y con carácter vinculante. Su mediación es esencial para garantizar las condiciones de seguridad jurídica y territorial que permitan al Consorcio ejecutar las obras restantes sin interferencias de orden público.

4. PROGRAMA SST

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2026, se evidencia el cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.1. OBJETIVOS

- Informar a la dirección del proyecto “**LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ**” sobre las medidas de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.
- Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.
- Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de seguridad y salud en el trabajo que se han presentado.

4.2. ALCANCE

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar cobertura a todo el personal directo, contratistas y subcontratistas con el fin de controlar los factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar.

4.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tabla 14 Documentos de referencia

DOCUMENTO	NORMA DE REFERENCIA
Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Decreto 1072/2015
Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Res. 0312/2019

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud ocupacional del sector de la construcción	Ministerio de trabajo
Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados.	Res. 0491/ 2020
Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas	Res. 4272 / 2021

4.4. RELACIÓN PERSONAL VINCULADO Y DESVINCULADO

Para el mes de agosto se registraron las siguientes novedades de vinculación y desvinculación de personal en el proyecto:

Tabla 15 Personal Vinculado – agosto 2026

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha ingreso
Manuel Carvajal	Aux Topografía	17/08/2026

Tabla 16. Personal desvinculado –agosto 2026

Nombres y Apellidos	Cargo	Empresa	Fecha retiro
Guillermo González	Topógrafo	Consortio redes y PTAPS Valle	07/08/2026
María Camila Gil	Ambiental	Consortio redes y PTAPS Valle	15/08/2026

4.5. RELACIÓN TOTAL PERSONAL EN EL PROYECTO

A continuación, se describe el personal vinculado y activo dentro del proyecto en el mes de agosto 2026

Tabla 17. Relación personal administrativo y operativo

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SG-SST		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	ALDO GUTIÉRREZ	79.699.673	N/A		CONSORCIADO	SURA	SURA	COLPENSIONES
2	CARLOS ANDRÉS LEYVA	89.008.184	N/A		DIRECTOR DE LA OBRA	SURA	SURA	PROTECCIÓN
3	WILLIAM H. MORA M/NEZ	7.558.271	01/03/26		APOYO TÉCNICO	SURA	SURA	COLPENSIONES
4	ANA FDA. ROSERO CAJIGAS	36.759.739	17/01/24		ING. RESIDENTE AUXILIAR	SANITAS	SURA	COLPENSIONES
5	JENNIFER CABRERA	1.084.223.618	27/07/26		RESIDENTE OBRA	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
6	MARÍA FDA. MARTÍNEZ	38.856.496	05/01/23		PROFESIONAL SOCIAL	SURA	SURA	COLPENSIONES
7	JORGE APONTE	1.112.098.988	02/09/24		ALMACENISTA	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
8	MAURICIO FERNANDO SOTO	14.652.613	14/11/24		AYUDANTE OBRA	SOS	SURA	PORVENIR
9	JORGE HERNÁN OCAMPO CORTEZ	9.858.689	26/11/24		AYUDANTE OBRA	EMSSANAR	SURA	PORVENIR
10	RODRIGO RODRIGUEZ	16.860.355	02/07/25		AYUDANTE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
11	SARAY TONUZO	1.005.870.273	03/07/25		AUX VIAL	EMSSANAR	SURA	COLPENSIONES

12	JHON VIVEROS JAIRO	94.444.582	28/09/25		AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
13	ANGELICA MARIA GONZALEZ	1.112.967.318	27/03/26		AUXILIAR VIAL	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
14	CAROLINA MORA DUARTE	1.082.976.100	10/02/26		AUXILIAR ADMINISTRATIV	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
15	MARÍA CAMILA GIL	1.112.969.458	02/05/25	15/08/26	INGENIERA AMBIENTAL	N. EPS	SURA	PORVENIR
16	GLORIÉS ZULUAGA LÓPEZ	39.282.330	15/07/26		PROFESIONAL SST(E)	SURA	SURA	PORVENIR

Tabla 18. Relación personal operativo contratista

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA ASCENDORES JFM								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SG-SST		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
17	GUILLERMO GONZALEZ	12.976.239	07/02/24	07/08/26	TOPÓGRAFO	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR
18	JOSÉ ESPINOZA	1.114.894.279	22/01/26		CADENERO	SALUD TOTAL	SURA	COLPENSIONES
19	JIMMY SINISTERRA	14.636.383	08/10/25		TOPÓGRAFO	S.O.S.	POSITIVA	COLPENSIONES
20	MANUEL CARVAJAL	1.107.087.790	17/08/26		AUX TOPOGRAFICO	DELAGENTE	SURA	COLFONDOS
PERSONAL OPERATIVO A7 CONSTRUCCIONES								
No.	NOMBRE	No CÉDULA	FECHA		CARGO	SG-SST		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
21	IVAN CAICEDO RODRIGUEZ	1.114.457.595	15/07/25	30-08-26	MAESTRO	S. TOTAL	SURA	PORVENIR
PERSONAL OPERATIVO ABRAHAM CAICEDO CONSTRUCCIONES								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SG-SST		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
22	ABRAHAM CAICEDO	16.985.160	15/07/25	06/08/26	MAESTRO	S. TOTAL	SURA	PORVENIR

PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SG-SST		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
23	NELSON BLANCO	91.272.299	03/10/25		ELECTRICISTA	N. EPS	SURA	COLPENSIONES

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SG-SST		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
24	DAVID LOZANO	16.932.279	19/08/25		ING. ENCARGADO	EMSSANAR	SURA	PORVENIR
25	MAICOL CAICEDO	1.143.938.113	19/08/25		MAESTRO	SURA	SURA	PORVENIR
26	ORLEY GOMEZ	94.301.373	19/08/25		CONDUCTOR	SANITAS	SURA	COLPENSIONES
27	BRAYAN NAVARRETE	1.010.151.246	01/2026		AYUDANTE	EMSSANAR	SURA	PORVENIR
28	GUILLERMO ALVAREZ	94.302.945	01/11/25		OPER. MÁQUINA	SOS EPS	COLMENA	COLPENSIONES

PERSONAL OPERATIVO ABSCISA SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		CARGO	SG-SST		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
29	JORGE DUQUE	16.599.361	13/07/26		OPER. MÁQUINA	N. EPS	SURA	COLPENSIONES

4.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.6.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2026, se realiza verificación del pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo.

Tabla 19.. Aportes a la seguridad social integral.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CONSORCIO			
NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO PLANILLA	FECHA	OPERADOR
ALDO GUTIERREZ		07/2026	
CARLOS ANDRÉS LEYVA	9509856597	07/2026	SU APOORTE
WILLIAM MORA MARTÍNEZ	9508682505	07/2026	APORTES EN LÍNEA
JENIFER CABRERA VIVEROS	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
ANA FDA. ROSERO CAJIGAS	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ B	9509007210	07/2026	APORTES EN LÍNEA
MARÍA CAMILA GIL	93943317	07/2026	MI PLANILLA
GLORIES ZULUAGA LÓPEZ	9508296551	07/2026	APORTES EN LÍNEA
CAROLINA MORA DUARTE	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
PERSONAL OPERATIVO			
JORGE APONTE	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
MAURICIO FERNADO SOTO	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
JORGE HERNÁN OCAMPO CORTEZ	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
RODRIGO RODRIGUEZ	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
SARAY TONUZO	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
JHON JAIRO VIVEROS	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
ANGELICA MARIA GONZALEZ	9509856597	07/2026	APORTES EN LÍNEA
ASCENSORES JFM SAS			
JIMMY SINISTERRA	508849817	07/2026	APORTES EN LÍNEA
JOSÉ ESPINOZA	510170222	07/2026	APORTES EN LÍNEA
GUILLERMO GONZÁLEZ		07/2026	
MANUEL CARVAJAL	CERTIFICADOS	07/2026	
A7 CONSTRUCCIONES			
IVAN CAICEDO RODRIGUEZ	1084496975	07/2026	SIMPLE
INGENIERÍA Y SOLUCIONES			
DAVID LOZANO	9509391695	07/2026	APORTES EN LÍNEA
MAICOL CAICEDO	9509391695	07/2026	APORTES EN LÍNEA
ORLEY GÓMEZ	9509391695	07/2026	APORTES EN LÍNEA
BRAYAN NAVARRETE	9509391695	07/2026	APORTES EN LÍNEA
GUILLERMO ÁLVAREZ	9509391695	07/2026	APORTES EN LÍNEA
ELECTRO MONTAJES			
NELSON BLANCO	9508224305	07/2026	APORTES EN LÍNEA
ABSCISA			
JORGE DUQUE	508731913	07/2026	APORTES EN LÍNEA
CONDUCTOR			

RODRIGO PRECIADO PALACIOS	1084111856	07/2026	SIMPLE
---------------------------	------------	---------	--------

Ver anexo SST - Planillas de aportes a la seguridad social integral.

4.6.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En el mes de agosto del 2026 ingresó personal nuevo a la obra, como medida de cumplimiento a la normativa colombiana se tiene en cuenta los siguientes temas, para realizar las respectivas inducciones y reinducciones al personal que ingresa al Consorcio Redes y PTAPS Valle.

- Presentación de la empresa
- Reglamento interno de trabajo
- Aspectos generales, legales y políticas del SG-SST.
- Política de no consumo de sustancias psicoactivas.
- Derechos y deberes
- Actividades que va a ejecutar

4.6.3. PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el mes de agosto de 2026, se realizan las siguientes charlas e inspecciones de seguridad:

- Charla de seguridad tema: Golpe de calor



Ver anexo SST registros de charlas – capacitaciones

4.6.4. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el mes de agosto del 2026, se realizaron las pausas activas con el objetivo de prevenir trastornos osteo-musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas y romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y propiciar la integración grupal.

Ver anexo registros de pausas activas



Ilustración 31. Pausas activas mes de agosto

4.6.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el mes de agosto del 2026, se realizan actividades tales como:

- ❖ Análisis de trabajo seguro
- ❖ Inspecciones
- ❖ Charlas
- ❖ Visitas a campo

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de agosto del 2026.

Tabla 20.. *Maquinaria, equipos y herramientas.*

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Equipos de topografía Estación – Nivel	1	NIKON - SNDWAY
Retroexcavadora Llantas	1	CAT
Retroexcavadora tipo oruga	1	HITACHI
Volquetas	1	(UFK231 - TMA840)
Taladro demoledor	2	
Pulidora	2	DELWAT
Sierra circular para corte de madera	1	DELWAT
Planta Generadora 6.5	2	ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas	1	BARNES
Motobomba 3 pulgadas	1	
Mezcladora de concreto	1	TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico	2	BOSCH 2.8 HP-NUEVO
Taladros manuales	3	
Martillo demoledor	1	SIEFKEN
Rotomartillo	1	SIEFKEN
Buggy	5	Herragro- Toolcraft
Tronzadora	2	DELWAT
Máquina de prueba hidrostática	1	Orust

Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate)		
---	--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO S.S.T.



Señalización y demarcación de excavaciones sobre la vía.



Inspección de equipos y herramientas.



Control de tráfico.



Revisión señalización parte eléctrica



Recorridos en frentes de obra, inspección de maquinaria.

ACCIDENTES Y/O ENFERMEDAD LABORAL		
NOMBRES	CARGO	DÍAS
No hubo accidentes ni enfermedad laboral		

CONSECUENCIA	CANTIDAD	DÍAS DE INC.	%
Accidente laboral			
Enfermedad laboral			
Total			

4.6.7. AUSENTISMO

Durante el mes de agosto del 2026, no se registró ausentismo por origen común o enfermedad.

Formula: Ausentismo por causa médica = $\frac{\# \text{ días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\# \text{ de días programados en el mes}} \times 100$

PORCENTAJE DE AUSENTISMO			
NOMBRE	CAUSA	DIAS DE INCAPACIDAD	%

4.6.8. PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

Durante el mes de agosto del 2026, se ejecutan las inspecciones programadas en el cronograma de inspecciones tales inspecciones son:

- ❖ Inspección locativa oficina
- ❖ Inspección de herramientas en almacén
- ❖ Inspección de comportamiento
- ❖ Inspección de equipos de emergencia

Anexos formatos de inspecciones

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el mes de agosto del presente año (2026).

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas de pre-construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo).

5.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades:

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para la ejecución del proyecto.
- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo con las necesidades del proyecto.
- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo con el avance del proyecto y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como parte del desarrollo del PMMA.
- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.
- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA del proyecto.
- Capacitar al personal de obra en temas ambientales.

5.2. PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES

Durante la ejecución del proyecto es necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, para lo cual se han gestionado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración Municipal los diferentes permisos requeridos para el desarrollo de las actividades de obra. A continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto, junto con su respectiva vigencia:

Tabla 21.. *Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle*

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
TIPO DE PERMISO	RESOLUCIÓN	AUTORIDAD COMPETENTE	VIGENCIA	ESTADO
Concesión de Aguas Superficiales	Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020	CVC	10-07-2030	VIGENTE
Permiso de Ocupación de Cauce	Resolución 0740 No. 0741 14366 de 2025	CVC	18-11-2026	SE REQUIERE TRAMITAR UN NUEVO PERMISO – ÁREA ADICIONAL
Aprovechamiento Forestal Planta ACUAVALLE Ginebra	Resolución 740 No. 0741 0381 29-04-2024	CVC	08-06-2026	INTERVENCION (PAF PTAP GINEBRA) REALIZADA
Aprovechamiento Forestal Sector Bocatoma	Resolución 740 No. 0741 13191 22-10-2025	CVC	22-04-2026	PERMISO – ÁREA ADICIONAL SE REALIZÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE SE ESTA A LA ESPERA DEL COMUNICADO POR PARTE DE LA CVC
Licencia de Espacio Público	Resolución No. 0015-04-12-2025 29-01-2025	Planeación Municipal Ginebra	04-12-2027	VIGENTE
Licencia de Espacio Público	Resolución No. 140-23-3-001 13-01-2026	Planeación Municipal Guacarí	13-01-2027	VIGENTE
PMT	Resolución No.	Secretaría de Movilidad Ginebra	Duración del Proyecto	VIGENTE
PMT	Resolución No. 900-50-020 20-03-2023	Secretaría de Movilidad y Transporte Guacarí	Duración del Proyecto	VIGENTE
Permiso Rotura de Vías	Resolución No. 014- 09-2025	Planeación Municipal Ginebra	24-09-2027	VIGENTE

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
TIPO DE PERMISO	RESOLUCIÓN	AUTORIDAD COMPETENTE	VIGENCIA	ESTADO
Permiso Rotura de Vías	Resolución No. PM.300-42-2- 028 18-11-2024	Planeación Municipal Guacarí	18-11-2026	VIGENTE

Indicador:

Cumplimiento de requerimientos legales (%)

$$= \frac{\text{No. de Permisos otorgados (del proyecto o de terceros)}}{\text{No. de permisos requeridos (del proyecto o de terceros)}} * 100$$

Permisos del Proyecto:

$$\text{Cumplimiento de requerimientos legales (\%)} = \frac{9}{10} * 100$$

$$\text{Cumplimiento de requerimientos legales (\%)} = 90\%$$

El indicador de cumplimiento de los requerimientos legales se encuentra actualmente en un 90 %, debido a que se está a la espera del pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental competente (CVC) respecto a la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal asociado a la bocatoma. Una vez la autoridad emita el acto administrativo correspondiente, se dará continuidad a las acciones requeridas para alcanzar el cumplimiento total del indicador.

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades ambientales competentes.

Tabla 22.. *Permisos tercerizados Consorcio Redes y PTAPS*

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE			
PROVEEDOR	SERVICIO	TIPO DE PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL
CANTERA EL BERMEJAL	Suministro de materiales de construcción.	Licencias ambientales y Títulos Mineros	CVC / Plan de Manejo Ambiental Vigente. Agencia Nacional de Minería/ Título Minero Vigente.
VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.	Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD	Permisos sitios de disposición final escombros y sobrantes de obra	CVC / Inscripción vigente como gestor RCD

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE			
PROVEEDOR	SERVICIO	TIPO DE PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL
SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.	Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD	Permisos sitios de disposición final escombros y sobrantes de obra	Pendiente por renovación de permiso
Centro de Reciclaje BANCANAIMA	Gestor RCD no pétreos (madera, plástico, metal, vidrio, textiles, cartón y papel)	Inscripción como Gestor de residuos de demolición y construcción - RCD no pétreos	Administración Municipal / Inscripción vigente como gestor RCD no pétreo

Permisos del Proyecto (Terceros):

$$\text{Cumplimiento de requerimientos legales (\%)} = \frac{3}{4} * 100$$

$$\text{Cumplimiento de requerimientos legales (\%)} = 75\%$$

El indicador denominado "Permisos del Proyecto (Terceros)" presenta actualmente un cumplimiento del 75 %, debido a que el permiso otorgado por la autoridad ambiental competente (CVC) al gestor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., perdió su vigencia. Por lo que se está realizando el trámite para la vinculación de un nuevo gestor ambiental que cuente con la autorización vigente para el manejo y disposición de este tipo de residuos.

5.3. PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL

5.3.1. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA

En el marco del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad ambiental competente (CVC), se ejecutó la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos. Como medida de compensación por la intervención autorizada, la CVC estableció la obligación de realizar la siembra de diecinueve (19) individuos arbóreos. En la actualidad, dicha compensación forestal fue ejecutada en la Finca La María, predio previamente aprobado por la autoridad ambiental, y se encuentra en la fase de seguimiento, vigilancia y mantenimiento, conforme a las obligaciones establecidas en el acto administrativo correspondiente.

$$\text{Avance de Erradicaciones (\%)} = \frac{\text{No.de individuos forestales erradicados}}{\text{No.de individuos forestales a erradicarse segun permiso ambiental}} * 100$$

$$\text{Avance de Erradicaciones (\%)} = \frac{8}{8} * 100 = 100\%$$

El indicador evidencia la ejecución del aprovechamiento forestal correspondiente a la erradicación de los ocho (8) individuos arbóreos previamente autorizados por la autoridad ambiental competente (CVC), en cumplimiento de las condiciones establecidas en el respectivo acto administrativo.

5.3.2. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA

El trámite de renovación del permiso de aprovechamiento forestal para el área destinada a la construcción de la bocatoma se encuentra actualmente en curso ante la autoridad ambiental competente (CVC). Como parte del proceso, ya fue efectuado el pago correspondiente a la evaluación del trámite, a través de la Alcaldía Municipal de Ginebra. En la actualidad, se está a la espera del pronunciamiento oficial por parte de la CVC, mediante el cual se determine la viabilidad de la renovación del permiso y se emita el respectivo acto administrativo.

5.3.3. PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE

El permiso de ocupación de cauce se encuentra actualmente vigente. No obstante, debido a las modificaciones efectuadas al diseño de la bocatoma, es necesario adelantar ante la autoridad ambiental competente (CVC) el trámite correspondiente para la modificación, prórroga o, de ser requerido por la autoridad, la obtención de un nuevo permiso que incorpore las condiciones y el área de intervención definidas en el diseño actualizado.

5.3.4. PERMISO DE ROTURA DE VÍAS – MUNICIPIO DE GINEBRA

Mediante Resolución No. **014-09-2025**, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Ginebra concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y ocupación del espacio público para la ejecución de las obras antes mencionadas.

Esta autorización incluye el permiso de rotura de vías en los tramos donde sea necesario intervenir para la instalación o reparación de redes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y bajo la supervisión de la autoridad municipal.

El permiso fue otorgado por un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la resolución (24 de septiembre de 2025), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las actividades autorizadas y cumplir con las obligaciones establecidas.

5.3.5. PERMISO ROTURA DE VÍAS – MUNICIPIO DE GUACARÍ

Mediante Resolución No. **140-23-3-001**, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Guacarí concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y ocupación del espacio público para la ejecución de las obras del proyecto que ejecuta el consorcio Redes y PTAPS Valle.

El permiso fue otorgado por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la resolución (13 de enero de 2026), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las actividades autorizadas y cumplir con las obligaciones establecidas.

5.3.6. COMPENSACIÓN AMBIENTAL PTAP GINEBRA

Actualmente, la compensación forestal se encuentra en la fase de seguimiento, vigilancia y mantenimiento, de conformidad con las obligaciones y condiciones establecidas en el acto administrativo correspondiente.

Tabla 23.. *Número de individuos arbóreos por especie a sembrar*

Compensación Ambiental PTAP Ginebra		
Especie	Nombre común	Cantidad
Guadua angustifolia	Guadua	7
Manifera indica	Mango	7
Cecropia peltata	Yarumo	7

5.4. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE RCD

En los meses anteriores se tenía como gestor para la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) **SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.**, como su permiso no se encuentra vigente, se está realizando las gestiones pertinentes para realizar la disposición final de los RCD en una empresa inscrita ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Los residuos de construcción y demolición (RCD) no pétreos, tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel, continúan siendo entregados al gestor **Centro de Reciclaje BANCANAIMA**, ubicado en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra (Valle del Cauca), para su respectivo aprovechamiento y gestión conforme a la normativa ambiental vigente.

Indicador:

RCD pétreos

$$Disposición (\%) = \frac{Volumen \text{ Certificado Año } 2026(m3)}{Volumen \text{ despachado Año } 2026 (m3)} * 100$$

$$Disposición (\%) = \frac{2861 (m3)}{2861 (m3)} * 100 = 100\%$$

El indicador de RCD pétreos evidencia los volúmenes de residuos de construcción y demolición de naturaleza pétreo generados durante la ejecución de las diferentes actividades constructivas del proyecto, así como las cantidades transportadas y entregadas al sitio autorizado para su disposición final o aprovechamiento, según corresponda.

5.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro (3) puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí y en la Oficina Principal del proyecto ubicada en el Corregimiento de Costa Rica, cada punto con contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente:

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras de frutas, verduras y restos de alimentos).

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como servilletas, papeles metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico.

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado por la CVC.

5.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado en cada una de las plantas. Estos frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal ajeno al proyecto.

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento.

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de combustibles, además de los avisos y cartelera informativa.

5.7. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y lavamanos por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, de las aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en cada uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania con dos (2) unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios públicos.

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de estos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto.

5.8. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe componente SST)

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST)

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.

5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL

 18 ago. 2026 11:18:45 a. m. ptap guacari valle	 18 ago. 2026 11:27:32 a. m. ptap guacari valle
Foto 1. Limpieza Puntos ecológicos  18 ago. 2026 11:40:52 a. m. ptap guacari valle	Foto 2. Orden y aseo Baños Obra  20/08/26 - 2:50 pm. Ginebra, Valle del Cauca Consortio Interaguacari
Foto 3. Residuos Aprovechables 	Foto 4. Reunión Comité de veeduría  29/08/2026 7:37:12 a. m. Unnamed Road Guacari Valle del Cauca
Foto 5. Inspección de actividades	Foto 6. Capacitación Ambiental: Código de Colores



Foto 7. Inspección en los frentes de trabajo después del terremoto



Foto 8. Mantenimiento compensación Ambiental
PTAP Ginebra (Finca La María)

6. ANEXOS

Se anexan al presente informe los siguientes documentos:

1. Anexo Técnico:
2. Anexo Documental:
 - Oficios
3. Anexos SST:
 - Documentos de vehículos.
 - Seguridad social de contratistas.
 - Ficha técnica TG 15000CXE3.
 - Hoja de vida equipos pajarita.
 - Hoja de vida equipos máquina.
 - Hoja de vida equipos planta.
 - Formatos de seguridad (inducción, entrega EPP, charlas e inspecciones)
4. Anexo Ambiental:
 - Listado de asistencia capacitación ambiental
