

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3516 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR NIT No. 890.480.059 –1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS BOLIVAR CI NIT 902.012.474-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 04

PERIODO DEL: 01/Julio/2026 AL 20/Julio/2026

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	3
2.1. Localización	3
2.2. Estado Inicial De Las Vías	6
2.3. Características Técnicas Del Proyecto.....	6
2.4. Alcance Contractual.....	6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	7
4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES CONTRATADAS	8
4.1. Actividades Realizadas.....	10
5. INFORME DE AVANCE	12
5.1. Avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas	12
5.2. Avance Físico por Items.....	iError! Marcador no definido.
5.3. Avance Financiero	iError! Marcador no definido.
5. MAQUINARIA.....	15
6. REGISTRO DEL CLIMA.....	18
7. SEGUIMIENTO DEL PLAN CALIDAD – ACTIVIDADES EJECUTADAS	19
8. REGISTRO FOTOGRAFICO	20
9. DISEÑOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	82
9.2. Figura De La Estructura De Pavimento	82
10. DIFICULTADES PRESENTADAS	83
11. CONCLUSIONES	84

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa del departamento de Bolívar. Fuente: Navegador.	4
Ilustración 2. Esquema de la estructura de pavimento. Fuente: Elaboración propia.	35

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 3516 de 2025 suscrito con la Gobernación de Bolívar, el **CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI** presenta el **Informe Técnico de Obra No. 4** correspondiente al período comprendido entre el **01 de Julio** y el **20 de Julio** de 2026. El proyecto consiste en la construcción de pavimento rígido MR-38 en diferentes vías urbanas del municipio de Calamar, con una longitud total a intervenir aproximada de 2.263 Metros lineales, distribuida en varios frentes (por ejemplo, Barrio Brisas del Magdalena, Calle 32, Calle 33, Calle 34 entre vía oriental y CRA 3, entre otros).

El alcance técnico incluye excavaciones, conformación y mejoramiento de subrasante, suministro e instalación de geotextil, sub-base granular clase C, losas de concreto MR-38, bordillos, andenes, señalización y todos los controles de calidad y planes de gestión (PMA, PC, SST, PMT) necesarios para la ejecución conforme con las Especificaciones INVÍAS aplicables. Las actividades ejecutadas durante el periodo reportado comprenden topografía, excavaciones, transporte y adecuación de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado, suministro e instalación de geotextil y colocación de sub-base granular, Fundido de losas de concreto MR-38 en el **Frente No.1 (Barrio Brisas del Magdalena) Y Frente No.2 (Calle #32)**

El presente informe además documenta condiciones externas que afectan la ejecución (climáticas y de interferencia con redes de servicios públicos), el avance físico-financiero por ítems y propone acciones correctivas para mitigar impactos en calidad, seguridad, plazo y costos. Los registros climáticos y fotográficos, así como los controles de calidad ejecutados, se anexan como soporte técnico.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto se desarrolla en la cabecera municipal de Calamar, Departamento de Bolívar, en los siguientes sectores:


Tabla 1. Relación de calles a intervenir. Fuente: Elaboración propia.

LOCALIZACIÓN	CASCO	DETALLE	LONGITUD	TOTAL METROS
VIA 1 - BARRIO BRISAS DEL MAGDALENA	URBANO	CRA 2 ENTRE CARRERA 3 Y CALLE 38	893,00	893,00
VIA 2	URBANO	TRANVERSAL 2B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15	187,30	187,30
VIA 3	URBANO	CALLE 32 ENTRE VIA ORIENTAL Y CRA 3	278,50	278,50
VIA 4	URBANO	CALLE 33 ENTRE VIA ORIENTAL Y TRANSVERSAL 3	279,50	279,50
VIA 5	URBANO	CALLE 34 ENTRE VIA ORIENTAL Y CRA 3	279,50	279,50
VIA 6	URBANO	CALLE 18 ENTRE CRA 6 Y TRANSVERSAL 3	346,00	346,00
			TOTAL	2.263,80

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01


Longitud total aproximada a intervenir: **2.263,80 metros lineales**

Ilustración 1. Mapa del departamento de Bolívar. Fuente: Navegador.

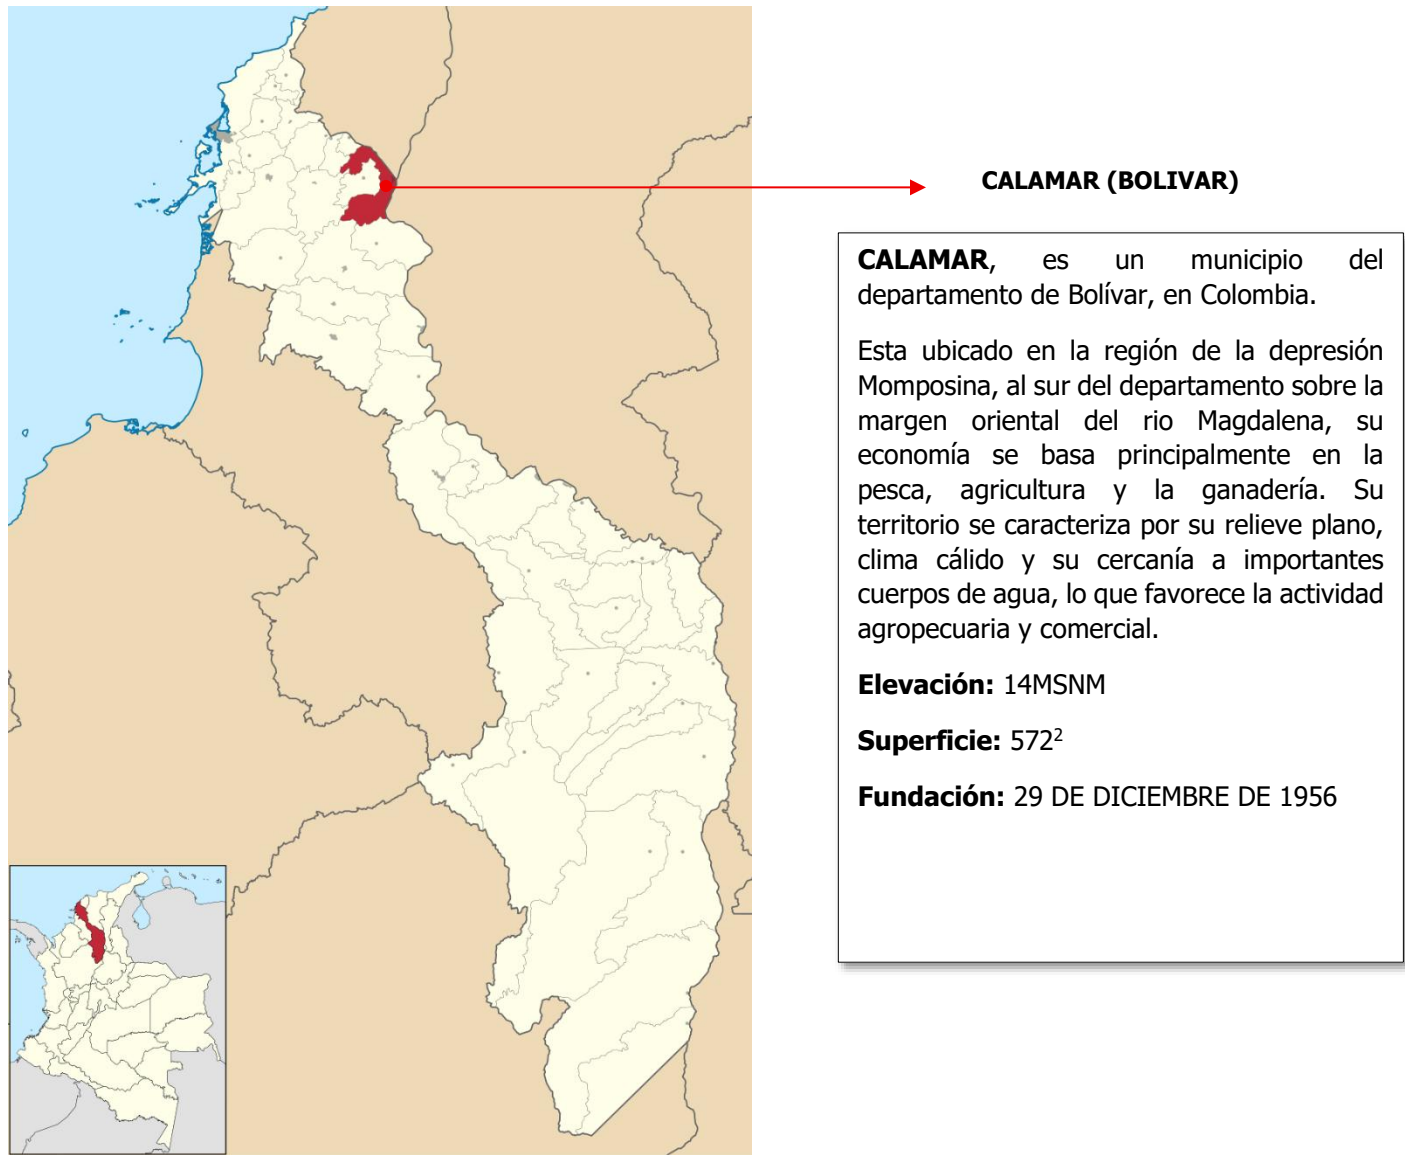

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

Tabla 2. Localizaciones específicas de las calles a intervenir. Fuente: Elaboración propia.

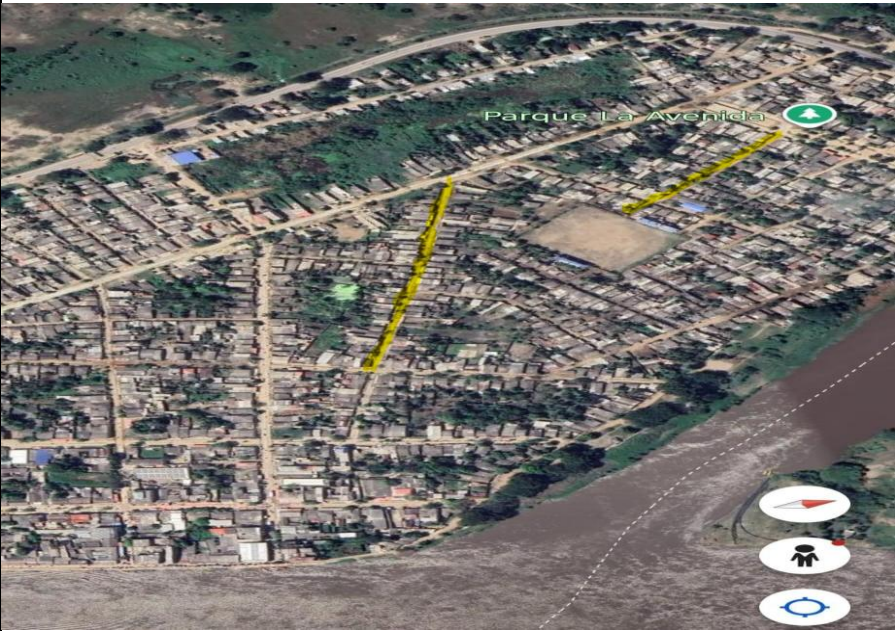CALLE 32 ENTRE VIA ORIENTAL Y CRA 3	
CALLE 33 ENTRE VIA ORIENTAL Y TRANSVERSAL 3	
CALLE 34 ENTRE VIA ORIENTAL Y CRA 3	
CRA 2 ENTRE CARRERA 3 Y CALLE 38	
TRANSVERSAL 2B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15	
CALLE 18 ENTRE CRA 6 Y TRANSVERSAL 3	

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

2.2. Estado Inicial De Las Vías

Previo al inicio de obra, las vías objeto de intervención presentaban:

- Superficie en afirmado y/o material granular deteriorado
- Presencia de baches, huecos y pérdida de material
- Problemas de drenaje superficial
- Escorrentías naturales no canalizadas
- Dificultad en tránsito vehicular y peatonal

Estas condiciones generaban aumento en tiempos de viaje, mayores costos de operación vehicular y riesgo de accidentalidad.

2.3. Características Técnicas Del Proyecto

La estructura del pavimento diseñada contempla:

- Pavimento en concreto hidráulico MR-38
- Espesor de losa: 20 cm
- Subbase estabilizada con cemento: 15 cm
- Mejoramiento de subrasante: 20cm
- Ancho promedio de calzada: 4,70 m
- Bordillos en concreto
- Señalización vertical
- Corte y sello de juntas

El diseño estructural fue desarrollado con base en el estudio de tránsito, considerando un período de diseño de 20 años.

2.4. Alcance Contractual

El alcance general del contrato comprende:

- Excavación en material común
- Conformación y mejoramiento de subrasante
- Suministro e instalación de subbase estabilizada con cemento
- Construcción de pavimento rígido MR-38
- Corte y sello de juntas
- Construcción de bordillos y andenes

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

- Señalización vertical

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tabla 3. Información contractual. Fuente: Elaboración propia.

No del contrato	No. 3516 de 2025		
Contratista	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI – NIT: 902.012.474-1		
	Nombre del Integrante	NIT	Compromiso (%)
	CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	901.069.828-7	90%
	INGECONSTRUJC SAS	901.215.664-2	10%
	TOTAL:		100%
Interventoría	Ingeniería Máster SAS		
Valor Inicial	\$ 6.256.954,253		
Adiciones	\$ 0.00		
Valor Acumulado del contrato	\$ 6.256.954,253		
Plazo	SEIS (6) meses		
Fecha de Inicio	24 de febrero del 2026		
Fecha de Terminación	24 de agosto del 2026		

Tabla 4. Información de polizas. Fuente: Elaboración propia.

Etapas	Tipo de Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Tomador	Vigencia	Valor Total (\$)
Contrato	Cumplimiento	Mundial de Seguros S.A.	100030506	Consortio Vias de Bolivar CI	19/01/2026 – 19/11/2031	1.877.086.275,90
Contrato	Salario y prestaciones sociales	Mundial de Seguros S.A.	100030506	Consortio Vias de Bolivar CI	19/01/2026 – 10/07/2029	312.847.712,65
Contrato	Estabilidad de la obra	Mundial de Seguros S.A.	100030506	Consortio Vias de Bolivar CI	19/07/2026 – 19/07/2031	312.847.712,65

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES CONTRATADAS

Las actividades contratadas para la construcción en pavimento rígido de vías urbanas del municipio de Calamar – Bolívar, fueron las siguientes:

Tabla 4. Actividades de obra y cantidades contratadas. Fuente: Elaboración propia

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1. PAVIMENTO MR 38.			
1.1	Localización y replanteo	M2	13.535,02
1.2	Demolición de pavimentos rígido y flexible.	M2	90
1.3	Demolición de bordillos en concreto y retiro del material al botadero autorizado	ML	2.228,00
1.4	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	5.440,24
1.5	Suministro e instalación de geotextil tejido NT 1600	M2	13.535,02
1.6	Conformación de calzada existente	M2	10.365,70
1.7	Relleno material afirmado	M3	570.48
1.8	Suelo de subbase estabilizado con cemento	M3	1.554,86
1.9	Pavimento de Concreto hidráulico MR 38 incluye acero y juntas	M3	2.073,14
1.10	Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye, preparación del concreto y hormigonado, construcción de junta y aplicación de antisol.	M3	221.85
1.11	Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo así: 1 de 3/8`` y U de 3/8``cada 0,30m Lv = 0,60, construcción de juntas y aplicación de antisol	ML	4.527,60
1.12	Realce de MH, incluye tapa HD	UN	20
1.13	Reparacion de acometidas de alcantarillado	UN	29
1.14	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto	UN	281

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

1.15	Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 (60.000PSI)	KG	12.478.97
1.16	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	M3-KM	19.250,01
2. SEÑALIZACIÓN			
2,1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UN	12
3. NO PREVISTOS			
3.1	Excavación manual en material común	M3	740,23
3.2	Suministro e instalacion de tuberia PF+UAD 3" de agua potable	ML	1370,8
3.3	Empalmes tuberia de 3" PF+UAD de agua potable con tubería en AC existente (incluye accesorios)	UN	32
3.4	Reubicacion de postes electricos de 8 metros (incluye postres y accesorios)	UN	10
3.5	Estabilización con suelo cemento con material granular de prestamo para subbase	M3	1656,95
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
N/A. OTROS COMPONENTES			
Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST			1,00
Plan de Manejo Ambiental – PMA			1,00
Plan de Calidad – PC			1,00
Plan de Manejo de Trafico – PMT			1,00

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

4.1. Actividades Realizadas

Durante el período del presente informe se dio el inicio de la ejecución de obra, se describen las actividades como tales como la topografía, excavaciones, instalación de geotextil y material seleccionado, subase suelo cemento, compactación, instalación de acometidas domiciliarias de agua potable y de alcantarillado, verificación de elementos que afectan la ejecución, dichas actividades logran desarrollar y se evidencian a continuación:

Tabla 5. Actividades realizadas en el periodo actual. Fuente: Elaboración propia.

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1. PAVIMENTO MR 38.			
1.1	Localización y replanteo	M2	1.044
1.4	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	277.67
1.5	Suministro e instalación de geotextil tejido NT 1600	M2	1.185
1.6	Conformación de calzada existente	M2	800
1.7	Relleno material afirmado	M3	168.3
1.9	Pavimento de Concreto hidráulico MR 38 incluye acero y juntas	M3	99.41
1.10	Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye, preparación del concreto y hormigonado, construcción de junta y aplicación de antisol.	M3	5.4
1.11	Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo así: 1 de 3/8`` y U de 3/8``cada 0,30m Lv = 0,60, construcción de juntas y aplicación de antisol	ML	30
1.12	Realce de MH, incluye tapa HD	UN	4
1.13	Reparacion de acometidas de alcantarillado	UN	2

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

1.14	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto	UN	40
1.15	Acero de refuerzo $F_y=4200\text{kg/cm}^2$ (60.000PSI)	KG	1.344.82
1.16	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	M3-KM	3770.07
3. NO PREVISTOS			
3.1	Excavación manual en material común	M3	166.4
3.2	Suministro e instalacion de tuberia PF+UAD 3" de agua potable	ML	150
3.3	Empalmes tuberia de 3" PF+UAD de agua potable con tubería en AC existente (incluye accesorios)	UN	3
3.4	Reubicacion de postes electricos de 8 metros (incluye postes y accesorios)	UN	8
3.5	Estabilización con suelo cemento con material granular de prestamo para subbase	M3	466.65

Las anteriores actividades fueron realizadas en el FRENTE No 1 y FRENTE No 2 de obra, localizado en el barrio **BRISAS DEL MAGDALENA (CRA 2 ENTRE CARRERA 3 Y CALLE 38) y Calle #32 (CALLE 32 ENTRE VIA ORIENTAL Y CRA 3)**

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

5. INFORME DE AVANCE

5.1. Avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas

Durante este periodo de obra corresponde a las actividades de la obra **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"**

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

Tabla 6. Avances de Obra. Fuente: Elaboración propia.

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

1.52.1	FASE 01 DEL PROYECTO	01/06/26	30/06/2026	20%
1.52.1.24	BARRIO BRISAS DEL MAGDALENA - TRAMO 3 - Long = 200mts	01/06/26	30/06/26	90%
1.52.1.24.10	1. PAVIMENTO RIGIDO MR 38	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.178	INICIO DE OBRA	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.180	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.181	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.182	ARREGLO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.183	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO NT 16000	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.184	ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO CON MATERIAL GRANULAR DE PRESTAMO PARA SUBASE	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.185	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMNIENTO AFIRMADO	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.186	CONFORMACION DE CALZADA	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.187	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.188	ARREGLO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.189	Concreto Clase D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) para Anden y Bermas	1/06/2026	30/06/26	50%
1.52.1.24.10.190	Concreto Clase D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) Bordillos	1/06/2026	30/06/26	50%
1.52.1.24.10.191	Acero de refuerzo $F_y = 4.200 \text{ Kg/cm}^2$ (60.000 PSI).	1/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.192	CORTE Y SELLO JUNTAS	1/06/26	30/06/26	30%
1.52.1.24.11	2. SEÑALIZACIÓN	1/06/2026	30/06/26	0%
1.52.1.24.11.34	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	1/06/26	30/06/2026	0%
1.52.1.25	FIN DE OBRA	01/06/26	30/06/2026	100%
25	FIN DEL PROYECTO	24/08/2026		0%

1.52.1	FASE 01 DEL PROYECTO	26/06/26	30/06/2026	20%
1.52.1.24	CALLE #32 - TRAMO 1 - Long = 160mts	26/06/26	30/06/26	30%
1.52.1.24.10	1. PAVIMENTO RIGIDO MR 38	26/06/26	30/06/26	0%
1.52.1.24.10.178	INICIO DE OBRA	26/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.180	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	26/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.181	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	26/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.182	ARREGLO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.183	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO NT 16000	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.184	ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO CON MATERIAL GRANULAR DE PRESTAMO PARA SUBASE	01/06/26	30/06/26	0%
1.52.1.24.10.185	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMNIENTO AFIRMADO	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.10.186	CONFORMACION DE CALZADA	01/06/26	30/06/26	100%
1.52.1.24.11	2. SEÑALIZACIÓN	1/06/2026	30/06/26	0%
1.52.1.24.11.34	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	1/06/26	30/06/2026	0%
1.52.1.25	FIN DE OBRA	01/06/26	30/06/2026	100%

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

El porcentaje de ejecución GENERAL hasta la fecha de este informe es de **32.76 %**


El porcentaje de ejecución PROGAMADO hasta la fecha de este informe es de **78.0 %**

5. MAQUINARIA

Tabla 7. Relación de maquinaria en obra. Fuente: Elaboración propia.

- Minicargador	BOB CAT S 570
	

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



- Volqueta	DOGE
------------	------



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

- Vibro Compactador	DINAPAC CC142
	

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN CALIDAD – ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el período del presente informe se ejecutaron actividades correspondientes a movimiento de tierras, transporte, adecuación de redes domiciliarias e instalación de estructura de pavimento. Para dichas actividades se aplicaron los controles establecidos en el Plan de Calidad aprobado, conforme a las Especificaciones Generales de Construcción INVÍAS y demás normas técnicas vigentes. A continuación, se presenta la matriz de control de calidad de las actividades ejecutadas.

Tabla 9. Seguimiento de plan de calidad. Fuente: Elaboración propia.

Ítem	Actividad	Controles de Calidad en Campo	Ensayos / Verificaciones	Frecuencia	Registros Asociados
1,1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	_ Verificación de cotas y alineamientos _ Revisión de material apto/no apto_ _ Control de niveles con equipo topográfico	_ Control topográfico _ Verificación visual del material	Permanente durante ejecución	_ Bitácora de obra _ Registro topográfico _ Acta de recibo parcial
1,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN (>1000 m)	_ Control de distancias _ Verificación de volquetas _ Control de disposición final	_ Registro de volúmenes transportados	Diario	_ Control diario de volquetas
1,3	ARREGLO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	_ Verificación de diámetro y tipo de racor _ Revisión de empalmes _ Compactación del relleno	_ Inspección visual de conexiones	Por intervención	_ Registro fotográfico _ Bitácora de obra
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO NT1600	_ Verificación de ficha técnica _ Revisión de traslapes mínimos _ Control de tensión y alineación	_ Certificado de calidad del fabricante _ Inspección visual de instalación	Por tramo instalado	_ Registro fotográfico _ Bitácora de obra
1,5	SUB_BASE GRANULAR CLASE C	_ Verificación de espesor _ Control de humedad _ Control de compactación _ Nivelación topográfica	_ Proctor Modificado _ Granulometría	Según especificación INVÍAS	_ Resultados de laboratorio _ Bitácora de obra _ Registro fotográfico

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas.


Tabla 10. Registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia.

FRENTE DE OBRA No 1 – BARRIO BRISAS DEL MAGDALENA –
ACTIVIDADES CRA 2 ENTRE CARRERA 3 Y CALLE 38

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

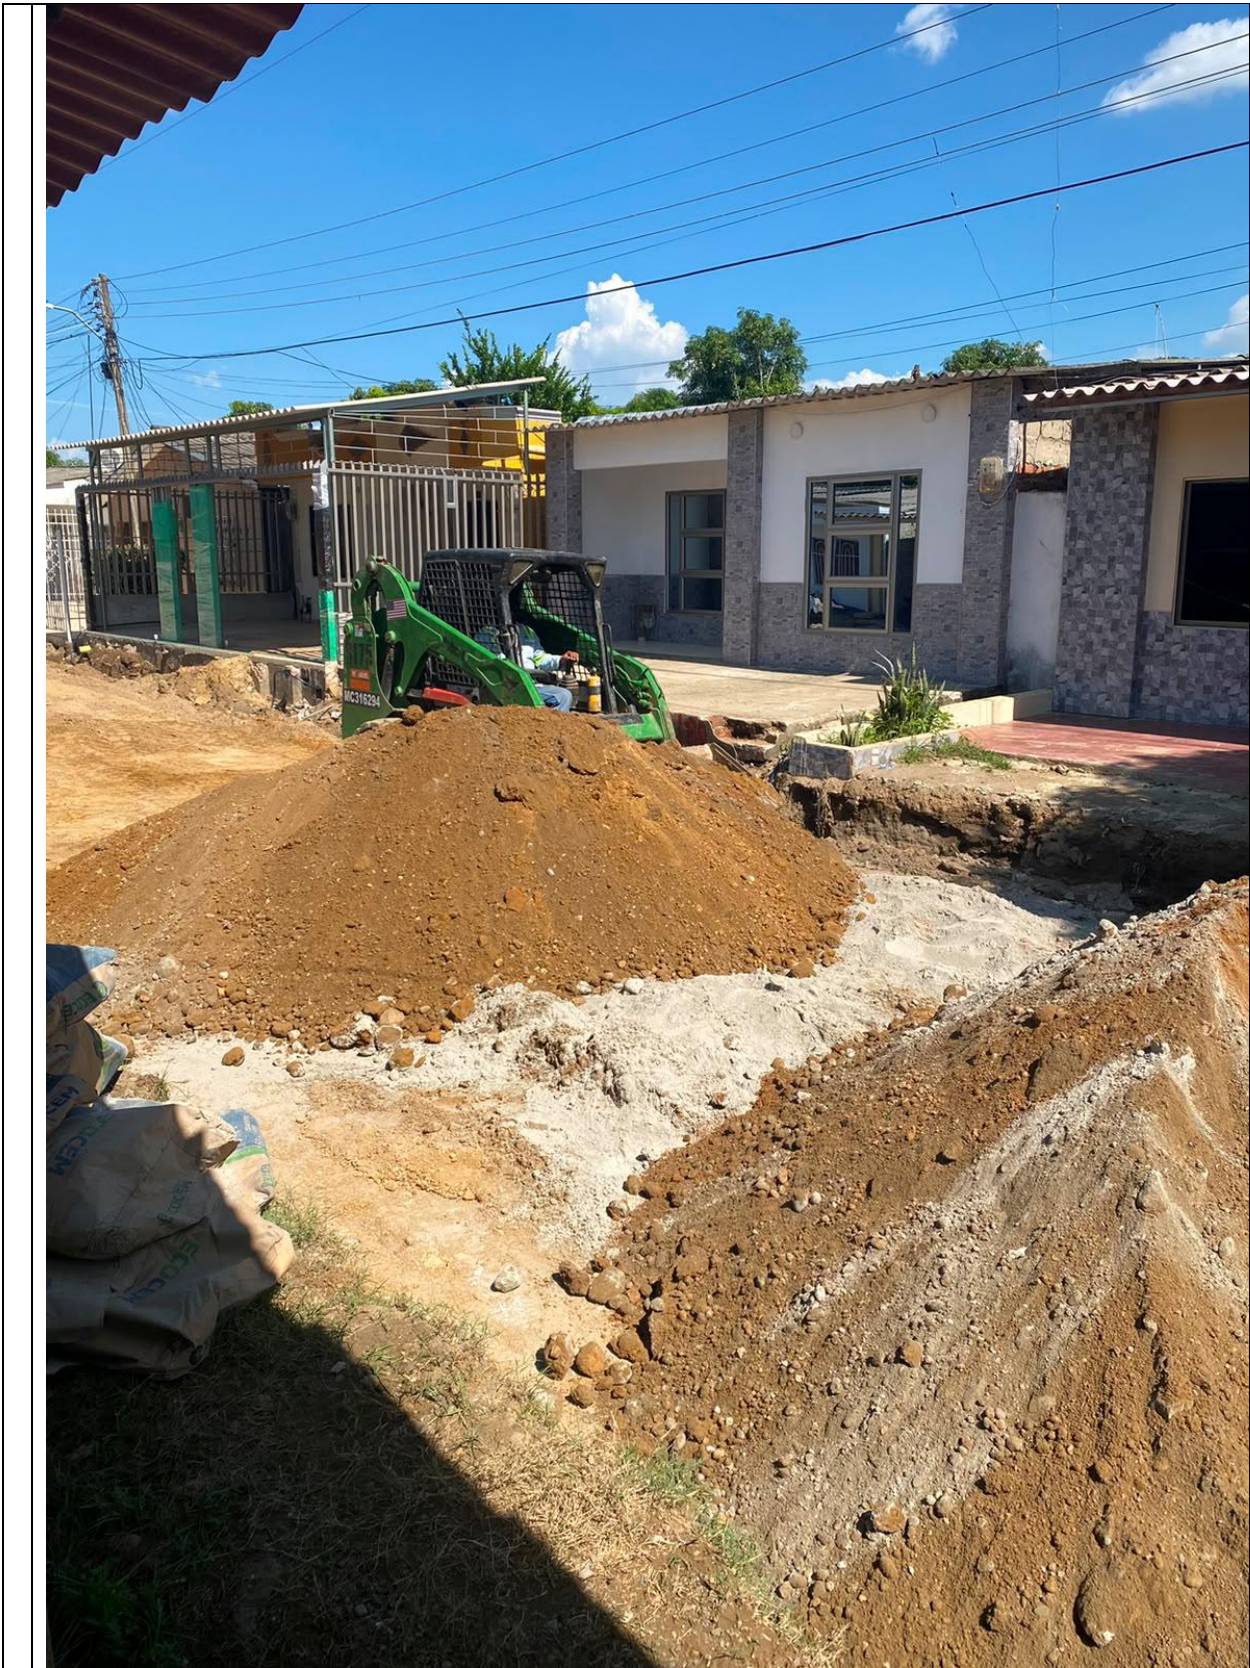

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01




	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

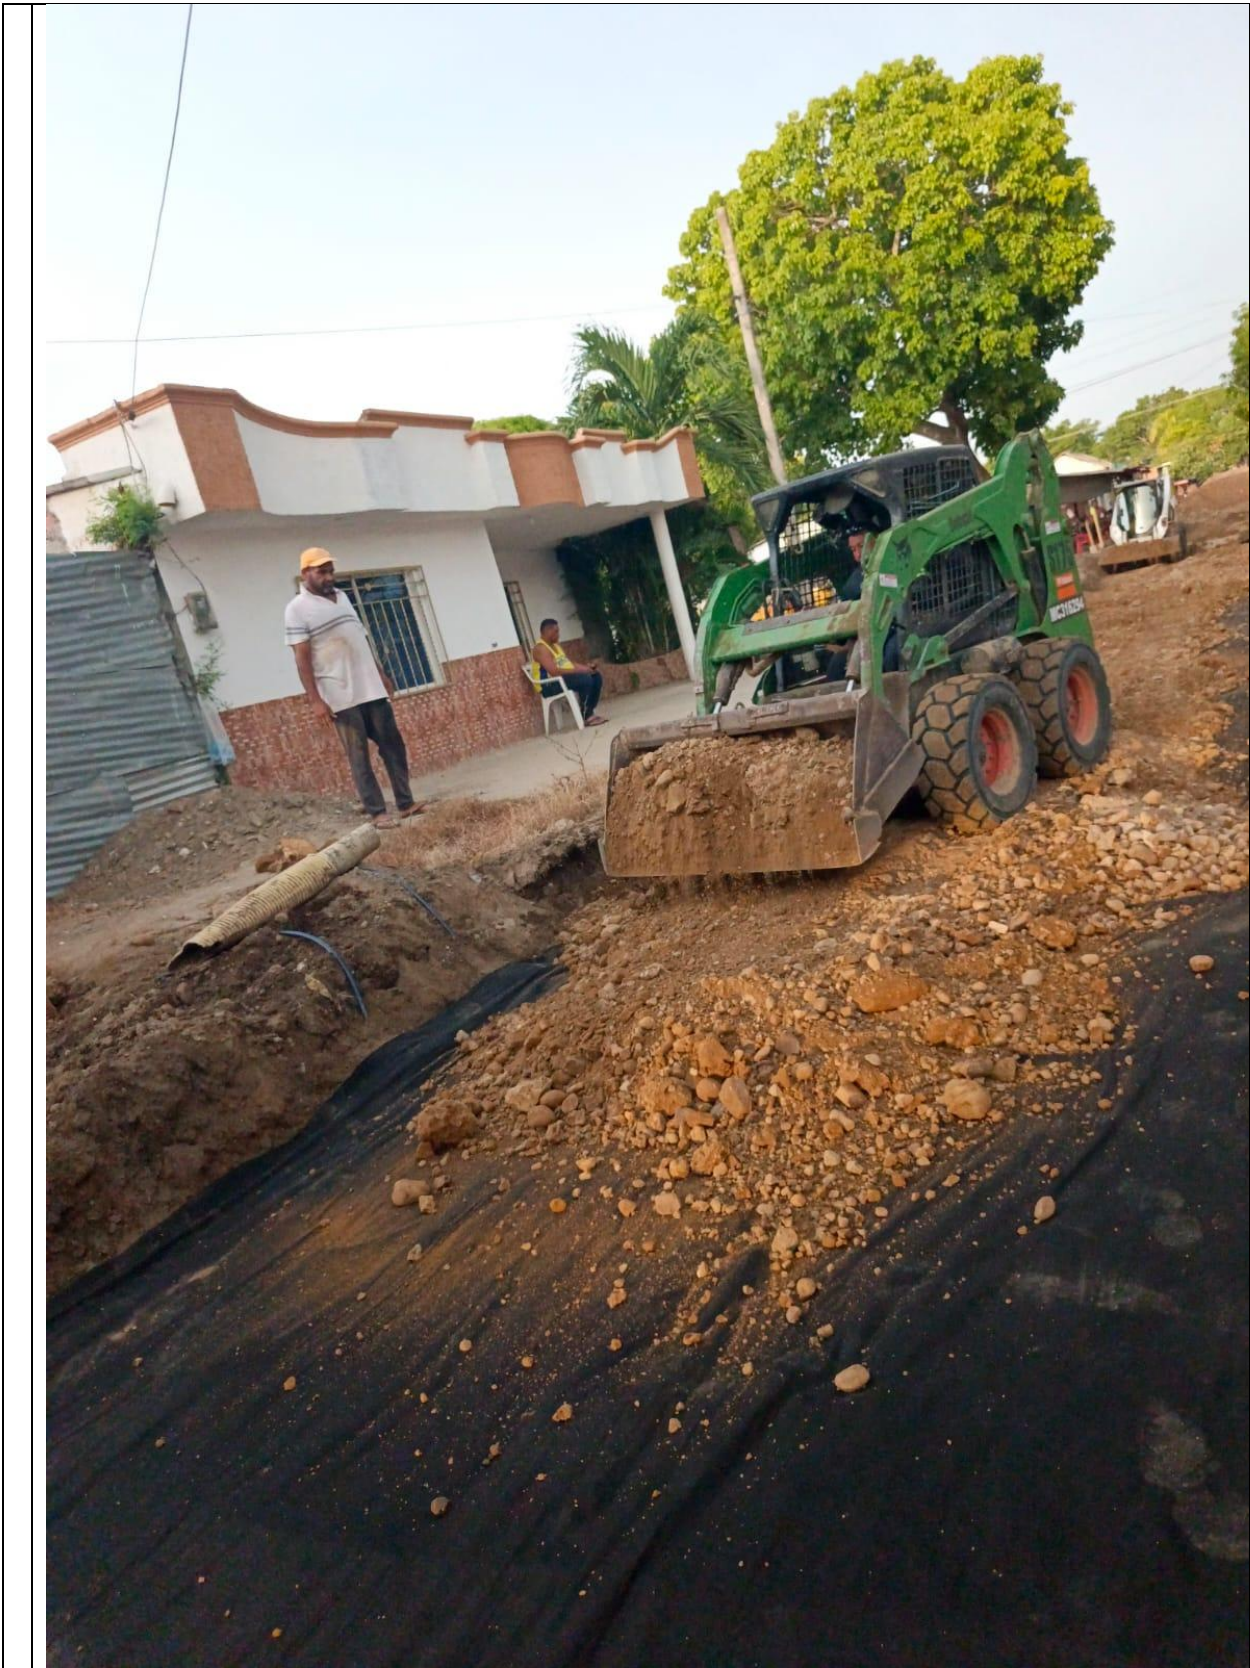

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01




	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

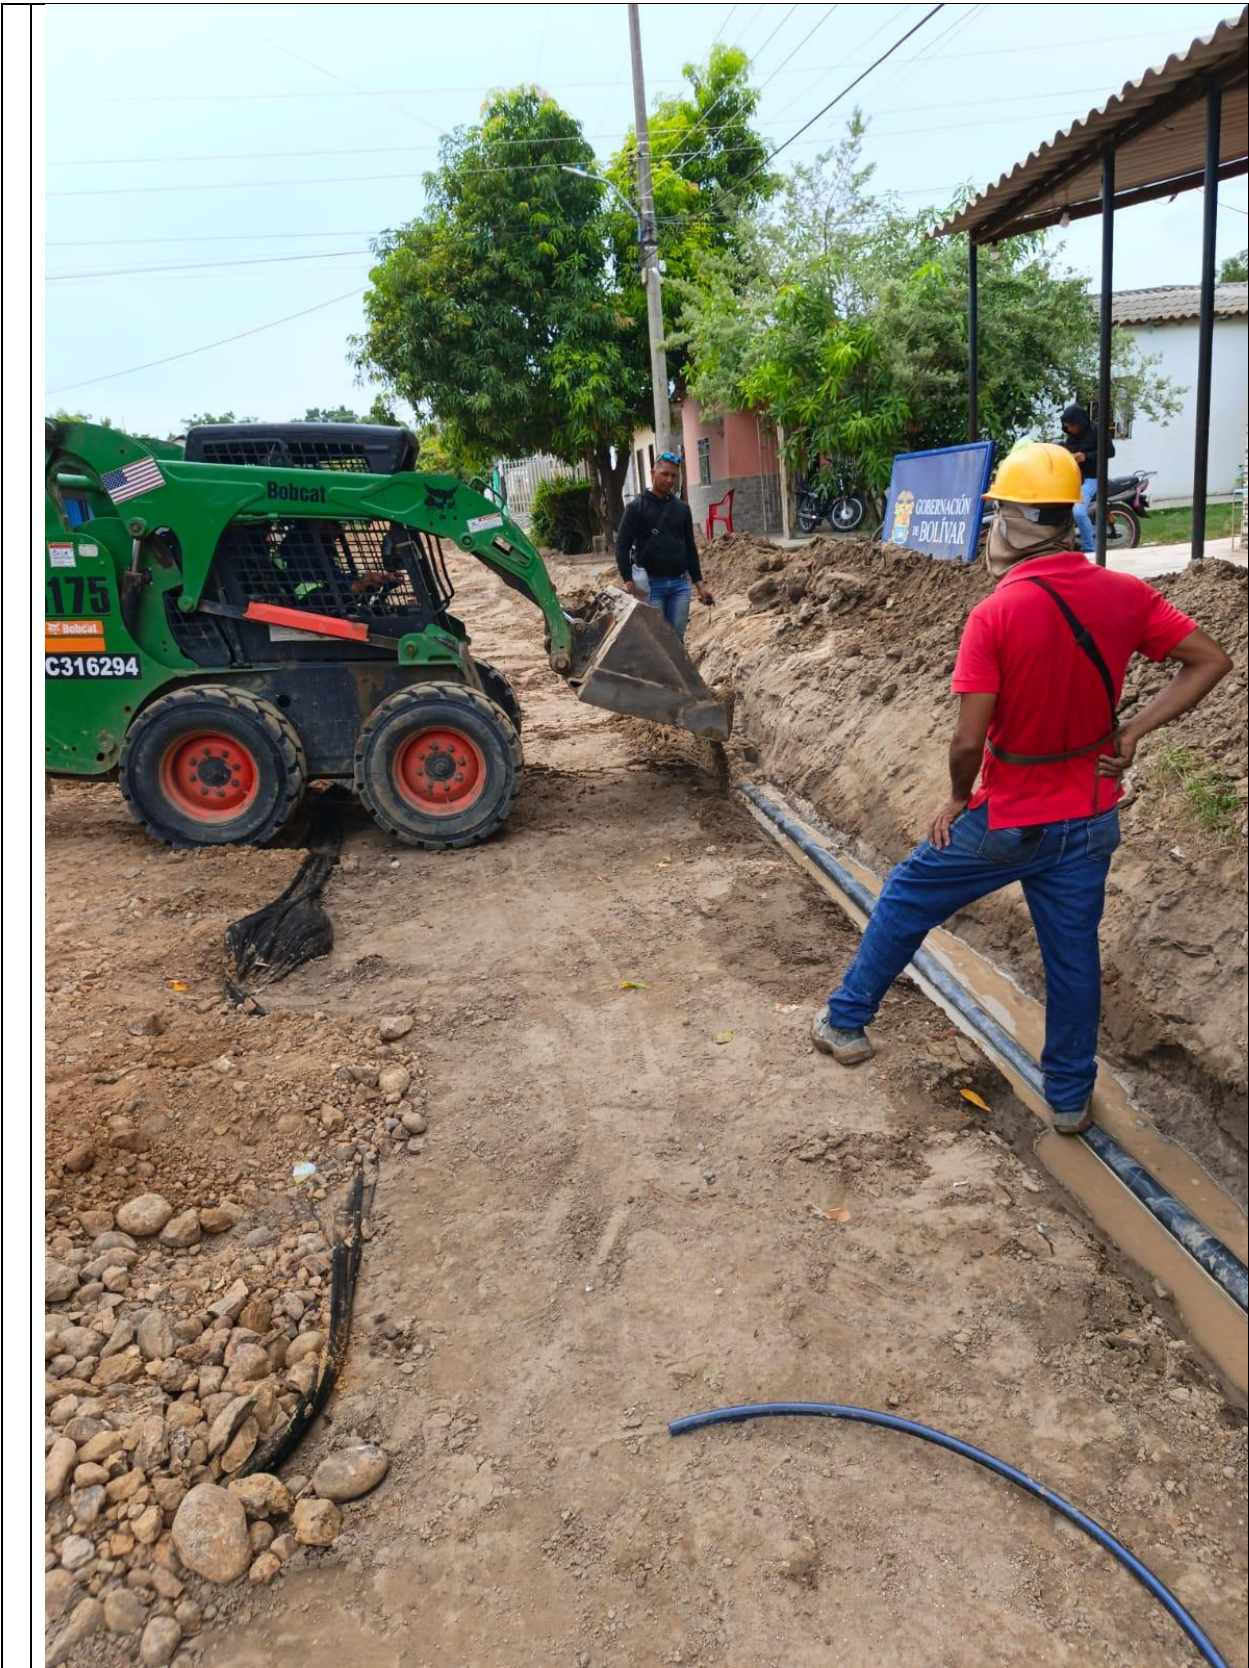

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1</p>	<p>Contrato N°: 3516 de 2025</p>
	<p>CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI</p>	<p>Versión: 01</p>



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01




	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

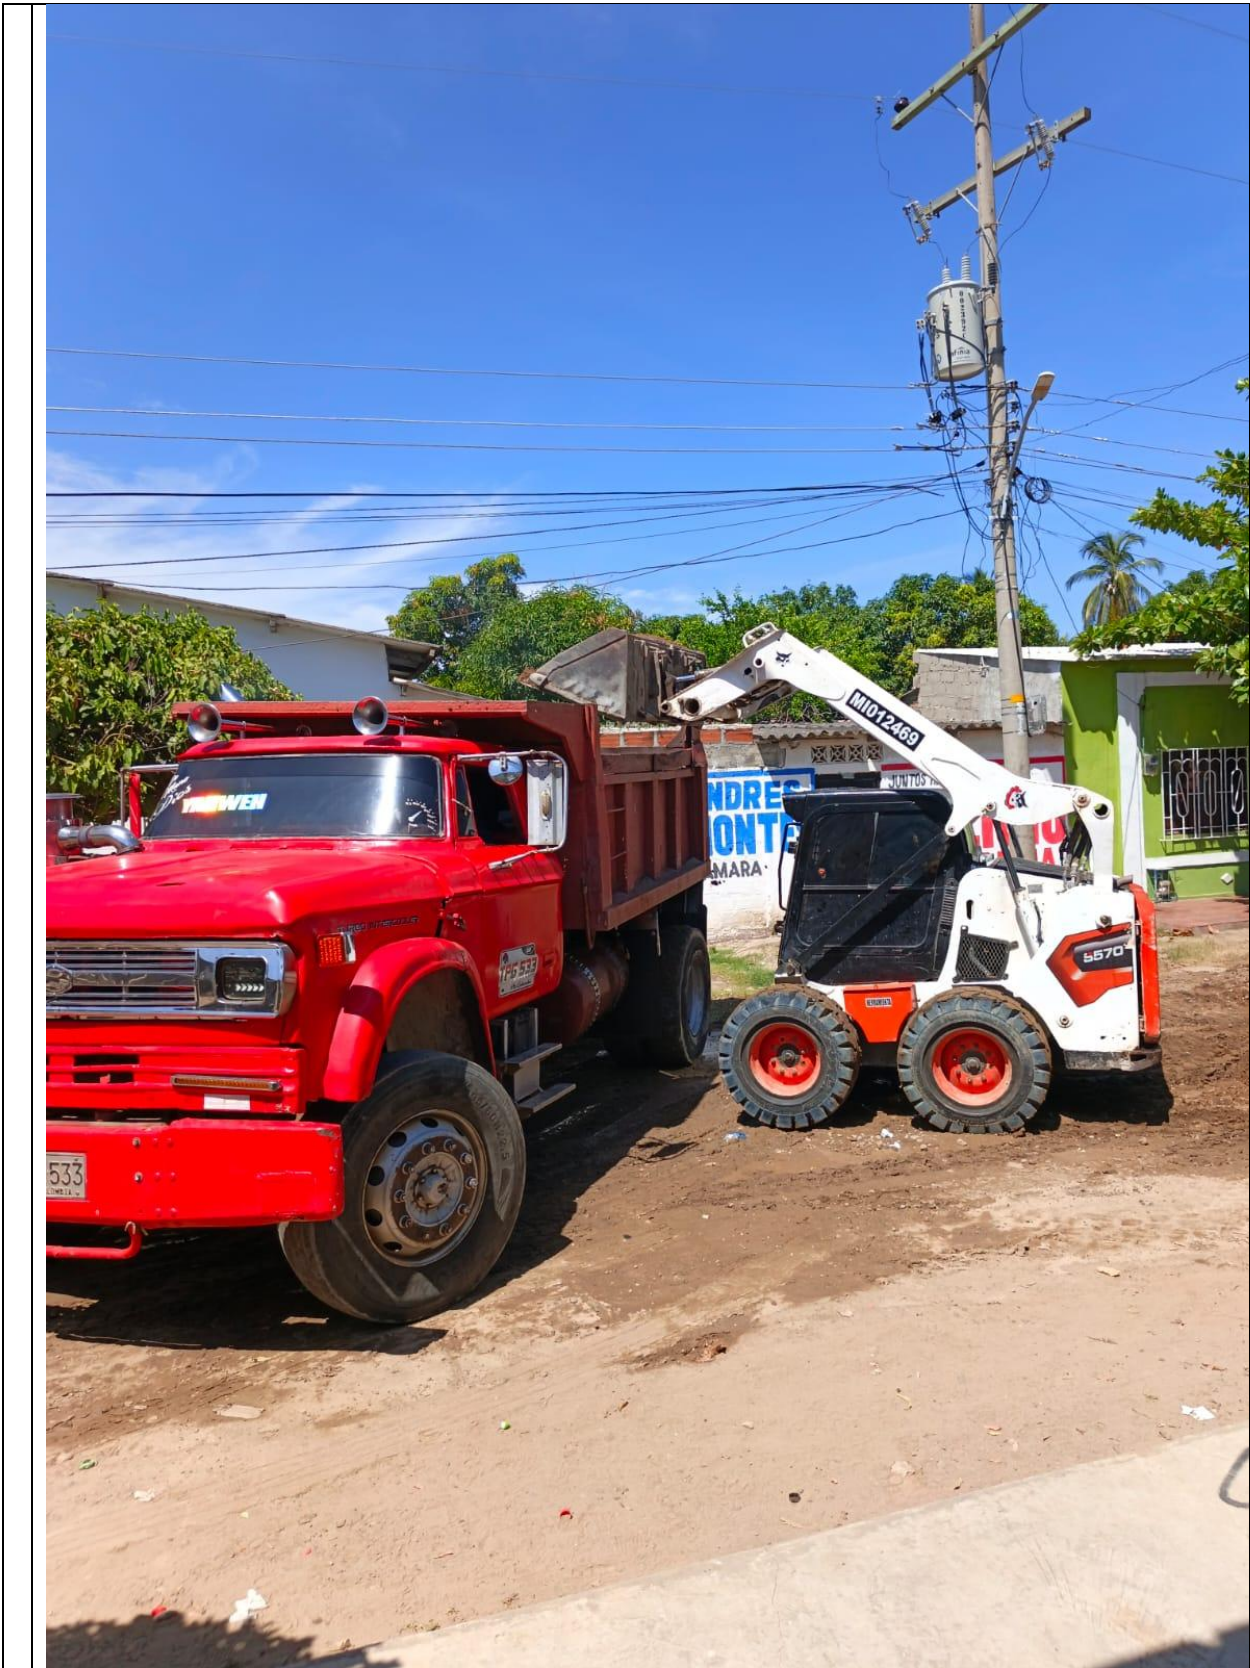

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1</p>	<p>Contrato N°: 3516 de 2025</p>
	<p>CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI</p>	<p>Versión: 01</p>



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1</p>	<p>Contrato N°: 3516 de 2025</p>
	<p>CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI</p>	<p>Versión: 01</p>



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01




	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

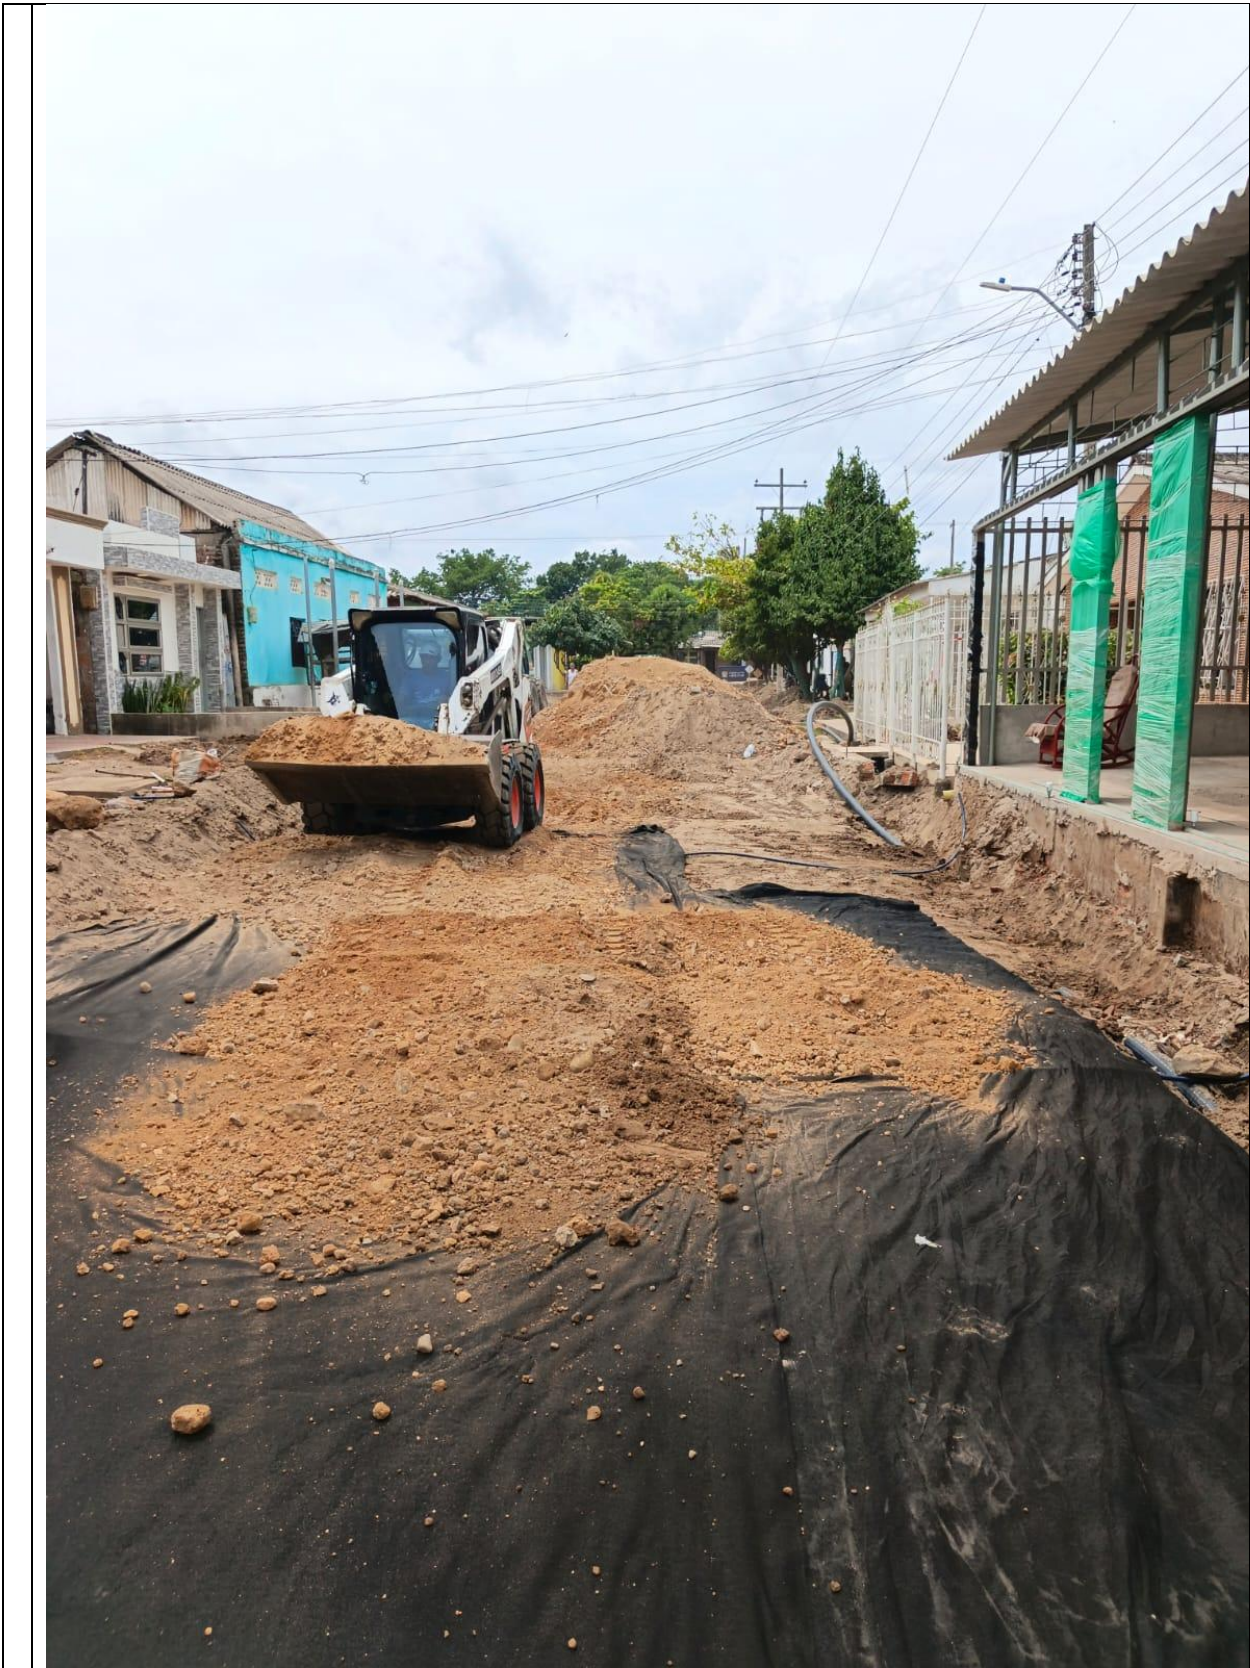

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01




	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

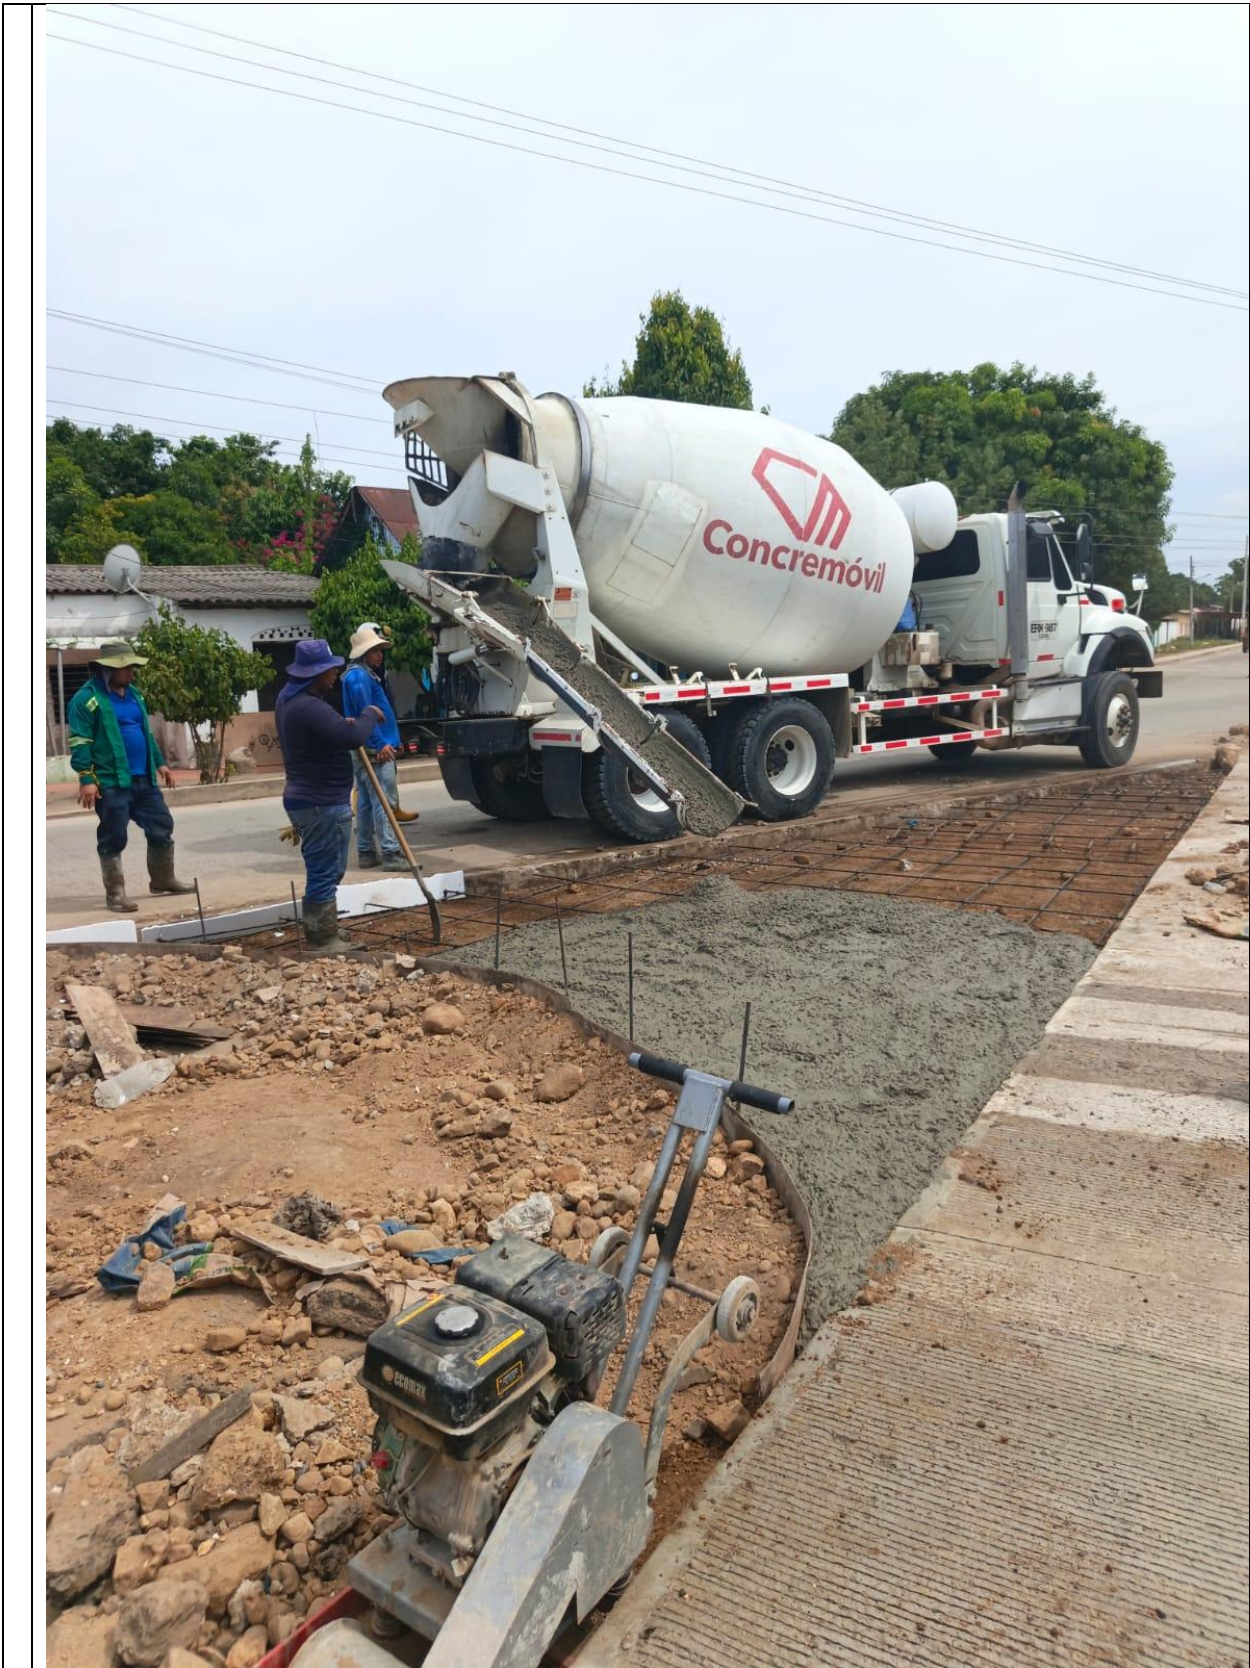

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01




	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01




	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

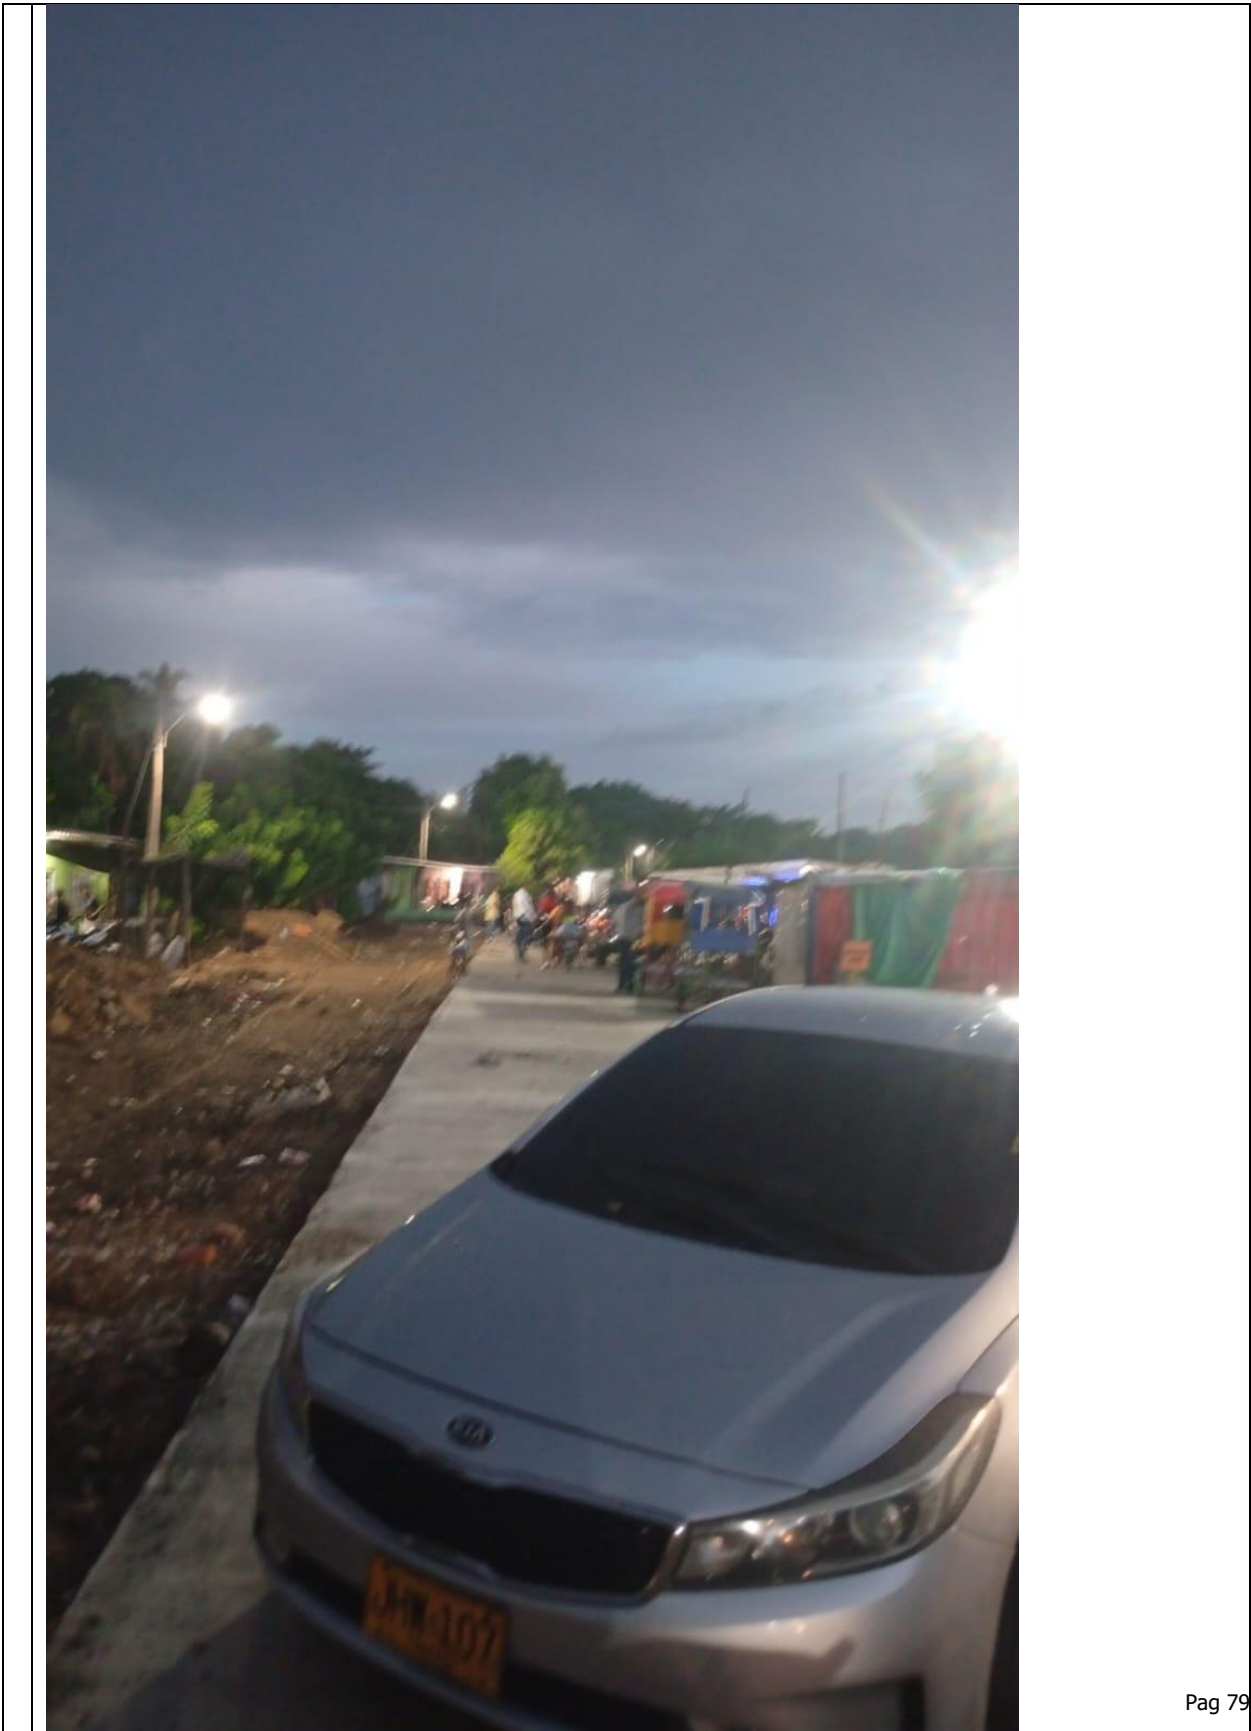

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

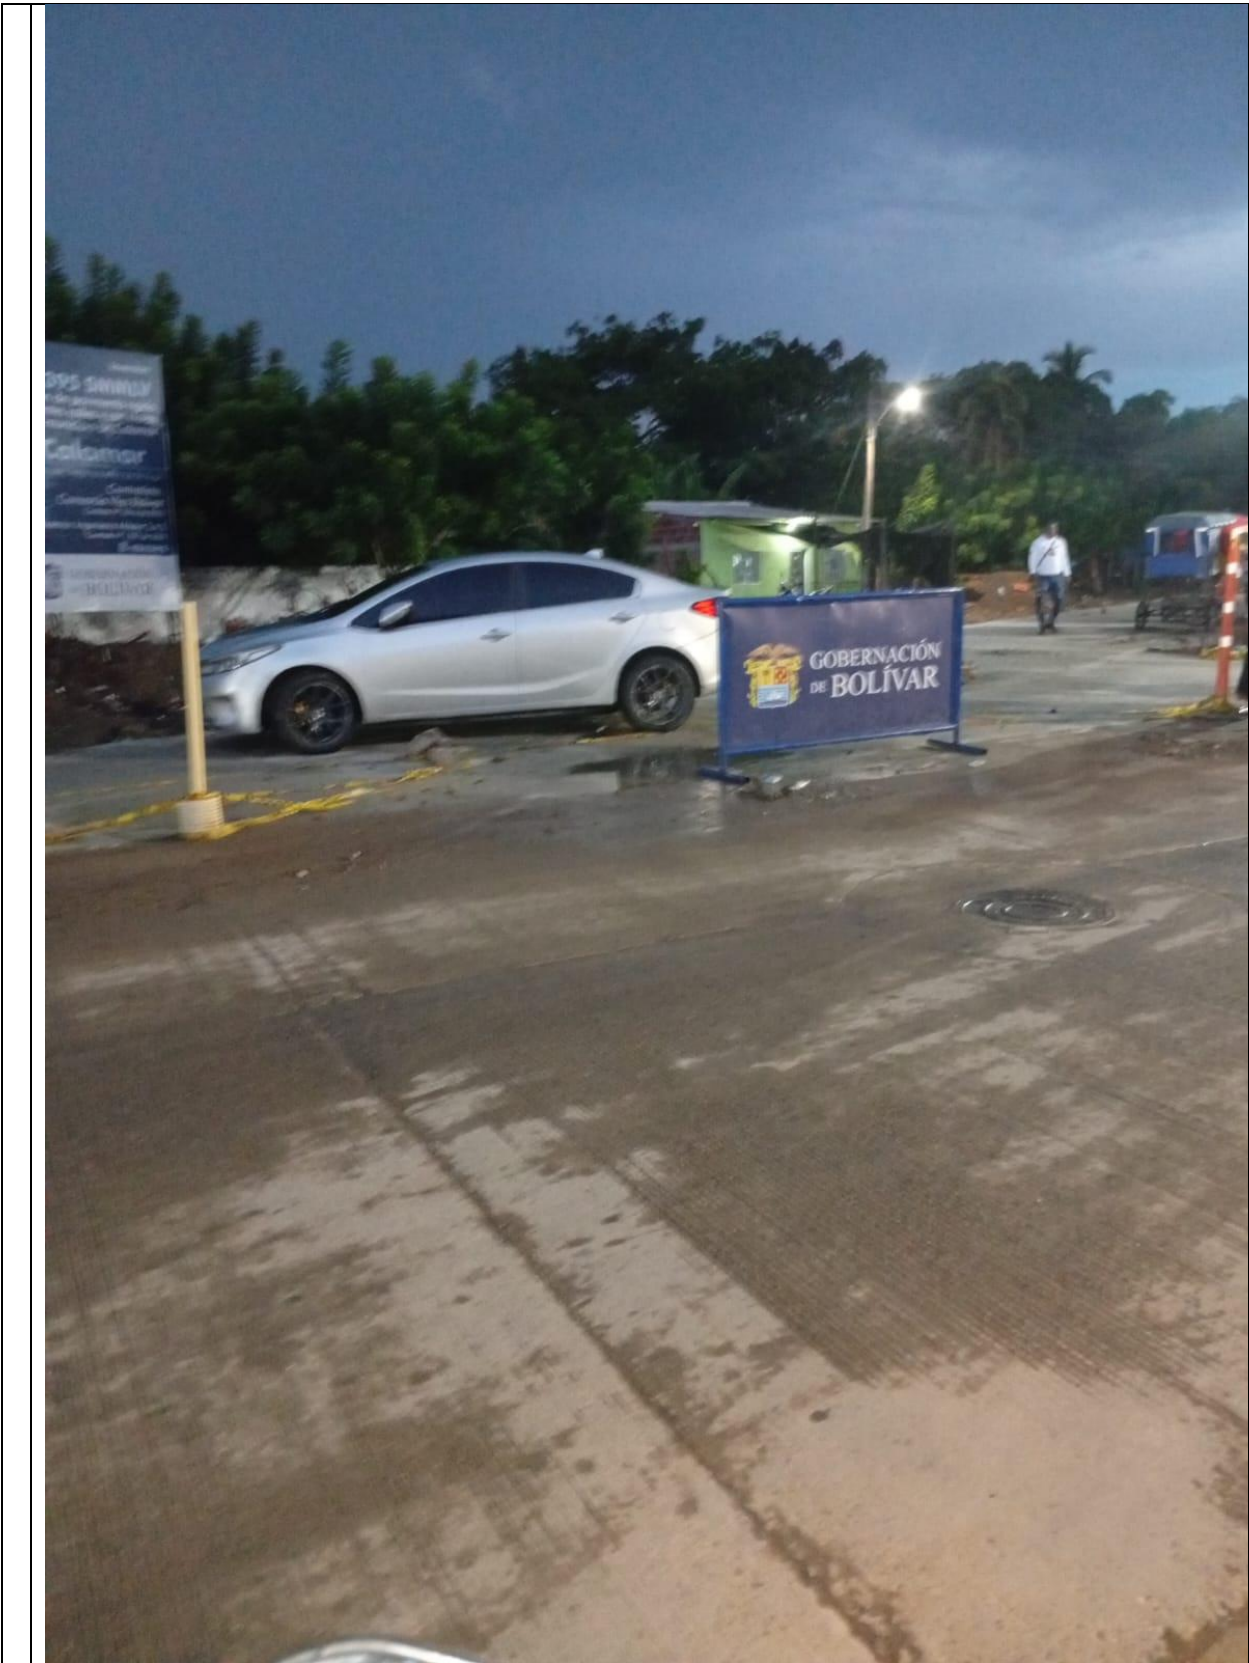

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01



	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

--	--

9. DISEÑOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

9.1 Figura De La Estructura De Pavimento

Se esquematiza lo estipulado en el punto 2.3 del presente informe.

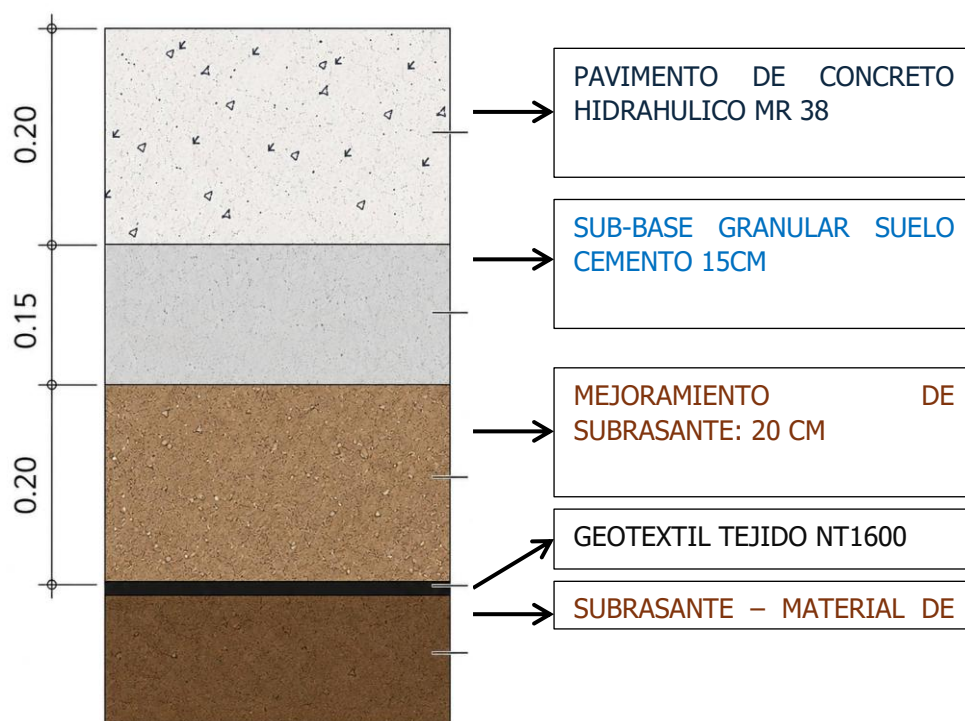


Ilustración 2. Esquema de la estructura de pavimento. Fuente: Elaboración propia.

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

10. DIFICULTADES PRESENTADAS

A partir de las observaciones en campo y el registro de ejecución, se identifican las siguientes dificultades

relevantes para la continuidad y calidad de la obra:

• **Ausencia de señalización y demarcación de redes de servicios públicos:** Se ha evidenciado la existencia de redes enterradas que carecen de cintas de advertencia, elementos de demarcación o señalización que permitan identificar su ubicación, profundidad y tipo de servicio, aumentando la probabilidad de afectaciones accidentales durante las labores de explanación y excavación de canaletas.

• **Imposibilidad de habilitar nuevos frentes de trabajo completos:** La apertura de nuevos frentes de trabajo ha estado restringida debido a que varias de las vías incluidas dentro del alcance contractual aún no se encuentran disponibles en el 100% de su longitud para ser intervenidas. Esta condición se debe a la ausencia de la certificación, el aval y la entrega formal por parte de los contratistas encargados de las obras de alcantarillado ejecutadas previamente. A la fecha, únicamente se han recibido tres (3) calles, las cuales presentan una disponibilidad aproximada del 60% de su longitud total, situación que limita la conformación de frentes de trabajo completos y afecta la secuencia de ejecución de las actividades programadas, repercutiendo en el avance físico del proyecto.

• **Interferencia por incumplimiento de las restricciones de acceso por parte de la comunidad:**

Durante el periodo de ejecución se evidenció el ingreso y tránsito de vehículos particulares sobre un tramo de pavimento de concreto que contaba únicamente con dos (2) días de haber sido fundido, incumpliendo las restricciones de acceso establecidas y la señalización preventiva instalada en el área de trabajo. Esta situación se presentó pese a que el frente de obra se encontraba debidamente demarcado y con los elementos de cerramiento y control correspondientes.

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

11. CONCLUSIONES

Durante el periodo de corte **(1/07/2026 – 20/07/2026)** el proyecto evidenció un inicio de obra acorde con la programación, concentrado en el **Frente No.1 (Barrio Brisas del Magdalena) Y Frente No.2 (Calle#32)**, ejecutando topografía, excavaciones, suministro e instalación de geotextil y sub-base granular, fundido de losa y atendiendo acometidas domiciliarias según lo previsto contractualmente. Sin embargo, la ejecución ha estado condicionada por dos factores transversales que tienen impacto técnico, de seguridad y de cronograma:

- **Interferencias por información incompleta de redes de servicios públicos:** La limitada disponibilidad de información técnica actualizada sobre la localización y configuración de las redes de servicios públicos existentes, sumada a la existencia de acometidas domiciliarias construidas sin documentación técnica confiable, ha originado interferencias imprevistas durante la ejecución de las obras. Esta situación ha requerido la realización de intervenciones correctivas sobre infraestructura existente, generando actividades no contempladas inicialmente, mayores tiempos de ejecución y una disminución en los rendimientos previstos para las diferentes actividades constructivas.
- **Restricción para la conformación de nuevos frentes de trabajo:** La disponibilidad parcial de las vías incluidas dentro del alcance del proyecto continúa limitando la apertura de frentes de trabajo completos, afectando la secuencia lógica de ejecución y la programación establecida. Esta condición obedece a que los contratistas responsables de las obras de alcantarillado aún no han efectuado la entrega formal de la totalidad de las vías intervenidas. Aunque en las mesas de coordinación se acordó adelantar un estudio técnico para evaluar un posible rediseño o definir una solución integral que permita la liberación total de las vías durante las próximas semanas, hasta la fecha no se ha formalizado una solución definitiva ni se ha establecido un cronograma oficial para su implementación. En consecuencia, esta situación continúa representando una restricción externa que incide negativamente en el desarrollo normal del proyecto.
- **Interferencia ocasionada por el incumplimiento de las medidas de control de acceso:** Durante la ejecución de las actividades se presentó el ingreso de vehículos particulares sobre un tramo de pavimento de concreto que únicamente contaba con dos (2) días de haber sido colocado, incumpliendo las restricciones de acceso y la señalización implementada en el área de intervención. A pesar de que el frente de obra disponía de cerramiento y demarcación preventiva, esta situación comprometió las condiciones adecuadas para el proceso de curado y desarrollo de resistencia del concreto, generando riesgos sobre la calidad de la estructura y posibles afectaciones al normal desarrollo de las actividades programadas. Lo anterior evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de control, seguimiento y sensibilización con la comunidad

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR



INFORME No. 4

JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2026


INFORME PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2026		
PROFESIONAL AMBIENTAL  SERAFIN BENAVIDES G. ELABORÓ	INGENIERO RESIDENTE JOSE JUAN MARTINEZ REVISÓ	DIRECTOR DE OBRA ARMANDO MARTINEZ APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	4
2. OBJETIVOS GENERALES.....	4
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
4.1. LOCALIZACIÓN	5
4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	7
5. DESARROLLO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	7
5.1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RESIDUOS ESPECIALES	7
5.2. MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8
5.3. MANEJO DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTO	10
5.4. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	11
5.5. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.....	12
5.6. MANEJO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	13
5.7. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO	14
5.8. MANEJO DEL RECURSO VEGETAL.....	14
5.9. MANEJO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15
5.10. PROGRAMA DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL	15

1. INTRODUCCION

El presente documento describe el seguimiento de las medidas de manejo ambiental aplicadas para prevenir, mitigar, controlar o compensar los posibles impactos que se deriven de las actividades del proyecto relacionado con las obras de la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

El Informe ambiental correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2026, se desarrolla con base en información obtenida por las inspecciones y verificaciones realizadas en el frente de obra y además de los resultados de las gestiones ambientales adelantadas en entidades oficiales y/o privadas.

El Informe aquí presentado tiene como objetivo dar a conocer el avance de las actividades ambientales ejecutadas, siguiendo las recomendaciones y medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, las observaciones de las acciones realizadas y la mención de actividades pendientes.

2. OBJETIVOS GENERALES

Describir las principales acciones y actividades socioambientales ejecutadas durante el proceso constructivo del proyecto de las obras de la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, en el marco de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de dicho proyecto.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las principales acciones y medidas ambientales y sociales de los diferentes programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental desarrolladas en el transcurso del periodo.

- Dar a conocer los avances de las gestiones ambientales adelantadas en el periodo.
- Cuantificar los indicadores de gestión y seguimiento ambiental desarrollados en este periodo.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto a ejecutar está localizado en la cabecera municipal de CALAMAR departamento de Bolívar, especialmente en las siguientes calles:

VÍA	N° Vía	Longitud	Ancho	Anden
Via 1:	CARRERA 2 ENTRE CARRERA 3 Y CALLE 38 (Brisas del Magdalena)	893.00	4.70	0.75
Via 2:	TRANSVERSAL 2B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15	187.30	4.50	0.75
Via 3:	CALLE 32 ENTRE VIA ORIENTAL Y CARRERA 3	278.50	4.50	0.75
Via 4:	CALLE 33 ENTRE VIA ORIENTAL Y TRANSVERSAL 3	279.50	4.50	0.75
Via 5:	CALLE 34 ENTRE VIA ORIENTAL Y CARRERA 3	279.50	4.50	0.75
Via 6:	CALLE 18 ENTRE CRA 6 Y TRANSVERSAL 3	346.00	4.50	0.75
		2263.80		

Ilustración 1. Localización general del proyecto



Fuente: Adaptación Google Earth 2025.

4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el período del presente periodo se dio el inicio de la ejecución de obra, se describen las actividades como tales como la topografía, excavaciones, instalación de geotextil y material seleccionado, instalación de acometidas domiciliarias de agua potable, revisión de elementos que afectan el desarrollo de la obra.

5. DESARROLLO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5.1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RESIDUOS ESPECIALES

Se continua con la prestación del servicio en el sistema de recolección de residuos sólidos del municipio de Calamar, por medio de la empresa de aseo local, entidad encargada de la recolección de los residuos a nivel municipal.

Se siguen con las jornadas de limpieza y aseo, y los residuos que se generan en los frentes de obra, aunque fueron de cantidades mínimas, se llevaron en bolsas hasta el sitio donde son recolectados por la empresa de aseo local.

En este periodo no se han generado cantidades significativas de residuos, sin embargo se calcula que en el periodo se ha generado aproximadamente 1 m³ de residuos convencionales. Con respecto a residuos especiales, en este periodo no se generaron este tipo de residuos.



INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de residuos solidos convencionales generados durante la ejecución de la obra	Volumen de residuos sólidos dispuestos / Volumen de residuos sólidos generados	Informe mensual	1 m3 de residuos sólidos dispuestos / 1 m3 de residuos sólidos generados	100%
Cantidad de residuos solidos especiales generados durante la ejecución de la obra	Volumen de residuos especiales dispuestos / Volumen de residuos especiales generados	Informe mensual	Volumen de residuos especiales dispuestos / Volumen de residuos especiales generados	N.A.

5.2. MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La fuente de materiales que surtirá a la obra, se localiza en Arroyo Hondo, Bolívar, y cuenta con licencia ambiental según Resolución No. 1697 de 2014, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, CARDIQUE y con el título minero No. LE3-10261.

Con respecto al proveedor de concretos, se contará con la concretera Concremovil que tiene un permiso ambiental otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A. mediante la Resolución No. 0979 de 2023.

Las cantidades de material que se emplearon en este mes correspondió a lo siguiente:

Afirmado	265,2 m3
Subbase	189,9 m3
TOTAL	455,1 m3





INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de materiales de construcción utilizados en la obra proveniente de fuentes de material autorizadas	Volumen de materiales de construcción proveniente de fuentes de material autorizadas / Volumen de materiales de construcción utilizados en la obra.	Informe mensual	455,1 m3 de materiales de construcción proveniente de fuentes de material autorizadas / 455,1 m3 de materiales de construcción utilizados en la obra.	100%

5.3. MANEJO DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTO

En este periodo se ha logrado ubicar el sitio para el funcionamiento del campamento, que es una vivienda con una lote de terreno amplio y apto para el almacenamiento de materiales y equipos. También cuenta con servicios de agua y energía y con baño para uso del

personal vinculado a la obra. El campamento se ubica en la Carrera 4 No. 26-39 en la localidad de Calamar.

En el sector de Brisas del Magdalena, se cuenta con un permiso para uso de baño en una vivienda, para ser utilizado por personal de la obra. Se adjunta acta de permiso de uso de baño en los anexos.



INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de baños usados en la obra	Número de baños usados / Número de baños programados	Informe mensual	Un baño usado / Un baño programado	100%

5.4. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

La maquinaria que se encuentra activa en el momento es la siguiente:

2	Minicargador
1	Volqueta
1	Vibrocompactador

Se informa y se aclara que la documentación relacionada con certificados de SOAT y técnico mecánicas de vehículos vinculados a la obra y de los registros de mantenimiento de la maquinaria, vehículos y equipos que funcionan en la obra, se relacionan en el informe correspondiente al área SST.



INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Numero de mantenimientos realizados a la maquinaria presente en la obra	Numero de Mantenimientos realizados a la maquinaria en la obra / Numero de Mantenimientos programados a las maquinarias	Informe mensual	Numero de mantenimiento realizado a la maquinaria en la obra / Número de Mantenimiento programado a las maquinarias	N.A.

5.5. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante la ejecución de las obras en este periodo, no se afectó ningún tipo de drenaje o cuerpo de agua. Se ha estado indicando las recomendaciones tanto a los ingenieros como a los trabajadores sobre los cuidados y manejo de materiales para evitar obstrucciones a drenajes que puedan existir en el área de influencia de las obras. En este periodo no se utilizó agua para la obra.

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de agua utilizada en la obra	Volumen de agua adquirida por compra / Volumen de agua utiliza en la obra	Informe mensual	Volumen de agua adquirida por compra / Volumen de agua utiliza en la obra	N.A.

5.6. MANEJO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

En este periodo se ejecutaron actividades de excavaciones, pero las cantidades no son significativas, por lo que no se requiere de un área especial para la disposición final de este tipo de residuos.

Teniendo en cuenta este aspecto, para la disposición de las cantidades menores de RCD que se generan en la obra, se ha estado coordinando con la secretaria de planeación municipal de la Alcaldía de Calamar, la autorización para la disposición de los RCD en áreas que requieren de nivelación o adecuación de acceso. De esta manera la Secretaria de Planeación Municipal de Calamar, expidió una certificación donde autoriza un sitio para la disposición final de los RCD que se generan en la obra. (Ver anexos).

La totalidad de RCD generados y dispuestos legalmente, alcanza la cantidad de 425 m3.



INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de demoliciones. y/o excavaciones generadas en la obra	Volumen de demoliciones dispuestas finalmente./ Volumen de demoliciones generados	Informe mensual	425 m3 de excavaciones dispuestas finalmente./ 425 m3 de excavaciones generados	100%

5.7. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

Como medidas para el control de las emisiones atmosféricas en la obra, se han realizado las recomendaciones dirigidas a las volquetas que transportan material, para que transiten a baja velocidad para evitar la emisión de material particulado y el uso de la carpa protectora durante el transporte de materiales. En este periodo no se ha presentado mayor afectación por la emisión de material particulado en las áreas intervenidas.

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de humectaciones realizadas en la obra	Numero de humectaciones realizadas / Número de humectaciones programadas	Informe mensual	Número de humectaciones realizadas / Número de humectaciones programadas	N.A.

5.8. MANEJO DEL RECURSO VEGETAL

Durante este periodo, no se produjo ningún tipo de afectación al recurso vegetal.

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de área de vegetación intervenida en la obra	Área total intervenida en la obra / Área de vegetación programada para su intervención	Informe mensual	Área total intervenida en la obra / Área de vegetación programada para su intervención	N.A.

5.9. MANEJO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

De acuerdo con el tipo y cantidad de maquinaria que se emplea en la obra, se está usando una pimpina o recipiente de 5 galones de capacidad para surtir de combustible a la maquinaria en la obra, por lo que no se requiere hasta el momento del acondicionamiento de un área especial para este tipo de sustancias.


Se ha efectuado la recomendación que en caso de contar con más recipientes con combustible en el almacenamiento, se deberá adecuar un sitio especial, aislado y señalizado.

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de área de vegetación intervenida en la obra	Número de medidas aplicadas en el mes / Número de medidas programadas en el mes	Informe mensual	Número de medidas aplicadas en el mes / Número de medidas programadas en el mes	N.A.

5.10. PROGRAMA DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL

En este periodo se dictaron las charlas ambientales dirigida a los trabajadores vinculados a la obra. Se les dictó las recomendaciones e indicaciones para el manejo ambiental de los residuos sólidos, manejo de estructuras y aseo en obra.

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Cantidad de trabajadores que asistieron a la concientización ambiental	Número de trabajadores que asistieron a la concientización ambiental en el mes. / Número de trabajadores programados para la concientización ambiental en el mes	Informe mensual	Diez y Nueve (19) trabajadores que asistieron a la concientización ambiental en el mes. / Diez y Nueve (19) trabajadores programados para la concientización ambiental en el mes	100%

ASISTENCIA A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO		FRT	THN	009
Versión: 2		Vigencia: 05-03-2015		
LUGAR	Obra Pavimentación Calamar Bolívar	DD	MM	AA
		18	06	26
ACTIVIDAD REALIZADA	TEMA			
Inducción				
Capacitación	X Manejo de Obras en Concreto y Materiales de Construcción			
Re inducción				
Charla Corta				
Reunión de Calidad/SST/ Operativos				
Seminario / Taller / Curso				
Capacitación específica al cargo				
Otra	¿Cuál?			
LISTADO DE ASISTENTES				
No	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	FIRMA
1	Richard Coma Molina	1143234480	Topógrafo	Richard
2	FREDY Sierra Morales	1002070165	ose	FREDY SM
3	Edwin Vargas	73237897	ayudante	Edwin
4	Pablo		ayudante	Pablo
5	Julio Carlos Perez	73268969	ayudante	Julio
6	Elen Ayarce	1043990883	op	Elen
7	Melissa Gonzalez Herrera	1002294028	social	Melissa
8	Christian Paternostro Leonos	1007187254	Ing. Ambiental	Christian
9	Chus Hualpa Pardo	1193300767	Interventor	Chus Hualpa
10	Robinson Feria		AYUDANTE	Robinson
11	Maria Alejandra Carrani D.	1097882597	SST	Maria (S)
12				
13				
14				
15				
OBSERVACIONES:				
PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	Maria Alejandra C.	FIRMA		
CARGO	Auxiliar SST			

ASISTENCIA A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO		FRT THN 009						
		Versión: 2						
		Vigencia: 05-03-2015						
LUGAR	Obra Pavimentación Calamar Carrera 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>06</td> <td>26</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	22	06	26
DD	MM	AA						
22	06	26						
ACTIVIDAD REALIZADA	TEMA							
Inducción								
Capacitación	X Mangro de Aguas Superficiales							
Re inducción								
Charla Corta								
Reunión de Calidad/SST/ Operativas								
Seminario / Taller / Curso								
Capacitación específica al cargo								
Otra	¿Cuál?							
LISTADO DE ASISTENTES								
No	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	FIRMA				
1	Nelissa González Llerena	100294028	Social	Nelissa G.				
2	Edwin Vargara	73237844	ayudante	Edwin				
3	Pablo		ayudante	Pablo				
4	Robinson Ferra		ayudante	Robinson				
5	FERRER SICKER M.	1002070165	OPE	FERRER M.				
6	Hernán Anlez	1066672452	Ing. Res.	Hernán Anlez				
7	Richard Góngora Molina	1143234480	Subcontratista	Richard				
8	Diego Roldán Egoz	1143300761	Interventor	Diego Roldán				
9	Cristian Paternostro	1002187754	Ing. Ambiental	Cristian				
10	Manu Alejandra C.	1047882097	SST	Manu Alejandra				
11								
12								
13								
14								
15								
OBSERVACIONES:								
PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD								
NOMBRE	Manu Alejandra C.		FIRMA					
CARGO	Auxiliar SST							

Lista de asistencias a las charlas ambientales

 CONSORCIO VIAS BOLÍVAR CI	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E
INTERVENTORIA DE PROYECTOS

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y
CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.**

CONTRATO DE OBRA No. 3516 DE 2025.

INFORME MENSUAL SOCIAL No.4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS BOLIVAR CI

Elaborado por:
Melissa González Llerena
Profesional Social

PERIODO DEL: 01 al 30 de junio del año 2026.



 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	4
2.2 OBJETIVO GENERAL	4
2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
3.1 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	5
3.2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	5
3.3 ALCANCES DEL PGS (Plan De Gestión Social)	5
3.4 PROGRAMAS	6
3.4.1 PROGRAMA DE DIVULGACION E INFORMACION COMUNITARIA:	6
3.4.2 PROGRAMA RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS	9
3.4.3 PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	12
3.4.4 PROGRAMA VINCULACIÓN LABORAL	26
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	¡Error! Marcador no definido.

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Social (**PGS**), hace parte del lineamiento a cumplir en marco del Plan de Gestión de calidad de la obra y la Guía de Gestión ambiental PAGA. En él están planteadas las recomendaciones que se deberán atender para el manejo adecuado y mitigación de los impactos socio-económicos causados en la comunidad por la obra **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”**.

El PGS, servirá para informar oportuna y claramente a la comunidad sobre todos y cada uno de los momentos y actividades de la obra, explicando sobre todos los efectos incómodos y los impactos positivos, que generará la obra. Se orienta hacia la comunidad involucrada en el proyecto (bajo la modalidad de beneficiario), los contratistas que llevarán a cabo la construcción del proyecto, las entidades que están involucradas en la planeación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, así como las instituciones Gubernamentales, territoriales que promueven la ejecución del mismo, se convierten en actores claves del Plan de Gestión Social. Desde este punto de vista se contemplan la superación y mitigación de los efectos negativos que el proyecto pueda generar.

El contratista de la obra, deberá desarrollar las actividades necesarias para realizar el proyecto. **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”**. la ejecución del Plan de Gestión Social, Gestión Ambiental entre otras, debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán las obras, a partir de lo cual, se definen los programas de manejo ambiental y social, acorde con las características de las obras y las condiciones de su área de influencia; esta evaluación tiene como propósito garantizar el desarrollo de una obra sostenible con su entorno social y ambiental, según las normas colombianas aplicables.

El plan de Gestión Social, debe proyectar una estrategia de comunicación social efectiva y eficaz dirigida a la comunidad, a todas las personas e instituciones (familias, residentes en la zona, comerciantes, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, campesinas, veedoras, organizaciones de base trabajadores de la obra, tráfico vehicular y transeúnte), que estén directos e indirecta y ocasionalmente involucrados con las obras que se desarrollaran.

Teniendo en cuenta lo anterior, se describe a continuación un contenido mínimo y los lineamientos para la elaboración del Plan de Gestión Social; el alcance y grado de detalle se establecerán a partir del reconocimiento del área de influencia directa, las actividades de la obra y otras condiciones que tengan incidencia en su ejecución.

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

El contratista de la obra deberá desarrollar las actividades necesarias para realizar el proyecto.

La ejecución del Plan de Gestión Social contempla, cuatro (4) programas a ejecutar en las Etapas de Construcción y dos (2) Estrategias Básicas:

Los programas son:

1. Programa Divulgación e información Comunitaria.
2. Programa Restitución de Bienes Afectados
3. Programa Atención y Participación Ciudadana
4. Programa de Vinculación Laboral

En el presente informe, muestra la gestión llevada por este contratista durante el periodo de corte del presente informe, del 01-30 de junio de 2026.

2. OBJETIVOS

2.2 OBJETIVO GENERAL

Cumplir con las acciones sociales, planteadas para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”** tendientes a evitar y reducir los efectos adversos que pueda llegar a causar a las comunidades residenciadas en el área directa del proyecto.

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Disponer de un profesional idóneo para cumplir de manera eficiente con cada una de las actividades programadas para el proyecto.
- Dar cumplimiento a los requerimientos sociales del proyecto.
- Informar a la población del área de influencia sobre las características generales del proyecto, las implicaciones de la ejecución de la obra y su indispensable participación y colaboración, para el óptimo desarrollo de ésta.
- Evitar la generación de falsas expectativas debidas a la escasa información.
- Generar una actitud receptiva y abierta entre la comunidad gracias al conocimiento del Proyecto.
- Abrir un canal de comunicación transparente entre la empresa contratista, Contratante, Interventor y la Comunidad del área de influencia.
- Informar en caso de actividades extraordinarias como la suspensión de servicios públicos tales como: Acueducto, alcantarillado, gas natural, energía eléctrica, teléfono por cable, Internet banda ancha, y drenaje de aguas lluvias en los que cualquier suspensión cause incomodidades a los habitantes

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

- Reducir las insatisfacciones e incomodidades generadas por la obra a la comunidad, atendiendo oportunamente sus quejas inquietudes y sugerencias.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

Esta obra, se desarrollará en el municipio de Calamar en el departamento de Bolívar.

ALCANCE DEL PROYECTO



CUADRO DESCRIPTIVO ALCANCE DEL PROYECTO				
VÍA	Descripción	Longitud (m)	Ancho (m)	Andén (m)
Vía 1	CARRERA 2 ENTRE CARRERA 3 Y CALLE 38 (Brisas del Magdalena)	893	4,7	0,75
Vía 2	TRANSVERSAL 2B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15	187,3	4,5	0,75
Vía 3	CALLE 32 ENTRE VÍA ORIENTAL Y CARRERA 3	278,5	4,5	0,75
Vía 4	CALLE 33 ENTRE VÍA ORIENTAL Y TRANSVERSAL 3	279,5	4,5	0,75
Vía 5	CALLE 34 ENTRE VÍA ORIENTAL Y CARRERA 3	279,5	4,5	0,75
Vía 6	CALLE 18 ENTRE CRA 6 Y TRANSVERSAL 3	346	4,5	0,75
TOTAL		2263,8		

Imágenes resaltadas en colores corresponden a las vías a mejorar

3.2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.3 ALCANCES DEL PGS (Plan De Gestión Social)

El Plan de Gestión Social, servirá como un instrumento para la identificación de los impactos ambientales y sociales, observados en el área de influencia directa de las comunidades que colindan con el proyecto en el municipio de Calamar- casco urbano. Así

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

mismo a toda la población del municipio en general; mirándolo desde el gran impacto social que trae consigo la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. En este sentido el PGS tomará como eje transversal el programa de Divulgación e Información; por medio de estrategias de comunicación efectivas.

3.4 PROGRAMAS

El Plan de Gestión Social que se propone para presente proyecto, está conformado por: cuatro (4) programas a ejecutar en las Etapas de Construcción y dos (2) Estrategias Básicas:

Los programas son:

- Programa Divulgación e información Comunitaria.
- Programa Restitución de Bienes Afectados
- Programa Atención y Participación Ciudadana
- Programa de Vinculación Laboral

Estrategias: Comunicación y Conformación de veeduría ciudadana.

3.4.1 PROGRAMA DE DIVULGACION E INFORMACION COMUNITARIA:


La falta de información genera especulación y falsas expectativas, con respecto a la realización de un nuevo proyecto. Es importante que la población del área de influencia se encuentre bien informada sobre la construcción de las obras y su posterior operación. Con este programa se busca establecer una comunicación directa, clara y oportuna entre los responsables del proyecto, la comunidad y autoridades locales ubicadas en el área.

De esta forma es posible lograr que la ciudadanía conozca que el proyecto va a traer progreso de manera directa e inmediata a los habitantes del municipio de Calamar, para mejorar su movilidad y condiciones de vida.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Jornada de limpieza y conservación del entorno de la obra.

Durante las actividades de ejecución del proyecto, en el tramo brisas del Magdalena, se desarrolló una jornada de limpieza y conservación del entorno de la obra con la participación del personal operativo del Consorcio Vías Bolívar. La actividad estuvo orientada a la recolección y disposición adecuada de residuos sólidos, retiro de material sobrante de construcción, así como a la limpieza de las áreas de intervención y zonas aledañas. Estas acciones se realizaron con el propósito de mantener condiciones óptimas de orden, aseo y seguridad en el frente de trabajo, prevenir riesgos laborales, minimizar los impactos ambientales derivados de la ejecución de la obra y fortalecer el compromiso

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

del personal con las buenas prácticas de manejo ambiental y la conservación del espacio intervenido. **Ver registro fotográfico- Anexo No 1 Listado de asistencia.**

	
<p>Imagen No 1. Actividad Sensibilización – Disposición de Residuos Lugar: Brisas del Magdalena</p>	<p>Imagen No 2. Lugar: Brisas del Magdalena</p>

Jornada de entrega de material informativo sobre el inicio de obra de pavimentación en la calle 32 y 33

Durante la fase previa al inicio de las actividades constructivas, se llevó a cabo una jornada de entrega de material informativo a los residentes y comerciantes de la Calle 32 y 33, con el propósito de dar a conocer el alcance del proyecto de pavimentación, el cronograma de ejecución, las actividades a desarrollar y las posibles afectaciones temporales derivadas de la obra. Asimismo, se brindó información sobre los canales de comunicación establecidos para la atención de inquietudes, sugerencias y requerimientos de la comunidad, promoviendo la participación ciudadana, el relacionamiento con los actores del área de influencia y el desarrollo adecuado del componente de gestión social del proyecto. Dicha información, se entregó a través del volante de inicio de obra, predio a predio, cubriendo 32 propietarios de predios colindantes con los tramos de obra adscritos al proyecto. **Ver registro fotográfico- Anexo No 2 Listado de asistencia- Volante informativo.**

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01



Imagen No 3. Jornada de entrega de material informativo sobre el inicio de obra de pavimentación en la calle 32 y 33

Lugar: calle 32



Imagen No 4. Jornada de entrega de material informativo sobre el inicio de obra de pavimentación en la calle 32 y 33

Lugar: calle 32



	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

<p>Imagen No 5. Jornada de socialización del inicio de obra de pavimentación y entrega de material informativo en la calle 32 y 33</p> <p>Lugar: calle 34</p>	<p>Imagen No 6. Jornada de socialización del inicio de obra de pavimentación y entrega de material informativo en la calle 32 y 33</p> <p>Lugar: calle 33</p>
---	---

3.4.2 PROGRAMA RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS

Para el desarrollo de este programa se ha reconocido el acta de vecindad como una herramienta que aporta elementos técnicos, jurídicos, sociales y económicos y que permite, además, registrar las condiciones previas del predio y tener elementos claros e integrales para tomar decisiones. Conocer las condiciones de estructuras, predios entre otros y validarlas en un formato acta de vecindad antes de iniciar las obras.

En cumplimiento al presente programa, se realizaron las actas de vecindad de los predios, colindantes en los tramos de obra que se encuentran en incluidos dentro del alcance del contrato. La tabla adjunta muestra la relación de tramos y número de actas levantadas al corte del presente informe:

Se levantaron 203 actas. Se adjunta **Tabla No 1. Consolidado actas de vecindad levantadas.**

TRAMOS DE OBRA	NUMERO DE PREDIOS VISITADOS	NUMERO DE ACTAS REALIZADAS
Brisas de la magdalena	85	85
Calle 32	43	43
Calle 33	31	31
Calle 34	43	43
Total: predios socializados	203	
Total: predios divulgados:	203	

Nota: a la fecha continuamos con la organización de las actas de vecindad, para entregar a la interventoría para su revisión.

Acta de permiso

Además, se gestionó un acta de permiso (1), bajo el concepto: uso de baño para los trabajadores de obra. **Ver Anexo No 3. Actas de permisos.**

Actas de Compromisos disposición de escombros y/o material sobrante.

Durante el periodo de corte del presente informe, se gestionaron con la comunidad actas de compromisos (15), en ocasión a la entrega de material sobrante de obra no contaminado; estos se cedieron a las personas que lo solicitaron para ser utilizados como relleno de los patios de sus viviendas; se ha venido verificando por el contratista la buena

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

disposición final de los mismos. El cuadro adjunto muestra el listado de personas, la dirección del predio donde se dispuso y la cantidad de material entregada, ver novedades en cuadro adjunto. **Ver Anexo No 4 Actas de compromisos disposición de escombros y/o material sobrante.**

Nombres y Apellidos	Dirección	Cantidad	Fecha entrega	de	Observaciones
Inelda Crespo	Cra 2 Brisas del magdalena	17 M3	13-04-2026		Se dispuso para mejorar el acceso al predio
Rosmery Ospino	Cra 2 Brisas del magdalena	20M3	13-04-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio
Walter Páez	Cra 2 Brisas del magdalena	15M3	13-04-2026		Se dispuso para mejorar el acceso al predio
Yesenia Perea Jaramillo	Cra 2 Brisas del magdalena	27M3	13-04-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio
Eleida Perea Jaramillo	Cra 2 Brisas del magdalena.	25 M3	13-04-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio
Yorselis Perea	Cra 2 Brisas de la magdalena.	130 M3	13-04-2026		Se dispuso para mejorar el acceso al predio.
Laura Marcela Mier	Cra 2 Brisas de la magdalena.	19M3	14-04-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio
Liliana García Martínez	Cra 2 Brisas de la magdalena.	20M3	14-04-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio.
Patricia Mercado García	Cra 2 Brisas de la magdalena.	20M3	14-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio.
Eugenia García Martínez	Cra 2 Brisas de la magdalena.	20M3	17-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio.
Yorbelis Vallejo Paez	Cra 2 Brisas de la magdalena.	20M3	17-05-2026		Se dispuso para mejorar el nivel de habitación y patio de su predio
Graciela Ortiz García	Cra 2 Brisas de la magdalena.	20M3	14-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio y sala de su predio.

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Nombres y Apellidos	Dirección	Cantidad	Fecha entrega	de	Observaciones
Isabel Narváez García	Cra 2 Brisas de la magdalena.	37M3	14-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio.
Lisbeth Moreno Yepes	Cra 2 Brisas de la magdalena.	15M3	21-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio.
Candelaria Cantillo Salas	Cra 2 Brisas de la magdalena.	20M3	22-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio de su predio.
Marina Mejía Contreras	Cra 2 Brisas de la magdalena.	40M3	21-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel del patio y terraza de su predio.
Diana González Moreno	Cra 2 Brisas de la magdalena.	40M3	17-05-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su lote próximo a construcción.
Luz Esther cresco Borrachera	Cra 2 Brisas de la magdalena	35M3	03-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Alba Yépez Pérez	Cra 2 Brisas de la magdalena	30M3	03-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Luis Herrera Ballestas	Cra 2 Brisas de la magdalena	35M3	03-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Deysi Narváez Ospino	Cra 2 Brisas de la magdalena	30M3	04-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Sindy Moreno Crespo	Cra 2 Brisas de la magdalena	25M3	05-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su lote próximo a construcción.
Alexandra Jiménez Torres	Cra 2 Brisas de la magdalena	30M3	05-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Nadilsa Machacón	Cra 2 Brisas de la magdalena	30M3	05-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Niní Suarez Torres	Cra 2 Brisas de la magdalena	35M3	09-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Carmen Yépez Gloria	Cra 2 Brisas de la magdalena	35M3	09-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Nombres y Apellidos	Dirección	Cantidad	Fecha entrega	de	Observaciones
Luz Miriam Aristizabal	Cra 2 Brisas de la magdalena	50M3	18-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su lote próximo a construcción.
Luis Mario Herrera	Calle 32	20 M3	26-06-2026		Se dispuso para mejorar nivel de su lote próximo a construcción.
María Alejandra Cassianis	Calle 32	25 M3	27-062026		Se dispuso para mejorar nivel de su lote próximo a construcción.
Rafael Vargas Mariotis	Calle 32	15M3	27-062026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Gustavo Hernández	Calle 32	15 M3	27-062026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio
Lolimar Reales	Calle 32	15 M3	27-062026		Se dispuso para mejorar nivel de su patio


Actas de Compromiso

Las siguientes actas de compromiso se realizan como resultado de trámite y seguimiento a las solicitudes presentadas por los propietarios y residentes del sector, relacionadas con afectaciones derivadas a la ejecución de la obra. A través de estas actas se dejan establecidos los acuerdos, compromisos y acciones de atención concretadas directamente entre las partes, con el fin de garantizar el seguimiento y cumplimiento de las soluciones planteadas. **Ver anexo No 5. Actas de compromiso**

3.4.3 PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

La mayor o menor aceptación de los proyectos por parte de la comunidad depende del grado en que los ejecutores de la obra permitan un real acercamiento de las personas del área de influencia durante cada una de las fases del proceso. Este acercamiento garantiza un amplio nivel de participación que se traduce en la posibilidad real de conocer las opiniones de las personas del área de influencia y establecer mecanismos para modificar situaciones o impactos negativos.

Por tal razón, se debe motivar y promover la participación de las comunidades, para poder detectar sus expectativas, las incomodidades que se estarían derivando de la ejecución, los beneficios que se esperan obtener cuando el proyecto sea ejecutado completamente. De igual forma, la participación debe dar paso a la atención de las quejas y reclamos que

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

se presenten en forma escrita o verbal, para poder establecer las acciones correctivas que sean necesario.

Punto de Atención Comunitaria


A la fecha de corte del presente informe, nos encontramos organizando logística para instalar el Punto de Atención comunitaria; teniendo en cuenta que los tramos de obra, se encuentran en zonas muy próximas entre sí, proyectamos contar con un punto de atención móvil.

El horario de atención proyectado: lunes y miércoles de 8 a.m. hasta las 2.p.m.

Los elementos básicos con los que deberá contar el PAC serán: una línea y/o celular, unas sillas, una mesa etc.

Para este periodo se continuó con la disposición del punto de Atención Móvil, ubicado en la Cra 2 barrio Brisas del magdalena, cumpliendo con el horario y días establecidos. **Ver registro fotográfico.**

	
<p>Imagen No 7. Punto de Atención movil Lugar: Brisas del Magdalena</p>	<p>Imagen No 8. Punto de Atención Movil Lugar: Brisas del Magdalena</p>

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Interacción y Atención permanente a la comunidad:

Se mantuvo comunicación constante con los habitantes del sector, atendiendo inquietudes, brindando información sobre el desarrollo del proyecto y fortaleciendo las relaciones entre comunidad y contratista.

Reuniones socialización

Socialización corte de piso para construcción de andenes y bordillos

Para este periodo, se realizaron 3 reuniones con la comunidad en el sector Brisas Del Magdalena, sobre el corte de sus pisos y ceder espacios para la construcción de andenes y bordillos, durante estas reuniones se contó con la presencia del personal de obra, habitantes del sector y alcaldesa municipal, inspector de policías y secretaria de Planeación, se realizó un trabajo de sensibilización puerta a puerta para obtener su consentimiento y brindarles información.

Ver registro fotográfico. Ver anexo No 6. Listados de asistencias. Acta de reunión con la comunidad. Formato acta de socialización.



Imagen No. 9 Reunión de Socialización de corte de pisos para construcción de andenes y bordillos en compañía del inspector de policía
Lugar: Brisas Del Magdalena



Imagen No.10 Reunión de Socialización de corte de pisos para construcción de andenes y bordillos en compañía de la alcaldesa municipal
Lugar: Brisas Del Magdalena

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01



Imagen No.11 socialización de corte de pisos para construcción de andén en compañía de secretaria de planeación

Lugar: brisas del magdalena



Imagen No.12. socialización de corte de pisos para construcción de andén en compañía de secretaria de planeación

Lugar: brisas del magdalena



Imagen No 13. Sensibilización puerta a puerta
Lugar: Brisas Del Magdalena



Imagen No 14. Sensibilización puerta a puerta
Lugar: Brisas Del Magdalena

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Reunión de socialización de obra Calles 32-33-34

Durante el presente período se realizaron jornadas de socialización predio a predio con los habitantes y demás actores de influencia de las calles: 32, 33 y 34, con el propósito de informar sobre el inicio de las obras de pavimentación, el alcance del proyecto, las actividades programadas y el cronograma de ejecución. En la jornada se contó con la participación del personal del Consorcio Vías Bolívar, alcaldesa municipal y miembros de la comunidad, quienes recibieron información relacionada con las intervenciones a ejecutar, las medidas de manejo para minimizar las afectaciones temporales y los canales de atención para la recepción de inquietudes, sugerencias y observaciones. Asimismo, se promovió la participación ciudadana, resolviendo las inquietudes planteadas por los asistentes y fortaleciendo la comunicación entre la comunidad y el proyecto. **Ver registro fotográfico. Ver anexo No 7. Listados de asistencias. Acta de reunión con la comunidad.**

			
Imagen No 15. Reunión de socialización de obra de pavimentación en la calle 33 y 34		Imagen No 16. Reunión de socialización de obra de pavimentación en la calle 33 y 34	
Lugar: calle 32		Lugar: calle 32	

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01



Imagen No 17. Reunión de socialización de obra de pavimentación en la calle 33 y 34

Lugar: calle 33



Imagen No 18. Reunión de socialización de obra de pavimentación en la calle 33 y 34

Lugar: calle 33



Imagen No 19. Reunión de socialización de obra de pavimentación en la calle 33 y 34

Lugar: calle 34



Imagen No 20. Reunión de socialización de obra de pavimentación en la calle 33 y 34

Lugar: calle 34

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CI	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

El cuadro adjunto muestra la reprogramación de las reuniones de socializaciones pendientes.

Tabla No 3. Muestra las reuniones realizadas a la fecha.

Consolidado Reuniones Realizadas						
No	MUNICIPIO	FECHA	HORA	LUGAR	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Calamar	11/02/2026	9.AM.	Barrio Brisas de la magdalena	Se cumplió con la reunión de socialización de apertura del proyecto, para el inicio de las obras.	Ejecutada
2	Calamar	22/05/2026	5.PM.	Barrio Brisas del magdalena	Se cumplió con la reunión de socialización para la continuación de la obra	Ejecutada
3	Calamar	22/05/2026	4.PM.	Barrio Brisas del magdalena	Se cumplió con la reunión de socialización para el corte de pisos en terrazas	Ejecutada
4	Calamar		9 AM	Barrio arriba Calle 34	Se cumplió con la reunión de socialización de las obra de pavimentación	Ejecutada
	Calamar		10:30 AM	Barrio arriba Calle 33	Se cumplió con la reunión de socialización de las obra de pavimentación	Ejecutada
4	Calamar		3 PM	Barrio Brisas del magdalena	Se cumplió con la reunión de socialización para el corte de pisos en terrazas para construcción de andenes y bordillos	Ejecutada
5	Calamar		6 PM	Barrio Brisas del magdalena	Se cumplió con la reunión de socialización para el corte de pisos en terrazas para construcción de andenes y bordillos	Ejecutada
6	Calamar	26-06-2026	10 AM	Barrio arriba Calle 32	Se cumplió con la reunión de socialización de las obra de pavimentación	Ejecutada

	<p>CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR CI</p>	<p>CONTRATO 3516 DE 2025</p>
	<p>CONSORCIO VÍAS BOLÍVAR CL</p>	<p>Versión: 01</p>

Reuniones de articulación Institucional

En reunión realizada con el personal del proyecto de alcantarillado, se socializaron avances y necesidades relacionadas con la ejecución de actividades en el sector barrio arriba. Durante el encuentro, el proyecto alcantarillado manifestó el compromiso de realizar entrega del tramo comprendido entre la carrera 5 y la carrera 3 de la calle 32 quedando pendiente el tramo de la carrera 6 esto con el fin de permitir la continuidad y el avance del proyecto.

Así mismo, se establecieron compromisos de coordinación y seguimiento entre las partes para garantizar el cumplimiento de los cronogramas y minimizar afectaciones a la comunidad. **Ver registro fotográfico. Ver anexo No 8. Acta de compromiso, Listado de asistencia.**



Imagen No.21: Reunión con personal del proyecto alcantarillado.
Lugar: calle 32



Imagen No.22: Reunión con personal del proyecto alcantarillado.
Lugar: calle 32

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Conformación de la Veeduría

Nota: el contratista tiene previsto para el próximo periodo realizar una convocatoria abierta para todos los líderes de los diferentes tramos que hacen parte integral del proyecto.

Visitas de Seguimiento

Se han realizado visitas de seguimiento en compañía de la interventoría a la obra, con el objetivo de verificar las condiciones de obra que afecten a la comunidad y que no repercutan en retrasos de obra.

Atención de manifestaciones ciudadanas.

Se presenta, cuadro consolidado donde se proyectará la recepción de las manifestaciones ciudadanas; que se presentaran a lo largo del proyecto. Dichas manifestaciones serán discriminadas de la siguiente manera:

- Quejas – referidos en el cuadro con la letra Q.
- Peticiones- referidos en el cuadro con la letra P.
- Reclamos- referidos en el cuadro con la letra R.
- Solicitudes- referidos en el cuadro con la letra S.
- Otras – referidas en el cuadro con la letra O.

Para este periodo, se recibieron (06) manifestaciones ciudadanas, interpuesta por varios miembros de la comunidad, las cuales se asocian a afectaciones de su andén y posible impacto de su estructura colocada en terraza y vivienda en general. Además, lograron subsanarse (2) manifestaciones ciudadanas teniendo como resultado la satisfacción de los miembros de la comunidad. Ver novedades en cuadro manifestaciones ciudadanas. **Ver anexo No 9. PQRS.- Registro fotográfico.**

Cuadro No 4. Consolidado Manifestaciones Ciudadanas							
No	FECHA	ASUNTO	PQR				
			P	Q	R	S	O
01	20-04-2026	La señora Eleida Perea, manifiesta preocupación por afectación de su andén y posible avería de su vivienda y estructura en terraza.	x				
						Se atendió la petición presentada, realizando la reparación de los daños en andén y	Cerrada

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Cuadro No 4. Consolidado Manifestaciones Ciudadanas										
No	FECHA	ASUNTO	PQR					RESPUESTA	ESTADO	
			P	Q	R	S	O			
								estructura del predio.		
02	02-05-2026	La señora Maritza pacheco, manifiesta que, debido al tránsito de volteo vinculado a la obra, su piso fue afectado.			x			Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta.	Abierta	
03	04-05-2026	El señor Álvaro Estrada Pájaro manifiesta afectación en sus paredes por grietas y fisuras.	x					Se atendió la petición presentada. El propietario por voluntad propia reparo las grietas y fisuras y se logró subsanar los daños presentados en sus paredes.	Cerrada	
04	05-05-2026	La señora Yaseinis Ariza Madrid manifiesta afectación en sus parades por grietas y ruptura de vidrio en su ventana.			x			Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta.	cerrada	
05	05-05-2026	La señora Luz castro villa manifiesta que, debido a las actividades de la obra, su piso fue afectado.	x					Se atendió la petición presentada, realizando la reparación de los daños identificados en su piso.	Cerrada	
06	06-05-20226	La señora María Perea manifiesta inconformidad por el corte de su piso.		x				Se atendió la queja por el corte de piso, realizando las acciones correspondientes y logrando la satisfacción de la inconformidad manifestada por la usuaria.	Cerrada	

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Cuadro No 4. Consolidado Manifestaciones Ciudadanas									
No	FECHA	ASUNTO	PQR					RESPUESTA	ESTADO
			P	Q	R	S	O		
07	07-05-2026	La señora Mercedes Perea realiza petición y manifiesta que, debido a la propuesta del corte de piso, solicita dejarlo en buen estado.	x					Se atendió la petición presentada, realizando la reparación de los daños identificados en su piso.	cerrada
08	12-05-2026	El señor José Ospino Solicita reparación de su piso que, debido a las actividades de la obra, fue afectado.	x					Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta.	Abierta
09	12-05-2026	La señora Luz Perea realiza petición de las bancas retiradas, solicita que sean entregadas en buenas condiciones.	x					Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta.	Abierta
10	21-05-2026	Luisa Ruiz manifiesta afectación en sus paredes por grietas y fisuras.			x			Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta.	Abierta
11	27-05-2026	La señora Yeinis Cortes manifiesta informalidad por nivel del tubo de desagüe.	x					Se atendió la petición relacionada con el nivel del tubo de desagüe, efectuando el ajuste requerido conforme a lo solicitado.	Cerrada
12	01-06-2026	La señora María pera García manifiesta preocupación por su estructura metálica (protector de ventana) por temor a posible colapso y solicita inspección y reparación.	x					Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta	Abierta

	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Cuadro No 4. Consolidado Manifestaciones Ciudadanas							
No	FECHA	ASUNTO	PQR				
			P	Q	R	S	O
13	03-06-2026	La señora Luz creso Bornachera manifiesta que debido a las actividades realizadas en la obra su enchapado fue afectada cayéndose una de sus baldosas , solicita inspección y pronta solución	x				
							Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta
14	05-06-2026	El señor Rafael Gómez creso manifiesta que debido a las actividades de la obra su baldosa fue fracturada en su totalidad en la parte frontal del piso de su terraza.	x				
							Se indica a el peticionario, que se revisará su caso para dar una respuesta
15	10-06-2026	La señora Nayelis Vargas Caro, manifiesta que debido a las actividades realizadas en la obra, por el tránsito de volquetas su piso fue fracturado y afectado. Solicita inspección y pronta solución	x				
							Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta
16	11-06-2026	La señora Gladys moreno Martínez manifiesta que debido a las actividades realizadas en la obra su piso fue destruido completamente y por el tránsito de las maquinarias su muro fue fracturado. Solicita inspección y pronta solución	x				
							Se indica a la peticionaria, que se revisará su caso para dar una respuesta
17	18-06-2026	El señor Elkis Moreno Palencia manifiesta que debido a la	x				
							Se indica al peticionario, que se revisará su

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Cuadro No 4. Consolidado Manifestaciones Ciudadanas						
No	FECHA	ASUNTO	PQR			
			P	Q	R	S O
		construcción del andén el piso de su negocio fue afectado ya que se realizó un corte perdiendo los bordes.				caso para dar una respuesta.



Manifestación Ciudadana No.12
Imagen No.23
Lugar: Brisas del Magdalena



Manifestación Ciudadana No.12
Imagen No.24
Lugar: Brisas del Magdalena


 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01



Manifestación Ciudadana No.16
Imagen No.25
Lugar: Brisas del Magdalena



Manifestación Ciudadana No.16
Imagen No.26
Lugar: Brisas del Magdalena

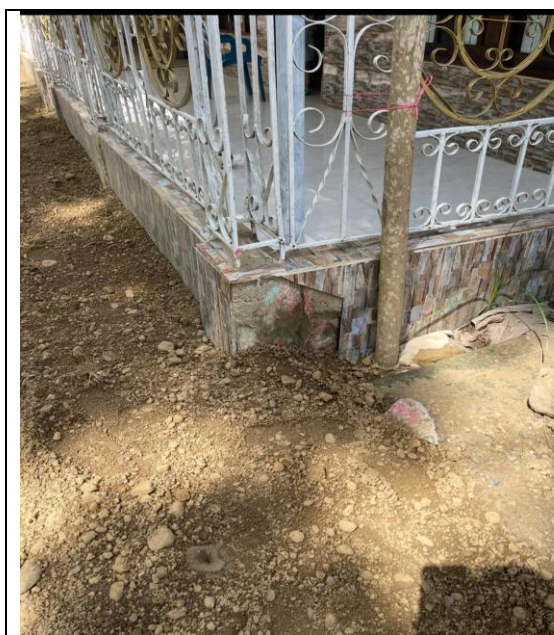


Manifestación Ciudadana No.14
Imagen No.27
Lugar: Brisas del Magdalena



Manifestación Ciudadana No.15
Imagen No.28
Lugar: Brisas del Magdalena

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

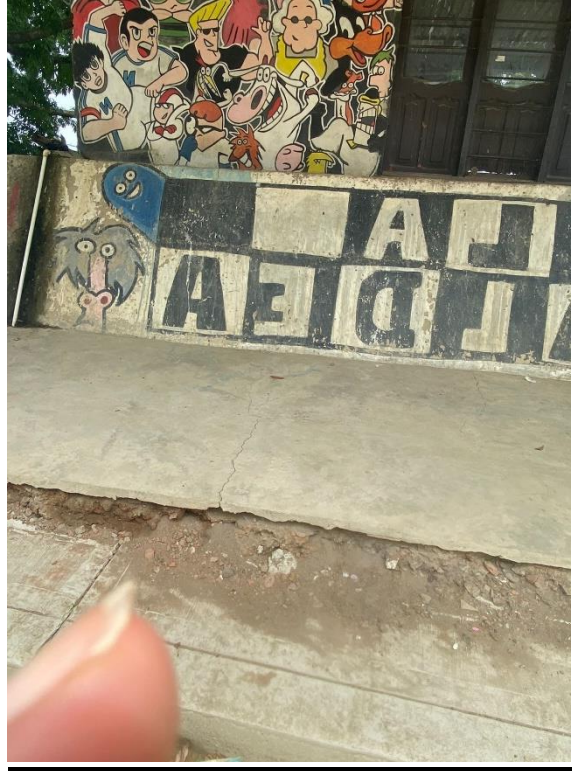	
Manifestación Ciudadana No.16 Imagen No.29 Lugar: Brisas del Magdalena	Manifestación Ciudadana No.17 Imagen No.30 Lugar: Brisas del Magdalena

3.4.4 PROGRAMA VINCULACIÓN LABORAL.

Los proyectos de infraestructura de cualquier envergadura, tiene una fuerte incidencia en la generación de empleo, lo que se convierte en un impacto positivo; permitirá un mejoramiento de los ingresos de muchas familias. En ese sentido los beneficiarios de este proyecto deben ser los familiares que se hallan en el área de influencia del mismo; bajo la modalidad de mano de obra no calificada, siempre y cuando cumplan con los perfiles exigidos y/o requeridos.

En todo caso el contratista, vinculará el 10% de la mano de obra no calificada de la zona; de esta el 5% debe estar representada en el sexo femenino. (Mujer).

Además, se realizarán mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, para lograrlo, se gestionará espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Se presenta el personal vinculado al proyecto en Tabla No 5.

PROYECTO		PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO			
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL			
Nombre		No IDENTIFICACIÓN	CARGO	AID	LUGAR
1	MELISSA LINEY GONZALEZ LLERENA	1002294028	AUXILIAR SOCIAL	SI	CALAMAR
2	MARIA ALEJANDRA CASSIANI OLIVERO	1047382597	AUXILIAR SST	SI	CALAMAR
3	RICHARD ANTONIO GOMEZ MOLINA	1143234480	TOPOGRAFO	SI	CALAMAR
4	FREDY ANDRES SIERRA MORALES	1002070165	OPERADOR	SI	CALAMAR
5	EDWIN GABRIEL VERGARA SERRANO	73231847	AYUDANTE DE OBRA	SI	CALAMAR
6	ELVIS LUIS JIMENEZ MOLINA	5721949	OPERADOR	SI	CALAMAR
7	ROBINSON FERIA FONSECA	73271436	AYUDANTE DE OBRA	SI	CALAMAR
8	JOSE GABRIEL OSPINO DE AVIAL	1051356999	CONCRETERO	SI	CALAMAR
9	GIOVANNI RAUL BRIGANTE DEL GUERCIO	19591471	INSPECTOR	SI	CALAMAR
10	ROINER JESUS GARCIA LUGO	1130266793	CONCRETERO	SI	CALAMAR
11	LUIS MANUEL MEDINA BARCA	1045727452	CONCRETERO	SI	CALAMAR
12	JESUS ANTONIO FLOREZ CUENTAS	1143450554	CONCRETERO	SI	CALAMAR
13	SANDRA JULIO CORONADO	22599247	PROFESIONAL SOCIAL	NO	BARRANQUILLA
14	GILBERTO ANTONIO ARIZA CUENTAS	1045683626	CONCRETERO	SI	CALAMAR
15	ARMANDO MARTINEZ SPADAFORA		ING RESIDENTE	SI	CALAMAR

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El periodo del informe No 4, comprende entre el 01 de junio al 30 de 2026, durante este tiempo, se realiza seguimiento al proyecto, a través de visitas domiciliarias.

Se realizaron jornada de limpieza y conservación del entorno de la obra

Durante el periodo reportado se elaboraron y gestionaron actas de compromiso para la disposición y/o aprovechamiento de material sobrante de obra, dejando constancia de la entrega en calidad de donación de material no contaminado para el mejoramiento de patios, accesos y otras áreas de uso domiciliario. Asimismo, se tramitaron actas de autorización para el uso de servicios sanitarios por parte del personal de obra y actas de compromiso orientadas a la reparación de posibles afectaciones o a la restitución de elementos intervenidos en los predios.

Se brindó atención oportuna a las manifestaciones ciudadanas presentadas por la comunidad, dando respuesta a las inquietudes y requerimientos formulados durante la ejecución del proyecto. Se mantuvo en funcionamiento el Punto Móvil de Atención a la Comunidad en el área de intervención, con el propósito de facilitar la comunicación permanente entre la comunidad y el proyecto.

Se desarrollaron jornadas de socialización con los residentes y el personal de obra, en las cuales se informó sobre las interferencias identificadas entre las terrazas de algunos predios y las actividades constructivas. Durante estos espacios se promovió la liberación voluntaria del área de uso público ocupada, se informó sobre las labores de corte de pisos y se atendieron las inquietudes de los asistentes para garantizar la continuidad de las obras. Sin embargo se registraron casos en los que algunos residentes manifestaron su desacuerdo con la intervención, expresando su inconformidad frente al corte de pisos en sus terrazas considerando afectaciones y cada uno exponiendo sus propios motivos, estas situaciones técnicas fueron atendidas mediante el dialogo, dejando constancia de sus observaciones y evaluando alternativas dentro del marco legal y técnico establecido.

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

Como resultado de la gestión social, se logró el cierre satisfactorio de dos (2) manifestaciones ciudadanas identificadas, evidenciando conformidad por parte de los propietarios de los predios intervenidos, (2).

Se logró la Articulación institucional con el equipo encargado del proyecto de alcantarillado, se socializaron los avances alcanzados, las necesidades operativas y las actividades previstas para los próximos frentes de intervención, realizando además inspecciones técnicas para la programación del inicio de las obras.

El proyecto mantiene un cumplimiento del 100 % en la contratación de mano de obra local y registra una participación del 5 % de personal femenino dentro del equipo de trabajo.

Finalmente, se realizaron recorridos permanentes en los diferentes frentes de obra con el fin de identificar, atender y prevenir oportunamente cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo de las actividades constructivas.

Se realizaron comités de obra, para hacer el seguimiento y control al cumplimiento del PGS.

—

Melissa Gonzalez

Profesional Social.

 CONSORCIO VIAS BOLIVAR CI	INFORME SOCIAL N°4	CONTRATO 3516 DE 2025
	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL	Versión: 01

ANEXOS

- No. 1 listados de asistencias.
- No. 2 Listado de asistencia- Volante informativo.
- No. 3 permisos uso de baño.
- No 4 Actas de compromisos disposición de escombros y/o material sobrante.
- No 5. Actas de compromiso
- No 6. Listados de asistencias. Acta de reunión con la comunidad. Formato acta de socialización
- No 7. Listados de asistencias. Acta de reunión con la comunidad. Formato acta de socialización
- No 8. Acta de compromiso, Listado de asistencia.
- No 9. PQRS

Informe No	3	Periodo	01 de junio 2026	al	30 de junio 2026	Proyecto	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - BOLIVAR
Contrato de obra		Contratista	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL				

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS								
								
Foto 1	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN		Foto 2	SEÑALIZACIONES Y DELIMITACIONES		Foto 3	INSPECCIÓN DE EPP	

					
Foto 4	USO ADECUADO DE EPP PARA REALIZAR LA LABOR	Foto 5	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	Foto 6	PAUSAS ACTIVAS
					
Foto 7	FORMACION	Foto 8	SENDERO PEATONAL	Foto 9	ORDEN Y ASEO EN AREA DE TRABAJO

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS				
2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS				
No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados	
1	Riesgo Biomecanico (Posturas, manipulacion de cargas)	200	Capacitación en manejo manual y mecanico de cargas, trabajo en equipo, Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	
2	Riesgo Fisico - Ruido ruido (de impacto, intermitente, continuo)	150	Elementos EPP auditivos y capacitacion sobre el riesgo	
3	Riesgo Fisico - Vibracion (Cuerpo entero)	100	Mantenimiento de maquinas, inspeccion preoperacional, inspeccion de herramientas y pausas activas.	
4	Riesgo - Fisco - Radiaciones No Ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja, radio frecuencia, microondas)	150	Uso de carpas, suministro de hidratacion, capacitaciones en radiaciones no ionizantes, pausas activas, Uso de EPP (Escafandra, camisa larga y Gafas oscuras)	
5	Riesgo por condiciones de seguridad (Manejo de Herramientas)	101	Preoperacionales, autocuidado, y capacitacion sobre el riesgo	
6	Riesgo por condiciones de seguridad (Accidente de transito)	120	Señalización de áreas, cerramientos provisionales, personal de control vial y capacitacion sobre el riesgo	
7	Riesgo por condiciones de seguridad (Locativos)	100	Jornadas de orden y aseo - capacitacion sobre el riesgo	
8	Riesgo por condiciones de seguridad (Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden publico, etc.)	100	Charlas de Riesgo publico basadas en como actuar en caso de un robo y atraco, modus operandi de la delincuencia.	
9	Riesgo - químico (Material particulado)	150	control de material semi-humedo, EPP, casco, gafas, tapa bocas, camisa manga larga y botas de seguridad.	
10	Riesgo Fenomenos Naturales (Lluvias)	150	Pare de actividades dependiendo del riesgo y capacitaciones del riesgo	
Riesgo promedio dentro de la obra		132,1	Acetable con controles	

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra
1	Plan de emergencia y analisis de vulnerabilidad del CALAMAR
2	Medevac
3	Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro
4	Inspección y disponibilidad de equipo de emergencia(extintor,botiquín,camilla)
5	Conformación de las brigada de emergencia(primeros auxilios,evacuacion,contra incendio)
6	Implementación de sendero peatonales seguros

2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
Razon Social	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2026											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ARMANDO MARTINEZ SPADAFORA	0	0	0	7	15	15						
Total Hombres (W)	0	0	0	7	15	15						
	0	0	0	1120	2400	2400	0	0	0	0	0	0

Informe No3

Periodo01 de junio 2026al30 de junio 2026

ProyectoCONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - BOLIVAR

Contrato de obraContratistaCONSORCIO VIAS BOLIVAR CL

Horas hombre acumulada	0	0	0	1120	3520	3520	1	2	3	4	5	6
------------------------	---	---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha			Tipo de actividad		Tema					No asistentes		Responsable
1	6	2026	Charla corta		¿Que hacer ante una ola de calor?					6		Maria Cassiani
2	6	2026	Charla corta		Identificación de riesgos en el area de trabajo					8		Maria Cassiani
4	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					7		Maria Cassiani
9	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					9		Maria Cassiani
11	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					9		Maria Cassiani
13	6	2026	Charla corta		Orden y aseo en el lugar de trabajo					9		Maria Cassiani
16	6	2026	Charla corta		Puntualidad y compromiso con el horario de trabajo					9		Maria Cassiani
18	6	2026	Capacitación		Manejo de obras en concreto y materiales de construcción					11		Maria Cassiani
18	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					9		Maria Cassiani
20	6	2026	Charla corta		Higiene y ergonomia					9		Maria Cassiani
22	6	2026	Capacitación		Manejo de aguas superficiales					10		Maria Cassiani
23	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					11		Maria Cassiani
25	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					7		Maria Cassiani
26	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					9		Maria Cassiani
27	6	2026	Pausas Activas		Pausas Activas					7		Maria Cassiani

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA												
Análisis de Seguridad en el Trabajo												
Fecha			Lugar		Descripción de la tarea					Responsable		
2/05/2026	al	8/05/2026	Calamar - Brisas de cartagena		Excavacion del terreno a profundidad 0.55m y ancho 5.1M Instalacion de malla geotextil en el tramo Colocacion de material de mejoramiento (afirmado) Retiro de material descalificado del tramo					Armando Martinez		
11/05/2026	al	15/05/2026	Calamar - Brisas de cartagena		Fundicion de bordillos y andenes (Abs 400 a Abs 610					Armando Martinez		
18/05/2026	al	29/05/2026	Calamar - Brisas de cartagena		Excavacion del terreno a profundidad 0.55m y Ancho 5.1m en el tramo (Abs 400 a Abs 200) Retiro de material excavado del tramo (Abs 400 a Abs 200) Instalaciones de acometidas de redes de agua potable en el tramo (Abs 400 a Abs 200) Instalacion de malla geotextil a Ancho 5.1 m (Abs 400 a Abs 200) Colocacion de material de mejoramiento a Altura 0.20m y Ancho 5.1m (Abs 400 a Abs 200) Compactación de material de mejoramiento (Abs 400 a Abs 200) Preparación e colocacion de sub base suelo cemento a Altura 0.15 m y Ancho 5.1m (Abs 400 a Abs 200) Compactación de sub base suelo cemento (Abs 400 a Abs 200)					Armando Martinez		

	Lugar		Nombre del trabajador		No de Cedula		Empresa		Vigencia		No de Registro		Recomendaciones Medicas	
PARA EL PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS EN ALTURA.														
Fecha		Lugar	Actividad				Tarea de Alto Riesgo		Nombre del trabajador			Inspector SST certificado		
PARA EL PERIODO NO SE DILIGENCIARON PERMISOS PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO.														

Entrega de elementos de seguridad													
Elemento			Unidad	Cantidad	Observaciones								
Botas de seguridad			und	0	En el mes de junio no se hizo entrega de epp								
Casco tipo I			und	0	En el mes de junio no se hizo entrega de epp								
Guantes de vaqueta			par	0	En el mes de junio no se hizo entrega de epp								
Guantes de Nitrilasafe			par	0	En el mes de junio no se hizo entrega de epp								
Proteccion visual			und	0	En el mes de junio no se hizo entrega de epp								
Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria									Hallazgos
16	6	2026	Calamar Bolivar	Inspeccion a obra									N/A
16	6	2026	Calamar Bolivar	Inspeccion de botiquin									N/A
16	6	2026	Calamar Bolivar	Inspeccion de extintores									N/A
16	6	2026	Calamar Bolivar	Inspencion de camilla para manejo de lesionado									N/A

9. COPASST y/o Vigia													
Cantidad de reuniones ejecutadas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	0	0	0	1	1	1							
Novedades	Seguimiento a los planes de formacion, plan de trabajo e indicadores de gestion.												

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO													
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA													
EPS			FONDO DE PENSIONES				A.R.L.				CAJA DE COMPENSACION		
Razón social		Cant. Trab	Razón social		Cant. Trab		Razón social		Cant. Trab		Razón social		Cant. Trab
COOSALUD		1	PORVENIR		11		SURA		15		COMFAMILIAR ATL		0
SALUD TOTAL		5	COLFONDOS		1						COMFAMILIAR CTG		0
MUTUAL SER		7	COLPENSIONES								COMBARRANQUILLA		0
CAJACOPI			PROTECCIÓN		3						CCF DE SUCRE		0
NUEVA EPS		2											
FAMILIAR DE COLOMBIA													
CAPRECOM													
SANITA													
TOTAL		15	TOTAL		15		TOTAL		15		TOTAL		0

2.3 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0	0							
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0	0	0							
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0	0	0	0	0	0							
# de (RTA) Accidente vial/ tránsito	0	0	0	0	0	0							
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0	0	0	0							
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0	0	0							
# de (NM) Incidente	0	0	0	0	0	0							
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0	0	0							
# de Investigaciones de Accidentes Laborales		0	0	0	0	0							
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0							



INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Informe No	3	Periodo	01 de junio 2026	al	30 de junio 2026	Proyecto	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - BOLIVAR
Contrato de obra		Contratista	CONSORCIO VIAS BOLIVAR CL				

# de dias perdidos por AT	0	0	0	0	0								
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							
Severidad accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0	0	0							
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0							
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0							
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0	0	0	0	0	0							
Ausentismo por Causa Medica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO

Descripción	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Señales Preventivas	0	0	0	0	3	3	4						
Señales Informativas	0	0	0	0	3	3	12						
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	4						
Canalizadores de Trafico	0	0	0		4	4	22						
Señales Institucionales	0	0	0	0	0	0	0						

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-	Recolección y Transporte RCD
CALLE 32	MINICARGADOR	MC316294	2013	BOBCAT	A3L541661	N/A	N/A	N/A
BARRIO ARRIBA	MINICARGADOR	MI012469	2013	BOBCAT	A7U713379	N/A	N/A	N/A
BARRIO ARRIBA	VIBROCOMPACTADORA	MC759749	1999	DYNAPAC	60211838	N/A	N/A	N/A

4. OBSERVACIONES

5. ANEXOS

SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	X
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	X
SST-3	Registros de ATS	X
SST-4	Certificados de trabajos en altura	N/A
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	X
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	X
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	X
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	X
SST-9	Registro fotográfico	N/A
SST-10	Otros anexos	(Especificar cual)

Firma
MARIA ALEJANDRA CASSIANI O.
Responsable del área SST
Contratista

Firma
Nombre
Responsable del área SST
Interventoría

	INFORME TÉCNICO DE OBRA N°1	Contrato N°: 3516 de 2025
	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR CI	Versión: 01

para prevenir la ocurrencia de eventos similares y reducir el riesgo de retrabajos y retrasos en la ejecución.

En términos generales, las situaciones descritas no han ocasionado, hasta la fecha, afectaciones directas sobre la ruta crítica del contrato; sin embargo, constituyen factores externos y operativos que incrementan el nivel de riesgo para el desarrollo del proyecto. La presencia de interferencias derivadas de información técnica insuficiente de las redes existentes, la disponibilidad parcial de las vías por la falta de entrega definitiva de las obras de alcantarillado y el incumplimiento de las restricciones de acceso por parte de la comunidad tienen el potencial de generar desviaciones en los plazos contractuales, disminuir los rendimientos de obra e incrementar los costos asociados a la ejecución. En este contexto, aunque el avance físico y financiero del contrato se mantiene acorde con la programación vigente, resulta indispensable continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional, la gestión técnica y las medidas de control operativo, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades, reducir las interferencias y preservar la calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.
