

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS



CONTRATO 1922 DE 2025

**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

INFORME MENSUAL No. 4

INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS



MARZO 01 AL 31 DE 2026, BARRANQUILLA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1914 de 2025, 1915 de 2025, 1892 de 2025, 1882 de 2025, 1957 de 2025, 1968 de 2025 **Contratista:** CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL, CONSORCIO NAVEGABILIDAD, CONSORCIO VIA FLUVIAL, TORRES Y ASOCIADOS SAS, CONSORCIO MNF, CONSORCIO NAVGABILIDAD

Contrato de Interventoría No. 1922 DE 2025 **Interventoría:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS

Objeto Contrato de Consultoría:
DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN TUMACO-NARIÑO.

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** 01 AL 31 DE MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
1	INTRODUCCIÓN		9
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		12
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		33
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		36
2.4	Características técnicas del proyecto		37
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA		40
3.1	Información general del contrato		40
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		46
3.3	Seguimiento ítems no previstos		56
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		56
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	59
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	61
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	64
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	76
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	82
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	86
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	90
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	102
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		102
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	103
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	106
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	106
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	106
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		107
5.1	Información general del contrato		107
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		109
5.3	Informes especialistas y profesionales		110
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		110
5.5	Informe matriz de riesgos.		111
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		111
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		112
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	112
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	113
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	114
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	115
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	116
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		116
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	116
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	116
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	116
7	Conclusiones y recomendaciones		117
8	Anexos		121
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		121

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: Patricia Ines Morales Padron
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula Profesional 0820254602 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	9
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	11
2.1	Localización de los proyectos.....	11
2.1.1	Lote 1 Consorcio Inprobrain Fluvial.....	11
2.1.2	Lote 2 Consorcio Navegabilidad.....	18
2.1.3	Lote 3 Consorcio Vía Fluvial.....	23
2.1.4	Lote 4 Torres y Asociados SAS.	27
2.1.5	Lote 5 Consorcio MNF.	30
2.1.6	Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.....	33
2.2.	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.	34
2.3.	Inventario y estado inicial de la vía.....	37
2.4.	Características técnicas del proyecto.....	38
3.	INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA.....	41
3.1	Información General de los Contratos de Consultoría	41
3.1.1	Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.....	41
3.1.2	Lote 2. Consorcio Navegabilidad.	42
3.1.3	Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.	43
3.1.4	Lote 4. Torres y Asociados SAS.	44
3.1.5	Lote 5. Consorcio MNF.....	45
3.1.6	Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.	46
3.2.	Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes	47
3.2.1	Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.....	47
3.2.2	Lote 2. Consorcio Navegabilidad.....	49
3.2.3	Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.	51
3.2.4	Lote 4. Torres y Asociados SAS.....	53
3.2.5	Lote 5. Consorcio MNF.	54
3.2.6	Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.....	55
3.3.	Seguimiento Ítems no previstos	57
3.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	57

4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA	60
4.1.	Informes Semanales	60
4.2.	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	62
4.3.	Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría.....	65
4.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	77
4.5.	Estado general del Tiempo	83
4.6.	Resumen Ensayos de laboratorio	87
4.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	91
4.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.....	103
4.9.	Otros documentos seguimiento mensual.....	103
4.9.1.	Seguimiento a la inversión del Anticipo	104
4.9.2.	Seguimiento al programa de inversiones	107
4.9.3.	Actas de comité y reunión	107
5	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	108
5.1.	Información general del contrato.....	108
5.2.	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.	110
5.3.	Informes de especialistas y profesionales	111
5.4.	Informe del Programa Anual de Caja – PAC.....	111
5.5.	Informe matriz de riesgos.....	112
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría.....	112
6	REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	113
6.1.	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	113
6.2.	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 114	
6.3.	Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.	115
6.4.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría	116
6.5.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	117
6.6.	Otros documentos seguimiento mensual.....	117
6.6.1.	Seguimiento a la inversión del Anticipo	117
6.7.	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.....	117

7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	118
8	ANEXOS.....	122
8.1	RELACION DE CORRESPONDENCIA.....	122
8.2	INFORMES SEMANALES.....	134
8.3	INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DEL COORDINADOR Y DE LOS INGENIEROS RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS, Y DEL INGENIERO AUXILIAR.	134
8.4	PRESENTACIÓN COMITES DE SEGUIMIENTO	134

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1	Localización del Hito 1 Puracon.....	12
Figura 2	Localización del Hito 1 Pucarón.....	12
Figura 3	Localización del Hito 2 Taraira.....	13
Figura 4	Localización del Hito 2 Taraira.....	14
Figura 5	Localización del Hito 3 Pacoa	15
Figura 6	Localización del Hito 3 Pacoa	15
Figura 7	Localización del Hito 4 Mirití- Parana.....	16
Figura 8	Localización del Hito 4 Mirití- Parana.....	16
Figura 9	Localización del Hito 5 La Victoria.....	17
Figura 10	Localización del Hito 5 La Victoria.....	17
Figura 11	Localización del Hito 1 La Guadalupe	19
Figura 12	Localización del Hito 1 La Guadalupe	19
Figura 13	Localización del Hito 2 Puerto Colombia.....	20
Figura 14	Localización del Hito 2 Puerto Colombia.....	21
Figura 15	Localización del Hito 3 Cacahual.	22
Figura 16	Localización del Hito 3 Cacahual.	23
Figura 17	Localización del Hito 1 Mapiripana.....	24
Figura 18	Localización del Hito 1 Mapiripana.....	24
Figura 19	Localización del Hito 2 Morichal.	25
Figura 20	Localización del Hito 3 Papanahua	26
Figura 21	Localización del Hito 3 Papanahua	26
Figura 22	Localización del Hito 1 Unguía	27
Figura 23	Localización del Hito 1 Unguía	28
Figura 24	Localización del Hito 2 Pavasá.....	29
Figura 25	Localización del Hito 2 Pavasá.....	29
Figura 26	Localización del Hito 1 Solita	30
Figura 27	Localización del Hito 1 Solita	31

Figura 28 Localización del Hito 2 Solano	32
Figura 29 Localización del Hito 2 Solano	32
Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño.....	33
Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño.....	34
Figura 32 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 2	62
Figure 33 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 4.....	63
Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 5.....	64
Figura 35 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 1.	71
Figura 36 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Cosnultoría. Lote 2.	72
Figura 37 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 3.	73
Figure 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 4.	74
Figura 39 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 5.	75
Figura 40 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 6.	76
Figura 41 Informe financiero lote 1.	77
Figura 42. Informe financiero lote 2.	78
Figura 43 Informe financiero lote 3.	79
Figura 44 Informe financiero lote 4.	80
Figura 45 Informe financiero lote 5.	81
Figura 46 Informe financiero lote 6.	82
Figura 47 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 2.	83
Figura 48 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 3.	84
Figura 49 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 4.	85
Figura 50 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 5.	86
Figura 51 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 4.	87
Figura 52 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 5.	88
Figura 53 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.....	91
Figura 54 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.....	93
Figura 55 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3.....	95
Figura 56 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4.....	97
Figura 57 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5.....	99

Figura 58 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6.....	101
Figura 59 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de obra, LOTE 2.....	104
Figura 60 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de obra, LOTE 4.....	105
Figura 61 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de obra, LOTE 5.....	106
Figure 62 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.....	113
Figura 63 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.....	114
Figura 64 MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.....	115
Figura 65 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento y seguros contrato de interventoría.....	116

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional.....	35
Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025.....	41
Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025.....	42
Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025.....	43
Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025.....	44
Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025.....	45
Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025.....	46
Tabla 8 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 1.....	60
Tabla 9 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 2.....	60
Tabla 10 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 3.....	60
Tabla 11 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 4.....	61
Tabla 12 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 5.....	61
Tabla 13 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 6.....	61
Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 1.....	65
Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 2.....	66
Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 3.....	67
Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 4.....	68
Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 5.....	69
Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 6.....	70
Tabla 20 Resumen reuniones y comités de seguimiento, periodo marzo.....	107
Tabla 21 Información del contrato de Interventoría.....	108

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

Tabla 22 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS	109
Table 23 Relación equipos de la Interventoría.	109
Tabla 24 listado informes semanales de Interventoría para el período comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.....	121

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 1.	122
Anexo 2 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1.	123
Anexo 3 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2.	123
Anexo 4 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2.	124
Anexo 5 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3.	125
Anexo 6 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3.	126
Anexo 7 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4.	127
Anexo 8 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4.	128
Anexo 9 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5.	129
Anexo 10 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5.	130
Anexo 11 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6.	130
Anexo 12 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6.	131
Anexo 13 Relación de correspondencia recibida de INVIAS.	132
Anexo 14 Relación de correspondencia enviada a INVIAS.	133

1. INTRODUCCION

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establece la promoción y desarrollo del modo fluvial y el transporte Intermodal, el cual elevará el nivel de los servicios que se prestan en la red fluvial; con el fin de generar una mayor accesibilidad de los territorios y mayor movilidad de la población de la Colombia profunda.

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra la estructuración de proyectos para la contratación de estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a su cargo, incluyendo los componentes técnico, jurídico, ambiental, social, predial y financiero. En desarrollo de dichas funciones, el INVIAS adelantó los procesos CMA-DTE-SPI-044-2025 y CMA-DTE-SPI-046-2025.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a través de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, incorpora dentro de su gestión el proyecto denominado **“Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS”**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y la operatividad de la infraestructura fluvial asociada a los muelles ubicados en la red navegable a cargo de la Entidad.

El proyecto objeto de interventoría corresponde a los **“Estudios y Diseños para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lotes 1 al 6”**, mediante el cual se contempla la ejecución de estudios para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de **Fase II – Factibilidad**, y para el Lote 6 a nivel de **Fase III – Estudios y Diseños Definitivos**.

Por lo que el Instituto Nacional de Vías suscribió con **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.)** el contrato número 1922 DE 2025, cuyo objeto es la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL”**

Y se suscribieron los siguientes contratos cuyo objeto son:

- El contrato 1914 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL**, cuyo objeto es **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS**

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.”

- El contrato 1915 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO NAVEGABILIDAD**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.**”
- El contrato 1892 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO VÍA FLUVIAL**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.**”
- El contrato 1882 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **TORRES Y ASOCIADOS**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**”. LOTE 4.”
- El contrato 1957 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5**”.
- El contrato 1968 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF**, cuyo objeto es “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.**”.

Las órdenes de inicio de los contratos de Consultoría se suscribieron:

- Lote No 1 el 16 de diciembre de 2025.
- Lote No 2 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 3 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 4 el 19 de diciembre de 2025
- Lote No 5 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 6 el 16 de diciembre de 2025

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

La orden de inicio del contrato de Interventoría se suscribió el 16 de diciembre del 2025.

El informe mensual No. 4 de Interventoría, corresponde al período comprendido entre el 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026. En este informe se presenta el alcance del proyecto, la información básica de los contratos de Consultoría e Interventoría y las principales actividades ejecutadas por la consultoría y la Interventoría durante este período.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización de los proyectos.

2.1.1 Lote 1 Consorcio Inprobrain Fluvial.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL se tiene la siguiente localización de los sus respectivos hitos:

HITO 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE ALTERNO PUCARÓN

El caserío de Pucarón se localiza al suroccidente del municipio de Mitú, en el departamento del Vaupés, en inmediaciones de los sectores de San Luis y Matapí. El área objeto de intervención corresponde a un punto estratégico del corredor fluvial del río Vaupés, el cual constituye un eje fundamental para el transporte de pasajeros, carga general y víveres desde el interior del país hacia el municipio de Mitú.

En este sector, la presencia de raudales genera una discontinuidad en la navegabilidad del tramo comprendido entre Calamar y Mitú, lo que obliga a la implementación de un trasbordo terrestre de aproximadamente 5,45 km. Dicho trasbordo se realiza a través de dos tramos viales: i) un tramo pavimentado en concreto, en adecuado estado de servicio, con una longitud aproximada de 2,40 km,

que conecta con los muelles de Yuruparí; y ii) un tramo carretable no pavimentado, de aproximadamente 2,45 km, que conduce al sector de Piraybaroca, desde donde se restablece la continuidad del transporte fluvial hacia el municipio de Mitú. Adicionalmente, este punto presenta una alta importancia funcional y social, al constituirse en un nodo de conectividad utilizado por comunidades indígenas para el acceso a servicios de educación y salud

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pucarón:

Figura 1 Localización del Hito 1 Puracon



Fuente: Google earth

Figura 2 Localización del Hito 1 Pucarón



Fuente: Google earth


EL HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE TARAIRA

Taraira es un municipio situado en el extremo suroriente del departamento del Vaupés, en Colombia. Se localiza en la frontera con Brasil al oriente y limita al sur y occidente con el departamento del Amazonas. Forma parte de la cuenca baja del río Apaporis, en una zona de alta riqueza hídrica y selvática.

El área municipal es de 6.619 Km², equivalente al 12,23% del área departamental, y limita por el norte con el corregimiento departamental de Pacoa y la República del Brasil (municipio de Japurá); por el oriente, con la República del Brasil (municipio de Japurá); por el sur y el occidente, con el departamento del Amazonas (corregimiento departamental de La Pedrera).

En las siguientes figura se presenta la localización general de Taraira:

Figura 3 Localización del Hito 2 Taraira

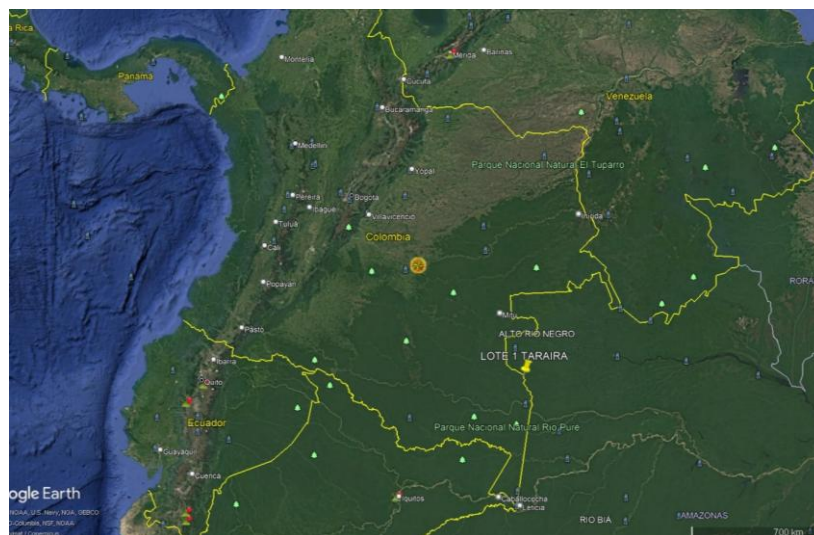

Fuente: Google earth

Figura 4 Localización del Hito 2 Taraira



Fuente: Google earth


EL HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PACOA

Pacoa es una de las tres áreas no municipalizadas del departamento de Vaupés en Colombia. Su cabecera municipal es Buenos Aires de Lérída, se encuentra a una altitud de 200 m.s.n.m. Cuenta con una superficie de 14.108 km² y tiene una población de 5709 habitantes. En este se encuentra el raudal de Jirijirimo, Río Apaporis.

Limita al norte con el corregimiento de Papunagua, partiendo del raudal Sabana; sobre el río Paraná Pichuna, siguiendo en línea recta en dirección noroeste hasta encontrar los nacimientos del caño Siringa; luego por el este aguas abajo hasta su desembocadura en el caño Aceite, punto de concurso del departamento del Guaviare y el municipio de Carurú y el corregimiento de Papunagua.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pacoa

Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa

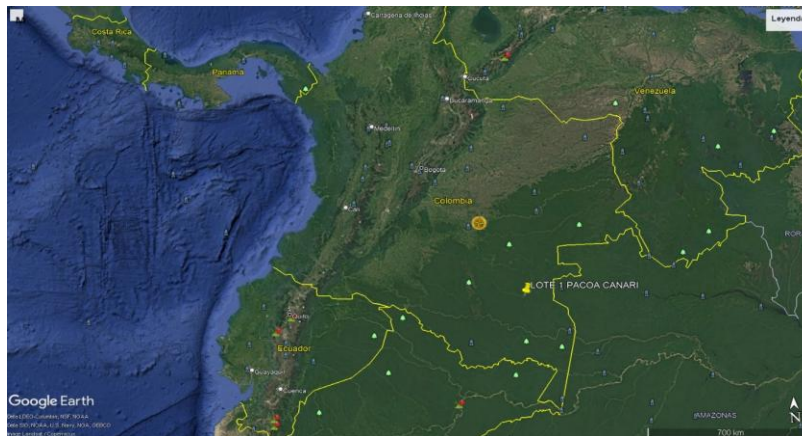

Fuente: Google earth

Figura 6 Localización del Hito 3 Pacoa



Fuente: Google earth

EL HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ

Localizado en Miriti-Paraná es un área no municipalizada colombiana, cuyo territorio se localiza en la cuenca del río del mismo nombre, y se encuentra ubicado al norte del departamento de Amazonas. Limita al norte con el departamento del Caquetá, el área no municipalizada de La Victoria y el departamento de Vaupés;

al este con el área no municipalizada de La Pedrera y al sur y oeste con el área no municipalizada de Puerto Santander.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Mirití Parana:

Figura 7 Localización del Hito 4 Mirití- Parana



Fuente: Google earth

Figura 8 Localización del Hito 4 Mirití- Parana




Fuente: Google earth

EI HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE LA VICTORIA

La Victoria es un área no municipalizada ubicada en el departamento colombiano de Amazonas. Limita al este con Pacoa, al noroeste con Solano y al sur con Mirití-Paraná. Fue fundado por Fidel Wilyhes. Este se localiza sobre el margen del rio Apaporis, su extensión es de 1443 km.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Victoria:

Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria

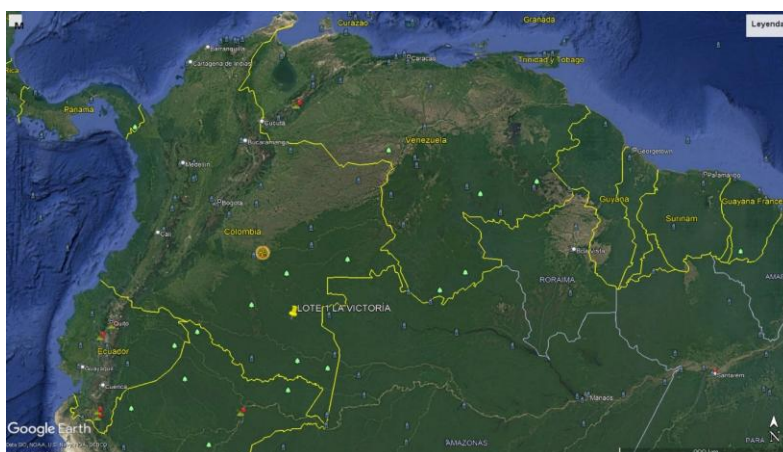

Fuente: Google earth

Figura 10 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Elaboración diagnósticos muelles fluviales a cargo del invias (Taraira, Miriti Parana, La Victoria) en los Departamentos de Vaupés y Amazonas. (INVIAS, 2023)

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

2.1.2 Lote 2 Consorcio Navegabilidad.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE.

La Guadalupe Está ubicado a los 01° 15´ 19” de latitud Norte y 66° 52´56” de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está ubicada en la margen derecha del río Negro, a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido entre los 27° y 32° y una precipitación media anual de 3.000 mm.. El Corregimiento tiene un área de 1.167 km², representando el 1,61% del total departamental. Limita por el norte con el corregimiento de San Felipe, por el oriente con la República de Venezuela y por el sur y el occidente con la República de Brasil.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Guadalupe:

Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

Figura 12 Localización del Hito 1 La Guadalupe




Fuente: Google earth

HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA.

Puerto Colombia es un área no municipalizada colombiana del departamento de Guainía, ubicada a 186 km por vía fluvial de Inírida, Limita al norte con el corregimiento departamental de Cacahual y el municipio de Puerto Inírida, al oriente con la República de Venezuela, por el sur con los corregimientos de San Felipe y Paná Paná y con Brasil y por el occidente con el corregimiento de Morichal y el municipio de Inírida

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Puerto Colombia:

Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.

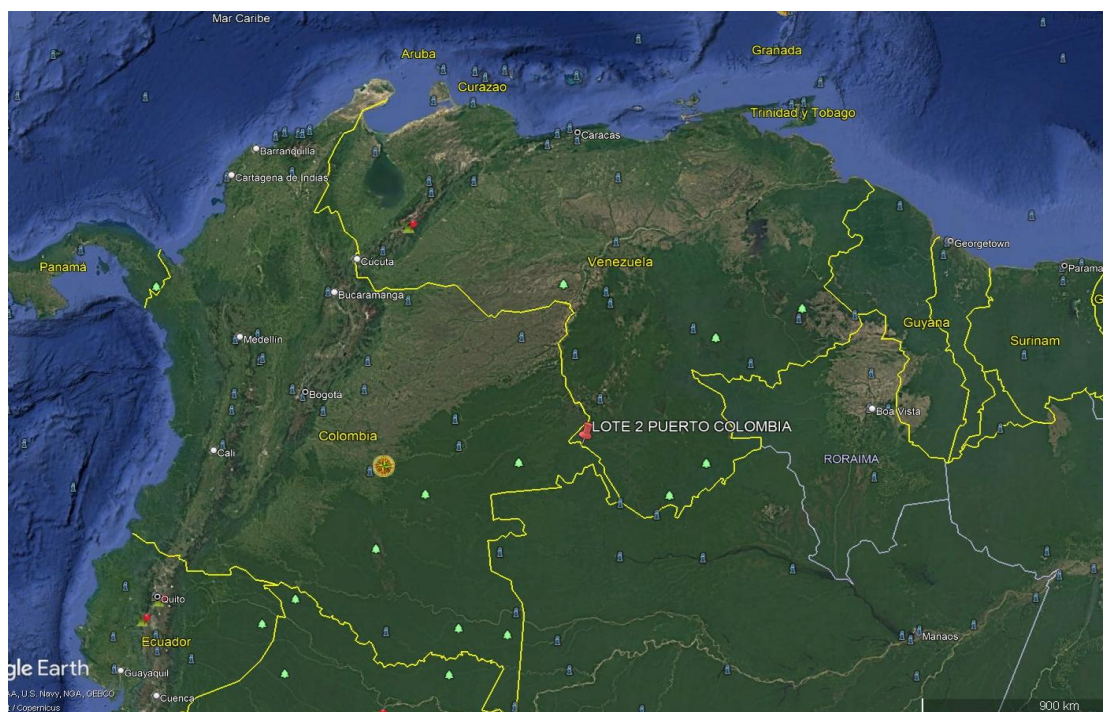

Fuente: Google earth

Figura 14 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.



Fuente: Google earth

HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CACAHUAL

Cacahual es una área no municipalizada de Colombia, situado en el departamento de Guainía, al este del país. Compuesto por los centros poblados: *Cacahual*, *Merey* y *San Juan*. Limita al oeste y norte con la capital departamental, Inírida, al sur con Puerto Colombia, y al este con Venezuela. Se encuentra a una distancia de 68 km de Inírida.

Las vías de comunicación son principalmente fluviales y aéreas. Dista de Inírida la capital departamental 186 km por vía fluvial.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Cacahual:

Figura 15 Localización del Hito 3 Cacahual.



Fuente: Google earth

Figura 16 Localización del Hito 3 Cacahual.



Fuente: Google earth

2.1.3 Lote 3 Consorcio Vía Fluvial.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA.

Mapiripana es un municipio colombiano situado en el departamento del GUAINIA a orillas del río Guaviare. Dista 116 km de San José del Guaviare al norte, 324 km de Villavicencio y 417 km de Bogotá al sur respectivamente.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Mapiripana:

Figura 17 Localización del Hito 1 Mapiripana.



Fuente: Google earth

Figura 18 Localización del Hito 1 Mapiripana.



Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL.

Es denominado también Garza Morichal y se halla ubicado a los 02° 14' 34" de latitud Norte y 70° 01'04" de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está

ubicada en el río Inírida, a una altura de 163 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido promedio de 27° y una precipitación media anual de 3.000 mm.

En la siguiente figura se presenta la localización general de Morichal:

Figura 19 Localización del Hito 2 Morichal.



Fuente: Google earth

HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PAPANAHUA.

se encuentra localizada en el corregimiento del Papanaua, en el área no municipalizada del departamento de Vaupés, colindante con el Rio Papanaua. Limita por el norte con los departamentos de Guaviare (municipio El Retorno) y Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el oriente, con el departamento de Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el sur con los municipios de Mitú y Carurú y por el occidente con el municipio de Carurú y el de Guaviare (municipio Miraflores).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Papanahua:

Figura 20 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

Figura 21 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

2.1.4 Lote 4 Torres y Asociados SAS.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA

El municipio de Unguía se encuentra localizado en el Urabá chocoano, en la parte noroccidental de Colombia. Tiene una extensión total de 1.190 km². La principal cuenca hidrográfica es la del Golfo de Urabá, que pertenece al río Atrato, al cual confluyen los ríos Arquía, Unguía, Tigre y Tanela. Sobre el mar Caribe se destacan la playa Tarena y la bahía de Titumate. También hay ciénagas como la de Unguía, Marriaga y Hornos.

El municipio de Unguía limita al norte con Acandí y el Golfo de Urabá, al oriente con el Río Atrato, que lo separa de Turbo (Antioquia), al sur con Riosucio, y al occidente con la Comarca Emberá-Wounaan y la Provincia de Darién, (ambas en Panamá).


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Unguía:

Figura 22 Localización del Hito 1 Unguía



Fuente: Google earth

Figura 23 Localización del Hito 1 Unguía

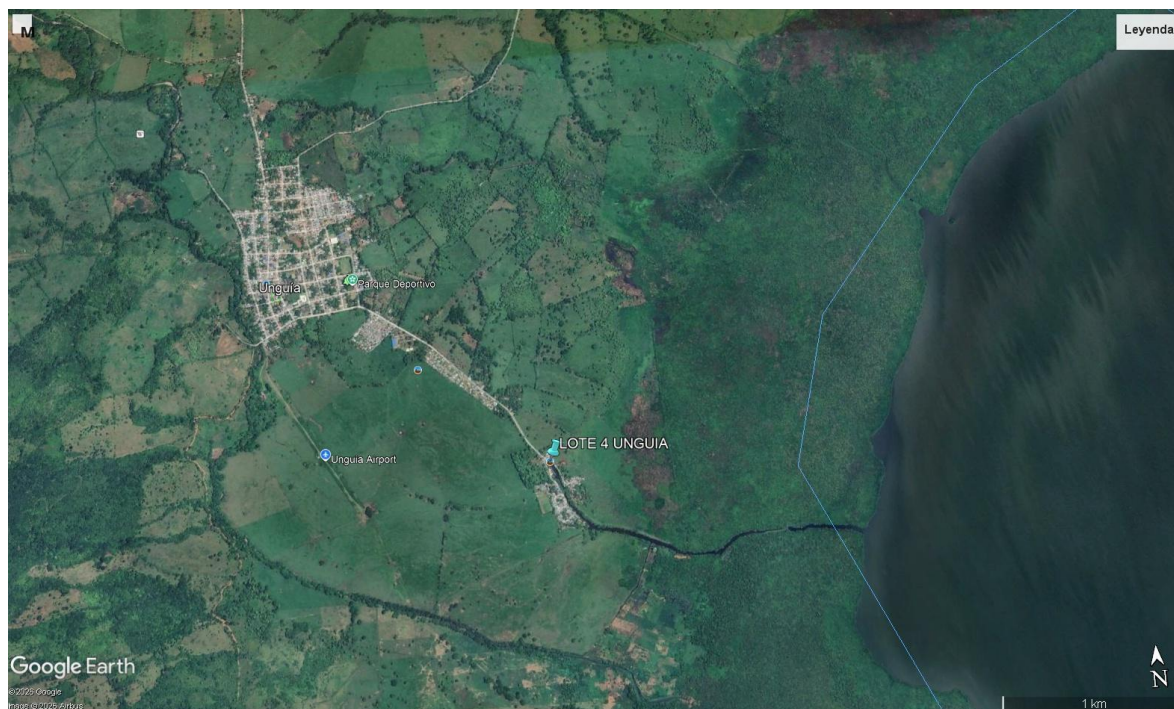

Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ.

Bajo Baudó es un municipio costero ubicado al sur del departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Su cabecera municipal es **Pizarro**. Se caracteriza por su ubicación entre la serranía del Baudó y el océano Pacífico.


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Pavasá:

Figura 24 Localización del Hito 2 Pavasá



Fuente: Google earth

Figura 25 Localización del Hito 2 Pavasá

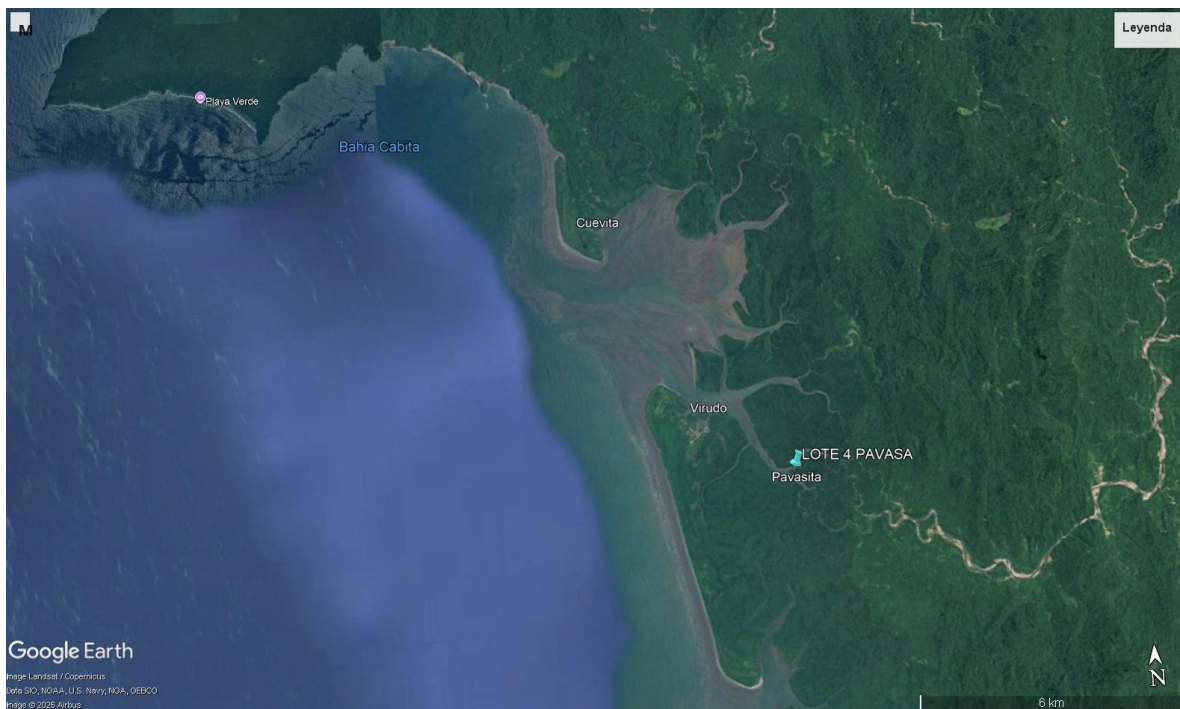

Fuente: Google earth

2.1.5 Lote 5 Consorcio MNF.

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA.

El municipio de Solita está ubicado en el suroccidente del departamento del Caquetá, a una distancia de 110 km de Florencia, capital del Departamento. Se encuentra sobre la margen izquierda del río Caquetá, en límites con el departamento del Putumayo. Su temperatura promedio es de 26 °C. y cuenta aproximadamente con 6,480 habitantes, distribuidos en un 61% en el área rural y un 39% en la zona urbana; y su economía principalmente está basada en la minería de oro, agricultura (arroz, plátano, yuca, maíz), ganadería (levante y leche) y pesca.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solita:

Figura 26 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

Figura 27 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE SOLANO

La cabecera municipal se localiza aproximadamente a 150 km al sureste de Florencia, desde donde se llega por vía terrestre Florencia – La Montañita – San Antonio de Getucha, y desde allí por vía fluvial por el río Ortegua; o vía terrestre Florencia – Valparaíso – Solita, y fluvial por el río Caquetá desde Solita hasta Solano.

El municipio de Solano limita con los siguientes territorios: Al norte con: Solita, Valparaíso, Milán, Montañita, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, los municipios de Calamar y Miraflores del Guaviare. Al este: Con el corregimiento departamental de Pacoa del Vaupés y los Corregimientos departamentales de Mirití, Paraná y la Victoria del Amazonas. Al sur: Con los corregimientos departamentales de Santander y la Chorrera, del Amazonas. Al oeste: Con los municipios de Puerto Leguizamó y Puerto Guzmán, del Putumayo. (Plan De Desarrollo 2020 – 2023. Por un Solano, Más Humano, Productivo y Sostenible y en Paz).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solano:

Figura 28 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

Figura 29 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

2.1.6 Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

El Municipio de la Tola, en el Departamento de Nariño, está ubicado a 460 km al noroccidente de Pasto. El suelo entre ondulado y plano, corresponde a la llanura del Pacífico. Tiene una población de 7.321 habitantes; una Latitud Norte 2° 24' 39", y una Longitud Oeste 78° 14' 34"; y una altitud 20 m.s.n.m; tiene una superficie de 459 kms2, con una temperatura promedio de 28°C. Limita al Norte con el Océano Pacífico; Por el Sur con el municipio de Roberto Payán; por el Oriente con el municipio de El Charco; y por el Occidente con el Municipio de Olaya Herrera


En las siguientes figuras se presenta la localización general del municipio de La Tola:

Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño



Fuente: Google earth

Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño

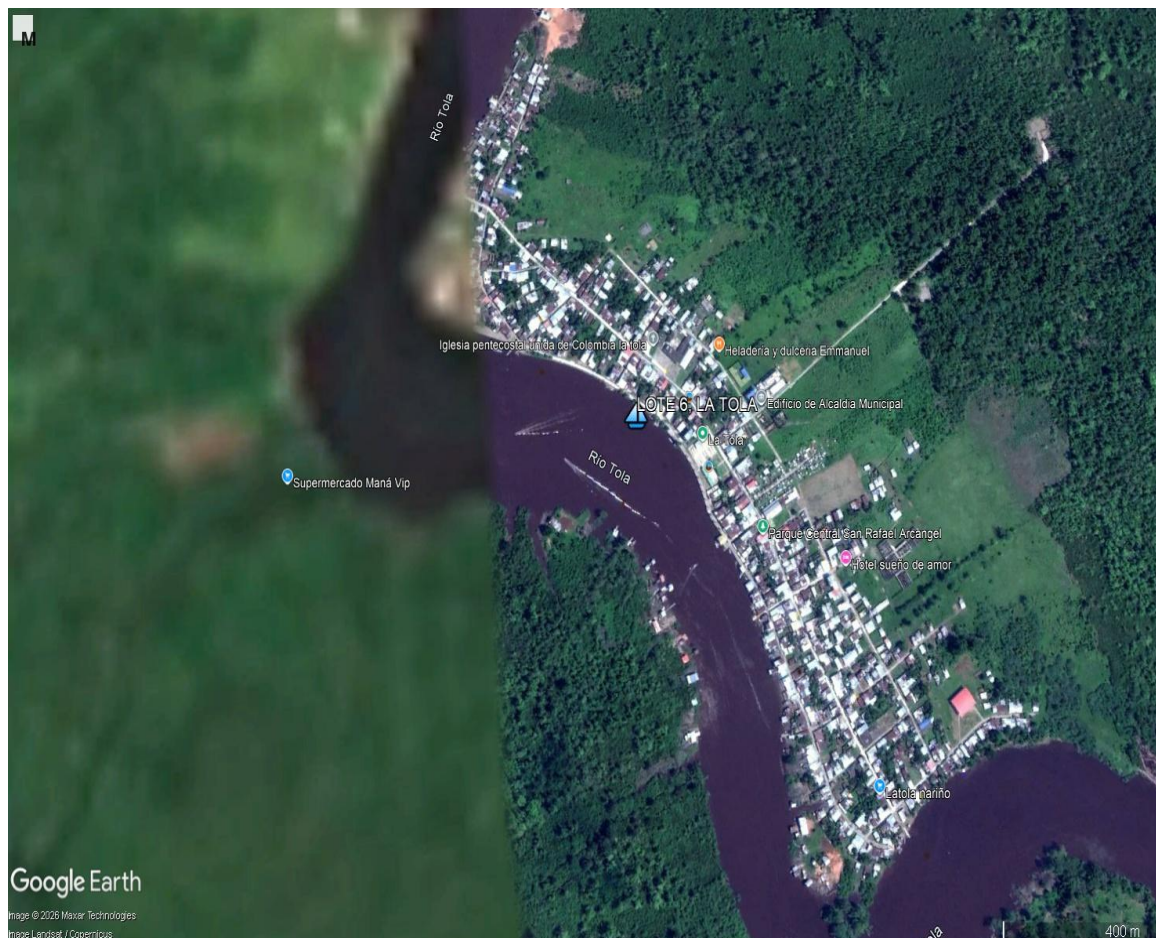

Fuente: Google earth

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Las zonas de influencia del proyecto **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6** se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
1	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN	Río Vaupés	Mitú	Vaupés
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA	Río Apaporis	Taraira	Vaupés
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA	Río Cananarí	Pacoa	Vaupés
		HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ	Río Miriti - Paraná	Miriti - Paraná	Amazonas
		HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA	Río Apaporis	La Victoria	Amazonas
2	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE	Río Negro	La Guadalupe	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA	Río Negro	Puerto Colombia	Guainía
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CACAHUAL	Río Atabapo	Cacahual	Guainía

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
3	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA	Río Guaviare	Mapiripana	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL	Río Inirida	Morichal	Guainía
4	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA	Quebrada Ipeti - Río Unguia	Unguía	Chocó
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ	Río Baudó	Bajo Baudó	Chocó
5	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA	Río Caquetá	Solita	Caquetá
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE SOLANO	Río Caquetá	Solano	Caquetá

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
6	Estudios y Diseños para las obras de protección del casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DENAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	Río Tola	La Tola	Nariño

Con la ejecución del proyecto, se presentan los siguientes beneficios:

- Generación de empleos directos e indirectos.
- El proyecto permitirá mejorar la conectividad de territorios en los que el transporte fluvial constituye el único medio de acceso, integrándolos con las principales vías de conexión regional y nacional. Esta intervención generará beneficios socioeconómicos al aumentar la accesibilidad y la movilidad de la población, facilitar el acceso oportuno a bienes, servicios básicos y mercados, reducir costos y tiempos de transporte, y dinamizar las economías locales. Asimismo, contribuirá a disminuir las brechas territoriales de productividad, competitividad y equidad, fortaleciendo la articulación entre las zonas rurales y los centros urbanos, en concordancia con los objetivos de desarrollo regional y cierre de brechas.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No Aplica.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

2.4. Características técnicas del proyecto.

Los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 deberán ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase II para la construcción de un terminal o muelle fluvial de pasajeros y/o carga. Estas actividades comprenden la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, geotécnica, operativa y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización del muelle y la determinación de la embarcación tipo de diseño.

Los estudios y diseños deberán incluir la definición de las áreas funcionales y de servicio, el diseño de accesos y facilidades para la accesibilidad universal, el diseño del acceso acuático y las condiciones de atraque para las embarcaciones, considerando escenarios de expansión futura. Así mismo, se deberán desarrollar los estudios y diseños de las obras civiles, la evaluación e incorporación del equipamiento requerido para la manipulación de carga conforme a la capacidad de la embarcación tipo definida, el diseño de los sistemas hidrosanitarios, redes secas, señalización, y las obras de dragado necesarias para garantizar la operatividad del muelle.

Adicionalmente, los consultores deberán evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad para la atención de emergencias en el muelle, incluyendo, entre otros, extintores, botiquines y camillas, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.

Los consultores deberán ejecutar todas las actividades adicionales requeridas por las Entidades involucradas, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase II, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables.

Las principales actividades a desarrollar por los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, y a Supervisar y hacer seguimiento por la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO
- VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO
- VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- VOLUMEN IX. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE
- VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
- VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL
- VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
- VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO
- VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO

El consultor del Lote 6 deberá ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III para la construcción de obras de protección de márgenes fluviales. Estas actividades comprenderán, entre otros aspectos, la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, hidrológica, geotécnica y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización de las obras de protección de orilla, la determinación de la embarcación tipo de diseño y la evaluación de las condiciones de navegabilidad.

Así mismo, los estudios y diseños deberán incluir el diseño de las obras civiles asociadas, las obras de dragado, la señalización fluvial y todas aquellas intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de las márgenes y la seguridad de la navegación.

Adicionalmente, el consultor deberá evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad náutica requerido para atender los requerimientos de navegabilidad, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.

El consultor seleccionado deberá adelantar todas las actividades adicionales que sean requeridas por las Entidades involucradas en el proyecto, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase III, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables, los cuales

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

se presentarán en los volúmenes establecidos contractualmente y que son los siguientes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO.
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA.
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DEFINITIVA
- VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
- VOLUMEN VIII. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN IX. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.
- VOLUMEN X. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN XI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO

Todas las Actividades realmente ejecutadas por las Consultorías del estudio deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad de los Consultores del estudio y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la Interventoría.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

3.1 Información General de los Contratos de Consultoría

En la tabla No 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se presenta la información básica de los Contratos de Consultoría para el proyecto **Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS**.

3.1.1 Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1914 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Inprobrain Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$2.932.226.232,00
Anticipo	\$ 1.232.027.829,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	6 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 688.841.088,00
% Ejecutado	20.8%

Fuente: Propia

3.1.2 Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1915 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.934.142.682,00
Anticipo	\$ 812.664.992,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4.5 meses

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Fecha actualizada de terminación	15 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 466.469.705,70
% Ejecutado	28.7%

Fuente: Propia

3.1.3 Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1892 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Vía Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.860.124.682,00
Anticipo	\$ 781.564.992,50
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Prórroga No 1	5 meses
Fecha actualizada de terminación	31 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 389.219.366,27
% Ejecutado	24.9%

Fuente: Propia

3.1.4 Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1882 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	19 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Torres y Asociados SAS
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.362.265.442,00
Anticipo	\$ 572.380.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Fecha de Inicio	19 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 188.885.544,54
% Ejecutado	16.5%

Fuente: Propia

3.1.5 Lote 5. Consorcio MNF.

Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1957 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio MNF
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 1.277.180.442,00
Anticipo	\$ 536630.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 432.524.133,03
% Ejecutado	40.3%

Fuente: Propia

3.1.6 Lote 6 Consorcio Navegabilidad Projesy.

Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1968 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para las obras de protección de casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad Projesy
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	\$934.498.770,00
Anticipo	\$392.646.542,00

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 109.941.031,76
% Ejecutado	14.7%

Fuente: Propia

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes

En el período comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2026, los contratistas de consultoría ejecutaron:

3.2.1 Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Avance General y Seguimiento

Durante el mes de marzo, el proyecto mantuvo un avance físico del 18.32%, cifra que coincide con el porcentaje programado, lo que indica un cumplimiento del 100% del cronograma a la fecha. Para garantizar este avance, se llevaron a cabo cuatro comités de seguimiento los días 2, 9, 16 y 30 de marzo, en los cuales se abordaron temas como la socialización con entes gubernamentales y la alineación de criterios técnicos.

Gestión Contractual y Administrativa

Se realizaron diversos trámites para el ajuste y continuidad del contrato:

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

- Modificaciones: Se remitió el Acta de Modificación No. 2 (3 y 9 de marzo) para la redistribución de recursos según las necesidades de ejecución.
- Cambio de Personal: El 9 de marzo se solicitó formalmente el cambio de director de consultoría, proponiendo un nuevo candidato para reemplazar al Ing. Samuel Homez.
- Suspensión: El 27 de marzo se presentó una solicitud de suspensión del contrato, fundamentada en retrasos en el desembolso del anticipo, el estado de las actas de costos y la situación de orden público
- Cronograma: Se enviaron actualizaciones del cronograma de trabajo los días 4 y 9 de marzo, ajustadas a los compromisos de los comités de seguimiento

Informes Técnicos y de Campo

La consultoría entregó productos clave relacionados con el diagnóstico y la metodología:

- Hito I: El 29 de marzo se entregó el informe de diagnóstico del Hito I (Volumen I), que incluye la identificación de necesidades y análisis de antecedentes para los muelles de Pucaron y Taraira.
- Visitas de Campo: El 10 de marzo se remitieron los informes de las visitas realizadas en febrero a los muelles de Pucaron, Taraira, Mirití - Paraná, Pacoa y La Victoria.
- Posteriormente, el 12 de marzo se envió la subsanación de dichos informes.
- Geotecnia y Topografía: Se actualizó la metodología de geotecnia para Pucaron y Taraira (3 de marzo) y se solicitaron ajustes al plan de exploración el 13 de marzo.
- Asimismo, se entregaron cotizaciones actualizadas de topografía (11 de marzo) y geotecnia (19 de marzo).

Gestión Ambiental, Social y Arqueológica

Se gestionaron requerimientos ante diversas autoridades para avanzar en los permisos necesarios:

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- Consulta Previa: Entre el 5 y 13 de marzo, se enviaron respuestas formales y complementarias al Grupo de Análisis de Procedencia de Consulta Previa para los muelles de La Victoria, Mirití-Paraná, Taraira y Pucarón.
- ICANH (Arqueología): El 5 de marzo se remitió información para el concepto de áreas arqueológicas protegidas, y el 27 de marzo se enviaron los archivos geográficos (polígonos en formato Shape/KML) de las áreas de intervención
- Sostenibilidad (CDA): El 26 de marzo se solicitaron a la CDA los lineamientos para el uso de madera en infraestructura fluvial bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
- Impactos: El 10 de marzo se entregó el informe de área de influencia, línea base e impactos ambientales y sociales

Gestión Financiera y Reportes Periódicos

- Actas de Costos: Se entregó el Acta de Costos No. 3 (periodo de febrero) el 5 de marzo, la cual fue subsanada y remitida nuevamente el 30 de marzo. También se entregaron subsanaciones de las actas No. 1 y No. 2 a principios de mes.
- Anticipo: Se envió una solicitud urgente al INVIAS el 13 de marzo para conocer el estado del desembolso del anticipo.
- Informes Semanales: Se cumplió con la entrega de los informes semanales No. 11, No. 13, No. 14 y No. 15, cubriendo las actividades desde finales de febrero hasta el 26 de marzo

3.2.2 Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Administrativa y Contractual

Durante el mes, se mantuvo el cumplimiento de los compromisos contractuales y la coordinación con la interventoría e INVIAS:

- Informes Semanales: Se radicaron los informes No. 12, 13, 14 y 15, cubriendo el periodo del 27 de febrero al 26 de marzo.
- Gestión Financiera: Se trabajó en la presentación, ajuste y radicación de las Actas de Costos No. 1, 2 y 3, así como en la solicitud de desembolso del anticipo.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- Reuniones Técnicas: Se adelantaron mesas de trabajo con INVIAS y la Interventoría para definir la metodología del estudio geotécnico y atender requerimientos sobre el equipo profesional.

Componente Social (Socializaciones Iniciales)

Se llevó a cabo una importante fase de acercamiento comunitario entre el 3 y el 5 de marzo en los sectores objeto de estudio:

- Cacahual (3 de marzo): Socialización de los alcances del proyecto (mejoramiento de navegabilidad y muelles) mediante cartografía social y entrevistas.
- La Guadalupe (4 de marzo): Presentación de la Fase 2 (estudios y diseños) a la comunidad Curripaco. Se identificaron retos logísticos por los bajos niveles del río Negro.
- Puerto Colombia (5 de marzo): Jornada de articulación donde se expusieron los objetivos de conectividad fluvial. Se registró la presencia de minería no autorizada como factor de contexto territorial.

Componente Geológico y Geotécnico

Tras definir la metodología, se inició la comisión de campo del 17 de marzo al 2 de abril, logrando los siguientes hitos técnicos:

- La Guadalupe: Ejecución de 10 sondeos, 5 apiques y 300 metros lineales de exploración sísmica indirecta.
- Puerto Colombia: Realización de 9 sondeos, 5 apiques y extracción de 7 núcleos de entre 15 y 20 cm.
- Cacahual: Ejecución de 9 sondeos, 5 apiques y 5 núcleos. Se reportó un desgaste de brocas superior al esperado, lo cual fue gestionado para dar continuidad a la actividad.

Estado de Avance y Entregables

Al cierre del mes, el proyecto presenta el siguiente estado de los productos técnicos:

- Aprobaciones: El Volumen I (Identificación de necesidades y diagnóstico) y las metodologías de los demás volúmenes ya cuentan con aprobación.
- Nuevas Presentaciones: Se entregó el Volumen VI (Estudio de transporte) y el informe de aforos sólidos.
- Trabajos de Campo: Se ha completado la totalidad de las labores de topografía, batimetría, aforos líquidos/sólidos y exploración geotécnica (directa e indirecta).

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- En Proceso: Continúan los ajustes a los Volúmenes II (Topografía) y IV (Geotecnia) tras las observaciones de la Interventoría

3.2.3 Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Social, Ambiental y Sostenibilidad

- Hito I (Mapiripana): Se llevó a cabo una reunión de socialización virtual el 24 de marzo, con la participación de representantes de la comunidad, la consultoría y la interventoría. Además, se avanzó en la identificación de actores sociales e institucionales y en la caracterización poblacional.
- Hito II (Morichal) e Hito III (Papunahua): Se recopiló la información socioeconómica para realizar la caracterización correspondiente. En el caso de Morichal, el documento inicial ya fue remitido para revisión de la interventoría, mientras que para Papunahua se encuentra en preparación.

Trabajos de Campo y Geotecnia

En los tres hitos (Mapiripana, Morichal y Papunahua), las actividades de campo presentaron el siguiente estado durante marzo:

- Perforaciones y estudio de suelos: Se reportan ejecutadas al 100%.
- Laboratorio: Las muestras recolectadas se encuentran actualmente en el laboratorio para el análisis de resultados y la elaboración de conclusiones.
- Pendientes: La realización de las líneas sísmicas en Morichal y Papunahua quedó programada para la segunda semana de abril de 2026 por razones logísticas.

Estudios Técnicos (Topografía, Geología y Geomorfología)

- Topografía y Cartografía (Volumen II): Se realizaron trabajos de amarre al sistema de coordenadas del IGAC y posicionamiento de puntos de control (GPS y Mojones) mediante captura de datos para postproceso (con rastreos de hasta 24 horas) en los tres puntos de intervención. En Mapiripana, se ejecutó el levantamiento topográfico en tiempo real diferencial (RTK).
- Geología y Geomorfología: Se finalizaron y entregaron los estudios y planos correspondientes a la interventoría en las siguientes fechas:

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- Mapiripana: 15 de marzo.
- Morichal: 24 de marzo.
- Papunahua: 30 de marzo.
- Matriz Multicriterio: Se realizó esta herramienta para la selección del muelle a diseñar y construir en Fase III para los tres hitos.

Estudio de Transporte y Embarcación Tipo (Volumen VI)

Durante marzo, este componente se centró en el análisis de gabinete, ya que no se realizaron nuevas jornadas de campo.

- Análisis de Información: Se procesó la información primaria levantada en enero y febrero, incluyendo topografía y registros fotográficos.
- Información Secundaria: Se recopilaron y validaron datos institucionales (Ministerio de Transporte), operativos (Inspección Fluvial de San José del Guaviare) y socioeconómicos (DANE).
- Avances Técnicos: Se avanzó en la caracterización del corredor fluvial del río Guaviare, la definición de las embarcaciones tipo (capacidad y configuración) y la evaluación de las condiciones operativas de los muelles.
- Informes: Se inició la elaboración de la versión preliminar (versión 0) de los informes de transporte para los tres muelles, con una fecha tentativa de entrega para la segunda semana de abril.

Gestión Administrativa y de Diagnóstico

La consultoría realizó labores de seguimiento contractual y revisión de los diagnósticos suministrados por el INVIAS. Se identificó que los diagnósticos previos para Papunahua y Morichal en temas de hidrología e hidráulica no aportaban información relevante, por lo que estos estudios deberán desarrollarse sin bases previas confiables.

Entrega de Volúmenes

A la fecha de cierre del presente informe se han entregado los siguientes volúmenes para revisión de interventoría.

Hito I (Mapiripana)

- Volumen I: Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso – 13/03/2026.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- Volumen II: Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico para el corregimiento de Mapiripana – 13/03/2026.
- Volumen III: Estudio de geología y geomorfología en Mapiripana – 17/03/2026.
- Volumen V: Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial en Mapiripana – 20/03/2026.

Hito II (Morichal)

- Volumen I: Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso – 13/03/2026.
- Volumen II: Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico para el área no municipalizada de Morichal – 13/03/2026.
- Volumen III: Estudio de geología y geomorfología en Morichal – 26/03/2026.

Hito III (Papunahua)

- Volumen I: Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso – 13/03/2026.
- Volumen II: Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico para el área no municipalizada de Papunahua – 13/03/2026.
- Volumen III: Estudio de geología y geomorfología en Papunahua – 30/03/2026

3.2.4 Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Durante el período, el Consultor ejecutó las siguientes actividades

Componente Topográfico y Batimétrico

Se realizaron levantamientos en los sectores de Unguía y Pavasá, que incluyeron:

- Reconocimiento del área de intervención y verificación de puntos de control.
- Captura de datos técnicos (distancias, niveles y profundidades) utilizando equipos especializados.
- Registro y organización sistemática de la información para su posterior procesamiento.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Componente Geotécnico (Estudio de Suelos)

- Sector Unguía: Se ejecutó y finalizó satisfactoriamente el programa de exploración mediante perforaciones, sondeos y apiques. Esto permitió identificar estratos del terreno, niveles freáticos y obtener muestras representativas del subsuelo.
- Sector Pavasá: Se inició la exploración en este sector tras realizar la adecuación del frente de trabajo y la movilización de equipos. Al cierre del mes, las perforaciones y la toma de muestras continuaban en ejecución con un avance significativo.

Gestión Ambiental y Social

- Se avanzó en la caracterización social preliminar de los puntos de intervención.
- Se estableció una base informativa para el componente de Gestión Ambiental, Social y Sostenibilidad, asegurando la articulación con las comunidades locales y actores del territorio.

Condiciones y Desafíos Operativos

El desarrollo de las actividades enfrentó algunos obstáculos que fueron superados:

- Retrasos en la movilización: Hubo dificultades para trasladar maquinaria desde Quibdó debido a problemas de orden público en la región.
- Factores climáticos: Se presentaron afectaciones puntuales por el clima, aunque se logró mantener el ritmo de trabajo programado.

3.2.5 Lote 5. Consorcio MNF.

Durante el período, el Consultor ejecutó las siguientes actividades

Trabajos de Campo y Componentes Técnicos

En marzo se culminaron los trabajos de campo contemplados en el alcance contractual:

- Geotecnia: Se ejecutaron y finalizaron las perforaciones exploratorias en suelo (tierra y agua). En el municipio de Solano, se realizó una perforación en agua el 7 de marzo, se iniciaron las de tierra el 9 de marzo y se culminó la campaña geotécnica total el 27 de marzo.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- Topografía y Batimetría: Se finalizaron los levantamientos batimétricos para caracterizar el cauce y se completó el levantamiento aerotransportado con dron LiDAR, obteniendo modelos digitales del terreno de alta resolución.
- Ambiental: Se realizaron monitoreos de calidad del agua y parámetros físicos para establecer la línea base ambiental. Estas actividades se completaron el 2 de marzo en Solita y el 3 de marzo en Solano.

Actividades Administrativas y Entregas

El contratista realizó la remisión de diversos informes técnicos (Volúmenes) y documentos de gestión:

- Entrega de Volúmenes: Se remitieron los estudios de Geología y Morfología (Vol. III) el 4 de marzo; Cartografía, Topografía y Batimetría (Vol. II) el 11 de marzo; Transporte y Caracterización de Embarcación (Vol. VI) el 19 de marzo; Diseño Arquitectónico y Urbanístico (Vol. IX) el 27 de marzo; e Hidrología e Hidráulica (Vol. V) el 31 de marzo.
- Informes y Solicitudes: Se enviaron informes semanales (Nos. 11, 12, 13 y 14), el Informe Mensual No. 2, y se tramitaron solicitudes de desembolso de anticipo (12 y 27 de marzo) y una prórroga (25 de marzo).

Gestión Social y Reuniones

- Socialización: Se desarrollaron jornadas de socialización con comunidades locales y actores institucionales mediante ejercicios de cartografía social. Además, en marzo se remitieron los informes correspondientes a las socializaciones realizadas en el municipio de Solita y Solano.
- Seguimiento: El consultor participó en tres comités de seguimiento técnico virtuales con INVIAS y la Interventoría, los días 3, 10 y 31 de marzo.

Control y Seguimiento

Se implementaron actividades de control técnico para asegurar la trazabilidad y calidad de la información recolectada en campo, la cual servirá como insumo para las fases posteriores de diseño.

3.2.6 Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Durante el período, el Consultor ejecutó las siguientes actividades

Actividades Administrativas y de Gestión

Durante el mes, se cumplieron diversos hitos para asegurar el seguimiento del contrato y el cumplimiento de requisitos ante la interventoría e INVIAS:

- Informes y Documentación: Se entregaron los informes semanales No. 12, 13, 14 y 15. Asimismo, se presentó la propuesta de socialización del proyecto y el acta de costos No. 3, atendiendo además las observaciones de las actas No. 1 y No. 2.
- Soportes Técnicos: Se hizo entrega del certificado de calibración de los equipos de trabajo y se remitieron las cotizaciones para las labores de topobatimetría.
- Trámites Contractuales: Se formalizó el desistimiento del anticipo contractual y se realizó el cambio del ingeniero residente del proyecto, previa aprobación de la interventoría.
- Coordinación Institucional: Se adelantaron gestiones relacionadas con el alcance de la construcción del nuevo terminal fluvial en La Tola para evitar traslapes en los diseños de ambos proyectos.

Visita Técnica de Campo (24 al 26 de marzo)

Se realizó una comisión conjunta con personal de INVIAS, la Interventoría y la Alcaldía Municipal para verificar los puntos de intervención. Los hallazgos principales fueron:

- Estructural: Se detectaron fallas en tensores de arriostramiento, fisuras horizontales por presión hidrostática en el muro de concreto y daños en los dados de transferencia que requieren estudio patológico y refuerzo.
- Geotecnia: Se identificó la necesidad de realizar levantamientos topográficos detallados, perforaciones de al menos 30 metros de profundidad (métodos SPT/CPTU) y líneas sísmicas (MASW, ReMi, HVSr) debido a la amenaza sísmica alta y susceptibilidad a licuación.
- Hidráulica: Se constató un retroceso de la orilla de aproximadamente 30 metros en zonas sin protección marginal y fallas estructurales por erosión en la cimentación y el relleno del muro existente.

Entregables y Estado de Avance

- Ajuste de Metodologías: Se radicaron y ajustaron las metodologías de los Volúmenes IV (Geotecnia) y II (Cartografía, Topografía y Batimetría) según lo observado en la visita de campo.
- Documentación Técnica: Se entregó el Volumen I actualizado y la metodología de geotecnia y topografía ajustada.
- Cumplimiento de Hito: La radicación de estas metodologías habilita formalmente el inicio de las actividades técnicas de estudios y diseños.

Acciones Inmediatas y Próximos Pasos

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

- Se propuso una mesa de trabajo virtual para el 27 de marzo con el fin de concertar con la interventoría los puntos finales a intervenir.
- A solicitud de INVIAS, la Consultoría debe presentar un Plan de Contingencia debido al tiempo restante de ejecución y priorizar la ubicación de las obras del programa "Todos Somos Pazcífico"

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

No aplica

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A continuación, se presenta el informe detallado del estado de avance y las acciones de la interventoría para los seis lotes

LOTE 1: INPROBAIN FLUVIAL

Estado de Avance: Se trabaja en los estudios para los muelles de Taraira, Pacoa, Mirití-Paraná, Victoria y Pucaron. A finales de marzo, las actas de costos No.1 y No.2 fueron enviadas a INVIAS. Sin embargo, los trabajos de campo de topografía se reportan como "sin iniciar" al 26 de marzo.

Acciones de la Interventoría:

- El Acta de Modificación ha sido devuelta repetidamente por falta de sustento técnico y jurídico, así como de soportes.
- El cronograma general fue devuelto por errores y falta de detalles sobre trabajos de campo.
- El Acta de Costos #3 fue devuelta en múltiples ocasiones (10, 11 y 26 de marzo) por observaciones no subsanadas.

LOTE 2: CONSORCIO NAVEGABILIDAD

Estado de Avance: Incluye los muelles de Cacahual, Guadalupe y Puerto Colombia. Se realizaron las socializaciones iniciales entre el 3 y 5 de marzo con participación de la interventoría. Para el 26 de marzo, las actas de costos No.1 y No.2 se encuentran en revisión por parte de INVIAS.

Acciones de la Interventoría:

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- La interventoría devolvió el Acta de Costos No.2 a inicios de mes por falta de soportes (tiquetes).
- El Acta de Costos No.3 fue devuelta con observaciones el 11 de marzo y persiste en ese estado al 26 de marzo.
- Se está a la espera de ajustes en el Estudio de Transporte y Pasajeros (Volumen VI) según las observaciones realizadas.

LOTE 3: CONSORCIO VIA FLUVIAL

Estado de Avance: Proyectos en Mapiripana, Morichal y Papunahua. Se completó la socialización virtual en Mapiripana el 24 de marzo y los estudios geoeléctricos en esa zona el 19 de marzo.

Acciones de la Interventoría:

- Las actas de costos No.1 y No.2 han tenido un proceso de revisión cíclico; fueron devueltas el 10 de marzo y para el 26 de marzo se encontraban nuevamente en revisión por la interventoría.
- Se reporta como acción pendiente realizar los estudios geoeléctricos en Morichal y Papunahua, programados para el 8 de abril.

LOTE 4: TORRES Y ASOCIADOS

Estado de Avance: Centrado en los muelles de Unguía y Pavasa. El 9 de marzo iniciaron los trabajos de geotecnia en Unguía y el 25 de marzo en Pavasá. Los trabajos de topografía y batimetría en Pavasa se estimaron para iniciar el 14 de marzo.

Acciones de la Interventoría:

- Incumplimiento en Reportes: La interventoría señala que no se han recibido informes semanales (No. 13, 14 y 15) desde el 6 de marzo, a pesar de reiteradas solicitudes.
- La documentación para el trámite de anticipo y los documentos de socialización fueron devueltos con observaciones desde el 5 de marzo y, al 26 de marzo, el consultor aún no entregaba los ajustes.
- El informe mensual No. 1 fue devuelto por observaciones el 26 de marzo.

LOTE 5: CONSORCIO MNF

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Estado de Avance: Estudios para los muelles de Solita y Solano. Las actas de costos No.1 y No.2 fueron aprobadas por la interventoría el 5 de marzo.

Acciones de la Interventoría:

- Revisión de Volúmenes: El Volumen I (identificación de necesidades) fue devuelto con observaciones el 16 de marzo; se recibió una versión ajustada el 27 de marzo que está bajo revisión.
- Los Volúmenes II y III (topografía y geología) fueron devueltos con observaciones y permanecen en revisión.
- Las Actas de Costo de mediados de mes siguen esperando ajustes por parte del consultor.

LOTE 6: CONSORCIO NAVEGABILIDAD

Estado de Avance: Enfocado en las obras de protección de La Tola. Los documentos para la socialización del muelle fueron revisados y avalados por la Interventoría para su presentación.

Acciones de la Interventoría:

- La Interventoría aprobó el Acta de Costos No. 3 el 12 de marzo.
- Las presentaciones de los informes semanales No. 12 y 13 (reportados con un "No" en cumplimiento).
- Persiste la necesidad de ajustar el cronograma general, el cual fue rechazado el 5 de marzo de 2026 y solicitado nuevamente al Consultor.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. Informes Semanales

A continuación, se relacionan los informes semanales recibidos de los consultores, correspondientes al período comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026:

Los informes por Lotes se adjuntan en Anexo.

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Tabla 8 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 1.

No. SEMANA	PERIODO		
12	27	Febrero / Marzo	5
13	6	Marzo / Marzo	12
14	13	Marzo / Marzo	19
15	20	Marzo / Marzo	26
16	27	Marzo / Abril	2

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Tabla 9 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 2.

No. SEMANA	PERIODO		
12	27	Febrero / Marzo	5
13	6	Marzo / Marzo	12
14	13	Marzo / Marzo	19
15	20	Marzo / Marzo	26
16	27	Marzo / Abril	2

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Tabla 10 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 3.

No. SEMANA	PERIODO		
12	27	Febrero / Marzo	5
13	6	Marzo / Marzo	12
14	13	Marzo / Marzo	19
15	20	Marzo / Marzo	26
16	27	Marzo / Abril	2

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Tabla 11 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 4.

No. SEMANA	PERIODO		
11	27	Febrero / Marzo	5
12	5	Marzo / Marzo	12
13	13	Marzo / Marzo	19
14	20	Marzo / Marzo	26
15	27	Marzo / Abril	2

Lote 5. Consorcio MNF.

Tabla 12 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 5.

No. SEMANA	PERIODO		
11	26	Febrero / Marzo	4
12	5	Marzo / Marzo	11
13	12	Marzo / Marzo	18
14	19	Marzo / Marzo	25
15	26	Marzo / Abril	1

Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Tabla 13 listado informes semanales, periodo marzo. Lote 6.

No. SEMANA	PERIODO		
12	26	Febrero / Marzo	4
13	6	Marzo / Marzo	12
14	13	Marzo / Marzo	19
15	20	Marzo / Marzo	26
16	27	Marzo / Abril	2

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría.
LOTE 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4																																																																																																																																																																																																																																																					
			VERSIÓN 1																																																																																																																																																																																																																																																					
			PÁGINA 1																																																																																																																																																																																																																																																					
FECHA: 05/04/2025 (JSA / BSA / RSE)																																																																																																																																																																																																																																																								
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cagaita																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																								
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: mar-25 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 5.																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO No. 1967 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO MNF																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 INTERVENTORÍA: CONCEP S.A.S.																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPO</th> <th colspan="31">DÍAS DEL MES</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA / MODELO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>LOCALIZACIÓN</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipo de perforación de rotación</td> <td>Copco</td> <td>N/A</td> <td>SOLITA Y SOLANO</td> <td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td></td><td></td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td></td><td></td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL ACTIVO</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL EN REPARACIÓN</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL INACTIVO</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Equipo de perforación de rotación	Copco	N/A	SOLITA Y SOLANO	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A					TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1					TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1					TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0					TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																																																																																																																																																																																																																																				
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																						
Equipo de perforación de rotación	Copco	N/A	SOLITA Y SOLANO	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESUMEN PERIODO / MES</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>%</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td>1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A</td> <td>1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>				RESUMEN PERIODO / MES			No.	%		TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100%	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100%	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%																																																																																																																																																																																																																																			
RESUMEN PERIODO / MES																																																																																																																																																																																																																																																								
No.	%																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100%																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100%																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																						
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I																																																																																																																																																																																																																																																								
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): N/A																																																																																																																																																																																																																																																								
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																																																																																																																																																																																																																																								
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																																																																																																																																																																																																																																								
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la Interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td> Firma Nombre: CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ Residente de Consultoría Matrícula Profesional No.: 06202091676 ATL </td> <td> Firma Nombre: Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: </td> </tr> </table>				Firma Nombre: CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ Residente de Consultoría Matrícula Profesional No.: 06202091676 ATL	Firma Nombre: Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.:																																																																																																																																																																																																																																																			
Firma Nombre: CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ Residente de Consultoría Matrícula Profesional No.: 06202091676 ATL	Firma Nombre: Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.:																																																																																																																																																																																																																																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría, Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																																																																								

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría.

A continuación, se muestra el personal presentado por la Consultoría y aprobado por la Interventoría para ejecutar cada uno de los proyectos:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.”

Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 1

CONSULTORÍA LOTE 1 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL CONTRATO 1914 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA	X		9/3/2026	APROBADO II-871-L1-032-2025 (09-03-26)
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025 (02-12-25)
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 1	RICARDO ANDRÉS BLANCO CASTAÑEDA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
4	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 2	LEONARDO PACHECO NIÑO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
5	INGENIERO AUXILIAR 1	LINA DANIELA GUTIERREZ TIBADUIZA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
6	INGENIERO AUXILIAR 2	CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
7	INGENIERO AUXILIAR 3	ANDRES FELIPE PRIETO LÓPEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
8	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	RICARDO BOLIVAR TIBOCHA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
9	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	PAOLA ANDREA LLANES VEGA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
10	GEÓLOGO	VICTOR HUGO DÍAZ HERRERA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
11	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	WILLIAM ALFONSO CAÑAS PRATO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
12	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
13	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
14	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
15	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
16	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
17	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
18	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
19	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
20	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	DANIEL CAMILO SÁNCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
21	PROFESIONAL SOCIAL 1	GEORGINA ELIZABETH QUINTANA GONZALEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
22	PROFESIONAL SOCIAL 2	CLAUDIA PATRICIA GALINDO SUAREZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
23	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	MARIA DEL PILAR CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
24	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	DANIEL CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
25	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	NELSON JAVIER MORALES MELO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
26	PROFESIONAL SIG	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
27	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ BERNAL	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
28	PROFESIONAL NAVAL	EDWIN GIOVANNY PAIPA SANABRIA	X		30/12/2025	OFICIO CON APROBACION II-871-L1-009-2026
29	DIBUJANTE 1	WILLIAM NICOLAS PRIETO SANCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
30	DIBUJANTE 2	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
31	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		(02-12-25)	APROBADO II-871-L1-002-2025

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 2.**

Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 2.

CONSULTORÍA LOTE 2 CONSORCIO NAVEGABILIDAD - CONTRATO 1915 DE 2025					
PERSONAL CLAVE					
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO	
1	DIRECTOR CONSULTORIA	CARLOS ORAMAS	X		APROBADO OFICIO L2-051-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ALLEN BATEMAN	X		APROBADO OFICIO L2-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE					
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO	
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CAROLINA ISABEL GARZON BUITRAGO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
4	INGENIERO AUXILIAR 1	DIEGO ALEJANDRO GARCÍA ARIZALA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
5	INGENIERO AUXILIAR 2	LINA GARCES RAVELO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-025-2025 CAMBIO
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FRANCISCO DE PAULA PEREZ AMAYA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	URIEL GUERRERO FARFÁN	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
8	GEOLOGO	JOSE HEYLEY VERGARA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	DORIS XIOMARA CASTAÑEDA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALEXANDER GÓMEZ CASSAB	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	MARTHA ISABEL CONTRADO LÓPEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	YOHOLIMA MARTINEZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	YOLIMA MARTINEZ GUERRERO	x		OFICIO APROBACIÓN II-87-L2-008-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	ASTRID BLANCO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	WALTER GIL	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	OLGA TORRES CAMARGO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	PABLO GARCIA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	FELISA ARIZALA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	LUZ ESTELLA GUTIERREZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	NATALIA ARCILA CORTES	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIANA CATALINA BLANCO FIGUEROA	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-006-2026
24	PROFESIONAL SIG	JOHNATAN CRHISTIAN PAZ	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	PAOLA GALINDO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
26	PROFESIONAL NAVAL	CARLOS ORAMAS	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
27	DIBUJANTE 1	MICHAEL ANDRÉS TELLO ENCISO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
28	DIBUJANTE2	JENY VANESSA FANDIÑO SARMIENTO	X		OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 3.**

Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 3.

CONSULTORÍA LOTE 3 CONSORCIO VIA FLUVIAL CONTRATO 1892 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026
4	INGENIERO AUXILIAR 1	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
5	INGENIERO AUXILIAR 2	JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR SANCHEZ	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	DAVID RENGIFO SAAVEDRA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
8	GEOLOGO	VICTOR ERNESTO SEDIEL	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JUAN MANUEL CEPEDA SUAREZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS GERMAN BULLA CAICEDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	PRISCILA RAMOS OCAMPO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	ALEXANDRA BERNAL SANCHEZ	X		14/1/2026	OFICIO CON OBSERVACIONES II-871-L3-008-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	DANIELA BRICEÑO QUINTERO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALEXANDER BARON AVILA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	SANDRA MILENA ALVAREZ ABRIL	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	MELANY LISETH BUSTOS RUIZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CARLOS ARLEY PORTILLA OSORIO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
24	PROFESIONAL SIG	JAIR ROJAS LEAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
26	PROFESIONAL NAVAL	HECTOR ALFONSO ESCOBAR ACOSTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
27	DIBUJANTE 1	JORGE ANDRÉS FAJARDO ROJAS	X		14/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-008-2026
28	DIBUJANTE2	VALENTINA SILVA RAMOS	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 4.**

Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 4.

CONSULTORÍA LOTE 4 TORRES Y ASOCIADOS SAS - CONTRATO 1882 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	X		4/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	MARLON MOGOLLO ROMERO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	CLAUDIA MARCELA FORERO CASTRO	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-008-2026
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	LORENA PRASCA RAMIREZ	X		27/01/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4-014-2026
7	GEÓLOGO	DIANA CAROLINA CHAPARRO PIRAJON	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	YEIMI GARCIA MORENO	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4-025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	CARLOS MAURICIO FONSECA GAMBA	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4-025-2026
10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JAIME ECHEVERRIA RODRIGUEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	NESTOR CAMILO SIERRA RODRIGUEZ	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-008-2026
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JULIANA HERRERA MACIAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ	X		16/02/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-028-2026
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FRANCY DANIELA DUARTE	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4-025-2026
16	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
17	PROFESIONAL SOCIAL	EDNA RUTH GARZON ROJAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JUAN SEBASTIAN PALMA MORENO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	LAURA MAHECHA BUITRAGO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4-020-2026
21	PROFESIONAL SIG	IBETH MURCIA PEÑA	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026
22	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4-020-2026
23	PROFESIONAL NAVAL	EDUARDO CUBAQUE BERNAL	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4-020-2026
24	DIBUJANTE	SEBASTIAN HERNANDEZ CHAVEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-010-2026

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 5.**

Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 5.

CONSULTORÍA LOTE 5 CONSORCIO MNF CONTRATO 1957 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		1/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-003-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		27/11/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-003-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CARLOS ANDRES MARTINEZ	X		17/12/25	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
4	INGENIERO AUXILIAR	LARRY GONZALEZ BARRERA	X		15/01/2026	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-005-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	JORGE IGNACIO VELEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	MARCELO BEDOYA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
7	GEOLOGO	MARIO ALBERTO VARGAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-008-2025
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	EDWIN DOMIGUEZ MORENO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-009-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE MANUEL ALVAREZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-008-2025
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-008-2025
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MARIA EULALIA ARTETA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-008-2025
16	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALBA LINARES TAFUR	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
17	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-008-2025
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	SANDRA MURILLO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CATALINA MOLINA LOZAN	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-008-2025
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	BRIAN RIOS BORRAEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
21	PROFESIONAL SIG	LISMAR ROSSANA MALDONADO MEDINA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
22	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	MARCO MONTENEGRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
23	PROFESIONAL NAVAL	ORLANDO CASTAÑEDA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-006-2025
24	DIBUJANTE 1	MARIO MONTENEGRO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN 8-871-LS-008-2025

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 6.**

Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 6.

CONSULTORÍA LOTE 6 CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO 1968 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-16-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS LEONARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-16-002-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	JULIAN DAVID MORA RAMIREZ	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	LAURA KATHERINE AGUILAR PULIDO	X		16/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-0011-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GERMAN FELIPE MEDIAN RUBIO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-16-014-2026
6	GEÓLOGO	LUIS EDUARDO SANTAMARIA MONTOYA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-008-2026
7	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-006-2025
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JENNY MAGALY RUIZ PIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-008-2026
9	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA	X		16/1/2026	OFICIO CON OBSERVACIONES II-871-16-012-2026
10	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JESUS ALBERTO LUENGAS BERNAL	X		13/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-16-009-20216
11	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	HIBET LASSO TRIGOS	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-008-2026
12	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-006-2025
13	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-008-2026
14	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE BETANCOURTH	X		13/1/2026	OFICIO CON OBSERVACIONES OFICIO II-871-16-008-2026
15	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	DIEGO ANDRÉS ROJAS MONTERO	X		16/01/2026	OFICIO CON OBSERVACIONES II-871-16-012-2026
16	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CAROL JEIMY TORRES AFRICANO	X		13/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-16-009-20216
17	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIEGO FERNANDO SEQUEDA	X		23/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-16-016-20216
18	PROFESIONAL SIG	MAURICIO MENDOZA CUBILLOS	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-006-2025
19	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	CARLOS HERNANDO RIOS FERRERIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-008-2026
20	DIBUJANTE	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-16-008-2026

 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 36 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Cosnultoría. Lote 2.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA															CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-TR-6																															
																	VERSIÓN 1																															
																	PÁGINA 																															
																	FECHA 15/04/26 (Día / Mes / Año)																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA																	DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.																															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1915 de 2025																	CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025																	PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 2.																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025																	INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																															
NOMBRE ARL: POSITIVA																	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR																															
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Dedicación en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión		Valor Caja de Compensación
1	SILVERIO FARIAS MENDOZA	19.068.998	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	\$ 4.667.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	87%	WEG INGENIERIA	\$ 4.667.000,00	\$ 324.900	V	compensar	75258701	\$ 186.700			\$ 186.700				Pensionado
2	CARLOS ORAMAS LEURO		DIRECTOR DE CONSULTORÍA	\$ 718.000,00																														WEG INGENIERIA	\$ 718.000,00	\$ 50.000	V	MIN01	75258701	\$ 28.800			\$ 28.800				Pensionado	
3	CAROLINA GARZON BUITRAGO	30.745.228	INGENIERA RESIDENTE DE ESTUDIOS Y CAMPO	\$ 6.150.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WEG INGENIERIA	\$ 6.150.000,00	\$ 452.400	V	compensar	75258701	\$ 260.000	Porvenir	75258701	\$ 1.040.000	\$ 260.000				
4	DIEGO ALEJANDRO GARCIA	1.234.192.633	INGENIERO AUXILIAR 1	\$ 4.090.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WEG INGENIERIA	\$ 4.090.000,00	\$ 284.700	V	compensar	75258701	\$ 163.600	Porvenir	75258701	\$ 654.400	\$ 163.600				
5	LINA CRISTINA GARCÉS	1.014.237.312	INGENIERA AUXILIAR 2	\$ 4.090.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	AIRTIFICIAL	\$ 4.090.000,00	\$ 21.400	I	compensar	84915279	\$ 163.600	Protección	84915279	\$ 654.400	\$ 163.600				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 19.715.000,00																																												
El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																																
NOTAS: 1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectivo. 2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo. 3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades. 4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal. 7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría. 9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																
Firma:  Nombre: CARLOS ORAMAS LEURO Director de Consultoría Matricula Profesional No.: 0035																			Firma: _____ Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL																													

 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Figura 37 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-TR-6																													
																	VERSIÓN	1																												
																	PÁGINA																													
																	FECHA	10/4/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA																	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																													
CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1892 DE 2025																	CONTRATISTA: CONSORCIO VIA FLUVIAL																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26																	PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 3																													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1967 DE 2025																	INTERVENTOR: CONCEP S.A.S																													
NOMBRE ARL: SURSA																	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR																													
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																														
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS		Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión
1	BENITEZ MATEUS MARCO TULIO	72110392	DIRECTOR DE CONSULTORIA	\$ 5.385.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIA FLUVIAL	\$ 5.385.000	\$ 11.400	V	ALIANSA SALUD		\$ 270.700	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR	52087956	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	\$ 6.150.000																								X	X	X	X	X	CONSORCIO VIA FLUVIAL	\$ 1.025.000	\$ 5.400	I	SANITAS		\$ 41.000	COLPENSIONES		\$ 164.000	\$ 41.000	\$ -	\$ -	
3	JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARRO	79442657	INGENIERO AUXILIAR	\$ 8.180.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIA FLUVIAL	\$ 9.920.000	\$ 690.500	I	SANITAS		\$ 1.240.000	COLPENSIONES		\$ 1.587.200	\$ 198.400	\$ -	\$ -	
4	VALENTINA SILVA RAMOS	1018490799	DIBUJANTE	\$ 5.260.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIA FLUVIAL	\$ 1.750.905	\$ 121.900	I	COMPENSAR		\$ 216.900	PORVENIR		\$ 280.200	\$ -	\$ -	\$ -	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																														
El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.																																														
NOTAS:																																														
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.																																														
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".																																														
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																														
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.																																														
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.																																														
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.																																														
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.																																														
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																														
Firma: _____ Nombre: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS Director de Consultoría Matrícula Profesional No.: 14658 CND																			Firma: _____ Nombre: _____ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INAVI. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																														

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figure 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 4.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA															CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-TR-6																														
		VERSIÓN 1																																													
		PÁGINA 104/2026 (507 Mes 7 Año)																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1882-2025 CONSULTOR: TORRES Y ASOCIADOS SAS																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026 PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL" LOTE 4.																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																																															
NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR																																															
VERIFICACIÓN PERSONAL. DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	
1	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DOONCEL	19.068.998	DIRECTOR DE CONSULTORIA	\$ 5,710,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50%	TORRES Y ASOCIADOS SAS	\$ 5,385,000.00	\$ 397,500.00	V	COMPENSAR	9502779798	\$ 228,400	PORVENIR	9502779798	\$ 913,600	\$ 228,400			
2	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	30.745.228	INGENIERA RESIDENTE DE ESTUDIOS Y CAMPO	\$ 6,300,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	TORRES Y ASOCIADOS SAS	\$ 6,300,000.00	\$ 438,500.00	V	SANITAS	9502779798	\$ 252,000	PORVENIR	9502779798	\$ 1,008,000	\$ 252,000			
3	MARLON ALVEIRO	1.234.192.633	INGENIERO AUXILIAR 1	\$ 3,615,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	TORRES Y ASOCIADOS SAS	\$ 3,615,000.00	\$ 251,700.00	V	SANITAS	9502779798	\$ 144,600	PORVENIR	9502779798	\$ 578,400	\$ 144,600			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 15,625,000.00																																											
El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																															
NOTAS: 1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva. 2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo. 3. La responsabilidad de la interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades. 4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal. 7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría. 9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																															
Firma: <u>Karen Criado</u> Nombre: KAREN DAYANA CRIADO Representante Legal o su Apoderado Consultora Matricula Profesional No.:																																															
Firma: _____ Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL																																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																															

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 39 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA																				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-TR-6																												
																					VERSION 1																												
																					PÁGINA 1 DE 1																												
																				FECHA 7/04/2026 <small>(Día / Mes / Año)</small>																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA																																							
CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1957 de 2025 MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 31 MARZO/26										INTERVENTOR: CONCEP SAS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. PROYECTO: LOTE 5 SUPERVISOR: PAOLA MAHECHA																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:																																																	
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																	
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS (4%)	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones (16%)	No. Planilla	Valor Cotizado Fondo y subcuenta	Valor Cotizado Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE DE LA HOZ DE CASTRO	3.745.341	Director Interventoría	\$ 5.710.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ingeniería de proyectos sas	\$ 5.710.000	\$ 367.500	V	SURA	9500420864	\$ 713.800	NA	9500420864	Pensionado	\$	-			Pensionado	
2	CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.140.818.460	Ingeniero Residente Estudios y Campo	\$ 6.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Imp Servicios sas	\$ 6.300.000	\$ 362.800	V	SURA	9500927374	\$ 300.000	COLPENSIONES	9500927374	\$ 1.275.000	\$	300.000				
3	LARRY GONZALEZ BARRERA	1.014.234.791	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.615.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ingeniería de proyectos sas	\$ 3.615.000	\$ 251.700	V	SALUD TOTAL	9501164957	\$ 144.600	COLPENSIONES	9501164957	\$ 578.400	\$	144.600				
4	MARCO MONTENEGRO	80.067.157	Dibujante	\$ 2.630.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ingeco	\$ 2.630.000	\$ 273.200	V	SALUD TOTAL	6000276769	\$ 214.100	COLPENSIONES	6000276769	\$ 856.400	\$	157.000				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																																	
El contratista adjunta la certificación de fecha 1/04/2026 a la que se refiere la nota 6 del presente formato.																																																	
NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. 5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normalidad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. 7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad prestadora del servicio. 8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																	
Firma Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO Representante Legal Consultoría Consorcio MNF										Firma Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE INTERVENTOR Matrícula Profesional: 002-0203687 ATL																																							



CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED
FLUVIAL NACIONAL

INFORME MENSUAL No 4



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Figura 40 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría. Lote 6.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7																																												
				VERSION 1																																												
				PÁGINA 1 de 1																																												
				FECHA 4/04/2025 (Día / Mes / Año)																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO																																														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1922 DE 2025		INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.																																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 MARZO 2026		PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 6																																														
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2025		CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY																																														
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar S.A		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																														
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES				Observaciones (indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			g	Dedicación en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla		Valor Cotizado Pension
1	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	1,086,177,766	DIRECTORA CONS.	\$ 5,385,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	PROES LATAM	\$ 5,385,000	\$ 374,800	I	Salud Total EPS	71966265	\$ 215,400	Porvenir	71966265	\$ 861,600	\$ 215,400			
2	CARLOS ARTURO BORJAS MARQUEZ	1,102,832,707	Ingeniero residente de campo y estudios	\$ 4,510,000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	PROES LATAM	\$ 4,510,000	\$ 313,900	I	Nuevo EPS	71966265	\$ 180,400	Colpensiones	71966265	\$ 721,600	\$ 180,400				
3	LAURA KATHERINE AGUILAR PULIDO	1,121,956,072	Ingeniera Auxiliar	\$ 4,090,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	PROES COLOMBIA	\$ 4,090,000	\$ 284,700	I	Santitas EPS	758335994	\$ 163,600	Porvenir	758335994	\$ 654,400	\$ 163,600				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES					\$ 13,985,000																																											
El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/03/2026 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																																
NOTAS: 1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva. 2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo. 3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades. 4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal. 7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría. 9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de 10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																
Firma Nombre: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS Director de consultoría Matrícula Profesional No. 22202-251355 COR PROCES INGENIERIA Origen: Informe Mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INAVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																																
Firma Nombre: Ricardo Jose Coady Matrícula Profesional No. 08202005667 ATL Director del contrato de Interventoría																																																

 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME MENSUAL No 4	

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.



Figura 41 Informe financiero lote 1.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA						CODIGO: MEPI-MNI-04-10-FR-B VERSION: 1 PAGINA:						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCION TERRITORIAL: N/A						FECHA: 6/04/2026 (DS/MS/TA/0)						
CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1911 DE 2025		CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL												
MES INFORME MENSUAL: 03/25		PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL - LOTE 1.												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1922 DE 2025		INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.												
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2025	835925	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BVS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 65.474.111								
2025	835925	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BVS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 2.866.752.121	\$ 1.320.706.772							
TOTAL						\$ 2.932.226.232	\$ 1.320.706.772							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 2.932.226.232..												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
ANTICIPO														
1		16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	\$ 71.892.000	\$ 13.059.480	\$ 85.551.480	\$ 35.946.000	\$ 49.605.480	\$ 1.232.027.828,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.700.198.404	\$ 2.932.226.232			
2		16 AL 31 DE ENERO DE 2026	\$ 139.486.000	\$ 26.502.340	\$ 165.988.340	\$ 69.743.000	\$ 96.245.340	\$ 1.126.336.828,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.650.592.924	\$ 2.846.674.752			
3		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	\$ 165.859.900	\$ 31.475.381	\$ 197.135.281	\$ 82.829.950	\$ 114.305.331	\$ 1.043.508.878,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.554.347.584	\$ 2.680.686.412			
4		1 AL 31 DE MARZO DE 2026	\$ 172.949.972	\$ 32.869.495	\$ 205.810.467	\$ 86.474.986	\$ 119.335.481	\$ 957.033.892,50	835925 - 25/11/2025	\$ 1.440.042.253	\$ 2.483.551.131			
TOTALES			\$ 549.987.872,00	\$ 104.497.696,00	\$ 654.485.568,00	\$ 274.993.936	\$ 379.491.632	\$ 1.043.508.878,50		\$ 1.320.706.772	\$ 2.277.740.664			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		\$ 251.622.090		\$ 47.808.188		\$ 299.430.188								
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES		\$ 101.699.098		\$ 19.590.908		\$ 120.190.000								
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS		\$ 197.355.872		\$ 37.499.516		\$ 234.855.388								
VALOR TOTAL		\$ 549.987.872		\$ 104.497.696		\$ 654.485.568								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma:  Nombre: CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA Director de Consultoría Matrícula Profesional No.: 25000-14687 CND </div> <div> Firma:  Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL </div> </div>														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIMAS. Copio: Interventor a Dirección Territorial														

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 42. Informe financiero lote 2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN 1			
											PÁGINA 1			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA											FECHA 20/04/2025 (Día / Mes / Año)			
CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1915 DE 2025											DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.			
CONTRATISTA CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD														
MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026														
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025														
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.														
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2025	1098324	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 43.187.756,00	\$ -							
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 1.890.954.926,00	\$ 952.340.090,50							
TOTAL						\$ 1.934.142.682,00	\$ 952.340.090,50							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.934.142.682,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
		ANTICIPO	\$ 812.664.992,50						834125 del 28/11/2025	\$ 1.121.477.689,50	\$ 1.934.142.682,00		SI NO	ANTICIPO
1	C	16 al 31 de Diciembre de 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812.664.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 1.121.477.689,50	\$ 1.934.142.682,00			
2	C	1 al 31 de enero de 2026	\$ 131.908.880,00	\$ 25.062.687,00	\$ 156.971.567,00	\$ 66.000.000,00	\$ 90.971.567,00	\$ 746.664.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 1.030.506.122,50	\$ 1.777.171.115,00			
3	C	1 al 28 de febrero de 2026	\$ 113.332.800,00	\$ 21.533.232,00	\$ 291.837.599,00	\$ 56.700.000,00	\$ 78.166.032,00	\$ 689.964.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 952.340.090,50	\$ 1.642.305.083,00			
4	C	1 a 31 de marzo de 2026	\$ 49.012.800,00	\$ 9.312.432,00	\$ 350.162.831,00	\$ 24.507.000,00	\$ 33.818.232,00	\$ 665.457.992,50	834125 del 28/11/2025	\$ 918.521.858,50	\$ 1.583.979.851,00			
TOTALES			\$ 294.254.480,00	\$ 55.908.351,00	\$ 350.162.831,00	\$ 147.207.000,00	\$ 202.955.831,00	\$ 665.457.992,50		\$ 918.521.858,50	\$ 1.583.979.851,00			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1			\$ 130.971.480,00		\$ 24.884.581,00		\$ 155.856.061,00							
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES - Grupo 2			\$ 110.400.000,00		\$ 20.976.000,00		\$ 131.376.000,00							
OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 52.883.000,00		\$ 10.047.770,00		\$ 62.930.770,00							
*														
VALOR TOTAL			\$ 294.254.480,00		\$ 55.908.351,00		\$ 350.162.831,00							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma  Nombre: CARLOS ORAMAS LEURO Director de Consultoría Matrícula Profesional No.: 0035 </div> <div> Firma  Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL </div> </div>														

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Figura 43 Informe financiero lote 3.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-9		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA 		
												FECHA 6/04/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CENTRAL		
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1892-2025 CONSULTOR CONSORCIO VIA FLUVIAL														
MES INFORME MENSUAL: PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VALUPÉ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1957-2025 INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.														
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2025	834225	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 41.534.997,00	\$ 41.534.997,00							
2025	834225	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	\$ 1.818.589.685,00	\$ 1.037.024.692,50							
TOTAL						\$ 1.860.124.682,00	\$ 1.078.559.689,50							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:						\$ 1.860.124.682								
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
		ANTICIPO	\$ 781.564.992,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	834225 de 28/11/2025	\$ 1.078.559.690	\$ 1.860.124.682,00		SI NO	ANTICIPO
1	C	16 al 31 de diciembre de 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	834225 de 28/11/2025	\$ 1.078.559.689,50	\$ 1.860.124.682,00			
2	C	01 al 31 de enero de 2026	\$ 88.725.800	\$ 16.857.902	\$ 105.583.702	\$ 44.362.900	\$ 61.220.802	\$ 720.344.191	834225 de 28/11/2025	\$ 1.017.338.888	\$ 1.754.540.980			
3	C	01 al 28 de febrero de 2026	\$ 425.544.324	\$ 80.853.422	\$ 506.397.746	\$ 212.772.162	\$ 293.625.584	\$ 487.939.409	834225 de 28/11/2025	\$ 784.934.106	\$ 1.248.143.234			
TOTALES			\$ 514.270.124,00	\$ 97.711.324,00	\$ 611.981.448,00	\$ 257.135.062,00	\$ 354.846.386,00	\$ 487.939.408,50		\$ 784.934.105,50	\$ 1.248.143.234,00			
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - GRUPO 1			\$ 59.293.800		\$ 11.265.822		\$ 70.559.622							
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES - GRUPO 2			\$ -		\$ -		\$ -							
OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 366.250.524		\$ 69.587.600		\$ 435.838.124							
VALOR TOTAL			\$ 425.544.324		\$ 80.853.422		\$ 506.397.746							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ Representante Legal o Apoderado Consorcio Via Fluvial Contratista </div> <div> Firma Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE Representante Legal o Apoderado Consorcio Concep S.A.S. Interventor </div> </div>														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.														

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 44 Informe financiero lote 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8				
											VERSIÓN 1				
											PÁGINA 1				
											FECHA 1/04/2026 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL:															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1882-2025 CONTRATISTA CONSULTOR: TORRES Y ASOCIADOS SAS															
MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025 PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4.															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922-2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.															
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2025	1096324	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 30,418,225.00	\$ 30,418,225.00								
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	\$ 1,331,847,217.00	\$ 1,331,847,217.00								
TOTAL						\$ 1,362,265,442.00	\$ 1,362,265,442.00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1,362,265,442.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
		ANTICIPO	\$ 572,380,438.00						124725 del 11/08/2025	\$ 789,885,004.00	\$ 1,362,265,442.00				ANTICIPO
1	C	19 al 31 de Diciembre de 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572,380,438.00	124725 del 11/08/2025	\$ 789,885,004.00	\$ 1,362,265,442.00				
2	C	1 al 31 de Enero de 2026	\$ 34,046,280.00	\$ 6,468,793.00	\$ 40,515,073.00	\$ 17,023,140.00	\$ 23,491,933.00	\$ 555,357,298.00	124725 del 11/08/2026	\$ 766,393,071.00	\$ 1,321,750,369.00				
3	C	1 al 28 de Febrero de 2026	\$ 357,959,250.00	\$ 68,012,258.00	\$ 425,971,508.00	\$ 178,979,625.00	\$ 246,991,883.00	\$ 376,377,673.00	124725 del 11/08/2027	\$ 519,401,188.00	\$ 895,778,861.00				
4	C	1 al 31 de Marzo de 2026	\$ 170,500,000.00	\$ 32,395,000.00	\$ 202,895,000.00	\$ 85,250,000.00	\$ 117,645,000.00	\$ 291,127,673.00	124725 del 11/08/2028	\$ 401,756,188.00	\$ 692,883,861.00				
TOTALES			\$ 562,505,530.00	\$ 106,876,051.00	\$ 669,381,581.00	\$ 85,250,000.00	\$ 388,128,816.00	\$ 291,127,673.00		\$ 401,756,188.00	\$ 692,883,861.00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL										
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1			\$ 37,500,000.00	\$ 7,125,000.00	\$ 44,625,000.00										
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES - Grupo 2			\$ -	\$ -	\$ -										
OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 133,000,000.00	\$ 25,270,000.00	\$ 158,270,000.00										
-															
VALOR TOTAL			\$ 170,500,000.00	\$ 32,395,000.00	\$ 202,895,000.00										
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma: <u>Karen Criado</u> Nombre: KAREN DAYANA CRIADO Representante Legal o su Apoderado Consultoría Matrícula Profesional No.: </div> <div> Firma: _____ Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL </div> </div>															

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 5. Consorcio MNF.


Figura 45 Informe financiero lote 5.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO: MNFRA-MN-IN-15-FR-9 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA														
CONTRATO DE OBRA No: 1957 de 2025		CONTRATISTA: CONSORCIO MNF														
MES INFORME MENSUAL: 1 - 31 MARZO/26		CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE SOLITA Y SOLANO SECTOR:														
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor										
2025	837825	C-2406-0600-6-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS	1957 de 2025	\$ 1.248.662.091,00										
2025	837825	C-2406-0600-7-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS	1957 de 2025	\$ 28.518.351,00										
TOTAL						\$ 1.277.180.442,00										
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 1.277.180.442,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No Registro presupuestal	Saldo Registro presupuestal No. 837825	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
		ANTICIPO	\$ 536.630.438		\$ 536.630.438	\$ -	\$ -	No. 837825	\$ 712.031.653							
1		16-31 DIC/25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No. 837825	\$ 740.560.004	\$ -	\$ 1.277.180.442,00			X		
2		1-31 ENE/26	\$ 90.041.800,00	\$ 17.107.942,00	\$ 107.149.742,00	\$ 45.020.900,00	\$ 491.609.538,00	No. 837825	\$ 678.421.162	\$ -	\$ 1.170.030.700,00			X		
3		1-28 FEB/26	\$ 195.709.600,00	\$ 37.184.824,00	\$ 232.894.424,00	\$ 97.854.800,00	\$ 393.754.738,00	No. 837825	\$ 543.381.538	\$ -	\$ 937.136.276,00			X		
4		1-31 MAR/26	\$ 129.070.800,00	\$ 24.523.452,00	\$ 153.594.252,00	\$ 64.535.400,00	\$ 329.219.338,00	No. 837825	\$ 454.322.686	\$ -	\$ 783.542.024,00			X		
TOTALES			\$ 414.822.200,00	\$ 78.816.218,00	\$ 493.638.418,00	\$ 207.411.100,00	\$ 329.219.338,00		\$ 454.322.686	\$ -	\$ 783.542.024,00					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																
		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL												
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		111.643.200,00	21.212.208,00	132.855.408,00												
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES		38.600.000,00	7.334.000,00	45.934.000,00												
GRUPO 3- OTROS COSTOS DIRECTOS		264.579.000,00	50.270.010,00	314.849.010,00												
VALOR TOTAL		\$ 414.822.200,00	\$ 78.816.218,00	\$ 493.638.418,00												
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																
Firma																
Nombre: JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ Director de Consultoría Matrícula No.: 0820221777 ATL		Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Matrícula Profesional: 082-0205667 ATL INTERVENTOR														
Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa). Copias: Interventor y Dirección Territorial.																

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Figura 46 Informe financiero lote 6.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA										CODIGO MEPI-MN1-IN-1S-FR-9	
											VERSION 1	
											PÁGINA 	
FECHA: 25/04/2026 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO												
CONTRATO DE INTEVENTORIA No.: 1922-2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. MES INFORME MENSUAL: 3 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025 CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY MIT. 902.007.863-3												
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2025	837525	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	\$ 913.632.210,00	\$ 804.730.720,61					
2025	837525	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	\$ 20.866.560,00	\$ -					
TOTAL						\$ 934.498.770	\$ 804.730.720,61					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 934.498.770												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	837525 DE 2025-12-1	\$ 934.498.770,00	\$ 934.498.770,00		
2	ENE/2026	\$ 55.451.739,00	\$ 10.535.830,41	\$ 65.987.569,41	\$ -	\$ 65.987.569,41	\$ -	837525 DE 2025-12-1	\$ 934.498.770,00	\$ 934.498.770,00		
3	FEB/2026	\$ 53.597.042,00	\$ 10.183.437,98	\$ 63.780.479,98	\$ -	\$ 63.780.479,98	\$ -	837525 DE 2025-12-1	\$ 868.511.200,59	\$ 868.511.200,59		
4	MAR/2026	\$ 28.830.332,00	\$ 5.477.763,08	\$ 34.308.095,08	\$ -	\$ 34.308.095,08	\$ -	837525 DE 2025-12-1	\$ 804.730.720,61	\$ 804.730.720,61		
TOTALES		\$ 137.879.113,00	\$ 26.197.031,47	\$ 164.076.144,47	\$ -	\$ 164.076.144,47	\$ -		\$ 770.422.625,53	\$ 770.422.625,53		
Todas las Actas aprobadas por el interventor del Contrato de consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		\$ 26.429.032,00		\$ 5.021.516,08		\$ 31.450.548,08						
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES		\$ -		\$ -		\$ -						
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS		\$ 2.401.300,00		\$ 456.247,00		\$ 2.857.547,00						
VALOR TOTAL		\$ 28.830.332,00		\$ 5.477.763,08		\$ 34.308.095,08						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma:  Nombre: Martha Liliana De Hoyos Director de Consultoría Matricula Profesional No. 22202-251355 COR CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY						Firma: _____ Nombre: Ricardo Jose Cogollo Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

4.5. Estado general del Tiempo

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 47 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-10																															
			VERSIÓN 1																															
			PÁGINA 																															
			FECHA 6/04/26 <small>(Día / Mes / Año)</small>																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.																																		
CONTRATO DE CONSULTORÍA N. 1915 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 2																																		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026 PROYECTO:																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.																																		
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																		
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Seco	24	24	24	24	24	24	N.A.										24	17	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	16	24
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0											0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0											0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0
Total horas	24	24	24	24	24	24											24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																		
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																		
OBSERVACIONES:																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma:  Nombre: Carolina Garzón Residente de Consultoría Matricula Profesional No.: 25202-370353 CND </div> <div> Firma: _____ Nombre: _____ Residente de Interventoría Matricula Profesional No.: _____ </div> </div>																																		

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.


Figura 48 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	1/04/2026 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA</u>			DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>META</u>																													
CONTRATO DE OBRA No: <u>1892 DE 2025</u>																																
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VIA FLUVIAL</u>																																
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN																																
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>mar-26</u>																																
PROYECTO: <u>LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3</u>																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: <u>1957 DE 2025</u>																																
INTERVENTOR: <u>CONCEP S.A.S</u>																																
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lluvias moderadas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Firma</p> <p>Nombre: LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR</p> <p>Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios</p> <p>Matrícula Profesional No.: 25202-099284 CND</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Firma</p> <p>Nombre:</p> <p>Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios</p> <p>Matrícula Profesional No.:</p> </div> </div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 49 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-10																														
			VERSIÓN 1																														
			PÁGINA 																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			FECHA 31/03/2026 <small>(Día / Mes / Año)</small>																														
DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																	
CONTRATO DE CONSULTORÍA: 1882 DE 2025																																	
CONTRATISTA: TORRES Y ASOCIADOS SAS																																	
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA PROYECTO: RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4.																																	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1922 DE 2025																																	
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS																																	
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24													474
Lluvias moderadas																													3	3		6	
Lluvias intensas																																0	
Total horas	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																	
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																	
OBSERVACIONES: Registro relacionado a Pavasá - Chocó																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma:  Nombre: HEIVER ANDRES TORRES RINCON Residente de Obra Matricula Profesional No.: 25202376269 CND </div> <div> Firma: _____ Nombre: _____ Residente de Interventoría Matricula Profesional No.: _____ </div> </div>																																	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 50 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSION	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	5/04/2026 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA</u>			DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAQUETA</u>																													
CONTRATO DE OBRA No: <u>1957 de 2025</u>			CONTRATISTA: <u>CONSORCIO MNF</u> ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>mar-26</u>			PROYECTO: <u>RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 5</u>																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: <u>1922 DE 2025</u>			INTERVENTOR: <u>CONCEP S.A.S</u>																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																																24
Lluvias moderadas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Lluvias intensas																																
Total horas																																
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
OBSERVACIONES: El presente registro se encuentra respaldado por el Reporte de Información Hidrometeorológica de DHIME, con una precipitación mensual de 211,4 mm en el mes																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">  Firma Nombre: CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ Residente de Consultoría Matricula Profesional No.: </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> Firma Nombre: Residente de Interventoría Matricula Profesional No.: </p> </div> </div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

 <p>ONCEP S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.</p>	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	 <p>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p>
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 52 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 5.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO</p>						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA			
						FECHA	5/04/2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA				
CONTRATO CONSULTORIA No.: 1957 DE 2025						CONTRATISTA: CONSORCIO MNF				
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26						ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL - LOTE 5				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025						INTERVENTOR: CONCEP SAS				
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. de Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
E1 A AR Solano	1/03/2026	Temperatura	Dec 1076/2015	Río Caquetá Aguas Arriba del Muelle Municipio de Solano	1	N.A.	29.8	-		
E1 A AR Solano	1/03/2026	pH	Dec 1076/2015		1	4.5	9.0	6.83	SI	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Conductividad	Dec 1076/2015		1	N.A.		46	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Oxígeno Disuelto	Dec 1076/2015		1	4.0		5.93	SI	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Porcentaje de saturación	Dec 1076/2015		1	70%		79.3	SI	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Alcalinidad Total	Dec 1076/2015		1	N.A.		<20.0	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	DBO ₅	Dec 1076/2015		1	N.A.		<2.0	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	DQO	Dec 1076/2015		1	N.A.		41.1	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Cetiosfatos	Dec 1076/2015		1	N.A.		0.72	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Fosforo Total	Dec 1076/2015		1	N.A.		1.1	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Nitrogeno Amoniacal	Dec 1076/2015		1	1.0		2.99	NO	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Nitros	Dec 1076/2015		1	1.0		<0.01	SI	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Nitritos	Dec 1076/2015		1	10.0		2.9	SI	
E1 A AR Solano	1/03/2026	NKT	Dec 1076/2015		1	N.A.		8.09	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Sólidos Suspendedos Totales (SST)	Dec 1076/2015		1	N.A.		147	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Sólidos Sedimentables	Dec 1076/2015		1	N.A.		0.5	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Turbiedad	Dec 1076/2015		1	N.A.		100	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Grasas y Aceites	Dec 1076/2015		1	No debe haber película visible		<0.5	SI	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Hidrocarburos Totales	Dec 1076/2015		1	N.A.		<0.5	-	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Mercurio	NOAA		1	0.0014		<0.001	SI	
E1 A AR Solano	1/03/2026	Detergentes	Dec 1076/2015	1	0.5		<0.1	SI		
E1 A AR Solano	1/03/2026	Coliformes Termotolerantes	Dec 1076/2015	1	2000		2	SI		
E1 A AR Solano	1/03/2026	Coliformes Totales	Dec 1076/2015	1	5000	20000	7	SI		
E2 A AB Solano	1/03/2026	Temperatura	Dec 1076/2015	Río Caquetá Aguas Abajo del Muelle Municipio de Solano	1	N.A.	29.7	-		
E2 A AB Solano	1/03/2026	pH	Dec 1076/2015		1	4.5	9.0	6.92	SI	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Conductividad	Dec 1076/2015		1	N.A.		51	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Oxígeno Disuelto	Dec 1076/2015		1	4.0		5.88	SI	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Porcentaje de saturación	Dec 1076/2015		1	70%		79.1	SI	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Alcalinidad Total	Dec 1076/2015		1	N.A.		<20	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	DBO ₅	Dec 1076/2015		1	N.A.		<2	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	DQO	Dec 1076/2015		1	N.A.		26.8	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Cetiosfatos	Dec 1076/2015		1	N.A.		0.73	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Fosforo Total	Dec 1076/2015		1	N.A.		0.1	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Nitrogeno Amoniacal	Dec 1076/2015		1	1.0		2.08	NO	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Nitros	Dec 1076/2015		1	1.0		<0.01	SI	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Nitritos	Dec 1076/2015		1	10.0		2.9	SI	
E2 A AB Solano	1/03/2026	NKT	Dec 1076/2015		1	N.A.		5.43	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Sólidos Suspendedos Totales (SST)	Dec 1076/2015		1	N.A.		163	-	
E2 A AB Solano	1/03/2026	Sólidos Sedimentables	Dec 1076/2015		1	N.A.		0.5	-	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO							CÓDIGO	MEPI-MN-1-IN-15-FR-11	
								VERSION	1	
								PAGINA		
								FECHA	5/04/2026 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA										
CONTRATO CONSULTORIA No.: 1957 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO MNF										
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 5										
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 PROYECTO: FLUVIAL NACIONAL, LOTE 5										
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONCEP SAS										
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
E1 A AR Solita	2023/2026	Temperatura	Dec 1076/2015	Río Caquetá - Aguas Arriba del Muelle Municipio de Solita	1	N.A.	27,3	-		
E1 A AR Solita	2023/2026	pH	Dec 1076/2015		1	4,5	9,0	6,94	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	Conductividad	Dec 1076/2015		1	N.A.		67	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	Oxígeno Disuelto	Dec 1076/2015		1	4,0		6,03	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	Porcentaje de saturación	Dec 1076/2015		1	70%		80,6	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	Alcalinidad Total	Dec 1076/2015		1	N.A.		30,7	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	DBO ₅	Dec 1076/2015		1	N.A.		<2	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	DQO	Dec 1076/2015		1	N.A.		5	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Grifofosfatos	Dec 1076/2015		1	N.A.		0,51	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Fosforo Total	Dec 1076/2015		1	N.A.		0,77	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Nitrogeno Amoniacal	Dec 1076/2015		1	1,0		2,19	NO	
E1 A AR Solita	2023/2026	Nitratos	Dec 1076/2015		1	1,0		<0,01	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	Nitratos	Dec 1076/2015		1	10,0		3,9	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	NKT	Dec 1076/2015		1	N.A.		6,79	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Sólidos Suspendedos Totales (SST)	Dec 1076/2015		1	N.A.		124	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Sólidos Sedimentables	Dec 1076/2015		1	N.A.		0,3	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Turbiedad	Dec 1076/2015		1	N.A.		80	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Grasas y Aceites	Dec 1076/2015		1	No debe haber película visible		<0,5	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	Hidrocarburos Totales	Dec 1076/2015		1	N.A.		<0,5	-	
E1 A AR Solita	2023/2026	Mercurio	NOAA		1	0,0014		<0,001	SI	
E1 A AR Solita	2023/2026	Detergentes	Dec 1076/2015	1	0,5		<0,1	SI		
E1 A AR Solita	2023/2026	Coliformes Termotolerantes	Dec 1076/2015	1	2000		<1,0	SI		
E1 A AR Solita	2023/2026	Coliformes Totales	Dec 1076/2015	1	5000	20000	<1,0	SI		
E2 A AB Solita	2023/2026	Temperatura	Dec 1076/2015	Río Caquetá - Aguas Abajo del Muelle Municipio de Solita	1	N.A.	27,4	-		
E2 A AB Solita	2023/2026	pH	Dec 1076/2015		1	4,5	9,0	7,09	SI	
E2 A AB Solita	2023/2026	Conductividad	Dec 1076/2015		1	4,0		62	SI	
E2 A AB Solita	2023/2026	Oxígeno Disuelto	Dec 1076/2015		1	4,0		5,95	SI	
E2 A AB Solita	2023/2026	Porcentaje de saturación	Dec 1076/2015		1	70%		79,6	SI	
E2 A AB Solita	2023/2026	Alcalinidad Total	Dec 1076/2015		1	N.A.		14,1	-	
E2 A AB Solita	2023/2026	DBO ₅	Dec 1076/2015		1	N.A.		5,75	-	
E2 A AB Solita	20									

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-11
					VERSIÓN 1
					PAGINA
					FECHA 5/04/2026 (Día / Mes / Año)


E2 A AB Solita	2/03/2026	Turbiedad	Dec 10/76/2015	1	N.A.	90	-	-	-
E2 A AB Solita	2/03/2026	Grasas y Aceites	Dec 10/76/2015	1	No debe haber película visible	<0.5	SI	-	-
E2 A AB Solita	2/03/2026	Hidrocarburos Totales	Dec 10/76/2015	1	N.A.	<0.5	-	-	-
E2 A AB Solita	2/03/2026	Mercurio	NQAA	1	0.0014	<0.001	SI	-	-
E2 A AB Solita	2/03/2026	Detergentes	Dec 10/76/2015	1	0.3	<0.1	SI	-	-
E2 A AB Solita	2/03/2026	Califormes Termotolerantes	Dec 10/76/2015	1	2000	1	SI	-	-
E2 A AB Solita	2/03/2026	Califormes Totales	Dec 10/76/2015	1	5000	20000	4	SI	-

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
- Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
- Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
- Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
- Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
- El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma  Nombre: JOSE DE LA HOZ DE CASTRO Director de Consultoría Matricula Profesional No. 08202094917 ATL	Firma _____ Nombre: RICARDO COGOLLO Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 082-0205667 ATL
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría

Lote 1. Consorcio Inprobrain Fluvial.

Figura 53 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																												
			VERSIÓN 1																																																												
			PÁGINA 																																																												
FECHA: 5 3 2026 (Día) (Mes) (Año)																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A																																																															
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1914 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.																																																															
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																															
VALOR INICIAL: \$ 2.932.226.232,00 VALOR ACUMULADO: \$ 2.932.226.232,00 (Incluye adiciones)																																																															
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 293.222.623,20</td> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 1.232.027.829,00</td> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 586.445.246,40</td> <td>24</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 879.667.869,60</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 293.222.623,20	24	11	2025	30	6	2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	30	6	2026	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 586.445.246,40	24	11	2025	31	12	2028	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030	Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																												
			Desde			Hasta																																																									
Cumplimiento	10%	\$ 293.222.623,20	24	11	2025	30	6	2026																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	30	6	2026																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 586.445.246,40	24	11	2025	31	12	2028																																																							
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce																																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2025																																																															
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																												
			Desde			Hasta																																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																															
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																															
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																															

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN 1
		PÁGINA

FECHA	5	3	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 293.222.623,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.232.027.829,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 586.445.246,40
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 879.667.869,60
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	11	2025	31	12	2026
24	11	2025	31	12	2026
24	11	2025	30	6	2029
31	12	2025	31	12	2030
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Clausula vigesima primera paragrafo primero:
 "Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
 Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.
 Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría"

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____

Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 54 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
			VERSIÓN	1																																																														
			PÁGINA																																																															
			FECHA	6	4	2026																																																												
			(Día) (Mes) (Año)																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1915 DE 2025			CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD																																																															
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.																																																																		
FECHA DE INICIO: 16/12/25 PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/25 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																		
VALOR INICIAL: \$ 1.934.142.682,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.934.142.682,00 (Incluye adiciones)																																																																		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.934.142.682,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.934.142.682,00																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 193.414.268,00</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td colspan="3">1/07/26</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 812.664.993,00</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td colspan="3">1/07/26</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 386.828.536,00</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 580.242.805,00</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 193.414.268,00	16	12	2025	1/07/26			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 812.664.993,00	16	12	2025	1/07/26			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 386.828.536,00	16	12	2025	31	12	2028	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 580.242.805,00	31	12	2025	31	12	2030	Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Cumplimiento	10%	\$ 193.414.268,00	16	12	2025	1/07/26																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 812.664.993,00	16	12	2025	1/07/26																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 386.828.536,00	16	12	2025	31	12	2028																																																										
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 580.242.805,00	31	12	2025	31	12	2030																																																										
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS																																																																		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																																		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																		

pág. 94

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 3. Consorcio Vía Fluvial.

Figura 55 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																												
			VERSIÓN 1																																																												
			PÁGINA 																																																												
			FECHA 31 03 2025 (Día) (Mes) (Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 1892 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO VIA FLUVIAL																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.																																																															
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: 1/01/1900 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																															
VALOR INICIAL: \$ 1.860.124.682,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.860.124.682,00 (Incluye adicionales)																																																															
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.860.124.682,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.860.124.682,00																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1957 DE 2025 INTERVENTOR: S.A.S- CONCEP S.A.S CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 186.012.468,20</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>100%</td> <td>\$ 930.062.341,00</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 372.024.936,40</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 558.037.404,60</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	6	2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	6	2026	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	12	2028	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030	Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																												
			Desde			Hasta																																																									
Cumplimiento	10%	\$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	6	2026																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	6	2026																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	12	2028																																																							
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2025																																																															
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																												
			Desde			Hasta																																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																															
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																															

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA																																																															
		FECHA	31	03	2025																																																												
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																	
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 188.012.468,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>100%</td> <td>\$ 930.062.341,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 372.024.936,40</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>30%</td> <td>\$ 558.037.404,60</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 188.012.468,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60	Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>11</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>11</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>5</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			20	11	2025	30	11	2026	20	11	2025	30	11	2026	20	11	2025	31	5	2029	31	12	2025	31	12	2030	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																															
Cumplimiento	10%	\$ 188.012.468,20																																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 930.062.341,00																																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 372.024.936,40																																																															
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 558.037.404,60																																																															
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
20	11	2025	30	11	2026																																																												
20	11	2025	30	11	2026																																																												
20	11	2025	31	5	2029																																																												
31	12	2025	31	12	2030																																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200 Certificado de modificación o anexo No.: 2 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/12/2025																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																	
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																																	
Otros																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No. <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																	
OBSERVACIONES:																																																																	
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																																	
Firma Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ Representante Legal Consultoría Matrícula Profesional No.: Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.			Firma Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Representante Legal o Delegado Interventor: Matrícula No.:																																																														

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 56 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
			VERSIÓN	1																																																				
			PÁGINA																																																					
			FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)																																																				
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD EJECUTORA:			DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1882 de 2025			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS																																																					
OBJETO DEL CONTRATO: Control y vigilancia del Contrato de Consultoría No. 1882 de 2025, Estudios y Diseños para la Infraestructura Fluvial en el Departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lote 4.																																																								
FECHA DE INICIO: 19/12/2025 PLAZO INICIAL: 4,5 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 1,362,265,442.00 VALOR ACUMULADO: \$ 1,362,265,442.00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES PADRON																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 136,226,544.20</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 681,132,721.00</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 272,453,088.40</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 408,679,632.60</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> </tbody> </table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20	20	11	2025	30	6	2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00	20	11	2025	20	6	2026	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40	20	11	2025	31	12	2028	Estabilidad y/o Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60	31	12	2025	21	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20	20	11	2025	30	6	2026																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00	20	11	2025	20	6	2026																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40	20	11	2025	31	12	2028																																																
Estabilidad y/o Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60	31	12	2025	21	12	2030																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069541 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																								

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
			VERSIÓN	1																																																					
			PÁGINA																																																						
			FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 136,226,544.20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 681,132,721.00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 272,453,088.40</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 408,679,632.60</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40	Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>2031</td> </tr> </tbody> </table>					VIGENCIA						Desde			Hasta			20	11	2025	19	7	2026	20	11	2025	19	7	2026	20	11	2025	19	1	2029	31	12	2025	19	1	2031
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 136,226,544.20																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 681,132,721.00																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 272,453,088.40																																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 408,679,632.60																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
20	11	2025	19	7	2026																																																				
20	11	2025	19	7	2026																																																				
20	11	2025	19	1	2029																																																				
31	12	2025	19	1	2031																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069541 Certificado de modificación o anexo No.: 2 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																									
OBSERVACIONES:																																																									
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																									
Firma Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:082-02-05667 ATL			Firma Nombre: Patricia Ines Morales Padron Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:																																																						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																									

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 57 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA				
		FECHA		5	4	26	
				(Día)	(Mes)	(Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		Subdirección de Planificación de Infraestructura		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.		1957 de 2025		CONTRATISTA: CONSORCIO MNF			
OBJETO DEL CONTRATO: Estudios y diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional. Lote 5							
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)							
VALOR INICIAL: \$ 1.277.180.442,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.277.180.442,00 (Incluye adiciones)							
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.277.180.442,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.277.180.442,00							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		1922 de 2025		INTERVENTOR: CONCEP S.A.S			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL							
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
				Desde Hasta			
Cumplimiento		10%	\$ 127.718.044,20	27	11	2025	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		42%	\$ 536.630.438,00	27	11	2025	30/06/2026
Prestaciones sociales		20%	\$ 255.436.088,40	27	11	2025	31 12 2028
Calidad del servicio		30%	\$ 383.154.132,60	31	12	2025	31 12 2030
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		85-44-101141984					
Certificado de modificación o anexo No.:		0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)							
Razón Social Compañía Aseguradora:		Seguros del Estado					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		1/12/2025					

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																					
			VERSIÓN	1																																																					
			PÁGINA																																																						
		FECHA		5	4	26																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 1 SUSPENSIÓN No.: N.A																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 127.718.044,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>42%</td> <td>\$ 536.630.438,00</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones sociales</td> <td>20%</td> <td>\$ 255.436.088,40</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 383.154.132,60</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 127.718.044,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	\$ 536.630.438,00	Prestaciones sociales	20%	\$ 255.436.088,40	Calidad del servicio	30%	\$ 383.154.132,60	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">31/10/2026</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">31/10/2026</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>4</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			27	11	2025	31/10/2026			27	11	2025	31/10/2026			27	11	2025	31	4	2029	31	12	2025	31	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 127.718.044,20																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	\$ 536.630.438,00																																																							
Prestaciones sociales	20%	\$ 255.436.088,40																																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 383.154.132,60																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
27	11	2025	31/10/2026																																																						
27	11	2025	31/10/2026																																																						
27	11	2025	31	4	2029																																																				
31	12	2025	31	12	2030																																																				
Certificado de modificación o anexo No.: 2 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
OBSERVACIONES: La presente se encuentra ajustada según la Prorroga No. 1																																																									
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																									
Firma: _____ Nombre: Ricardo Cogollo P. Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 082-02-05667 ATL																																																									
<small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</small>																																																									

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 6. Consorcio Navegabilidad Projesy.

Figura 58 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																												
			VERSIÓN 1																																																												
			PÁGINA 1																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO																																																													
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1988 DE 2025		CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY																																																													
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.																																																															
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 ABRIL DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 9.344.987.700,00 VALOR ACUMULADO: \$ 9.344.987.700,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1022 DE 2025 INTERVENTOR: CONCEP S.A.S																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 93,449,877.00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>100%</td> <td>\$ 392,646,542.00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 186,899,754.00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 280,349,631.00</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 93,449,877.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 392,646,542.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 186,899,754.00	Calidad del servicio	30%	\$ 280,349,631.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">1/07/2026</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">1/07/2026</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			28	11	2025	1/07/2026			28	11	2025	1/07/2026			28	11	2025	31	12	2028	31	12	2025	31	12	2030	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																													
Cumplimiento	10%	\$ 93,449,877.00																																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 392,646,542.00																																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 186,899,754.00																																																													
Calidad del servicio	30%	\$ 280,349,631.00																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A																																																													
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
28	11	2025	1/07/2026																																																												
28	11	2025	1/07/2026																																																												
28	11	2025	31	12	2028																																																										
31	12	2025	31	12	2030																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/15/2025																																																															
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N.A	N.A	Otros	N.A	N.A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N.A	N.A																																																													
Otros	N.A	N.A																																																													
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N.A OTRAS PÓLIZAS No. N.A Certificado de modificación o anexo No.: N.A (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: N.A Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N.A																																																															

 <p>ONCEP S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.</p>	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	 <p>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</p>	<p>CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12</p>																																																												
		<p>VERSIÓN: 1</p>																																																												
		<p>PÁGINA:</p>																																																												
<p align="right">FECHA: 10 / 4 / 2026 (Día) (Mes) (Año)</p>																																																														
<p align="center">GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES</p>																																																														
<p>A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.</p>																																																														
<p>ADICIONAL No.: N.A. PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: N.A. SUSPENSIÓN No.: N.A.</p>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 93,449,877.00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>100%</td> <td>\$ 392,646,542.00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 186,899,754.00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 280,349,631.00</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 93,449,877.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 392,646,542.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 186,899,754.00	Calidad del servicio	30%	\$ 280,349,631.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A.	N.A.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">30/10/2026</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td colspan="3">30/10/2026</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			28	11	2025	30/10/2026			28	11	2025	30/10/2026			28	11	2025	30	4	2029	31	12	2025	31	12	2030	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																												
Cumplimiento	10%	\$ 93,449,877.00																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 392,646,542.00																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 186,899,754.00																																																												
Calidad del servicio	30%	\$ 280,349,631.00																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A.	N.A.																																																												
VIGENCIA																																																														
Desde			Hasta																																																											
28	11	2025	30/10/2026																																																											
28	11	2025	30/10/2026																																																											
28	11	2025	30	4	2029																																																									
31	12	2025	31	12	2030																																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205</p> <p>Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.</p> <p>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:</p>																																																														
<p align="center">SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES</p>																																																														
<p>A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.</p>																																																														
<p>ADICIONAL No.: N.A. PRÓRROGA No.: N.A. MODIFICACIÓN No.: N.A. SUSPENSIÓN No.: N.A.</p>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N.A.	N.A.	Otros	N.A.	N.A.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N.A.	N.A.																																																												
Otros	N.A.	N.A.																																																												
VIGENCIA																																																														
Desde			Hasta																																																											
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N.A. OTRAS PÓLIZAS No. N.A.</p> <p>Certificado de modificación o anexo No. N.A. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: N.A.</p> <p>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N.A.</p>																																																														
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>De acuerdo a las condiciones contractuales del contrato de interventoría No 1968 de 2025 en la CLÁUSULA VIGECIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento la garantía señalada ampara los siguiente:</p> <p>a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.</p> <p>b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.</p> <p>c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más</p> <p>d). Calidad del Servicio, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría</p>																																																														
<p>NOTAS:</p> <p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p>																																																														
<p>Firma: </p> <p>Nombre: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS</p> <p>Matrícula Profesional No.: 22202-251355 COR</p> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</p>																																																														

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

No aplica para el presente periodo


4.9. Otros documentos seguimiento mensual

 <p>ONCEP S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.</p>	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	 <p>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p>
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

Lote 2. Consorcio Navegabilidad.

Figura 59 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de obra, LOTE 2.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA</p>		<p>CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-2-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA:</p>			
	<p>FECHA: 14/04/2020 (Día / Mes / Año)</p>					
	<p>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.</p>				
<p>DATOS GENERALES</p>						
<p>INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 MES: MARZO INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO</p>						
<p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1915 DE 2025 (Indicar número y año)</p>						
<p>CONTRATO DE FIDUCIA No. DE ENTIDAD FINANCIERA:</p>						
<p>CUENTA BANCARIA No. 1600145922 BANCO CALVIENDA SUCURSAL: GALERÍAS (Indicar al correspondiente al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)</p>						
<p>ANTICIPO OTORGADO: 42.02 % VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 812.664.992.50 (MCTE)</p>						
<p>OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 2.</p>						
<p>CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD</p>						
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 (Indicar número y año)</p>						
<p>INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP S.A.S.</p>						
<p>DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO</p>						
TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
<p>Comprobatarios de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplen los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la interventoría).</p>						
<p>*Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.</p>						
<p>NOTA: El interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, reportes de transferencias, comprobantes de operación de transferencias de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que corresponden al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.</p>						
<p>SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM</p>						
ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Personal directivo, profesional y de apoyo	\$ 30.000.000,00		\$ -	\$ 30.000.000,00	
2	Costo por volúmenes técnicos entregables	\$ 500.000.000,00		\$ -	\$ 500.000.000,00	
3	Viajes, transportes, oficina e informes	\$ 20.000.000,00		\$ -	\$ 20.000.000,00	
4	Adquisición de cartográfica, georeferenciación, topografía, y batimetría, ensayos de batimetría y socavación	\$ 70.000.000,00		\$ -	\$ 70.000.000,00	
5	Exploración geotécnica	\$ 90.000.000,00		\$ -	\$ 90.000.000,00	
6	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (Sroomprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viajes y transporte de personal, transporte de muestras, registros, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	\$ 50.000.000,00		\$ -	\$ 50.000.000,00	
7	Estudios técnicos adicionales y complementarios	\$ 52.664.992,50		\$ -	\$ 52.664.992,50	
TOTALES		\$ 812.664.992,50		\$ -	\$ 812.664.992,50	
<p>VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (Febrero 2020): \$ - (Indicar el mes)</p>				<p>(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)</p>		
<p>VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ 17.824.70 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)</p>						
<p>RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES</p>						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
<p>(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)</p>						
<p>OBSERVACIONES:</p>						
<p>NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>Indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u></p>						
<p>Firma:  Nombre: WALTER ENRIQUE GARCÍA BLANDÓN Representante Legal o Delegado Contratista Matrícula Profesional No.: 13872 AGR</p>			<p>Firma:  Nombre: RICARDO COGULLO PONCE Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 0820205967 ATL</p>			
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>						

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 4. Torres y Asociados SAS.

Figura 60 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de obra, LOTE 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1	VERSIÓN 1
					FECHA 31/03/2026 (Día / Mes / Año)	
	UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				DIRECCIÓN TERRITORIAL:	
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1						
DATOS GENERALES						
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCHÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 4.						
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1882 DEL 2025 (Indicar número y año)						
CONSULTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S						
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A) %
1	Pagos salarios de profesionales y primas regionales	\$ 42,429,017.50	\$ 42,429,017.50			\$ 84,858,035.00 7%
2	Pagos Honorarios especialistas	\$ 54,800,750.50	\$ 54,800,750.50			\$ 109,601,501.00 10%
3	Levantamiento Topografico, Batimetrico y socavación	\$ 34,950,000.00	\$ 34,950,000.00			\$ 69,900,000.00 6%
4	Perforaciones de suelos	\$ 25,101,000.00	\$ 25,101,000.00			\$ 50,202,000.00 4%
5	Viatcos, Transportes Aéreos, Transportes especiales (Vehiculos, lancha, otros)	\$ 46,300,000.00	\$ 46,300,000.00			\$ 92,600,000.00 8%
6	Edición de informes, gestiones ambientales y otros estudios técnicos	\$ 29,600,000.00	\$ 29,600,000.00			\$ 59,200,000.00 5%
7	Ensayos de Laboratorio (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	\$ 53,009,451.00	\$ 53,009,451.00			\$ 106,018,902.00 9%
						\$ -
	SUBTOTAL	\$ 286,190,219.00	\$ 286,190,219.00			\$ 572,380,438.00
	TOTAL	\$ 572,380,438.00				\$ 572,380,438.00 100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital. <u>al número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.						
Firma: <u>Karen Criado</u> Nombre: Karen Criado Representante Legal Contratista Torres y Asociados S.A.S		Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal o su Apoderado Interventor Matricula Profesional No.: _____				
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

 ONCEP S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 5. Consorcio MNF.

Figura 61 Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo contrato de obra, LOTE 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1		
					VERSIÓN 1		
					PÁGINA 1		
					FECHA 05/04/2026 (Día / Mes / Año)		
SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE UNIDAD EJECUTORA: <u>INFRAESTRUCTURA</u>					DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAQUETA</u>		
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. <u>1</u>							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. <u>1957 DE 2025</u>					CONTRATISTA: <u>CONSORCIO MNF</u>		
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1922 de 2025</u>					INTERVENTOR: <u>CONCEP SAS</u>		
JUSTIFICACIÓN: N/A							
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago salarios profesionales y primas regionales	\$ 43.656.000				\$ 43.656.000	8,14%
2	Pago honorarios especialistas	\$ 193.000.000				\$ 193.000.000	35,97%
3	Levantamiento Topografico, Batimetrico y socavación	\$ 56.100.000				\$ 56.100.000	10,45%
4	Perforaciones en suelos y ensayos de laboratorio	\$ 112.809.250				\$ 112.809.250	21,02%
5	Viaticos, Transportes aereos, Transportes especiales (vehiculo, lancha, otros)	\$ 43.150.000				\$ 43.150.000	8,04%
6	Edición de informes, gestiones ambientales, otros estudios tecnicos	\$ 87.915.188				\$ 87.915.188	16,38%
TOTAL		\$ 536.630.438				\$ 536.630.438	100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptualizar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:  Nombre: JORGE RDA MEJIA Representante Legal Consorcio MNF Matricula profesional: CN - 23026237				Firma:  Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Representante Legal Interventor Matricula profesional: 082-02-05667 ATL			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones

4.9.3. Actas de comité y reunión

En el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones y comités:

Tabla 20 Resumen reuniones y comités de seguimiento, periodo marzo

Fecha	Lotes	Concepto
02/03/2026	1, 2 y 3	Reunión de seguimiento
02/03/2026	1	Reunión Topografía
02/03/2026	6	Reunión Actas de costos
03/03/2026	4, 5 y 6	Reunión de seguimiento
03/03/2026	1	Reunión Acta de Modificación No.2
04/03/2026	Interventoría	Reunión de seguimiento
04/03/2026	2	Reunión presencia Geotecnia
05/03/2026	Interventoría	Reunión de seguimiento
07/03/2026	1	Reunión muelles
09/03/2026	1, 2, 3 e Interventoría	Reunión de seguimiento
10/03/2026	4, 5 y 6	Reunión de seguimiento
12/03/2026	3	Reunión Actas de costos No.1 y 2
16/03/2026	1, 2 y 3	Reunión de seguimiento
16/03/2026	5	Reunión Actas de costos
17/03/2026	4, 5 y 6	Reunión de seguimiento
18/03/2026	INVIAS - Interventoría	Reunión Revisión Actas de costos
20/03/2026	1 y 2	Reunión Actas de costos
24/03/2026	3	Socialización virtual Mapiripaná
24/03/2026	4	Reunión Actas de costos
30/03/2026	1, 2, 3 y 6	Reunión de seguimiento
30/03/2026	1 y 3	Reunión Acta de Modificación
31/03/2026	4 y 5	Reunión de seguimiento
31/03/2026	3	Reunión muelles
31/03/2026	4	Reunión Informes Mensuales

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

En la Tabla 21 se presenta la información básica del Contrato de Interventoría.

Tabla 21 Información del contrato de Interventoría.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	No. 1922 de 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16-12-2025
Objeto del contrato	Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Contratista	Construcciones civiles estudios y proyectos S.A.S. (CONCEP S.A.S.)
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor del Contrato	\$ 3.940.965.840,00
Anticipo	\$ 662.347.200
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Prórroga No 1	Del 01 enero de 2026 al 30 de junio 26
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.
Supervisor de contrato	Patricia Morales Padrón
VALOR EJECUTADO A 31 DE MARZO 2026	
Valor Básico Ejecutado	\$ 1.059.755.520,00
% Ejecutado	32 %

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

Fuente: Propia

En la Tabla 22 se relaciona el personal presentado por la Interventoría y aprobado por el INVIAS para ejecutar el proyecto INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

Tabla 22 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS

No.	CARGO	NOMBRE
1	Director de Interventoría	Ricardo Cogollo Ponce
2	Especialista portuario	Layton Gonzalez Rubio Merritt
3	Especialista en hidráulica e hidrología	Bladimir Salcedo
4	Ingeniero residente de campo	Pedro González Cabrera
5	Geólogo	Claudia Ramírez
6	Especialista en geotecnia	José Guardo García
7	Especialista estructural	Armando Balza
8	Especialista en tránsito y transporte	Euclides Llach
9	Especialista en evaluación económica de proyectos	María Eulalia Arteta
10	Profesional en costos y presupuesto	Oscar Londoño Higgins
11	Economista ambiental	Juan José Vargas
12	Profesional en Arqueología	Wilhen Londoño
13	Ingeniero Forestal	Serafín Benavides
14	Ingeniero Ambiental	Faurid Escobar
15	Profesional Técnico-predial	Angie Sánchez
16	Profesional Jurídico predial	Cristian Hernández
17	Ingeniero Naval	Jairo Alberto Arteta Goenaga

Fuente: Propia

Table 23 Relación equipos de la Interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo de Cómputo, impresora, Plotter	1
Equipo de comunicación	1

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026:

Participación en Comités y Mesas de Trabajo

La Interventoría mantuvo un seguimiento constante a través de diversas instancias de coordinación:

- Comités de Seguimiento Virtual: El 9 y 10 de marzo, se llevaron a cabo comités para todos los lotes (1 al 6), tratando el avance del proyecto, visitas de especialistas, actas de costos y compromisos adquiridos en anteriores comités.
- Comité de Seguimiento No. 8: El 16 y 17 de marzo, la Interventoría participó en este comité para todos los lotes, evaluando el estado contractual, actividades de campo y volúmenes entregables.
- Mesas de Trabajo y Reuniones Específicas: Se realizaron sesiones para tratar actas de costos (Lote 1 el 20 de marzo; Lote 3 el 12 y 31 de marzo; Lote 4 el 31 de marzo; Lote 5 el 16 de marzo; Lote 6 el 30 de marzo). También se efectuaron reuniones sobre geotecnia (Lote 2 el 4 de marzo) y actas modificatorias (Lote 1 el 30 de marzo).

Gestión Financiera y de Costos

Una actividad crítica fue la revisión y trámite de las actas de costos:

- Revisión y Observaciones: Se emitieron observaciones técnicas a las actas de diversos lotes para asegurar su correcta presentación (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5).
- Remisión a INVIAS: Tras su validación, se enviaron a la entidad contratante las actas aprobadas (Lote 1 el 10 y 11 de marzo; Lote 2 el 11 y 30 de marzo; Lote 4 el 31 de marzo).

Revisión Técnica de Entregables (Volúmenes)

La Interventoría evaluó la calidad de los productos de la Consultoría:

- Observaciones Técnicas: Se realizaron correcciones a informes de diagnóstico, cartografía, geología e hidrología (Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 5).
- Validación de Metodologías: Se aprobaron metodologías de geotecnia y topografía (Lote 1, Lote 4) y se brindaron lineamientos para los volúmenes de los Lotes 2 y 6.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

- Componente Social: Se revisaron informes y documentos de socialización de todos los lotes, solicitando ajustes en las piezas informativas y metodologías de campo, según requerimiento.

Gestión Contractual y de Personal

Se supervisó el cumplimiento de las condiciones administrativas del contrato:

- Aprobación de Personal: Se aprobaron cambios de directores de Consultoría (Lote 1 y Lote 2) y del Ingeniero Residente del Lote 6. En el Lote 4, se desistió de la solicitud de cambio de director tras recibir justificaciones del Consultor para su permanencia en la Consultoría.
- Garantías y Seguros: Se realizó el seguimiento al cargue y corrección de pólizas de cumplimiento en SECOP II, especialmente para los Lotes 4 y 6.
- Prórrogas y Suspensiones: Se aprobó una prórroga de 30 días para el Lote 5 y se gestionaron consultas sobre la eventual suspensión del Lote 6 para definir alcances técnicos.
- Incumplimientos: En el Lote 4, se emitió un informe de presunto incumplimiento parcial el 5 de marzo de 2026, debido a retrasos en el inicio de labores de campo, no entrega a tiempo de documentos y falta de un plan de contingencia acorde con la ejecución y entrega de volúmenes en el tiempo contractual.

Aprobación de Cotizaciones

La Interventoría autorizó la contratación de servicios especializados tras revisar propuestas económicas:

- Imágenes satelitales para el Lote 1.
- Estudios topográficos y batimétricos para el Lote 1 y Lote 6.
- Monitoreos ambientales para el Lote 5

5.3. Informes de especialistas y profesionales

En anexo, se presentan el informe del Director de Interventoría, Coordinador de Interventoría y de los Ingenieros de campo y estudios, y auxiliar. Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2026.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Para el presente periodo No Aplica

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p>INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

5.5. Informe matriz de riesgos.

Para el presente periodo No Aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

6 REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Figure 62 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-5																														
			VERSION 1																														
			PAGINA 1																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 24/03/2026 (Día / Mes / Año)																															
DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A																																	
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-26		PROYECTO: Estudios y Diseños para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional																															
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025		INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. (ONCEP S.A.S.)																															
CONTRATO DE OBRA No. 1914-2025/1915-2025/1892-2025/1882-2025/1957-2025/1968-2025		CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL/ CONSORCIO NAVEGABILIDAD/CONSORCIO VIA FLUVIAL/ TORRES Y ASOCIADOS S.A.S./CONSORCIO MNE/CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY																															
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	N/A																																
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= L																																	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																	
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectivo). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																	
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																	
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																	
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma Nombre: Ricardo Cigollo Ponce Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL </div> <div> Firma Nombre: Patricia Ines Morales Padron Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL </div> </div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	

 <p>CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.</p>	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	 <p>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

A continuación, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Figura 64 MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

		<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>				<p>CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-9 VERSIÓN: 1 PÁGINA:</p>						
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				DIRECCIÓN TERRITORIAL:						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1992-2025				INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.						
MES INFORME MENSUAL:		16 al 31 de mayo de 2026				PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL						
CONTRATO DE OBRA No.:		1914-2025/1915-2026/1992-2025/1992-2025/1992-2025/1992-2025/1992-2025				CONTRATISTA: CONSORCIO INFERBRAN FLUVIAL CONSORCIO NAVEGABILIDAD CONSORCIO VIA FLUVIAL TORRES Y ASOCIADOS S.A.S. CONSORCIO MNE CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYECTOS						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Régimen o Propósito)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2025	837325	C-2406-0000-1-51102A-2406039-62 C-2406-0000-4-31102A-2406039-62	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000					
			10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.870.965.840	\$ 3.870.965.840					
TOTAL						\$ 3.940.965.840	\$ 3.940.965.840					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 3.940.965.840										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Anticipo		\$ 1.655.868.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.655.868.000,00	837325 del 01/12/2025	\$ 2.285.097.840,00	\$ 3.940.965.840,00		
1	16/12/2025 al 15/01/2026	\$ 52.864.200,80	\$ 10.044.198,15	\$ 62.908.398,95	\$ 26.432.100,40	\$ 36.476.298,55	\$ 1.629.435.899,60	837325 del 01/12/2025	\$ 2.248.621.541,45	\$ 3.878.057.441,05		
2	16/01/2026 al 31/01/2026	\$ 202.207.700,00	\$ 38.419.463,00	\$ 240.627.163,00	\$ 101.103.890,00	\$ 139.523.313,00	\$ 1.528.332.049,60	837325 del 01/12/2025	\$ 2.109.098.228,45	\$ 3.637.430.278,05		
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTALES		\$ 255.071.900,80	\$ 48.463.661,15	\$ 303.535.561,95	\$ 127.535.990,40	\$ 175.999.571,55	\$ 1.628.332.049,60		\$ 2.109.098.228,45	\$ 3.637.430.278,05		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$	102.855.100,80	\$	19.542.469,15	\$	122.397.569,95						
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	\$	147.900.000,00	\$	28.101.000,00	\$	176.001.000,00						
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	\$	4.316.800,00	\$	820.192,00	\$	5.136.992,00						
VALOR TOTAL	\$	255.071.900,80	\$	48.463.661,15	\$	303.535.561,95						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
<p>Firma: </p> <p>Nombre: RICARDO CODOLLO PONZE Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08205967ATL</p>						<p>Firma: </p> <p>Nombre: Patricia Ines Morales Padilla Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820544902 ATL</p>						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial												

 ONCEP S.A.S. <small>CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.</small>	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>
	INFORME MENSUAL No 4	

6.4. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 actualizado.

Figura 65 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento y seguros contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																			
			VERSIÓN 1																																																			
			PÁGINA 																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			FECHA: 16/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																			
DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS																																																			
OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.																																																						
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/06/2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 3.940.995.840,00 VALOR ACUMULADO: \$ 3.940.995.840,00 <small>(Incluye adiciones)</small> SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Patricia Ines Morales Padron																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 394.096.584,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 1.655.868.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 788.193.168,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 1.182.289.752,00</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00	Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>7</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>1</td> <td>2026</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>2031</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			16	12	2025	21	7	2026	16	12	2025	21	7	2026	16	12	2025	21	1	2029	21	1	2026	21	1	2031
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																				
Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00																																																				
Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00																																																				
VIGENCIA																																																						
Desde			Hasta																																																			
16	12	2025	21	7	2026																																																	
16	12	2025	21	7	2026																																																	
16	12	2025	21	1	2029																																																	
21	1	2026	21	1	2031																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027 Certificado de modificación o anexo No.: 2 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2025																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 394.096.584,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>50%</td> <td>\$ 1.655.868.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 788.193.168,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 1.182.289.752,00</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00	Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>12</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>1</td> <td>2026</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>2031</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			16	12	2025	31	12	2026	16	12	2025	31	12	2026	16	12	2025	30	6	2029	21	1	2026	21	1	2031
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																				
Cumplimiento	10%	\$ 394.096.584,00																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.655.868.000,00																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 788.193.168,00																																																				
Calidad del servicio	30%	\$ 1.182.289.752,00																																																				
VIGENCIA																																																						
Desde			Hasta																																																			
16	12	2025	31	12	2026																																																	
16	12	2025	31	12	2026																																																	
16	12	2025	30	6	2029																																																	
21	1	2026	21	1	2031																																																	

	<p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p> <p align="center">INFORME MENSUAL No 4</p>	
---	---	---

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-13	VERSION 1
		PÁGINA	
		FECHA	16/01/2026 (Día / Mes / Año)
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027 Certificado de modificación o anexo No.: 3 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:			
OBSERVACIONES:			
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran). <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="313 829 706 942"> Firma Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820205667ATL </div> <div data-bbox="836 829 1177 942"> Firma Nombre: Patricia Ines Morales Padron Supervisor Contrato de Interventoría Matricula Profesional No.: 0820254802 ATL </div> </div>			

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de Interventoría. Para el presente informe se entrega el seguimiento a la inversión del anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1

A continuación, se presenta el formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 plan de inversión del anticipo.

6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, no aplica para el periodo

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones por Lote de acuerdo al avance de actividades y cumplimientos para el período comprendido de 1-31 marzo 2026:

Lote 1 – Consorcio Inprobrain Fluvial

Conclusiones

- El proyecto presenta un avance físico acorde con lo programado (20.8%), evidenciando cumplimiento del cronograma a la fecha.
- Se ha realizado una adecuada dinámica de seguimiento, reflejada en lo tratado en los comités técnicos.
- Persisten limitaciones administrativas y financieras, particularmente en relación con el desembolso del anticipo y la gestión de actas de costos.
- Se evidencia cumplimiento en la entrega de productos técnicos iniciales y gestión ante entidades.

Recomendaciones

- Gestionar de manera prioritaria ante la entidad contratante el desembolso del anticipo, dada su incidencia en la ejecución.
- Fortalecer la gestión administrativa y de flujo de información, especialmente en la presentación acertada de las actas de costos.
- Mantener la periodicidad de los comités, incorporando seguimiento a riesgos críticos.

Lote 2 – Consorcio Navegabilidad

Conclusiones

- Se evidencia cumplimiento en la gestión administrativa y contractual, incluyendo reportes e interacción con la Interventoría.
- El componente social presenta un adecuado desarrollo inicial, con identificación de condiciones territoriales relevantes.
- Los trabajos de campo para el componente de geotecnia fueron ejecutados.
- El proyecto muestra un avance técnico significativo, con productos aprobados y actividades de campo finalizadas.
- Se identifican condiciones externas (niveles del río, minería no autorizada) que pueden incidir en fases posteriores.

Recomendaciones

- Incorporar en la planeación técnica los factores territoriales identificados en socializaciones.
- Asegurar la oportuna atención de observaciones a los volúmenes en ajuste.
- Consolidar los resultados de campo en los productos técnicos, garantizando coherencia entre componentes.
- Mantener articulación interinstitucional para la gestión de riesgos externos.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Lote 3 – Consorcio Vía Fluvial

Conclusiones

- Se registra un avance importante en actividades de campo, con ejecución total de perforaciones.
- Los estudios técnicos presentan progreso sostenido, con entrega de productos clave en varios hitos.
- Se evidencia avance en componentes sociales y de diagnóstico, aunque algunos productos se encuentran en proceso.
- La ausencia de información base confiable en ciertos componentes (hidrología e hidráulica) representa un riesgo técnico relevante.
- Existen actividades de campo pendientes por ejecutar (líneas sísmicas).

Recomendaciones

- Priorizar la finalización de actividades pendientes de campo, evitando afectaciones al cronograma.
- Fortalecer los análisis técnicos ante la falta de información secundaria confiable.
- Asegurar la integración de resultados de laboratorio en los productos finales.
- Mantener seguimiento en la entrega oportuna de volúmenes en revisión.

Lote 4 – Torres y Asociados S.A.S.

Conclusiones

- Se evidencia ejecución de actividades técnicas conforme al alcance, especialmente en topografía y geotecnia.
- El componente geotécnico presenta avance diferenciado entre frentes de trabajo Hito I Unguía y el Hito II Pavasá.
- Se desarrollaron acciones iniciales en los componentes social y ambiental.
- Factores externos como el orden público (17-23 marzo de 2026) y condiciones climáticas han generado afectaciones logísticas.

Recomendaciones

- Implementar estrategias que mitiguen los riesgos logísticos asociados al orden público.
- Optimizar la planificación de actividades en campo, considerando variables climáticas.
- Asegurar la continuidad del componente geotécnico en Pavasá hasta su finalización.
- Fortalecer el desarrollo de los componentes social y ambiental en paralelo a lo técnico.

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

Lote 5 – Consorcio MNF

Conclusiones

- Se logró la culminación de las actividades de campo, cumpliendo con el alcance previsto.
- Se evidencia una adecuada producción de entregables técnicos, con radicación de múltiples volúmenes.
- La gestión administrativa y de seguimiento presenta cumplimiento en reportes y solicitudes contractuales.
- El componente social se desarrolló de manera articulada con las comunidades.
- Se cuenta con información técnica suficiente para avanzar en la entrega de volúmenes.

Recomendaciones

- Priorizar la revisión y aprobación de los volúmenes entregados para evitar reprocesos.
- Garantizar la integración de la información de campo en los diseños a presentar.
- Mantener la trazabilidad y control de calidad de la información recopilada.
- Continuar con la articulación social para facilitar la implementación futura.

Lote 6 – Consorcio Navegabilidad Projesy

Conclusiones

- Se evidencia cumplimiento en la gestión administrativa y documental del contrato.
- La visita técnica permitió identificar patologías estructurales y riesgos geotécnicos e hidráulicos relevantes.
- Se han realizado ajustes metodológicos que permiten el inicio formal de actividades técnicas.
- El Consultor debe presentar un plan de contingencia y cronograma ajustado acorde con la fecha de finalización del contrato (30 abril 2026).

Recomendaciones

- Formular e implementar de manera inmediata el Plan de Contingencia solicitado.
- Priorizar los estudios geotécnicos y estructurales detallados, teniendo en cuenta los hallazgos.
- Asegurar la coordinación institucional para evitar traslapes entre proyectos.
- Establecer un plan de trabajo ajustado que permita optimizar el tiempo restante de ejecución.

Durante el presente periodo se presentaron 4 informes semanales que se relacionan a continuación:

Tabla 24 listado informes semanales de Interventoría para el período comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Lote No.	1 al 6
No. Semana	Período
12	Del 27/02/2026 al 05/03/2026
13	Del 06/03/2026 al 12/03/2026
14	Del 13/03/2026 al 19/03/2026
15	Del 20/03/2026 al 26/03/2026
16	Del 27/03/2026 al 02/04/2026

8 ANEXOS

8.1 ANEXO RELACION DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta la relación de la correspondencia enviada y recibida por Lote durante el período comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026.

Lote 1

Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 1.

LOTE 1			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
CIF-OP-2025-1914-087	2/03/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-030-2026 - Respuesta a la comunicación CIF-OP-2025-1914-086 LOTE 1.
CIF-OP-2025-1914-088	2/03/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-031-2026 - Respuesta a la comunicación CIF-OP-2025-1914-086 LOTE 1.
CIF-OP-2025-1914-089	2/03/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-02-2027 - Solicitud informe semanal No.11.
MAIL	3/03/2026	CONCEP SAS	ACTAS DE COSTOS No.1 y No.2 LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-090	3/03/2026	CONCEP SAS	Acta de modificación No.2 Contrato de Consultoría No1914 de 2025- Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-091	3/03/2026	CONCEP SAS	Actualización metodología geotecnia - Lote 1
MAIL	4/03/2026	CONCEP SAS	Ajuste informe semanal No. 10
CIF-OP-2025-1914-092	4/03/2026	CONCEP SAS	Actualización Cronograma de trabajo - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-093	13/03/2026	CONCEP SAS	Solicitud ajuste al plan de exploración y metodología del trabajo geotécnica muelles Lote 1
CIF-OP-2025-1914-100	5/03/2026	CONCEP SAS	Remisión informe mensual No.3 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-101	5/03/2026	CONCEP SAS	remision acta de costos 3
CIF-OP-2025-1914-102	6/03/2026	CONCEP SAS	informe semanal No. 11
MAIL	6/03/2026	CONCEP SAS	Ajuste informe semanal No.11 y No.12 - LOTE 1
MAIL	8/03/2026	INVIAS - CONCEP	RV: URGENTE: Consulta sobre jurisdicción para la aplicación de retenciones de ICA - LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-103	9/03/2026	CONCEP SAS	Cambio Director
CIF-OP-2025-1914-104	9/03/2026	CONCEP SAS	Acta de modificación No.2 Contrato de Consultoría No1914 de 2025- Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-105	9/03/2026	CONCEP SAS	Actualización Cronograma de trabajo V3 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-106	10/03/2026	CONCEP SAS	Remisión de informes - Visitas de campo mes de febrero 2026.
CIF-OP-2025-1914-107	10/03/2026	CONCEP SAS	Remisión Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales.
CIF-OP-2025-1914-108	11/03/2026	CONCEP SAS	Cotizaciones topografía - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-109	12/03/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-33-2026 - Observación a Informe de visitas de campo -Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-110	13/03/2026	CONCEP SAS	Remisión informe semanal No.13 - Lote 1.
MAIL	13/03/2026	CONCEP SAS	ACTA DE COSTOS No. 3 Ajustada LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-112	19/03/2026	CONCEP SAS	Cotizaciones geotecnia - Lote 1
CIF-OP-2025-1914-113	20/03/2026	CONCEP SAS	Remisión informe semanal No.14 - Lote 1.
MAIL	20/03/2026	CONCEP SAS	ACTAS DE COSTO AJUSTADAS No. 1, No. 2 y No. 3 - Lote 1
CIF-OP-2025-1914-114	26/03/2026	corporacion para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazonico - CDA	Solicitud de lineamientos para uso de madera en infraestructura fluvial - criterios de sostenibilidad ambiental
CIF-OP-2025-1914-116	27/03/2026	CONCEP SAS	Remision informe semanal No. 15
CIF-OP-2025-1914-117	27/03/2026	CONCEP SAS	Solicitud de suspensión Contrato de Consultoría No. 1914 de 2025 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-118	30/03/2026	CONCEP SAS	Observaciones acta de costos No.3 Lote 1
CIF-OP-2025-1914-119	30/03/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-0352026 - Observaciones acta de costos No.3 Lote 1

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1.

LOTE 1			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
II-871-L1-032	9/03/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-032-2026 Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-103. Cambio director de consultoría
II-871-L1-033	10/03/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Observación a Informe de visitas de campo -Lote 1.
II-871-L1-034	17/03/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-034-2026 Cotizaciones del estudio cartográfico, topográfico y batimétrico del Lote 1
II-871-L1-035	27/03/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Observaciones al acta de costos No. 3 Lote 1
II-871-L1-036	31/03/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-036-2026 Muelle Pucarán y Taraira - Lote 1
II-871-L1-037	31/03/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-037-2026 Aprobación Acta de Modificación de costos No. 2 - Redistribución de costos sin afectación del valor contractual. Lote 1

Lote 2

Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2.

LOTE 2			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
CN-1915-2025-070	3/03/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-036-2026 Observaciones actas de Costo 1 y 2
CN-1915-2025-071	4/03/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-071 Programación exploración geotécnica
CN-1915-2025-072	9/03/2027	CONCEP SAS	CN-1915-2025-072. Su comunicación II-871-L2-042-2026 Metodología geotecnia
CN-1915-2025-073	10/03/2027	CONCEP SAS	LOTE 2. CN-1915-2025-073 Solicitud de cambio de profesional auxiliar
MAIL	10/03/2026	CONCEP SAS	11-03-26 Gmail - LOTE 2. Atención Oficio II-871-L2-041-2026 observaciones Acta de costos No 2
CN-1915-2025-074	11/03/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-074 Su comunicación II-871-L2-039-2026 Volumen II. Estudio Topográfico y Batimétrico
CN-1915-2025-075	13/03/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-044-2026 Observaciones al acta de costos No. 3
CN-1915-2025-076	13/03/2026	INVIAS	Reiteración solicitud de desembolso del anticipo del contrato.
CN-1915-2025-077	16/03/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-077 Su comunicación II-871-L2-035-2026 Volumen VI Estudio de Transporte, Hito 1, 2 y 3
CN-1915-2025-078	18/03/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-045-2026 Informe socialización - Lote 2
CN-1915-2025-079	19/03/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-079 Informe de aforos sólidos
CN-1915-2025-080	19/03/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-080 Su comunicación II-871-L2-046-2026
CN-1915-2025-081	26/03/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-081 Su comunicación II-871-L2-050-2026 Solicitud cambio director de consultoría
CN-1915-2025-082	31/03/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-081 Sus comunicaciones II-871-L2-052-2026 y II-871-L2-053-2026 Observaciones Volumen VI, Hito I y II.

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2.

LOTE 2			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
L2-034	11/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-034-2026 Respuesta Oficio CN-1915-2025-073 Solicitud de cambio de profesional auxiliar - Lote 2
L2-035	24/02/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-035-2026 Volumen VI, Hito 1,2 y 3
L2-036	25/02/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-036-2026 Observaciones al acta de costos No. 1 y No. 2 - Lote 2
L2-037	25/02/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-037-2026 Solicitud de Presentación metodología para el Volumen IV - Estudio de Geotecnia - Lote 2
L2-038	25/02/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-038-2026 Respuesta Oficio CN-1915-2025-062 - Lote 2
L2-039	26/02/2026	Consortio Navegabilidad	OFICIO II-871-L2-039-2026 Observaciones al oficio CN-1915-2025-057 - Volumen II Estudio cartografico, topografico - hito III sector cacahual - Lote 2
L2-040	26/02/2026	Consortio Navegabilidad	OFICIO II-871-L2-040-2026 Solicitud informe semanal No. 11 - Lote 2
L2-041	27/02/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-041-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-066 - Lote 2
MAIL	3/02/2026	Consortio Navegabilidad	LOTE 2 - SOLICITUD ACCESO REUNION PRESENCIAL 4 DE MARZO
L2-042	6/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-855-L2-042-2026 Compilación de documentos de metodología Geotécnica - Lote 2
L2-044	12/03/2026	Consortio Navegabilidad	Observaciones al acta de costos No. 3 Lote 2
L2-045	16/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-045-2026 Informe socialización - Lote 2
L2-046	16/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-046-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-075 - Lote 2
L2-047	18/03/2026	Consortio Navegabilidad	Respuesta cotización sísmica
L2-048	19/03/2026	Consortio Navegabilidad	Observaciones al Volumen II, Hito III, sector de Cacahual V1
L2-049	20/03/2026	Consortio Navegabilidad	Respuesta a solicitud
L2-050	20/03/2026	Consortio Navegabilidad	Solicitud cambio de director de Consultoría a Cto. 1915 de 2025. - Lote 2
L2-051	27/03/2026	Consortio Navegabilidad	Lote 2 - Oficio II-871-L2-051-2026 Respuesta Oficio CN-1915-2025-081 - Lote 2
L2-052	27/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-052-2026 Volumen VI- Hito I - Transporte de pasajeros y carga muelle La Guadalupe - Lote 2
L2-053	27/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-053-2026 Volumen VI- Hito II - ESTUDIOS DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACION DE LA EMBARCACION TIPO - Lote 2
L2-054	31/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-054-2026 VOLUMEN II. INFORME CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO - HITO 1 - CACAUAL V1 - Lote 2
L2-055	31/03/2026	Consortio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-055-2026 Presentación informe de resultados de aforos sólidos - Lote 2

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 3

Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3.

LOTE 3			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
MAIL	3/03/2026	CONCEP	Documentos Socialización Mapiripana
MAIL	3/03/2026	CONCEP	Lista de Asistentes reunion con la subdirectora el proximo miercoles 4 de marzo a las 10 a.m
FLU3-CE-034-2026	3/03/2026	CONCEP	Respuesta Oficio II-871-L3-028-2026 Solicitud Cronograma Lote 3 - Hito I, II, III.
MAIL	3/03/2026	CONCEP	RE: Contrato 1892 de 2025 - Lote 3 - Oficio II-871-L3-033-2026 Observaciones a las actas No. 1 y No. 2 - Lote 3 enviado por: ingeplan.co
MAIL	9/03/2026	CONCEP	RE: Contrato 1892 de 2025 - Lote 3 - Oficio II-871-L3-038-2026 Solicitud respuesta entidades ambientales - Lote 3
FLU3-CE-035-2026	9/03/2026	CONCEP	Respuesta Oficio II-871-L3-035-2026 Solicitud Cronograma Estudios Geotécnicos y Trabajos de Campo líneas Geoelectricas y/o Geo sísmicas.
FLU3-CE-036	10/03/2026	CONCEP	Respuesta INCUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL No. 2
FLU3-CE-036	11/03/2026	CONCEP	Respuesta al oficio II-871-L3-037-2026 Observaciones a documentos socialización muelle de Mapiripana.
FLU3-CE-039	13/03/2026	CONCEP	entrega volumen I
FLU3-CE-043	24/03/2026	MINISTERIO DEL INTERIOR	Remisión de Anexo 1- Solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para la ejecución de proyectos, obras o actividades Muelles Mapiripana, Morichal y Papunaua.
FLU3-CE-044	18/03/2026	CONCEP	Afectación al equilibrio económico del contrato y perjuicios al consorcio derivados de la no gestión oportuna y desembolso del anticipo contractual
FLU3-CE-044	20/03/2026	CONCEP	Entrega Volumen V - ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL EN MAPIRIPANA, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA. HITO I - MAPIRIPANA.
FLU3-CE-045-2026	24/03/2026	CONCEP	espuesta a su oficio II-871-L3-041-2026 de fecha 19 de marzo de 2026. - Respuesta a comunicación FLU3-CE-044-2026 - Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico y observaciones al trámite del anticipo - Lote 3.
FLU3-CE-046	26/03/2026	CONCEP	FLU3-CE-046-2026- Entrega Volumen III - ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA HITO II- MORICHAL
FLU3-CE-047	31/03/2026	CONCEP	Entrega Volumen III - ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA HITO III- PAPUNAHUA.
FLU3-CE-048	31/03/2026	instituto colombiano de antropologia	Solicitud de concepto de Obligatoriedad de Programa de Arqueología Preventiva
FLU3-CE-049	31/03/2026	instituto colombiano de antropologia	Solicitud de concepto de Obligatoriedad de Programa de Arqueología Preventiva
FLU3-CE-050	31/03/2026	instituto colombiano de antropologia	Solicitud de concepto de Obligatoriedad de Programa de Arqueología Preventiva. - HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PAPUNAHUA - CONTRATO CONSULTORÍA No. 1892 de 2025

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3.

LOTE 3			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
II-871-L3-032	3/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Aprobación acta de modificación de costos contrato 1892-2025 Lote 3
MAIL	23/02/2026	CONCEP	RE: FLU3-CE-021-2026- Visita a Morichal - Papunaua
II-871-L3-033	26/02/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-033-2026 Observaciones a las actas No. 1 y No. 2 - Lote 3
II-871-L3-034	26/02/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	OFICIO II-871-L3-034-2026 Solicitud informe semanal No. 11 - Lote 3
II-871-L3-035	5/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Solicitud programa de campo estudios geotecnicos - Lote 3
II-871-L3-036	5/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-036-2026 Solicitud de resultado estudios Topográficos y Batimétricos - LOTE 3
II-871-L3-037	5/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-037-2026 Observaciones a documentos socializacion Mapiripana - Lote 3
II-871-L3-038	9/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-038-2026 Solicitud respuesta entidades ambientales - Lote 3
II-871-L3-040	12/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-040-2026 Observaciones a las actas de costos No. 2 del contrato de consultoría 1892-2025 - Lote 3
II-871-L3-040	26/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-040-2026 Respuesta a comunicación FLU3-CE-045-2026 Lote 3
II-871-L3-041	19/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-041-2026 Respuesta a comunicación FLU3-CE-044-2026 – Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico y observaciones al trámite del anticipo – Lote 3
II-871-L3-042	26/03/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-042-2026 Remisión oficio FLU-3-CE-045-2026 Lote 3
II-871-L3-044	27/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-L3-044-2026 Respuesta Radicado No. 2026S-VBOG-017264 - Actas de costos Contrato de Consultoría No. 1982 de 2025 - Lote 3

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 4

Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4.

LOTE 4			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
CST- INV – 0039	2/03/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0039 Cronograma ajustado.
MAIL	5/03/2026	CONCEP SAS	Re: Contrato 1882 de 2025 Lote 4 - Oficio II-871-L4-0013-2026 Solicitud anticipo contrato 18982-2025. Lote 4
Oficio CST- INV – 0042	5/03/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0042 Presentación Plan de Contingencia
Oficio CST- INV – 0043	5/03/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0043 Informe semana N°11
Oficio CST- INV – 0044	12/03/2026	CONCEP SAS	Cambio director de consultoria
Oficio CST- INV – 0045	12/03/2026	CONCEP SAS	Informe mensual N°1
Oficio CST- INV – 0046	16/03/2026	CONCEP SAS	Remisión del Programa de Inversiones en formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
Oficio CST- INV – 0047	17/03/2026	CONCEP SAS	Remisión de actas de costos para revisión
MAIL	17/03/2026	CONCEP SAS	Reenvio Oficio CST-036 Presentación social y pieza informativa
MAIL	18/03/2026	CONCEP SAS	Re: Subsanación Póliza que ampare la prórroga 1
MAIL	18/03/2026	CONCEP SAS	Re: Contrato 1882 de 2025 - Lote 4 - Oficio II-871-L4-047 Observaciones presentación social y pieza informativa hito 2 - Lote 4
MAIL	19/03/2026	CONCEP SAS	Contrato 1882 de 2025 - Lote 4 corroborar information del paro armado miércoles 17 de marzo 2026
Oficio CST- INV – 0048	20/03/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0048 Remisión de radicados – Consulta previa Preliminares

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4.

LOTE 4			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
II-871-L4-038	3/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-038-2026 Solicitud de Cambio de Director de Consultoría - LOTE 4
II-871-L4-039	3/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-039-2026 Solicitud Plan de Contingencia - LOTE 4
II-871-L4-040	5/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Formato plan de inversion del anticipo
II-871-L4-041	05-0326	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-041-2026 Requerimiento por incumplimiento en la presentación del plan de contingencia
II-871-L4-042	6/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Observaciones solicitud de Anticipo Lote 4
II-871-L4-043	9/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-043-2026 Cronograma actualizado - Lote 4
II-871-L4-044	12/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-044-2026 Respuesta oficio solicitud cambio de director de consultoría - Lote 4
II-871-L4-045	12/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-045-2026 Observaciones a Informe Mensual No. 1 - Lote 4
II-871-L4-046	17/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-046 Observaciones presentación social y pieza informativa hito 1 - Lote 4
II-871-L4-047	17/03/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-047 Observaciones presentación social y pieza informativa hito 2 - Lote 4
II-871-L4-048	26/03/2024	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-048-2026 Respuesta radicado No. 2026S-VBOG-017265 - Actas de costos Contrato Consultoría No. 1982 de 2025 - Lote 4

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Lote 5

Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5.

CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
CINP-573-056-0767	4/03/2026	CONCEP SAS	Remisión Volumen II – Geología y morfología – Lote 5, Hitos I y II. (ES VOLUMEN III)
CINP-573-057-0767	5/03/2026	CONCEP SAS	Informe semanal No. 11 consultoría
CINP-573-058-0786	6/03/2026	CONCEP SAS	Informe mensual No. 2
CINP-573-059-0791	6/03/2026	CONCEP SAS	Acta de costos No. 3 - Consultoría
CINP-573-060-0815	9/03/2026	CONCEP SAS	Remision de informe - Socialización en los municipios de Solita y Solano
CINP-573-061-0830	9/03/2026	CONCEP SAS	REMISION INFORME - Socializacion en los municipio de Solita y solano Hitos I y II
MAIL	11/03/2026	CONCEP SAS	REMISION INFORME - Socializacion en los municipio de Solita y solano Hitos I y II (AJUSTADO)
CINP-573-062	10/03/2026	INVIAS	Comunicación informativa - mesa de concertación del municipio de Solano.
CINP-573-063-0878	11/03/2026	CONCEP SAS	Remisión Volumen II – Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico – Lote 5, Hitos I y II.
CINP-573-064	12/03/2026	CONCEP SAS	informe semanal No. 12 consultoria
CINP-573-065-0894	12/03/2026	INVIAS	Solicitud Desembolso Anticipo – Lote 5
CINP-573-066	16/03/2026	CONCEP SAS	Remisión de documentos ajustados – Volumen I (Hitos I y II) – Oficio II-871-L5-017-2026
MAIL	18/03/2026	CONCEP SAS	SPI - ACTA DE COSTOS 1 DIC-2025 & ACTA DE COSTOS 2 ENE-2026 CTO 1957-2025 CONSORCIO MNF NIT:902008875-6 RP 816825970; RECURSO 10; VALOR ACTA DE COSTOS 1 DIC-2025 \$0 & VALOR ACTA DE COSTOS 2 ENE-2026 \$62.128.842,00
CINP-573-067-0950	19/03/2026	CONCEP SAS	Remisión Volumen VI – Estudio de transporte, pasajeros y/o carga y Caracterización de la embarcación tipo– Lote 5, Hitos I y II.
CINP-573-068	19/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-068-0951 - Informe semanal No. 13
CINP-573-069-0973	19/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-069-0973 - Cotizaciones Monitoreos
CINP-573-070-0978	19/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-070-0978 - Certificados de laboratorios
CINP-573-071-1024	25/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-071-1024 - Solicitud Prórroga No. 2
CINP-573-072-1058	27/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-072-1058 - Volumen IX - Diseño arquitectónico Hitos I y II
CINP-573-073-1064	27/03/2026	CONCEP SAS	Remisión de documentos ajustados – Volumen I (Hitos I y II) – Oficio II - 871-L5-019-2026
CINP-573-074-1063	27/03/2026	CONCEP SAS	Respuesta a observaciones – Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico – Lote 5, Hitos I y II.
CINP-573-075-1078	27/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-075-1078 - Solicitud primer giro anticipo
CINP-573-076-1077	27/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-076-1077 - Informe semanal No. 14
CINP-573-077-1096	30/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-077-1096 - Remision de Volumen III ajustado
CINP-573-079-1104	31/03/2026	CONCEP SAS	CINP-573-079-1104 - Remisión de Volumen V Hidrología e Hidráulica

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5.

LOTE 5			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
II-871-L5-016	9/03/2026	CONSORCIO MNF	Oficio II-871-L5-016-2026 Presentación de la socialización - Lote 5
II-871-L5-017	11/03/2026	CONSORCIO MNF	Oficio II-871-L5-017-2026 Observaciones Volumen I
II-871-L5-018	11/03/2026	CONSORCIO MNF	Oficio II-871-L5-018-2026 Estudio de geología y geomorfología - Volumen III - Lote 5
MAIL	16/03/2026	CONSORCIO MNF	Observaciones LOTE 5 / CINP-573-060-0815 - Socializaciones Solita & Solano
II-871-L5-019	18/03/2026	CONSORCIO MNF	Respuesta oficio CINP-573-066-0921. Observaciones Volumen I Lote 5
II-871-L5-019	18/03/2026	CONSORCIO MNF	Oficio II-871-L5-019-2026 Respuesta Oficio CINP-573-066-0921. Observaciones Volumen I Lote 5
II-871-L5-020	24/03/2026	CONSORCIO MNF	Presupuesto cotizaciones monitoreos ambientales - Lote 5

Lote 6

Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6.

LOTE 6			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO POR:	CONCEPTO
II-871-L6-032	3/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Solicitud de presencia Director de consultoría en comités - LOTE 6
II-871-L6-033	6/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Lineamientos para la elaboracion de metodologías - Volúmenes II y IV - Lote 6
II-871-L6-035	11/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Oficio II-871-L6-035-2026 Aprobación cotización trabajos de batimetría - Lote 6
II-871-L6-036	13/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Oficio II-871-L6-036-2026 Respuesta a oficio OF-25C-CONS-0044-26 Solicitud cambio de Ingeniero Residente-Lote 6
II-871-L6-038	19/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Oficio II-871-L6-038-2026 Respuesta al oficio OF-25C08-CONS-040-2025 Lote 6
II-871-L6-039	19/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Oficio II-871-L6-039-2026 Respuesta oficios OF-25C08-CONS-0045-26 y OF-25C08-CONS-0048-26 - Solicitud de formalización de eventual suspensión contractual
II-871-L6-040	20/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Actas de reunion y grabacion de comites - Lote 6
II-871-L6-041	27/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Oficio II-871-L6-041-2026 Respuesta observaciones actas de comite 1 al 8

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6.

LOTE 6			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO POR:	CONCEPTO
OF-25C08-CONS-0032	2/03/2026	CONCEP	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 10 y 11
OF-25C08-CONS-0033	3/03/2026	CONCEP	ENTREGA DE PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN LA TOLA
OF-25C08-CONS-0034	3/03/2026	CONCEP	Respuesta Oficio II-871-L6-032-2026 Solicitud de presencia Director de Consultoría en comités.
OF-25C08-CONS-0035	4/03/2026	CONCEP	RESPUESTA OFICIO II-871-L6-030-2026 - OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS 1Y 2
OF-25C08-CONS-0036	4/03/2026	CONCEP	ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
OF-25C08-CONS-0037	4/03/2026	CONCEP	Recordatorio - Pendiente aprobación Metodología Volumen II y Volumen IV Actualizado
OF-25C08-CONS-0038	4/03/2026	CONCEP	Respuesta Oficio II-871-L6-031-2026: Desistimiento del anticipo
OF-25C08-CONS-0039	5/03/2026	CONCEP	Solicitud de remisión de Acta y grabación - Comité del 3 de marzo de 2026
OF-25C08-CONS-0040	5/03/2026	CONCEP	Alcance contractual de los estudios y diseños para obras de protección - infraestructura existente en el municipio de La Tola (Nariño)
OF-25C08-CONS-0041	6/03/2026	CONCEP	Entrega acta de costos No3.
OF-25C08-CONS-0042	10/03/2026	CONCEP	Entrega cotizaciones trabajos batimetria
OF-25C08-CONS-0043	11/03/2026		Informe mensual 2
OF-25C08-CONS-0044	11/03/2026	CONCEP	Solicitud cambio de director
OF-25C08-CONS-0045	11/03/2026	INVIAS	Solicitud de formalización y fundamentos de eventual suspensión contractual
OF-25C08-CONS-0046	13/03/2026	CONCEP	Entrega soportes de Hv ingeniero residente.
OF-25C08-CONS-0047	12/03/2026	CONCEP	Entrega soportes de Hv ingeniero residente.
OF-25C08-CONS-0048	13/03/2026	CONCEP	Reiteración respuesta de oficio OF-25C08-CONS-0040-26, cual tiene por asunto Alcance contractual de los estudios y diseños para obras de protección - infraestructura existente en el municipio de La Tola (Nariño)
OF-25C08-CONS-0049	20/03/2026	CONCEP	Reiteración Solicitud de remisión de Acta y grabación de Comité según oficios 25C08-CONS-0034-26 y OF-25C08-CONS-0034-26
OF-25C08-CONS-0050	20/03/2026	CONCEP	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 13 y 14
OF-25C08-CONS-0051	24/03/2026	CONCEP	OBSERVACIONES ACTAS DE COMITÉ DEL TAL 8
OF-25C08-CONS-0052	30/03/2026	CONCEP	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - ESTADO DE AVANCE EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN PARA FACTURACIÓN DE LAS ACTAS DE COSTOS No. 2Y No. 3

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Interventoría

Relación de correspondencia recibida de INVIAS.

INTERVENTORIA			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
MAIL	3/03/2026	CONCEP	RV: NUEVOS LINEAMIENTOS DE ACTAS DE COSTOS, ANTICIPOS Y DESEMBOLSOS
MAIL	03-03-026	CONCEP	Fwd: Remisión de presunto incumplimiento parcial
MAIL	04-03-027	CONCEP	Fwd: Remisión de presunto incumplimiento parcial
2026I-VBOG-009306	4/03/2026	CONCEP	Solicitud de subsanación del Informe de Presunto incumplimiento Contrato de Consultoría N° 1882 de 2025. Radicado Nro. 2026I-VBOG-006739 de fecha
2026S-VBOG-011243	5/03/2026	CONCEP	Aclaración y alcance respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-001785 Aprobación de Hojas de vida de CMA-DTE-SPI-046-2025- respuesta oficio II-869 INT-001-2025- contrato 1922 de 2025
2026S-VBOG-011281	5/03/2026	CONCEP	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-001791 respuesta II-871-INT-002-2025
2026S-VBOG-014066	13/03/2026	CONCEP	Respuesta los radicados 2026E-VUVRAZ-022249 - 2026E-VUVRAZ-022250 - 2026E-VUVRAZ-022254 - 2026E-VUVRAZ-022248 - 2026E-VUVRAZ-
2026S-VBOG-015042	17/03/2026	CONCEP	Solicitud remisión concepto técnico especializado en geotecnia y geología a hitos 2 y 3 - Puerto Colombia y Cacahual (Lote2)
MAIL	17/03/2026	CONCEP	RE: SPI- ACTA COSTOS 02 16 DE ENERO 2026 - 31 ENERO 2026 CTO 1914-2025 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL NIT. 902.008.292-2, RP 835925; RECURSO 10; VALOR \$2.932.226.232,00
MAIL	17/03/2026	CONCEP	RE: SPI- ACTA COSTOS 01 16 DE DICIEMBRE 2025 - 15 ENERO 2026 CTO 1914-2025 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL NIT. 902.008.292-2, RP 835925; RECURSO 10; VALOR \$2.932.226.232,00
MAIL	17/03/2026	CONCEP	RE: SPI- ACTA COSTOS 01 y 02 DICIEMBRE DE 2024 CTO 1968-2025 CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJES Y NIT. 902.007.863-3 RP 837525; RECURSO 10; VALOR \$934.498.770,00
MAIL	17/03/2026	CONCEP	DEVOLUCION ACTA DE COSTOS LOTES 1-6
MAIL	17/03/2026	CONCEP	RE: ACTA DE COSTOS No. 3 ajustada LOTE 1
MAIL	17/03/2026	CONCEP	RV: LOTE 2. SPI-ACTA COSTOS 3 FEBRERO 2026 CTO_1915-2025 CONSORCIO NAVEGABILIDAD NIT 902.008.983-3 RP 834125; RECURSO 10
MAIL	17/03/2026	CONCEP	RV: LOTE 2. CN-1915-2025-075 Su comunicación II-871-L2-044-2026 Observaciones al acta de costos
MAIL	18/03/2026	CONCEP	RE: Solicitud urgente de desembolso del anticipo y sus implicaciones en la ejecución del contrato.
2026S-VBOG-016081	19/03/2026	CONCEP	Documentación Necesaria para Solicitudes de Desistimiento de Anticipo
2026S-VBOG-016082	19/03/2026	CONCEP	Respuesta al radicado 2026E-VUVRAZ-025717 Aprobación Hoja de vida de CMADTE-SPI-046-2025- Oficio II-871-INT-041-2026
2026S-VBOG-016114	19/03/2026	CONCEP	Respuesta a Oficio No. II-871-INT-039-2026
2026S-VBOG-016509	20/03/2026	CONCEP	Solicitud de cambio director de Consultoría Cto No. 1915 de 2025 (LOTES 2)
2026S-VBOG-016527	20/03/2026	CONCEP	Solicitud remisión Cronograma Administrativo
2026S-VBOG-016531	20/03/2026	CONCEP	Solicitud Actas de Socialización
2026S-VBOG-017264	24/03/2026	CONCEP	Solicitud remisión actas de costos Cto No. 1892/2025 - Lote 3
2026S-VBOG-017265	24/03/2026	CONCEP	Reiteración solicitud presentación actas de costos Cto No. 1882/2025 - LOTE 4
2026S-VBOG-017269	24/03/2026	CONCEP	Solicitud Remisión Actas de Comité

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	
	INFORME MENSUAL No 4	

Relación de correspondencia enviada a INVIAS.

INTERVENTORIA			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-871-INT-027	5/03/2026	INVIAS	Desistimiento anticipo lote 6
II-871-INT-028	6/03/2026	INVIAS	Remisión oficio OF-CONS-0040-26 - Lote 6
II-871-INT-029	9/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-029-2026 Solicitud de aprobación del personal profesional social
II-871-INT-030	9/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-030-2026 Solicitud aprobación del personal Ingenieros de Campo y Oficina
II-871-INT-032	10/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-032-2026 Solicitud aprobación Geólogo José Castro Bolívar
II-871-INT-033	9/03/2026	INVIAS	ficio II-871-INT-033-2026 Solicitud de aprobación del personal Auxiliar Administrativo
II-871-INT-034	9/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-034-2026 Solicitud aprobación Especialista Hidráulica e Hidrología
II-871-INT-036	9/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-036-2026 Propuesta Socialización La Tola - Lote 6
II-871-INT-037	10/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-037-2026 Modificación del personal y dedicación
II-871-INT-038	10/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-038-2026 Información de la renuncia del personal
II-871-INT-039	12/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-039-2026. Oficio OF-25C08-CONS-0045-26 del consultor lote 6
II-871-INT-040	12/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-040-2026 Solicitud aprobación personal Social
II-871-INT-041	17/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-041-2026 Solicitud aprobación de personal - INTERVENTORIA
II-871-INT-042	18/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-042-2026 Respuesta concepto técnico en geotecnia y geología a hito 2 y 3 Lote 2
II-871-INT-043	19/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-043-2026 Respuesta a su comunicación 2026S-VBOG-015042
MAIL INTERNO	19/03/2026	INVIAS	Re: LOTE 5 / CINP-573-063-0878 - Volumen II - estudio topografico, cartografico y batimetrico
II-871-INT-044-2026	19/03/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-044-2026 Documentacion necesaria para solicitud de desistimiento
II-871-INT-045	21/03/2026	INVIAS	Respuesta Solicitud remisión cronograma administrativo.
II-871-INT-046	27/03/2026	INVIAS	Respuesta a la solicitud del radicado 2026S-VBOG-016531
II-871-INT-047	31/03/2026	INVIAS	Respuesta a la solicitud del radicado 2026S-VBOG-017269
II-871-INT-048	31/03/2026	INVIAS	Remisión presentación socialización Lote 4 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS

	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL</p>	
	<p>INFORME MENSUAL No 4</p>	

8.2 INFORMES SEMANALES

8.3 INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DEL COORDINADOR Y DE LOS INGENIEROS RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS, Y DEL INGENIERO AUXILIAR.

8.4 PRESENTACIÓN COMITES DE SEGUIMIENTO
