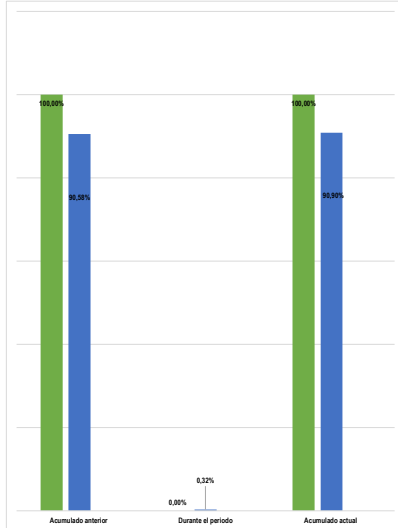
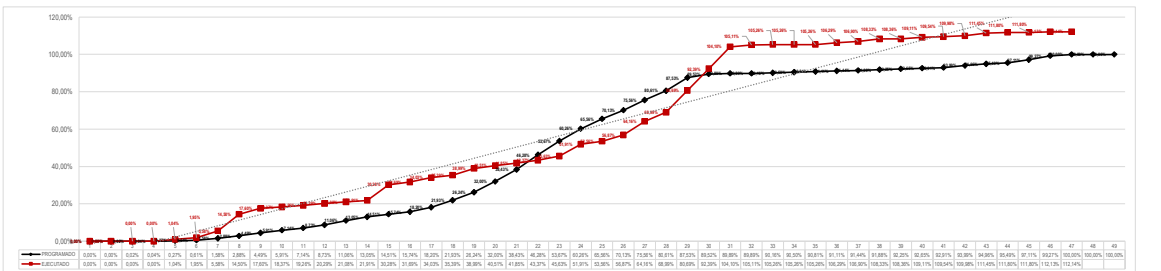


<div><div><div>PROBINTEC S.A.S.</div></div><div><div>CONTRATO DE OBRA</div><div>INFORME SEMANAL No. 50</div></div></div> <div><div>CO1.PCCNTR.8155350</div><div>LOTE COP No.18</div></div> <div><div><div>SECRETARIA DE EDUCACION</div></div><div><div>BOGOTA</div></div></div>		SEMANA N° 50 DEL 14/09/2026 AL 20/09/2026		Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 días																	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8188831		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N° CO1.PCCNTR.8155350		LOTE COP 18																	
Número del contrato																					
CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA																					
CONTRATISTA R.L. del consorcio CONTRATO N°		CONSORCIO EDUCATIVO 26 DAYANNA ALEXANDRA BAQUERO AGUILAR CO1.PCCNTR.8188831		PROBINTEC S.A.S DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ CO1.PCCNTR.8188831																	
OBJETO		"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 18																	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.551.797.666,00		\$ 796.276.938,00																	
AÑO		\$ 31,17%		\$ 139.526.698,00																	
COSTO DIRECTO		\$ 1.795.365.305,15		\$ 739.947.737,00																	
OFERTADO		\$ 2.322.866.467,00		\$ 178.451.454,00																	
EMERGENCIAS		\$ 100.000.000,00		\$ 1.333.296.788,00																	
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		\$ 2.422.866.467,00																			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		\$ 128.932.199,00																			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		\$ 2.551.797.666,00																			
Valor adicional No. 1:		\$ 645.761.648,00																			
Valor inicial No. 1 - emergencias:		\$ 265.092.000,00																			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		\$ 480.769.648,00																			
Valor adicional No. 2:		\$ 461.696.965,00																			
Valor inicial No. 2 - emergencias:		\$ 265.092.000,00																			
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:		\$ 261.688.965,00																			
Valor adicional No. 3:		\$ 310.000.000,00																			
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:		\$ 310.000.000,00																			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		\$ 3.969.259.269,00																			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		\$ 938.932.199,00																			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		\$ 3.030.327.070,00																			
PLAZO INICIAL		SETE (07) MESES		SETE (07) MESES																	
PLAZO ADICIONAL No. 01		CUATRO (04) MESES		CUATRO (04) MESES																	
PLAZO ADICIONAL No. 02		CUATRO (04) MESES		CUATRO (04) MESES																	
PLAZO ADICIONAL No. 03		TRES (3) MESES Y 25 DIAS		TRES (3) MESES Y 25 DIAS																	
PLAZO TOTAL		QUINCE (15) MESES		QUINCE (15) MESES																	
FECHA DE INICIACIÓN		31/03/2025		31/03/2025																	
FECHA DE TERMINACIÓN		20/09/2026		20/09/2026																	
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2		31/12/2026		31/12/2026																	
AVANCE DEL CONTRATO																					
Obra Programada (%)		SEMANAL 100,00%		SEMANAL 0,32%																	
Valor de la Obra Programada:		\$ 0,00		\$ 938.932.199,00																	
Obra Física Ejecutada (%)		ACUMULADO 100,00%		ACUMULADO 90,90%																	
Valor de la Obra Ejecutada:		\$ 3.969.259.269,00		\$ 3.608.011.147,56																	
GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO																					
SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACION DE OBRA																					
<table><tr><th></th><th>% PROGRAMADO</th><th>% EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>100,00%</td><td>90,90%</td><td></td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>0,00%</td><td>0,32%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>100,00%</td><td>90,90%</td><td></td></tr></table> 							% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	100,00%	90,90%		Durante el periodo	0,00%	0,32%	0,00%	Acumulado actual	100,00%	90,90%	
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA																		
Acumulado anterior	100,00%	90,90%																			
Durante el periodo	0,00%	0,32%	0,00%																		
Acumulado actual	100,00%	90,90%																			
NOTA: El alcance de la emergencia y/o obra prioritaria en Torquigua ha cambiado, al igual que el frente contractual se la adición N°1. Antonio Villavicencio - Sede B. Como resultado, los porcentajes han sufrido una variación.																					
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS — SEMANA 50																					
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		VALOR TOTAL OBRAS EMERGENCIA / PRIORITARIAS																	
50,84%		\$ 477.314.053,17		\$ 938.932.199,00																	
SALDO POR EJECUTAR		\$ 461.618.145,83		BOLSA DISPONIBLE (SIN ASIGNAR)																	
				\$ 202.063.091,37																	
AVANCE FINANCIERO																					
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		\$ 3.969.259.269,00		INDICADOR FINANCIERO																	
VALOR PARCIAL N°1		\$ 401.759.151,00		VALOR FACTURADO																	
VALOR PARCIAL N°2		\$ 392.655.364,00		\$ 3.339.246.968,00																	
VALOR PARCIAL N°3		\$ 419.080.656,00		VALOR PENDIENTE POR FACTURAR																	
VALOR PARCIAL N°4		\$ 335.248.214,00																			
VALOR PARCIAL N°5		\$ 340.158.088,00																			
VALOR PARCIAL N°6		\$ 962.858.748,00																			
VALOR PARCIAL N°7		\$ 267.388.536,00																			
VALOR PARCIAL N°8		\$ 220.148.211,00																			
TOTAL VALOR FACTURADO		\$ 3.339.246.968,00																			
SOMAS IGUALES		\$ 630.012.301,00																			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO																					
INDICADOR TECNICO		% AVANCE PROGRAMADO		INDICADOR TIEMPO (DIAS)																	
		100,00%		457																	
		% AVANCE EJECUTADO		RETRASO																	
		90,90%		0,00																	
		% RETRASO -																			
		0,00%																			
		% ADELANTO +																			
CURVA S																					
																					
SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA																					

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2026	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
2	SEM 2	21/10/2026	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
3	SEM 3	28/10/2026	\$ 452.000,00	0.02%	0.00%	\$ -	\$ 452.000,00	0.02%	\$ 452.000,00	0.00%	\$ -
4	SEM 4	4/11/2026	\$ 726.000,00	0.03%	0.00%	\$ -	\$ 726.000,00	0.04%	\$ 1.178.000,00	0.00%	\$ -
5	SEM 5	11/11/2026	\$ 6.389.251,00	0.23%	1.04%	\$ 29.416.873,00	\$ 23.027.622,00	0.27%	\$ 7.567.251,00	1.04%	\$ 29.416.873,00
6	SEM 6	18/11/2026	\$ 9.620.826,00	0.34%	0.91%	\$ 25.779.255,00	\$ 16.158.429,00	0.61%	\$ 17.188.077,00	1.95%	\$ 55.196.128,00
7	SEM 7	25/11/2026	\$ 27.550.191,00	0.98%	3.63%	\$ 102.559.453,00	\$ 75.009.262,00	1.58%	\$ 44.738.268,00	5.58%	\$ 157.755.581,00
8	SEM 8	2/12/2026	\$ 36.491.532,00	1.29%	8.91%	\$ 251.731.418,00	\$ 215.239.886,00	2.88%	\$ 81.229.800,00	14.50%	\$ 409.486.999,00
9	SEM 9	9/12/2026	\$ 45.682.077,00	1.62%	3.10%	\$ 87.572.933,00	\$ 41.890.856,00	4.49%	\$ 126.911.877,00	17.60%	\$ 497.059.932,00
10	SEM 10	16/12/2026	\$ 39.901.460,00	1.41%	0.77%	\$ 21.793.589,00	\$ 18.107.871,00	5.91%	\$ 166.813.337,00	18.37%	\$ 518.853.521,00
11	SEM 11	23/12/2026	\$ 34.900.709,00	1.24%	0.89%	\$ 25.093.898,00	\$ 9.806.811,00	7.14%	\$ 201.714.046,00	19.26%	\$ 543.947.419,00
12	SEM 12	30/12/2026	\$ 44.803.303,00	1.59%	1.03%	\$ 29.099.062,00	\$ 15.704.241,00	8.73%	\$ 246.517.349,00	20.29%	\$ 573.046.481,00
13	SEM 13	6/01/2027	\$ 65.790.932,00	2.33%	0.79%	\$ 22.343.565,00	\$ 43.447.367,00	11.06%	\$ 312.308.281,00	21.08%	\$ 595.390.046,00
14	SEM 14	13/01/2027	\$ 56.247.989,00	1.99%	0.83%	\$ 23.469.005,00	\$ 32.778.984,00	13.05%	\$ 368.556.270,00	21.91%	\$ 618.859.051,00
15	SEM 15	20/01/2027	\$ 41.234.728,00	1.46%	8.37%	\$ 236.488.719,00	\$ 195.253.991,00	14.51%	\$ 409.790.998,00	30.28%	\$ 855.347.770,00
16	SEM 16	27/01/2027	\$ 34.958.790,00	1.24%	1.41%	\$ 39.956.792,00	\$ 4.998.002,00	15.74%	\$ 444.749.788,00	31.69%	\$ 895.304.562,00
17	SEM 17	3/02/2027	\$ 69.362.324,00	2.46%	2.34%	\$ 66.086.806,00	\$ 3.275.518,00	18.20%	\$ 514.112.112,00	34.03%	\$ 961.391.368,00
18	SEM 18	10/02/2027	\$ 105.342.386,00	3.73%	1.36%	\$ 38.340.595,00	\$ 67.001.791,00	21.93%	\$ 619.454.498,00	35.39%	\$ 999.731.963,00
19	SEM 19	17/02/2027	\$ 121.849.038,00	4.31%	3.60%	\$ 101.726.291,00	\$ 20.122.747,00	26.24%	\$ 741.303.536,00	38.99%	\$ 1.101.458.254,00
20	SEM 20	24/02/2027	\$ 162.551.206	5.75%	1.52%	\$ 42.982.940,00	\$ 119.568.266,00	32.00%	\$ 903.854.742,00	40.51%	\$ 1.144.441.194,00
21	SEM 21	3/03/2027	\$ 181.799.979,00	6.44%	1.34%	\$ 37.731.200,00	\$ 144.068.779,00	38.43%	\$ 1.085.654.721,00	41.85%	\$ 1.182.172.394,00
22	SEM 22	10/03/2027	\$ 221.633.716	7.85%	1.52%	\$ 42.847.295,00	\$ 178.786.421,00	46.28%	\$ 1.307.288.437,00	43.37%	\$ 1.225.019.689,00
23	SEM 23	17/03/2027	\$ 208.747.364	7.39%	2.26%	\$ 63.951.186,00	\$ 144.796.178,00	53.67%	\$ 1.516.035.801,00	45.63%	\$ 1.288.970.875,00
24	SEM 24	24/03/2027	\$ 186.145.269	6.59%	6.28%	\$ 177.464.542,00	\$ 8.680.727,00	60.26%	\$ 1.702.181.070,00	51.91%	\$ 1.466.435.417,00
25	SEM 25	31/03/2027	\$ 149.758.087	5.30%	1.65%	\$ 46.684.366,00	\$ 103.073.721,00	65.56%	\$ 1.851.939.157,00	53.56%	\$ 1.513.119.783,00
26	SEM 26	7/04/2027	\$ 129.089.554	4.57%	3.31%	\$ 93.368.732,00	\$ 35.720.822,00	70.13%	\$ 1.981.028.711,00	56.87%	\$ 1.606.488.515,00
27	SEM 27	14/04/2027	\$ 153.455.255	5.43%	7.29%	\$ 205.922.820,00	\$ 52.467.565,00	75.56%	\$ 2.134.483.966,00	64.16%	\$ 1.812.411.335,00
28	SEM 28	21/04/2027	\$ 142.675.377	5.05%	4.83%	\$ 136.535.783,00	\$ 6.139.594,00	80.61%	\$ 2.277.159.343,00	68.99%	\$ 1.948.947.118,00
29	SEM 29	28/04/2027	\$ 195.438.873	6.92%	11.70%	\$ 330.548.693,00	\$ 135.109.820,00	87.53%	\$ 2.472.598.216,00	80.69%	\$ 2.279.495.811,00
30	SEM 30	5/05/2027	\$ 56.148.389	1.99%	11.70%	\$ 330.548.693,00	\$ 274.400.304,00	89.52%	\$ 2.528.746.605,00	92.39%	\$ 2.610.044.504,00
31	SEM 31	12/05/2027	\$ 10.449.797	0.37%	11.70%	\$ 330.548.693,00	\$ 320.098.896,00	89.89%	\$ 2.539.196.402,00	104.10%	\$ 2.940.593.197,00
32	SEM 32	19/05/2027	\$ -	0.00%	1.01%	\$ 28.542.222,29	\$ 28.542.222,29	89.89%	\$ 2.539.196.402,00	105.11%	\$ 2.969.135.419,29
33	SEM 33	26/05/2027	\$ 7.610.997,19	0.27%	0.15%	\$ 4.238.766,24	\$ 3.372.230,95	90.16%	\$ 2.546.807.399,19	105.26%	\$ 2.973.374.185,53
34	SEM 34	2/06/2027	\$ 9.768.829,83	0.35%	0.00%	\$ 77.556,48	\$ 9.691.273,35	90.50%	\$ 2.556.576.229,02	105.26%	\$ 2.973.451.742,01
35	SEM 35	9/06/2027	\$ 8.748.496,46	0.31%	0.00%	\$ 77.556,48	\$ 8.670.939,98	90.81%	\$ 2.565.324.725,48	105.26%	\$ 2.973.529.298,49
36	SEM 36	16/06/2027	\$ 8.435.451,79	0.30%	1.03%	\$ 29.141.324,08	\$ 20.705.872,29	91.11%	\$ 2.573.760.177,27	106.29%	\$ 3.002.670.622,57
37	SEM 37	23/06/2027	\$ 9.377.523,99	0.33%	0.60%	\$ 17.088.844,05	\$ 7.711.320,06	91.44%	\$ 2.583.137.701,26	106.90%	\$ 3.019.759.466,62
38	SEM 38	30/06/2027	\$ 12.438.524,11	0.44%	1.44%	\$ 40.567.420,99	\$ 28.128.896,88	91.88%	\$ 2.595.576.225,37	108.33%	\$ 3.060.326.887,61
39	SEM 39	7/07/2027	\$ 10.342.404,12	0.37%	0.03%	\$ 759.662,73	\$ 9.582.741,39	92.25%	\$ 2.605.918.629,49	108.36%	\$ 3.061.086.550,34
40	SEM 40	14/07/2027	\$ 11.368.920,36	0.40%	0.74%	\$ 21.019.420,25	\$ 9.650.499,89	92.65%	\$ 2.617.287.549,85	109.11%	\$ 3.082.105.970,59
41	SEM 41	21/07/2027	\$ 7.414.110,12	0.26%	0.44%	\$ 12.298.490,01	\$ 4.884.379,89	92.91%	\$ 2.624.701.659,97	109.54%	\$ 3.094.404.460,60
42	SEM 42	28/07/2027	\$ 30.285.878,89	1.07%	0.44%	\$ 12.458.803,48	\$ 17.827.075,41	93.99%	\$ 2.654.987.538,86	109.98%	\$ 3.106.863.264,08
43	SEM 43	4/08/2027	\$ 27.404.109,91	0.97%	1.47%	\$ 41.599.471,97	\$ 14.195.362,06	94.96%	\$ 2.682.391.648,77	111.45%	\$ 3.148.462.736,05
44	SEM 44	11/08/2027	\$ 14.952.840,10	0.53%	0.35%	\$ 9.829.625,97	\$ 5.123.214,13	95.49%	\$ 2.697.344.488,87	111.80%	\$ 3.158.292.362,02
45	SEM 45	18/08/2027	\$ 45.762.755,02	1.62%	0.00%	\$ -	\$ 45.762.755,02	97.11%	\$ 2.743.107.243,89	111.80%	\$ 3.158.292.362,02
46	SEM 46	25/08/2027	\$ 61.169.408,68	2.17%	0.33%	\$ 9.379.500,35	\$ 51.789.908,33	99.27%	\$ 2.804.276.652,57	112.13%	\$ 3.167.671.862,37
47	SEM 47	1/09/2027	\$ 20.603.614,88	0.73%	0.01%	\$ 171.214,75	\$ 20.432.400,13	100.00%	\$ 2.824.880.267,45	112.14%	\$ 3.167.843.077,12
48	SEM 48	8/09/2027		0.00%	8.22%	\$ 11.015.255,32	\$ 11.015.255,32	100.00%	\$ 2.824.880.267,45		\$ 3.178.858.332,44
49	SEM 49	15/09/2027		0.00%	0.25%	\$ 7.037.876,04	\$ 7.037.876,04	100.00%	\$ 2.824.880.267,45		\$ 3.185.896.208,48
50	SEM 50	22/09/2027		0.00%	0.09%	\$ 2.611.527,23	\$ 2.611.527,23	100.00%	\$ 2.824.880.267,45		\$ 3.188.507.735,71
			\$ 2.824.880.267,45								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y N°S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 50LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No. 50	DEL 14/9/2026	AL 20/9/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 días
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP: 18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR			
<div>1. Actividades Técnicas: Frente de obra entregado</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se realizaron actividades de adecuación y mantenimiento en aulas, laboratorio y aula de informática, a los cuales se les realizó el cambio de cubierta. De igual manera, se efectuó el suministro e instalación de un aula modular y ejecución de carcamo en parte posterior a las aulas intervenidas.</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITÁN CORTÉS - SEDE B			
<div>1. Actividades Técnicas: Frente de obra entregado. Se realizó el desmonte de las canchas existentes, seguido de actividades de excavación, conformación de subbase y ejecución de placa de concreto. Posteriormente, se efectuaron trabajos de pintura y demarcación de la cancha, incluyendo la señalización de los juegos infantiles. De igual manera, se realizó la pintura de las fachadas de todo el bloque y se ejecutó la adecuación de un cuarto de basuras y de un espacio destinado para los guardas.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se aprueba NP del mantenimiento del portón de la sede. El contratista se encuentra realizando colizaciones</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A			
<div>1. Actividades Técnicas: N/A</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Frente de obra entregado</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el día 26 de mayo</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B			
<div>1. Actividades Técnicas: Las obras fueron ejecutadas y entregadas mediante acta de reunión al almacenista, sin registrarse novedades.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se realizó la instalación de una estructura metálica independiente para la cubierta de las aulas modulares, con el fin de independizar este bloque y garantizar el soporte de la cubierta mediante su propia estructura. Adicionalmente, se ejecutaron muros aligerados para dividir y aislar el área destinada a las aulas, así como la pintura interna de los salones. También se intervino el salón de archivo ubicado en la zona de oficinas, realizando trabajos de pintura.</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ			
<div>1. Actividades Técnicas: Se efectua capacitacion de los equipos programada</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 50LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No. 50	DEL 14/9/2026	AL 20/9/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 días
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP: 18	
(Número de Contrato)	(Número de Contrato)	(Número de Contrato)	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA			
<p>1. Actividades Técnicas: Se efectúan labores de aseo y reemboquillado de las juntas. Queda pendiente finalizar el reemboquillado y efectuar la respectiva verificación por parte de la interventoría, con el fin de contar con el aval para continuar con la aplicación del hidrófugo.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de jornadas de orden y aseo, así como actividades de reemboquillado. Se recomienda mantener las áreas de trabajo organizadas y despejadas, realizar una adecuada gestión de los residuos generados y garantizar el uso de los EPP requeridos, con el fin de prevenir incidentes y accidentes de trabajo.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos y material de construcción, por lo que se recomienda posteriormente disponer todo adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO			
<p>1. Actividades Técnicas: Frente de obra entregado</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES			
<p>* LA PALESTINA - SEDE B: Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A: Ficha SAE remitida el 04 de junio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A: Ficha SAE remitida el 08 de julio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A: Ficha SAE remitida el 15 de diciembre del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p> <p>* TABORA - SEDE A: Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.</p>			
<p>1. Actividades Técnicas:</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría</p> <p>6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)			
<p>1. Actividades Técnicas: Las puertas correspondientes a las actividades de cambio se encuentran actualmente en proceso de fabricación.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: Se ejecutaron rampas de acceso que permiten la comunicación entre la zona verde y las aulas de primera infancia, facilitando el ingreso y tránsito hacia los salones. Adicionalmente, se construyeron columnetas como elementos de soporte para las puertas de acceso a las aulas, las cuales permiten delimitar y garantizar la seguridad entre la zona verde y los espacios destinados a primera infancia.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra:</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 50 LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No. 50	DEL 14/9/2026	AL 20/9/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 días
Consecutivo	66-mm-aa	66-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP: 18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se ejecutó actividad de desmonte de puertas existentes y suministro e instalación de puertas nuevas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato)			
1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina)			
1. Actividades Técnicas: La segunda etapa incluye una intervención eléctrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: La zona fue entregada a la institucion y a la fecha no se reportan novedades			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño)			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se realizaron actividades de actividades de pintura en electrostática y suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUCILA RUBIO LA VERDE			
1. Actividades Técnicas: Las labores ya se finalizaron			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se realizó el suministro e instalación de baños portátiles como medida de contingencia ante la afectación de los baños principales de la sede			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Se realiza entrega de espacios			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución. En consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se deben instalar puntos de apoyo en los paneles fijos con el fin de darles rigidez a la estructura . De igual manera hacer correccion de boquilla y algunas piezas que se afectaron en la ejecucion de los trabajos en baños del polideportivo			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia. Se aprueba el NP 0010, por lo tanto, el contratista podra dar inicio a las actividades durante la próxima semana.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B			
1. Actividades Técnicas: Se ejecuta reemboquillado, tratamiento de juntas de dilatacion y lavado de mamposteria.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: La interventoria realizará recorridos de verificación con el fin de constatar la culminación de las labores pendientes.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se identificó que el caudal actual no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La supervisión solicita aplazar la intervención debido a aspectos presupuestales. Por lo anterior, no se realizará la intervención en la sede hasta contar con la respectiva autorización.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A			
1. Actividades Técnicas: El día 21 de agosto se realizó una reunión con los especialistas eléctricos, en la cual se revisó la necesidad de intervención de las redes eléctricas en zonas de circulación y áreas externas. Como resultado, el contratista remitirá un NP asociado al ítem de tubería metálica IMC conduiti galvanizado, requerido para la ejecución de las redes en las zonas mencionadas. Se adelantan las subsanaciones requeridas en los NP para su posterior revisión y aprobación.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: La supervisión informa que se remitirá una nueva ficha de emergencia, debido a cambios en el proceso de definición del alcance de la intervención de la sede. Por lo anterior, será necesario efectuar una nueva visita de verificación en sitio con los profesionales del área eléctrica. Se llevara a cabo una reunion con el fin de verificar el alcance de la obra en sitio. Esta convocado electrico de la SED, interventoria y obra.			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 50 LOTE COP No 18		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEMANA No. 50 Consecutivo	DEL 14/9/2026 dd-mm-aa	AL 20/9/2026 dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) LOTE COP: 18	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Se realiza el desmonte de las láminas transparentes existentes en el punto fijo de la cubierta y su reemplazo mediante el suministro e instalación de policarbonato translúcido, conservando las condiciones y características requeridas para la zona.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Las actividades se encuentran terminadas; sin embargo, se evidenció una leve filtración. El contratista realizará las reparaciones correspondientes en el marco de la garantía.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección de tanques por solicitud de la supervisión.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR			
1. Actividades Técnicas: El contratista realiza columnetas e instalación de puerta en aula No. 12, retira el cerramiento, efectúa labores de aseo			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la instalación total de las láminas de policarbonato en la pérgola. Así mismo, se identificó la permanencia de material residual de obra en la parte posterior de la institución. Se recomienda realizar su retiro oportuno y mantener el área despejada, garantizando condiciones adecuadas de orden y aseo y evitando posibles riesgos para trabajadores y comunidad educativa.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.			
5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen medio-alto), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental			
6. Generales: La supervisión dará la referencia del cable UTP requerido para la conexión de datos, con el fin de entregar a OTIC el punto de acuerdo con las especificaciones establecidas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ			
1. Actividades Técnicas: Se realizó visita conjunta con la supervisión, interventoría y obra, en la cual se definieron la ubicación y las condiciones para la instalación del cerramiento. La supervisión informó que notificará con anticipación la fecha de evacuación de los habitantes del lote, con el fin de que el contratista coordine el ingreso temprano del material y este se encuentre disponible en sitio para iniciar oportunamente la instalación del cerramiento rígido. De igual manera, se estableció la instalación de concertina sobre el cerramiento, el cual contará con dos puertas, así como la disposición de un baño y campamento.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se solicitó un esquema de intervención que incluya las respectivas fichas técnicas. Se aprueba NP 020 2026 correspondiente al cerramiento			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA - SEDE C			
1. Actividades Técnicas: Se realiza la demolición de adoquín y se efectúa alisado de piso. Se evidencia la llegada de piso que se instalará en el espacio intervenido.			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades de fundida y nivelación de alisado de piso, demolición de adoquín en el acceso al aula y trasiego de material residual de obra. Así mismo, se realizaron labores de limpieza y acopio del material proveniente de la demolición. Se recomienda garantizar el uso adecuado de los EPP requeridos, mantener las áreas de circulación despejadas y asegurar condiciones de orden y aseo durante la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir incidentes y accidentes de trabajo.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.			
5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidenció instalación de cerramiento perimetral, al igual se evidenció la llegada de material para fundir el piso, se recomienda acopiar todo el residuo adecuadamente para posteriormente disponerlo, al igual realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental			
6. Generales: N/A			
Se realizó mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervisión con el fin de unificar criterios entre las partes y así radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.			
OBSERVACION: Se actualización en la tabla de los valores unitarios de las emergencias			
ANEXOS			

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FIRMAS			
 ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA	 ING. PEDRO ENRIQUE GALENAO SANTANA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ING. LUIS EMILIO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	 ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	
 ING. GERMAIN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	 ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO	 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	
 DRA. SILVIA JULIANA BETANCUR RODRIGUEZ ASESOR JURIDICO			



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 50

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 50

Consecutivo

DEL 14/8/2026

dd-mm-aa

AL 20/9/2026

dd-mm-aa

Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CO1.PCCNTR.8168931

(Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

CO1.PCCNTR.8155350

(Número de Contrato)

LOTE COP: 18


ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Vista general del area de pergola.



Se evidencia intalacion total de lamina en policarbonato

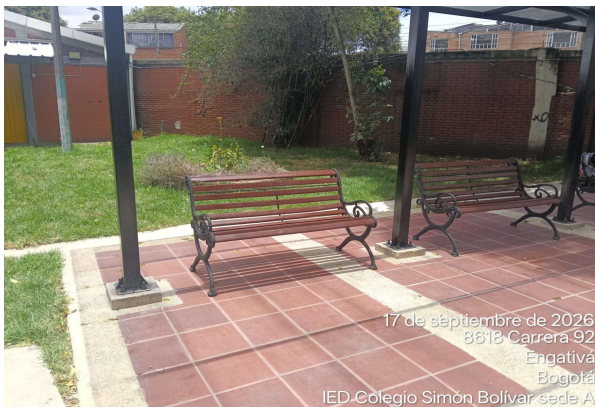

Se registra la colocacion de bancas (por parte del colegio) en zona de la pergola



Bancas sin anclar al piso



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 50

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 50

DEL 14/8/2026
dd-mm-aa

AL 20/9/2026
dd-mm-aa

Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CO1.PCCNTR.8168931
(Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

CO1.PCCNTR.8155350
(Número de Contrato)

LOTE COP: 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



En area donde se intervino el cerramiento aun se encuentran herramientas y residuos de obra.



Nivelación y ajuste de puerta en salon 12



Nivelación y ajuste de puerta en salon 12



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 50

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 36 14/8/2026 AL 20/8/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 días
Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



14 de septiembre de 2026
68b-21 Carrera 69
Engativá
Bogotá
IED Colegio República de Colombia sede B

Levantamiento total de muro en mampostería. Se ejecutó en su totalidad la fundida y desencofrado de la viga de amarre.



14 de septiembre de 2026
68-59 Carrera 69b
Engativá
Bogotá, D.C.
IED Colegio República de Colombia sede B

Reemboquillado entre muro de mampostería y viga corona.



18 de septiembre de 2026
69-41 Calle 69 Bis
Engativá
Bogotá
IED Colegio República de Colombia sede B

Revestimiento en columna para mejorar el acabado.



14 de septiembre de 2026
69-41 Calle 69 Bis
Engativá
Bogotá
IED Colegio República de Colombia sede B

Acabados de filos de columnas.



18 de septiembre de 2026
69-41 Calle 69 Bis
Engativá
Bogotá
IED Colegio República de Colombia sede B

Reemboquillados de juntas en el muro de mampostería



14 de septiembre de 2026
69-41 Calle 69 Bis
Engativá
Bogotá
IED Colegio República de Colombia sede B

Acabado superficial del concreto.



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 50

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 DEL 14/9/2026 AL 20/9/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA



Demolicion de alistado



Demolicion de alistado



Limpieza de placa base.



Demolicion de adoquin perimetral al acceso al aula.



Trasiego de material para fundida piso.



Fundida y nivelación de alistamiento de piso
