

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

CONVENIO No. 4462-2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PR6+100 SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL CRUCE TRAMO 1702 (BALALAIKA) - GUACHAVEZ, IDENTIFICADA CON CODIGO 17NR01 EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No 2

PERIODO INFORME: 01/01/2026 AL 30/04/2026

San Juan de Pasto, Abril de 2026

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO		

FECHA DE PRESENTACION:	5-may-26	CORTE	30/04/2026
------------------------	----------	-------	------------

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	/index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8347901&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets
----------------------	--

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No:	GN4462-2025 ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
----------------------------------	---

CDP DEPARTAMENTAL No.:	2025070023	FECHA:	1-jul-25	VALOR	\$ 700.000.000,00
------------------------	------------	--------	----------	-------	-------------------

REGISTRO DEPARTAMENTAL No:	2025091272	FECHA:	19-sep-25	VALOR	\$ 698.116.295,15
----------------------------	------------	--------	-----------	-------	-------------------

CDP ENTIDAD No.:	S/N	FECHA:	9-jun-25	VALOR	\$ 1.000.000,00
------------------	-----	--------	----------	-------	-----------------

REGISTRO ENTIDAD No:	N/A	FECHA:	N/A	VALOR	N/A
----------------------	-----	--------	-----	-------	-----

OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PR6+100 SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL CRUCE TRAMO 1702 (BALALAIKA) - GUACHAVEZ, IDENTIFICADA CON CODIGO 17NR01 EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
----------------------	--

CONTRATISTA CONVENIO:	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA NIT. 900652849-8 R.L. SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ CC No 5.254.419
-----------------------	--

CONTRATISTA DE CONSULTORIA:	002-2026 PROVEA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION SAS R.L HENRY DELGADO BOLAÑOS
-----------------------------	--

CONTRATISTA INTERVENTORIA:	003-2026 CONSORCIO VIAS Y OBRAS LUIS JAIME GUERRERO RUALES
----------------------------	---

SUPERVISOR:	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE Secretario de Infraestructura
-------------	---

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
---------------------------------------	------------------------------

META FISICA	1 ESTUDIO FASE TRES
-------------	---------------------

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$ 699.116.295,15
-----------------------------	-------------------

FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO:	19-sep-25
-----------------------------	-----------

APORTE DEPARTAMENTO ESTUDIOS:	\$ 614.807.657,10
-------------------------------	-------------------

APORTE DEPARTAMENTO INTERVENTORIA:	\$ 83.308.638,05
------------------------------------	------------------

APORTE DEPARTAMENTO TOTAL:	\$ 698.116.295,15
----------------------------	-------------------

APORTE ENTIDAD:	\$ 1.000.000,00
-----------------	-----------------

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:	Tres (3) Meses, contados a partir de la suscripcion de Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
-----------------------------	--

FECHA DE LEGALIZACIÓN:	11-dic-25
------------------------	-----------

FECHA DE ACTA INICIO:	1-dic-25			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31-dic-25			
FECHA MODIFICATORIO No 1:	31-dic-25			
FECHA TERMINACION MOD No 1:	30-abr-26			
ACTA RECIBO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	30-abr-26			
PORCENTAJE ANTICIPO	40% del valor total aportado por el Departamento			
TOTAL ANTICIPO	\$	279.246.518,06		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO	\$	-		
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No.:	41-44-101298059			
% AVANCE FISICO CONVENIO	% PROGRAMADO:	100,00%	% EJECUTADO:	100,00%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	100,00%	% EJECUTADO	40,00%
META FISICA A LA FECHA	1 ESTUDIO FASE TRES		% EJECUTADO	100,00%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONVENIO

ASPECTOS TÉCNICOS: El alcance del convenio comprende la ejecución de estudios y diseños para el mejoramiento del tramo vial ubicado en el cruce Balalaika - Guachavez, el cual corresponde a una de las vías de acceso del Resguardo Indígena de Guachavez, vía de acceso la cual pertenece al pueblo de los Pastos. Dicho tramo vial corresponde a la vía **1702 BALALAICA - GUACHAVEZ**, la cual se encuentra en la Vía Departamental **17NR01**. Se tiene como coordenada aproximada inicial de estudios **1°12'49.47"N - 77°40'44.69"W**. Los volúmenes técnicos a entregar son:

1. ESTUDIO TOPOGRAFÍA.
2. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
3. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL.
4. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.
5. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA DISEÑO FUNDACIONES.
6. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.
7. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA ATENDER PUNTO CRÍTICO.
8. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO GEOMÉTRICO RECTIFICACIÓN VIAL EN SECTOR INESTABLE.
9. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA DISEÑO DE PAVIMENTO.
10. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS
11. ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL.
12. ESTUDIOS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.
13. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS.
14. ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL.
15. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL.
16. ESTUDIO SOSTENIBILIDAD.
17. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES OBRA, APU, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES.
18. INFORME FINAL EJECUTIVO.

Se presenta por parte del INTIQUILLA, los productos objeto del convenio según volúmenes establecidos en los Estudios previos, los cuales entran a etapa de revisión técnica por parte de la Secretaría de Infraestructura.

ASPECTOS FINANCIEROS: Según la forma de pago establecida entre las partes, el valor total del aporte del Departamento se realizará mediante un primer desembolso en calidad de anticipo del **40%**, correspondiente a **\$ 279'246.518,06**, dicho desembolso se realizó según Comprobante de Egreso No. **2026001605** del **12-03-2026**.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Se suscribió Acta Inicio (**01-12-2025**). Por solicitud de INTIQUILLA; se tramita el Modificadorio No **1 (31-12-2025)**, prorrogando la ejecución contractual hasta el **30-04-2026**; motivado por ampliación del tiempo en la contratación de los procesos derivados de consultoría e inventoria. Se suscribe el Acta de Recibo de Estudios y Diseños (**30-04-2026**). Dichos estudios se encuentran en etapa de revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura.

ASPECTOS LEGALES: El Convenio Interadministrativo fue legalizado por el Departamento Administrativo de Contratación **DAC** según certificado de legalización del **11-12-2025**. El Departamento Administrativo de Contratación **DAC** aprobó la ampliación de amparos respecto al Acta de Inicio y del Modificadorio No **1**. Lo anterior permitió la legalización de dicha modificación según certificado de legalización del **06-03-2026**.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe continuar con la ejecución contractual para iniciar las labores de consultoría y su posterior culminación.



Proyecto: Ing. **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**
Contratista Apoyo a la Supervisión - SID
Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura - SID
Gobernación de Nariño

4. REGISTRO PRODUCTOS



Imagen 1: Sector Crítico

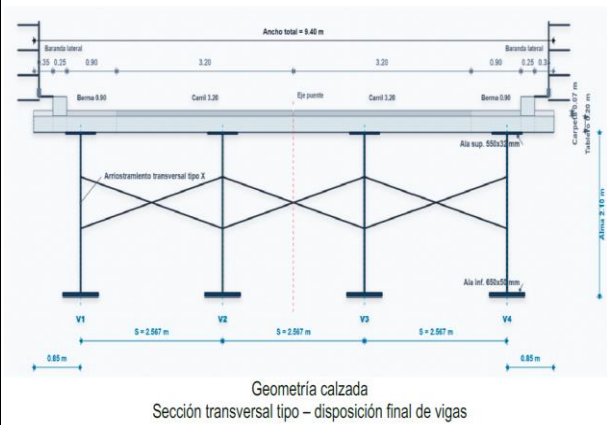


Imagen 2: Esquema Puesto Balaiaica

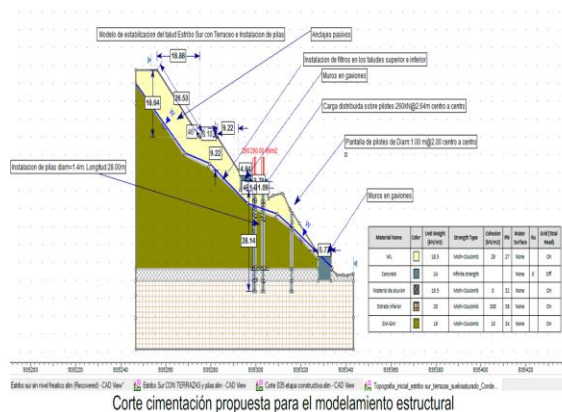


Imagen 3: Estabilización Sector Crítico

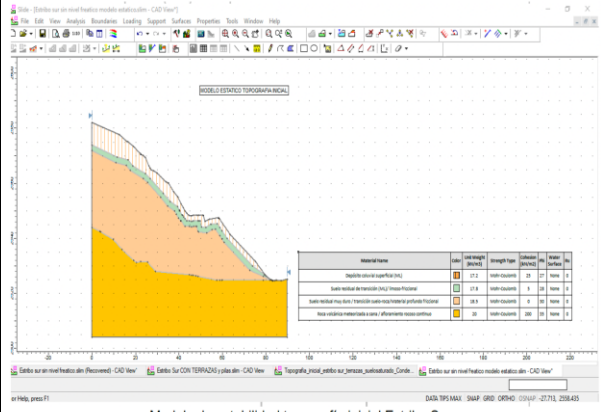


Imagen 4: Análisis Estabilidad de Taludes

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No:	GN4462-2025 ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
--------------	--

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESCUENTOS	COM EGRESO No	FECHA PAGO
ANTICIPO		\$ 279.246.518,06		\$ -	\$ 279.246.518,06	\$ 279.246.518,06	\$ -	2026001605	12/03/2026
TOTAL									

AVANCE FISICO	100,00%
AVANCE FINANCIERO	0,00%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No:	GN4462-2025 ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
---------------------	---

GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
-------------------	------------------------

PÓLIZA No:	41-44-101298059
-------------------	-----------------

AMPARO	VALOR	TIEMPO
Cumplimiento del Convenio	10% del Valor Convenio	Tiempo de ejecución del Convenio y 6 meses mas
Buen Manejo Anticipo	100% del Valor Anticipo	Termino de duracion Convenio y 6 meses mas

ANEXO 1			FECHA APROBACION	21/10/2025	FECHA EXPEDICION	6/10/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento del Convenio	\$ 69.911.629,52	10%	19-sep-25	19-jun-26	Póliza Inicial del Convenio	● 45
Buen Manejo Anticipo	\$ 279.246.518,06	100%	19-sep-25	19-jun-26	Póliza Inicial del Convenio	● 45

ANEXO 2			FECHA APROBACION	31/12/2025	FECHA EXPEDICION	26/12/2025
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento del Convenio	\$ 69.911.626,52	10%	1-dic-25	31-ago-26	Acta Inicio	● 118
Buen Manejo Anticipo	\$ 279.246.518,06	100%	1-dic-25	31-ago-26	Acta Inicio	● 118

ANEXO 3			FECHA APROBACION	18/02/2026	FECHA EXPEDICION	4/02/2026
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento del Convenio	\$ 69.911.626,52	10%	1-dic-25	30-oct-26	Modificadorio No 1	● 178
Buen Manejo Anticipo	\$ 279.246.518,06	100%	1-dic-25	30-oct-26	Modificadorio No 1	● 178

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO		Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS		
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS		Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION		Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION

CONVENIO No.:	GN4462-2025 ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
---------------	--

CAP.	ACTIVIDAD	DETALLE - ACTIVIDADES	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	VOLUMEN I	ESTUDIO TOPOGRAFIA	\$ 38.982.369,56	\$ 38.982.369,56	\$ 38.982.369,56	\$ -	100,00%
2	VOLUMEN II	ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA	\$ 31.046.672,90	\$ 31.046.672,90	\$ 31.046.672,90	\$ -	100,00%
3	VOLUMEN III	ESTUDIO HIDROGEOLOGIA LOCAL	\$ 26.285.254,91	\$ 26.285.254,91	\$ 26.285.254,91	\$ -	100,00%
4	VOLUMEN IV	ESTUDIO ESTABILIDAD TALUDES	\$ 65.963.738,21	\$ 65.963.738,21	\$ 65.963.738,21	\$ -	100,00%
5	VOLUMEN V	ESTUDIO DE GEOTECNIA ESTRUCTURAS	\$ 23.110.976,24	\$ 23.110.976,24	\$ 23.110.976,24	\$ -	100,00%
6	VOLUMEN VI	ESTUDIO DE HIDRAULICA Y SOCAVACION	\$ 32.633.812,23	\$ 32.633.812,23	\$ 32.633.812,23	\$ -	100,00%
7	VOLUMEN VII	ESTUDIO ALTERNATIVAS	\$ 38.982.369,56	\$ 38.982.369,56	\$ 38.982.369,56	\$ -	100,00%
8	VOLUMEN VIII	ESTUDIO DISEÑO GEOMETRICO	\$ 38.982.369,56	\$ 38.982.369,56	\$ 38.982.369,56	\$ -	100,00%
9	VOLUMEN IX	ESTUDIO GEOTECNIA PAVIMENTOS	\$ 42.156.648,23	\$ 42.156.648,23	\$ 42.156.648,23	\$ -	100,00%
10	VOLUMEN X	ESTUDIO PAVIMENTOS	\$ 26.285.254,91	\$ 26.285.254,91	\$ 26.285.254,91	\$ -	100,00%
11	VOLUMEN XI	ESTUDIO SEÑALIZACION	\$ 7.239.582,92	\$ 7.239.582,92	\$ 7.239.582,92	\$ -	100,00%
12	VOLUMEN XII	ESTUDIO ESTRUCTURAS	\$ 32.633.812,23	\$ 32.633.812,23	\$ 32.633.812,23	\$ -	100,00%
13	VOLUMEN XIII	ESTUDIO GESTION DEL RIESGO	\$ 26.285.254,91	\$ 26.285.254,91	\$ 26.285.254,91	\$ -	100,00%
14	VOLUMEN XIV	ESTUDIO AMBIENTAL	\$ 69.138.016,87	\$ 69.138.016,87	\$ 69.138.016,87	\$ -	100,00%
15	VOLUMEN XV	ESTUDIO GESTION PREDIAL	\$ 43.743.787,56	\$ 43.743.787,56	\$ 43.743.787,56	\$ -	100,00%
16	VOLUMEN XVI	ESTUDIO SOSTENIBILIDAD	\$ 7.239.582,92	\$ 7.239.582,92	\$ 7.239.582,92	\$ -	100,00%
17	VOLUMEN XVII	ESTUDIO PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES	\$ 32.633.812,23	\$ 32.633.812,23	\$ 32.633.812,23	\$ -	100,00%
18	VOLUMEN XVIII	INFORME FINAL	\$ 31.464.341,15	\$ 31.464.341,15	\$ 31.464.341,15	\$ -	100,00%
19	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$ 84.308.638,05	\$ 84.308.638,05	\$ 84.308.638,05	\$ -	100,00%
20		COSTO TOTAL	\$ 699.116.295,15	\$ 699.116.295,15	\$ 499.726.133,24	\$ 199.390.161,91	71,48%

