



CONSORCIO CI 2026
NIT 902.092.335-8
DG 51 15 A 161 KM 12 VIA BELLO
Tel: 6044000000
Bello - Colombia
info@consorcioci2026.com



Factura electrónica de venta
No. FECI 2

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			Fecha y hora Factura	
NIT	901.387.801-2	Teléfono	(604) 4801300 - (000) 3206700136	Generación	24/09/2026, 16:35
Dirección	CL 35 SUR 40 35	Ciudad	Envigado - Colombia	Expedición	24/09/2026, 16:59
				Vencimiento	09/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 02 - CONTRATO SERVICIOS AU DESUR CONTRATO: Desur- # IP-204-2026	1.00	2,812,503,116.00
2	AU ACTA 02 - CONTRATO SERVICIOS AU	1.00	685,125,759.00



Al Contable Radicado 2026-1300-012828-R lo: 120192
Fecha: 2025-09-28 08:01
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSORCIO CI 2026
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0



Total items: 2

Valor en Letras:

Tres mil cuatrocientos noventa y siete millones seiscientos veintiocho mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-09 por \$ 3,497,628,875.00

Observaciones:

CONTRATO: IP-204-2026

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la Adecuación y Mejoramiento a la malla vial en diferentes sitios del municipio de Envigado, en cumplimiento al acta de Ejecución N°10 del convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24.

EJECUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2026. AU (24.36%).

FAVOR CONSIGNAR A CUENTA AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA
No. 0550039400086292 A NOMBRE DEL CONSORCIO CI 2026 Nit. 902.092.335-8.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764113801909 aprobado en 20260809 prefijo FECI desde el número 1 al

100 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 937a55870d6513d132cd838c6114537075bd21063a6b1f509cb72b084c6c382f27753ab63c79d48bccac2ebd3e270ed

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo S&S - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siglo Hub, Firma electrónica: ver en el XML

Contributo al:

[illegible]

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	151
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026					ACTA DE OBRA N°:		2			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.					PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre			
CONTRATANTE:		DESUR					CONTRATO DE OBRA:		DESUR-IP-204-2026			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026					MUNICIPIO:		ENVIGADO			
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S										
CAPITULO:	1	RETIROS Y DEMOLICIONES					UNIDAD:	m²	CANTIDAD CORTE:	553,80		
ÍTEM:	1.3.2	Demolición de pavimento espesor entre 5 a 10 cm, incluye transporte a sitio de acopio.							CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	553,80		
ACTA #1			ACTA #2	553,80		ACTA #3		ACTA #4		ACTA #5		
ELEMENTO		LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL			FOTO	
DEMOLICION @		LA MINA 1 PR0+000 AL PR0+035 CD		35,00	3,48		1,00	121,80				
DEMOLICION @		LA MINA 1 PR0+000 AL PR0+046 CI		46,00	3,00		1,00	138,00				
DEMOLICION @		LA MINA 1 PR0+046 AL PR0+092 CI		46,00	3,50		1,00	161,00				
DEMOLICION @		LA MINA 1 PR0+092 AL PR0+130 CI		38,00	3,50		1,00	133,00				
SUB-TOTAL						553,80						

Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

Residente de Interventoría
CONINTEC S.A.S
Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026					ACTA DE OBRA N°:		2		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.					PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre		
CONTRATANTE:		DESUR					CONTRATO DE OBRA:		DESUR-IP-204-2026		
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026					MUNICIPIO:		ENVIGADO		
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S					UNIDAD:		m³		
CAPITULO:		1									
ITEM:		1.3.3					CANTIDAD CORTE:		1.484,59		
		Fresado de pavimento asfáltico. Incluye transporte interno y disposicion final del material					CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:		1.936,18		
ACTA #1		451,59		ACTA #2		1.484,59		ACTA #3			
ACTA #4				ACTA #5							
ELEMENTO		LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO		
FRESADO ☉		LA MINA 1 PR0+130 CD		130,00	3,55	0,050	1,00	23,08			
FRESADO ☉		LA MINA 1 PR0+130 CI		130,00	3,55	0,050	1,00	23,08			
FRESADO ☉		ALTO NATURA PR0+130		130,00	6,10	0,120	1,00	95,20			
FRESADO ☉		ALTO NATURA PR140+229,4		99,40	6,13	0,120	1,00	73,13			
FRESADO ☉		LA MINA 2 PR0+146,7		146,70	3,50	0,120	1,00	61,61			
FRESADO ☉		LA MINA 2 PR0+146,7		146,70	2,95	0,120	1,00	51,97			
FRESADO ☉ 31/08/2026		LA SALLE PR0+092		92,00	7,38	0,120	1,00	81,48			
FRESADO ☉		ALTO NATURA LA LOMA PR0+140,3		140,30	6,82	0,120	1,00	114,81			
FRESADO ☉ 2/09/2026		MUA PR0+099,5		99,50	4,50	0,140	1,00	62,69			
FRESADO ☉ 3/09/2026		MUA PR0+104 CI		104,00	4,35	0,140	1,00	63,34			
FRESADO ☉ 7/09/2026		MUA PR0+104 CD		104,00	4,50	0,140	1,00	65,52			
FRESADO ☉ 7/09/2026		MUA PR0+024 BAHÍA		24,00	1,93	0,040	1,00	1,85			
FRESADO ☉ 8/09/2026		MUA PR0+104 CI		104,00	4,43	0,140	1,00	64,50			
FRESADO ☉ 9/09/2026		MUA PR0+024 OCHAVE		10,00	6,00	0,040	1,00	2,40			
FRESADO ☉ 10/09/2026		MUA PR0+039,1		39,10	4,50	0,140	1,00	24,63			
FRESADO ☉ 10/09/2026		MUA PR0+030		30,00	6,79	0,140	1,00	28,52			
FRESADO ☉ 10/09/2026		MUA PR0+008		8,00	4,50	0,140	1,00	5,04			
FRESADO ☉ 11/09/2026		MUA PR0+077		77,00	6,50	0,140	1,00	70,07			
FRESADO ☉ 11/09/2026		MUA PR0+09,1 OCHAVE		9,10	4,05	0,040	1,00	1,47			
FRESADO ☉ 15/09/2026		MUA PR0+052 CD		52,00	4,82	0,140	1,00	35,09			
FRESADO ☉ 15/09/2026		MUA PR0+057 CD		57,00	4,83	0,150	1,00	41,30			
FRESADO ☉ 16/09/2026		MUA PR0+052 CI		52,00	4,82	0,140	1,00	35,09			
FRESADO ☉ 16/09/2026		MUA PR0+057 CI		57,00	4,83	0,150	1,00	41,30			
FRESADO ☉ 16/09/2026		MUA PR0+013,5		13,50	4,10	0,040	1,00	2,21			
FRESADO ☉ 16/09/2026		MUA PR0+014		14,00	2,40	0,040	1,00	1,34			
FRESADO ☉ 7/09/2026		CES PR0+130 DER		130,00	4,456	0,120	1,00	69,51			
FRESADO ☉ 8/09/2026		CES PR0+160 IZQ		160,00	3,91	0,120	1,00	75,05			
FRESADO ☉ 9/09/2026		CES PR160+302 IZQ		142,00	3,55	0,120	1,00	62,25			
FRESADO ☉ 10/09/2026		CES PR0+100 IZQ - DER LEONARDO DAVINCI		100,00	5,17	0,120	1,00	74,08			
FRESADO ☉ 14/09/2026		CES PR130+302 IZQ		172,00	3,93	0,120	1,00	81,03			
FRESADO ☉ 18/09/2026		MUA PR0+076 CI AREPEPA		76,00	4,85	0,100	1,00	36,86			
FRESADO ☉ 18/09/2026		MUA PR0+032 OCHAVE		32,00	5,90	0,080	1,00	15,10			
SUB-TOTAL							1484,59				

Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

Residente de Interventoria
CONINTEC S.A.S
Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:	23 de septiembre de 2026	ACTA DE OBRA N°:	2
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.	PERIODO DE CORTE:	01 al 23 de septiembre
CONTRATANTE:	DESUR	CONTRATO DE OBRA:	DESUR-IP-204-2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO CI 2026	MUNICIPIO:	ENVIGADO
INTERVENTORIA:	CONINTEC S.A.S		
CAPITULO:	2	RETIROS Y DEMOLICIONES	
ÍTEM:	2.1.2	Excavaciones Mecánicas de 0 a 2 metros en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 1 m³, incluye transporte interno a sitio de acopio.	UNIDAD: m³
			CANTIDAD CORTE: 138,45
			CANTIDAD ACUMULADA TOTAL: 138,45

ACTA #1		ACTA #2	138,45		ACTA #3			ACTA #4		ACTA #5
ELEMENTO	LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO		
EXCAVACION @	LA MINA 1 PRO+000 AL PRO+035 CD		35,00	3,55	0,150	1,00	18,64			
EXCAVACION @	LA MINA 1 PRO+000 AL PRO+046 CI		46,00	3,55	0,150	1,00	24,50			
EXCAVACION @	LA MINA 1 PRO+035 AL PRO+102 CD		67,00	3,55	0,150	1,00	35,68			
EXCAVACION@	LA MINA 1 PRO+046 AL PRO+092 CI		46,00	3,55	0,150	1,00	24,50			
EXCAVACION @	LA MINA 1 PRO+102 AL PRO+130 CD		28,00	3,55	0,150	1,00	14,91			
EXCAVACION @	LA MINA 1 PRO+092 AL PRO+130 CI		38,00	3,55	0,150	1,00	20,24			
							0,00			
							0,00			
SUB-TOTAL						138,45				




Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

Residente de Interventoria
CONINTEC S.A.S
Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026				ACTA DE OBRA N°:		2			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.				PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre			
CONTRATANTE:		DESUR				CONTRATO DE OBRA:		DESur-IP-204-2026			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026				MUNICIPIO:		ENVIGADO			
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S									
CAPITULO:	2	EXCAVACIONES Y LLENOS				UNIDAD:	m³	CANTIDAD CORTE:	138,45		
ÍTEM:	2.1.4	CARGUE MANUAL O MECÁNICO, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las explanaciones y excavaciones. Incluye cargue con paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoria. Su medida será en sitio.						CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	138,45		
ACTA #1			ACTA #2	138,45		ACTA #3			ACTA #4		ACTA #5
ELEMENTO		LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL			FOTO
EXCAVACION ☉		LA MINA 1 PRO+000 AL PRO+035 CD		35,00	3,55	0,150	1,00	18,64			
EXCAVACION ☉		LA MINA 1 PRO+000 AL PRO+046 CI		46,00	3,55	0,150	1,00	24,50			
EXCAVACION ☉		LA MINA 1 PRO+035 AL PRO+102 CD		67,00	3,55	0,150	1,00	35,68			
EXCAVACION☉		LA MINA 1 PRO+046 AL PRO+092 CI		46,00	3,55	0,150	1,00	24,50			
EXCAVACION ☉		LA MINA 1 PRO+102 AL PRO+130 CD		28,00	3,55	0,150	1,00	14,91			
EXCAVACION ☉		LA MINA 1 PRO+092 AL PRO+130 CI		38,00	3,55	0,150	1,00	20,24			
SUB-TOTAL							138,45				

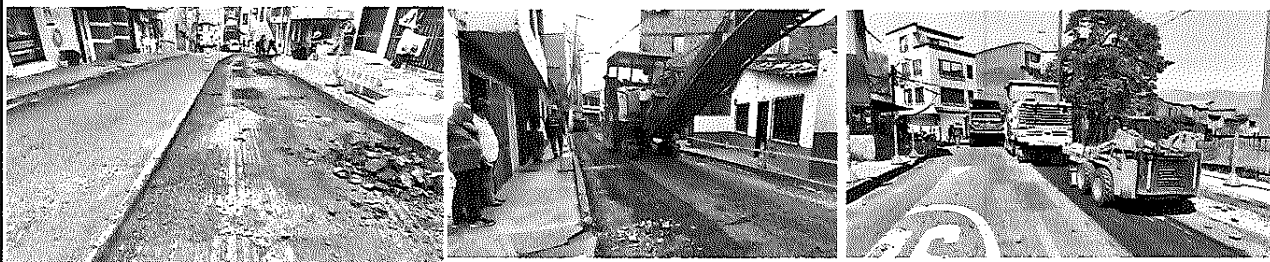


Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

Residente de Interventoria
CONINTEC S.A.S
Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026					ACTA DE OBRA N°:		2			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.					PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre			
CONTRATANTE:		DESUR					CONTRATO DE OBRA:		DESUR-IP-204-2026			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026					MUNICIPIO:		ENVIGADO			
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S										
CAPITULO:	2	EXCAVACIONES Y LLENOS					UNIDAD:	m³	CANTIDAD CORTE:	138,45		
ÍTEM:	2.2.1	Suministro, transporte e instalación de base granular NORMA INVIAS 2013, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado							CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	138,45		
ACTA #1			ACTA #2		138,45		ACTA #3			ACTA #4		ACTA #5
ELEMENTO		LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO			
BASE GRANULAR @		LA MINA PR0+000 AL PR0+035 CD		35,00	3,55	0,150	1,00	18,64				
BASE GRANULAR @		LA MINA PR0+000 AL PR0+046 CI		46,00	3,55	0,150	1,00	24,50				
BASE GRANULAR @		LA MINA PR0+035 AL PR0+102 CD		67,00	3,55	0,150	1,00	35,68				
BASE GRANULAR @		LA MINA PR0+046 AL PR0+092 CI		46,00	3,55	0,150	1,00	24,50				
BASE GRANULAR @		LA MINA PR0+102 AL PR0+130 CD		28,00	3,55	0,150	1,00	14,91				
BASE GRANULAR @		LA MINA PR0+092 AL PR0+130 CI		38,00	3,55	0,150	1,00	20,24				
								0,00				
								0,00				
SUB-TOTAL							138,45					

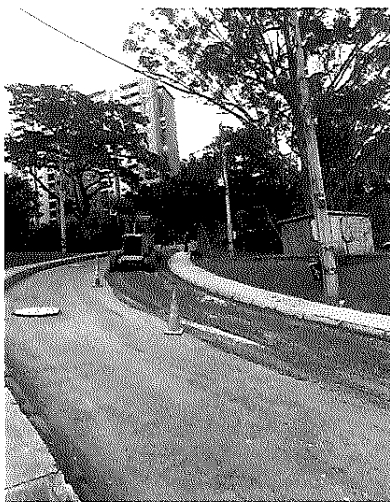

Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista


Residente de Interventoría
CONINTEC S.A.S
Interventoría


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026		ACTA DE OBRA N°:		2	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.		PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre	
CONTRATANTE:		DESUR		CONTRATO DE OBRA:		DESUR-IP-204-2026	
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026		MUNICIPIO:		ENVIGADO	
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S					
CAPITULO	6	PAVIMENTOS		UNIDAD:	m²	CANTIDAD CORTE:	141,91
ÍTEM:	6.1.5	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 + FIBRA en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.				CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	141,91


ACTA #1	ACTA #2	141,91	ACTA #3	ACTA #4	ACTA #5		
ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO
MDC-19 + FIBRA ©	LA MINA 1 PR0+000 AL PR0+130 CD	130,00	3,55	0,086	1,00	39,69	
MDC-19 + FIBRA ©	LA MINA 1 PR0+000 AL PR0+130 CI	130,00	3,55	0,086	1,00	39,69	
MDC-19 + FIBRA © 18/09/2026	MUA PR0+032 OCHAVE	32,00	5,90	0,08	1,00	15,10	
MDC-19 + FIBRA © 18/09/2026	MUA PR0+076 CI Arepepa	76,00	4,85	0,125	1,00	46,08	
MDC-19 + FIBRA © 18/09/2026	MUA PR0+05,78 Tornillos y cortes	5,78	1,58	0,08	1,00	0,73	
MDC-19 + FIBRA © 18/09/2026	MUA PR0+064 Dollarcity	6,40	1,00	0,08	1,00	0,51	
MDC-19 + FIBRA © 18/09/2026	MUA PR0+01,3 Restaurante Doña Angela	1,30	0,70	0,05	1,00	0,05	
MDC-19 + FIBRA © 18/09/2026	MUA PR0+01,40 Restaurante Doña Angela	1,40	0,90	0,05	1,00	0,06	
SUB-TOTAL						141,91	




 Residente de Obra
 CONSORCIO CI 2026
 Contratista


 Residente de Interventoría
 CONINTEC S.A.S
 Interventoría


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

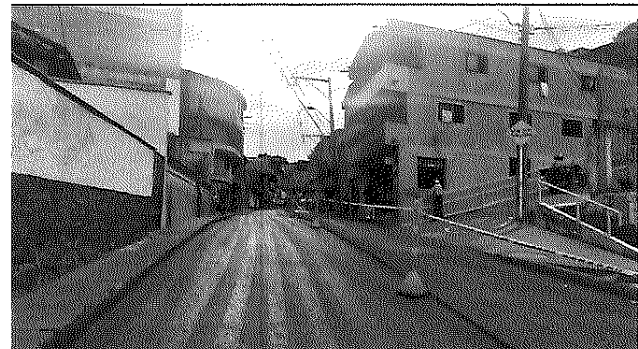FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026					ACTA DE OBRA N°:		2			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.					PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre			
CONTRATANTE:		DESUR					CONTRATO DE OBRA:		DESur-IP-204-2026			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026					MUNICIPIO:		ENVIGADO			
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S										
CAPITULO	6	PAVIMENTOS					UNIDAD:	m³	CANTIDAD CORTE:	747,67		
ITEM:	6.1.6	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MAM-25 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.							CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	747,67		
ACTA #1			ACTA #2	747,67		ACTA #3			ACTA #4			ACTA #5
ELEMENTO		LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO			
MAM-25 ©		LA MINA 2 PR0+146,7 CD		146,70	3,50	0,071	1,00	36,32				
MAM-25 ©		LA MINA 2 PR0+146,7 CI		146,70	2,95	0,071	1,00	30,63				
MAM-25 © 2/09/2026		MUA PR0+099,5 CD		99,50	4,50	0,103	1,00	46,20				
MAM-25 © 3/09/2026		MUA PR0+104 CI		104,00	4,35	0,103	1,00	46,68				
MAM-25 © 7/09/2026		MUA PR0+104 CD		104,00	4,50	0,103	1,00	48,29				
MAM-25 © 8/09/2026		MUA PR0+104 CI		104,00	4,43	0,103	1,00	47,54				
MAM-25 © 10/09/2026		MUA PR0+039,1 CD		39,10	4,50	0,103	1,00	18,16				
MAM-25 © 10/09/2026		MUA PR0+030 CD		30,00	6,78	0,103	1,00	20,99				
MAM-25 © 10/09/2026		MUA PR0+010 CD		8,00	4,50	0,100	1,00	3,60				
MAM-25 © 11/09/2026		MUA PR0+077 CI		77,00	6,50	0,103	1,00	51,65				
MAM-25 © 15/09/2026		MUA PR0+052 CD		52,00	4,82	0,103	1,00	25,86				
MAM-25 © 15/09/2026		MUA PR0+057 CD		57,00	4,83	0,093	1,00	25,66				
MAM-25 © 16/09/2026		MUA PR0+052 CI		52,00	4,82	0,103	1,00	25,86				
MAM-25 © 16/09/2026		MUA PR0+057 CI		57,00	4,83	0,093	1,00	25,66				
MAM-25 © 7/09/2026		CES PR0+114,23 CD		114,23	4,46	0,100	1,00	50,90				
MAM-25 © 8/09/2026		CES PR0+160 CI		160,00	3,91	0,100	1,00	62,58				
MAM-25 © 9/09/2026		CES PR160+302 CI		142,00	3,64	0,100	1,00	51,75				
MAM-25 © 10/09/2026		CES PR0+100 CI - CD LEONARDO DAVINCI		100,00	6,17	0,100	1,00	61,73				
MAM-25 © 14/09/2026		CES PR130+302 CI		172,00	3,93	0,100	1,00	67,61				
SUB-TOTAL							747,67					

- fecha 19

[Handwritten signature]






Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista


Residente de Interventoria
CONINTEC S.A.S
Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026					ACTA DE OBRA N°:		2					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.					PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre					
CONTRATANTE:		DESUR					CONTRATO DE OBRA:		DESUR-IP-204-2026					
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026					MUNICIPIO:		ENVIGADO					
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S												
CAPITULO	5	PAVIMENTOS					UNIDAD:	m3	CANTIDAD CORTE:	78,11				
ÍTEM:	6.1.8	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MAM-19 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.							CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	78,11				
ACTA #1			ACTA #2		78,11		ACTA #3			ACTA #4			ACTA #5	
ELEMENTO		LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL		FOTO				
MAM-19 @		ALTO NATURA PR140+229,4		98,00	6,13	0,13	1,00	78,11						
SUB-TOTAL							78,11							

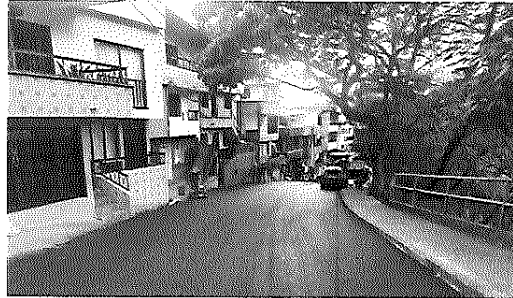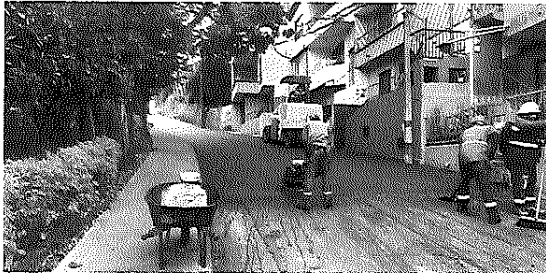

Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista


Residente de Interventoría
CONINTEC S.A.S
Interventoría


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:				23 de septiembre de 2025		ACTA DE OBRA N°:		2			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.				PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre			
CONTRATANTE:		DESUR				CONTRATO DE OBRA:		DESUR-IP-204-2026			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026				MUNICIPIO:		ENVIGADO			
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S									
CAPITULO:		6		PAVIMENTOS							
ÍTEM:		6.1.13		Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Resaltos, que cumpla con el Artículo 450-22. Incluye colocación y compactación. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio, incluye imprimación y transporte de materiales				UNIDAD:	m	CANTIDAD CORTE:	69,37
										CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	69,37

ACTA #1	-	ACTA #2	69,37	ACTA #3			ACTA #4		ACTA #5
ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LONGITUD [m]	BASE / ANCHO [m]	PROF / ALTURA [m]	CANT.	TOTAL	FOTO		
MDC-19 RESALTOS ☉	LA MINA 2 PRO+063	5,90	2,00		1,00	5,90			
MDC-19 RESALTOS ☉	ALTO NATURA LA LOMA PRO+003	6,70	2,00		1,00	6,70			
MDC-19 RESALTOS ☉	ALTO NATURA PRO+026	6,80	2,00		1,00	6,80			
MDC-19 RESALTOS ☉	ALTO NATURA PRO+138	4,50	2,00		1,00	4,50			
MDC-19 RESALTOS ☉ 11/09/2026	CES PRO+103,5 IZQ-DER LEONARDO DAVINCE	12,00	2,00		1,00	12,00			
MDC-19 RESALTOS ☉	CES PRO+067,5	8,90	2,00		1,00	8,90			
MDC-19 RESALTOS ☉	CES PRO+245	6,57	2,00		1,00	6,57			
MDC-19 RESALTOS ☉ 14/09/2026	MUA	9,00	3,80		1,00	9,00			
MDC-19 RESALTOS ☉ 17/09/2026	MUA	9,00	3,80		1,00	9,00			
SUB-TOTAL						69,37			





Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista


Residente de Interventoría
CONINTEC S.A.S
Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:		23 de septiembre de 2026					ACTA DE OBRA N°:		2					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.					PERIODO DE CORTE:		01 al 23 de septiembre					
CONTRATANTE:		DESUR					CONTRATO DE OBRA:		DESUR-IP-204-2026					
CONTRATISTA:		CONSORCIO CI 2026					MUNICIPIO:		ENVIGADO					
INTERVENTORIA:		CONINTEC S.A.S												
CAPITULO:							UNIDAD:	m3	CANTIDAD CORTE:		503,35			
ÍTEM:		OE-01 Conformación y compactación de base granular existente para cumplir el 100% de densificación, incluye todos los equipos para el proceso constructivo, laboratorio y todo lo necesario para el cumplimiento.							CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:		503,35			
ACTA #1		-	ACTA #2		503,35		ACTA #3			ACTA #4			ACTA #5	
ELEMENTO		LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL		FOTO				
CONFORMACIÓN @		ALTO NATURA PR0+130		130,00	6,10	0,200	1,00	158,67						
CONFORMACIÓN @ 7/09/2026		CES PR0+130 DER		130,00	4,46	0,200	1,00	115,85						
CONFORMACIÓN @ 7/09/2026		CES PR0+160 IZQ		160,00	3,91	0,200	1,00	125,09						
CONFORMACIÓN @ 7/09/2026		CES PR160+302 IZQ		142,00	3,65	0,200	1,00	103,75						
SUB-TOTAL								503,35						

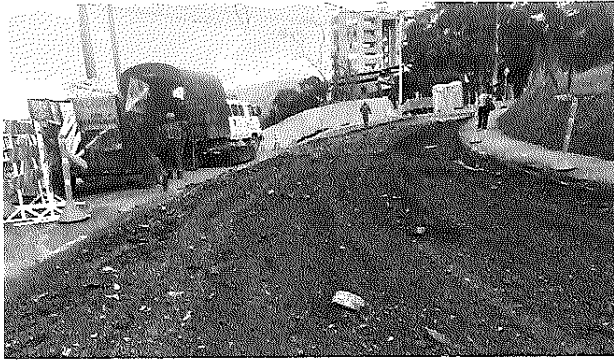




 Residente de Obra
 CONSORCIO CI 2026
 Contratista



 Residente de Interventoría
 CONINTEC S.A.S
 Interventoría


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO:	23 de septiembre de 2026		ACTA DE OBRA N°:	2	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.		PERIODO DE CORTE:	01 al 23 de septiembre	
CONTRATANTE:	DESUR		CONTRATO DE OBRA:	DESUR-IP-204-2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CI 2026		MUNICIPIO:	ENVIGADO	
INTERVENTORIA:	CONINTEC S.A.S				
CAPITULO:					
ITEM:	OE-02	Estabilización de base granular con cemento en una proporción de 3% sobre el volumen del material granular existente, incluye suministro, transporte y riego del cemento, equipos para el proceso constructivo y todo lo necesario para el cumplimiento. Incluye adición de base granular en un 20%		UNIDAD:	m3
				CANTIDAD CORTE:	230,75
				CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	230,75

ACTA #1		ACTA #2		ACTA #3		ACTA #4		ACTA #5		
		230,75								
ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO			
ESTABILIZACION ☉	LA MINA 1 PRO+000 AL PRO+035 CD	35,00	3,55	0,250	1,00	31,06				
ESTABILIZACION ☉	LA MINA 1 PRO+000 AL PRO+046 CI	46,00	3,55	0,250	1,00	40,83				
ESTABILIZACION ☉	LA MINA 1 PRO+035 AL PRO+102 CD	67,00	3,55	0,250	1,00	59,46				
ESTABILIZAION ☉	LA MINA 1 PRO+046 AL PRO+092 CI	46,00	3,55	0,250	1,00	40,83				
ESTABILIZACION ☉	LA MINA 1 PRO+102 AL PRO+130 CD	28,00	3,55	0,250	1,00	24,85				
ESTABILIZACION ☉	LA MINA 1 PRO+092 AL PRO+130 CI	38,00	3,55	0,250	1,00	33,73				
						0,00				
SUB-TOTAL						230,75				

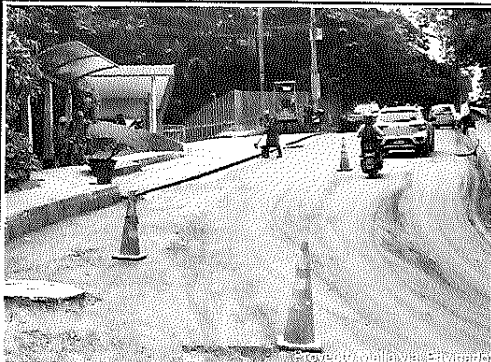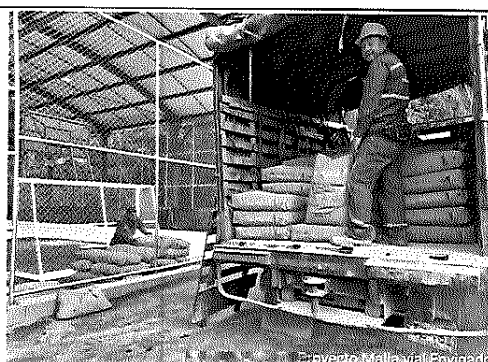


Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista


Residente de Interventoría
CONINTEC S.A.S
Interventoría



CONTRATO N° DESur-IP-204-2026

OBJETO: REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 1

En el Municipio de Envigado a los (23) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la Ingeniera LAURA QUINTERO, supervisor del contrato, el Ingeniera ANGELA VELEZ A, representante del contratista CONSORCIO CI 2026 y la Ingeniera LUCIDIA ARBOLEDA T, representante de la Interventoría CONINTEC S.A.S, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente del 1 al 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 en desarrollo del Contrato.

JUSTIFICACIÓN

LA PRESENTE ACTA DE CAMBIO DE OBRA SE JUSTIFICA EN QUE UNA VEZ VALORADOS LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS, CORRESPONDIENTES A LOS DATOS PRIORIZADOS, SE ENCONTRO QUE LAS CANTIDADES REALES DE OBRA DIFIEREN DE LAS CONTRATADAS. SE OBSERVA QUE LOS ESPESORES DE PAVIMENTO DE LOS DISEÑOS, DIFIEREN DE LOS ESPESORES DE LAS CAPAS EXISTENTES, GENERALMENTE SIENDO DE MAYOR ESPESOR.

Por las anteriores razones, se procedió a realizar el siguiente cambio de obra

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.2.1	Suministro, transporte e instalación de base granular NORMA INVIAS 2013, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado	m³	-1749,75	\$ 325.400	-\$ 569.367.905
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					-\$ 569.367.905

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.3.3	Fresado de pavimento asfáltico. Incluye transporte interno y disposición final del material	m3	936,06	\$ 184.000	\$ 172.234.756
6.1.6	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MAM-25 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³	78,67	\$ 2.231.200	\$ 175.526.287
6.1.10	Suministro y aplicación de liga con emulsion asfáltica CRR-2	m²	19443,75	\$ 6.465	\$ 125.703.871
OE-01	Conformación y compactación de base granular existente para cumplir el 100% de densificación, incluye todos los equipos para el proceso constructivo, laboratorio y todo lo necesario para el cumplimiento.	m3	503,35	\$ 91.925	\$ 46.270.051
OE-02	Estabilización de base granular con cemento en una proporción de 3% sobre el volumen del material granular existente, incluye suministro, transporte y riego del cemento, equipos para el proceso constructivo y todo lo necesario para el cumplimiento. Incluye adición de base granular en un 20%	m3	230,75	\$ 215.094	\$ 49.632.941
TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA					\$ 569.367.905

TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA	\$ 569.367.905
DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA	-\$ 0

Las partes dejan constancia de lo siguiente:


1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empresa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESur-IP-204-2026
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:


ANGELA VELEZ A.
Representante Contratista
CONSORCIO CI 2026


ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
GERENTE
DESUR


LUCIDIA ARBOLEDA T.
Representante de Interventoría
CONINTEC S.A.S


LAURA QUINTERO
Profesional en Ejecución de proyectos
DESUR



DESUR-IP-204-2026

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE OBRA EXTRA No 1 - OBRA EXTRA A INCLUIRSE DESDE EL ACTA DE PAGO No 2 (SEPTIEMBRE DE 2026)

En el Municipio de Envigado a los (11) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron, la ingeniera LUCIDIA ARBOLEDA T, representante de la interventoría CONINTEC SAS y la ingeniera ANGELA MARIA VELEZ A, representante de CONSORCIO CI 2026, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2026 en desarrollo del Contrato.

JUSTIFICACIÓN

Dada la matriz de prioridad de ejecución enviada por la entidad, nos encontramos unos frentes de trabajo con diseños de alta demanda, el cual consiste en instalar mezclas asfálticas modificadas, adicional de cambiar los niveles de la rasante, por esto se deben ejecutar actividades que no se tenían contempladas en la proyección inicial y nos conlleva a ejecutar algunos ítem adicionales para cumplir con el objeto del contrato.

Por las anteriores razones, se procede a relacionar y aprobar las siguientes obras extras, tener en cuenta que los siguientes precios son a costo directo (NO INCLUYE AU)

OBRA EXTRA A EJECUTARSE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VR UNITARIO
O.E01	Conformación y compactación de base granular existente para cumplir el 100% de densificación, incluye todos los equipos para el proceso constructivo, laboratorio y todo lo necesario para el cumplimiento.	m3	91.924
O.E02	Estabilización de base granular con cemento en una proporción de 3% sobre el volumen del material granular existente, incluye suministro, transporte y riego del cemento, equipos para el proceso constructivo y todo lo necesario para el cumplimiento. Incluye adición de base granular en un 20%	m3	215.094
O.E03	Construcción de carpeta asfáltica a máquina con Mezcla Asfáltica tipo MDC-25, incluye suministro, transporte y colocación de material tipo capa intermedia. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye transportes externos e internos, acarreo manual o mecánicos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	1.827.509

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que las obras extras revisadas y aprobadas por la Interventoría de Obra, fueron presentadas por el Contratista, por medio del análisis de precio unitario (APU) correspondiente, de manera oportuna y en consonancia con la tipología de recursos y precios incluidos en los análisis de precios de los ítems de obra contractual.
2. Las obras extras presentadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría de Obra, mantienen el objeto del Contrato No.DESUR-IP-204-2026
3. Las obras extras presentadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría de Obra, respetan y mantienen los beneficios económicos otorgadas al Contratista en las obras contractuales, preservándose tanto para el Municipio como para el Contratista, el debido principio de equilibrio financiero.
4. Se anexan los análisis de precios unitarios (APU) aprobados.

Para constancia firman:

Ing. ANGELA MARIA VELEZ A.
Directora de obra
CONSORCIO CI 2026
CONTRATISTA

Ing. LUCIDIA ARBOLEDA T.
Directora de Interventoría
CONINTEC SAS
INTERVENTORÍA

Item: OE-03		Capítulo: OBRAS EXTRAS	
CANTIDAD	UNIDAD	Descripción	
500,00	m3	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-25 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	

MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Tipo	Valor M.O	Rendimiento	Valor Parcial	
Herramienta menor	5% mano de obra	190.680	0,050	9.534,00	

MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Finisher	h	1,00	220.000,00	0,22848	50.265,60
Vibrocompactador doble tandem	h	1,00	140.000,00	0,22848	31.987,20
Vibrocompactador neumático	h	1,00	120.000,00	0,22848	27.417,60
Camión	h	1,00	90.000,00	0,22848	20.563,20
Placa vibratoria (rana)	h	1,00	59.500,00	0,22848	13.594,56
Minicargador	h	1,00	110.000,00	0,22848	25.132,80
				SubTotal	178.494,96

MATERIALES DE OBRA					
MDC-25	ton	2,43	560.014,00		1.360.834,02
				SubTotal	1.360.834,02

TRANSPORTE					
TRANSPORTE MDC	1,30	30,00	Ton	2.500,00	97.500,00
				SubTotal	97.500,00

MANO DE OBRA						
CUADRILLA DE PAVIMENTO	UND	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,05448	190.680,00
					SubTotal	190.680,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.827.508,98

Elaborado por:

Revisado por:

Item: OE-03

Capítulo: OBRAS EXTRAS

CANTIDAD	UNIDAD	Descripción	
500,00	m3	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-25 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Tipo	Valor M.O	Rendimiento	Valor Parcial	
Herramienta menor	5% mano de obra	190.680	0,050	9.534,00	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Finisher	h	1,00	220.000,00	0,22848	50.265,60
Vibrocompactador doble tandem	h	1,00	140.000,00	0,22848	31.987,20
Vibrocompactador neumatico	h	1,00	120.000,00	0,22848	27.417,60
Camión	h	1,00	90.000,00	0,22848	20.563,20
Placa vibratoria (rana)	h	1,00	59.500,00	0,22848	13.594,56
Minicargador	h	1,00	110.000,00	0,22848	25.132,80
				SubTotal	178.494,96

MATERIALES DE OBRA

MDC-25	ton	2,43	560.014,00		1.360.834,02
				SubTotal	1.360.834,02

TRANSPORTE

TRANSPORTE MDC	1,30	30,00	Ton	2.500,00	97.500,00
				SubTotal	97.500,00

MANO DE OBRA

CUADRILLA DE PAVIMENTO	UND	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,05448	190.680,00
					SubTotal	190.680,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.827.508,98

Elaborado por:

Revisado por:

Item: OE-03		Capítulo: OBRAS EXTRAS	
CANTIDAD	UNIDAD	Descripción	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-25 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.
500,00	m3		

MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Tipo	Valor M.O	Rendimiento	Valor Parcial	
Herramienta menor	5% mano de obra	190.680	0,050	9.534,00	

MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Finisher	h	1,00	220.000,00	0,22848	50.265,60
Vibrocompactador doble tandem	h	1,00	140.000,00	0,22848	31.987,20
Vibrocompactador neumatico	h	1,00	120.000,00	0,22848	27.417,60
Camión	h	1,00	90.000,00	0,22848	20.563,20
Placa vibratoria (rana)	h	1,00	59.500,00	0,22848	13.594,56
Minicargador	h	1,00	110.000,00	0,22848	25.132,80
				SubTotal	178.494,96

MATERIALES DE OBRA					
MDC-25	ton	2,43	560.014,00		1.360.834,02
				SubTotal	1.360.834,02

TRANSPORTE					
TRANSPORTE MDC	1,30	30,00	Ton	2.500,00	97.500,00
				SubTotal	97.500,00

MANO DE OBRA						
CUADRILLA DE PAVIMENTO	UND	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,05448	190.680,00
					SubTotal	190.680,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.827.508,98

Elaborado por:

Revisado por:

CONSORCIO CI 2026

Diagonal 51 No. 15 A 161 Km 12 Bello
Antioquia
PBX (604) 400 00 00 - 314
Email: info@consorcio2026.com



DESUR-IP-204-2026

"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24,"

Bello, 17 de septiembre de 2026

Señores

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL – DESUR
Envigado

Referencia: Contrato DESUR-IP-204-2026

Respetados señores:

Los abajo firmantes, en su calidad de representante legal y contador respectivamente del **CONSORCIO CI 2026**, con Nit. **902.092.335-8**, certificamos que la empresa a la fecha no tiene vinculado personal a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales aportes a las caja de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las disposiciones legales vigentes sobre la materia, por tanto, en el momento de existir alguna vinculación de personal, realizaremos el pago exigido por cada entidad en la fecha indicada para ello.

Dada en Bello, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2026. ✓

José Andrés Chica Pérez
C.C. 98.637.898
Representante Legal

Pablo Emilio Gómez Restrepo
C.C. 98.491.635 y TP 221244-T
Contador

Elaboró: JRodríguez – Coordinadora Jurídica – Conasfaltos S.A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.491.635

GOMEZ RESTREPO

APELLIDOS

PABLO EMILIO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1965

BELLO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

12-DIC-1983 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00021901-M-0098491635-20080711

0000930189A 1

2070020743

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


221244-T

PABLO EMILIO
GOMEZ RESTREPO
C.C. 98491635

RESOLUCION INSCRIPCION 1170 FECHA 21/10/2016
UNIVERSIDAD CORP UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 235687



Rowda

224767


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990:
-Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 8 8 8 7 3 0 0 0 A 1 A C 5 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PABLO EMILIO GOMEZ RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98491635 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 221244-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, ✓
contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800929351	7	CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. COMASFALTOS	A - 200 O MAS COIZTANTES	PRINCIPAL	OG 51 16 A 161	BELLO-ANTIOQUIA	4000000	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud		Planilla		Límite		Pago	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	652090928	951104949	E	2026/09/11	2026/09/14	BANCO DANVIEHDA	3	\$87,322,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		VALOR A PAGAR
							Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Intereses de Mora Fondo Subsistencia
								Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					63	\$43,504,200	\$97,800		\$0
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	4	\$3,225,600	\$7,400	\$200	\$43,602,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	16	\$11,641,600	\$26,200	\$200	\$3,233,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	18	\$9,685,500	\$21,700	\$0	\$11,667,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	25	\$18,951,500	\$42,500	\$600	\$9,707,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					63	\$18,065,500	\$40,400		\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-4	860,002,183	9	63	\$18,065,500	\$40,400	\$0	\$18,105,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					63	\$10,597,800	\$23,700		\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF04	890,900,841	9	63	\$10,597,800	\$23,700	\$0	\$10,621,500
COMFAMA					63	\$13,381,400	\$30,100		\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					51	\$11,349,000	\$25,400	\$0	\$13,411,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$478,200	\$1,100	\$0	\$11,374,400
FOSYGA		MIN001	901,037,916	1	2	\$478,200	\$1,100	\$0	\$479,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$880,600	\$2,000	\$0	\$479,300
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$252,000	\$600	\$0	\$882,600
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$336,000	\$800	\$0	\$252,600
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	1	\$85,600	\$200	\$0	\$336,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$947,000	\$2,200	\$0	\$85,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$947,000	\$2,200	\$0	\$949,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$631,300	\$1,500		\$0
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$631,300	\$1,500	\$0	\$632,800
TOTAL					63	\$87,427,200	\$195,700	\$358,600	\$87,322,900



Se certifica que ANGELA MARIA VELEZ ARANGO identificado(a) con CC 21560763 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor		vst		sln	ige	ma	vac	avp	vct		irl	vip
2026-08	2026-09	652090928	9511049449	E	2026-09-14																				
Riesgo		Administradora COLPENSIONES		Días	Tarifa	IBC							Cotización												
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD		30	16%	\$12,000,000							\$1,920,000												
AFP		PENSIONAL		30		\$12,000,000							\$60,000												
AFP		SUBCUENTA DE		30		\$12,000,000							\$60,000												
AFP		SUBSISTENCIA COLPATRIA ARP		30		\$12,000,000							\$60,000												
ARL		COMFAMA		30	6.96%	\$12,000,000							\$835,200												
CCF				30	4%	\$12,000,000							\$480,000												
EPS		EPS SURA(ANTES SUSALUD)		30	4%	\$12,000,000							\$480,000												

Este certificado se expide el día 2026-09-17 a las 08:32.



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JESUS EMIRO ARIAS GARCIA identificado(a) con CC 88142493 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tup	tap	vsp	cor		vst		sin	ige	ma	vac	avp	vct		irl	vip
2026-08	2026-09	652090928	9511049449	E	2026-09-14																				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$7,000,000						\$1,120,000													
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$7,000,000						\$487,200													
CCF		COMFAMA		30	4%	\$7,000,000						\$280,000													
EPS		EPS SURA(ANTES SUSALUD)		30	4%	\$7,000,000						\$280,000													

Este certificado se expide el día 2026-09-17 a las 08:31.



Certificados de Aportes

Se certifica que ALEXANDER BELEÑO RAMIREZ identificado(a) con CC 79684729 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tip	tao	vsp	cor		vst		sln	ige	ma	vac	avp	vct		irt	vip
2026-08	2026-09	652090928	9511049449	E	2026-09-14	X																			
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización													
AFP		COLPENSIONES		28	16%	\$3,266,667						\$522,700													
ARL		COLPATRIA ARP		28	6.96%	\$3,266,667						\$227,400													
CCF		COMFAMA		28	4%	\$3,266,667						\$130,700													
EPS		EPS SURA(ANTES SUSALUD)		28	4%	\$3,266,667						\$130,700													

Este certificado se expide el día 2026-09-17 a las 08:31.



Se certifica que LUZ ERCILIA CUERVO ISAZA identificado(a) con CC 28798607 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor		vst		sln	ige	ma	vac	avo	vct		irl	vip
2026-08	2026-09	652090928	9511049449	E	2026-09-14	X																			
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización													
AFP		PORVENIR		13	16%	\$1,863,334						\$298,200													
ARL		COLPATRIA ARP		13	6.96%	\$1,863,334						\$129,700													
CCF		COMFAMA		13	4%	\$1,863,333						\$74,600													
EPS		SANITAS		13	4%	\$1,863,334						\$74,600													

Este certificado se expide el día 2026-09-17 a las 08:32.



Se certifica que JULIANA HERNANDEZ CARDONA identificado(a) con CC 1152202573 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor		vst		ige	ima	vac	avp	vct		irl	vip
2026-08	2026-09	652090928	9511049449	E	2026-09-14	X																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC							Cotización											
AFP		PROTECCION		10	16%	\$1,433,334							\$229,400											
ARL		COLPATRIA ARP		10	6.96%	\$1,433,334							\$99,800											
CCF		COMFAMA		10	4%	\$1,433,333							\$57,400											
EPS		EPS SURA(ANTES SUSALUD)		10	4%	\$1,433,334							\$57,400											

Este certificado se expide el día 2026-09-17 a las 08:32.



Se certifica que DIANA PAOLA ROBLES CASTAÑO identificado(a) con CC 1040518703 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	cae	tdp	tap	vsp	cor		vst	sin	ige	ma	vac	avo	vct	irl	vip
2026-08	2026-09	652090928	9511049449	E	2026-09-14	X																	
Riesgo		Administradora		Dias	Tarifa	IBC							Cotización										
AFP		PROTECCION		28	16%	\$4,013,334							\$642,200										
ARL		COLPATRIA ARP		28	6.96%	\$4,013,334							\$279,400										
CCF		COMFAMA		28	4%	\$4,013,333							\$160,600										
EPS		NUEVAE.P.S.		28	4%	\$4,013,334							\$160,600										

Este certificado se expide el día 2026-09-17 a las 08:32.



Se certifica que ALEX TORREGLOSA REYES identificado(a) con CC 1045515685 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	ae	tdp	tap	vsp	cor		vst		sln	ige	ma	vac	avo	vct		irl	vip
2026-08	2026-09	652090928	9511049449	E	2026-09-14																				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC							Cotización												
AFP		PORVENIR		30	16%	\$6,092,520							\$974,900												
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$6,092,520							\$424,100												
CCF		COMFAMA		30	4%	\$6,092,520							\$243,800												
EPS		EPS SURA(ANTES SUSALUD)		30	4%	\$6,092,520							\$243,800												

Este certificado se expide el día 2026-09-17 a las 08:32.

BANCO DAVIVIENDA S.A.**CERTIFICA:**

Que nuestro cliente empresarial **CONSORCIO CI 2026**, identificado(a) con Nit **9020923358**, es titular de la siguiente cuenta con nuestra Entidad:

Número de Producto	Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Cancelación
0550039400086292	CUENTA DE AHORROS	VIGENTE	2026/08/25	

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el día 25 de agosto de 2026.

Cordial saludo,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CONSORCIO CI 2026

Diagonal 51 No. 15 A 161 Km 12
Bello, Antioquia.
PBX (604) 400 00 00 - 314
Email: info@conasfaltos.com



Al Contrater Cito Radicado: 2026-1300-012816-R Id: 120125
Fecha: 2026-09-25 09:51
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSORCIO CI 2026
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

**DESUR-IP-204-2026**

"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24."

Medellín, 25 de septiembre de 2026.

CCI-013-2026

Ingeniera

LAURA QUINTERO

Profesional de ejecución de proyectos
DESUR

Cl. 35 Sur #40 - 35, Zona 9, Envigado, Antioquia
Correo: laura.quintero@desur.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO No. DESUR-IP-204-2026

ASUNTO: Remisión de acta de pago N°2

25/9/26, 8:38

CONSORCIO CI 2026 CORRESPONDENCIA
Radicado: 32-01-2026092500006
Fecha: 25/09/2026 08:37:18 a. m.
Usuario: bvargas
FECHA DEL DOCUMENTO : 25/09/2026
TIPO DE DOCUMENTO: Carta

Estima Ingeniera,

Conforme al proyecto de la referencia, realizamos la entrega del acta de pago N°2, con los siguientes documentos:

- 2 copias Acta N°2 (Factura FECl 2, acta firmada en original con memorias, acta de cambio de obra 1, acta de precios no previstos 1, certificado de parafiscales del Consorcio CI2026, copia cedula-Tarjeta Profesional- Junta de Contadores-Pablo Gómez, Seguridad Social Vigente y Certificado bancario Consorcio CI2026)
- Adicionalmente para Tesorería: Factura FECl 2, certificado de parafiscales del Consorcio CI2026, copia cedula, Tarjeta Profesional y Junta de Contadores Pablo Gómez, Seguridad Social Vigente y Certificado bancario Consorcio CI2026.

Estaremos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ANGELA MARIA VELEZ

C.C. 21.560.763

DIRECTORA DE OBRA

