

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 10

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20001103-H4 de 2020
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2020.
OBJETO	RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.
VALOR	CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO \$ 105.673.174,00 M/CTE.
ADICION	VEINTI CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DOS M/CTE (\$ 24.690.202) INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2020.
VALOR FINAL	CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$130.363.376). INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD
PRORROGA	N/A
PLAZO FINAL	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2020.
CDP	25520 09-09-2020
RP	84320 15-11-2020
CDP ADICIONAL	35320 16-12-2020
RP ADICIONAL	98420 17-12-2020
FECHA LEGALIZACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

En la ciudad de Palmira (V), a los 21 días del mes de diciembre de 2020, se reunieron:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 10

El Ing. **DIEGO ROLANDO GUTIERREZ** representante legal de **CONSORCIO OBRAS 2020** obrando como contratista, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como Supervisor y **JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA** en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo de **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1**, de las obras el Contrato 20001103-H4 de 2020.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

15/11/2020

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

PRÓRROGAS

N/A

ADICIONES EN VALOR

VEINTI CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DOS M/CTE (\$ 24.690.202)
INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30/12/2020

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALIZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	AEROPUERTO MATECANA DE PEREIRA						
	Preliminares.						
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	31,54	\$ 3.400,00	\$ 107.236,00	31,54	\$ 107.236,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 10

1,02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	48,70	\$ 18.600,00	\$ 905.820,00	48,70	\$ 905.820,00
1,03	RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	2,00	\$ 11.700,00	\$ 23.400,00	2,00	\$ 23.400,00
1,04	EXCAVACION DE TIERRA A MANO (VIGAS CIMIENTO)	M3	53,22	\$ 11.900,00	\$ 633.318,00	53,22	\$ 633.318,00
1,05	DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO	M2	57,88	\$ 1.400,00	\$ 81.032,00	57,88	\$ 81.032,00
1,06	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	0,00	\$ 2.500,00	\$ -	0,00	\$ -
1,07	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	M3	13,07	\$ 15.800,00	\$ 206.508,00	0,00	\$ -
2	Rellenos.						
2,01	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC- CILINDRO +ACA	M3	31,50	\$ 31.600,00	\$ 995.400,00	31,50	\$ 995.400,00
2,02	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6,63	\$ 12.900,00	\$ 85.527,00	6,63	\$ 85.527,00
2,03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	0,00	\$ 700,00	\$ -	0,00	\$ -
2,04	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	0,00	\$ 2.400,00	\$ -	0,00	\$ -
3	Cimentacion y Estructura						
3,01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	27,84	\$ 18.700,00	\$ 520.608,00	27,84	\$ 520.608,00
3,02	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	3,52	\$ 261.100,00	\$ 919.072,00	3,52	\$ 919.072,00
3,03	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,05	\$ 327.600,00	\$ 671.580,00	2,05	\$ 671.580,00
3,04	PEDESTAL CONCRETO	M3	0,00	\$ 366.300,00	\$ -	0,00	\$ -
3,05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,64	\$ 497.100,00	\$ 1.312.344,00	2,64	\$ 1.312.344,00
3,06	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2,12	\$ 803.700,00	\$ 1.703.844,00	2,12	\$ 1.703.844,00
3,07	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	2,64	\$ 698.100,00	\$ 1.842.984,00	2,64	\$ 1.842.984,00
3,08	DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS	ML	0,00	\$ 65.900,00	\$ -	0,00	\$ -
3,09	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10- 12x20CM	ML	29,40	\$ 27.200,00	\$ 799.680,00	29,40	\$ 799.680,00
3,10	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	0,00	\$ 34.600,00	\$ -	0,00	\$ -
3,11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1042,00	\$ 3.300,00	\$ 3.438.600,00	1042,00	\$ 3.438.600,00
3,12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	76,98	\$ 4.700,00	\$ 361.806,00	76,98	\$ 361.806,00
3,13	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	\$ 748.500,00	\$ -	0,00	\$ -
3,14	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KG	0,00	\$ 6.000,00	\$ -	0,00	\$ -
3,15	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm - 2.0MM C.14	ML	0,00	\$ 34.500,00	\$ -	0,00	\$ -
3,16	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	20,00	\$ 11.000,00	\$ 220.000,00	20,00	\$ 220.000,00
4	Cubierta.						
4,01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO- ALUM.E=1 1C	M2	28,00	\$ 131.800,00	\$ 3.690.400,00	28,00	\$ 3.690.400,00
4,02	IMPERM.MANTO 800XT. 4mm.	M2	0,00	\$ 28.000,00	\$ -	0,00	\$ -
4,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	5,40	\$ 18.000,00	\$ 97.200,00	5,40	\$ 97.200,00
4,04	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML	17,80	\$ 27.600,00	\$ 491.280,00	17,80	\$ 491.280,00
4,05	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	0,00	\$ 14.300,00	\$ -	0,00	\$ -
4,06	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	2,00	\$ 9.400,00	\$ 18.800,00	2,00	\$ 18.800,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 10

4,07	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	8,00	\$ 17.200,00	\$ 137.600,00	8,00	\$ 137.600,00
4,08	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	UND	3,00	\$ 188.400,00	\$ 565.200,00	0,00	\$ -
4,09	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	3,00	\$ 103.700,00	\$ 311.100,00	0,00	\$ -
4,1	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO	M2	0,00	\$ 34.200,00	\$ -	0,00	\$ -
4,11	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	0,00	\$ 17.600,00	\$ -	0,00	\$ -
4,12	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	0,00	\$ 40.700,00	\$ -	0,00	\$ -
4,13	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	ML	29,40	\$ 53.000,00	\$ 1.558.200,00	29,40	\$ 1.558.200,00
4,14	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	0,00	\$ 19.200,00	\$ -	0,00	\$ -
4,15	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM	ML	0,00	\$ 14.700,00	\$ -	0,00	\$ -
4,16	CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	0,00	\$ 28.600,00	\$ -	0,00	\$ -
4,17	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	33,20	\$ 38.800,00	\$ 1.288.160,00	33,20	\$ 1.288.160,00
5	Carpinterías						
5,01	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31	M2	10,20	\$ 190.300,00	\$ 1.941.060,00	0,00	\$ -
5,02	NAVE ALUMINIO NAVE- ENTAMBORADA-LLENA	M2	0,00	\$ 332.200,00	\$ -	0,00	\$ -
5,03	MARCOS EN ALUM 0,81-1,00M LISO C/ LUCETA	UND	8,00	\$ 181.300,00	\$ 1.450.400,00	0,00	\$ -
5,04	CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316	UND	1,00	\$ 135.100,00	\$ 135.100,00	0,00	\$ -
6	Pisos.						
6,01	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	57,88	\$ 24.600,00	\$ 1.423.848,00	57,88	\$ 1.423.848,00
6,02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	31,54	\$ 19.700,00	\$ 621.338,00	31,54	\$ 621.338,00
6,03	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	31,54	\$ 48.400,00	\$ 1.526.536,00	31,54	\$ 1.526.536,00
6,04	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	24,20	\$ 11.300,00	\$ 273.460,00	24,20	\$ 273.460,00
7	Instalaciones Electricas y Domotizado						
7,01	SAL TOMA 1F (C/T/A/T/O:REGULADO P&S)	UND	4,00	\$ 82.000,00	\$ 328.000,00	0,00	\$ -
7,02	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	0,00	\$ 210.400,00	\$ -	0,00	\$ -
7,03	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	\$ 79.600,00	\$ 477.600,00	0,00	\$ -
7,04	SAL LAMP EMT	UND	6,00	\$ 94.100,00	\$ 564.600,00	0,00	\$ -
7,05	SALIDA S3 EMT	UND	1,00	\$ 110.600,00	\$ 110.600,00	0,00	\$ -
7,06	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	0,00	\$ 144.600,00	\$ -	0,00	\$ -
7,07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	\$ 26.300,00	\$ -	0,00	\$ -
7,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	6,00	\$ 26.600,00	\$ 159.600,00	6,00	\$ 159.600,00
7,09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	5,00	\$ 32.100,00	\$ 160.500,00	0,00	\$ -
7,1	INSTALACION SWITCHE	UND	0,00	\$ 6.000,00	\$ -	0,00	\$ -
7,11	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PTO	0,00	\$ 19.600,00	\$ -	0,00	\$ -
7,12	TUBERIA PVC 1,1/2"	ML	0,00	\$ 10.100,00	\$ -	0,00	\$ -
7,13	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	0,00	\$ 8.000,00	\$ -	0,00	\$ -
7,14	ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3"	ML	0,00	\$ 366.200,00	\$ -	0,00	\$ -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 10

8	Mampostería, Repellos, Estucos y Pintura						
8,01	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	59,23	\$ 40.000,00	\$ 2.369.200,00	59,23	\$ 2.369.200,00
8,02	ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	ML	0,00	\$ 21.300,00	\$ -	0,00	\$ -
8,03	REPELLO MURO 1:3	M2	63,55	\$ 17.400,00	\$ 1.105.770,00	63,55	\$ 1.105.770,00
8,04	FILOS - DILATACIONES	ML	110,80	\$ 3.400,00	\$ 376.720,00	110,80	\$ 376.720,00
8,05	REPELLO VIGA CANAL [3C]	ML	0,00	\$ 24.800,00	\$ -	0,00	\$ -
8,06	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	55,85	\$ 15.500,00	\$ 865.675,00	55,85	\$ 865.675,00
8,07	KORAZA [3M]	M2	61,01	\$ 8.300,00	\$ 506.383,00	0,00	\$ -
ITEMS NUEVOS							
NP 01	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	27,13	\$ 61.200,00	\$ 1.660.356,00	27,13	\$ 1.660.356,00
NP 02	ALFAGIA CONCRETO A= 25 - 30CM	ML	25,20	\$ 28.853,00	\$ 727.096,00	25,20	\$ 727.096,00
NP 03	PINTURA TIPO 1 INTERIOR, 3 MANOS	M2	55,85	\$ 8.100,00	\$ 452.385,00	55,85	\$ 452.385,00
NP 04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3	M2	61,01	\$ 19.597,00	\$ 1.195.613,00	61,01	\$ 1.195.613,00
NP 05	TUBERIA PVC 2 SANITARIA	ML	7,80	\$ 17.480,00	\$ 136.344,00	7,80	\$ 136.344,00
NP 06	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	2,00	\$ 54.000,00
NP 07	REJILLA PARA SIFÓN 3x2"	UND	2,00	\$ 21.000,00	\$ 42.000,00	0,00	\$ -
NP 08	PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO, CON CUERPO FIJO DE 0,70 MTS Y DOS CUERPOS BATIENTES CADA UNO DE 1 X 2 MTS	UND	1,00	\$ 4.414.333,00	\$ 4.414.333,00	0,00	\$ -
NP 09	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	6,00	\$ 170.000,00	\$ 1.020.000,00	6,00	\$ 1.020.000,00
NP 10	CANAL GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0,61 MTS	ML	8,10	\$ 118.375,00	\$ 958.838,00	8,10	\$ 958.838,00
NP 11	ACOMETIDA CABLE STP CATEGORIA 6. VOZ Y DATOS	ML	55,00	\$ 30.050,00	\$ 1.652.750,00	0,00	\$ -
NP 12	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, 8 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR	UND	1,00	\$ 570.250,00	\$ 570.250,00	0,00	\$ -
NP 13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO, 8 CIRCUITOS	UND	1,00	\$ 154.417,00	\$ 154.417,00	0,00	\$ -
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,00	\$ 17.750,00	\$ 17.750,00	0,00	\$ -
NP 15	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT)	UND	1,00	\$ 133.180,00	\$ 133.180,00	0,00	\$ -
NP 16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 60 CMS	UND	1,00	\$ 412.900,00	\$ 412.900,00	0,00	\$ -
NP 17	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	1,00	\$ 73.533,00	\$ 73.533,00	0,00	\$ -
NP 18	TOMA JACK FACE PLATE. VOZ Y DATOS	UND	1,00	\$ 49.900,00	\$ 49.900,00	0,00	\$ -
NP 19	ACOM.E.3F(3#2+1#6) NO REGULADA	ML	55,00	\$ 104.730,00	\$ 5.760.150,00	0,00	\$ -
NP 20	ACOM.E.2F(2#2+1#6) REGULADA	ML	100,00	\$ 78.480,00	\$ 7.848.000,00	0,00	\$ -
NP 21	TUBO CORRUGADO ELECTRICO DE 3"	ML	105,00	\$ 48.178,00	\$ 5.058.690,00	0,00	\$ -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 6 de 10

	AEROPUERTO SANTANA DE CARTAGO						
9	Sala de Capacitacion y Entrenamiento.						
9,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	35,62	\$ 1.700,00	\$ 60.554,00	35,62	\$ 60.554,00
9,02	VINOLO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	35,62	\$ 8.900,00	\$ 317.018,00	35,62	\$ 317.018,00
9,03	REPELLO MURO 1:3	M2	35,62	\$ 17.400,00	\$ 619.788,00	35,62	\$ 619.788,00
9,04	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	11,73	\$ 4.000,00	\$ 46.920,00	11,73	\$ 46.920,00
9,05	RETIRO LAMPARA	UND	1,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	0,00	\$ -
9,06	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	0,00	\$ 2.500,00	\$ -	0,00	\$ -
9,07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	\$ 26.300,00	\$ -	0,00	\$ -
9,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00
9,09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	0,00	\$ 32.100,00	\$ -	0,00	\$ -
9,1	INSTALACION SWITCHE	UND	0,00	\$ 6.000,00	\$ -	0,00	\$ -
9,11	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	11,73	\$ 7.200,00	\$ 84.456,00	11,73	\$ 84.456,00
9,12	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	11,73	\$ 61.200,00	\$ 717.876,00	11,73	\$ 717.876,00
9,13	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	11,73	\$ 48.400,00	\$ 567.732,00	11,73	\$ 567.732,00
9,14	DESMONTE CAJONERA	UND	0,00	\$ 4.600,00	\$ -	0,00	\$ -
10	Baño.						
10,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2,00	\$ 22.400,00	\$ 44.800,00	2,00	\$ 44.800,00
10,02	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	25,02	\$ 7.200,00	\$ 180.144,00	25,02	\$ 180.144,00
10,03	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	4,22	\$ 4.000,00	\$ 16.880,00	4,22	\$ 16.880,00
10,04	RETIRO LAMPARA	UND	1,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	1,00	\$ 4.500,00
10,05	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00	2,00	\$ 5.000,00
10,06	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	\$ 26.300,00	\$ -	0,00	\$ -
10,07	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00
10,08	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	1,00	\$ 32.100,00	\$ 32.100,00	0,00	\$ -
10,09	INSTALACION SWITCHE	UND	2,00	\$ 6.000,00	\$ 12.000,00	0,00	\$ -
10,1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	4,22	\$ 61.200,00	\$ 258.264,00	4,22	\$ 258.264,00
10,11	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	4,22	\$ 25.600,00	\$ 108.032,00	4,22	\$ 108.032,00
10,12	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	25,02	\$ 44.600,00	\$ 1.115.892,00	25,02	\$ 1.115.892,00
10,13	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JGO	1,00	\$ 85.700,00	\$ 85.700,00	0,00	\$ -
10,14	INSTALACION SANITARIO	UND	2,00	\$ 21.000,00	\$ 42.000,00	0,00	\$ -
10,15	INSTALACION LAVAMANOS	UND	1,00	\$ 20.800,00	\$ 20.800,00	0,00	\$ -
10,16	DISPENSADOR JABON 1.2 LTS A.INOX	UND	1,00	\$ 145.800,00	\$ 145.800,00	0,00	\$ -
10,17	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO A.INOX	UND	1,00	\$ 155.200,00	\$ 155.200,00	0,00	\$ -
10,18	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	1,00	\$ 226.300,00	\$ 226.300,00	0,00	\$ -
10,19	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.	UND	1,00	\$ 1.024.500,00	\$ 1.024.500,00	0,00	\$ -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 7 de 10

10,2	ESPEJO CLARO DE 3MM	M2	0,50	\$ 38.900,00	\$ 19.450,00	0,00	\$ -
10,21	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	JGO	1,00	\$ 147.200,00	\$ 147.200,00	0,00	\$ -
10,22	ORINAL PEQUEÑO	UND	1,00	\$ 158.200,00	\$ 158.200,00	0,00	\$ -
10,23	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO	UND	1,00	\$ 245.400,00	\$ 245.400,00	0,00	\$ -
10,24	DUCHA MEZCLADORA (M)	UND	1,00	\$ 93.100,00	\$ 93.100,00	0,00	\$ -
10,25	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	1,00	\$ 385.700,00	\$ 385.700,00	0,00	\$ -
10,26	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M2	4,00	\$ 194.600,00	\$ 778.400,00	0,00	\$ -
10,27	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	\$ 6.700,00	\$ 13.400,00	2,00	\$ 13.400,00
10,28	NAVE ALUMINIO NAVE-ENTAMBORADA-LLENA	M2	6,85	\$ 332.200,00	\$ 2.275.570,00	0,00	\$ -
10,29	CERRADURA BANO ALUMINIO	UND	1,00	\$ 53.400,00	\$ 53.400,00	0,00	\$ -
10,3	MARCOS EN ALUM 0,81-1,00M LISO C/ LUCETA	UND	0,00	\$ 181.300,00	\$ -	0,00	\$ -
11	Torre de Control.						
11,01	REPELLO MURO 1:3	M2	11,70	\$ 17.400,00	\$ 203.580,00	11,70	\$ 203.580,00
11,02	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	47,32	\$ 8.400,00	\$ 397.488,00	47,32	\$ 397.488,00
11,03	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	47,32	\$ 8.900,00	\$ 421.148,00	47,32	\$ 421.148,00
11,04	DESM. VENTANA EXISTENTE	M3	39,02	\$ 17.400,00	\$ 678.948,00	39,02	\$ 678.948,00
11,05	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3,00	\$ 15.900,00	\$ 47.700,00	0,00	\$ -
11,06	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31 - SIN VIDRIO	M2	40,93	\$ 163.500,00	\$ 6.692.055,00	40,93	\$ 6.692.055,00
11,07	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM	M2	39,02	\$ 194.400,00	\$ 7.585.488,00	39,02	\$ 7.585.488,00
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OPALIZADO	M3	39,02	\$ 53.100,00	\$ 2.071.962,00	39,02	\$ 2.071.962,00
11,09	LIJADA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	ML	0,00	\$ 11.200,00	\$ -	0,00	\$ -
ITEMS NUEVOS							
NPC 01	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	2,00	\$ 170.000,00	\$ 340.000,00	2,00	\$ 340.000,00
NPC 02	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	13,70	\$ 11.300,00	\$ 154.810,00	13,70	\$ 154.810,00
NPC 03	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	8,96	\$ 24.600,00	\$ 220.416,00	8,96	\$ 220.416,00
NPC 04	ALISTADO PISO 4 CM	M2	11,73	\$ 19.700,00	\$ 231.081,00	11,73	\$ 231.081,00

COSTO DIRECTO TOTAL	31,00%	\$ 98.940.024,00	\$ 60.042.102,00
ADMINISTRACIÓN	21,00%	\$ 20.777.405,00	\$ 12.608.841,00
IMPREVISTOS	6,00%	\$ 5.936.401,00	\$ 3.602.526,00
UTILIDAD	4,00%	\$ 3.957.601,00	\$ 2.401.684,00
SUBTOTAL		\$ 129.611.431,00	\$ 78.655.153,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$ 751.945,00	\$ 456.320,00
TOTAL		\$ 130.363.376,00	\$ 79.111.473,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 8 de 10

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

\$ 105.673.174,00 M/CTE IVA INCLUIDO SOBRE LA UTILIDAD.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$130.363.376 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD.

FORMA DE PAGO:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL**, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

NOTA: Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 9 de 10

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas: (Indicar entre otros, el número de acta, valor bruto, valor neto, valor IVA, valor otros descuentos).

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

(indicar si a la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista valor alguno por concepto del contrato ejecutado).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 105.673.174
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 24.690.202
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$79.111.473
VALOR NO EJECUTADO	\$51.251.903

VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR DESCUENTOS	\$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO	\$ 130.363.376

TOTALES	\$ 130.363.376	\$ 130.363.376	\$ 130.363.376
---------	----------------	----------------	----------------

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 10 de 10

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:


1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.


GARANTÍAS


El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron.


(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).


DIEGO ROLANDO GUTIERREZ
 RL. Consorcio obras 2020
 Contratista.


JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
 Apoyo a la supervisión del Contrato
 U.A.E.A.C.


VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
 Director Aeronáutico Regional Valle.
 U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Juan David Rodriguez Suancha- Infraestructura
 Revisó: Diego Mauricio López. - Jurídico


 Diego M


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:	RVL00763 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.	VALOR INICIAL	CANTIDADES DE OBRA
DESARROLLO AEROPORTUARIO REGIONAL VALLE	CONTRATO No.20001103-H4	AEROPUERTO	AEROPUERTO MATECAÑA - SANTANA	INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS PLAZO FINAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	AEROPUERTO MATECAÑA - SANTANA	PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS PLAZO FINAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ.


ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALIZADAS)			ACTA DE COBRO PARCIAL No.1			EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vc.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
1	AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA									
	Preliminares									
1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	31,54	\$	3.400,00	\$	107.236,00	31,54	\$	107.236,00
1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	48,70	\$	18.600,00	\$	905.820,00	48,70	\$	905.820,00
1.03	RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	2,00	\$	11.700,00	\$	23.400,00	2,00	\$	23.400,00
1.04	EXCAVACION DE TIERRA A MANO (VIGAS CIMENTO)	M3	53,22	\$	11.900,00	\$	633.318,00	53,22	\$	633.318,00
1.05	DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO	M2	57,88	\$	1.400,00	\$	81.032,00	57,88	\$	81.032,00
1.06	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	0,00	\$	2.500,00	\$	-	0,00	\$	-
1.07	RETIRO SOBREPANTES MAQUINA <=10KM.	M3	13,07	\$	15.800,00	\$	206.506,00	0,00	\$	-
2	Rellenos									
2.01	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	31,50	\$	31.600,00	\$	995.400,00	31,50	\$	995.400,00
2.02	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6,63	\$	12.900,00	\$	85.527,00	6,63	\$	85.527,00
2.03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	0,00	\$	700,00	\$	-	0,00	\$	-
2.04	CONFORM.COMPACT SUBRASANTE CBR=95	M2	0,00	\$	2.400,00	\$	-	0,00	\$	-
3	Cimentacion y Estructura									
3.01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	27,84	\$	18.700,00	\$	520.608,00	27,84	\$	520.608,00
3.02	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	3,52	\$	261.100,00	\$	919.072,00	3,52	\$	919.072,00
3.03	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,05	\$	327.600,00	\$	671.580,00	2,05	\$	671.580,00
3.04	PEDESTAL CONCRETO	M3	0,00	\$	366.300,00	\$	-	0,00	\$	-
3.05	VIGA CIMENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,64	\$	497.100,00	\$	1.312.344,00	2,64	\$	1.312.344,00
3.06	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2,12	\$	803.700,00	\$	1.703.844,00	2,12	\$	1.703.844,00
3.07	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	2,64	\$	698.100,00	\$	1.842.984,00	2,64	\$	1.842.984,00
3.08	DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS	ML	0,00	\$	65.900,00	\$	-	0,00	\$	-
3.09	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	29,40	\$	27.200,00	\$	799.680,00	29,40	\$	799.680,00
3.10	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	0,00	\$	34.600,00	\$	-	0,00	\$	-
3.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1042,00	\$	3.300,00	\$	3.438.600,00	1042,00	\$	3.438.600,00
3.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	76,98	\$	4.700,00	\$	361.806,00	76,98	\$	361.806,00
3.13	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	\$	748.500,00	\$	-	0,00	\$	-
3.14	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KG	0,00	\$	6.000,00	\$	-	0,00	\$	-
3.15	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14	ML	0,00	\$	34.500,00	\$	-	0,00	\$	-
3.16	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	20,00	\$	11.000,00	\$	220.000,00	20,00	\$	220.000,00
4	Cubierta.									
4.01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	28,00	\$	131.800,00	\$	3.690.400,00	28,00	\$	3.690.400,00
4.02	IMPERM.MANTO 800XT. 4mm.	M2	0,00	\$	28.000,00	\$	-	0,00	\$	-
4.03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	5,40	\$	18.000,00	\$	97.200,00	5,40	\$	97.200,00
4.04	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML	17,80	\$	27.500,00	\$	491.280,00	17,80	\$	491.280,00


ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALIZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1				EJECUTADO ACUMULADO			
		UND.	CANT.	Vc-UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM	
4.05	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	0,00	\$ 14.300,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
4.06	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	2,00	\$ 9.400,00	\$ 18.800,00	2,00	\$ 18.800,00	2,00	\$ 18.800,00	2,00	\$ 18.800,00	100%	
4.07	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	8,00	\$ 17.200,00	\$ 137.600,00	8,00	\$ 137.600,00	8,00	\$ 137.600,00	8,00	\$ 137.600,00	100%	
4.08	CAJA INSPECCION 60x60 HAST 1,0M CONC+EXC	UND	3,00	\$ 188.400,00	\$ 565.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
4.09	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	3,00	\$ 103.700,00	\$ 311.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
4.1	C.F.PANEL YESO 12,7MM S.JUNTA+VINILO	M2	0,00	\$ 34.200,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
4.11	ASLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	0,00	\$ 17.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
4.12	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	0,00	\$ 40.700,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
4.13	REMA TE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	ML	29,40	\$ 53.000,00	\$ 1.558.200,00	29,40	\$ 1.558.200,00	29,40	\$ 1.558.200,00	29,40	\$ 1.558.200,00	100%	
4.14	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	0,00	\$ 19.200,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
4.15	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM	ML	0,00	\$ 14.700,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
4.16	CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	0,00	\$ 28.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
4.17	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2 0MM	ML	33,20	\$ 38.800,00	\$ 1.288.160,00	33,20	\$ 1.288.160,00	33,20	\$ 1.288.160,00	33,20	\$ 1.288.160,00	100%	
5	Carpinterías												
5.01	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31	M2	10,20	\$ 190.300,00	\$ 1.941.060,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
5.02	NAVE ALUMINIO NAVE-ENTAMBORADA-LLENA	M2	0,00	\$ 332.200,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
5.03	MARCOS EN ALUM 0.81-1.00M LISO C/ LUCETA	UND	8,00	\$ 181.300,00	\$ 1.450.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
5.04	CERRADURA YALE ENTRADA PPAL REF 5316	UND	1,00	\$ 135.100,00	\$ 135.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
6	Pisos.												
6.01	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	57,88	\$ 24.600,00	\$ 1.423.848,00	57,88	\$ 1.423.848,00	57,88	\$ 1.423.848,00	57,88	\$ 1.423.848,00	100%	
6.02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	31,54	\$ 19.700,00	\$ 621.338,00	31,54	\$ 621.338,00	31,54	\$ 621.338,00	31,54	\$ 621.338,00	100%	
6.03	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF 4	M2	31,54	\$ 48.400,00	\$ 1.526.536,00	31,54	\$ 1.526.536,00	31,54	\$ 1.526.536,00	31,54	\$ 1.526.536,00	100%	
6.04	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	24,20	\$ 11.300,00	\$ 273.460,00	24,20	\$ 273.460,00	24,20	\$ 273.460,00	24,20	\$ 273.460,00	100%	
7	Instalaciones Electricas y Domilizarlo												
7.01	SAL TOMA 1F (C/TAO):REGULADO P&S)	UND	4,00	\$ 82.000,00	\$ 328.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
7.02	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	0,00	\$ 210.400,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
7.03	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	\$ 79.600,00	\$ 477.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
7.04	SAL LAMP EMT	UND	6,00	\$ 94.100,00	\$ 564.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
7.05	SALIDA S3 EMT	UND	1,00	\$ 110.600,00	\$ 110.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
7.06	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	0,00	\$ 144.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
7.07	INSTALACION LAMPARA 2X98	UND	0,00	\$ 26.300,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
7.08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	6,00	\$ 26.600,00	\$ 159.600,00	6,00	\$ 159.600,00	6,00	\$ 159.600,00	6,00	\$ 159.600,00	100%	
7.09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	5,00	\$ 32.100,00	\$ 160.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
7.1	INSTALACION SWITCH	UND	0,00	\$ 6.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
7.11	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PTO	0,00	\$ 19.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
7.12	TUBERIA PVC 1.1/2"	ML	0,00	\$ 10.100,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
7.13	CODO 90 PRESION PVC 1.1/2"	UND	0,00	\$ 8.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
7.14	ACOME.E.3F(3/4"0-1#4/0)3"	ML	0,00	\$ 366.200,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
8	Mampostería, Repellos, Estucos y Pintura												
8.01	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	59,23	\$ 40.000,00	\$ 2.369.200,00	59,23	\$ 2.369.200,00	59,23	\$ 2.369.200,00	59,23	\$ 2.369.200,00	100%	
8.02	ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	ML	0,00	\$ 21.300,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
8.03	REPELLO MURO 1:3	M2	69,55	\$ 17.400,00	\$ 1.105.770,00	69,55	\$ 1.105.770,00	69,55	\$ 1.105.770,00	69,55	\$ 1.105.770,00	100%	
8.04	FILOS - DILATACIONES	ML	110,80	\$ 3.400,00	\$ 376.720,00	110,80	\$ 376.720,00	110,80	\$ 376.720,00	110,80	\$ 376.720,00	100%	
8.05	REPELLO VIGA CANAL [3C]	ML	0,00	\$ 24.800,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
8.06	ESTUCCO PLASTICO + RELLENO SIBLOQUE	M2	55,85	\$ 15.500,00	\$ 865.675,00	55,85	\$ 865.675,00	55,85	\$ 865.675,00	55,85	\$ 865.675,00	100%	
8.07	KORAZA [3M]	M2	61,01	\$ 8.300,00	\$ 508.383,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
ITEMS NUEVOS													
NP 01	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	27,13	\$ 61.200,00	\$ 1.660.356,00	27,13	\$ 1.660.356,00	27,13	\$ 1.660.356,00	27,13	\$ 1.660.356,00	100%	
NP 02	ALFAGIA CONCRETO A= 25 - 30CM	ML	25,70	\$ 28.853,00	\$ 727.096,00	25,70	\$ 727.096,00	25,70	\$ 727.096,00	25,70	\$ 727.096,00	100%	
NP 03	PINTURA TIPO 1 INTERIOR, 3 MANOS	M2	55,85	\$ 8.100,00	\$ 452.385,00	55,85	\$ 452.385,00	55,85	\$ 452.385,00	55,85	\$ 452.385,00	100%	
NP 04	PANETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3	M2	61,01	\$ 19.597,00	\$ 1.195.613,00	61,01	\$ 1.195.613,00	61,01	\$ 1.195.613,00	61,01	\$ 1.195.613,00	100%	
NP 05	TUBERIA PVC 2 SANITARIA	ML	7,80	\$ 17.480,00	\$ 136.344,00	7,80	\$ 136.344,00	7,80	\$ 136.344,00	7,80	\$ 136.344,00	100%	
NP 06	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	2,00	\$ 54.000,00	2,00	\$ 54.000,00	2,00	\$ 54.000,00	100%	
NP 07	REJILLA PARA SIFON 3x2"	UND	2,00	\$ 21.000,00	\$ 42.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALIZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1				EJECUTADO ACUMULADO			
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM	
NP 08	PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO, CON CUERPO FIJO DE 0.70 MTS Y DOS CUERPOS BATIENTES CADA UNO DE 1 X 2 MTS	UND	1,00	\$ 4.414.333,00	\$ 4.414.333,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 09	PANEL LED 0.60 X 0.60 MTS	UND	6,00	\$ 170.000,00	\$ 1.020.000,00	6,00	\$ 1.020.000,00	6,00	\$ 1.020.000,00	6,00	\$ 1.020.000,00	100%	
NP 10	CANAL GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.61 MTS	ML	8,10	\$ 118.375,00	\$ 958.838,00	8,10	\$ 958.838,00	8,10	\$ 958.838,00	8,10	\$ 958.838,00	100%	
NP 11	ACOMETIDA CABLE STP CATEGORIA 6. VOZ Y DATOS	ML	55,00	\$ 30.050,00	\$ 1.652.750,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 12	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, 8 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR	UND	1,00	\$ 570.250,00	\$ 570.250,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO, 8 CIRCUITOS	UND	1,00	\$ 154.417,00	\$ 154.417,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,00	\$ 17.750,00	\$ 17.750,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 15	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT)	UND	1,00	\$ 133.180,00	\$ 133.180,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 60 CMS	UND	1,00	\$ 412.900,00	\$ 412.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 17	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	1,00	\$ 73.533,00	\$ 73.533,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 18	TOMA JACK FACE PLATE. VOZ Y DATOS	UND	1,00	\$ 49.900,00	\$ 49.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 19	ACOME E.3F(3#2+1#6) NO REGULADA	ML	55,00	\$ 104.730,00	\$ 5.760.150,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 20	ACOME E.2F(2#2+1#6) REGULADA	ML	100,00	\$ 78.480,00	\$ 7.848.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
NP 21	TUBO CORRUGADO ELÉCTRICO DE 3"	ML	105,00	\$ 48.178,00	\$ 5.058.690,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
9	Sala de Capacitación y Entrenamiento.												
9.01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	35,62	\$ 1.700,00	\$ 60.554,00	35,62	\$ 60.554,00	35,62	\$ 60.554,00	35,62	\$ 60.554,00	100%	
9.02	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	35,62	\$ 8.900,00	\$ 317.018,00	35,62	\$ 317.018,00	35,62	\$ 317.018,00	35,62	\$ 317.018,00	100%	
9.03	REPELLO MURO 1:3	M2	35,62	\$ 17.400,00	\$ 619.788,00	35,62	\$ 619.788,00	35,62	\$ 619.788,00	35,62	\$ 619.788,00	100%	
9.04	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	11,73	\$ 4.000,00	\$ 46.920,00	11,73	\$ 46.920,00	11,73	\$ 46.920,00	11,73	\$ 46.920,00	100%	
9.05	RETRO LAMPARA	UND	1,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
9.06	RETRO SWITCH O TOMA	UND	0,00	\$ 2.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
9.07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	\$ 26.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
9.08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00	100%	
9.09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	0,00	\$ 32.100,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
9.1	INSTALACION SWITCH	UND	0,00	\$ 6.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
9.11	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	11,73	\$ 7.200,00	\$ 84.456,00	11,73	\$ 84.456,00	11,73	\$ 84.456,00	11,73	\$ 84.456,00	100%	
9.12	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	11,73	\$ 61.200,00	\$ 717.876,00	11,73	\$ 717.876,00	11,73	\$ 717.876,00	11,73	\$ 717.876,00	100%	
9.13	CERAMICA 30.01-32.50X30.01-32.50 TRAF 4	M2	11,73	\$ 48.400,00	\$ 567.732,00	11,73	\$ 567.732,00	11,73	\$ 567.732,00	11,73	\$ 567.732,00	100%	
9.14	DESMONTE CAJONERA	UND	0,00	\$ 4.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
10	Baño.												
10.01	DESM APARATO SANITARIO	UND	2,00	\$ 22.400,00	\$ 44.800,00	2,00	\$ 44.800,00	2,00	\$ 44.800,00	2,00	\$ 44.800,00	100%	
10.02	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	25,02	\$ 7.200,00	\$ 180.144,00	25,02	\$ 180.144,00	25,02	\$ 180.144,00	25,02	\$ 180.144,00	100%	
10.03	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	4,22	\$ 4.000,00	\$ 16.880,00	4,22	\$ 16.880,00	4,22	\$ 16.880,00	4,22	\$ 16.880,00	100%	
10.04	RETRO LAMPARA	UND	1,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	1,00	\$ 4.500,00	1,00	\$ 4.500,00	1,00	\$ 4.500,00	100%	
10.05	RETRO SWITCH O TOMA	UND	2,00	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00	2,00	\$ 5.000,00	2,00	\$ 5.000,00	2,00	\$ 5.000,00	100%	
10.06	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	\$ 26.300,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	N/A	
10.07	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00	1,00	\$ 26.600,00	100%	
10.08	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	1,00	\$ 32.100,00	\$ 32.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
10.09	INSTALACION SWITCH	UND	2,00	\$ 6.000,00	\$ 12.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
10.1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	4,22	\$ 61.200,00	\$ 258.264,00	4,22	\$ 258.264,00	4,22	\$ 258.264,00	4,22	\$ 258.264,00	100%	
10.11	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	4,22	\$ 25.600,00	\$ 108.032,00	4,22	\$ 108.032,00	4,22	\$ 108.032,00	4,22	\$ 108.032,00	100%	
10.12	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	25,02	\$ 44.600,00	\$ 1.115.892,00	25,02	\$ 1.115.892,00	25,02	\$ 1.115.892,00	25,02	\$ 1.115.892,00	100%	
10.13	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JGO	1,00	\$ 85.700,00	\$ 85.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
10.14	INSTALACION SANITARIO	UND	2,00	\$ 21.000,00	\$ 42.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
10.15	INSTALACION LAVAMANOS	UND	1,00	\$ 20.800,00	\$ 20.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
10.16	DISPENSADOR JABON 1.2 LTS A INOX	UND	1,00	\$ 145.800,00	\$ 145.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	
10.17	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO A INOX	UND	1,00	\$ 155.200,00	\$ 155.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALIZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
10.18	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	1,00	\$ 226.300,00	\$ 226.300,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.19	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.	UND	1,00	\$ 1.024.500,00	\$ 1.024.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.2	ESPEJO CLARO DE 3MM	M2	0,50	\$ 38.900,00	\$ 19.450,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.21	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	JGO	1,00	\$ 147.200,00	\$ 147.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.22	ORINAL PEQUEÑO	UND	1,00	\$ 158.200,00	\$ 158.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.23	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO	UND	1,00	\$ 245.400,00	\$ 245.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.24	DUCHA MEZCLADORA (M)	UND	1,00	\$ 93.100,00	\$ 93.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.25	DIV.BANO A INOX ORINAL 96X46CM	UND	1,00	\$ 385.700,00	\$ 385.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.26	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M2	4,00	\$ 194.600,00	\$ 778.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.27	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	\$ 6.700,00	\$ 13.400,00	2,00	\$ 13.400,00	2,00	\$ 13.400,00
10.28	NAVE ALUMINIO NAVE-ENTAMBORADA-LLENA	M2	6,85	\$ 332.200,00	\$ 2.275.570,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.29	CERRADURA BANO ALUMINIO	UND	1,00	\$ 53.400,00	\$ 53.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.3	MARCOS EN ALUM 0,81-1,00M LISO C/ LUCETA	UND	0,00	\$ 181.300,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11	Torre de Control.								
11.01	REPELLO MURO 1:3	M2	11,70	\$ 17.400,00	\$ 203.580,00	11,70	\$ 203.580,00	11,70	\$ 203.580,00
11.02	ESTUCCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	47,32	\$ 8.400,00	\$ 397.488,00	47,32	\$ 397.488,00	47,32	\$ 397.488,00
11.03	VINOLO CIELO TIPO 1 [SM]	M2	47,32	\$ 8.900,00	\$ 421.148,00	47,32	\$ 421.148,00	47,32	\$ 421.148,00
11.04	DESM.VENTANA EXISTENTE	M3	39,02	\$ 17.400,00	\$ 678.948,00	39,02	\$ 678.948,00	39,02	\$ 678.948,00
11.05	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3,00	\$ 15.900,00	\$ 47.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.06	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31 - SIN VIDRIO	M2	40,93	\$ 163.500,00	\$ 6.692.055,00	40,93	\$ 6.692.055,00	40,93	\$ 6.692.055,00
11.07	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM	M2	39,02	\$ 194.400,00	\$ 7.585.488,00	39,02	\$ 7.585.488,00	39,02	\$ 7.585.488,00
11.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE OPALIZADO	M3	39,02	\$ 53.100,00	\$ 2.071.962,00	39,02	\$ 2.071.962,00	39,02	\$ 2.071.962,00
11.09	LUJADA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	ML	0,00	\$ 11.200,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
ITEMS NUEVOS									
NPC 01	PANEL LED 0.60 X 0.60 MTS	UND	2,00	\$ 170.000,00	\$ 340.000,00	2,00	\$ 340.000,00	2,00	\$ 340.000,00
NPC 02	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	13,70	\$ 11.300,00	\$ 154.810,00	13,70	\$ 154.810,00	13,70	\$ 154.810,00
NPC 03	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	8,96	\$ 24.600,00	\$ 220.416,00	8,96	\$ 220.416,00	8,96	\$ 220.416,00
NPC 04	ALISTADO PISO 4 CM	M2	11,73	\$ 19.700,00	\$ 231.081,00	11,73	\$ 231.081,00	11,73	\$ 231.081,00
COSTO DIRECTO TOTAL									
	ADMINISTRACION		31,00%		\$ 88.940.024,00		\$ 88.940.024,00		\$ 88.940.024,00
	IMPREVISTOS		21,00%		\$ 20.777.405,00		\$ 20.777.405,00		\$ 20.777.405,00
	UTILIDAD		6,00%		\$ 5.936.401,00		\$ 5.936.401,00		\$ 5.936.401,00
	SUBTOTAL		4,00%		\$ 3.957.601,00		\$ 3.957.601,00		\$ 3.957.601,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		\$ 129.611.431,00		\$ 129.611.431,00		\$ 129.611.431,00
	TOTAL				\$ 751.945,00		\$ 751.945,00		\$ 751.945,00
					\$ 130.363.376,00		\$ 130.363.376,00		\$ 130.363.376,00


 DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
 Representante Legal
 CONTRATISTA: COMSORCIO OBRAS 2020


 U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
 JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
 Apoyo a la supervision


 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 VOBO MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR AERONAUTIGO REGIONAL VALLE

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	OBJETO: RVL00763 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.	VALOR INICIAL: \$ 105.673.174,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020
	AEROPUERTO: AEROPUERTO MATECAÑA - SANTANA CONTRATO No.20001103-H4	VALOR ADICIONAL: \$ 24.690.202,00 INCLUIDO IVA SOBRE U	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ
	PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	VALOR FINAL: \$ 130.363.376,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	
	PLAZO ADICIONAL: PLAZO FINAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		

ACTA DE COBRO PARCIAL

El día 21 de diciembre de 2020 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, se reunieron el Ingeniero DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO representante legal del contratista de obra CONSORCIO OBRAS 2020, MILTON CESAR SANCHEZ, quien actúa como Supervisor, y JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, con el objeto de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 y el 21 de diciembre del 2020 determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades de obra ACTA DE COBRO PARCIAL, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALORES

1. Valor Inicial Contrato		\$ 105.673.174
2. Valor Adicional		\$ 24.690.202
3. Valor total del Contrato (1+2)		\$ 130.363.376
4. Valor Pagado por Anticipo	0%	\$ 0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		\$ 130.363.376
6. Valor Presente Acta No. 01		\$ 79.111.472,96
7. Amortización en esta acta	0%	\$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)		\$ -
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		\$ 79.111.472,96
10. Pagos Actas Anteriores		\$ -
11. Valor pagado a la Fecha		\$ -
12. Saldo por pagar del presente Contrato		\$ 130.363.376,00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		60,69%

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría contratada por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolución 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoría y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

 Contratista: CONSORCIO OBRAS 2020 DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO Representante Legal	 U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA Apoyo a la supervisión
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL VoBo MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE COBRO PARCIAL

NUMERO:

CONTRATO No.20001103-H4

CONTRATISTA:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020

SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:

SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

COSTO TOTAL BRUTO

\$79.111.472,96

(Costo Directo + A.I.U. + IVA SOBRE U)

Porcentaje estimado para el A.I.U

31,0%

COSTO DIRECTO

Costo Total Directo

\$60.042.102,00

UTILIDAD


(Costo Directo x 4% estimado de Utilidad)

\$2.401.684,00

IVA


Utilidad x 19% estimado para el IVA

\$456.319,96


DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO


Representante Legal

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020


U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

JUAN DAVID RODRIGUEZ

Apoyo a la Supervision


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVILVoBo MILTON CÉSAR SANCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE



RVL00783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	3.80		8.30				31.54		LUGAR
						TOTAL	0,00	0,00	31,54	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	11.80		12.70			24.50		0	LUGAR
			11.20		13.00			24.20			
						TOTAL	0,00	48,70	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
1.03	RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND					2,00			0,00	LUGAR
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
1.04	EXCAVACION DE TIERRA A MANO (VIGAS CIMENTO)	M3	0.80	0.75	0.80		8,00			3.84	LUGAR
			0.40	0.70	5.60		2,00			3.14	ZAPATAS
			0.40	0.70	2.70		4,00			3.02	CICLOPEO
			2.45	0.15	3.00		2,00			2.21	SOLADO
			1.90	0.15	3.00		1,00			0.86	ANDENES
			0.70	0.15	26.20		1,00			2.75	
			2.00	0.30	4.00		1,00			2.40	TUBERIA CORRUGADA
			1.00	1.00	35.00		1,00			35.00	
						TOTAL	14,00	0,00	0,00	53.22	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
1.05	DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO	M2	3.80		8.30				31.54	0.00	LUGAR
			2.00		4.00				8.00	0.00	
			0.70		26.20				18.34	0.00	
						TOTAL	0,00	0,00	57,88	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
2.01	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	1.00	0.90	35.00		1,00			31.50	LUGAR
						TOTAL	1,00	0,00	0,00	31,50	

 RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEROS REGIONAL VALLE													
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN
2.02	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)			LUGAR
			8.30	0.20	3.20				5.31				
			0.70	0.05	26.20				0.92				
			2.00	0.05	4.00				0.40				
						TOTAL	0.00	0.00	6.63	0.00			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN
3.01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	#REF!		LUGAR
			0.80	0.05	0.80		8.00		5.12	0.03			
			2.55	0.05	3.20		2.00		16.32	0.41			
			2.00	0.05	3.20		1.00		6.40	0.32			
						TOTAL	10.00	0.00	27.84	1.00			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN
3.02	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)			LUGAR
			0.40	0.40	2.70		4.00			1.73			
			0.40	0.40	2.05		4.00			1.31			
			0.40	0.40	1.50		2.00			0.48			
						TOTAL	0.00	0.00	0.00	3.52			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN
3.03	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)			LUGAR
			0.80	0.40	0.80		8.00			2.05			
						TOTAL	8.00	0.00	0.00	2.05			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN
3.05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)			LUGAR
			0.30	0.30	8.30		2.00		16.60	1.49			
			0.30	0.30	3.20		4.00		12.80	1.15			
						TOTAL	6.00	29.00	0.00	2.64			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN
3.06	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)			LUGAR
			0.30	2.70	0.30		4.00			0.97			
			0.30	3.20	0.30		4.00			1.15			
						TOTAL	8.00	0.00	0.00	2.12			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN
3.07	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)			LUGAR
			0.30	0.30	8.30		2.00		16.60	1.49			
			0.30	0.30	3.20		4.00		12.80	1.15			
						TOTAL	6.00	29.00	0.00	2.64			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL					LOCALIZACIÓN



RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

3.09	VIGA CONDR. AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					3.20		4.00	12.80		0.00	
					8.30		2.00	16.60		0.00	
						TOTAL		29.40		0.00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Longitud (M)	Peso (Kis)	Cant	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Peso(Kis)	
3.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.00	1.00	16.00		8.00			128.00	ZAPATAS
			3.92	1.00	4.00		4.00			62.72	COLUMNAS POSTERIORES
			1.04	0.56	21.00		4.00			48.92	FLEJES COLUMNAS POSTERIORES
			4.42	1.00	4.00		4.00			70.72	COLUMNAS FRONTALES
			1.04	0.56	25.00		4.00			58.24	FLEJES COLUMNAS FRONTALES
			6.00	1.00	2.00		4.00			48.00	VIGA AMARRE
			6.00	1.00	2.00		4.00			48.00	VIGA AMARRE
			2.30	1.00	2.00		2.00			9.20	VIGA AMARRE
			1.50	1.00	2.00		2.00			6.00	VIGA AMARRE
			3.80	1.00	4.00		2.00			30.40	FLEJES VIGA AMARRE
			1.04	0.56	225.00		1.00			131.04	VIGA AEREA
			6.00	1.00	2.00		4.00			48.00	VIGA AEREA
			6.00	1.00	2.00		4.00			48.00	VIGA AEREA
			2.30	1.00	2.00		2.00			9.20	VIGA AEREA
			1.50	1.00	2.00		2.00			6.00	VIGA AEREA
			3.80	1.00	4.00		2.00			30.40	VIGA AEREA
			1.04	0.56	225.00		1.00			131.04	FLEJES VIGA AEREA
			5.30	1.00	4.00		2.00			42.40	VIGA CINTA
			4.90	1.00	2.00		4.00			39.20	VIGA CINTA
			0.37	0.56	225.00		1.00			46.62	FLEJES VIGA CINTA
						TOTAL				1042.00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Longitud (M)	Peso (Kis)	Cant	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Peso(Kis)	
3.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG		1.33					31.54	41.95	
				1.33					18.34	24.39	
				1.33					8.00	10.64	
						TOTAL				76.98	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
3.16	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG					20.00				
						TOTAL			0.00	0.00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
4.01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	3.50		8.00				28.00	0.00	
						TOTAL			28.00	0.00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES			TOTAL	LOCALIZACIÓN

 ASESORIA CIVIL ASESORES		RVLCO783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE									
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	EXPANSIÓN	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
4.03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML			2,70		2,00	5,40			
						TOTAL	2,00	5,40	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	EXPANSIÓN	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
4.04	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML			7,80			7,80		0,00	
					10,00			10,00		0,00	
						TOTAL	0,00	17,80	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	EXPANSIÓN	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
4.06	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND					2,00				BAJANTES
							2,00				SIFONES
						TOTAL	4,00	0,00	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	EXPANSIÓN	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
4.07	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND					8,00			0,00	
										0,00	
						TOTAL	8,00	0,00	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
4.13	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	ML			8,30		2,00	16,60			
					3,20		4,00	12,80			
								0,00			
								0,00			
						TOTAL		29,40	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
4.17	TUBO ESTRUCTURAL 75x 38x2,0MM	ML			8,30		4,00	33,20			
						TOTAL		33,20	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
6.01	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	3,80		8,30			31,54			SALA DE CAPACITACIONES
			0,70		26,20			18,34			ANDENES PERIMETRALES
			2,00		4,00			8,00			
						TOTAL	0,00	57,88	0,00	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	CANT (UND)	LONG TOTAL (ML)	AREA (M²)	VOLUMEN (M³)	LUGAR
6.02	ALUSTADO PISO 4 CM	M2	3,80		8,30			31,54			
						TOTAL					

	<p>RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE</p>
---	---

			2.00	2.55		-1.00		-5.10				
			3.50	7.90		1.00		27.65				MURO FRONTAL INTERIOR
			0.40	0.80		-2.00		-0.64				
			2.00	2.55		-1.00		-5.10				
			2.70	2.00		-1.00		-5.40				
			3.10	3.30		1.00		10.23				MURO LATERAL INTERIOR IZQUIERDO
			0.40	0.80		-2.00		-0.64				
			3.10	3.50		1.00		10.85				MURO LATERAL INTERIOR DERECHO
			0.40	0.80		-2.00		-0.64				
			0.55	3.50		4.00		7.70				CUCHILLAS
						TOTAL		0.00	63.55	0.00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL			LOCALIZACIÓN
8.04	FILOS - DILATACIONES	M/L	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)
					110.80		1.00	110.80		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN	
	ESTUCO PLASTICO + RELLENO SUBLOQUE		M2		Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR	
8.06						3.20	7.90		1.00		25.28		MURO POSTERIOR INTERIOR	
						0.40	0.80		-0.64					
						2.00	2.55		-1.00		-5.10			
						3.50	7.90		1.00		27.65	MURO FRONTAL INTERIOR		
						0.40	0.80		-0.64					
						2.00	2.55		-1.00		-5.10			
						2.70	2.00		-1.00		-5.40			
						3.10	3.30		1.00		10.23			
						0.40	0.80		-0.64					
						3.10	3.50		1.00		10.85			
						0.40	0.80		-2.00		-0.64			
					TOTAL									0.00

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 01	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3.30		2.60		1.00		8.58		
			3.50		5.30		1.00		18.55		
						TOTAL	2.00	0.00	27.13	0.00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL			LOCALIZACIÓN	
NP 02	ALFAGIA CONCRETO A= 25 - 30CM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					25.20		1.00	25.20			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	
NP 02	ALFAGIA CONCRETO A= 25 - 30CM	ML									MURO LATERAL INTERIOR DERECHO
TOTAL								25.20	0.00	0.00	

AERONAUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

NP 10	CANAL GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0,61 MTS	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					8,10		1,00	8,10	0,00		
						TOTAL	1,00	8,10	0,00	0,00	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL			LOCALIZACIÓN	
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
NP 11	ACOMETIDA CABLE STP CATEGORIA 6. VOZ Y DATOS	ML			55.00		1.00	55.00	0.00		
						TOTAL	1.00	55.00	0.00	0.00	

AEROPUERTO SANTANA DE CARTAGO

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES						TOTAL		LOCALIZACIÓN
	RASQUETEADA-LUJADA-RESANE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
9.01			3.45	2.50			2.00		17.94		
			3.40	2.80			2.00		17.68		
									0.00		
									0.00		
						TOTAL		0.00	35.62	0.00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9.02	VINOLO CIELO TIPO 1 (3M)	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3.45	2.50			2.00		17.94		
			3.40	2.60			2.00		17.68		
									0.00		
									0.00		
						TOTAL		0.00	35.62	0.00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9.03	REPELLO MURO 1:3	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3.45	2.60			2.00		17.94		
			3.40	2.60			2.00		17.88		
									0.00		
									0.00		
						TOTAL		0.00	35.62	0.00	

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
9,04	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	3,45		3,40			11,73		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
						TOTAL		0,00	0,00	
								11,73		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES	TOTAL	LOCALIZACIÓN
---------	-------------	--------	-------------	-------	--------------



RVI C0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

9.08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							1,00		0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
9,11	DEMOL ENCHAPE CERAMICO	M2	3,45		3,40				11,73		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	11,73	0,00	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
9,12	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	3,45		3,40				11,73		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	11,73	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL		LOCALIZACIÓN	
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
9,13	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	3,45		3,40			11,73		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
						TOTAL		11,73	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL			LOCALIZACIÓN	
		UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (MIL)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
10.01	DESM.APARATO SANITARIO						2.00		0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
						TOTAL	2.00	0.00	0.00	0.00	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10.02	DEMOL ENCHAPE CERAMICO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,76		2,40		1,00		4,22		Piso
			1,76		2,50		2,00		8,80		Paredes
			2,40		2,50		2,00		12,00		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	25,02	0,00	

[illegible]

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

	1.76	2.40	1.00	4.22	
				0.00	
			TOTAL	1.00	0.00
				4.22	0.00

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES.						TOTAL		LOCALIZACIÓN
		UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
10,04	RETIRO LAMPARA						1,00		0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	0,00	0,00	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
		UND	Ancho (ft)	Altura (ft)	Longitud (ft)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
10.05	RETIRO SWITCHE O TOMA						2,00		0,00		
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES						TOTAL		LOCALIZACIÓN
		M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
10,1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM		1,76		2,40		1,00		4,22		
						TOTAL	1,00	0,00	4,22	0,00	

[illegible]

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES			TOTAL			LOCALIZACIÓN	
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
10.12	ENCHAPE CERÁMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	1.76		2.40		1.00	4.22		

[illegible]

	0,50	1,00							
	0,82	0,82				8,00		8,50	
						1,00		1,44	
	0,57	0,82				1,00		1,39	
					TOTAL		0,00	39,02	0,00

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL		LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (M/L)	Area (M²)	Volumen (M³)
11,06	VENTANA ALUM.FIJA P.3B-3I - SIN VIDRIO	M2	2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			2,50	1,16			1,00		3,66	
			0,50	1,00			8,00		8,50	
			0,70	0,90			1,00		1,60	
			0,65	0,90			1,00		1,55	
						TOTAL		0,00	40,93	0,00

[illegible]

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL		LOCALIZACIÓN	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OPALIZADO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cent (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
11.08			2.45	1.13			1.00		3.58		
			2.40	1.13			1.00		3.53		
			2.43	1.13			1.00		3.56		
			2.43	1.13			1.00		3.56		
			2.43	1.13			1.00		3.56		
			1.65	1.13			1.00		2.78		
			2.43	1.13			1.00		3.56		
			2.43	1.13			1.00		3.56		
			0.50	1.00			8.00		8.50		
			0.62	0.82			1.00		1.44		
			0.57	0.82			1.00		1.39		



RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

							TOTAL			0,00	39,02	0,00	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN		
11,09	LJADA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR		
						TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN		
NPC 01	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR		
							2,00		0,00				
									0,00				
									0,00				
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN		
NPC 02	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR		
			3,45	3,40			2,00	13,70					
						TOTAL		13,70	0,00	0,00			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN		
NPC 03	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Pc/sj	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR		
			3,45		3,40		1,00		11,73				
			2,05		1,35	-1,00			-2,77				
									0,00				
						TOTAL		0,00	8,96	0,00			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN		
NPC 04	ALISTADO PISO 4 CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR		
			3,45		3,40		1,00		11,73				
						TOTAL	1,00	0,00	11,73	0,00			

CONSORCIO OBRAS 2020

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL - NIT 899999059-3

CONTRATO: 20001103 H4 A DE 2020

OBJETO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO
OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE
CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO N° 1.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente.




ACTIVIDADES TECNICAS.

1. AEROPUERTO PEREIRA




PRELIMINARES Y RELLENOS




CONSORCIO OBRAS 2020

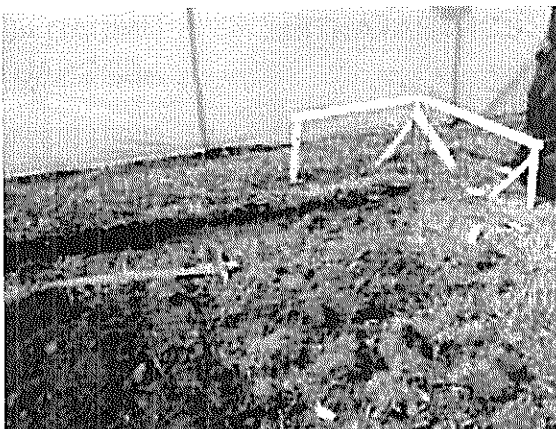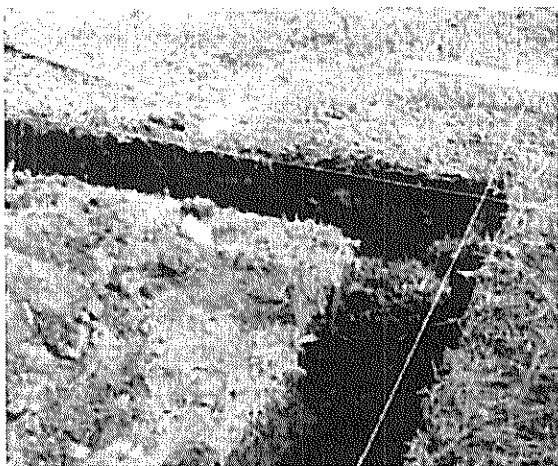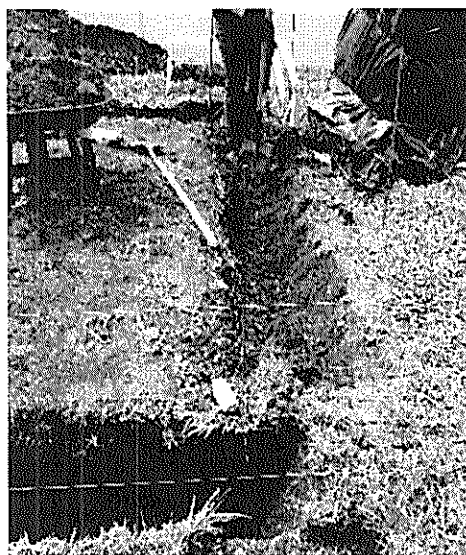



CONSORCIO OBRAS 2020

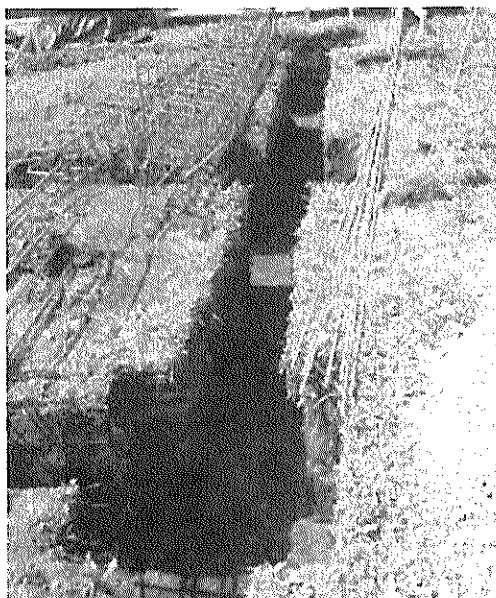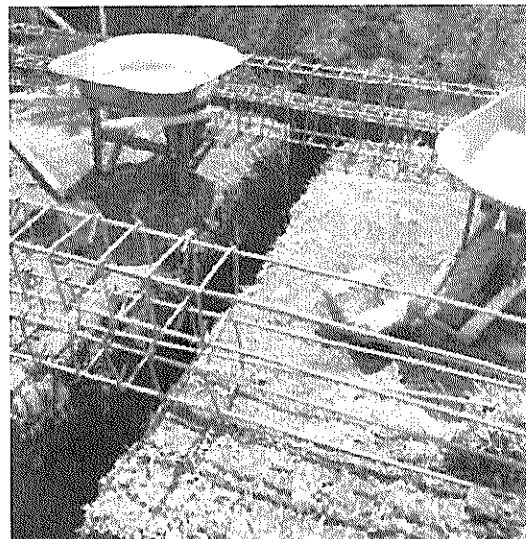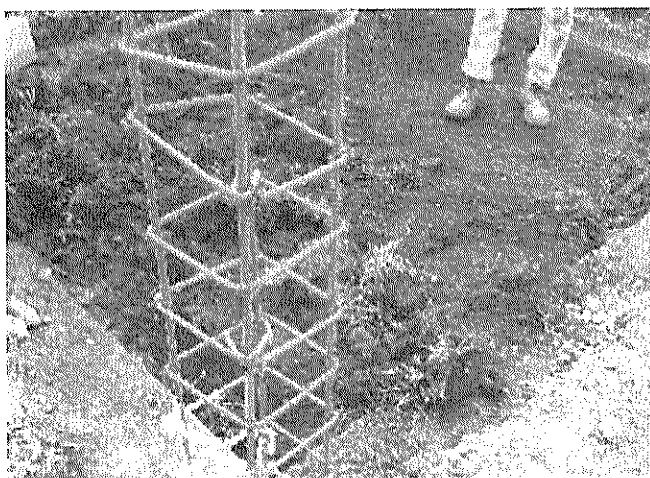







CONSORCIO OBRAS 2020

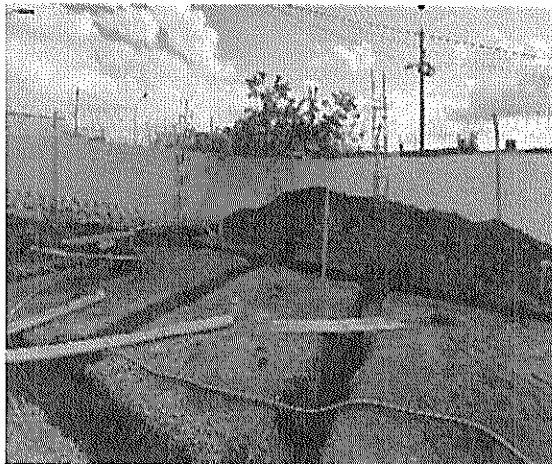






CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

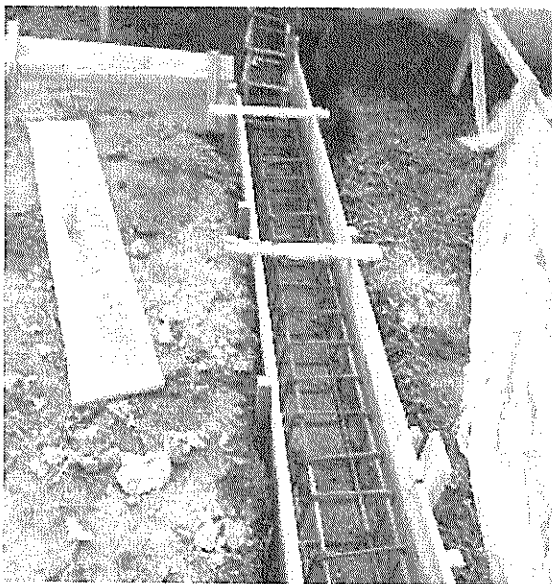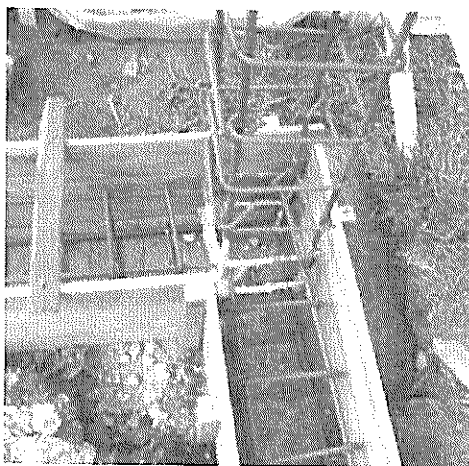




CONSORCIO OBRAS 2020

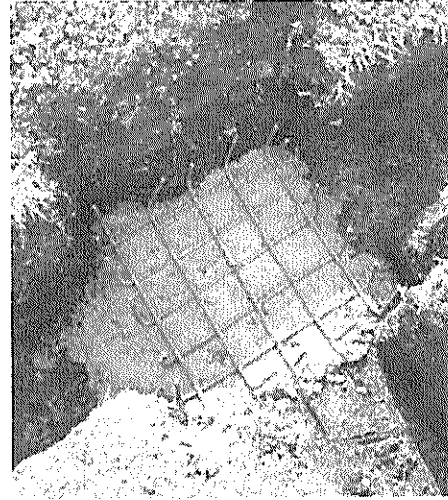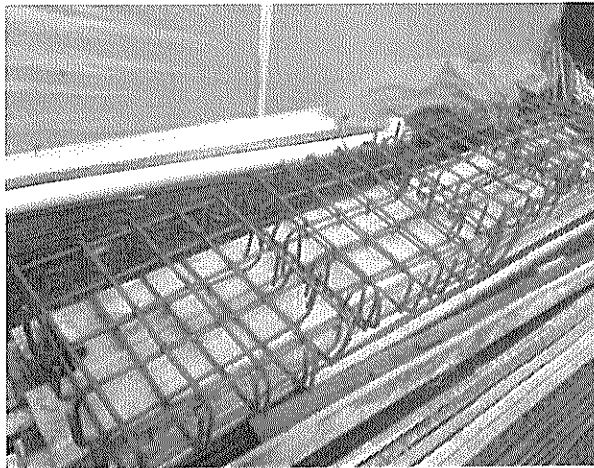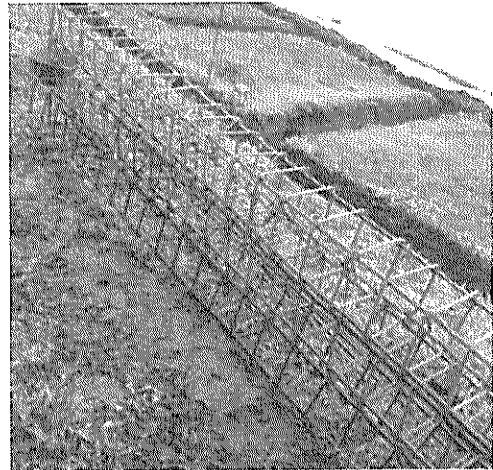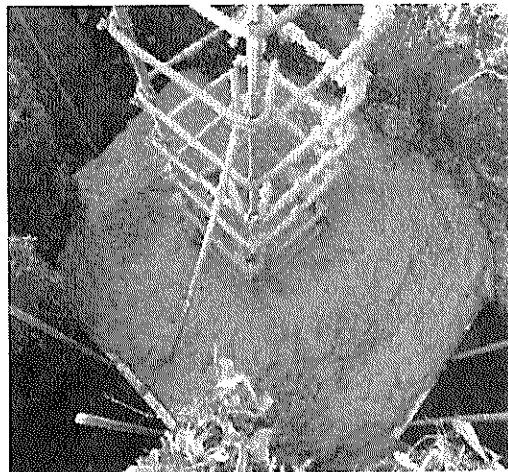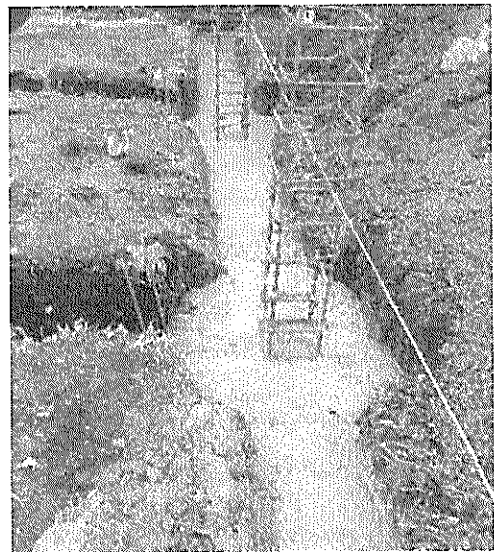

CONSORCIO OBRAS 2020

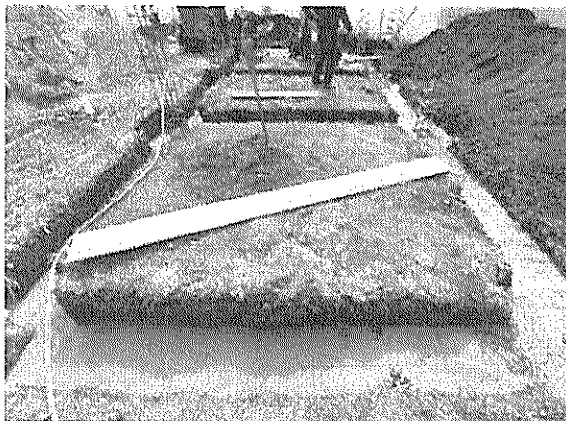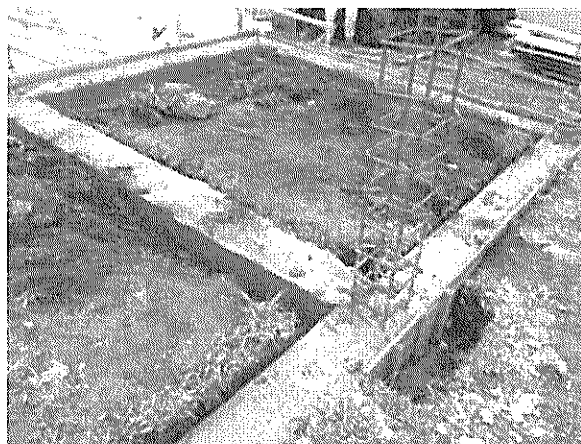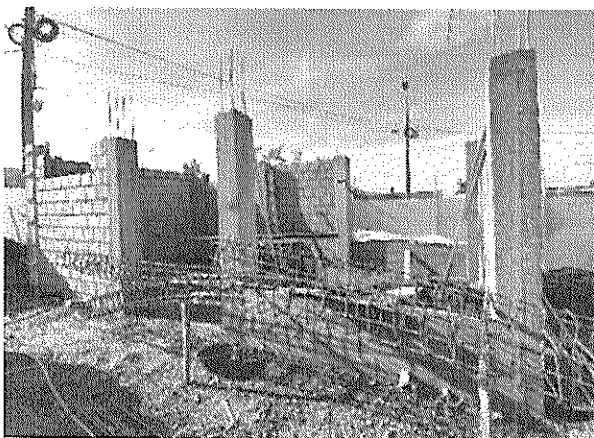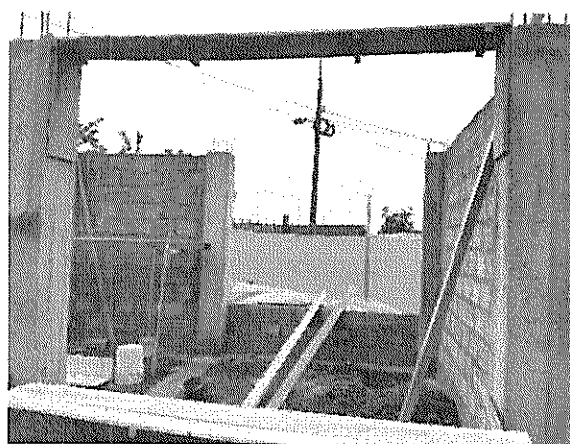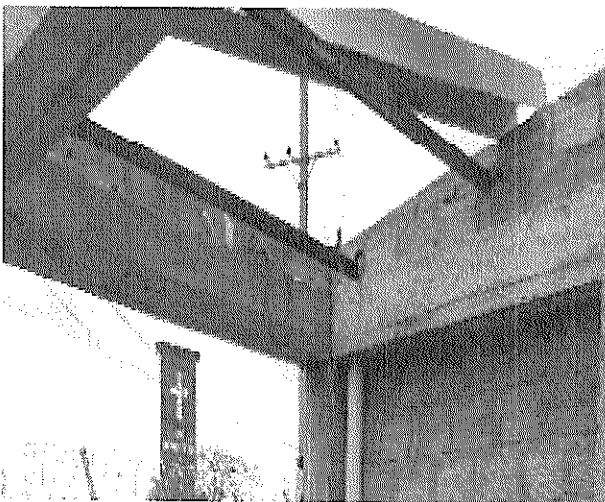


CONSORCIO OBRAS 2020

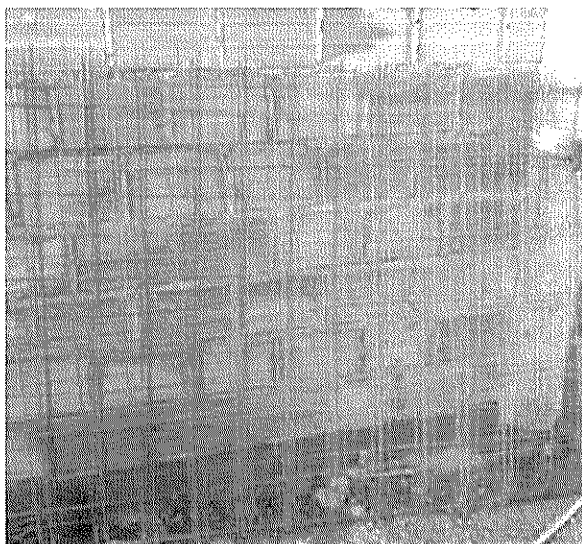
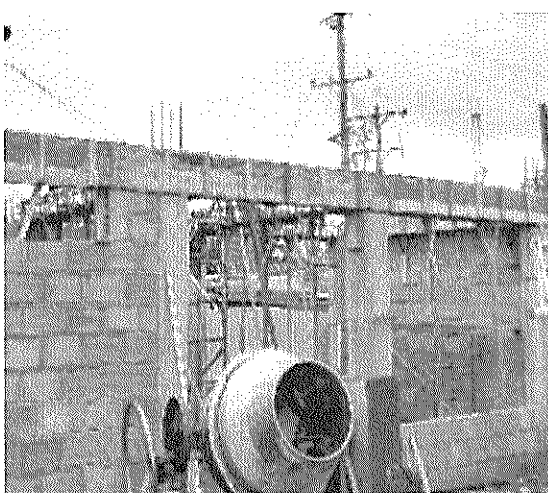
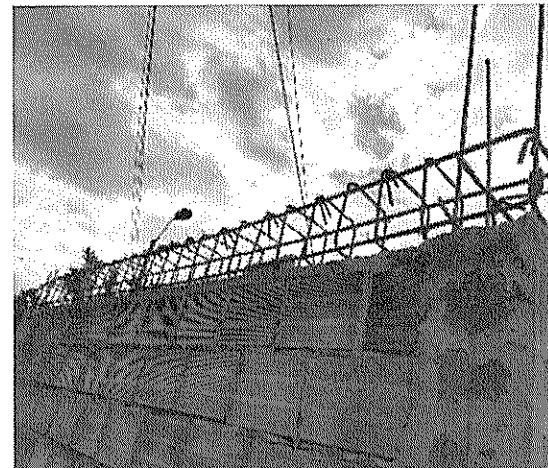


CONSORCIO OBRAS 2020

CUBIERTA


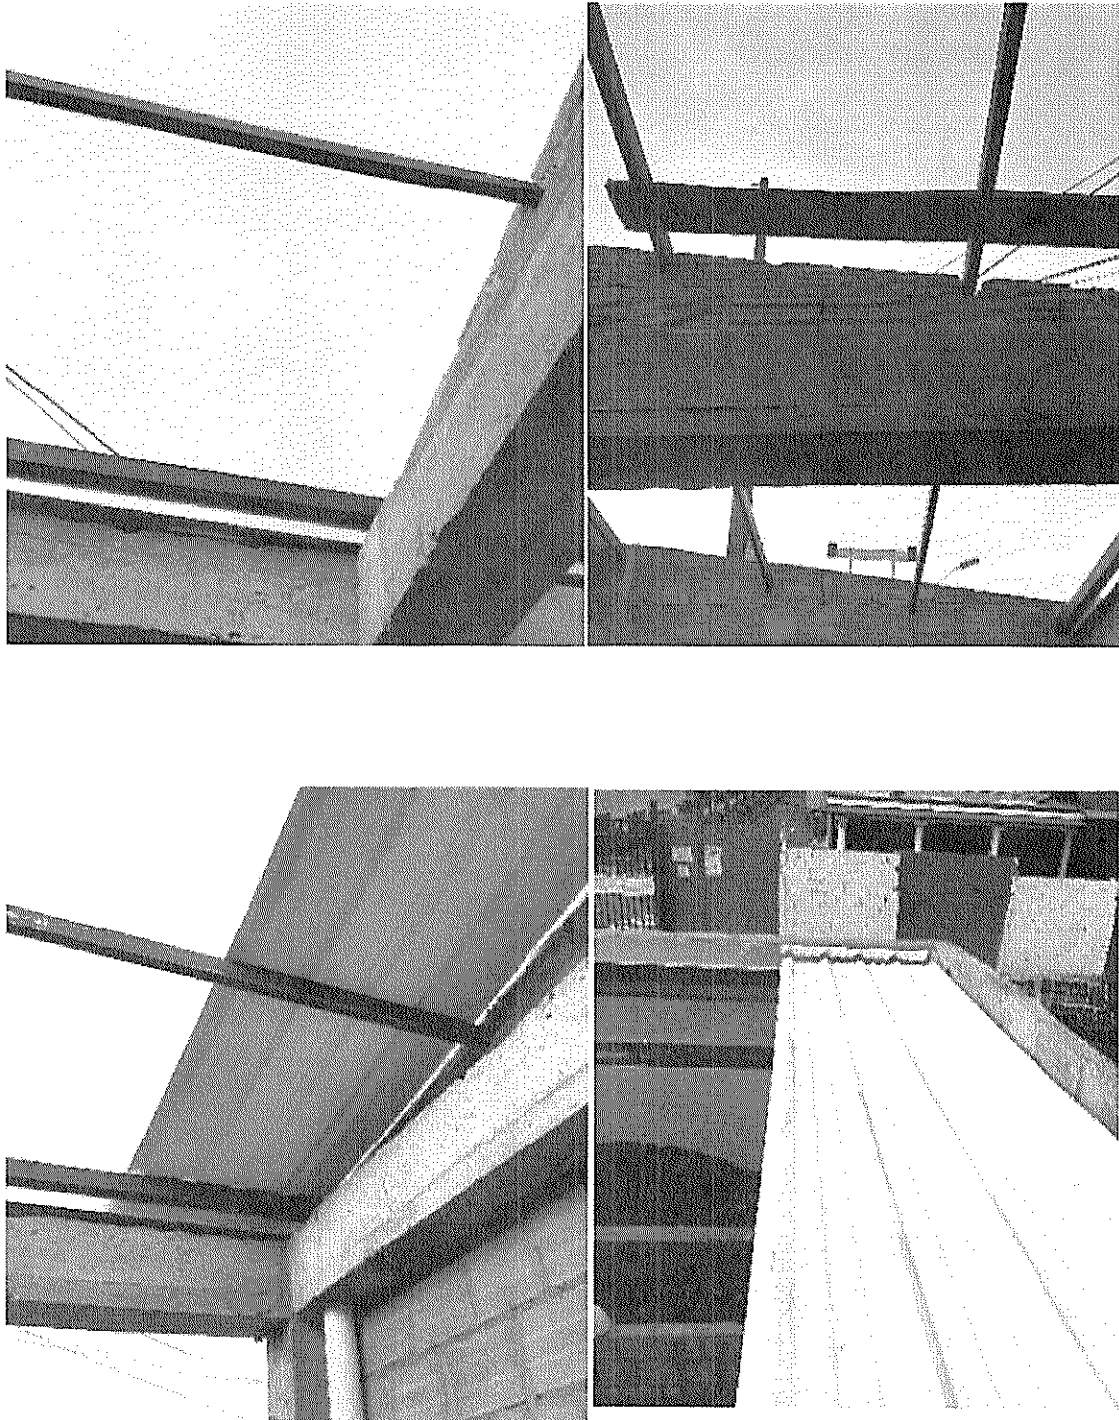


CONSORCIO OBRAS 2020

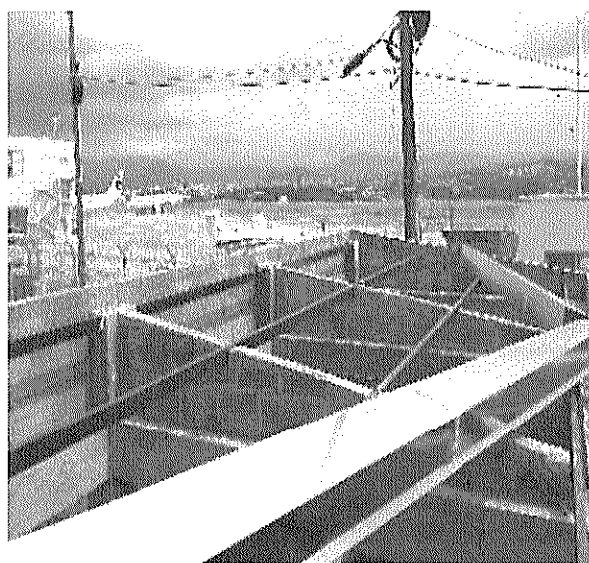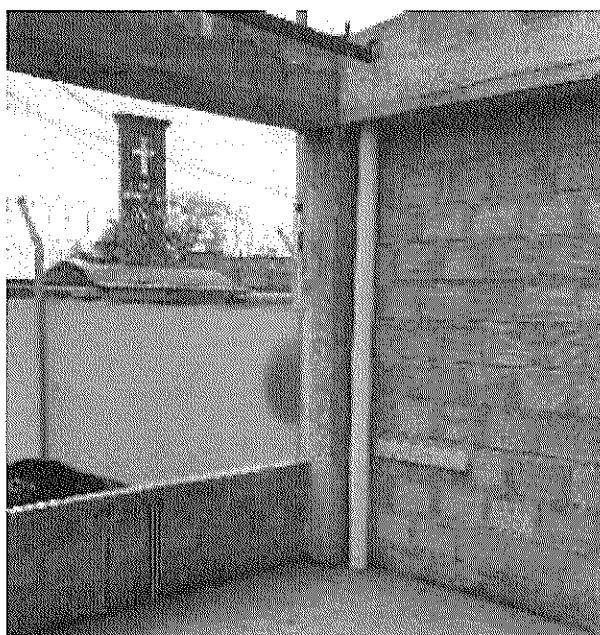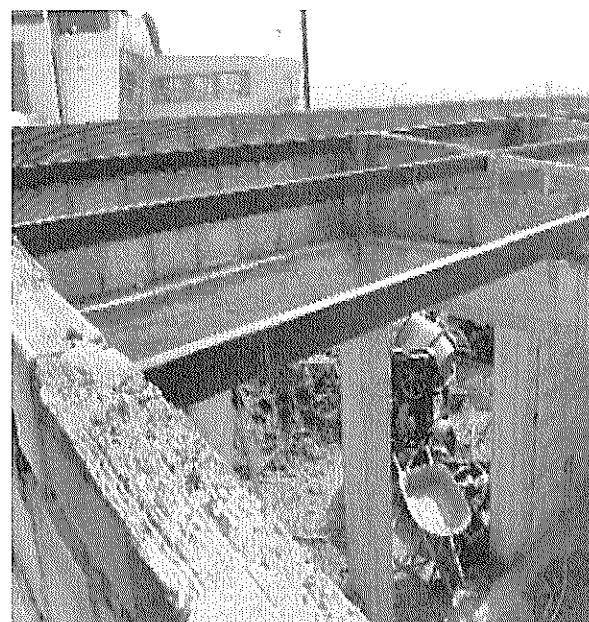


CONSORCIO OBRAS 2020


PISOS

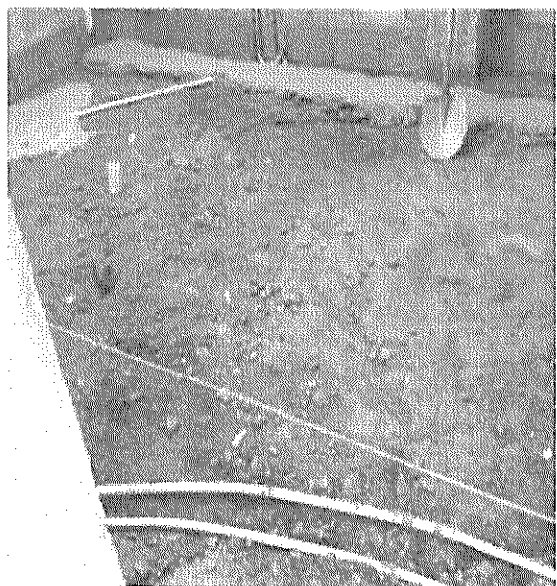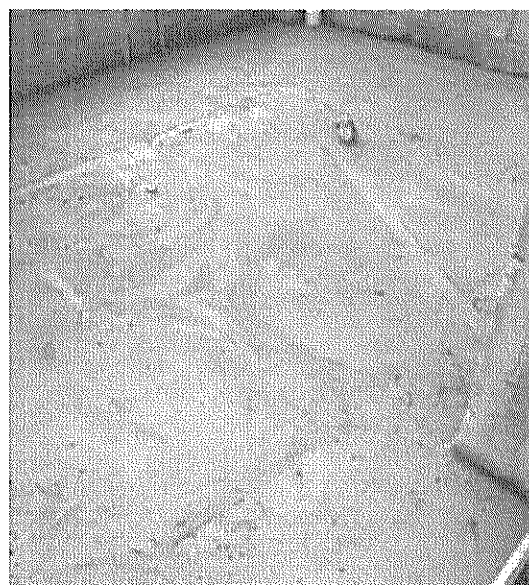

CONSORCIO OBRAS 2020





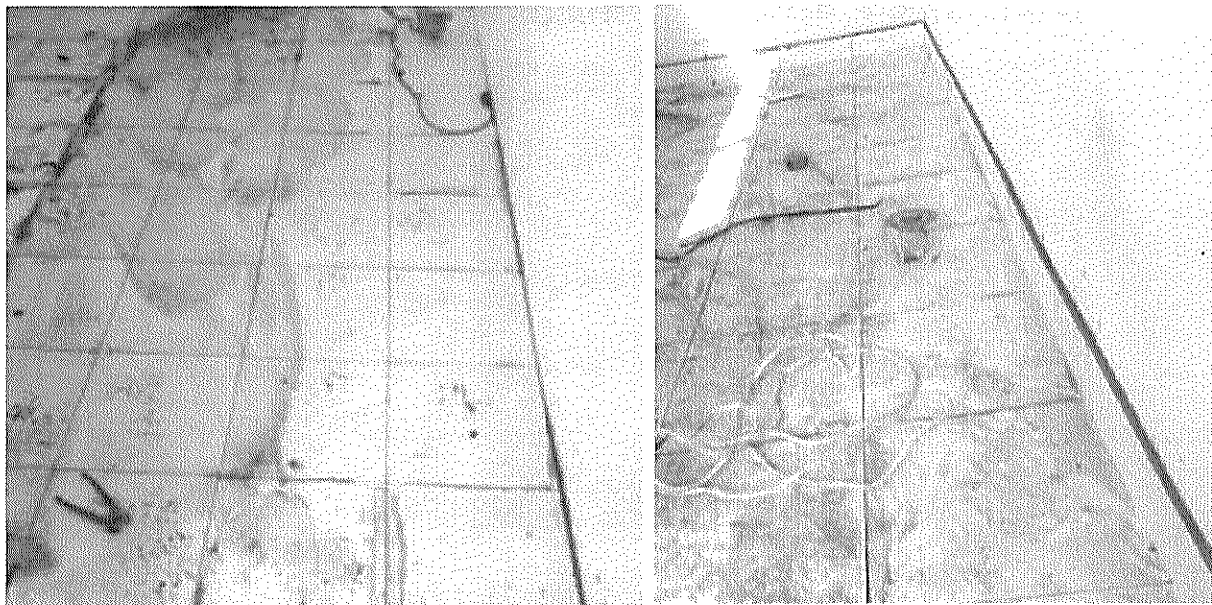


INSTALACIONES ELECTRICAS Y DOMOTIZADO



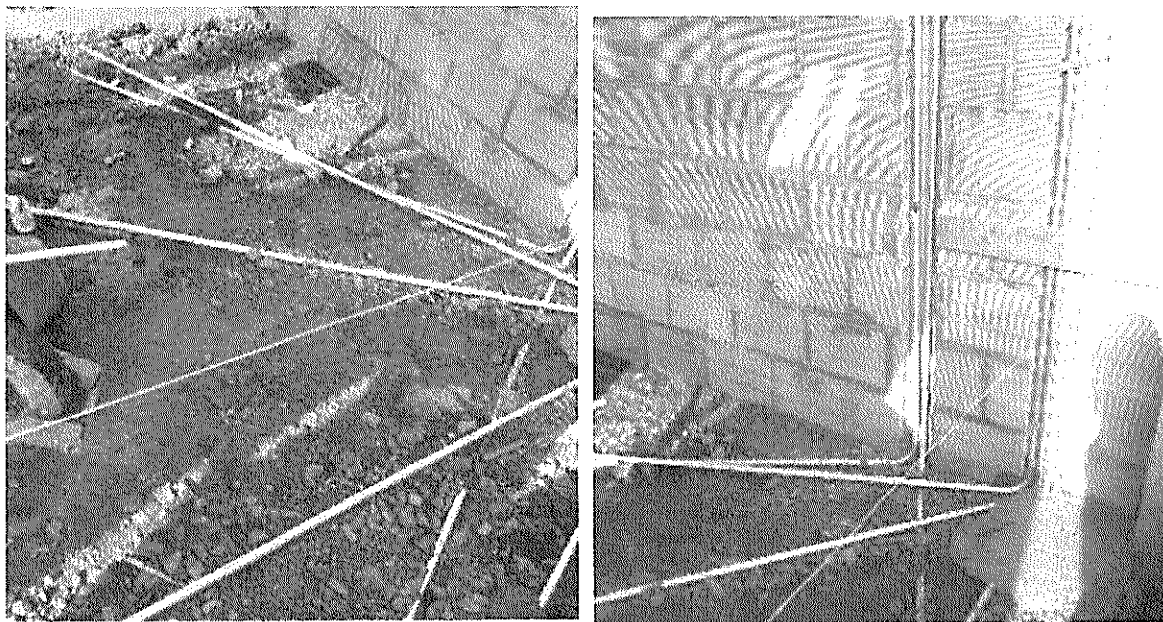


CONSORCIO OBRAS 2020




MAMPOSTERIA, REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA

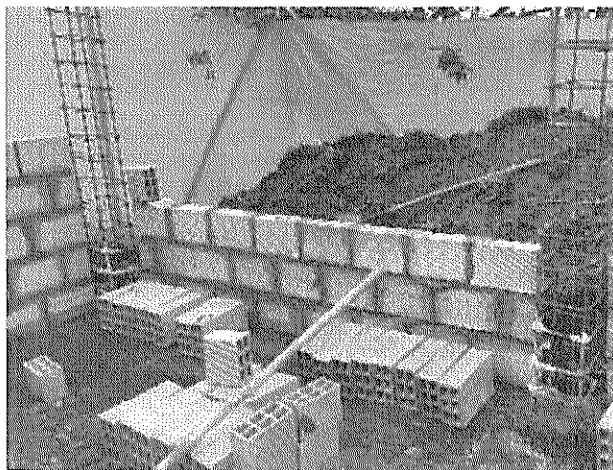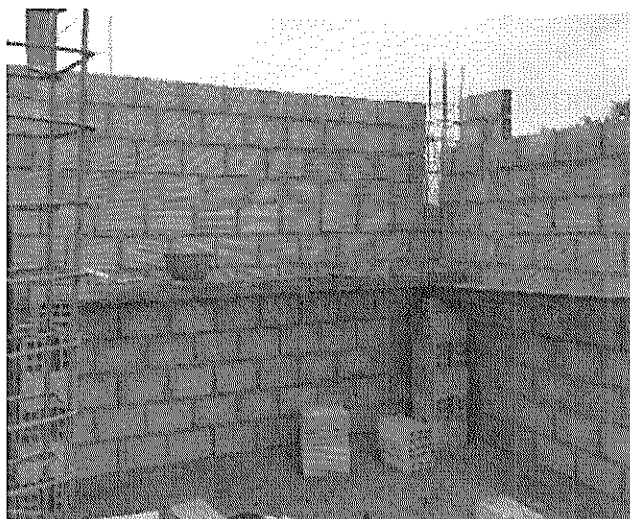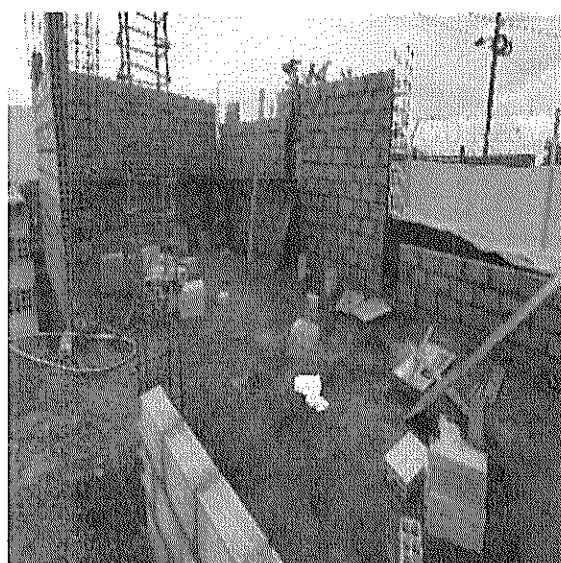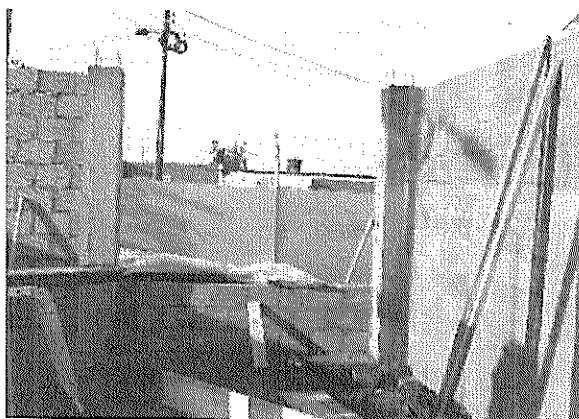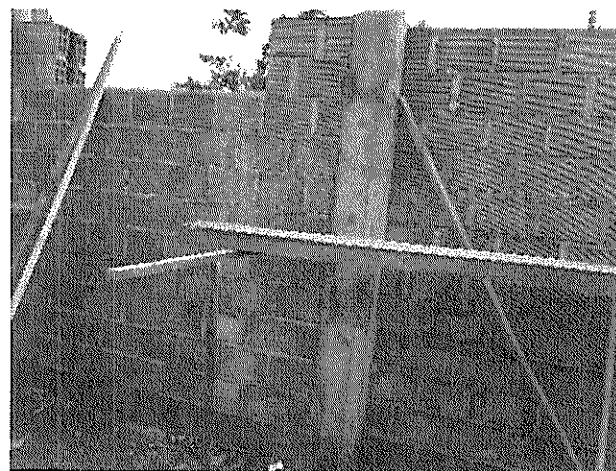

CONSORCIO OBRAS 2020



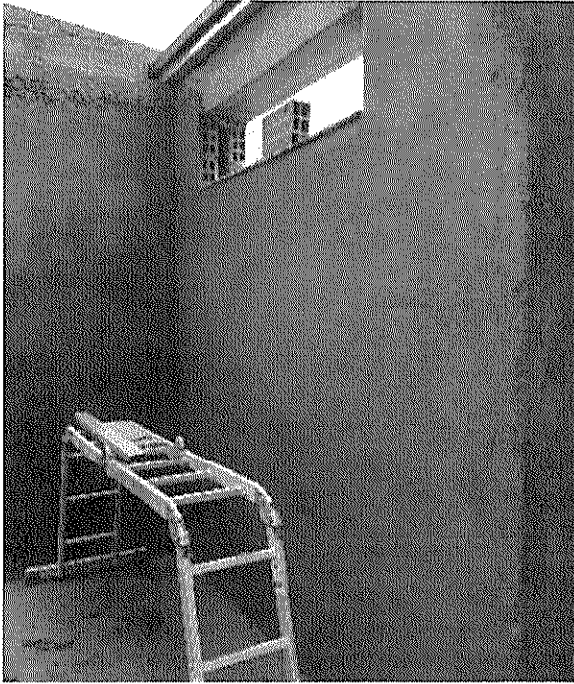
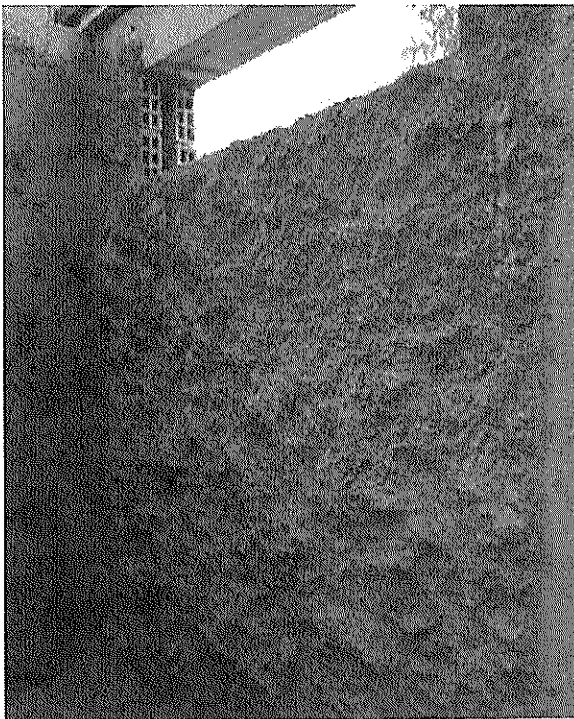
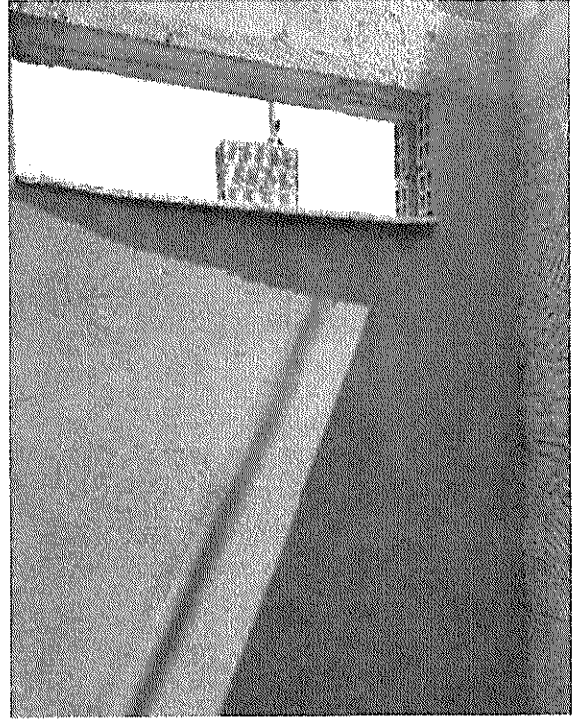


CONSORCIO OBRAS 2020

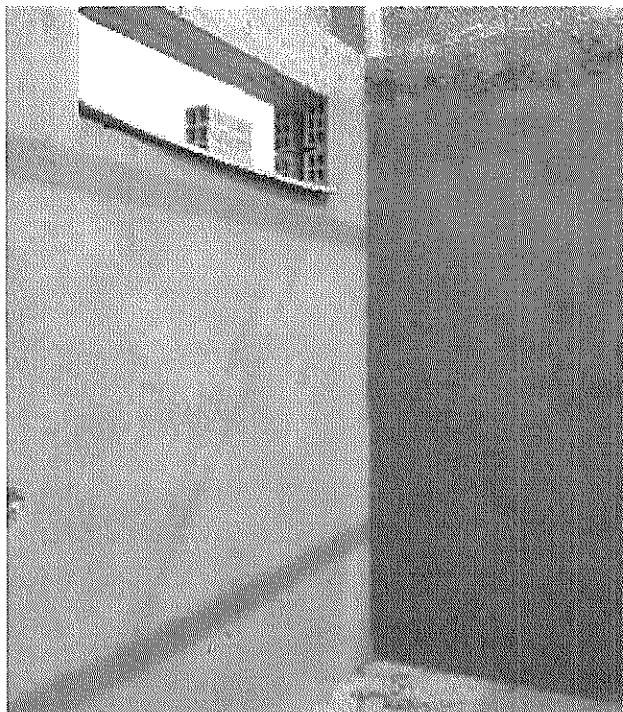


CONSORCIO OBRAS 2020

ITEMS NO PREVISTOS


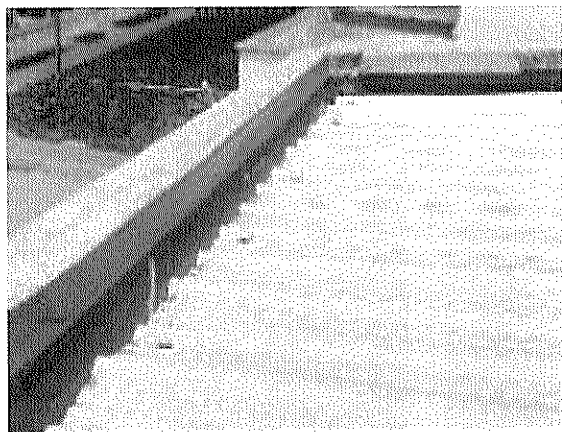
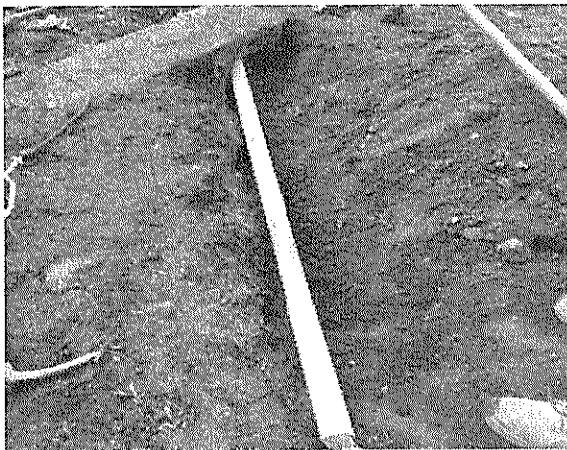


CONSORCIO OBRAS 2020


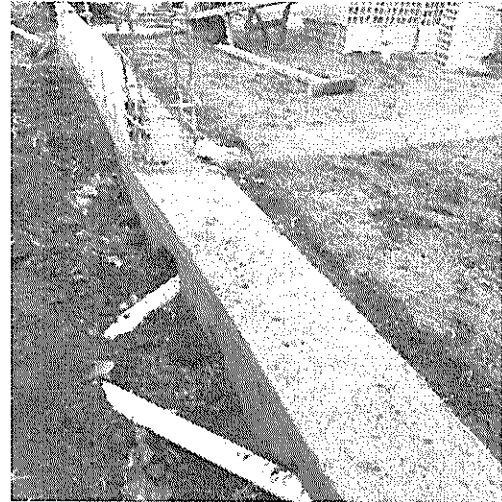


2. AEROPUERTO SANTANA DE CARTAGO



SALA DE CAPACITACIÓN DE ENTRENAMIENTO

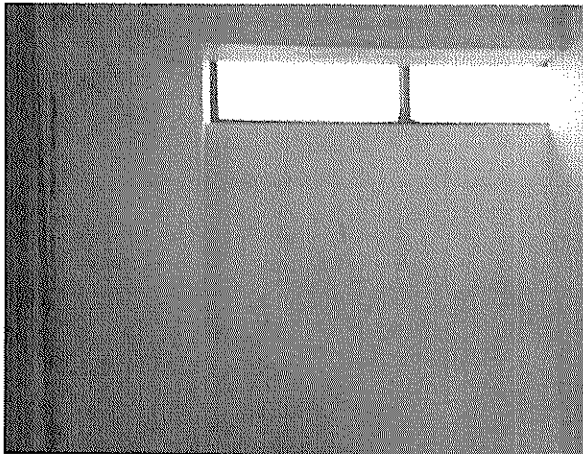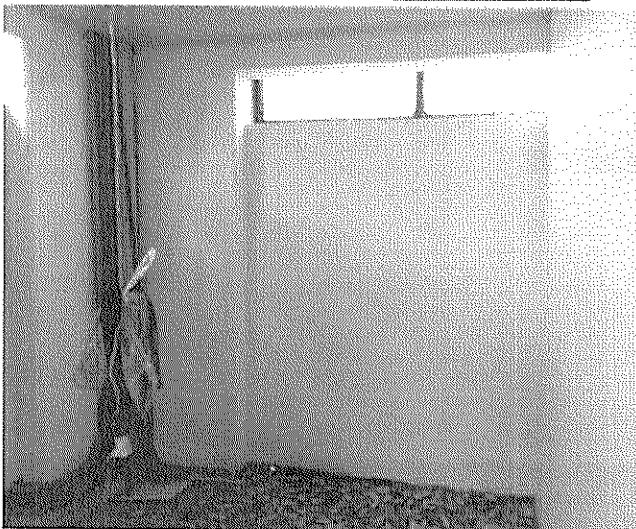

CONSORCIO OBRAS 2020

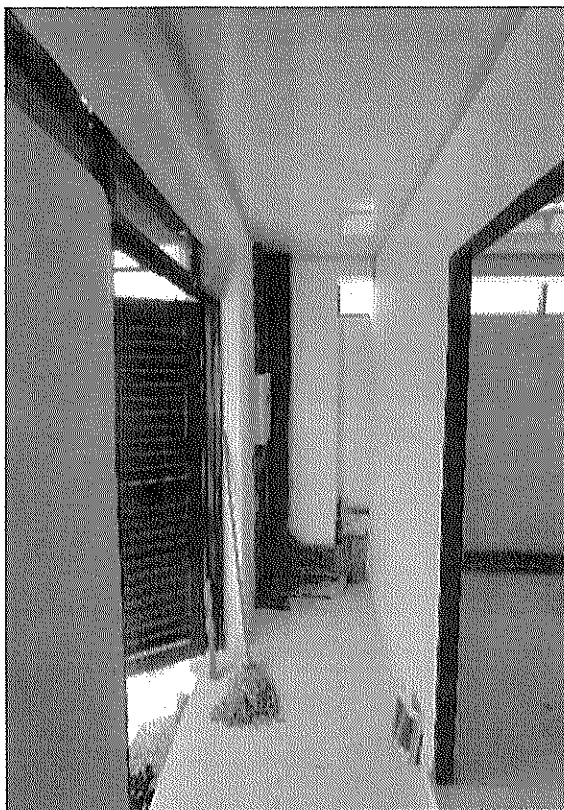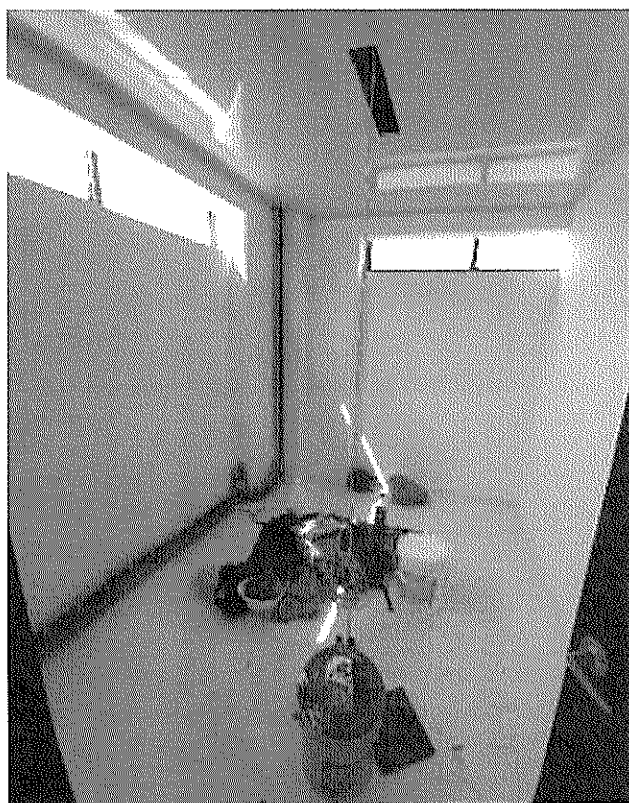



CONSORCIO OBRAS 2020

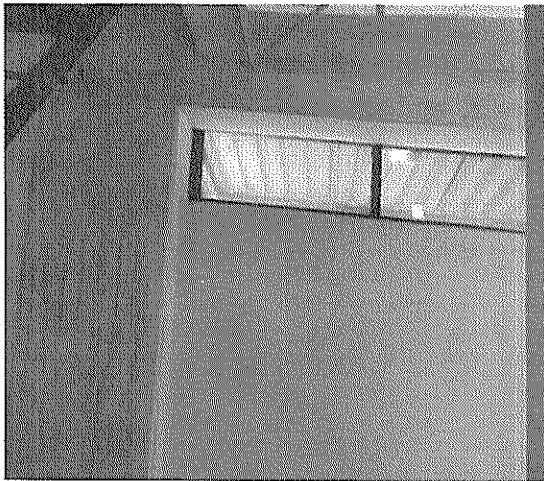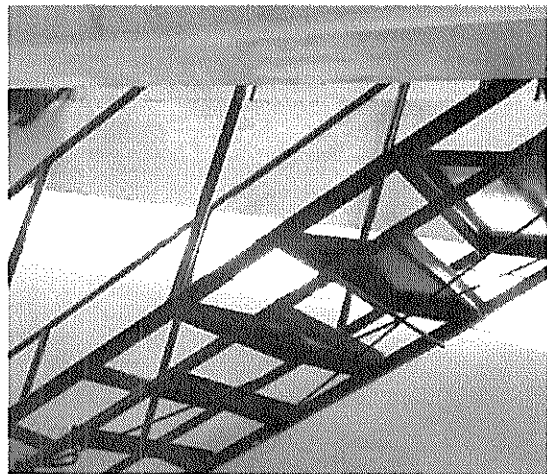





CONSORCIO OBRAS 2020



BAÑO


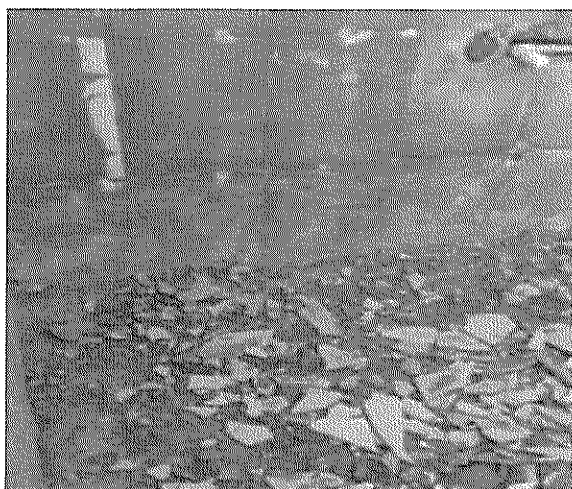



CONSORCIO OBRAS 2020

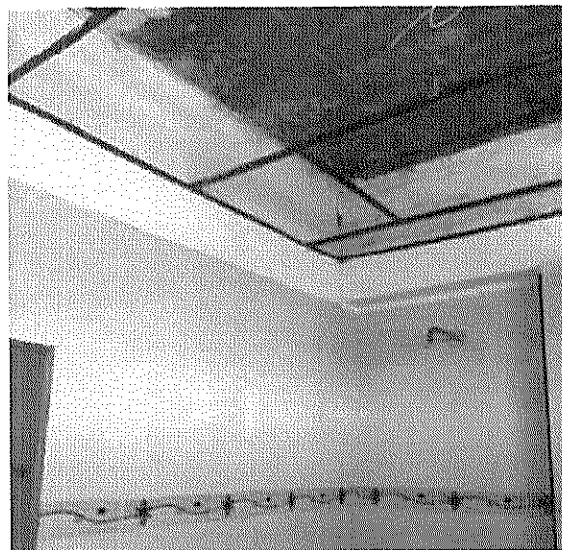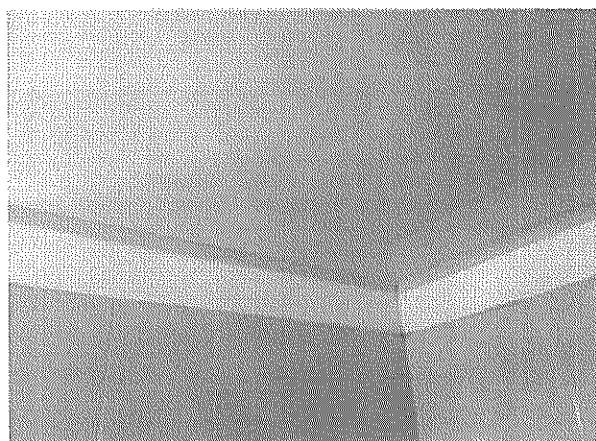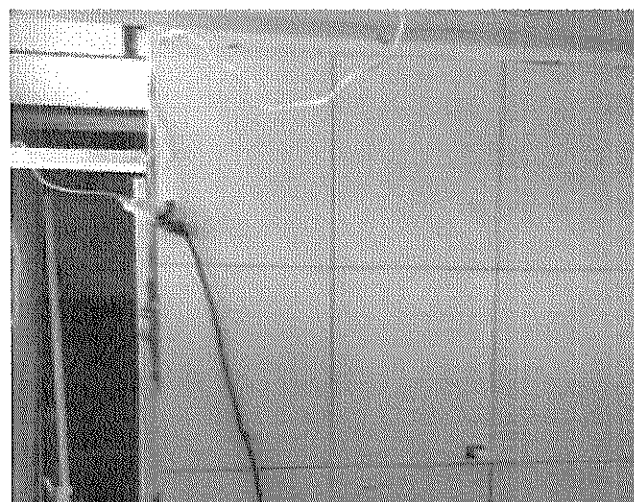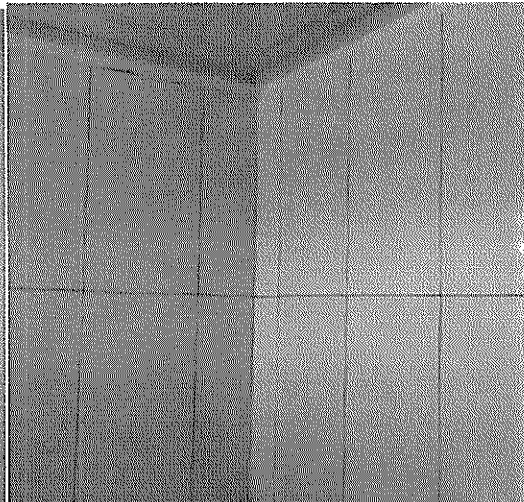

CONSORCIO OBRAS 2020

TORRE DE CONTROL

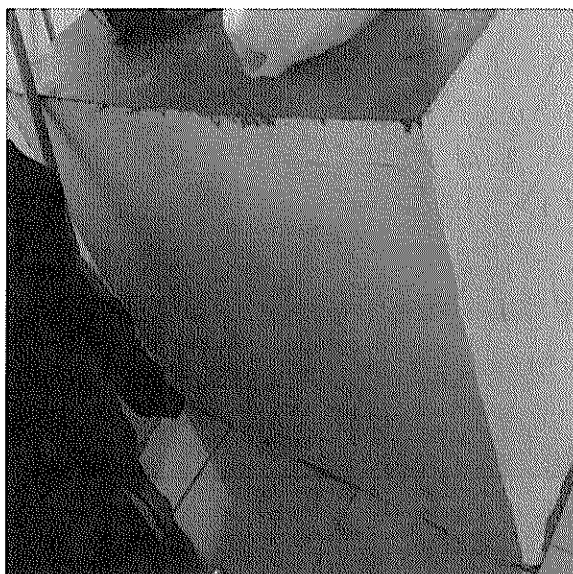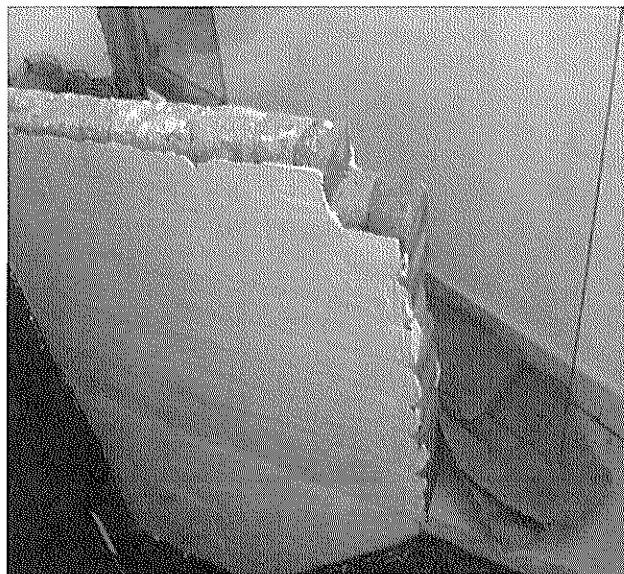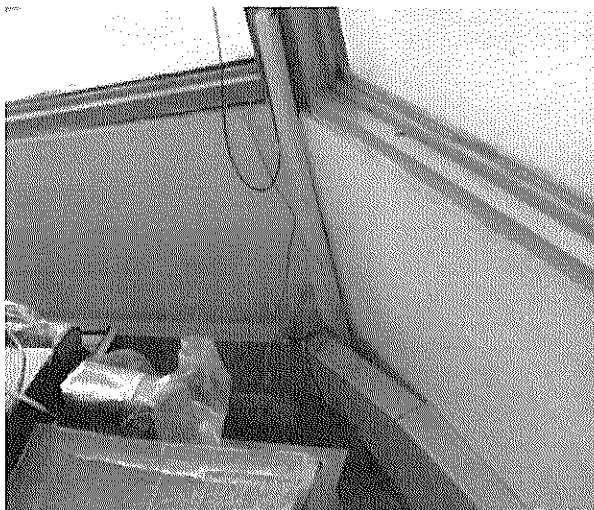

CONSORCIO OBRAS 2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Rolando Gutiérrez Castro'. The signature is stylized and fluid.

DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
Representante legal
CONSORCIO OBRAS 2020





CONSORCIO OBRAS 2020

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL - NIT 899999059-3



OBJETO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO
OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE
CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.

INFORME MATRIZ DE RIESGO

A continuación, se adjunta un registro fotográfico donde se evidencia que el personal de obra realiza actividades de excavación, relleno, figurado de hierro, fundida de concreto, corte de hierro, soldadura, manipulación de equipos, entre otras, utilizando los Elementos de Protección Personal.

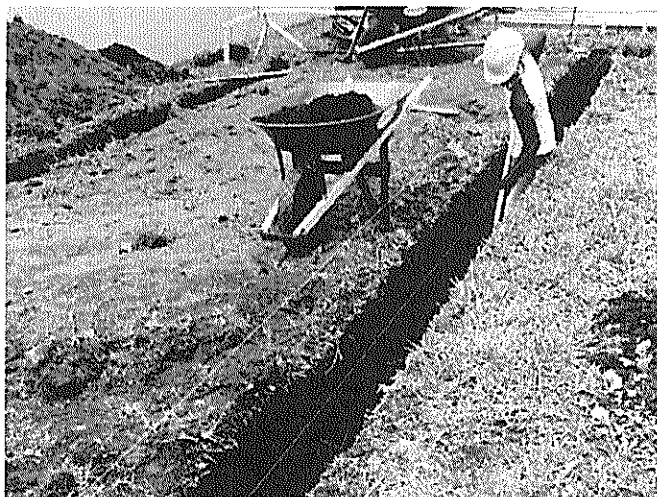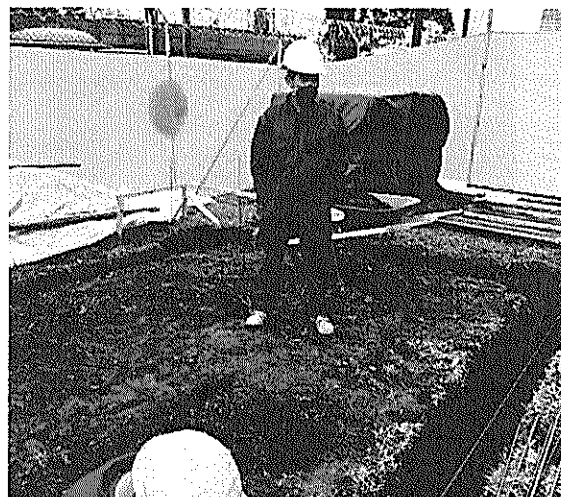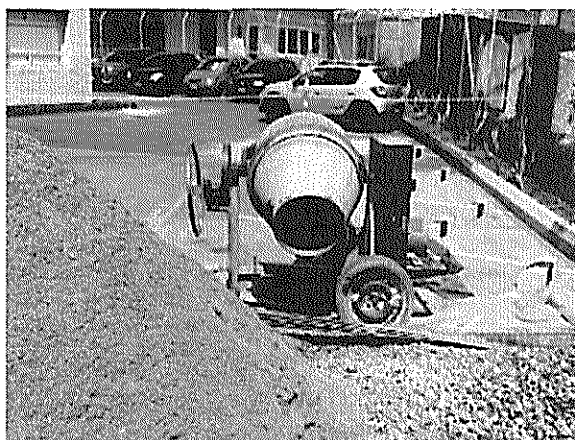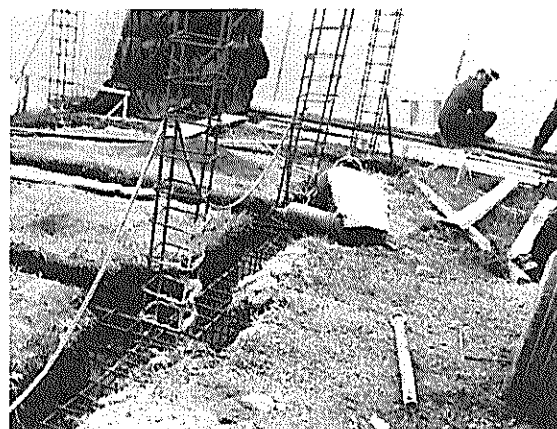


CONSORCIO OBRAS 2020

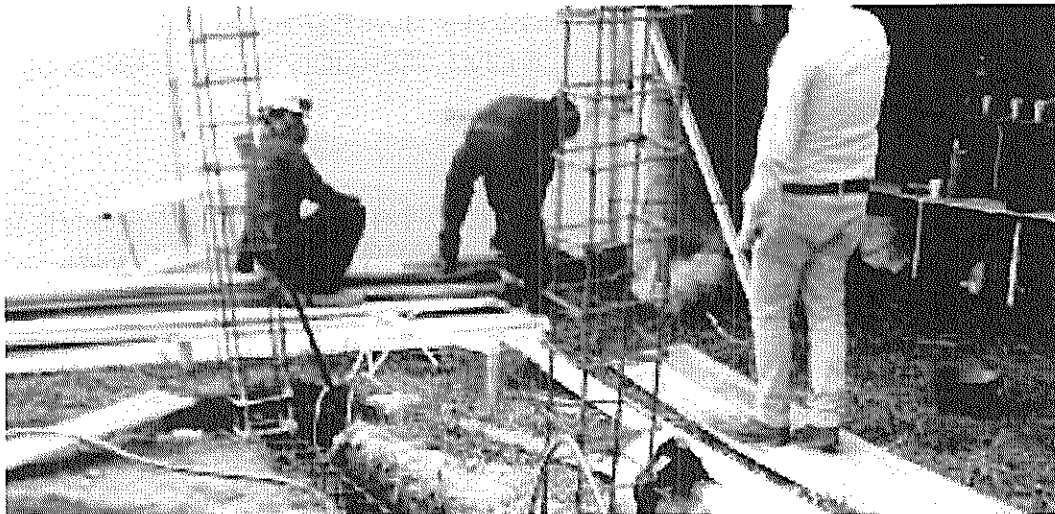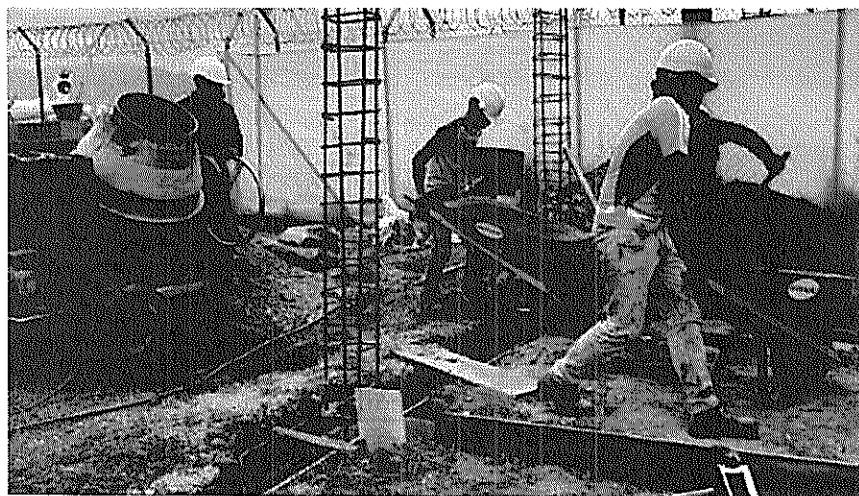

CONSORCIO OBRAS 2020





CONSORCIO OBRAS 2020

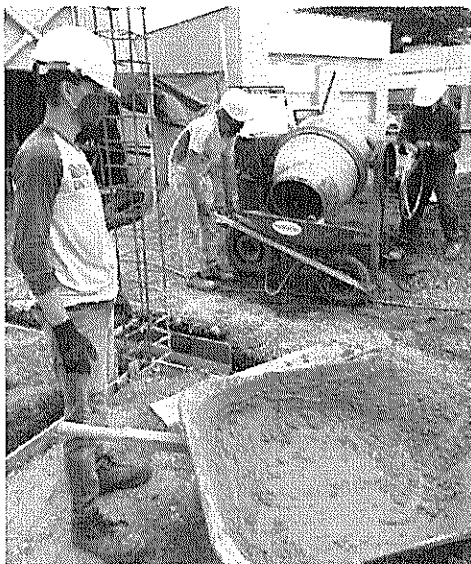


CONSORCIO OBRAS 2020



CONSORCIO OBRAS 2020

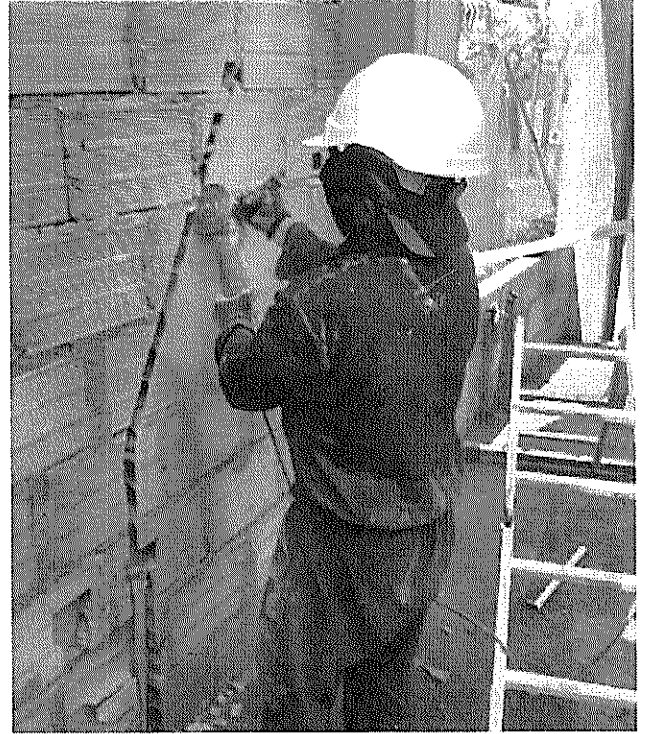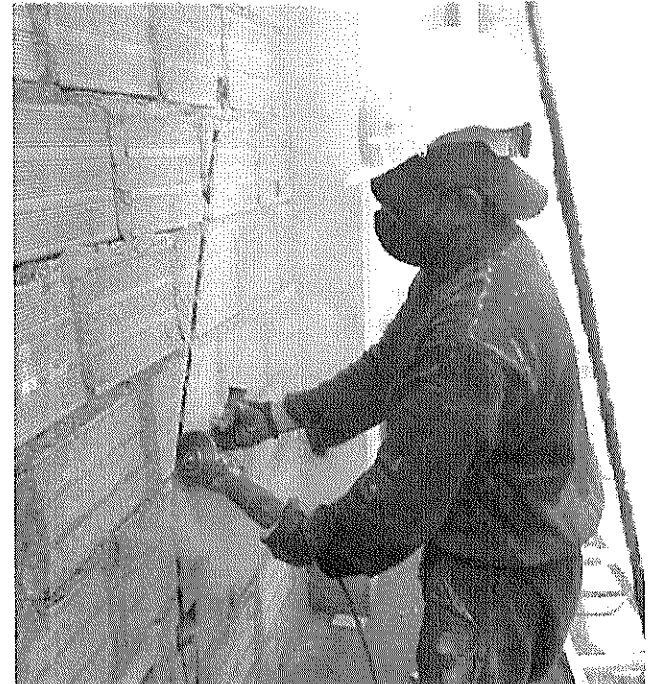

CONSORCIO OBRAS 2020

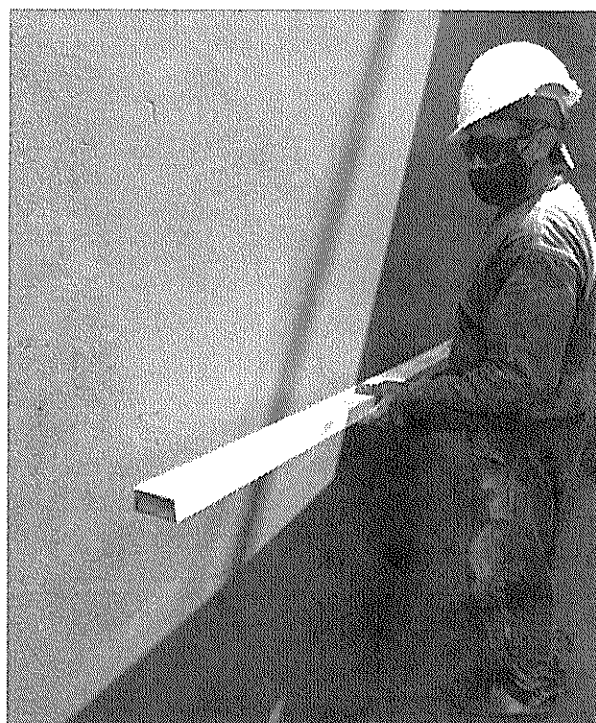

Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04


317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

Además, se reitera que todo el personal que se encuentra laborando en obra está afiliado al sistema de seguridad social.



DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
Representante legal
CONSORCIO OBRAS 2020

CONSORCIO OBRAS 2020

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL - NIT 899999059-3


CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020 – NIT 901.427.345-8

CONTRATO: 20001103 H4 A DE 2020




OBJETO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO
OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE
CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.

INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

A continuación, se adjunta un registro fotográfico donde se evidencia que el personal de obra realiza actividades, utilizando los Elementos relacionados al Protocolo de Bioseguridad.


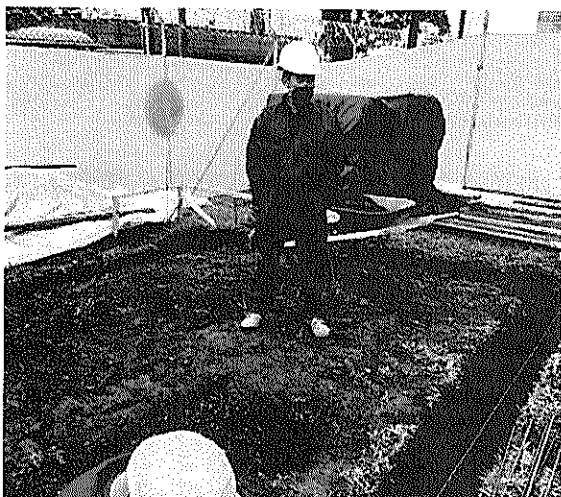


CONSORCIO OBRAS 2020

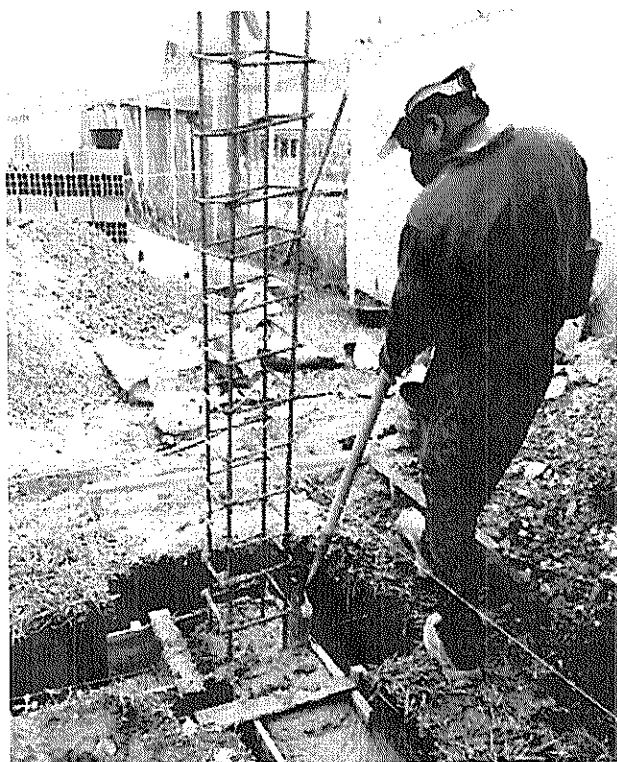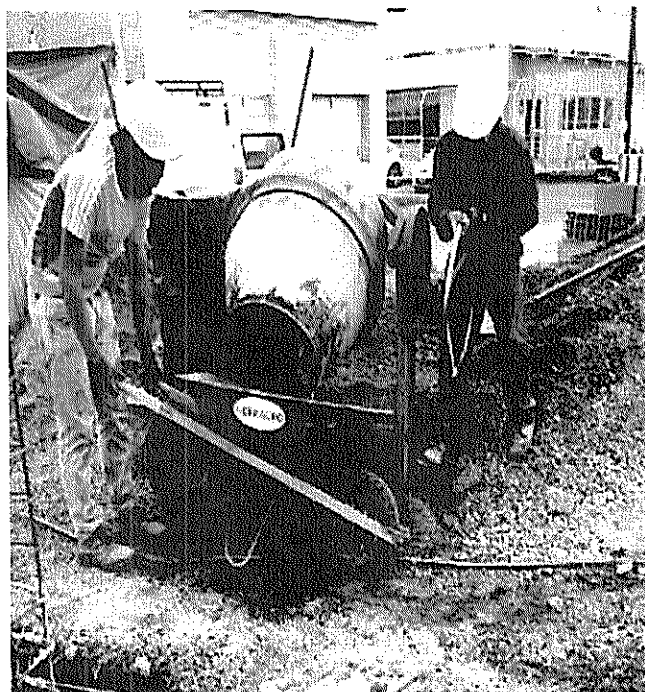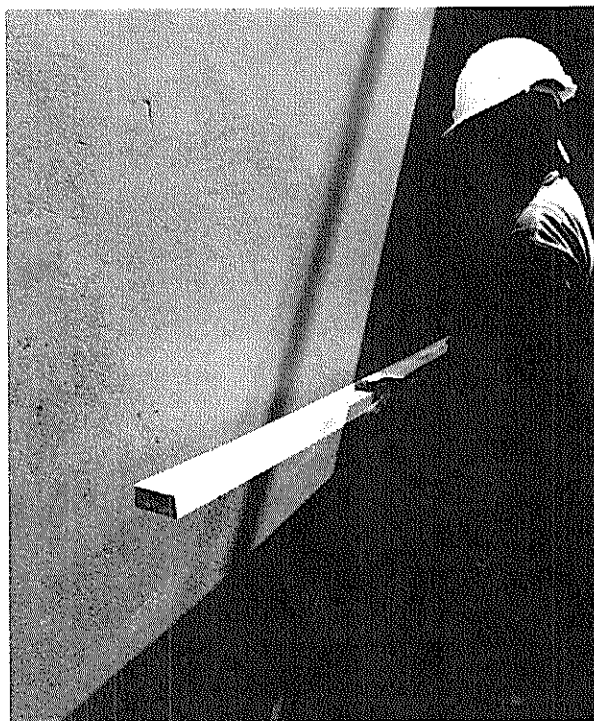

CONSORCIO OBRAS 2020

Se anexan imágenes donde se realizan charlas para la concientización del cuidado del COVID-19 y su respectiva prevención

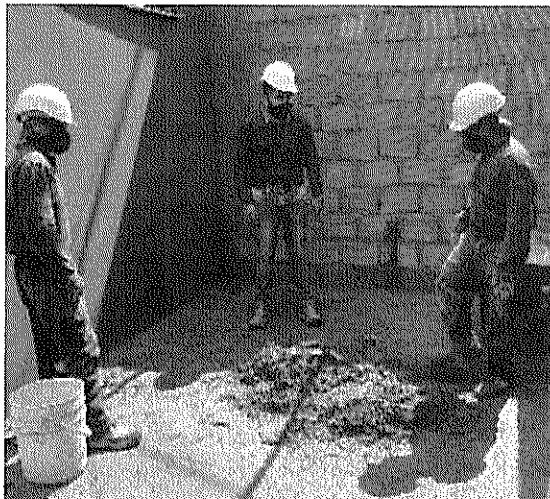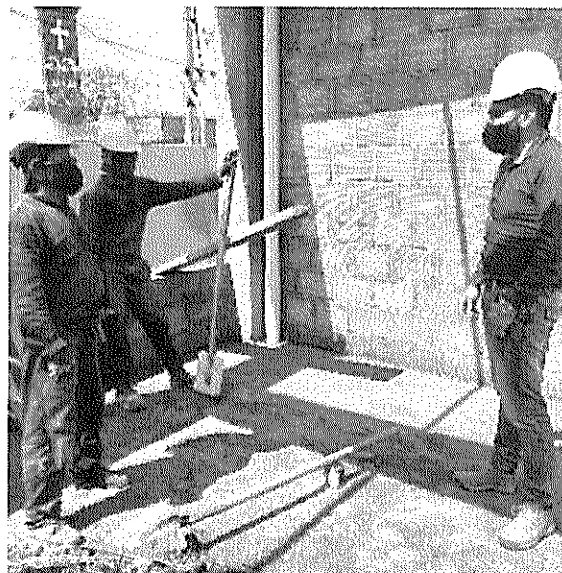

Se anexa tablas y seguimiento de síntomas del protocolo de BIOSEGURIDAD COVID – 19

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Diego Rolando Gutiérrez Castro'.

DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
Representante legal
CONSORCIO OBRAS 2020

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OIRAS 2020

PROYECTO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Diego Bolando Gutierrez Castro Semana comprendida desde el día: 23/11/2020 al día 29/11/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:					Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos, seca:	Diarrea, dolor, congestión, seriedad nasal o dificultad para respirar		1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes						x	x	x	x	x	x	x	35.6	36.4	<i>[Signature]</i>
Martes						x	x	x	x	x	x	x	35.8	36.1	<i>[Signature]</i>
Miércoles						x	x	x	x	x	x	x	35.6	35.9	<i>[Signature]</i>
Jueves						x	x	x	x	x	x	x	36.0	36.4	<i>[Signature]</i>
Viernes						x	x	x	x	x	x	x	35.8	35.9	<i>[Signature]</i>

Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventor

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE ENTRENAMIENTO

DEL AÑO 2020

PROYECTO: RVC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Dago Roberto Gutierrez Cacho

Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio	Tos seca:	Fatiga, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes	☒	☒	☒	☒	X	X	X	X	X			36.1	36.3	<i>[Signature]</i>
Martes	☒	☒	☒	☒	X	X	X	X	X	X		35.4	35.7	<i>[Signature]</i>
Miércoles	☒	☒	☒	☒	X	X	X	X	X	X		36.0	36.0	<i>[Signature]</i>
Jueves	☒	☒	☒	☒	X	X	X	X	X			35.6	36.1	<i>[Signature]</i>
Viernes	☒	☒	☒	☒	X	X	X	X	X			35.8	36.4	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventora

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOKOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO AEROPORTUARIO 2020

NIT 900.000.000-00

PROYECTO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE

NOMBRE: Diego Pablo Alvarado Castro Semana comprendida desde el día: 7/12/2020 al día 13/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					x	x	x	x	x	x		35.5	35.5	<i>[Signature]</i>
Martes					x	x	x	x	x	x	x	35.2	35.8	<i>[Signature]</i>
Miércoles					x	x	x	x	x	x	x	35.6	35.6	<i>[Signature]</i>
Jueves					x	x	x	x	x			35.8	35.1	<i>[Signature]</i>
Viernes					x	x	x	x	x	x		35.7	36.2	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventor

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL

PROYECTO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Diego Rolando Gutierrez Castro

Semana comprendida desde el día: 14/12/2020 al día 18/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		32.6	35.7	<i>[Signature]</i>
Martes					X	X	X	X	X	X		35.8	35.7	<i>[Signature]</i>
Miércoles					X	X	X	X	X	X	X	36.7	36.2	<i>[Signature]</i>
Jueves					X	X	X	X	X	X		35.7	35.6	<i>[Signature]</i>
Viernes					X	X	X	X	X	X		36.0	35.7	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoría


NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

MINISTERIO DE SALUD 2020

PROYECTO: RVLCO783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Fabian Guillermo Gutierrez Castro Semana comprendida desde el día: 23/11/2020 al día 24/11/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X	X	35.7	35.8	
Martes					X	X	X	X	X	X	X	35.9	36.1	
Miércoles					X	X	X	X	X	X	X	36.2	35.8	
Jueves					X	X	X	X	X	X	X	35.4	36.3	
Viernes					X	X	X	X	X	X	X	35.9	36.8	


Firma de Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventor(a)

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSOLIDADO 2020

ELABORADO POR: J. J. G. G.

PROYECTO:

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Fabian Guillermo Gutierrez Castro

Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					x	x	x	x	x	x		35.5	35.9	<i>[Firma]</i>
Martes					x	x	x	x	x	x	x	36.1	35.8	<i>[Firma]</i>
Miercoles					x	x	x	x	x			35.3	36.0	<i>[Firma]</i>
Jueves					x	x	x	x	x	x		35.5	35.8	<i>[Firma]</i>
Viernes					x	x	x	x	x	x		35.9	36.1	<i>[Firma]</i>

[Firma]
Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19


CONSORCIO OLINIAS 2020

WY 00190701000

PROYECTO: RVLCO783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Jose Pedro Rocha Iguana Semana comprendida desde el día: 23/11/2020 al día 29/11/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura:		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X	X	35.8	35.6	Jose Pedro
Martes					X	X	X	X	X	X	X	35.8	35.7	Jose Pedro
Miércoles					X	X	X	X	X	X	X	35.5	36.0	Jose Pedro
Jueves					X	X	X	X	X	X	X	35.9	35.8	Jose Pedro
Viernes					X	X	X	X	X	X	X	36.3	35.9	Jose Pedro


Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOKOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OBRAS 2020

PROYECTO: RVLCO783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE:

Jose Heder Pacheco Iguarés

Semana comprendida desde el día: 3/11/2020 al día 6/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X			35.9	36.2	Jose Heder
Martes					X	X	X	X	X	X	X	35.4	35.7	Jose Heder
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	35.8	35.5	Jose Heder
Jueves					X	X	X	X	X	X	X	36.1	35.9	Jose Heder
Viernes					X	X	X	X	X	X	X	36.0	36.1	Jose Heder

Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO AERIAS 2020

PROYECTO:

RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE

NOMBRE:

Osayra Rocha

Semana comprendida desde el día: 23/11/2020 al día 29/11/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					x	x	x	x	x	x	x	35.9	36.2	PR
Martes					x	x	x	x	x	x	x	35.9	36.0	PR
Miercoles					x	x	x	x	x	x	x	35.6	36.1	PR
Jueves					x	x	x	x	x	x	x	35.9	35.8	PR
Viernes					x	x	x	x	x	x	x	36.1	35.9	PR

[Firma]
Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

ESTADO MAYOR

PROYECTO:

RVLC0763 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE


NOMBRE:

Brayan Rocha

Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 06/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					x	x	x	x	x	x	x	32.2	32.6	R.R.
Martes					x	x	x	x	x			33.8	35.9	R.R.
Miércoles					x	x	x	x	x	x		32.9	32.8	R.R.
Jueves					x	x	x	x	x	x	x	36	36.1	R.R.
Viernes					x	x	x	x	x	x		35.5	36.2	R.R.


Firma del ing. Residente


Firma del ing. Residente Interventor

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

GOBIERNO DE COLOMBIA

Ministerio de Salud y Protección Social

PROYECTO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE

NOMBRE: Dayan Gomez Semana comprendida desde el día 26/11/2020 al día 1/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Martes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Miércoles	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Jueves	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	35.6	35.8	Dayan
Viernes	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	36.1	35.6	Dayan


Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OBRAS 2020

LEY 902.002, 1995

PROYECTO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Drayán Gómez

Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/2020


Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	35.6	35.9	Drayán
Martes	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	35.8	37.5	Drayán
Miércoles	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	35.9	37.8	Drayán
Jueves	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	35.5	37.6	Drayán
Viernes	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	36.1	36.1	Drayán


Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19														
CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES														
PROYECTO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE														
NOMBRE: <u>Jeffrey Mesa</u>					Semana comprendida desde el día <u>26/11/2018</u> al día <u>24/12/2018</u>									
Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Conjuntivitis:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Martes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Miércoles	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Jueves	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	36.1	36.0	/
Viernes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	36.7	36.7	/


 Firma del ing. Residente


 Firma del ing. Residente Interventor

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO AEROPORTUARIO 2020

PROYECTO: RVL0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.


NOMBRE:

Jeffrey Mexa

Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos:							Control de temperatura:		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos:	Dificultad para respirar:	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		35.2	35.9	
Martes					X	X	X	X	X	X		36.1	35.7	
Miércoles					X	X	X	X	X	X		36.0	35.9	
Jueves					X	X	X	X	X	X		36.0	36.1	
Viernes					X	X	X	X	X	X		35.8	36.3	


Firma del ing. Residente


Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00566 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

 Principio de Procedencia: 1401.528	FORMATO Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	
--	---	---

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No.20001103-H4 de 2020.

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.


Nombre del Apoyo a la Supervisión. Juan David Rodriguez Suancha.

Verificación No.1 Fecha 21/12/2020


Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la Supervisión.

Firma:


 Apoyo a la Supervisión.

Act. No 1

Representación Gráfica														
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA														
Datos del Documento		Número de Factura: SETG-980000002				Código Único de Factura - CUFE: 3507400ffdec7dace8d66218dc72bbb0689309f5d8bab56b009dbed35c72c78adee0ff252ece7eb85c2f448b5460d8								
Fecha de Emisión		21/12/2020				Fecha de Vencimiento		21/12/2020						
Tipo de Operación		Generica				Prefijo		SETG						
Tipo de Negociación		Contado				Medio de Pago		Consiganción bancaria						
Tipo de Entrega														
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 901427345				Razón Social:		CONSORCIO OBRAS 2020						
Nombre Comercial		CONSORCIO OBRAS 2020				Dirección		CL 68 7 56 TO 4 AP 04						
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica				Departamento		Huila						
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA				Correo		serinsas17@gmail.com						
Actividad Económica Principal		4290				Municipio		Neiva						
Tipo Responsabilidad		O-07;O-14;O-48;O-52				Teléfono		3174098864						
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 899999059				Razón Social:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL						
Tipo de Documento		NIT				Dirección		AEROPUERTO REGIONAL VALLE						
Número Documento		899999059				Departamento		Valle del Cauca						
Nombre Comercial		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL				Municipio		Cali						
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica				Correo		adriconymedina@gmail.com						
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA				Teléfono		2963138						
Tipo de Responsabilidad		O-07;O-09;O-11;O-14												
Detalles de Productos														
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item			
								IVA	ICA	INC				
1	1	ACTA DE CORTE PARCIAL N 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 20001103 H4 DE 2020 CON OBJETO RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEROS REGIONAL VALLE. COSTO DIRECTO TOTAL	NIU	1,00	\$ 60.042.102,00						\$ 60.042.102,00			
2	2	ADMINISTRACION 21%	NIU	1,00	\$ 12.608.841,00						\$ 12.608.841,00			
3	3	IMPREVISTOS 6%	NIU	1,00	\$ 3.602.526,00						\$ 3.602.526,00			
4	4	UTILIDAD 4%	NIU	1,00	\$ 2.401.684,00			\$ 456.319,96			\$ 2.401.684,00			
Descuentos y Recargos Globales														
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto									
Datos de Referencia														
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia				Fecha Referencia							
Notas Finales														
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N 24102710742 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO OBRAS 2020 NIT 901.427.345-8														
Datos Totales														
						MONEDA COP								
						TASA DE CAMBIO								
						Subtotal Precio Unitario (=)						\$	78.655.153,00	
						Descuentos detalle (-)						\$	0,00	
						Recargos detalle (+)						\$	0,00	
						Subtotal Base gravable (=)						\$	2.401.684,00	
						Total impuesto detalle (+)						\$	456.319,96	
						Total otros impuestos (+)						\$	0,00	
Total mas impuesto (=)						\$	79.111.472,96							
Descuento Global (-)														
Recargo Global (+)														
Valor total de la operación (=)						\$	79.111.472,96							
Numero de Autorización: 18760000001 Rango Autorizado: Desde 980000000 Rango Autorizado: Hasta 985000000 Vigencia: 2030-01-19														

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

radicado N: 2020110743
22-12-20

Cladus
Dic 22

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO OBRAS 2020, identificado con número de identificación tributaria NIT 901.397.537-5, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos para caja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de noviembre del año 2020.

Dado en Neiva a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020.



TERESA RUBIANO GARCIA
Contador Público
128027-T

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19403600
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-12-18

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS 2020	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901427345	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 68 N 7 56 TORRE 4 APTO 04	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SERINSAS.ADTIVO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3174098864
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	80833443	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	DIEGO	SEGUNDO NOMBRE	ROLANDO
		SEGUNDO APELLIDO	CASTRO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020 Mes: 11	Año: 2020 Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
6	\$1,784,869	19403600

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1007705295	01	No	No	No	41	1	FiJo	GOMEZ OVIEDO BRAYAN STEVEN		\$877,803
CC-80833443	01	No	No	No	41	1	FiJo	GUTIERREZ CASTRO DIEGO ROLANDO		\$877,803
CC-1022394423	01	No	No	No	11	1	FiJo	GUTIERREZ CASTRO FABIAN GUILLERMO		\$877,803
CC-1088337862	01	No	No	No	41	1	FiJo	MESA TANGARIFE JEFFREY RAMSES		\$877,803
CC-1084924161	01	No	No	No	41	1	FiJo	ROCHA DELGADO BRAYAN ESNEIDER		\$877,803
CC-83224158	01	No	No	No	41	1	FiJo	ROCHA IQUINAS JOSE HEDER		\$877,803

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T T D A E	T T D A E	T T D A E	Nov Vsp	Fecha Vsp	V T S L E	V T S L E	Fecha Vsp	I G E	Fecha I G E	L M A	Fecha L M A	V C	Fecha V C	A V P T	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vct Fin	Fecha Vct Fin	Fecha Irp Fin	Fecha Irp Fin
CC - 1007705295	X	2020-11-25																							
CC - 80833443	X	2020-11-18																							
CC - 1022394423	X	2020-11-18																							
CC - 1088337862	X	2020-11-25																							
CC - 1084924161	X	2020-11-21																							
CC - 83224158	X	2020-11-18																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1007705295	PROTECCION	6	\$175,561	0.1600000	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100	\$0	\$0	\$0
CC - 80833443	COLFONDOS	13	\$380,382	0.1600000	\$60,900	\$0	\$0	\$60,900	\$0	\$0	\$0
CC - 1022394423	COLFONDOS	13	\$380,382	0.1600000	\$60,900	\$0	\$0	\$60,900	\$0	\$0	\$0
CC - 1088337862	PORVENIR	6	\$175,561	0.1600000	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1084924161	COLFONDOS	10	\$292,601	0.1600000	\$46,900	\$0	\$0	\$46,900	\$0	\$0	\$0
CC - 83224158	PORVENIR	13	\$380,382	0.1600000	\$60,900	\$0	\$0	\$60,900	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Cot Obl	Tarifa
CC - 1007705295	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$175,561	0.0400000	\$7,100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$175,561	1	0.0696000
CC - 80833443	MEDIMAS EPS	13	\$380,382	0.0400000	\$15,300	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$380,382	1	0.0696000
CC - 1022394423	FAMISANAR	13	\$380,382	0.0400000	\$15,300	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$380,382	1	0.0696000
CC - 1088337862	SALUD TOTAL	6	\$175,561	0.0400000	\$7,100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$175,561	1	0.0696000
CC - 1084924161	EPS-S COMF HUILA	10	\$292,601	0.0400000	\$11,800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292,601	1	0.0696000
CC - 83224158	COOMEVA EPS	13	\$380,382	0.0400000	\$15,300	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$380,382	1	0.0696000

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-1007705295	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$175,561	0.0400000	\$7,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-80833443	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	\$380,382	0.0400000	\$15,300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1022394423	CAFAM	13	\$380,382	0.0400000	\$15,300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1088337862	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$175,561	0.0400000	\$7,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1084924161	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$292,601	0.0400000	\$11,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-83224158	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	\$380,382	0.0400000	\$15,300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	3	\$168,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$168,700
POREVENIR	2	\$89,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$89,000
PROTECCION	1	\$28,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$28,100

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR	
	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	3	\$285,800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$124,500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$71,900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$554,100

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 8

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	No. 20000698 H4 DE 2020
Nombre del Contratista:	JAVIER LONDOÑO OP SAS.
Periodo informe:	15 de noviembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020.
Nombre de Supervisor:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	Infraestructura.

2. OBJETO DEL CONTRATO

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 15 de noviembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020.		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
a. Presentar previo a la iniciación del contrato la matriz de cumplimiento de	Contratista hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en salud ocupacional	Secop II – Carpeta de Proceso No. 20001103-H4 DE 2020

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 8

requisitos en seguridad ocupacional para contratistas de la aeronáutica civil, debidamente diligenciada en físico y en medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.	– con aceptación de la parte de Salud ocupacional fechada el día 13 de noviembre de 2020.	
b. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.	Contratista cumple con los protocolos de Bioseguridad según los aprobado y verificado por el área de salud ocupacional y apoyo a la supervisión.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 20001103 H4 DE 2020 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
c. Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas.	Contratista hace entrega de cronograma de ejecución en obra el cual es aprobado – con aceptación por parte del supervisor fechada el día 15 de noviembre de 202.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 20001103-H4 DE 2020
d. Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones.	Certificado de aprobación de Pólizas y garantías actualizadas según acta de inicio.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 20001103-H4 DE 2020
e. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía	Ejecuta cada ítems según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 20001103-H4 DE 2020 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
f. Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución.	Ejecuta cada ítems según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 20001103-H4 DE 2020 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1.
g. Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.	Ejecuta cada ítems según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial, se realiza seguimiento mediante el cronograma de actividades y se verifica con el flujo de inversión del mismo.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1. Tabla de comparativo de avance y seguimiento a obra.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 8

h. Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental y/o la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en el sitio de ejecución de la obra, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar la obra deberá hacerse en cada una de las áreas intervenidas una limpieza general a total satisfacción del SUPERVISOR.	Contratista realiza acopio de material sobrante de obra (escombros), es retirado por medio de volqueta y dispuesto en botadero municipal.	Evidencia de registro fotográfico.
i. Todos los trabajadores a utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son responsabilidad de este en su vinculación o remoción al igual que las obligaciones como contratante de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni obligaciones con persona alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier concepto, debido a los trabajos contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de cualquier trabajador previa justificación de la decisión	Cada uno de los trabajadores y profesionales por parte del contratista son responsabilidad netamente del contratista. La aeronáutica no tiene responsabilidad alguna con las personas y/o trabajadores contratados por el contratista.	Planillas de aportes al sistema de seguridad social.
j. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato" y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podrán implicar la suspensión de la actividad.	Se evidencia la implementación y aplicación de la matriz de riesgos laborales en las diferentes áreas de trabajo guiados y supervisados por una profesional en el área.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 8

k. Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria.	Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria.	
l. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos.	Contratista asume la responsabilidad que tiene a su cargo.	
m. En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor.	Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación.	Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico.
n. Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables.	A la fecha no se han reportado daños en ninguna área de trabajo ocasionadas por el contratista.	N/A
o. Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.	El plan de calidad se aprobara una vez se realice el acta de recibo final con su previa aprobación de la parte de supervisión con el fin de establecer las fechas exactas.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato y alcance del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 8

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
19. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 8

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del Arquitecto residente en obra, la profesional en salud ocupacional haciendo seguimiento a la aplicación de la matriz de riesgos y protocolo de bioseguridad.

Las actividades previstas se han ejecutado bajo la verificación y aprobación de la supervisión.

El clima (lluvias) en obra en el mes de septiembre no ha permitido una ejecución al 100% pero se ha adelantado trabajos en horas extras con el fin de dar cumplimiento.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 8

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

60.69%

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ACTAS PARCIALES OBRA							
	VALOR ACTAS	VALOR ACUMULADO	% EJECUCION	TOTAL A PAGAR	ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	PERIDO DE FACTURACION

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1400.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 8

		ACTAS PARCIALES					
ACTA COBRO PARCIAL No.1	\$79.111.473	\$79.111.473	60.69%	\$79.111.473	\$79.111.473	\$51.251.903	15 de noviembre de 2020
							21 de diciembre

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

60.69%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
Cc. 16.889.912 de Florida (V).
SUPERVISOR

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Cc. 74.451.949 de Nobsa (Boy).
APOYO A LA SUPERVISION

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
