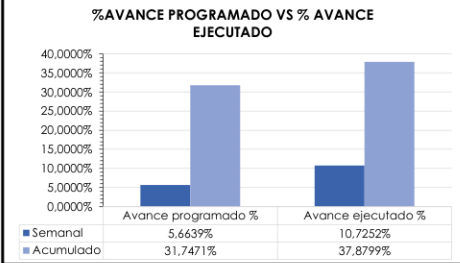
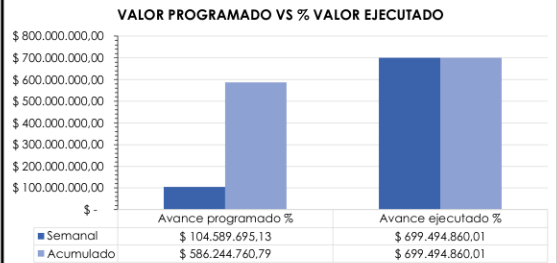
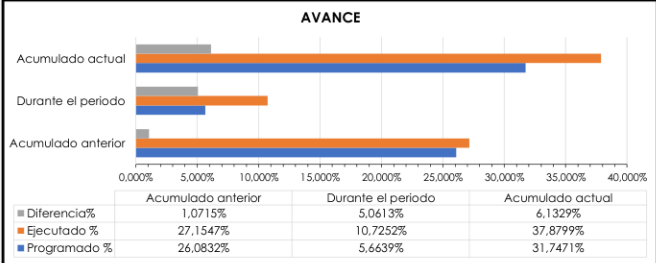



				FORMATO																							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				SEMANA 11																							
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA																							
CONTRATO DE OBRA NO.		328 de 18 de Marzo de 2026		ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA																							
INTERVENTORÍA		CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.		325 de 17 de Marzo de 2026		OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA																							
VALOR INICIAL		\$ 1.846.610.986,00		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.																							
PLAZO CONTRACTUAL		5 meses																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		\$ 1.846.610.986,00																									
FECHA DE INICIACIÓN		miércoles, 15 de julio de 2026																									
FECHA DE TERMINACIÓN		martes, 15 de diciembre de 2026																									
SEMANA NUMERO.		11	DEL	21/09/2026	AL	26/09/2026	DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO	74																			
AVANCE DEL CONTRATO																											
%AVANCE PROGRAMADO VS % AVANCE EJECUTADO			VALOR PROGRAMADO VS % VALOR EJECUTADO																								
																											
Semanal		Acumulado		Avance programado %		Valor programado																					
5,6639%		31,7471%				\$ 104.589.695,13 \$ 586.244.760,79																					
\$ 104.589.695,13		\$ 586.244.760,79		Avance ejecutado %		Valor ejecutado																					
10,7252%		37,8799%				\$ 699.494.860,01 \$ 699.494.860,01																					
\$ 699.494.860,01		\$ 699.494.860,01																									
GRAFICA DE AVANCE																											
AVANCE																											
				<table><tr><th>Programado %</th><th>Ejecutado %</th><th>Diferencia%</th><th></th><th></th></tr><tr><td>26,0832%</td><td>27,1547%</td><td>1,0715%</td><td>Acumulado anterior</td><td>Ok, Adelantados</td></tr><tr><td>5,6639%</td><td>10,7252%</td><td>5,0613%</td><td>Durante el periodo</td><td>Ok, Adelantados</td></tr><tr><td>31,7471%</td><td>37,8799%</td><td>6,1329%</td><td>Acumulado actual</td><td>Ok, Adelantados</td></tr></table>					Programado %	Ejecutado %	Diferencia%			26,0832%	27,1547%	1,0715%	Acumulado anterior	Ok, Adelantados	5,6639%	10,7252%	5,0613%	Durante el periodo	Ok, Adelantados	31,7471%	37,8799%	6,1329%	Acumulado actual
Programado %	Ejecutado %	Diferencia%																									
26,0832%	27,1547%	1,0715%	Acumulado anterior	Ok, Adelantados																							
5,6639%	10,7252%	5,0613%	Durante el periodo	Ok, Adelantados																							
31,7471%	37,8799%	6,1329%	Acumulado actual	Ok, Adelantados																							
Acumulado anterior				1,0715%																							
Durante el periodo				5,0613%																							
Acumulado actual				6,1329%																							
Diferencia %				1,0715%																							
Ejecutado %				27,1547%																							
Programado %				26,0832%																							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																											
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO																			
1.0	ACTIVIDADES PRELIMINARES																										
Subtotal					\$ 39.221.436,09		2,12%	\$ 39.221.436,09																			
2.0	CIMENTACIONES																										
Subtotal					\$ 94.094.346,44		5,10%	\$ 94.094.346,44																			
3.0	ESTRUCTURAS																										
Subtotal					\$ 82.929.614,98		4,49%	\$ 82.929.614,98																			
4.0	MAMPOSTERÍA																										
Subtotal					\$ 105.187.268,15		3,71%	\$ 68.467.218,02																			
5.0	PLACA "PAZ A LO BIEN"																										
Subtotal					\$ 7.771.829,37		0,00%	\$ -																			
6.0	PINTURA Y ACABADOS																										
Subtotal					\$ 18.282.886,57		0,00%	\$ -																			
7.0	CUBIERTA																										
7.1	EDIFICIO DE SERVICIO																										
7.2	AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO																										
7.2.4	Suministro e instalación de lamina termoacústica tipo Sandwich e=18mm	m2	262,02	\$ 549.067,15	\$ 143.866.273,82	157,21	4,6745%	\$ 86.319.764,29																			
Subtotal					\$ 268.229.847,05		7,35%	\$ 135.690.620,85																			
8.0	IMPERMEABILIZACIONES																										
Subtotal					\$ 4.879.736,45		0,00%	\$ -																			
9.0	CARPINTERIA METALICA																										
Subtotal					\$ 39.260.462,35		0,00%	\$ -																			
10.0	ESPACIO PUBLICO																										
10.01	Suministro e instalacion de maquina bio-saludable barras paralelas	Und	1,00	\$ 3.599.863,25	\$ 3.599.863,25	1,00	0,1949%	\$ 3.599.863,25																			
10.02	Suministro e instalacion de maquina bio-saludable caminador aereo	Und	1,00	\$ 3.886.513,25	\$ 3.886.513,25	1,00	0,2105%	\$ 3.886.513,25																			
10.03	Suministro e instalacion de maquina bio-saludable pony	Und	1,00	\$ 3.729.863,25	\$ 3.729.863,25	1,00	0,2020%	\$ 3.729.863,25																			
10.04	Suministro e instalacion de maquina bio-saludable giro de cadera twister	Und	1,00	\$ 4.379.863,25	\$ 4.379.863,25	1,00	0,2372%	\$ 4.379.863,25																			
10.05	Suministro e instalacion de maquina bio-saludable ciclo	Und	1,00	\$ 5.046.763,25	\$ 5.046.763,25	1,00	0,2733%	\$ 5.046.763,25																			
10.06	Suministro e instalacion de maquina bio-saludable doble swinger	Und	1,00	\$ 3.989.863,25	\$ 3.989.863,25	1,00	0,2161%	\$ 3.989.863,25																			
10.07	Suministro e instalacion de banca en concreto sin espaldar	Und	5,00	\$ 3.057.898,90	\$ 15.289.494,51	1,00	0,1656%	\$ 3.057.898,90																			
10.08	Suministro e instalacion de banca en concreto con espaldar	Und	4,00	\$ 3.770.298,90	\$ 15.081.195,61	1,00	0,2042%	\$ 3.770.298,90																			
Subtotal					\$ 89.073.503,90		1,70%	\$ 31.460.927,29																			
11.0	PLAZAS Y ANDENES																										
11.04	Losa en concreto e=10cm con acabado afinado para servir como base de otros recubrimiento o superficie final	m2	130,00	\$ 189.903,98	\$ 24.687.517,78	130,00	1,3369%	\$ 24.687.517,78																			
11.05	Mallo electrosoldada para losa de concreto xx-188(1.50mmx1.50mmx6mm)	m2	130,00	\$ 69.112,04	\$ 8.984.564,79	130,00	0,4865%	\$ 8.984.564,79																			
11.10	Bordillo en concreto hecho en sitio	m	414,58	\$ 116.714,28	\$ 48.387.524,59	350,00	2,2122%	\$ 40.849.999,41																			
Subtotal					\$ 696.317.769,43		6,55%	\$ 121.007.316,46																			
12.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS																										
Subtotal					\$ 126.450.174,22		4,16%	\$ 76.792.908,94																			
13.0	INSTALACIONES ELECTRICAS																										
13.1	SALIDAS ELECTRICAS																										
13.2	LUMINARIAS Y ACCESORIOS																										
13.3	TABLEROS Y PROTECCIONES																										
13.4	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES																										
13.5	CAJAS DE REGISTRO																										
13.5.1	Caja de registro de 40x40x60 cms	Und	10,00	\$ 963.765,40	\$ 9.637.654,00	10,00	0,5219%	\$ 9.637.654,00																			
13.6	PUESTA A TIERRA																										
13.7	SISTEMA FOTOVOLTAICO																										
Subtotal					\$ 227.395.176,97		1,04%	\$ 19.289.332,43																			
CERTIFICACIONES RETIE - RETILAP				1,00	\$ 13.440.042,00	\$ 13.440.042,00	0,29%	\$ 5.306.348,30																			
IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO				1,00	\$ 16.794.462,00	\$ 16.794.462,00	0,67%	\$ 12.436.718,75																			
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)				1,00	\$ 17.282.430,00	\$ 17.282.430,00	0,69%	\$ 12.798.071,25																			
TOTAL ACUMULADO					\$ 1.846.610.986,00		37,8800%	\$ 699.494.860,01																			

		FORMATO											
		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			SEMANA 11								
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA			OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA								
CONTRATO DE OBRA NO.		328 de 18 de Marzo de 2026											
INTERVENTORÍA		CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE			ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIENAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CORDOBA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.		325 de 17 de Marzo de 2026											
VALOR INICIAL		\$ 1.846.610.986.00			OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA								
PLAZO CONTRACTUAL		5 meses											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		\$ 1.846.610.986.00			INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIENAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CORDOBA.								
FECHA DE INICIACIÓN		miércoles, 15 de julio de 2026											
FECHA DE TERMINACIÓN		martes, 15 de diciembre de 2026											
SEMANA NUMERO.		11		DEL	21/09/2026		AL	26/09/2026		DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO	74		
Realizó.		 ANDRES FERIA AGUIRRE INTERVENTORIA				Revisó.				 ADALBERTO SOTOMAYOR RUIZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO			
Supervisó.										 DAVID GONZALES PUEENTE SUPERVISOR DEL CONTRATO			
Revisó.		 DANILO DURANGO BOTIA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO											
REGISTRO FOTOGRAFICO													
    													
OBSERVACIONES													
<p>En el transcurso de esta semana se realizaron las actividades correspondientes en la Cubierta del Area polivalente se dio comienzo a la instalacion de la lamina termoacustica de la cubierta. Igualmente en el Capitulo de Espacio Publico se inicio con el suministro e instalacion de las maquinas biosaludables de; Barras paralelas, Caminador aereo, Pony, Giro de cadera Twister, Cicla, Doble swinger, banca de concreto con y sin espaldar.</p> <p>En el Capitulo de Plazas y Andenes, se han culminado las actividades correspondientes a la losa de concreto con acabado afinado al igual que la malla electrosoldada de esta, y se han seguido fabricando bordillos en sitio.</p> <p>Con respecto al Capitulo de Instalaciones Electricas se ha culminado la construccion de las cajas de registro de 40x40x60; igualmete se ha iniciado con el procedimiento ara la solucitud de las certifiaciones Retie y Retilap.</p> <p>Se continuan tambien con las actividades correspondientes a los Programas de impacto ambiental y el Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO).</p>													
