

 Gobernación de Boyacá	FORMATO		VERSIÓN: 1			
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-047			
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO			FECHA: 13/Feb/2026			

INFORME No:	2	FECHA:	17	de	SEPTIEMBRE	de	2026					
PERIODO:	DEL	1	de	FEBRERO	de	2026	AL	31	de	MARZO	de	2026
CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.8562435/3827	DE	2025									

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL SURGE COMO RESPUESTA A LA NECESIDAD DE ADELANTAR, EN ARTICULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y/O ENTIDADES EJECUTORAS DEL PROYECTO, REALIZAR INTERVENCIONES PERIÓDICAS EN APROXIMADAMENTE 121.59KM, DE CORREDORES VIALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES TERRITORIOS DEL DEPARTAMENTO.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		NIT. 891.800.498-1	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA		GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	
Teléfono: (608) 7 42 01 50	Dirección	CALLE 20 No. 9 - 90	Teléfono: (608) 7 42 01 50
		Dirección	CALLE 20 No. 9 - 90
ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN		26 DE DICIEMBRE DE 2025	
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIERRASUA	TOTAL
\$ 67.876.349.053,63	\$ 0,00	\$ 2.397.503.359,67	\$ 70.273.852.413,30
OBSERVACIÓN			
Para términos del diligenciamiento del presente formato y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se aclara que no se cuenta con interventoría y en los espacios para diligenciar información del contrato de obra, estos serán diligenciados con información de la entidad con la que se suscribió el convenio, es decir, TIERRASUA S.A.S., cabe resaltar que no es propiamente el contratista de obra pero dada la naturaleza del convenio y con el fin únicamente de ampliar la información a presentar en este informe, se toma como si lo fuese.			

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CD-GB-3802-2025	06 de Noviembre de 2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	07 de Noviembre de 2025
Estudios Previos	06 de Noviembre de 2025
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación: 1299 DE 2025	06 de Noviembre de 2025
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A


INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
TIERRASUA S.A.S.	\$ 70.273.852.413,30
OBJETO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
TIERRASUA S.A.S.	JHON ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Teléfono: 3168174458 Dirección CALLE 19 No. 9-35 TUNJA - P10	Teléfono: 3108808902 Dirección CALLE 19 No. 9-35 TUNJA - P10

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	\$ 0,00
OBJETO:	
N/A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
N/A	N/A
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	17	12	2025						
PLAZO INICIAL	17	12	2027						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	16	12	2027						
ADICIONES EN PLAZO									

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

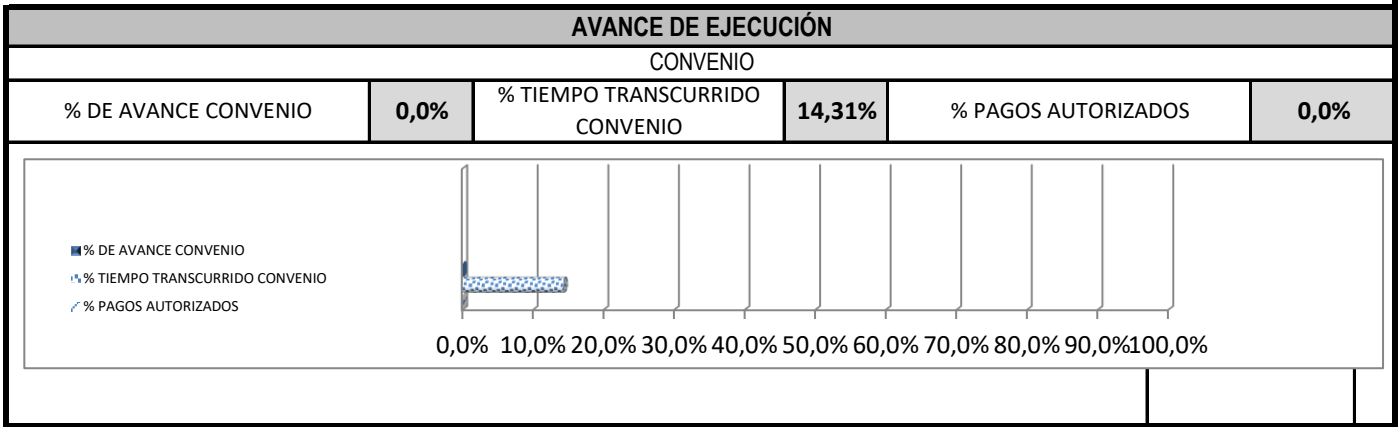

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 3827 de 2025 continuó en una etapa de alistamiento administrativo, técnico, logístico y operativo, previa al inicio de las actividades de intervención física en los corredores viales priorizados. Durante este periodo se dio continuidad a la revisión y verificación de los corredores objeto del convenio, al análisis de la información técnica disponible, a la validación de las condiciones de la infraestructura vial y a la identificación de patologías y necesidades de intervención por sectores y abscisas. De manera paralela, se avanzó en la definición de cantidades, presupuestos, actividades de intervención, requerimientos de materiales, equipos y maquinaria, así como en la planeación de los frentes de trabajo y su logística de ejecución.

Igualmente, se continuó con la gestión relacionada con la señalización vial, los dispositivos de manejo de tránsito y los requerimientos para la implementación de los respectivos PMT. En materia administrativa y contractual, se adelantaron las gestiones necesarias para la consecución y disponibilidad de los bienes, servicios y recursos requeridos para la ejecución. En consecuencia, durante el periodo reportado no se registró inicio de ejecución física de las actividades de mantenimiento o rehabilitación, toda vez que se continuó con la fase de preparación y alistamiento, en articulación con la priorización de corredores por parte de la Gobernación de Boyacá, como condición previa para la apertura de los frentes de obra.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	17	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO
CONVENIO

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

SEGUIMIENTO FINANCIERO							
CONVENIO							
CUENTA No.	7302017354	BANCO:	SCOTIABANK COLPATRIA		SUCURSAL:	TUNJA-BOYACÁ	
NOMBRE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS C.I. NO: CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.						
DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE	FECHA		VALOR	
Desembolso ANTICIPADO			17,56%	15	1	2026	\$ 12.337.833.185,55
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS							

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO			
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
21 DE ENERO DE 2026	COOPERANTES	MODIFICATORIO No. 1	TRAMITADA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
ACTA DE COMITÉ 001	21	1	2026	AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN DEL CONVENIO
ACTA DE COMITÉ 002	30	1	2026	TRAMO VIAL BTS-OICATA
ACTA DE COMITÉ 003	10	2	2026	TRAMO VIAL LA Y - FIRAVITOBA

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO									
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN		
	DESDE			HASTA					
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa			

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME SUPERVISIÓN 001	17	12	2025	31	1	2026	Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión técnica adelantadas en los corredores 60BY15 y 55BY14, como parte de la etapa de alistamiento del convenio, se precisa que, para el periodo reportado, no se encontraba iniciada la ejecución física de obras, toda vez que la priorización de los corredores a intervenir se encontraba en proceso de definición por parte de la Gobernación de Boyacá.
INFORME SUPERVISIÓN 002	1	2	2026	31	3	2026	Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión técnica adelantadas en los corredores 60BY15, 55BY14, 55BY07 y 61BY04 como parte de la etapa de alistamiento del convenio, se precisa que, para el periodo reportado, no se encontraba iniciada la ejecución física de obras, toda vez que la priorización de los corredores a intervenir se encontraba en proceso de definición por parte de la Gobernación de Boyacá.

OBSERVACIONES:

Cabe aclarar que el presente informe corresponde al mismo periodo reportado en el informe presentado al convenio, por lo cual los anexos correspondientes se encuentran adjuntos en dicho informe. Esto con el fin de evitar la duplicidad en el cargue de información y garantizar una adecuada organización y trazabilidad documental dentro del proceso.

Mediante Acta de Comité Técnico No. 001, se modificó con fecha de (29 de enero de 2026) el valor del Convenio de \$78.143.407.253,17 M/CTE a \$70.273.852.413,30 M/CTE, como resultado del ajuste de la estructura financiera del convenio, la incorporación de aportes en especie por parte de TIERRASUA S.A.S. y la optimización de costos administrativos, tributarios e indirectos, sin afectar el objeto, alcance, cantidades ni especificaciones técnicas previstas.

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapas precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
Seguimiento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de Boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	


 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Supervisor Departamento
NOMBRE:	CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA

Proyectó: Ing. Camilo Andres Pinto Zorro

