





3,5	Lleno y compactación manual con material de préstamo (limo o arena) libre de materia orgánica o cualquier otro contaminante (incluye acarreo interno, almacenamiento, protección y compactación de los materiales agrios)	m3	\$	163.969		\$	-	0.00	\$	-		
3,6	Construcción de PISO EN CONCRETO DE 21 Mpa. con un ESPESOR DE 0.10 m. PENDIENTADO Y ACABADO LLANEADO LISO, para placa polipropileno, vaciado alternado con distanceros en junta perdida (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m). Incluye formateo para junta fría en piso colado de 2"x4", vibrado, curado, protección y todo lo necesario para correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. El ensayo y el refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m2	\$	123.890		\$	-	0.00	\$	-		
3,7	Construcción de SOLADO EN CONCRETO de 2500 psi/1784cm/di, de espesor 5cm. para cualquier tipo de fundación como zapatas y vigas antes de la colocación del refuerzo. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.	m3	\$	563.751		\$	-	0.00	\$	-		
3,8	Suministro, transporte y colocación de CONCRETO CICLOPEO (Concreto 60% y piedra 40%). Incluye transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta preparación.	m3	\$	493.310		\$	-	0.00	\$	-		
3,9	Construcción de ZAPATAS Y PEDESTALES en concreto de 21 MPa. Con impermeabilizante integral Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.	m3	\$	838.585		\$	-	0.00	\$	-		
3,10	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro y transporte de los materiales, formateo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	m3	\$	808.575		\$	-	0.00				
3,11	Construcción de PEDESTAL en concreto de 3000 psi, de sección 30x30 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formateo completo, vibrado, protección, curado de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno.	m3	\$	803.367		\$	-	0.00				
3,12	Construcción de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formateo en super "T" de 19mm, aristas biseladas, desmoldante, bastidor para curado de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los fierros para el amarre de la mampostería.	m3	\$	808.575		\$	-	0.00				
3,13	Construcción de VIGAS AÉREAS de 0.4 x 0.4 m. en concreto de 21 MPa, hasta una altura de 3.2m medida desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formateo de primera calidad en super "T" de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requemida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidas en los planos. En el vaciado se deben dejar los fierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagará anclajes.	m3	\$	871.079		\$	-	0.00				
3,14	Construcción de GRADENAS AÉREAS en concreto de 3000 psi, para gradenas de espesor 10 cm. para la boca y revojo de sección 0.2x0.60, de acuerdo a diseño (en horizontal 70mm y en vertical= 40 cm.), incluye formateo SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Silka o similar, acelerante para concreto tipo Silka o similar, desencofrante tipo Silka o similar, transporte externo e interno y colocación de la formateo en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formateo en su sitio, tales como bacos, paneles, pasadores, tornillos, etc. que se requiera.	m2	\$	530.167		\$	-	0.00				
4	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTAS											
4,1	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendiente polealeado y rallado con escobilla, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2 x 4 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entraseado en junta (en 15 m.), arena compactada (en 0.05 m.), malla electrosoldada 0-12", y plancha de acero prefabricada de 200x20 x 4 cm. curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m	\$	150.953		\$	-	0.00				
4,2	Colocación de ADQUIN TACTIL, GUÍA O ALERTA DE 0.20 x 0.20 x 0.06 m, COLOR AMARILLO, SALMÓN, JASPE, BEIGE. Para un ancho de 0.20. Incluye suministro y el transporte de los adquines, perforación y revelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0.05 m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.	m	\$	27.170		\$	-	0.00				
4,3	Colocación de LOSE DEMARCADORA 0.20 x 0.20 x 0.06 m, COLOR AMARILLO, SALMÓN, JASPE, BEIGE. Para un ancho de 0.20. Incluye suministro y el transporte de los adquines, perforación y revelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0.05 m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.	m	\$	35.143		\$	-	0.00				
4,4	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.40 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas empujadas, referencia Barredillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P.). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	\$	64.826		\$	-	0.00				
5	CERRAJERIA Y PASAMANOS											
5,1	Suministro transporte e instalación de PUERTA MALLA (Marcos y plate) Incluye tubería galvanizada en caliente de 1 1/2" calibre 14, ángulo 1/2"x1/2", plancha de 5/8"x1/2", malla galvanizada oip N°4 calibre 10, picaporte, pasadores, candado de seguridad, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no se puntas, retiro de escorias, lija, aplicación de anticorrosivo y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos), según diseño.	und	\$	1,384.619		\$	-	0.00				
6	CAPITULO ELECTRIC											
6,1	Suministro transporte. instalación de poste en fibra de vidrio, H igual a 8 m de 350 KGf. de acuerdo con la norma ASTM D3025. Las tas bases para la cima y para la base del poste seran material polimérico. Incluye incado a 1.40 m de profundidad.	und	\$	2,319.790		\$	-	0.00				
6,2	Suministro transporte. instalación de brazo metalico 52" de 1"tipo balarina para alumbrado publico	und	\$	344.755		\$	-	0.00				
6,3	Suministro transporte instalación de acomodaes principal en cable N° 10 incluye tubería galvanizada de 3" capacidad, 2" base N°1/2" + base neutra N° 1/0 mas polo a tierra en cable n°2	m	\$	299.421		\$	-	0.00				
6,4	Suministro transporte instalación de tubería conduit de 1 1/2", incluye terminales, las excavaciones y llenos se pagaran en sus respectivos ítems	m	\$	12.923		\$	-	0.00				
6,5	Suministro transporte e instalación de cableado Cu 180 cu desnudo, incluye tubería galvanizada 3/4", conectores 10/10 lánselec, uniones galvanizadas abrazaderas metálicas y pintura verde para demarcación cumplimiento norma RETE.	m	\$	95.477		\$	-	0.00				
6,6	Suministro e instalación de para rayos Punta Franklin. Incluye tubería galvanizada de 3/4, base union y fijaciones	m	\$	356.400		\$	-	0.00				
6,7	Suministro transporte instalación de lampara reflectora para poste tipo balarina 106W, 6000K, 14485lm, incluye encauchetado 3x14 AWG Cu y regleta de empaque en caja de piso	und	\$	560.978		\$	-	0.00				
6,8	Suministro transporte instalación de lampara reflectora para poste tipo balarina 106W, 6000K, 14485lm, incluye encauchetado 3x14 AWG Cu y regleta de empaque en caja de piso	und	\$	560.978		\$	-	0.00				
6,9	Suministro, transporte e instalación de cable Encauchetado 3X12, AWG, incluye conectores clásico con centro tipo C en cobre para iluminación de lámparas en postes.	m	\$	24.305		\$	-	0.00				
6,10	CAJA DE EMPALME DE 50X50CM. Incluye excavación y lleno de vicos. Suministro transporte y construcción de concreto de 3000 psi para muros y losa de fondo de espesor 10cm y sección 60x60, concreto para tapa de espesor 5 cm y parafuso 7/8"x7/8", tapa con manija en varilla de 1/2" y refuerzo en malla electrosoldada d=50 para cada lado, losa de fondo y tapa.	und	\$	569.996		\$	-	0.00				
7	CERRAMIENTO EN MALLA											
7,1	Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla eslabonada, calibre 10 oje 5, incluye: concreto de 21 Mpa para fundación de 0.30 x 0.40 m, concreto de 21 Mpa para columnas de 0.20 x 0.20 m, cada 2.20 m, e eje viga superior pizamalla con cortagrasas - muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm (2'1/2'x12'), acero de refuerzo, tubería galvanizada de 1 1/2" para postes con galvanizado doble 2.20 m, (H poste = 3.00m, incluido galvanizado y para picapinos en espigas e referencias (L = 2.97,00 m.), tubería superior, altura malla 2.00 m, pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada, 8'1/2' base de postes e= 12" y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m	\$	555.804		\$	-	0.00				
7,2	Suministro e instalación de PORTERIAS INTEGRADAS, con tableros para balacasto todo costo.	und	\$	8,543.156		\$	-	0.00				

B	PINTURA Y DEMARCAION									
B.1	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epoxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua reguladoriana adosada con entna de piso, aplicación de investimento acrífco base agua en los cñones requerimientos del cliente y demarcado de los juegos según la normativa.	m2	\$	63.300	\$ -	0.00				
					\$ -	-	\$ -	-		
					\$ -	-	\$ -	-		
					EJECUCIÓN SEMANAL	\$ 1.763.800,00		EJECUCIÓN ACUMULADA	\$ 24.206.226,00	
TOTAL EJECUTADO COSTO DIRECTO					\$ 1.763.800,00			\$	24.206.226,00	
VALOR EJECUTADO + AU					\$ 2.311.636,28			EJECUCIÓN ACUMULADA + AU \$	31.724.879,80	

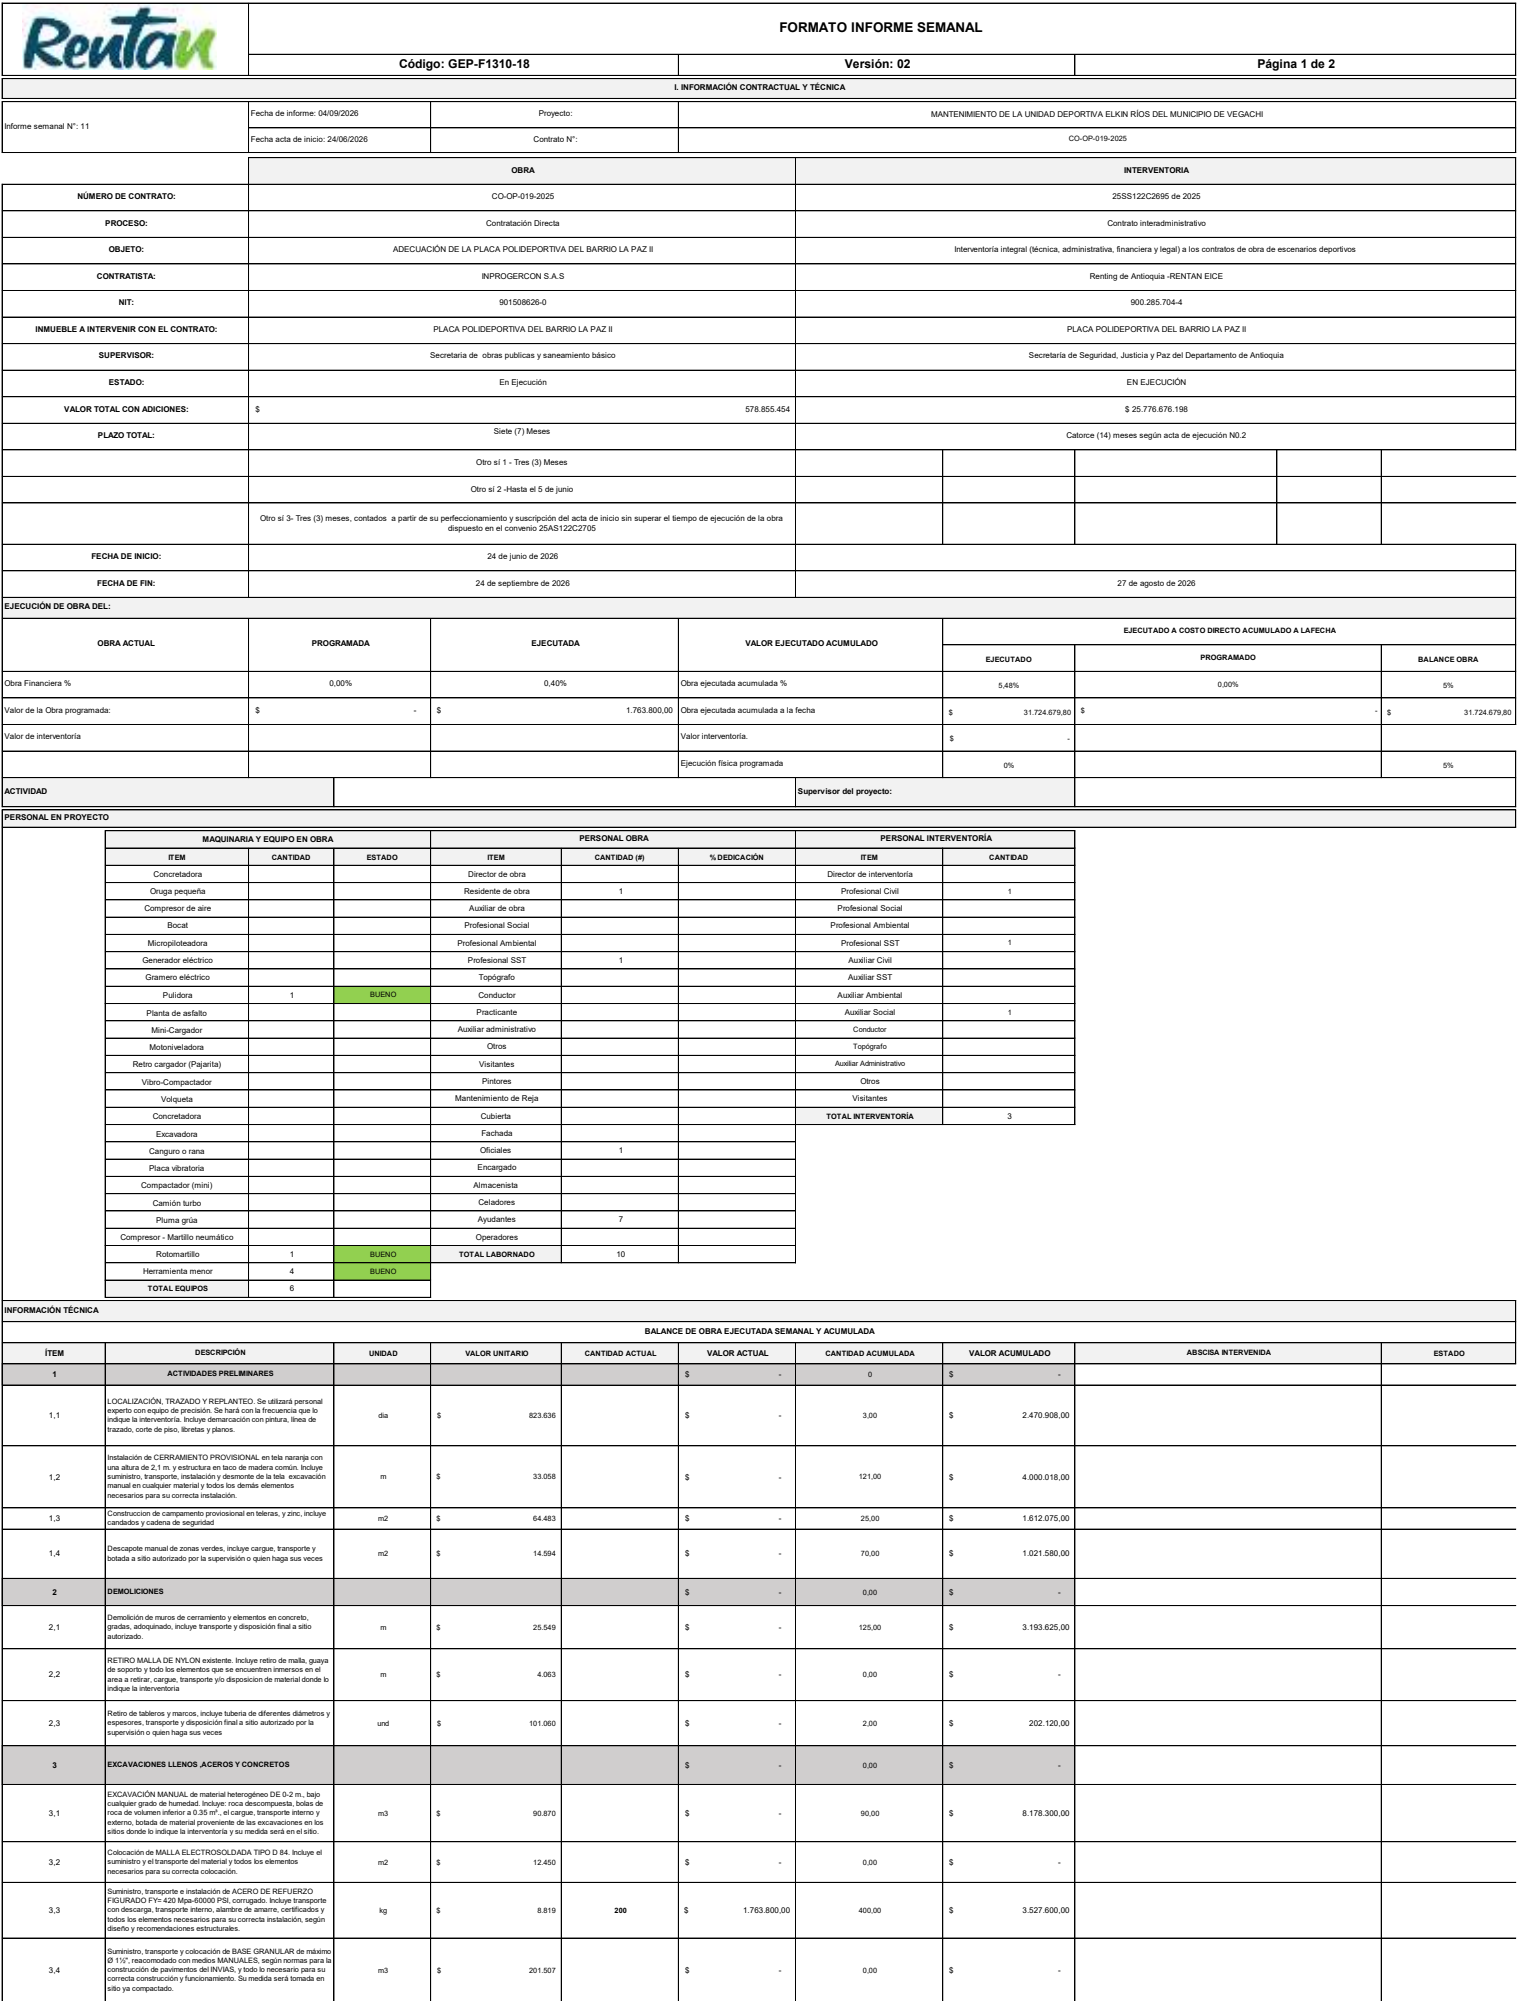

Observaciones:
Durante el periodo, el contratista realiza actividades encaminadas a. excavaciones e instalación de acero para la fundida de micropilotes del cerramiento, adicionalmente cuenta con. acopio de acero dentro del proyecto.
Observaciones: No se reportan actividades físicas durante este periodo, sin embargo el contratista manifiesta incertidumbre debido a que la administración municipal no le ha definido la adición de recursos de acuerdo a las cantidades mayores.
El contratista solicita realiza solicitud de suspensión con fecha de 04 de septiembre. Durante el periodo de suspensión, el contratista debe gestionar ante el Municipio

Fuentes de materiales		Permisos ambientales	
Ubicación:		Zonas de depósito:	
Permiso minero:			
Licencia ambiental:			
Ubicación:		Licencia ambiental:	
Permiso minero:		Aprovechamiento forestal:	
Licencia ambiental:		Ocupación de cauce:	
Ubicación:		Vertimientos:	(Protección de aguas)
Permiso minero:		Emisiones: (polvo, ruido mecánica):	
Licencia ambiental:		Concesión de aguas:	
Observaciones:		Ocupación de cauce:	
		Observaciones:	

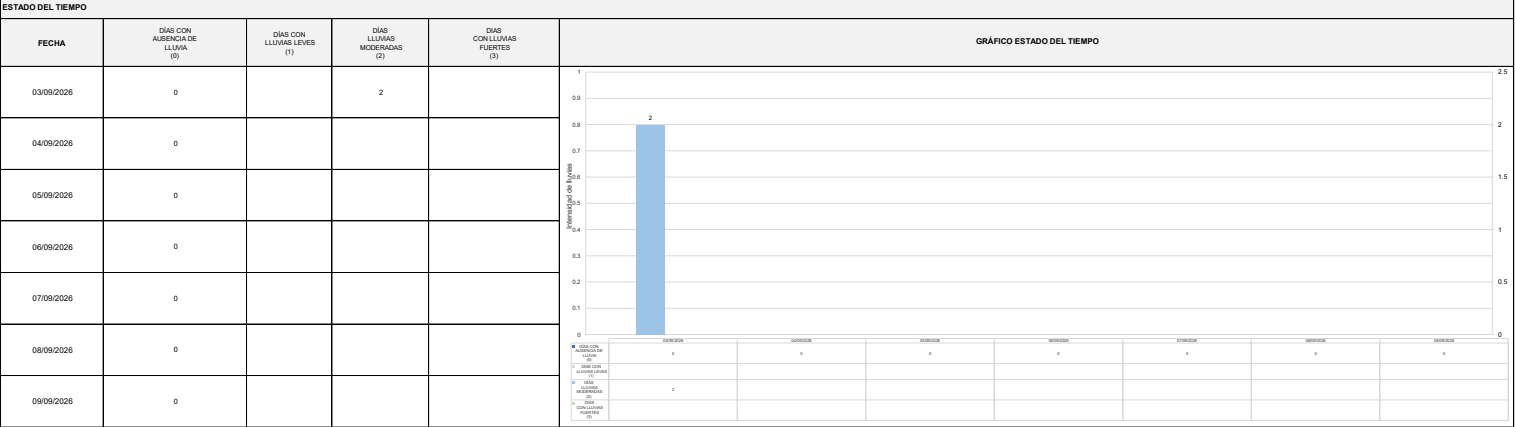

ACTIVIDADES GESTION AMBIENTAL:

Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra. Se realizó un recorrido socioambiental en el área de influencia, verificando las condiciones del entorno y el estado del cerramiento en sárén, el cual se encuentra en buen estado y cumple con su función de protección y delimitación.
Actividades constructivas:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.
Gestión del recurso hídrico:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.
Biodiversidad y servicios ecosistémicos:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.
Manejo de instalaciones temporales:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra.

Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

Total empleos proyecto (contratista):	Mano de obra local: 0	Mano de obra foránea: 0	N° de socializaciones realizadas:	
Empleos nuevos generados (última semana):	0		N° de capacitaciones realizadas:	0
Total actas de vecindad (última semana):	0		N° de inducciones realizadas:	0
Total actas de entorno (última semana):	0		N° de PQRSF atendidas:	0
Dirección punto de atención a la comunidad:	El contratista aun no ha reportado el punto que se destinará para la atención comunitaria		Canales de atención a la comunidad virtual:	

Observaciones:

ACTIVIDADES GESTION SOCIAL:

Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria y servicios públicos:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra. Se realizó un recorrido socioambiental en el área de influencia, verificando las condiciones del entorno y el estado del cerramiento en sárén, el cual se encuentra en buen estado y cumple con su función de protección y delimitación.
Programa para el reconocimiento del entorno:	Durante la visita de interventoría se realizó un recorrido social en el área de influencia
Programa de contratación de mano de obra:	Sin personal en obra
Información y divulgación:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.
Atención a la comunidad e interesados en el proyecto:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural:	No aplica para este proyecto
Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.
Capacitación y participación comunitaria:	Durante la visita de interventoría se constató que no se encuentran en actividades.

IV. GESTIÓN SST						
N° de inducciones realizadas:	0	N° de charlas realizadas:	0			
N° inspecciones de seguridad realizadas:	0	N° de capacitaciones realizadas:	0			
N° de accidentes de trabajo ocurridos :	0	N° de días ausentismo por enfermedad	0			
N° de días perdidos por AT:	0					
TEMAS FORMACIÓN DIARIA		HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LA SEMANA COMPONENTE SST				
Día	TEMA	Día	HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA CIERRE	ESTADO
1		1				
2		2				
3		3				
4		4				
5		5				
6		6				
ACTIVIDADES GESTION SST						
Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista solo laboró dos días, durante las visitas realizadas no se evidenció ejecución de actividades por parte del contratista.						
Observaciones: Se realizó envío de oficio # 15002679 al contratista en el que se notifica el incumplimiento la obligación de entregar la documentación del personal, así como el pago de la seguridad social del personal.						
ACCIDENTALIDAD SEMANAL						
TASA DE ACCIDENTALIDAD		TASA DE SEVERIDAD DEL ACCIDENTE				
Análisis: Durante el periodo objeto del informe la tasa de accidentalidad se mantiene en cero, debido a que el contratista no reportó accidentes de trabajo.		Análisis: Durante el periodo objeto del informe la tasa de severidad se mantiene en cero, debido a que no se presentaron incapacidades por accidentes de trabajo.				
VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Foto 1.		Foto 2.		Foto 3.		

Foto 4.		Foto 5.		Foto 6.	
					
Foto 6.		Foto 7.		Foto 8.	
Foto 9.		Foto 10.		Foto 11.	
Foto 12.		Foto 13.		Foto 14.	
Foto 15.		Foto 16.		Foto 17.	
IX. OBSERVACIONES					
					
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: CARLOS MAURICIO SOTOMAYOR PÉREZ		NOMBRE: DORA TORRES ORTIZ		NOMBRE: SANDRA BENÍTEZ	
CARGO: PROFESIONAL TÉCNICO		CARGO: PROFESIONAL SOCIAL		CARGO: PROFESIONAL SST	
