

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
05-10-2026	10-2026	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	IVAN MATURANA CORDOBA

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	SA-MC-03-2026	Tipo: Prestación: Obra	Convenio No.		Tipo. Contrato SA-MC-03-2026
OBJETO: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira-Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira."					
Rubro Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor	
C-2701-0800-37-2011D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	2026	3826	12-05-2026	1.750.000.000	
			TOTAL	1.750.000.000	

Valor Inicial del Contrato	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
1.750.000.000		29-07-2026	127 días	24-08-2026	31-12-2026

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de la Garantía	No. de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Valor
75-44-101155155 75-40-101058895	31-07-2026	20526	30-07-2026	1.750.000.000
			TOTAL	1.750.000.000

Modificaciones al Contrato							
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance		
Adición							
Prorroga							
		TOTAL	XX días				
Información							
Valor Total de Contrato y/o Convenio				1.750.000.000	% Anticipo:		
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
05-10-2026	Abono en Cuenta	3.00	52.381.114,17				Factura RIE No. 448
	TOTAL	3.00	52.381.114,17				

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUCION / CUMPLIMIENTO			
	SI	NO	N/A	OBSERVACION
Cumplir a cabalidad con el objeto de la presente contratación, conforme lo establecido en la Invitación Publica y efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones Técnicas	X			
Suscribir el acta de inicio	X			
Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier aspecto del objeto del contrato	X			
Elaborar Quincenalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual debe ser	X			
Dar cumplimiento de las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecidas en el ACUERDO No. PSAA16-10560 "Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004", elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo según la reglamentación vigente. Anexos 9	X			
Además de las aquí previstas, el contratista deberá cumplir con aquellas que la ley le imponga y le sean inherentes a la naturaleza				

Productos a entregar	Productos	Fecha	% de Ejecución
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)			

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	alternativa	Fecha	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor	
Nom	IVAN MATURANA CORDOBA
Carg	Supervisor

SUPERVISIÓN

1. SEGUIMIENTO TECNICO

Se revisó el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato.

ACTIVIDADES GENERALES

El día 24-08-2026 se reunieron los señores CRISTIAN LUIS BARON TORRES Representante Legal de la empresa REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S como CONTRATISTA, y el Arquitecto MAURICIO CASTRO SORIANO Representante Legal de la empresa EJE GROUP S.A.S. en calidad de Interventoría, revisaron los términos y condiciones del contrato e iniciaron los contratos.

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se revisó el expediente electrónico del contrato verificando que cumple con la normativa aplicable se revisaron las garantías.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20382111	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.401.181.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2031 @UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito	Aprobada
CO1.WRT.20298933	Seriedad de la oferta	-	175.000.000,00 COP	-	24 días para terminar (31/10/2026 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía

CO1.WRT.20382111

Referencia de la garantía

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Estado

Aprobada

Justificación

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra

☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora

SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza

75-44-101155155

Tomador

REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S

Beneficiario

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION PEREIRA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	175.000.000,00 COP	30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	175.000.000,00 COP	31/12/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	350.000.000,00 COP	31/12/2031 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	350.000.000,00 COP	31/12/2031 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Estado

Aprobada

garantía

75-44-101154577

Justificación

☒ Seriedad de la oferta

Valor

175.000.000,00 COP

Vigencia

31/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)

Descripción	Nombre del documento		
☐ 11. GARANTIA DE SERIEDAD.pdf	11. GARANTIA DE SERIEDAD.pdf	Descargar	Detalle

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RP	Fecha de Registro	Unidad	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Soporte
3826	20526	2026-07-30	02	C-2701-0800-28-0-2701023-02	1.750.000.000	0.00	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S	SA-MC-03-2026
					125.649.720	0.00		

PAGOS REALIZADOS

CDP	RPC	Informe No.	Factura	Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
3826	20526	1	No. 448				52.381.114,17		
SUMAS							52.381.114,17		

VALOR PARA PAGAR EN ESTE INFORME:


Documento	Numero	Fecha	Valor Total
Factura	RIE No. 448	05-10-2026	52.381.114,17

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

Se verificó que el contrato que la ejecución del contrato se está realizando de acuerdo a lo contratado y a la normativa aplicable.

5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Realizar la adopción del Plan de Gestión Ambiental mediante el uso adecuado de papel.


IVAN MATURANA CÓRDOBA
Coordinador Administrativo y Financiero
Dirección Seccional de Administración Judicial
Supervisor del Contrato

Pereira, 05 de octubre de 2026

Doctores,

IVÁN MATURANA CORDOBA

Supervisor

Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira – Risaralda

CC

CRISTIAN LUIS BARÓN TORRES

REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.

Representante Legal

REFERENCIA: *Contrato de Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento de Sedes N.º SA-MC-003-2026, celebrado entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira – Risaralda y REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.*

ASUNTO: *Oficio N. 40 Concepto favorable y remisión del Acta de Obra N.º 001 y sus soportes para trámite de pago.*

Cordial saludo,

EJE GROUP S.A.S., en cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoría N.º MC-07-2026, remite el Acta de Obra N.º 001, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 30 de septiembre de 2026, presentada por REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. mediante el Oficio OFI-REING-SAMC003-031 del 4 de octubre de 2026.

La revisión de la Interventoría comprendió las cantidades incorporadas al corte, sus memorias de cálculo, los precios unitarios y la liquidación del acta, en correspondencia con las actividades de desmonte y demolición de la Orden de Trabajo N.º 1 ejecutadas en la sede principal de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira.

Como resultado de esta revisión, la Interventoría emite concepto favorable sobre el Acta de Obra N.º 001, por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$52.381.114,17), incluido el IVA sobre la utilidad. Este valor coincide con el total de la Factura Electrónica de Venta RIE 448 del 5 de octubre de 2026.

El concepto favorable se circunscribe a las cantidades y actividades incluidas en el acta. Para la revisión de la Supervisión y la continuidad del trámite administrativo y financiero, se remite la siguiente documentación:

- Factura Electrónica de Venta RIE 448 y archivos electrónicos asociados.
- Acta de Obra N.º 001.



EJE GROUP SAS

OF-INTER-INT-RM-27

- Memorias de cálculo.
- Informe técnico del primer corte.
- Informes semanales.
- Seguimiento de ejecución y Curva S.
- Registro fotográfico.
- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Bitácora del periodo.
- Planillas PILA.
- Registro Único Tributario —RUT— del contratista.
- Certificación bancaria.
- Oficio de remisión OFI-REING-SAMC003-031.

Con fundamento en lo anterior, se solicita a la Supervisión continuar con la revisión y el trámite de pago del Acta de Obra N.º 001, previa verificación de los requisitos administrativos exigidos por la Entidad.

Cordialmente,

MAURICIO CASTRO SORIANO

Representante Legal
EJE GROUP S.A.S.

EJE GROUP SAS



CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN

ACTA DE CORTE 1

NUMERO DE PROCESO						SA-MC-003-2026				FECHA DE INICIO				24 DE AGOSTO DEL 2026									
OBJETO DEL PROCESO:						Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira																	
CONTRATISTA: REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S						INTERVENTOR: EJE GROUP S.A.S				SUPERVISOR: IVAN MATURANA CORDOBA													
PERIODO A PAGAR:						DEL 24 DE AGOSTO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				VALOR PRESENTE ACTA				\$ 52.381.114,17									
ACTIVIDADES CONTRATO INICIAL										BALANCE A LA FECHA				ACTA PARCIAL 1				ACTA PARCIAL 2				ACUMULADO ACTUAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS ODT1			DEL 24 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2026				DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2026										
						CANTIDAD		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR							
(+)	(-)	CANT S/BALANCE																					
1	PRELIMINARES				\$ 3.376.700,00				\$ 57.774.042,00			\$ 52.001.105,00			\$ 0,00			\$ 52.001.105,00					
1.1	Replanteo topográfico con equipo	M2	1,00	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00		1,00	\$ 3.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.2	Replanteo (manual y equipo láser)	M2	1,00	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00		1,00	\$ 2.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.3	Cerramiento provisional en polisombra de alta densidad	M	1,00	\$ 45.200,00	\$ 45.200,00		1,00	\$ 45.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.4	Cerramiento provisional	M	1,00	\$ 138.500,00	\$ 138.500,00		1,00	\$ 138.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.5	Valla de identificación de obra (área > 4 m²)	M2	1,00	\$ 465.800,00	\$ 465.800,00		1,00	\$ 465.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.6	Descapote y limpieza manual del terreno	M2	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00		1,00	\$ 15.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.7	Desmonte piso laminado	M2	1,00	\$ 7.300,00	\$ 7.300,00		1,00	\$ 7.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.8	Desmonte división de baño en cualquier material	M2	1,00	\$ 11.300,00	\$ 11.300,00		54,05	\$ 610.765,00	46,12	\$ 521.120,00	0,00	\$ 0,00	46,12	\$ 521.120,00	0,00	\$ 0,00	46,12	\$ 521.120,00					
1.9	Desmonte divisiones de oficina	M2	1,00	\$ 10.600,00	\$ 10.600,00		1,00	\$ 10.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.10	Desmonte división en vidrio templado piso-techo	M2	1,00	\$ 19.100,00	\$ 19.100,00		1,00	\$ 19.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.11	Desmonte piso flexible (vinilo, alfombra o tapete)	M2	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00		1,00	\$ 15.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.12	Desmonte puerta metálica existente en vano definido	UN	1,00	\$ 692.700,00	\$ 692.700,00		1,00	\$ 692.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.13	Desmonte aparatos sanitarios con recuperación	UN	1,00	\$ 88.100,00	\$ 88.100,00		46,00	\$ 4.052.600,00	39,00	\$ 3.435.900,00	0,00	\$ 0,00	39,00	\$ 3.435.900,00	0,00	\$ 0,00	39,00	\$ 3.435.900,00					
1.14	Desmonte puerta metálica, en madera o en vidrio	M2	1,00	\$ 39.500,00	\$ 39.500,00		70,06	\$ 2.767.512,00	68,24	\$ 2.695.425,00	0,00	\$ 0,00	68,24	\$ 2.695.425,00	0,00	\$ 0,00	68,24	\$ 2.695.425,00					
1.15	Desmonte ventanería metálica o en madera	M2	1,00	\$ 49.700,00	\$ 49.700,00		14,55	\$ 723.125,00	14,55	\$ 723.125,00	0,00	\$ 0,00	14,55	\$ 723.125,00	0,00	\$ 0,00	14,55	\$ 723.125,00					
1.16	Desmonte rejas metálicas o en aluminio	M2	1,00	\$ 51.700,00	\$ 51.700,00		1,00	\$ 51.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.17	Desmonte canalizaciones eléctricas	M	1,00	\$ 15.700,00	\$ 15.700,00		1206,62	\$ 18.943.934,00	1.206,62	\$ 18.943.934,00	0,00	\$ 0,00	1.206,62	\$ 18.943.934,00	0,00	\$ 0,00	1.206,62	\$ 18.943.934,00					
1.18	Desmonte punto eléctrico	UN	1,00	\$ 13.300,00	\$ 13.300,00		633,00	\$ 8.418.900,00	624,00	\$ 8.299.200,00	0,00	\$ 0,00	624,00	\$ 8.299.200,00	0,00	\$ 0,00	624,00	\$ 8.299.200,00					
1.19	Desmonte cable UTP de red de datos o cable de red	M	1,00	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00		1,00	\$ 5.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.20	Desmonte tablero eléctrico existente	UN	1,00	\$ 229.000,00	\$ 229.000,00		1,00	\$ 229.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.21	Desmonte punto hidráulico o de desagüe	UN	1,00	\$ 27.200,00	\$ 27.200,00		16,00	\$ 435.200,00	12,00	\$ 326.400,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 326.400,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 326.400,00					
1.22	Desmonte canales y bajantes de aguas lluvias	M	1,00	\$ 16.900,00	\$ 16.900,00		1,00	\$ 16.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.23	Desmonte cielo raso	M2	1,00	\$ 14.800,00	\$ 14.800,00		46,57	\$ 689.236,00	45,47	\$ 673.026,00	0,00	\$ 0,00	45,47	\$ 673.026,00	0,00	\$ 0,00	45,47	\$ 673.026,00					
1.24	Desmonte ductería de aire acondicionado	M	1,00	\$ 29.400,00	\$ 29.400,00		23,00	\$ 676.200,00	23,00	\$ 676.200,00	0,00	\$ 0,00	23,00	\$ 676.200,00	0,00	\$ 0,00	23,00	\$ 676.200,00					
1.25	Desmonte cubiertas libres de asbesto	M2	1,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00		1,00	\$ 24.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.26	Demolición pasamanos en concreto	M	1,00	\$ 51.100,00	\$ 51.100,00		1,00	\$ 51.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.27	Demolición enchape o revoque	M2	1,00	\$ 33.700,00	\$ 33.700,00		35,20	\$ 1.186.240,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.28	Demolición afinado de piso en mortero	M2	1,00	\$ 29.400,00	\$ 29.400,00		1,00	\$ 29.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.29	Demolición piso en baldosa de granilo y mortero	M2	1,00	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00		1,00	\$ 42.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.30	Desmonte o demolición de piso en adoquín de concreto	M2	1,00	\$ 20.200,00	\$ 20.200,00		1,00	\$ 20.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.31	Demolición muros en mampostería	M2	1,00	\$ 39.800,00	\$ 39.800,00		168,34	\$ 6.700.127,00	136,53	\$ 5.433.727,00	0,00	\$ 0,00	136,53	\$ 5.433.727,00	0,00	\$ 0,00	136,53	\$ 5.433.727,00					
1.32	Demolición muro en placa de fibrocemento	M2	1,00	\$ 17.700,00	\$ 17.700,00		1,00	\$ 17.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.33	Demolición muro en placa de yeso	M2	1,00	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00		674,26	\$ 9.911.675,00	662,01	\$ 9.731.595,00	0,00	\$ 0,00	662,01	\$ 9.731.595,00	0,00	\$ 0,00	662,01	\$ 9.731.595,00					
1.34	Demolición concreto simple o reforzado con equipo menor	M3	1,00	\$ 966.300,00	\$ 966.300,00		0,40	\$ 386.928,00	0,31	\$ 303.053,00	0,00	\$ 0,00	0,31	\$ 303.053,00	0,00	\$ 0,00	0,31	\$ 303.053,00					
1.35	Demolición poceta de aseo	UN	1,00	\$ 119.200,00	\$ 119.200,00		3,00	\$ 357.600,00	2,00	\$ 238.400,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 238.400,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 238.400,00					
1.36	Aseo y limpieza generalIncluye limpieza profunda	M2	1,00	\$ 6.400,00	\$ 6.400,00		1,00	\$ 6.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
1.37	Disposición final Residuos de Aparatos Eléctricos	KG	1,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00		1,00	\$ 4.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				\$ 1.207.600,00			\$ 1.207.600,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00					
2.1	Excavación material común a cualquier grado de humedad	M3	1,00	\$ 147.500,00	\$ 147.500,00		1,00	\$ 147.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2.2	Excavación conglomerado seco a cualquier grado	M3	1,00	\$ 314.200,00	\$ 314.200,00		1,00	\$ 314.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2.3	Lleno compactado libre de materia orgánica	M3	1,00	\$ 59.800,00	\$ 59.800,00		1,00	\$ 59.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2.4	Lleno con material de afirmado clasificado	M3	1,00	\$ 172.000,00	\$ 172.000,00		1,00	\$ 172.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2.5	Carra y atraque en arena lavada de río	M3	1,00	\$ 208.000,00	\$ 208.000,00		1,00	\$ 208.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2.6	Cargue y transporte material sobrante en volqueta de 7	M3	1,00	\$ 80.600,00	\$ 80.600,00		1,00	\$ 80.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2.7	Base/subbase granular	M3	1,00	\$ 194.000,00	\$ 194.000,00		1,00	\$ 194.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
2.8	Disposición final residuos de construcción y demolición	M3	1,00	\$ 31.500,00	\$ 31.500,00		1,00	\$ 31.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					

3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 5.449.900,00		\$ 5.449.900,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.1	Concreto de limpieza de 14 MPa (2000 psi), e=5cm	M2	1,00	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	1,00	\$ 50.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.2	Viga de cimentación en concreto de 21 MPa (3000 psi)	M3	1,00	\$ 1.047.100,00	\$ 1.047.100,00	1,00	\$ 1.047.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.3	Viga de amarre y confinamiento en concreto de 21 MPa	M3	1,00	\$ 1.119.900,00	\$ 1.119.900,00	1,00	\$ 1.119.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.4	Columneta de confinamiento en concreto de 21 MPa	M3	1,00	\$ 1.213.400,00	\$ 1.213.400,00	1,00	\$ 1.213.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.5	Viga cinta en concreto de 21 MPa (3000 psi) preparado	ML	1,00	\$ 32.600,00	\$ 32.600,00	1,00	\$ 32.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.6	Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3000 psi)	M2	1,00	\$ 104.000,00	\$ 104.000,00	1,00	\$ 104.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.7	Placa maciza en concreto de 21 MPa (3000 psi), e=15cm	M2	1,00	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	1,00	\$ 178.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.8	Reparación elementos estructurales en concreto	M2	1,00	\$ 660.700,00	\$ 660.700,00	1,00	\$ 660.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3.9	Mortero de relleno de baja retracción	M3	1,00	\$ 1.043.800,00	\$ 1.043.800,00	1,00	\$ 1.043.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4	REFUERZOS Y ANCLAJES					\$ 394.600,00		\$ 394.600,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1	Acero liso Fy=240 MPa	KG	1,00	\$ 9.400,00	\$ 9.400,00	1,00	\$ 9.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.2	Acero corrugado Fy=420 MPa	KG	1,00	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00	1,00	\$ 8.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.3	Gratifi de acero, alambirón trellado 4 a 7 mm	KG	1,00	\$ 10.200,00	\$ 10.200,00	1,00	\$ 10.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.4	Malla electrosoldada Q-5 cuadrícula 15x15 cm	M2	1,00	\$ 32.100,00	\$ 32.100,00	1,00	\$ 32.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.5	Anclaje epóxico Ø 3/8", profundidad 9 cm	UN	1,00	\$ 22.600,00	\$ 22.600,00	1,00	\$ 22.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.6	Anclaje epóxico Ø 1/2", profundidad 11 cm	UN	1,00	\$ 26.100,00	\$ 26.100,00	1,00	\$ 26.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.7	Anclaje epóxico Ø 5/8", profundidad 14 cm	UN	1,00	\$ 32.700,00	\$ 32.700,00	1,00	\$ 32.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.8	Anclaje epóxico Ø 3/4", profundidad 17 cm	UN	1,00	\$ 41.900,00	\$ 41.900,00	1,00	\$ 41.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.9	Anclaje epóxico Ø 1", profundidad 23 cm	UN	1,00	\$ 66.600,00	\$ 66.600,00	1,00	\$ 66.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.10	Anclaje mecánico perno de cuña Ø 1/2" x 3" zincado	UN	1,00	\$ 21.400,00	\$ 21.400,00	1,00	\$ 21.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.11	Platina de anclaje en acero A36, espesor 1/4" a 1/2"	KG	1,00	\$ 19.100,00	\$ 19.100,00	1,00	\$ 19.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4.12	Prueba de extracción (Pull-out)	UN	1,00	\$ 104.100,00	\$ 104.100,00	1,00	\$ 104.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5	MAPOSTERÍA					\$ 2.240.700,00		\$ 2.240.700,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.1	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm	M2	1,00	\$ 198.700,00	\$ 198.700,00	1,00	\$ 198.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.2	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm	ML	1,00	\$ 99.900,00	\$ 99.900,00	1,00	\$ 99.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.3	Muro en bloque de concreto estándar No	M2	1,00	\$ 97.900,00	\$ 97.900,00	1,00	\$ 97.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.4	Muro en bloque de concreto estándar No	ML	1,00	\$ 53.000,00	\$ 53.000,00	1,00	\$ 53.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.5	Muro en bloque de concreto estándar No	M2	1,00	\$ 115.800,00	\$ 115.800,00	1,00	\$ 115.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.6	Muro en bloque de concreto estándar No	ML	1,00	\$ 56.700,00	\$ 56.700,00	1,00	\$ 56.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.7	Muro en ladrillo portante prensado 26x12x6 cm	M2	1,00	\$ 398.900,00	\$ 398.900,00	1,00	\$ 398.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.8	Mesón en concreto 21 MPa (3000 PSI)	ML	1,00	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	1,00	\$ 178.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.9	Dintel en concreto 21 MPa (3000 PSI)	ML	1,00	\$ 70.100,00	\$ 70.100,00	1,00	\$ 70.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.10	Dintel en concreto 21 MPa (3000 PSI)	ML	1,00	\$ 103.300,00	\$ 103.300,00	1,00	\$ 103.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.11	Alfajía en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm	ML	1,00	\$ 88.400,00	\$ 88.400,00	1,00	\$ 88.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.12	Alfajía fundida en sitio en concreto 17,2 MPa	ML	1,00	\$ 91.200,00	\$ 91.200,00	1,00	\$ 91.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.13	Poceta de aseo prefabricada en granito 42x42x25 cm	UN	1,00	\$ 630.400,00	\$ 630.400,00	1,00	\$ 630.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.14	Corte mampostería con pulidora eléctrica y disco	ML	1,00	\$ 34.100,00	\$ 34.100,00	1,00	\$ 34.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5.15	Grouting 17,2 MPa (2500 PSI) en celosas de mampostería	ML	1,00	\$ 24.300,00	\$ 24.300,00	1,00	\$ 24.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO					\$ 759.800,00		\$ 759.800,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.1	Muro divisorio en placa de yeso doble cara, e=12cm	M2	1,00	\$ 132.700,00	\$ 132.700,00	1,00	\$ 132.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6.2	Muro divisorio en placa de yeso una cara, e=8cm	M2	1,00	\$ 90.300,00	\$ 90.300,00	1,00	\$ 90.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6.3	Muro divisorio en placas de fibrocemento doble cara	M2	1,00	\$ 191.500,00	\$ 191.500,00	1,00	\$ 191.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6.4	Muro divisorio en placas de fibrocemento una cara	M2	1,00	\$ 128.600,00	\$ 128.600,00	1,00	\$ 128.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6.5	Aislamiento termo-acústico en rollo de lana de vidrio	M2	1,00	\$ 48.100,00	\$ 48.100,00	1,00	\$ 48.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6.6	Reparación muros en placa de yeso o placas	M2	1,00	\$ 168.600,00	\$ 168.600,00	1,00	\$ 168.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7	ALISTADO DE PISOS, POYOS					\$ 809.100,00		\$ 1.442.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.1	Alistado de piso en mortero 1:4 cemento-arena, e=4cm	M2	1,00	\$ 61.900,00	\$ 61.900,00	1,00	\$ 61.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.2	Alistado de piso impermeabilizado en mortero 1:4	M2	1,00	\$ 70.100,00	\$ 70.100,00	1,00	\$ 70.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.3	Piso en mortero 1:4 cemento-arena, e=4cm	M2	1,00	\$ 103.000,00	\$ 103.000,00	1,00	\$ 103.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.4	Piso en concreto de 21 MPa (3000 psi), e=4cm	M2	1,00	\$ 138.500,00	\$ 138.500,00	1,00	\$ 138.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.5	Piso en concreto de 21 MPa (3000 psi), e=4cm	M2	1,00	\$ 101.000,00	\$ 101.000,00	1,00	\$ 101.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.6	Mortero autonivelante de base cementicia, e=5mm	M2	1,00	\$ 106.300,00	\$ 106.300,00	1,00	\$ 106.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.7	Poyo o base de soporte en concreto de 21 MPa	M2	1,00	\$ 194.600,00	\$ 194.600,00	1,00	\$ 194.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7.8	Media caña en mortero 1:3 cemento-arena	ML	1,00	\$ 33.700,00	\$ 33.700,00	1,00	\$ 33.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8	PAÑETES					\$ 577.400,00		\$ 577.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.1	Pañete liso en mortero 1:4	M2	1,00	\$ 55.500,00	\$ 55.500,00	1,00	\$ 55.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.2	Pañete impermeabilizado en mortero 1:3	M2	1,00	\$ 72.300,00	\$ 72.300,00	1,00	\$ 72.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.3	Pañete liso en mortero 1:4 bajo placa de concreto	M2	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	1,00	\$ 78.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.4	Pañete rústico en mortero 1:4	M2	1,00	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00	1,00	\$ 64.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.5	Tratamiento hidrófugo incoloro (repelente de agua)	M2	1,00	\$ 36.700,00	\$ 36.700,00	1,00	\$ 36.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.6	Regata en piso de mortero o concreto, ejecutada	ML	1,00	\$ 49.500,00	\$ 49.500,00	1,00	\$ 49.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.7	Regata en muro, ejecutada con pulidora eléctrica	ML	1,00	\$ 39.300,00	\$ 39.300,00	1,00	\$ 39.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.8	Resane general de pañetes en muros o cielos con mortero	M2	1,00	\$ 76.300,00	\$ 76.300,00	1,00	\$ 76.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.9	Remates de bordes (filos), carteras y dilataciones	ML	1,00	\$ 27.900,00	\$ 27.900,00	1,00	\$ 27.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8.10	Pañete liso en mortero 1:4	M2	1,00	\$ 77.700,00	\$ 77.700,00	1,00	\$ 77.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9	CIELO RASOS					\$ 1.239.500,00		\$ 1.239.500,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.1	Cielo raso plano en placa de yeso de 1/2"	M2	1,00	\$ 108.400,00	\$ 108.400,00	1,00	\$ 108.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9.2	Cielo raso plano en placa de yeso resistente a la	M2	1,00	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	1,00	\$ 125.000,00	-	\$ 0,00	0,00,				

10.2	Pintura vinílica lavable Tipo 1	M2	1,00	\$ 27.600,00	\$ 27.600,00	1,00	\$ 27.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.3	Recubrimiento epóxico base agua bicomponente	M2	1,00	\$ 71.600,00	\$ 71.600,00	1,00	\$ 71.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.4	Pintura exterior acrílica de alta	M2	1,00	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	1,00	\$ 52.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.5	Sistema de protección	M2	1,00	\$ 33.700,00	\$ 33.700,00	1,00	\$ 33.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.6	Sistema de protección	ML	1,00	\$ 12.900,00	\$ 12.900,00	1,00	\$ 12.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.7	Barniz o esmalte sintético	M2	1,00	\$ 34.300,00	\$ 34.300,00	1,00	\$ 34.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.8	Barniz o esmalte sintético	ML	1,00	\$ 13.700,00	\$ 13.700,00	1,00	\$ 13.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.9	Sistema protector en esmalte sintético	M2	1,00	\$ 38.900,00	\$ 38.900,00	1,00	\$ 38.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.10	Pintura de tráfico	ML	1,00	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	1,00	\$ 12.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.11	Pintura en esmalte	ML	1,00	\$ 8.800,00	\$ 8.800,00	1,00	\$ 8.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.12	Estuco plástico	UN	1,00	\$ 13.800,00	\$ 13.800,00	1,00	\$ 13.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11	ENCHAPES Y ACABADOS			\$ 2.723.800,00	\$ 2.723.800,00		\$ 2.723.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.1	Piso en baldosa de granito pulido prefabricado de 33×33	M2	1,00	\$ 182.300,00	\$ 182.300,00	1,00	\$ 182.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.2	Pulida y cristalizada pisos existentes en granito	M2	1,00	\$ 66.500,00	\$ 66.500,00	1,00	\$ 66.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.3	Bocapuerta o cenefa prefabricada en granito pulido	ML	1,00	\$ 141.100,00	\$ 141.100,00	1,00	\$ 141.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.4	Guardascoba en baldosa de granito h=7 cm	ML	1,00	\$ 51.400,00	\$ 51.400,00	1,00	\$ 51.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.5	Piso en cerámica esmaltada, formato s 33×33 cm	M2	1,00	\$ 96.100,00	\$ 96.100,00	1,00	\$ 96.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.6	Piso en cerámica esmaltada de tráfico comercial	M2	1,00	\$ 130.700,00	\$ 130.700,00	1,00	\$ 130.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.7	Guardascoba en cerámica esmaltada comercial h=7 cm	ML	1,00	\$ 39.200,00	\$ 39.200,00	1,00	\$ 39.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.8	Piso en porcelanato esmaltado, formato 60×60 cm	M2	1,00	\$ 193.700,00	\$ 193.700,00	1,00	\$ 193.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.9	Guardascoba en porcelanato esmaltado h=7 cm	ML	1,00	\$ 56.200,00	\$ 56.200,00	1,00	\$ 56.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.10	Cenefa en porcelanato	ML	1,00	\$ 74.900,00	\$ 74.900,00	1,00	\$ 74.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.11	Piso en madera laminada de alta presión (HPL)	M2	1,00	\$ 127.700,00	\$ 127.700,00	1,00	\$ 127.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.12	Piso vinílico	M2	1,00	\$ 150.500,00	\$ 150.500,00	1,00	\$ 150.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.13	Pulida, sellada y lacada de piso en madera natural	M2	1,00	\$ 105.800,00	\$ 105.800,00	1,00	\$ 105.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.14	Guardascoba en PVC rígido de alto impacto h=7 cm	ML	1,00	\$ 26.900,00	\$ 26.900,00	1,00	\$ 26.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.15	Enchape de pared en cerámica esmaltada, formato entre	M2	1,00	\$ 112.700,00	\$ 112.700,00	1,00	\$ 112.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.16	Mesón prefabricado en granito pulido, e=2cm	ML	1,00	\$ 661.300,00	\$ 661.300,00	1,00	\$ 661.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.17	Piso	M2	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	1,00	\$ 300.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.18	Reposición enchape de piso o pared	UN	1,00	\$ 71.000,00	\$ 71.000,00	1,00	\$ 71.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.19	Cenefa antideslizante	ML	1,00	\$ 69.100,00	\$ 69.100,00	1,00	\$ 69.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.20	Sellante	ML	1,00	\$ 34.900,00	\$ 34.900,00	1,00	\$ 34.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.21	Guardascoba en mortero pulido 1:3, h=7 cm, e=1,5cm	ML	1,00	\$ 31.800,00	\$ 31.800,00	1,00	\$ 31.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12	CUBIERTA			\$ 2.148.900,00	\$ 2.148.900,00		\$ 2.148.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.1	Impermeabilización con manto asfáltico modificado	M2	1,00	\$ 88.200,00	\$ 88.200,00	1,00	\$ 88.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.2	Cubierta	M2	1,00	\$ 226.600,00	\$ 226.600,00	1,00	\$ 226.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.3	Caminadero metálico	ML	1,00	\$ 226.600,00	\$ 226.600,00	1,00	\$ 226.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.4	Cubierta en teja termoacústica con núcleo	M2	1,00	\$ 95.900,00	\$ 95.900,00	1,00	\$ 95.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.5	Cubierta translúcida en policarbonato alveolar	M2	1,00	\$ 165.200,00	\$ 165.200,00	1,00	\$ 165.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.6	Cubierta translúcida en policarbonato macizo	M2	1,00	\$ 349.000,00	\$ 349.000,00	1,00	\$ 349.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.7	Canal de aguas lluvias	ML	1,00	\$ 162.100,00	\$ 162.100,00	1,00	\$ 162.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.8	Canal de aguas lluvias	ML	1,00	\$ 226.300,00	\$ 226.300,00	1,00	\$ 226.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.9	Tragante	UN	1,00	\$ 157.400,00	\$ 157.400,00	1,00	\$ 157.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.10	Fianche	ML	1,00	\$ 64.400,00	\$ 64.400,00	1,00	\$ 64.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.11	Fianche	ML	1,00	\$ 104.000,00	\$ 104.000,00	1,00	\$ 104.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.12	Remate de cumbrera, caballete o limatesa	ML	1,00	\$ 90.900,00	\$ 90.900,00	1,00	\$ 90.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.13	Aislamiento térmico reflectivo bajo cubierta	M2	1,00	\$ 39.700,00	\$ 39.700,00	1,00	\$ 39.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.14	Mantenimiento cubierta existente	M2	1,00	\$ 20.500,00	\$ 20.500,00	1,00	\$ 20.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.15	Reposición teja deteriorada	UN	1,00	\$ 116.300,00	\$ 116.300,00	1,00	\$ 116.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.16	Limpieza profunda de canales y bajantes de aguas	ML	1,00	\$ 15.800,00	\$ 15.800,00	1,00	\$ 15.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13	CARPINTERIA EN MADERA			\$ 11.674.600,00	\$ 11.674.600,00		\$ 11.674.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera existente	UN	1,00	\$ 230.800,00	\$ 230.800,00	1,00	\$ 230.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.2	Puerta en madera entamborada de 0,80 × 2,40 m	UN	1,00	\$ 1.296.400,00	\$ 1.296.400,00	1,00	\$ 1.296.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.3	Puerta en madera entamborada de 0,90 × 2,40 m	UN	1,00	\$ 1.390.400,00	\$ 1.390.400,00	1,00	\$ 1.390.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.4	Puerta en madera entamborada de 1,00 × 2,40 m	UN	1,00	\$ 1.491.800,00	\$ 1.491.800,00	1,00	\$ 1.491.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.5	Puerta en madera entamborada de doble hoja, 1,60 × 2,40	UN	1,00	\$ 2.553.900,00	\$ 2.553.900,00	1,00	\$ 2.553.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.6	Hoja de puerta en madera entamborada	UN	1,00	\$ 965.400,00	\$ 965.400,00	1,00	\$ 965.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.7	Marco de puerta en pino tea inmunizado o equivalente	UN	1,00	\$ 397.600,00	\$ 397.600,00	1,00	\$ 397.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.8	Restauración puerta en madera existente de gran	UN	1,00	\$ 1.942.700,00	\$ 1.942.700,00	1,00	\$ 1.942.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.9	Mueble modular en aglomerado de partículas resistente	ML	1,00	\$ 1.010.700,00	\$ 1.010.700,00	1,00	\$ 1.010.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.10	Entrepau en aglomerado RH	ML	1,00	\$ 181.900,00	\$ 181.900,00	1,00	\$ 181.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.11	Mantenimiento enchape de muros en madera	M2	1,00	\$ 128.500,00	\$ 128.500,00	1,00	\$ 128.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.12	Mantenimiento zócalo en madera de muros	ML	1,00	\$ 38.200,00	\$ 38.200,00	1,00	\$ 38.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.13	Mantenimiento cornisa en madera de muros	ML	1,00	\$ 46.300,00	\$ 46.300,00	1,00	\$ 46.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14	CARPINTERIA METÁLICA, DE ALUMINIO Y VIDRIO			\$ 40.230.600,00	\$ 40.230.600,00		\$ 40.230.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.1	Puerta metálica entamborada de 1,00 × 2,10 m	UN	1,00	\$ 2.100.700,00	\$ 2.100.700,00	1,00	\$ 2.100.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.2	Puerta metálica entamborada de 1,01 a 1,50 × 2,40 m	UN	1,00	\$ 2.921.500,00	\$ 2.921.500,00	1,00	\$ 2.921.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.3	Puerta metálica	UN	1,00	\$ 2.379.200,00	\$ 2.379.200,00	1,00	\$ 2.379.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.4	Puerta abatible en perfilera de aluminio	UN	1,00	\$ 2.319.800,00	\$ 2.319.800,00	1,00	\$ 2.319.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.5	Puerta abatible en perfilera de aluminio	UN	1,00	\$ 2.872.800,00	\$ 2.872.800,00	1,00	\$ 2.872.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.6	Puerta abatible en perfilera de aluminio	UN	1,00	\$ 5.046.200,00	\$ 5.046.200,00	1,00	\$ 5.046.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.7	Puerta en vidrio templado monolítico de 10 mm	UN	1,00	\$ 2.886.200,00	\$ 2.886.200,00	1,00	\$ 2.886.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.8	Puerta de acceso principal en vidrio laminado	UN	1,00	\$ 4.708.900,00	\$ 4.708.900,00	1,00	\$ 4.708.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.9	Puerta corrediza	UN	1,00	\$ 3.827.600,00	\$ 3.827.600,00	1,00	\$ 3.827.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.10	División piso-techo en vidrio templado de 10 mm	M2	1,00	\$ 757.200,00	\$ 757.200,00	1,00	\$ 757.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.11	Ventana corrediza en perfilera de aluminio	M2	1,00	\$ 542.400,00	\$ 542.400,00	1,00	\$ 542.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.12	Ventana corrediza en perfilera de aluminio	M2	1,00	\$ 690.900,00	\$ 690.900,00	1,00	\$ 690.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.13	Ventana proyectante en perfilera de aluminio	M2	1,00	\$ 627.900,00	\$ 627.900,00	1,00	\$ 627.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

14.14	Ventana fija en perfilera de aluminio arquitectónico	M2	1,00	\$ 573.200,00	\$ 573.200,00	1,00	\$ 573.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.15	Ventana corrediza en perfilera de aluminio	M2	1,00	\$ 802.600,00	\$ 802.600,00	1,00	\$ 802.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.16	Ventana	M2	1,00	\$ 610.700,00	\$ 610.700,00	1,00	\$ 610.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.17	Ventana	ML	1,00	\$ 354.400,00	\$ 354.400,00	1,00	\$ 354.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.18	Pasamanos en tubo de acero al carbón de 1 1/2"	ML	1,00	\$ 284.700,00	\$ 284.700,00	1,00	\$ 284.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.19	Pasamanos en tubo de acero inoxidable AISI 304	ML	1,00	\$ 513.000,00	\$ 513.000,00	1,00	\$ 513.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.20	Baranda metálica	ML	1,00	\$ 1.059.600,00	\$ 1.059.600,00	1,00	\$ 1.059.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.21	Baranda en vidrio laminado de seguridad templado 6+6 mm	ML	1,00	\$ 1.607.700,00	\$ 1.607.700,00	1,00	\$ 1.607.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.22	Reja de seguridad en varilla cuadrada maciza de 1/2"	M2	1,00	\$ 566.700,00	\$ 566.700,00	1,00	\$ 566.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.23	Cerramiento perimetral en tubería metálica galvanizada	ML	1,00	\$ 536.700,00	\$ 536.700,00	1,00	\$ 536.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.24	Cerramiento metálico	ML	1,00	\$ 640.000,00	\$ 640.000,00	1,00	\$ 640.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.25	Rejilla metálica de piso	ML	1,00	\$ 504.900,00	\$ 504.900,00	1,00	\$ 504.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.26	Mantenimiento ventanería en perfilera de aluminio	M2	1,00	\$ 133.400,00	\$ 133.400,00	1,00	\$ 133.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.27	Cambio vidrio en ventanería o puerta existente	M2	1,00	\$ 361.700,00	\$ 361.700,00	1,00	\$ 361.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15	CERRADURAS Y ESPEJOS				\$ 2.247.400,00		\$ 2.247.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.1	Cerradura	UN	1,00	\$ 169.500,00	\$ 169.500,00	1,00	\$ 169.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.2	Cerradura	UN	1,00	\$ 194.600,00	\$ 194.600,00	1,00	\$ 194.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.3	Cerradura	UN	1,00	\$ 790.700,00	\$ 790.700,00	1,00	\$ 790.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.4	Cerrojo de seguridad doble (deadbolt) complementario	UN	1,00	\$ 382.600,00	\$ 382.600,00	1,00	\$ 382.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.5	Desmonte puntual de cerradura existente conservando la	UN	1,00	\$ 30.100,00	\$ 30.100,00	1,00	\$ 30.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.6	Espejo flotado biselado de 4 mm de espesor, con plata	M2	1,00	\$ 313.900,00	\$ 313.900,00	1,00	\$ 313.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.7	Espejo flotado biselado de 5 mm de espesor, con plata	M2	1,00	\$ 366.000,00	\$ 366.000,00	1,00	\$ 366.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16	CERRADURAS Y ESPEJOS				\$ 15.561.000,00		\$ 15.561.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.1	Reinstalación sanitario	UN	1,00	\$ 145.200,00	\$ 145.200,00	1,00	\$ 145.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.2	Reinstalación lavamanos	UN	1,00	\$ 125.400,00	\$ 125.400,00	1,00	\$ 125.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.3	Reinstalación orinal	UN	1,00	\$ 138.300,00	\$ 138.300,00	1,00	\$ 138.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.4	Sanitario institucional de piso	UN	1,00	\$ 855.300,00	\$ 855.300,00	1,00	\$ 855.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.5	Sanitario institucional de piso sin tanque	UN	1,00	\$ 1.818.900,00	\$ 1.818.900,00	1,00	\$ 1.818.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.6	Sanitario	UN	1,00	\$ 2.030.600,00	\$ 2.030.600,00	1,00	\$ 2.030.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.7	Lavamanos institucional con pedestal de soporte	UN	1,00	\$ 717.100,00	\$ 717.100,00	1,00	\$ 717.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.8	Lavamanos institucional de Incrustar	UN	1,00	\$ 688.700,00	\$ 688.700,00	1,00	\$ 688.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.9	Lavamanos	UN	1,00	\$ 873.000,00	\$ 873.000,00	1,00	\$ 873.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.10	Orinal mediano de pared	UN	1,00	\$ 916.200,00	\$ 916.200,00	1,00	\$ 916.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.11	Lavaplatos de un compartimiento en acero inoxidable	UN	1,00	\$ 765.100,00	\$ 765.100,00	1,00	\$ 765.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.12	Grifería de ducha completa	UN	1,00	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00	1,00	\$ 390.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.13	Llave terminal de jardín en bronce de 1/2" x 3/4"	UN	1,00	\$ 103.600,00	\$ 103.600,00	1,00	\$ 103.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.14	Reposición grifería antivandálica	UN	1,00	\$ 423.600,00	\$ 423.600,00	1,00	\$ 423.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.15	Reposición válvula antivandálica	UN	1,00	\$ 468.300,00	\$ 468.300,00	1,00	\$ 468.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.16	Reposición grifería	UN	1,00	\$ 374.400,00	\$ 374.400,00	1,00	\$ 374.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.17	Dispensador institucional de papel higiénico	UN	1,00	\$ 382.600,00	\$ 382.600,00	1,00	\$ 382.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.18	Dispensador institucional de toallas de papel	UN	1,00	\$ 473.300,00	\$ 473.300,00	1,00	\$ 473.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.19	Dispensador institucional de jabón líquido	UN	1,00	\$ 328.400,00	\$ 328.400,00	1,00	\$ 328.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.20	Secador de manos automático eléctrico institucional	UN	1,00	\$ 2.011.800,00	\$ 2.011.800,00	1,00	\$ 2.011.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.21	Barra de apoyo recta de longitud 60 cm en tubo de acero	UN	1,00	\$ 267.700,00	\$ 267.700,00	1,00	\$ 267.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.22	Barra de apoyo abatible	UN	1,00	\$ 786.600,00	\$ 786.600,00	1,00	\$ 786.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.23	Barra de apoyo en L	UN	1,00	\$ 476.900,00	\$ 476.900,00	1,00	\$ 476.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17	INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$ 8.415.800,00		\$ 8.415.800,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.1	Medidor de agua de 1/2"	UN	1,00	\$ 397.800,00	\$ 397.800,00	1,00	\$ 397.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.2	Medidor de agua de 3/4"	UN	1,00	\$ 485.400,00	\$ 485.400,00	1,00	\$ 485.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.3	Caja prefabricada en polipropileno de alta densidad	UN	1,00	\$ 263.700,00	\$ 263.700,00	1,00	\$ 263.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.4	Punto hidráulico de 1/2" en tubería PVC presión	UN	1,00	\$ 182.400,00	\$ 182.400,00	1,00	\$ 182.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.5	Punto hidráulico de 1/2" en tubería CPVC	UN	1,00	\$ 223.600,00	\$ 223.600,00	1,00	\$ 223.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.6	Punto hidráulico de 1 1/4" en tubería PVC presión	UN	1,00	\$ 301.600,00	\$ 301.600,00	1,00	\$ 301.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.7	Red hidráulica en tubería PVC presión RDE-13.5 de 1/2"	UN	1,00	\$ 20.600,00	\$ 20.600,00	1,00	\$ 20.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.8	Red hidráulica en tubería PVC presión RDE-21 de 3/4"	UN	1,00	\$ 26.200,00	\$ 26.200,00	1,00	\$ 26.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.9	Red hidráulica en tubería PVC presión RDE-21 de 1"	UN	1,00	\$ 34.700,00	\$ 34.700,00	1,00	\$ 34.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.10	Red hidráulica en tubería PVC presión RDE-21 de 1 1/4"	UN	1,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	1,00	\$ 45.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.11	Red hidráulica en tubería PVC presión RDE-21 de 1 1/2"	UN	1,00	\$ 59.900,00	\$ 59.900,00	1,00	\$ 59.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.12	Red hidráulica en tubería PVC presión RDE-21 de 2"	UN	1,00	\$ 76.100,00	\$ 76.100,00	1,00	\$ 76.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.13	Red hidráulica en tubería CPVC de 1/2"	UN	1,00	\$ 34.200,00	\$ 34.200,00	1,00	\$ 34.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.14	Red hidráulica en tubería CPVC de 3/4"	UN	1,00	\$ 45.100,00	\$ 45.100,00	1,00	\$ 45.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.15	Válvula de bola en PVC	UN	1,00	\$ 47.100,00	\$ 47.100,00	1,00	\$ 47.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.16	Válvula de bola en PVC	UN	1,00	\$ 62.700,00	\$ 62.700,00	1,00	\$ 62.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.17	Válvula de bola en PVC	UN	1,00	\$ 88.600,00	\$ 88.600,00	1,00	\$ 88.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.18	Válvula de bola en bronce	UN	1,00	\$ 471.000,00	\$ 471.000,00	1,00	\$ 471.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.19	Válvula de bola en bronce	UN	1,00	\$ 628.100,00	\$ 628.100,00	1,00	\$ 628.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.20	Cheque (válvula de retención) cortina en bronce	UN	1,00	\$ 267.500,00	\$ 267.500,00	1,00	\$ 267.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.21	Cheque (válvula de retención) cortina en bronce	UN	1,00	\$ 325.400,00	\$ 325.400,00	1,00	\$ 325.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.22	Cheque (válvula de retención) cortina en bronce	UN	1,00	\$ 419.200,00	\$ 419.200,00	1,00	\$ 419.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.23	Cheque (válvula de retención) cortina en bronce	UN	1,00	\$ 696.700,00	\$ 696.700,00	1,00	\$ 696.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.24	Cheque (válvula de retención) cortina en bronce	UN	1,00	\$ 1.044.100,00	\$ 1.044.100,00	1,00	\$ 1.044.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.25	Cambio acople sanitario flexible de 1/2"	UN	1,00	\$ 44.600,00	\$ 44.600,00	1,00	\$ 44.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.26	Mantenimiento válvula de bola, registro o cheque	UN	1,00	\$ 103.200,00	\$ 103.200,00	1,00	\$ 103.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.27	Reposición válvula de bola, registro o cheque	UN	1,00	\$ 602.700,00	\$ 602.700,00	1,00	\$ 602.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

17.28	Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua	UN	1,00	\$ 260.600,00	\$ 260.600,00	1,00	\$ 260.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
17.29	Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua	UN	1,00	\$ 1.158.000,00	\$ 1.158.000,00	1,00	\$ 1.158.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18	INSTALACIONES SANITARIAS			\$ 5.053.800,00	\$ 5.053.800,00		\$ 5.053.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.1	Caja de inspección sanitaria interior 40 × 40 cm	UN	1,00	\$ 594.700,00	\$ 594.700,00	1,00	\$ 594.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.2	Caja de inspección sanitaria interior 60 × 60 cm	UN	1,00	\$ 909.000,00	\$ 909.000,00	1,00	\$ 909.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.3	Punto de desagüe sanitario en tubería PVC Sanitaria Ø	UN	1,00	\$ 226.400,00	\$ 226.400,00	1,00	\$ 226.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.4	Punto de desagüe sanitario en tubería PVC Sanitaria Ø	UN	1,00	\$ 304.400,00	\$ 304.400,00	1,00	\$ 304.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.5	Punto de desagüe sanitario en tubería PVC Sanitaria Ø	UN	1,00	\$ 382.600,00	\$ 382.600,00	1,00	\$ 382.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.6	Sifón de piso en tubería PVC Sanitaria Ø 2"	UN	1,00	\$ 182.100,00	\$ 182.100,00	1,00	\$ 182.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.7	Sifón de piso en tubería PVC Sanitaria Ø 3"	UN	1,00	\$ 263.800,00	\$ 263.800,00	1,00	\$ 263.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.8	Sifón de piso en tubería PVC Sanitaria Ø 4"	UN	1,00	\$ 339.100,00	\$ 339.100,00	1,00	\$ 339.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.9	Red sanitaria enterrada en tubería PVC Sanitaria Ø 2"	ML	1,00	\$ 28.700,00	\$ 28.700,00	1,00	\$ 28.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.10	Red sanitaria enterrada en tubería PVC Sanitaria Ø 3"	ML	1,00	\$ 42.600,00	\$ 42.600,00	1,00	\$ 42.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.11	Red sanitaria enterrada en tubería PVC Sanitaria Ø 4"	ML	1,00	\$ 64.100,00	\$ 64.100,00	1,00	\$ 64.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.12	Red sanitaria enterrada en tubería PVC Sanitaria Ø 6"	ML	1,00	\$ 140.300,00	\$ 140.300,00	1,00	\$ 140.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.13	Red sanitaria descolgada en tubería PVC Sanitaria Ø 2"	ML	1,00	\$ 45.100,00	\$ 45.100,00	1,00	\$ 45.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.14	Red sanitaria descolgada en tubería PVC Sanitaria Ø 3"	ML	1,00	\$ 66.400,00	\$ 66.400,00	1,00	\$ 66.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.15	Red sanitaria descolgada en tubería PVC Sanitaria Ø 4"	ML	1,00	\$ 97.700,00	\$ 97.700,00	1,00	\$ 97.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.16	Red sanitaria descolgada en tubería PVC Sanitaria Ø 6"	ML	1,00	\$ 211.700,00	\$ 211.700,00	1,00	\$ 211.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.17	Bajante sanitaria vertical en tubería PVC Sanitaria Ø	ML	1,00	\$ 39.700,00	\$ 39.700,00	1,00	\$ 39.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.18	Bajante sanitaria vertical en tubería PVC Sanitaria Ø	ML	1,00	\$ 58.500,00	\$ 58.500,00	1,00	\$ 58.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.19	Bajante sanitaria vertical en tubería PVC Sanitaria Ø	ML	1,00	\$ 83.800,00	\$ 83.800,00	1,00	\$ 83.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.20	Bajante sanitaria vertical en tubería PVC Sanitaria Ø	ML	1,00	\$ 182.300,00	\$ 182.300,00	1,00	\$ 182.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.21	Tubería PVC Sanitaria Ø 2"	ML	1,00	\$ 34.800,00	\$ 34.800,00	1,00	\$ 34.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.22	Tubería PVC Sanitaria Ø 3"	ML	1,00	\$ 50.900,00	\$ 50.900,00	1,00	\$ 50.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.23	Tubería PVC Sanitaria Ø 4"	ML	1,00	\$ 71.300,00	\$ 71.300,00	1,00	\$ 71.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.24	Tubería PVC Sanitaria Ø 6"	ML	1,00	\$ 162.300,00	\$ 162.300,00	1,00	\$ 162.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.25	Prueba de estanqueidad	UN	1,00	\$ 471.500,00	\$ 471.500,00	1,00	\$ 471.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			\$ 14.269.800,00	\$ 14.269.800,00		\$ 14.269.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.1	Tubería metálica EMT de 1/2"	ML	1,00	\$ 39.800,00	\$ 39.800,00	1,00	\$ 39.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.2	Tubería metálica EMT de 3/4"	ML	1,00	\$ 47.700,00	\$ 47.700,00	1,00	\$ 47.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.3	Tubería metálica EMT de 1"	ML	1,00	\$ 59.100,00	\$ 59.100,00	1,00	\$ 59.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.4	Tubería PVC Conduit de 1/2"	ML	1,00	\$ 15.400,00	\$ 15.400,00	1,00	\$ 15.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.5	Tubería PVC Conduit de 3/4"	ML	1,00	\$ 20.600,00	\$ 20.600,00	1,00	\$ 20.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.6	Tubería PVC Conduit de 1"	ML	1,00	\$ 27.100,00	\$ 27.100,00	1,00	\$ 27.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.7	Coraza metálica flexible de 1"	ML	1,00	\$ 52.200,00	\$ 52.200,00	1,00	\$ 52.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.8	Caja de paso metálica 10x10 cm	UN	1,00	\$ 34.800,00	\$ 34.800,00	1,00	\$ 34.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.9	Caja de paso metálica 15x15 cm	UN	1,00	\$ 50.600,00	\$ 50.600,00	1,00	\$ 50.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.10	Caja de paso metálica 20x20 cm	UN	1,00	\$ 77.000,00	\$ 77.000,00	1,00	\$ 77.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.11	Caja galvanizada	UN	1,00	\$ 17.500,00	\$ 17.500,00	1,00	\$ 17.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.12	Conductor de cobre N° 14 AWG	ML	1,00	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00	1,00	\$ 7.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.13	Conductor de cobre N° 12 AWG	ML	1,00	\$ 10.300,00	\$ 10.300,00	1,00	\$ 10.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.14	Conductor de cobre N° 10 AWG	ML	1,00	\$ 16.200,00	\$ 16.200,00	1,00	\$ 16.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.15	Conductor de cobre N° 8 AWG	ML	1,00	\$ 26.800,00	\$ 26.800,00	1,00	\$ 26.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.16	Conductor de cobre N° 6 AWG	ML	1,00	\$ 40.100,00	\$ 40.100,00	1,00	\$ 40.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.17	Conductor de cobre N° 4 AWG	ML	1,00	\$ 60.400,00	\$ 60.400,00	1,00	\$ 60.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.18	Conductor de cobre N° 2/0 AWG	ML	1,00	\$ 169.500,00	\$ 169.500,00	1,00	\$ 169.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.19	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	ML	1,00	\$ 152.600,00	\$ 152.600,00	1,00	\$ 152.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.20	Cable encauchetado 3x12 AWG	ML	1,00	\$ 33.000,00	\$ 33.000,00	1,00	\$ 33.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.21	Tablero de distribución trifásico (3F-5H, 208/120V)	UN	1,00	\$ 1.418.600,00	\$ 1.418.600,00	1,00	\$ 1.418.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.22	Tablero de distribución trifásico (3F-5H, 225A) de 42	UN	1,00	\$ 4.387.300,00	\$ 4.387.300,00	1,00	\$ 4.387.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.23	Interruptor termomagnético enchufable de 1 polo	UN	1,00	\$ 59.600,00	\$ 59.600,00	1,00	\$ 59.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.24	Interruptor termomagnético enchufable de 2 polos	UN	1,00	\$ 149.800,00	\$ 149.800,00	1,00	\$ 149.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.25	Interruptor termomagnético enchufable de 3 polos	UN	1,00	\$ 243.000,00	\$ 243.000,00	1,00	\$ 243.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.26	Interruptor termomagnético enchufable de 3 polos 40A	UN	1,00	\$ 260.200,00	\$ 260.200,00	1,00	\$ 260.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.27	Interruptor termomagnético enchufable de 3 polos 60A	UN	1,00	\$ 304.800,00	\$ 304.800,00	1,00	\$ 304.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.28	Interruptor termomagnético enchufable de 3 polos 80A	UN	1,00	\$ 350.600,00	\$ 350.600,00	1,00	\$ 350.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.29	Interruptor termomagnético enchufable de 3 polos 100A	UN	1,00	\$ 386.600,00	\$ 386.600,00	1,00	\$ 386.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.30	Sistema de puesta a tierra	UN	1,00	\$ 426.900,00	\$ 426.900,00	1,00	\$ 426.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.31	Interruptor sencillo de incrustar (15A/120V)	UN	1,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	1,00	\$ 35.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.32	Interruptor doble de incrustar (15A/120V)	UN	1,00	\$ 51.900,00	\$ 51.900,00	1,00	\$ 51.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.33	Interruptor triple de incrustar (15A/120V)	UN	1,00	\$ 66.400,00	\$ 66.400,00	1,00	\$ 66.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.34	Interruptor conmutable sencillo de incrustar	UN	1,00	\$ 45.100,00	\$ 45.100,00	1,00	\$ 45.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.35	Interruptor conmutable doble de incrustar	UN	1,00	\$ 64.400,00	\$ 64.400,00	1,00	\$ 64.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.36	Interruptor conmutable triple de incrustar	UN	1,00	\$ 83.800,00	\$ 83.800,00	1,00	\$ 83.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.37	Tomacorriente doble con polo a tierra 15A/120V	UN	1,00	\$ 39.700,00	\$ 39.700,00	1,00	\$ 39.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.38	Tomacorriente doble con polo a tierra	UN	1,00	\$ 46.800,00	\$ 46.800,00	1,00	\$ 46.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.39	Tomacorriente doble GFCI 15A/120V	UN	1,00	\$ 226.100,00	\$ 226.100,00	1,00	\$ 226.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.40	Tomacorriente especial 20A/240V	UN	1,00	\$ 69.600,00	\$ 69.600,00	1,00	\$ 69.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.41	Sensor de movimiento infrarrojo/ultrasónico	UN	1,00	\$ 211.100,00	\$ 211.100,00	1,00	\$ 211.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.42	Fotocelda	UN	1,00	\$ 76.300,00	\$ 76.300,00	1,00	\$ 76.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.43	Pulsador de incrustar	UN	1,00	\$ 42.600,00	\$ 42.600,00	1,00	\$ 42.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.44	Tapa ciega	UN	1,00	\$ 15.400,00	\$ 15.400,00	1,00	\$ 15.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.45	Panel LED 60x60 cm (48W)	UN	1,00	\$ 225.900,00	\$ 225.900,00	1,00	\$ 225.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00


19.46	Panel LED 30x120 cm (48W)	UN	1,00	\$ 264.400,00	\$ 264.400,00	1,00	\$ 264.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.47	Bala o Panel LED redondo de 12W	UN	1,00	\$ 56.600,00	\$ 56.600,00	1,00	\$ 56.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.48	Bala o Panel LED redondo de 18W	UN	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	1,00	\$ 71.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.49	Bala o Panel LED redondo de 24W	UN	1,00	\$ 89.200,00	\$ 89.200,00	1,00	\$ 89.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.50	Lámpara hermética LED 2x18W	UN	1,00	\$ 194.200,00	\$ 194.200,00	1,00	\$ 194.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.51	Reflector LED 200W	UN	1,00	\$ 664.700,00	\$ 664.700,00	1,00	\$ 664.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.52	Luminaria de emergencia LED (tipo R1)	UN	1,00	\$ 118.100,00	\$ 118.100,00	1,00	\$ 118.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.53	Aviso LED de salida/emergencia doble spot	UN	1,00	\$ 182.300,00	\$ 182.300,00	1,00	\$ 182.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.54	Reinstalación luminaria existente	UN	1,00	\$ 101.200,00	\$ 101.200,00	1,00	\$ 101.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.55	Reinstalación tubería metálica EMT	ML	1,00	\$ 21.200,00	\$ 21.200,00	1,00	\$ 21.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.56	Reinstalación canaleta metálica o plástica	ML	1,00	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	1,00	\$ 17.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.57	Interruptor diferencial DDR	UN	1,00	\$ 316.400,00	\$ 316.400,00	1,00	\$ 316.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.58	DPS (descargador de sobretensiones) tipo 2	UN	1,00	\$ 642.100,00	\$ 642.100,00	1,00	\$ 642.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.59	Tablero de distribución monofásico (1F-3H, 120/240 V)	UN	1,00	\$ 962.000,00	\$ 962.000,00	1,00	\$ 962.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.60	Caja	UN	1,00	\$ 323.500,00	\$ 323.500,00	1,00	\$ 323.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20	CABLEADO ESTRUCTURADO				\$ 61.097.900,00		\$ 61.097.900,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
20.1	Bandeja portacables	ML	1,00	\$ 103.200,00	\$ 103.200,00	1,00	\$ 103.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.2	Bandeja portacables	ML	1,00	\$ 218.700,00	\$ 218.700,00	1,00	\$ 218.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.3	Canaleta metálica con tapa y división interna de 12 × 5	ML	1,00	\$ 83.800,00	\$ 83.800,00	1,00	\$ 83.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.4	Canaleta plástica con tapa de 60 × 40 mm o equivalente	ML	1,00	\$ 32.700,00	\$ 32.700,00	1,00	\$ 32.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.5	Salida HDMI con canalización en tubería PVC Conduit	UN	1,00	\$ 157.400,00	\$ 157.400,00	1,00	\$ 157.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.6	Salida HDMI con canalización en tubería metálica EMT	UN	1,00	\$ 191.500,00	\$ 191.500,00	1,00	\$ 191.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.7	Rack abierto de 19" de 42 unidades de altura	UN	1,00	\$ 1.745.100,00	\$ 1.745.100,00	1,00	\$ 1.745.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.8	Multitoma de 6 puertos	UN	1,00	\$ 263.700,00	\$ 263.700,00	1,00	\$ 263.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.9	Organizador de cable horizontal de 19" de 1 unidad	UN	1,00	\$ 113.500,00	\$ 113.500,00	1,00	\$ 113.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.10	Rack cerrado de piso	UN	1,00	\$ 5.939.300,00	\$ 5.939.300,00	1,00	\$ 5.939.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.11	Conectorización de fibra óptica monomodo OS2	UN	1,00	\$ 145.100,00	\$ 145.100,00	1,00	\$ 145.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.12	ODF (distribuidor de fibra óptica) de 12 hilos monomodo	UN	1,00	\$ 1.574.100,00	\$ 1.574.100,00	1,00	\$ 1.574.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.13	Patch cord de fibra óptica monomodo OS2 SC/APC –	UN	1,00	\$ 76.300,00	\$ 76.300,00	1,00	\$ 76.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.14	Switch administrable de 24 puertos 10/100/1000 Base-T	UN	1,00	\$ 3.485.100,00	\$ 3.485.100,00	1,00	\$ 3.485.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.15	Switch administrable de 48 puertos 10/100/1000 Base-T	UN	1,00	\$ 5.737.600,00	\$ 5.737.600,00	1,00	\$ 5.737.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.16	Patch panel de 12 puertos Cat 6A o equivalente	UN	1,00	\$ 505.500,00	\$ 505.500,00	1,00	\$ 505.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.17	Patch panel de 24 puertos Cat 6A o equivalente	UN	1,00	\$ 806.300,00	\$ 806.300,00	1,00	\$ 806.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.18	Patch panel de 48 puertos Cat 6A o equivalente	UN	1,00	\$ 1.450.200,00	\$ 1.450.200,00	1,00	\$ 1.450.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.19	Cable Cat 6A U/UTP de 4 pares, calibre 23 AWG	ML	1,00	\$ 17.900,00	\$ 17.900,00	1,00	\$ 17.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.20	Trajack Cat 6A o equivalente certificado	UN	1,00	\$ 51.800,00	\$ 51.800,00	1,00	\$ 51.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.21	Trajack Cat 6A o equivalente certificado	UN	1,00	\$ 51.800,00	\$ 51.800,00	1,00	\$ 51.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.22	Face plate sencillo de un puerto en plástico ABS	UN	1,00	\$ 18.100,00	\$ 18.100,00	1,00	\$ 18.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.23	Face plate doble de dos puertos en plástico ABS	UN	1,00	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	1,00	\$ 22.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.24	Patch cord Cat 6A U/UTP de 1,6 m, calibre 24 AWG	UN	1,00	\$ 59.500,00	\$ 59.500,00	1,00	\$ 59.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.25	Patch cord Cat 6A U/UTP de 2,7 m, calibre 24 AWG	UN	1,00	\$ 68.900,00	\$ 68.900,00	1,00	\$ 68.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.26	Marquilla plástica termoencontrable o autoadhesiva	UN	1,00	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	1,00	\$ 5.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.27	Certificación de punto de red Cat 6A	UN	1,00	\$ 47.600,00	\$ 47.600,00	1,00	\$ 47.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.28	Bandeja portacables	ML	1,00	\$ 169.600,00	\$ 169.600,00	1,00	\$ 169.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.29	Canaleta plástica con tapa de 12 × 5 cm en PVC	ML	1,00	\$ 64.200,00	\$ 64.200,00	1,00	\$ 64.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.30	Canaleta metálica con tapa de 15 × 5 cm	ML	1,00	\$ 116.100,00	\$ 116.100,00	1,00	\$ 116.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.31	Troquel eléctrico sencillo	UN	1,00	\$ 28.900,00	\$ 28.900,00	1,00	\$ 28.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.32	Multitoma vertical	UN	1,00	\$ 664.100,00	\$ 664.100,00	1,00	\$ 664.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.33	Multitoma vertical	UN	1,00	\$ 750.400,00	\$ 750.400,00	1,00	\$ 750.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.34	Toma doble RJ45 Cat 6A o equivalente certificado	UN	1,00	\$ 175.100,00	\$ 175.100,00	1,00	\$ 175.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.35	Salida HDMI	UN	1,00	\$ 206.200,00	\$ 206.200,00	1,00	\$ 206.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.36	Microfono de cuello de ganso	UN	1,00	\$ 1.095.500,00	\$ 1.095.500,00	1,00	\$ 1.095.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.37	Mezclador de audio digital de mesa de 8 canales mínimo	UN	1,00	\$ 5.046.000,00	\$ 5.046.000,00	1,00	\$ 5.046.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.38	Amplificador de audio	UN	1,00	\$ 2.259.800,00	\$ 2.259.800,00	1,00	\$ 2.259.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.39	Pariente de techo empotrado	UN	1,00	\$ 397.600,00	\$ 397.600,00	1,00	\$ 397.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.40	Tarjeta o equipo de grabación digital de audio	UN	1,00	\$ 5.694.400,00	\$ 5.694.400,00	1,00	\$ 5.694.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.41	Cable de audio balanceado XLR macho a XLR hembra	UN	1,00	\$ 182.000,00	\$ 182.000,00	1,00	\$ 182.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.42	Cable de parlante de dos conductores calibre 14 AWG	ML	1,00	\$ 15.700,00	\$ 15.700,00	1,00	\$ 15.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.43	Cámara IP fija de interior	UN	1,00	\$ 1.413.400,00	\$ 1.413.400,00	1,00	\$ 1.413.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.44	NVR (grabador de video en red)	UN	1,00	\$ 3.043.900,00	\$ 3.043.900,00	1,00	\$ 3.043.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.45	Monitor LED de visualización de sala de audiencia	UN	1,00	\$ 1.031.500,00	\$ 1.031.500,00	1,00	\$ 1.031.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.46	Proyector multimedia	UN	1,00	\$ 5.363.700,00	\$ 5.363.700,00	1,00	\$ 5.363.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.47	Pantalla de proyección eléctrica con motor	UN	1,00	\$ 1.867.100,00	\$ 1.867.100,00	1,00	\$ 1.867.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.48	UPS online de doble conversión	UN	1,00	\$ 6.271.100,00	\$ 6.271.100,00	1,00	\$ 6.271.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.49	DPS (descargador de sobretensiones) tipo 2	UN	1,00	\$ 642.100,00	\$ 642.100,00	1,00	\$ 642.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.50	Sistema de control de acceso por cerradura	UN	1,00	\$ 1.451.900,00	\$ 1.451.900,00	1,00	\$ 1.451.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.51	Sensor de apertura magnético	UN	1,00	\$ 174.900,00	\$ 174.900,00	1,00	\$ 174.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO				\$ 1.524.900,00		\$ 1.524.900,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
21.1	Pavimento articulado en adoquín de concreto peatonal	M2	1,00	\$ 152.900,00	\$ 152.900,00	1,00	\$ 152.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.2	Pavimento articulado en adoquín de concreto peatonal	M2	1,00	\$ 155.800,00	\$ 155.800,00	1,00	\$ 155.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.3	Andén en concreto de 21 MPa (3000 psi)	M2	1,00	\$ 186.700,00	\$ 186.700,00	1,00	\$ 186.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.4	Andén en concreto de 21 MPa (3000 psi)	M2	1,00	\$ 167.600,00	\$ 167.600,00	1,00	\$ 167.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.5	Andén en concreto de 21 MPa (3000 psi)	M2	1,00	\$ 223.300,00	\$ 223.300,00	1,00	\$ 223.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

21.6	Piso en loseta prefabricada en concreto de 40 × 40 cm	M2	1,00	\$ 174.600,00	\$ 174.600,00	1,00	\$ 174.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.7	Sardinel fundido en sitio en concreto de 21 MPa	ML	1,00	\$ 129.600,00	\$ 129.600,00	1,00	\$ 129.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.8	Sardinel prefabricado en concreto	ML	1,00	\$ 173.100,00	\$ 173.100,00	1,00	\$ 173.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.9	Bordillo fundido en sitio en concreto de 21 MPa	ML	1,00	\$ 51.600,00	\$ 51.600,00	1,00	\$ 51.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.10	Bordillo prefabricado en concreto	ML	1,00	\$ 109.700,00	\$ 109.700,00	1,00	\$ 109.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	PELÍCULAS Y VINILOS PARA VIDRIO				\$ 4.613.400,00		\$ 4.613.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.1	Película de control solar polarizada	M2	1,00	\$ 132.700,00	\$ 132.700,00	1,00	\$ 132.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.2	Película de control solar polarizada	M2	1,00	\$ 127.600,00	\$ 127.600,00	1,00	\$ 127.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.3	Película de control solar polarizada	M2	1,00	\$ 125.500,00	\$ 125.500,00	1,00	\$ 125.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.4	Película decorativa	M2	1,00	\$ 138.100,00	\$ 138.100,00	1,00	\$ 138.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.5	Película decorativa	M2	1,00	\$ 120.500,00	\$ 120.500,00	1,00	\$ 120.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.6	Película decorativa	M2	1,00	\$ 120.500,00	\$ 120.500,00	1,00	\$ 120.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.7	Película decorativa	M2	1,00	\$ 96.300,00	\$ 96.300,00	1,00	\$ 96.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.8	Película decorativa	M2	1,00	\$ 141.200,00	\$ 141.200,00	1,00	\$ 141.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.9	Película de seguridad transparente	M2	1,00	\$ 118.500,00	\$ 118.500,00	1,00	\$ 118.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.10	Película de seguridad transparente reforzada	M2	1,00	\$ 194.000,00	\$ 194.000,00	1,00	\$ 194.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.11	Película de seguridad y control solar combinada	M2	1,00	\$ 228.000,00	\$ 228.000,00	1,00	\$ 228.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.12	Película inteligente PDLC	M2	1,00	\$ 3.043.100,00	\$ 3.043.100,00	1,00	\$ 3.043.100,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.13	Retiro de película o vinilo	M2	1,00	\$ 27.400,00	\$ 27.400,00	1,00	\$ 27.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23	AIRE ACONDICIONADO				\$ 36.351.100,00		\$ 36.351.100,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.1	Equipo de aire acondicionado	UN	1,00	\$ 3.411.000,00	\$ 3.411.000,00	1,00	\$ 3.411.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.2	Equipo de aire acondicionado	UN	1,00	\$ 3.974.900,00	\$ 3.974.900,00	1,00	\$ 3.974.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.3	Equipo de aire acondicionado	UN	1,00	\$ 5.281.200,00	\$ 5.281.200,00	1,00	\$ 5.281.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.4	Equipo de aire acondicionado	UN	1,00	\$ 6.909.600,00	\$ 6.909.600,00	1,00	\$ 6.909.600,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.5	Equipo de aire acondicionado	UN	1,00	\$ 12.770.700,00	\$ 12.770.700,00	1,00	\$ 12.770.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.6	Tubería de cobre flexible aislada	ML	1,00	\$ 100.900,00	\$ 100.900,00	1,00	\$ 100.900,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.7	Soporte metálico	UN	1,00	\$ 206.800,00	\$ 206.800,00	1,00	\$ 206.800,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8	Recarga de gas refrigerante R-410A o R-32	UN	1,00	\$ 715.400,00	\$ 715.400,00	1,00	\$ 715.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.9	Reparación correctiva de equipo de aire acondicionado	UN	1,00	\$ 603.400,00	\$ 603.400,00	1,00	\$ 603.400,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.10	Desmonte equipo de aire acondicionado	UN	1,00	\$ 1.377.200,00	\$ 1.377.200,00	1,00	\$ 1.377.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24	SISTEMA CONTRA INCENDIO				\$ 7.264.900,00		\$ 7.264.900,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.1	Panel de control de alarma contra incendio (FACP)	UN	1,00	\$ 3.857.500,00	\$ 3.857.500,00	1,00	\$ 3.857.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.2	Detector de humo fotoeléctrico convencional	UN	1,00	\$ 349.700,00	\$ 349.700,00	1,00	\$ 349.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.3	Detector de temperatura termovelocimétrico convencional	UN	1,00	\$ 325.000,00	\$ 325.000,00	1,00	\$ 325.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.4	Estación manual de alarma contra incendio	UN	1,00	\$ 296.700,00	\$ 296.700,00	1,00	\$ 296.700,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.5	Sirena estroboscópica	UN	1,00	\$ 378.000,00	\$ 378.000,00	1,00	\$ 378.000,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.6	Gabinete contra incendio Clase II, conformado por	UN	1,00	\$ 2.023.500,00	\$ 2.023.500,00	1,00	\$ 2.023.500,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.7	Cable apantallado	ML	1,00	\$ 10.300,00	\$ 10.300,00	1,00	\$ 10.300,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
24.8	Tubería metálica EMT de 1/2" exclusiva	ML	1,00	\$ 24.200,00	\$ 24.200,00	1,00	\$ 24.200,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 228.589.200,00		\$ 283.302.992,00		\$ 52.001.105,00		\$ 0,00		\$ 52.001.105,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 175.837.846,00		\$ 217.925.378,00		\$ 40.000.850,00		\$ 0,00		\$ 40.000.850,00
ADMINISTRACION				25,00%	\$ 43.959.462,00		\$ 54.481.345,00	25,00%	\$ 10.000.213,00	25,00%	\$ 0,00	25,00%	\$ 10.000.213,00
UTILIDAD				5,00%	\$ 8.791.892,00		\$ 10.896.269,00	5,00%	\$ 2.000.043,00	5,00%	\$ 0,00	5,00%	\$ 2.000.043,00
SUBTOTAL				30%	\$ 228.589.200		\$ 283.302.992	30,00%	\$ 52.001.106,00	30,00%	\$ 0,00	30,00%	\$ 52.001.106,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	\$ 1.670.459,00		\$ 2.070.290,16	19,00%	\$ 380.008,17	19,00%	\$ 0,00	19,00%	\$ 380.008,17
SUBTOTAL					\$ 230.259.659,00		\$ 285.373.282,00		\$ 52.381.114,17		\$ 0,00		\$ 52.381.114,17


Porcentaje Cobrado	Porcentaje Cobrado	Porcentaje Acumulado
2,99%	0,0%	2,99%

COSTO DIRECTO CONTRATO		\$ 1.336.387.934
ADMINISTRACION	25,00%	\$ 334.096.984
UTILIDAD	5,00%	\$ 66.819.397
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$ 12.695.685
SUBTOTAL		\$ 413.612.066
COSTO TOTAL CONTRATO		\$ 1.750.000.000

conocen únicamente hasta las cantidades aprobadas en la ODT1: 1.206,62 m y 23,00 m, respectivamente. Las mayores cantidades ejecutadas quedan pendientes de trámite, soporte y aprobación en

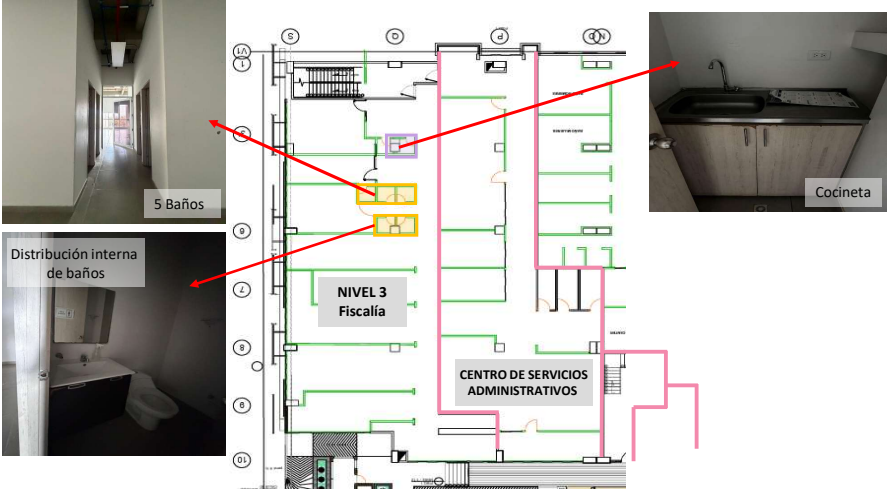



ARQ. CRISTIAN BARÓN TORRES
DIRECTOR DE OBRA REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S.

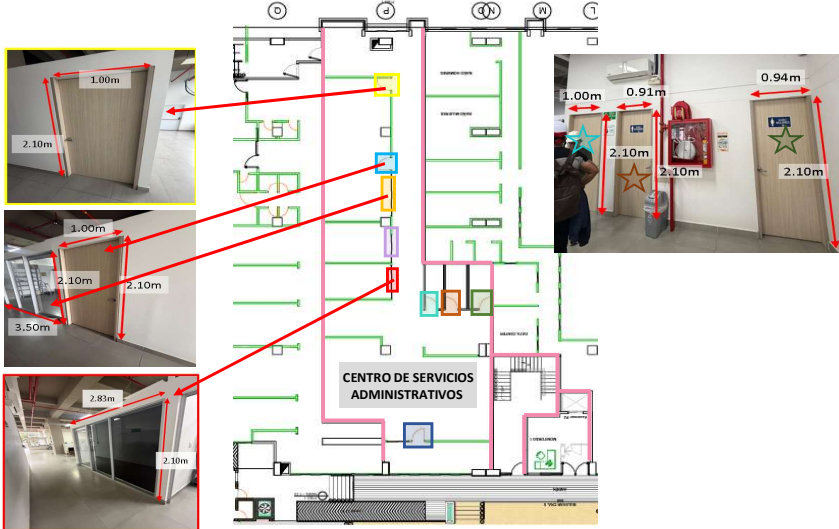


ARQUITECTO MAURICIO CASTRO SORIANO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EJE GROUP S.A.S.

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA		CÓDIGO	0
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	0
			PAGINAS	3 de 3


INFORMACIÓN GENERAL												
FECHA	DD	5	MM	10	AA	2026	CORTE N°	1	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.										
CONTRATISTA		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S		NIT O C.C.		901.358.559-0		REP. CONTRATISTA		ARQ. CRISTIAN BARON		
INTERVENTORÍA		EJE GROUP S.A.S		NIT O C.C.				REP. INTERVENTORÍA		MAURICIO CASTRO SORIANO		
CAPÍTULO:		1		DESMONTE APARATOS SANITARIOS CON RECUPERACIÓN		ÍTEM :		1.13		UNID UN		
INFORMACIÓN DEL ÍTEM												
PLANO						Dimensiones				SUB TOTAL		
						Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
						Antigua Fiscalía - Nivel 3						
						Baños						
						Sanitarios					4	4,00
						Lavamanos					5	5,00
						Cocineta					1	1,00
FOTOGRAFÍA 1						FOTOGRAFÍA 2						
												
FOTOGRAFÍA 3												
												
						Viene memoria anterior					29,00	
						SUBTOTAL MEMORIA					10,00	
						TOTAL MEMORIA					39,00	
VALIDACIÓN												
Rep. Contratista.						Supervisor						
FIRMA:						FIRMA:						
ELABORA :						NOMBRE :						
		YURY DANIELA PINILA INGENIERA RESIDENTE						Representante Interventoría				
								FIRMA:				
								NOMBRE :				

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>	FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA	CÓDIGO 0
		VERSIÓN 0
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	PAGINAS 2 de 3

INFORMACIÓN GENERAL												
FECHA	DD	5	MM	10	AA	2026		CORTE N°	1	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA		
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.										
CONTRATISTA		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S		NIT O C.C.		901.358.559-0		REP. CONTRATISTA		ARQ. CRISTIAN BARON		
INTERVENTORÍA		EJE GROUP S.A.S		NIT O C.C.				REP. INTERVENTORÍA		MAURICIO CASTRO SORIANO		
CAPÍTULO:		1		DESMONTE PUERTA METÁLICA, EN MADERA O EN VIDRIO				ÍTEM :		1.14		
										UNID	M2	
PLANO												
								Dimensiones				SUB TOTAL
								Largo	Ancho	Alto	Cantidad	
<p>Antiguo Centro de servicios administrativos - Nivel 3</p> <p>Puerta ingreso</p> <p>Puerta ventana oficina 1</p> <p>Puerta ventana oficina 2</p> <p>Puerta ventana archivo</p> <p>Puerta 1 archivo</p> <p>Puerta 2 archivo</p> <p>Puerta baño mujeres</p> <p>Puerta baño hombres</p> <p>Puerta baño PMR</p>												
								Viene memoria anterior				33,71
								SUBTOTAL MEMORIA				30,09
								TOTAL MEMORIA				63,80
VALIDACIÓN												
Rep. Contratista.						Supervisor						
FIRMA:						FIRMA:						
ELABORA :						NOMBRE :						
YURY DANIELA PINILA		INGENIERA				Representante Interventoría						
RESIDENTE						FIRMA:						
						NOMBRE :						

	FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA	CÓDIGO	0
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
		PAGINAS	3 de 3

INFORMACIÓN GENERAL													
FECHA	DD	5	MM	10	AA	2026	CORTE N°	1	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA				
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.											
CONTRATISTA		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S		NIT O.C.C.		901.358.559-0		REP. CONTRATISTA	ARQ. CRISTIAN BARON		CONTRATO N°	SA-MC-003-2026	
INTERVENTORÍA		EJE GROUP S.A.S		NIT O.C.C.				REP. INTERVENTORÍA	MAURICIO CASTRO SORIANO		CONTRATO N°		
CAPÍTULO:		1		DESMONTE PUERTA METÁLICA, EN MADERA O EN VIDRIO				ÍTEM :		1.14		UNID	M2
PLANO													
FOTOGRAFÍA 1													
FOTOGRAFÍA 2													
FOTOGRAFÍA 3													
NIVEL 2 - SOTANO 1													
Puerta modulo grande													
NIVEL 2 - SOTANO 2													
Puerta antiguo cuarto rack													
Largo													
Ancho													
Alto													
Cantidad													
SUB TOTAL													
Viene memoria anterior													
SUBTOTAL MEMORIA													
TOTAL MEMORIA													
VALIDACIÓN													
Rep. Contratista.		Supervisor				Representante Interventoría							
FIRMA:		FIRMA:				FIRMA:							
ELABORA :		NOMBRE :				NOMBRE :							



FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA

CÓDIGO	
--------	--

0

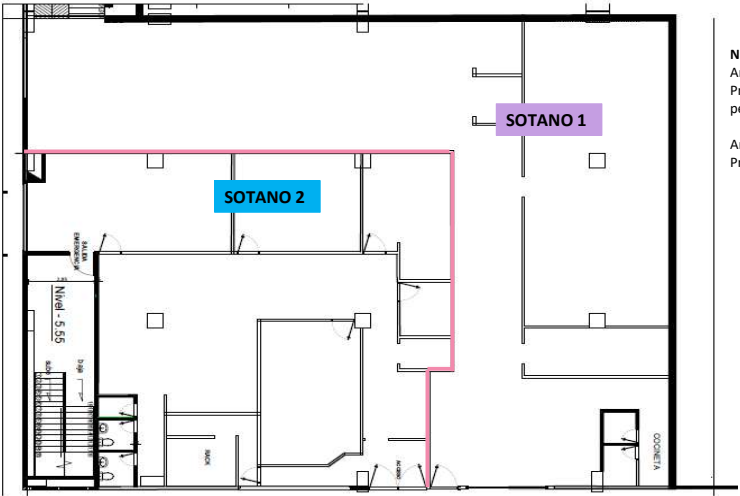
VERSIÓN

0

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

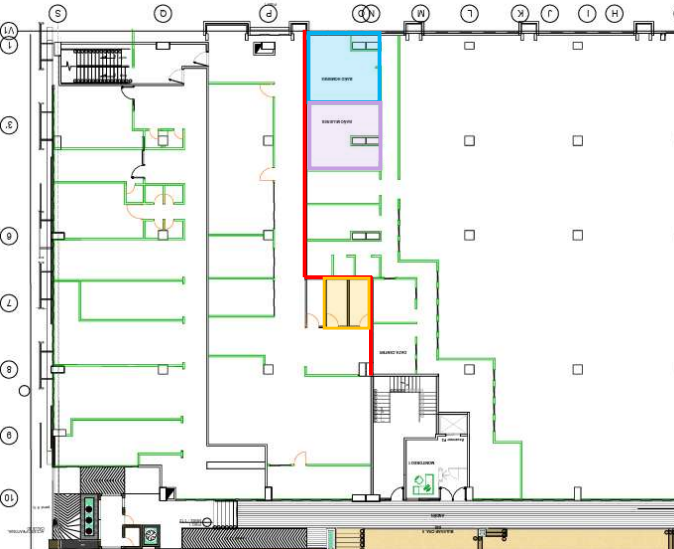

PAGINAS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2 de 2

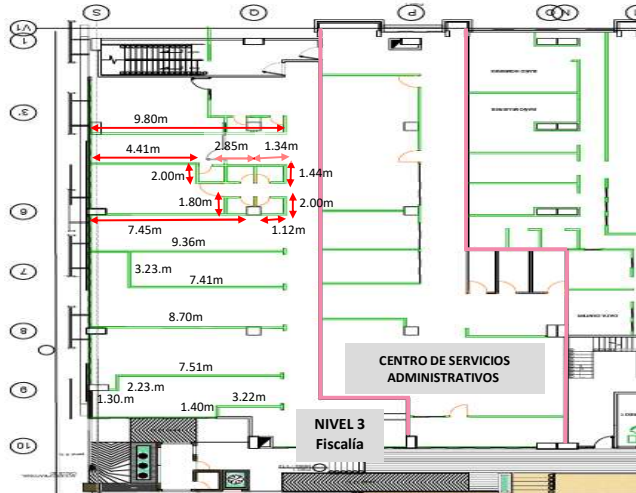
INFORMACIÓN GENERAL												
FECHA	DD	5	MM	10	AA	2026	CORTE N°	1	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.										
CONTRATISTA		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S		NIT O.C.C.		901.358.559-0		REP. CONTRATISTA		ARQ. CRISTIAN BARON		
INTERVENTORÍA		EJE GROUP S.A.S		NIT O.C.C.				REP. INTERVENTORÍA		MAURICIO CASTRO SORIANO		
CAPÍTULO:		1		DESMONTE PUNTO ELÉCTRICO				ÍTEM :		1.18		
										UNID	UN	
INFORMACIÓN DEL ÍTEM												
PLANO							Dimensiones				SUB TOTAL	
							Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
 <p>NIVEL -3 Antes: Sotano 1 Proyección: Centro de servicios penales adultos</p> <p>NIVEL -3 - SOTANO 1</p> <p>Antes: Sotano 2 Proyección: Oficina judicial</p> <p>NIVEL -3 - SOTANO 2</p>							Tomacorrientes				10	10,00
							Interruptores				5	5,00
							Voz y datos				15	15,00
							Luminarias				31	31,00
							Tomacorrientes				20	20,00
							Interruptores				8	8,00
							Voz y datos				73	73,00
							Luminarias				39	39,00
FOTOGRAFÍA 1							FOTOGRAFÍA 2					
												
FOTOGRAFÍA 3												
												
Viene memoria anterior							423,00					
SUBTOTAL MEMORIA							201,00					
TOTAL MEMORIA							624,00					
VALIDACIÓN												
Rep. Contratista.	 YURY DANIELA PINILA INGENIERA RESIDENTE				Supervisor					Representante Interventoría		
FIRMA:					FIRMA:					FIRMA:		
ELABORA :					NOMBRE :					NOMBRE :		


[illegible]

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA		CÓDIGO	0
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	0
			PAGINAS	1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL												
FECHA	DD	5	MM	10	AA	2026	CORTE N°	1	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.										
CONTRATISTA		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S		NIT O C.C.		901.358.559-0		REP. CONTRATISTA		ARQ. CRISTIAN BARON		
INTERVENTORÍA		EJE GROUP S.A.S		NIT O C.C.				REP. INTERVENTORÍA		MAURICIO CASTRO SORIANO		
CAPÍTULO:		1		DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA		ÍTEM :		1.31		UNID		
										M2		
INFORMACIÓN DEL ÍTEM												
PLANO						Dimensiones				SUB TOTAL		
						Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
 <p>NIVEL 3 Antes: Zona 1 - Call center Proyección: Juzgados No.1 al 7</p> <p>Antes: Zona 2 - Call center Proyección: Juzgados No.9 al 13</p> <p>Antes: Centro de servicios administrativos Proyección: - Centro de servicios ejecución de penas - Sala de audiencias - Juzgado No.8</p> <p>MURO DIVISORIO ZONA 1 Y CENTRO DE</p> <p>BAÑO MUJERES Y HOMBRES</p>						Muro divisorios antiguo Call Center y Antiguo Centro de servicios administrativos - Nivel 3	29,71		4,50		133,70	
						Antiguo Call Center - Nivel 3						
						Muretes Baño hombres		0,56	0,84	2	0,94	
						Muretes Baño mujeres		0,56	0,84	2	0,94	
						NIVEL 0 - Centro de servicios administrativos y juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad						
						MURETES LAVAMANOS						
						Baño mujeres		0,56	0,84		0,47	
						Baño hombres		0,57	0,84		0,48	
FOTOGRAFÍA 1						FOTOGRAFÍA 2						
 <p>MURO DIVISORIO</p>						 <p>MURO DIVISORIO</p>						
FOTOGRAFÍA 3						 <p>MURETES BAÑO HOMBRES</p>						
						Viene memoria anterior						0,00
						SUBTOTAL MEMORIA						136,53
						TOTAL MEMORIA						136,53
VALIDACIÓN												
Rep. Contratista.		Supervisor		Representante Interventoría								
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:								
ELABORA :		NOMBRE :		NOMBRE :								
YURY DANIELA PINILA		INGENIERA										
RESIDENTE												

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA	CÓDIGO 0
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN 0
		PAGINAS 2 de 4

INFORMACIÓN GENERAL											
FECHA	DD	5	MM	10	AA	2026	CORTE N°	1	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA		
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.							 Reingeniería Integral		
CONTRATISTA INTERVENTORÍA		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S	NIT O C.C.		901.358.559-0		REP. CONTRATISTA	ARQ. CRISTIAN BARON			
		EJE GROUP S.A.S	NIT O C.C.				REP. INTERVENTORÍA	MAURICIO CASTRO SORIANO			
CAPÍTULO:		1	DEMOLICIÓN MURO EN PLACA DE YESO				ÍTEM :	1.33	UNID M2		
INFORMACIÓN DEL ÍTEM											
PLANO						Dimensiones					
						Largo	Ancho	Alto	Cantidad	SUB TOTAL	
						Antigua Fiscalía - Nivel 3					77,72
											189,49
											4,74
FOTOGRAFÍA 1						FOTOGRAFÍA 2					
											
MUROS PLACA YESO						MUROS PLACA YESO					
FOTOGRAFÍA 3											
											
MUROS PLACA YESO											
						Viene memoria anterior					
						SUBTOTAL MEMORIA					
						TOTAL MEMORIA					
VALIDACIÓN											
Rep. Contratista.					Supervisor						
FIRMA:					FIRMA:						
ELABORA :					NOMBRE :						
YURY DANIELA PINILA		INGENIERA		RESIDENTE							



PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PAGINAS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2 de 2

OBJETO DEL CONTRATO

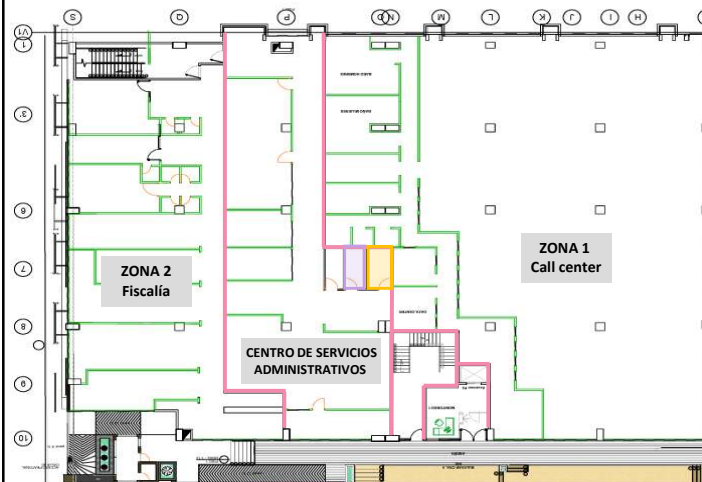
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES -
OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS
DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.



SA-MC-003-2026

M3

PLANO



NIVEL 3

Antes: Centro de servicios administrativos
Proyección:
- Centro de servicios ejecución de penas
- Sala de audiencias
- Juzgado No.8

 MESON BAÑO MUJERES CA

 MESON BAÑO HOMBRES CA

ZONA 1
Call center

FOTOGRAFÍA 1

BAÑO MUJERES
Y HOMBRES

FOTOGRAFÍA 2

BAÑO MUJERES
Y HOMBRES

FOTOGRAFÍA 3



**BAÑO MUJERES
Y HOMBRES**

Viene memoria anterior

0.23

SUBTOTAL MEMORIA

0,09

TOTAL MEMORIA

0.31

VALIDACIÓN

Rep. Contratista.

FIRMA:

ELABORA :

Supervisor

FIRMA:

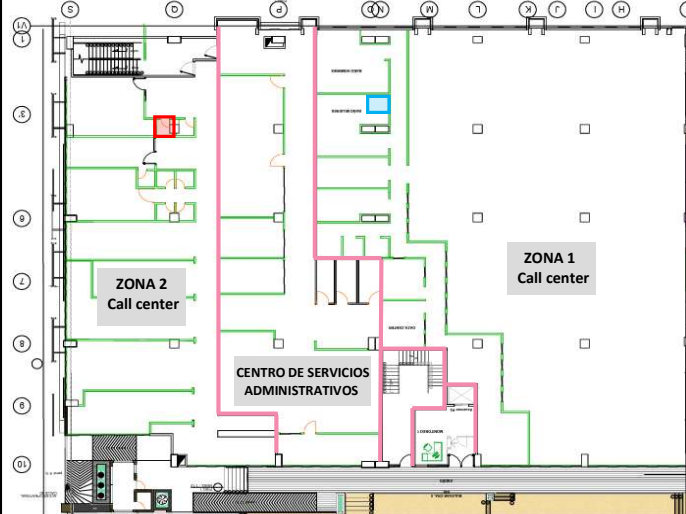
NOMBRE

Representante Interventoría

FIRMA:

NOMBRE :

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>	FORMATO DE MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE OBRA	CÓDIGO 0
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN 0
		PAGINAS 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL																
FECHA	DD	5	MM	10	AA	2026		CORTE N°	1	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA						
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - OFICINAS DE APOYO - CENTROS DE SERVICIO, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 1 ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.														
CONTRATISTA		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S		NIT O C.C.		901.358.559-0		REP. CONTRATISTA		ARQ. CRISTIAN BARON						
INTERVENTORÍA		EJE GROUP S.A.S		NIT O C.C.				REP. INTERVENTORÍA		MAURICIO CASTRO SORIANO						
CAPÍTULO:		1		DEMOLICIÓN POCETA DE ASEO				ÍTEM :		1.35						
										UNID	UN					
INFORMACIÓN DEL ÍTEM																
PLANO								Dimensiones				SUB TOTAL				
								Largo	Ancho	Alto	Cantidad					
 <p>NIVEL 0 Antes: Zona 1 - Call center Proyección: Juzgados No.1 al 7</p> <p>Antes: Zona 2 - Call center Proyección: Juzgados No.9 al 13</p> <p>POCEA BAÑO MUJERES POCEA ZONA 2</p>								Antiguo Call Center - Nivel 3								
								Poceta Baño Mujeres							1	1,00
								Antigua Fiscalía - Nivel 3							1	1,00
 <p>BAÑO MUJERES</p>  <p>BAÑO MUJERES</p>  <p>BAÑO HOMBRES</p>																
								Viene memoria anterior				0,00				
								SUBTOTAL MEMORIA				2,00				
								TOTAL MEMORIA				2,00				
VALIDACIÓN																
Rep. Contratista.	 YURY DANIELA PINILA INGENIERA RESIDENTE				Supervisor					Representante Interventoría						
FIRMA:					FIRMA:					FIRMA:						
ELABORA :					NOMBRE :					NOMBRE :						



REINGENIERIA INTEGRAL SAS

Nit 901358559

Factura Electrónica De Venta No

RIE No. 448

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101310988 que habilita desde RIE 416 hasta RIE 1000. Vence 2026-11-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA CONST 8.00 X 1000

CLIENTE	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARA				POR CONCEPTO DE				
NIT	800165940 9				#\$27-01-01-220; SA-MC-03-2026; imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co #\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
L 41 P 1 ED PALACIO DE JU		Pereira	3113720068						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO							
05/10/2026		05/10/2026							
				VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
				PAULA ANDREA BARRIOS BOTERO			Credito		
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41301002	COSTO DIRECTO(Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira)		1,00	Und.	\$ 40.000.850,00	0%	\$ 0,00	\$ 40.000.850,00
2	1002	ADMINISTRACION 25%		1,00	Und.	\$ 10.000.213,00	0%	\$ 0,00	\$ 10.000.213,00
3	1004	UTILIDAD 5%		1,00	Und.	\$ 2.000.043,00	19%	\$ 380.008,17	\$ 2.000.043,00

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS

ORDEN DE COMPR

SUBTOTAL	\$ 52.001.106,00
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 380.008,17
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 52.381.114,17
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 52.381.114,17



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2026 08:09:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

BRR TORICES CLL 43 N° 13 - 71 P3 Teléfono 3165248233

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 047414105db6e2e3cbe2cb296878b87a250511230dc61a2fae5ec8cb213dcd3683c96fed276500c4bd9f5d9dff3ef9c4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2026 12:14:46 p. m.



**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo **Cristian Luis Barón Torres** identificado con **C.C 7.938.406** en mi condición de representante legal de **Reingeniería Integral S.A.S** identificada con el **NIT 901.358.559-0**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **Shirly Álvarez Julio** identificado con **C.C 1.050.956.415** y con tarjeta profesional No. 259805-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de auditor externo de **Reingeniería Integral S.A.S** identificada con el **NIT 901.358.559-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cartagena, a los 01 días del mes de octubre de 2026.

CRISTIAN BARÓN TORRES

C.C 7.938.406

REPRESENTANTE LEGAL DE REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S

SHIRLY ALVAREZ JULIO

C.C 1.050.956.415

T.P 259805-T

REVISOR FICAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.369.407**

GARCIA CORREA

APELLIDOS

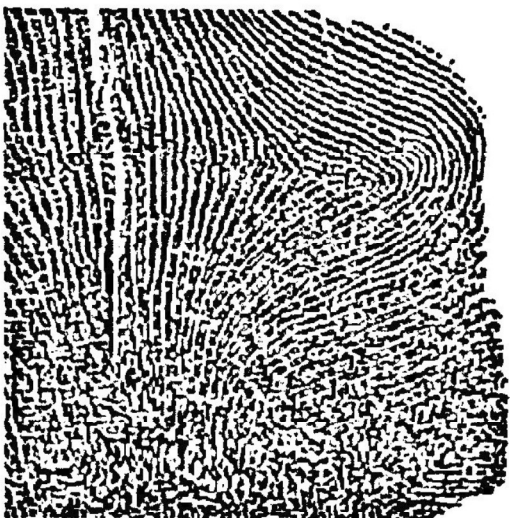
YORMAN

NOMBRES

YORMAN GARCIA CORREA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

27-AGO-1993

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

A+

G.S. RH


M

SEXO

07-DIC-2011 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0500150-00379924-M-1143369407-20120530

0030091415A 2

37626644

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



286180-T

**YORMAN
GARCIA CORREA
C.C. 1143369407**

**RES. INSCRIPCION 2246 DEL 10/09/2021
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR**



JOSE ORLANDO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

308878

326004

USO EXCLUSIVO PARA REINGENIERIA INTEGRAL SAS

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 F 9 0 9 B 4 C 6 1 E 0 7 9 7 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YORMAN GARCIA CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143369407 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 286180-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.050.956.415**
ALVAREZ JULIO

APELLIDOS
SHIRLY

NOMBRES
Shirly Alvarez Julio
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-1991**
ARJONA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-JUN-2009 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-0511800-00213385-F-1050956415-20100208 0020715446A 1 29558965

LINDEAD | JUNTA CENTRAL
ADMINISTRATIVA DE CONTADORES
ESPECIAL



259805-T

SHIRLY
ALVAREZ JULIO
C.C. 1050956415
RES. INSCRIPCION 374
FUNDACION UNIVERSITARIA TECNICA
COMFENALCO



270652

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290011



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2327913049ADBCA1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SHIRLY ALVAREZ JULIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050956415 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 259805-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 38733117

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-09-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901358559	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TORICES CALLE 43 N 13 71 PISO 3	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	REINGENIERIAINTEGRALSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	65630124
FAX	65630124	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	reingenieria integral sas
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7938406	PRIMER APELLIDO	BARON	SEGUNDO APELLIDO	TORRES
PRIMER NOMBRE	CRITIAN	SEGUNDO NOMBRE	LUIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$13.503.620		38733117

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7938406	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	BARON TORRES CRISTIAN LUIS	\$6.500.000
CC-1235042920	01	No	No	No	13	1	1711001	Fijo	BARRIOS BOTERO PAULA ANDREA	\$1.750.905
CC-22493371	01	No	No	No	13	1	1711001	Fijo	GALVAN ACUÑA LUZ PERLY	\$1.750.905
CC-1002243154	01	No	No	No	13	1	1711001	Fijo	OSUNA ARIAS SOL MERY	\$1.750.905
CC-3946299	01	4	No	No	13	1	1711001	Fijo	TORRES CANTILLO WILLIAM RAFAEL	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7938406																													0		
CC - 1235042920																													0		
CC - 22493371																													0		
CC - 1002243154																													0		
CC - 3946299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7938406	PORVENIR	30	\$6.500.000	0.1600000	\$1.040.000	\$0	\$0	\$1.040.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1235042920	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 22493371	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1002243154	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 3946299	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7938406	EPS SURA	30	\$6.500.000	0.0400000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.000	901358559	0.0696000	\$452.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1235042920	SALUD TOTAL	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0052200	\$9.200
CC - 22493371	EPS SURA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1002243154	EPS SURA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0052200	\$9.200
CC - 3946299	SALUD TOTAL	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0052200	\$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7938406	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$6.500.00 0	0.0400000	\$260.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1235042920	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-22493371	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002243154	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-3946299	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0
COLPENSIONES	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$700	\$0	\$0	\$280.900
PORVENIR	3	\$1.600.400	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$3.600	\$0	\$0	\$1.604.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$140.2 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140.2 00	3	\$400	\$0	\$140.6 00	\$0	0	\$0	\$0	\$140.6 00	\$0	\$0	\$140.6 00
EPS SURA	3	\$400.2 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$400.2 00	3	\$900	\$0	\$401.1 00	\$0	0	\$0	\$0	\$401.1 00	\$0	\$0	\$401.1 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	\$489.200	0	\$0	\$0	\$489.200	3	\$1.100	\$490.300	0	\$0	\$0	\$490.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	5	\$540.400	3	\$1.300	\$541.700
SENA	0	\$0	3	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	3	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	3	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	3	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$541.700
PENSIONES	2	\$1.884.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$490.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$541.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.458.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38732694
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901358559	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TORICES CALLE 43 N 13 71 PISO 3	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	TENIS1980@YAHOO.COM.CO	TELÉFONO	65630124
FAX	65630124	SUCURSAL	007	NOMBRE SUCURSAL	RAMA JUDICIAL PEREIRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7938406	PRIMER APELLIDO	BARON	SEGUNDO APELLIDO	TORRES
PRIMER NOMBRE	CRISTIAN	SEGUNDO NOMBRE	LUIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$4.021.879		38732694

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74366059	01	No	No	No	17	616	5711001	Fijo	ALVAREZ PINTO LUIS CARLOS	\$4.000.000
CC-73146369	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	BOLIVAR RODRIGUEZ WILSON	\$2.800.000
CC-1093219899	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LOAIZA GARCIA ALEJANDRO	\$1.750.905
CC-1053868903	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	MARTINEZ SANCHEZ ANA VALENTINA	\$3.500.000
CC-1047397859	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	OSUNA NAVARRO JADER ANDRES	\$3.000.000
CC-1068976344	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	PINILLA TICORA YURY DANIELA	\$4.000.000
CC-73545758	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RIVERO ARRIETA JAVIER ENRIQUE	\$3.500.000
CC-73152806	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	ZUÑIGA PAJARO FREDY ENRIQUE	\$2.500.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDAP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74366059	X	2026-08-25																										0			
CC - 73146369	X	2026-08-28																										0			
CC - 1093219899	X	2026-08-24																										0			
CC - 1053868903	X	2026-08-25																										0			
CC - 1047397859	X	2026-08-28																										0			
CC - 1068976344	X	2026-08-24																										0			
CC - 73545758	X	2026-08-28																										0			
CC - 73152806	X	2026-08-28																										0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74366059	PORVENIR	6	\$800.000	0.1600000	\$128.000	\$0	\$0	\$128.000	\$0	\$0	\$0
CC - 73146369	COLFONDOS	3	\$280.000	0.1600000	\$44.800	\$0	\$0	\$44.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1093219899	PORVENIR	7	\$408.545	0.1600000	\$65.400	\$0	\$0	\$65.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1053868903	PROTECCION	6	\$700.000	0.1600000	\$112.000	\$0	\$0	\$112.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1047397859	PORVENIR	3	\$300.000	0.1600000	\$48.000	\$0	\$0	\$48.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1068976344	PORVENIR	7	\$933.334	0.1600000	\$149.400	\$0	\$0	\$149.400	\$0	\$0	\$0
CC - 73545758	PROTECCION	3	\$350.000	0.1600000	\$56.000	\$0	\$0	\$56.000	\$0	\$0	\$0
CC - 73152806	PROTECCION	3	\$250.000	0.1600000	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74366059	EPS SURA	6	\$800.000	0.0400000	\$32.000	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$800.000	5711001	0.0696000	\$55.700
CC - 73146369	SALUD TOTAL	3	\$280.000	0.0400000	\$11.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$280.000	5711001	0.0696000	\$19.500
CC - 1093219899	SALUD TOTAL	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$408.545	5711001	0.0696000	\$28.500
CC - 1053868903	SALUD TOTAL	6	\$700.000	0.0400000	\$28.000	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$700.000	5711001	0.0696000	\$48.800
CC - 1047397859	SALUD TOTAL	3	\$300.000	0.0400000	\$12.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$300.000	5711001	0.0696000	\$20.900
CC - 1068976344	SALUD TOTAL	7	\$933.334	0.0400000	\$37.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$933.334	5711001	0.0696000	\$65.000
CC - 73545758	EPS SURA	3	\$350.000	0.0400000	\$14.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$350.000	5711001	0.0696000	\$24.400
CC - 73152806	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$250.000	0.0400000	\$10.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$250.000	5711001	0.0696000	\$17.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74366059	CCF DE CALDAS	6	\$800.000	0.0400000	\$32.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73146369	COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$280.000	0.0400000	\$11.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1093219899	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$408.545	0.0400000	\$16.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053868903	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$700.000	0.0400000	\$28.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1047397859	COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$300.000	0.0400000	\$12.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1068976344	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$933.334	0.0400000	\$37.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73545758	COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$350.000	0.0400000	\$14.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73152806	COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$250.000	0.0400000	\$10.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	4	\$390.800	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$900	\$0	\$0	\$391.700	
COLFONDOS	1	\$44.800	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$200	\$0	\$0	\$45.000	
PROTECCION	3	\$208.000	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$500	\$0	\$0	\$208.500	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	\$46.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.00 0	3	\$200	\$0	\$46.20 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.20 0	\$0	\$0	\$46.20 0
SALUD TOTAL	5	\$105.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$105.0 00	3	\$300	\$0	\$105.3 00	\$0	0	\$0	\$0	\$105.3 00	\$0	\$0	\$105.3 00
EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$10.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$10.00 0	3	\$100	\$0	\$10.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$10.10 0	\$0	\$0	\$10.10 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	\$280.200	0	\$0	\$0	\$280.200	3	\$700	\$280.900	0	\$0	\$0	\$280.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	1	\$32.000	3	\$100	\$32.100
COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$129.000	3	\$300	\$129.300
SENA	0	\$0	3	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	3	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	3	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	3	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$161.600
PENSIONES	3	\$645.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$280.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$161.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.249.100



CERTIFICACION

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR, 04/10/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **REINGENIERIA INTEGRAL SAS** con **NIT 901.358.559-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 058200243234

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA
