

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	AFINCO-FR-46
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	Versión	1
	AUTORIZACION DE PAGO OBRA PÚBLICA	FECHA	10/09/2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Dependencia:	GCN	Pago No:	4	Total de Pagos Proyectados	80
--------------	-----	----------	---	----------------------------	----

Nombre/Razón Social:	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO	Naturaleza:	PERSONA JURIDICA	Identificación:	901887085-0
Correo:	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Dirección:	CR 38 # 26 - 41 oficina 833		

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.:	4303-2024	Periodo a pagar:	ABRIL-2026	Plazo de Ejecucion:	31/12/2026
Fecha de inicio:	21/11/2024	Departamento:	CHOCÓ	Municipio:	EL CARMEN DE ATRATO

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Número Compromiso	Rubro	Recurso	Valor
232426	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	\$ 33.455.606,50

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

+ Valor Inicial:	\$ 154.199.331.758,00
+ Valor Adición:	\$ 0,00
= Valor Total Contrato:	\$ 154.199.331.758,00

Total Obligado:	\$ 0,00
Total Pagado:	\$ 0,00

+ Valor básico a pagar (OTRO COBRO):	\$ 35.394.984,19
+ Valor IVA:	\$ 242.709,63
(-) Valor amortización:	\$ 2.182.087,32
= Valor a Pagar:	\$ 33.455.606,50

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA
---------	---

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA	ACTA DE AJUSTE DEFINITVA No 18 PERIODO ABRIL2026.

AUTORIZACION DE PAGO

De acuerdo con la Resolución número 8121 del año 2018, modificada por la Resolución 8130 de 2018, y modificada parcialmente y adicionada por la Resolución 359 de 2019 y las resoluciones de delegación que se derivan de estas, se AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA con cargo al registro presupuestal del contrato. Para proceder con el presente pago, en calidad de supervisor del contrato/convenio anotado, certifico que el contratista cumplió con el objeto del contrato y lo estipulado contractualmente. En igual sentido certifico que el contratista cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.

OBSERVACIONES
En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta de ajustes 18D, correspondiente al mes de abril de 2026, derivada del Contrato de obra 4303-2024, Como resultado de la revisión, se verificó que la documentación soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las partes intervinientes corresponden a las competencias establecidas y que el acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los lineamientos institucionales aplicables para su trámite.

HISTORIAL DE EVENTOS (HOJA DE RUTA)			
FECHA	USUARIO	EVENTO	DESCRIPCIÓN
07/09/2026 11:28	wzambrano@invias.gov.co	Enviado a revisión	En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta de ajustes 18D, correspondiente al mes de abril de 2026, derivada del Contrato de obra 4303-2024, Como resultado de la revisión, se verificó que la documentación soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las partes intervinientes corresponden a las competencias establecidas y que el acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los lineamientos institucionales aplicables para su trámite.
04/09/2026 16:08	andres_spineda@hotmail.com	Aprobado Vo.Bo.	Luego de revisar el acta de ajustes No.18D CTO 4303-2024 con sus respectivos formatos y soportes, se remite para continuar con el tramite
03/09/2026 16:06	vgutierrez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y aprobación por la Interventoria Consorcio Cordillera Occidental, se da visto bueno para continuar con el debido de revisión y/o aprobación por la Unidad Ejecutora
03/09/2026 15:05	ychatat@invias.gov.co	Aprobado Supervisor	Con los documentos adjuntos, se aprueba para tramite
03/09/2026 14:54	intcordilleraoccidental@gmail.com	Enviado a revisión	Revisada la información del Acta de Ajustes No. 18 Provisional se da la Aprobación por parte de Interventoria
31/08/2026 16:36	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
31/08/2026 09:53	intcordilleraoccidental@gmail.com	Rechazado Vo.Bo.	SE RECHAZA DEBIDO A QUE LE INDICE DEL GRUPO DE AJUSTE DE PUENTES SUBESTRUCTURA NO CORRESPONDE AL VALOR DEL INDICE DEL MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, LO QUE AFECTA EL VALOR DEL ACTA DE AJUSTES
25/08/2026 15:21	mpovedam	Correccion Valor Antes Iva	Corrección de VALOR ANTES IVA duplicado por error del sistema al editar (de 72612920.32 a 36306460.16).
25/08/2026 07:17	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
24/08/2026 18:13	andres_spineda@hotmail.com	Rechazado Vo.Bo.	Por medio de la presente se hace devolución del acta de ajuste No. 18D CTO 4303-2024, debido a que el índice del grupo de ajuste 14104 para el mes del cierre del proceso de selección no corresponde,
20/08/2026 15:20	jjsanchez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	SE APRUEBA EL ACTA DE AJUSTES 18 DEF PARA TRAMITE CORRESPONDIENTE
20/08/2026 10:26	vgutierrez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y aprobación por la Interventoria Consorcio Cordillera Occidental, se da visto bueno para continuar con el debido de revisión y/o aprobación por la Unidad Ejecutora
19/08/2026 19:36	ychatat@invias.gov.co	Aprobado Supervisor	Con la revisión de los anexos, se aprueba el tramite del acta
19/08/2026 11:31	intcordilleraoccidental@gmail.com	Enviado a revisión	Revisada la información presentada para el trámite, se da aprobación al Acta de Ajustes Definitivo No. 18 del periodo de Abril de 2026
19/08/2026 08:22	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Radicación	Cuenta de cobro radicada por el contratista



LUIS JAIME DIAZ PEREZ

—

Documento Firmado Electrónicamente



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. 72

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CI 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 16:22
Expedición	31/08/2026, 16:22
Vencimiento	11/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE DEFINITVA No 18 PERIODO ABRIL 2026.	1.00	31,935,477.76	31,935,477.76
2	UTILIDAD 5%	1.00	1,277,419.11	1,277,419.11

Total items: 2

Total Bruto	33,212,896.87
IVA 19%	242,709.63
Total a Pagar	33,455,606.50

Valor en Letras: Treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-11 por \$ 33,455,606.50

Observaciones: #\$24-02-00;4303-2024;liguaran@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 8dc3202bb0906fc8ff108787125a9e69ccb42e12f28321ca98253465e5a1c475125e9317b1e3d99c92641b624b2ee727

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		PERIODO MES: abr-26		FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 18 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 33.212.896,87			


	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25/08/2026	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	25/08/2026	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	27/08/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	27/08/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.


ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		NIT. 901887085-0	
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS		AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	
		(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 33.455.606,50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO ABRIL ACTA 18 2026 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)		DEL PERIODO: abr-26 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar el periodo del Acta)	

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA	Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS
Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND	Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND	Matrícula profesional No.: 17202-124682 CLD	Matrícula Profesional No.: 25202-104893 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

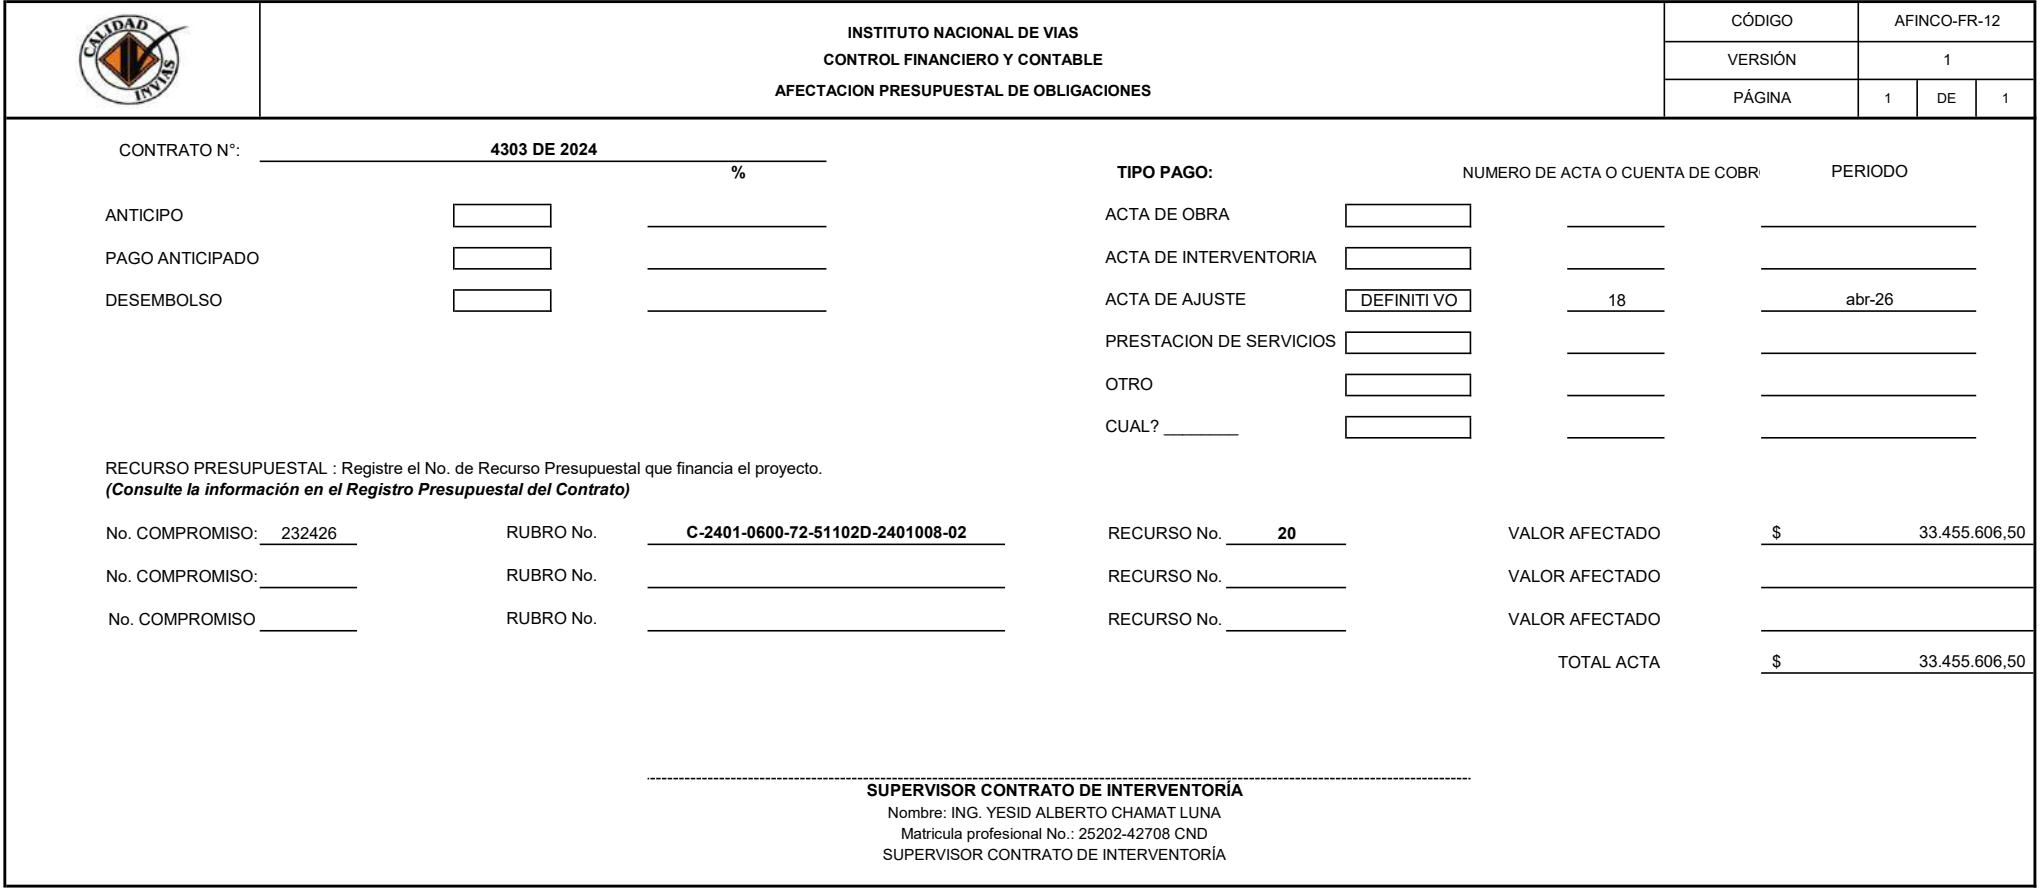

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO VERSION 1 PÁGINA 1 de 2		MEP-MN-IN-15-FR-8				
												FECHA 25/08/2026 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCHÓ						
CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024												CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						
MES INFORME MENSUAL: abril - 2026												PROYECTO: CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHÓ Y ANTIOQUIA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024												INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																		
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		VALOR		Saldo del Acta Anterior				
2024		1125924 del 14 de noviembre del 2024		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		11		NACION		PRINCIPAL		\$ 600.000.000,00		\$ -				
2024		1125924 del 14 de noviembre del 2024		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		21		PROPIOS		PRINCIPAL		\$ 2.000.000.000,00		\$ -				
														\$ -				
2025		84525 del 19 de febrero 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		20		PROPIOS		PRINCIPAL		\$ 11.624.000.000,00		\$ -				
2025		84525 del 19 de febrero 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401017-02		20		PROPIOS		PRINCIPAL		\$ 5.084.300.000,00		\$ -				
2025		84525 del 19 de febrero 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401008-02		20		PROPIOS		PRINCIPAL		\$ 60.091.031.758,00		\$ -				
2025		894225 del 27 de Diciembre 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401060-02		10		NACION		Adicional No. 1		\$ 800.000.000,00		\$ -				
2026		232426 del 02 de Febrero de 2026		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		20		PROPIOS		PRINCIPAL		\$ 19.528.000.002,00		\$ -				
2026		232426 del 02 de Febrero de 2026		C-2401-0600-72-51102D-2401008-02		20		PROPIOS		PRINCIPAL		\$ 39.911.000.000,00		\$ 39.673.653.410,41				
2026		232426 del 02 de Febrero de 2026		C-2401-0600-72-51102D-2401017-02		20		PROPIOS		PRINCIPAL		\$ 14.560.999.998,00		\$ 14.560.999.998,00				
TOTAL												\$ 154.199.331.758,00		\$ 54.234.653.408,41				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 154.199.331.758,00																		
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																		
Item	Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														No.	Fecha	SI	NO	
1	OBRA	nov-24	\$ 986.816.994,00	\$ 7.211.354,96	\$ 994.028.348,96	\$ 994.028.348,96	\$ -	\$ 994.028.348,96	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ 2.600.000.000,00	\$ 153.205.303.409,04	17915	2024-12-12			R.P. VIGENCIA 2025	
2	OBRA	dic-24	\$ 1.591.046.374,00	\$ 11.626.877,35	\$ 1.602.673.251,35	\$ 2.596.701.600,31	\$ -	\$ 1.602.673.251,35	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ 3.298.399,69	\$ 151.602.630.157,69	17916	2024-12-10				
1	AJUSTE DEFINITIVO	nov-24	\$ 1.946.494,64	\$ 14.224,38	\$ 1.960.719,02	\$ 2.598.662.319,33	\$ -	\$ 1.960.719,02	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ 1.337.680,67	\$ 151.600.669.438,67	905	2025-03-06				
2	AJUSTE DEFINITIVO	dic-24	\$ 3.591.506,18	\$ 26.245,62	\$ 3.617.751,80	\$ 2.602.280.071,13	\$ -	\$ 3.617.751,80	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ -	\$ 151.597.051.686,87	907	2025-03-06				
ANTICIPO 1											\$ 7.000.000.000	\$ 76.797.051.686,87						
3	OBRA	ene-25	\$ 2.088.221.025,00	\$ 15.260.076,72	\$ 2.103.481.101,72	\$ 4.705.761.172,85	\$ -	\$ 2.103.481.101,72	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 69.797.051.686,87	\$ 149.493.570.585,15	455	2025-02-20				
3	AJUSTE PROVISIONAL	ene-25	\$ 3.293.534,11	\$ 24.068,13	\$ 3.317.602,24	\$ 4.709.078.775,09	\$ -	\$ 3.317.602,24	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.693.570.585,15	\$ 149.490.252.982,91	457	2025-02-20				
3	AJUSTE DEFINITIVO	ene-25	\$ 41.055.662,05	\$ 300.022,15	\$ 41.355.684,20	\$ 4.750.434.459,29	\$ -	\$ 41.355.684,20	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.690.252.982,91	\$ 149.490.252.982,91	972	2025-03-10				
4	OBRA	feb-25	\$ 485.375.921,00	\$ 3.546.977,88	\$ 488.922.898,88	\$ 5.239.357.358,17	\$ -	\$ 488.922.898,88	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.648.897.298,71	\$ 149.448.897.298,71	1646	2025-03-28				
4	AJUSTE PROVISIONAL	feb-25	\$ 10.201.572,29	\$ 74.549,95	\$ 10.276.122,24	\$ 5.249.633.480,41	\$ -	\$ 10.276.122,24	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.159.974.399,83	\$ 148.959.974.399,83	1343	2025-03-19				
4	AJUSTE DEFINITIVO	feb-25	\$ 4.531.979,73	\$ 33.118,31	\$ 4.565.098,04	\$ 5.254.198.578,45	\$ -	\$ 4.565.098,04	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.149.698.277,59	\$ 148.949.698.277,59	1615	2025-03-28				
5	OBRA	mar-25	\$ 5.289.006.845,00	\$ 38.650.434,64	\$ 5.327.657.279,64	\$ 10.581.855.858,09	\$ 370.230.479	\$ 4.957.426.800,49	\$ 6.629.769.521	84525-19/02/2025	\$ 67.145.133.179,55	\$ 148.945.133.179,55	3334	2025-05-08				
5	AJUSTE DEFINITIVO	mar-25	\$ 173.254.070,10	\$ 1.266.087,44	\$ 174.520.157,54	\$ 10.756.376.015,63	\$ -	\$ 174.520.157,54	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 62.187.706.379,06	\$ 143.617.475.899,91	3175	2025-05-06				
6	OBRA	abr-25	\$ 2.657.349.080,00	\$ 19.419.089,43	\$ 2.676.768.169,43	\$ 13.433.144.185,06	\$ 186.014.436	\$ 2.490.753.733,83	\$ 6.443.755.085	84525-19/02/2025	\$ 62.013.186.221,52	\$ 143.442.955.742,37	4933	2025-06-09				
6	AJUSTE PROVISIONAL	abr-25	\$ 90.425.102,33	\$ 660.798,82	\$ 91.085.901,15	\$ 13.524.230.086,21	\$ -	\$ 91.085.901,15	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 62.187.706.379,06	\$ 143.617.475.899,91	3175	2025-05-06				
6	AJUSTE DEFINITIVO	abr-25	\$ 12.095.540,07	\$ 88.390,49	\$ 12.183.930,56	\$ 13.536.414.016,77	\$ -	\$ 12.183.930,56	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 59.431.346.586,54	\$ 140.675.101.671,79	4809	2025-06-09				
7	OBRA	may-25	\$ 3.300.738.117,00	\$ 24.120.778,55	\$ 3.324.858.895,55	\$ 16.861.272.912,32	\$ 231.051.668	\$ 3.093.807.227,36	\$ 6.212.703.417	84525-19/02/2025	\$ 59.419.162.655,98	\$ 140.662.917.741,23	7009	2025-07-15				
7	AJUSTE PROVISIONAL	may-25	\$ 122.001.733,10	\$ 891.551,13	\$ 122.893.284,23	\$ 16.984.166.196,55	\$ -	\$ 122.893.284,23	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 59.419.162.655,98	\$ 140.662.917.741,23	7009	2025-07-15				
7	AJUSTE DEFINITIVO	may-25	\$ 209.409,67	\$ 1.530,30	\$ 210.939,97	\$ 16.984.377.136,52	\$ -	\$ 210.939,97	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 56.202.462.144,39	\$ 137.215.165.561,45	7018	2025-07-15				
8	OBRA	jun-25	\$ 4.186.894.660,00	\$ 30.596.537,90	\$ 4.217.491.197,90	\$ 21.201.868.334,42	\$ 293.082.626	\$ 3.924.408.571,70	\$ 5.919.620.791	84525-19/02/2025	\$ 56.202.251.204,42	\$ 137.214.954.621,48	7774	2025-07-29				
8	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jun-25	\$ 199.915.966,00	\$ 37.984.033,54	\$ 237.899.999,54	\$ 21.439.768.333,96	\$ -	\$ 237.899.999,54	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 56.202.251.204,42	\$ 137.214.954.621,48	7774	2025-07-29				
8	AJUSTE PROVISIONAL	jun-25	\$ 151.356.504,21	\$ 1.106.066,76	\$ 152.462.570,97	\$ 21.592.230.904,93	\$ -	\$ 152.462.570,97	\$ -	84525-19/02/2026	\$ 52.039.942.633,18	\$ 132.759.563.424,04	7496	2025-07-23				
8	AJUSTE DEFINITIVO	jun-25	\$ 67.120,23	\$ 490,50	\$ 67.610,73	\$ 21.592.298.515,66	\$ -	\$ 67.610,73	\$ -	84525-19/02/2027	\$ 51.887.412.451,48	\$ 132.607.033.242,34	10932	2025-09-29				
9	OBRA	jul-25	\$ 4.123.294.898,00	\$ 30.131.770,41	\$ 4.153.426.668,41	\$ 25.745.725.184,07	\$ 288.630.643	\$ 3.864.796.025,55	\$ 5.630.990.148	84525-19/02/2025	\$ 52.039.942.633,18	\$ 132.759.563.424,04	7496	2025-07-23				
9	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jul-25	\$ 500.052.101,00	\$ 95.009.899,19	\$ 595.062.000,19	\$ 26.340.787.184,26	\$ -	\$ 595.062.000,19	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 48.022.616.425,93	\$ 128.453.606.573,93	8869	2025-08-25				
9	AJUSTE PROVISIONAL	jul-25	\$ 151.904.059,21	\$ 1.110.068,12	\$ 153.014.127,33	\$ 26.493.801.311,59	\$ -	\$ 153.014.127,33	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 47.427.554.425,74	\$ 127.888.544.573,74	8869	2025-08-25				
9	AJUSTE DEFINITIVO	jul-25	\$ 20.676.533,58	\$ 151.097,75	\$ 20.827.631,33	\$ 26.514.628.942,92	\$ -	\$ 20.827.631,33	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 47.274.540.298,41	\$ 127.705.530.446,41	10933	2025-09-27				
10	OBRA	ago-25	\$ 4.786.609.118,00	\$ 34.979.066,63	\$ 4.821.588.184,63	\$ 31.336.217.127,55	\$ 335.062.638	\$ 4.486.525.546,37	\$ 5.295.927.510	84525-19/02/2025	\$ 47.253.712.667,08	\$ 127.694.702.815,08	10934	2025-09-27				
10	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ago-25	\$ 300.000.000,00	\$ 57.000.000,00	\$ 357.000.000,00	\$ 31.693.217.127,55	\$ -	\$ 357.000.000,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.767.187.120,71	\$ 122.863.114.630,45	10251	2025-10-16				
10	AJUSTE PROVISIONAL	ago-25	\$ 195.788.202,66	\$ 1.430.759,95	\$ 197.218.962,61	\$ 31.890.438.090,16	\$ -	\$ 197.218.962,61	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.410.187.120,71	\$ 122.508.114.630,45	10251	2025-10-16				
10	AJUSTE DEFINITIVO	ago-25	\$ 4.582.141,31	\$ 33.484,87	\$ 4.615.626,18	\$ 31.895.051.716,34	\$ -	\$ 4.615.626,18	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12122	2025-10-23				
ANTIPO 2											\$ 14.000.000.000	\$ 28.208.352.531,92						
11	OBRA	sep-25	\$ 5.137.964.276,00	\$ 37.546.808,17	\$ 5.175.511.084,17	\$ 37.070.582.800,51	\$ 1.141.146.308	\$ 4.034.394.776,47	\$ 18.154.781.202	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12122	2025-10-23				
11	ESTUDIOS Y DISEÑOS	sep-25	\$ 650.000.000,00	\$ 123.500.000,00	\$ 773.500.000,00	\$ 37.844.082.890,51	\$ -	\$ 773.500.000,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 23.400.467.755,45	\$ 116.355.248.957,49	12124	2025-10-23				
11	AJUSTE PROVISIONAL	sep-25	\$ 186.805.104,39	\$ 1.365.114,23	\$ 188.170.218,62	\$ 38.032.253.019,13	\$ -	\$ 188.170.218,62	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 23.212.297.536,83	\$ 116.167.078.738,87	12123	2025-10-23				
11	AJUSTE DEFINITIVO	sep-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.032.253.019,13	\$ -	\$ -	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 23.212.297.536,83	\$ 116.167.078.738,87	12123	2025-10-23				

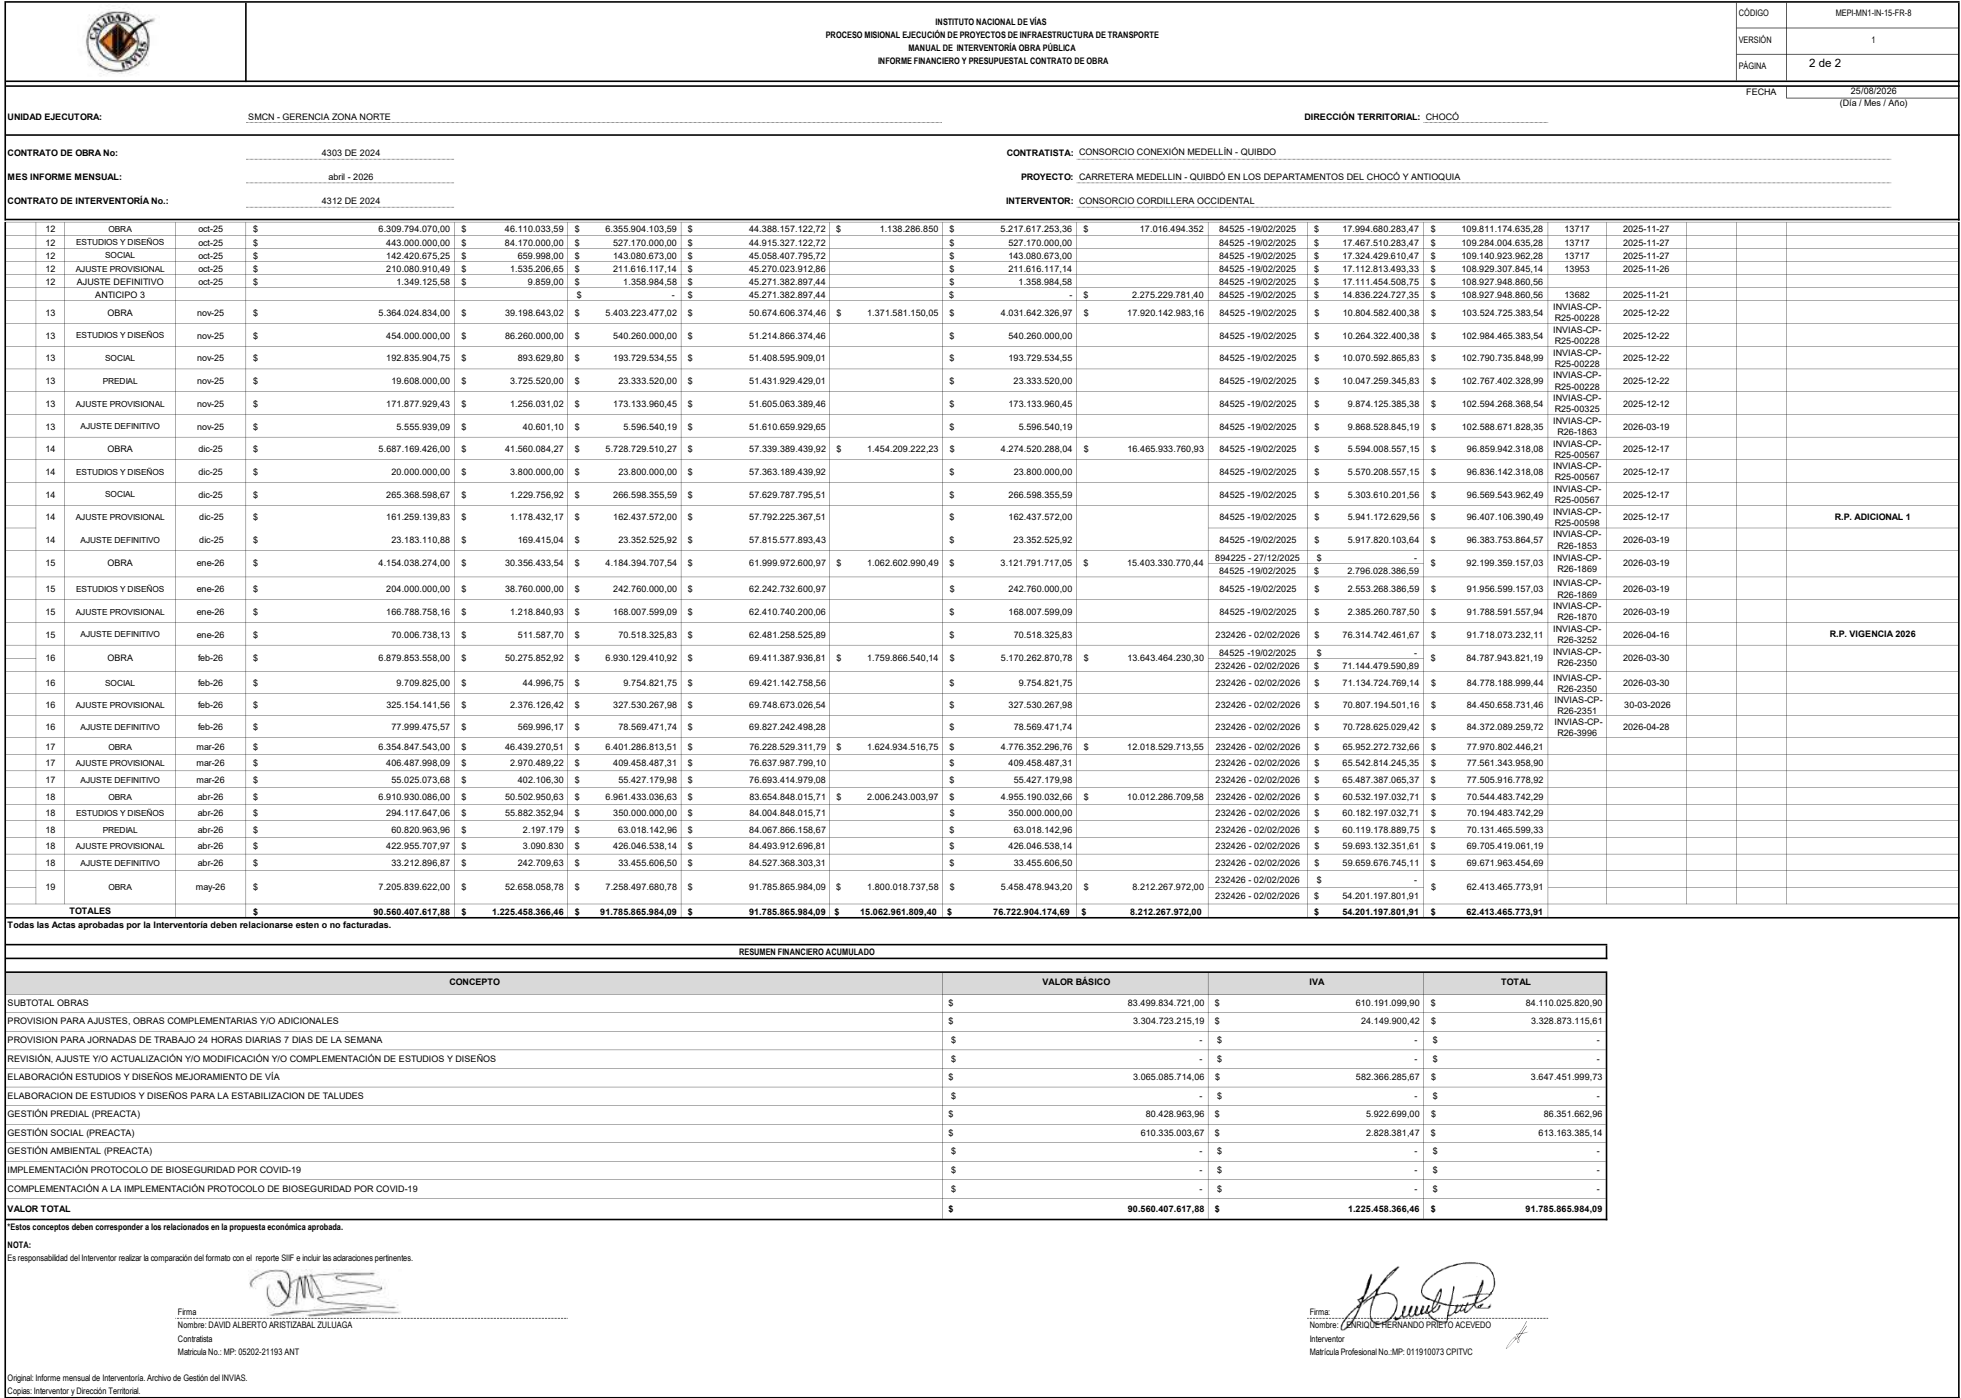

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCO

FECHA

08/05/2026

(Día / Mes / Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 18 DE _____ abr-26 VALOR BÁSICO RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 6.910.930.086,00

SEGUIMIENTO No. 18

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21) MESES Y NUEVE (9) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21) MESES Y NUEVE (9) DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.399.331.758,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO \$ 154.199.331.758,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(100% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Valor Ejecutado	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	
EXPLANACIONES (No de Orden de 1 al 5)	\$2.752.302	2,37%	12,85%	%P 0,08%	\$91.220	\$254.309	\$265.366	\$254.309	\$427.924	\$540.495	\$527.136	\$444.569	\$720.993	\$375.847	\$531.094	\$551.526	\$507.885	\$544.039	\$208.210	\$553.292	\$577.007	\$740.478	\$685.921	\$1.949.642	\$1.649.632	100%
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS (No de Orden de 6 al 7)	\$2.152.035	1,85%	0,96%	%E 0,09%	\$101.547	\$143.163	\$230.894	\$145.545	\$609.613	\$166.966	\$376.420	\$620.582	\$691.145	\$1.199.385	\$1.316.289	\$1.586.875	\$1.234.384	\$1.084.721	\$1.426.144	\$684.262	\$1.966.373	\$1.426.144	\$0	\$0	\$0	\$0
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No de Orden de 8 al 11)	\$2.935.916	2,52%	1,11%	%P 0,02%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAVIMENTOS CONCRETO (No de Orden de 12)	\$57.207.500	49,16%	0,66%	%E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No de Orden de 13 al 50)	\$38.432.605	33,02%	17,03%	%P 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No de Orden de 51 al 59)	\$330.955	0,29%	1,74%	%E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OBRAS VARIAS (No de Orden de 60 al 66)	\$5.001.028	4,30%	2,20%	%P 0,03%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TRANSPORTES (No de Orden 67)	\$9.350.000	8,03%	0,87%	%E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ITEM NO PREVISTOS (No de Orden NP1 A NP17)	\$0	0,00%	29,22%	%P 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 116.376.149	100%	65,82%																							0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 117.170.345	101%	\$76.293.995																							0%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMADA No.5 MES	%	0,53%	1,47%	1,51%	1,45%	2,25%	2,84%	3,74%	4,35%	4,76%	3,36%	4,28%	4,54%	4,77%	4,72%	4,10%	5,04%	5,92%	5,75%	5,80%	14,41%	15,10%
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMADA No. 5 ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$612.893	\$1.707.628	\$1.757.942	\$1.684.695	\$2.617.291	\$3.394.220	\$4.248.575	\$5.067.646	\$5.533.997	\$3.907.676	\$4.979.239	\$5.279.239	\$5.598.861	\$5.494.906	\$4.773.776	\$5.862.314	\$6.890.257	\$6.691.828	\$6.755.595	\$16.757.706	\$17.875.781
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,53%	1,59%	3,50%	4,95%	7,20%	10,04%	13,78%	18,13%	22,89%	26,24%	30,52%	35,06%	39,83%	44,56%	48,60%	53,70%	59,62%	65,37%	71,17%	85,58%	100,682%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$612.893	\$2.320.520	\$4.078.463	\$5.763.157	\$8.380.449	\$11.684.666	\$16.033.243	\$21.100.889	\$26.634.886	\$30.542.762	\$35.522.000	\$40.801.239	\$46.388.100	\$51.853.086	\$56.626.863	\$62.489.177	\$68.379.434	\$76.071.262	\$82.826.857	\$99.594.563	\$117.170.345

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

TIPO DE DIBUJO

PROGRAMADO

EJECUTADO

0,16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

\$

1.124.483.653

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)

\$

11.635.999.121

\$

2.813.943.79

24,18%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO Y HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)

\$

500.000.000

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (A) = A + B + C + D

\$

131.636.631.581

\$

79.665.471.93

60,92%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

\$

850.441.288

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

\$

850.441.288

\$

857.533.04

65,96%

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

\$

132.487.072.869

\$

79.665.471.93

60,13%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (E)

\$

6.000.000,00

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

\$

12.912.259,09

\$

699.516,06

5,42%

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (R)

\$

2.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

153.399.331.758

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')

\$

153.399.331.758

\$

84.012.438,98

54,77%

Aprueba Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Aprueba Firma:

Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
												VERSIÓN 1									
												PÁGINA 1 de 6									
FECHA 08/05/2026 (Día / Mes / Año)																					
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CHOCÓ			ACTA No. 18 ACTA FINAL		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 7.265.868.697,02		MES abr-26						
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024								RUTA 6002-6003						VR. INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153.399.331.758,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 800.000.000,00			
INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 154.199.331.758,00													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 del 31 de enero de 2026		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO								
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																					
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4,00	\$ 530.554	\$ 2.122.216	13,08	\$ 6.939.646,32		\$ -	2,94	\$ 1.559.829							
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4.701,00	\$ 61.916	\$ 291.067.116	171.800,26	\$ 10.637.184.898,16	16.803,65	\$ 1.040.414.793	165.679,77	\$ 10.258.228.639							
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138.412,00	\$ 17.034	\$ 2.357.710.008	307.844,11	\$ 5.243.816.569,74	22.644,66	\$ 385.729.138	256.269,65	\$ 4.365.297.217							
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4.571,00	\$ 22.139	\$ 101.197.369	30.000,00	\$ 664.170.000,00		\$ -	15.075,80	\$ 333.763.136							
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10,00	\$ 20.535	\$ 205.350		\$ -		\$ -		\$ -							
Subtotal								\$ 2.752.302.059		\$ 16.552.111.114,22		\$ 1.426.143.931		\$ 14.958.848.821							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																					
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6.073,00	\$ 196.801	\$ 1.195.172.473	13.413,24	\$ 2.639.739.045,24		\$ -	5.649,20	\$ 1.111.768.209							
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4.237,00	\$ 225.835	\$ 956.862.895	400,00	\$ 90.334.000,00		\$ -		\$ -							
Subtotal								\$ 2.152.035.368		\$ 2.730.073.045,24		\$ -		\$ 1.111.768.209							
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																					
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21.644,00	\$ 4.818	\$ 104.280.792	11.644,00	\$ 56.100.792,00		\$ -		\$ -							
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32.766,00	\$ 2.298	\$ 75.296.268	16.766,00	\$ 38.528.268,00		\$ -		\$ -							
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5,00	\$ 1.306.545	\$ 6.532.725	5,00	\$ 6.532.725,00		\$ -		\$ -							
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711,00	\$ 1.355.295	\$ 963.614.745	361,00	\$ 489.261.495,00		\$ -		\$ -							
Subtotal								\$ 1.149.724.530		\$ 590.423.280,00		\$ -		\$ -							
PAVIMENTO DE CONCRETO																					
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61.250,00	\$ 934.000	\$ 57.207.500.000	5.894,39	\$ 5.505.360.260,00	198,51	\$ 185.408.340	823,45	\$ 769.102.300							
Subtotal								\$ 57.207.500.000		\$ 5.505.360.260,00		\$ 185.408.340		\$ 769.102.300							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																					
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48.390,00	\$ 52.433	\$ 2.537.232.870	7.982,29	\$ 418.535.411,57	574,68	\$ 30.132.196	4.549,48	\$ 238.542.883							
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1.695,00	\$ 86.720	\$ 146.990.400	1.695,00	\$ 146.990.400,00		\$ -	203,36	\$ 17.635.380							
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3.886,00	\$ 26.160	\$ 101.657.760		\$ -		\$ -		\$ -							
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7.406,00	\$ 39.054	\$ 289.233.924	2.000,00	\$ 78.108.000,00	608,45	\$ 23.762.406	1.687,61	\$ 65.907.921							
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	6.606,00	\$ 181.292	\$ 1.197.614.952	3.104,91	\$ 562.895.343,72	166,31	\$ 30.150.673	1.997,56	\$ 362.141.648							
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843,00	\$ 204.068	\$ 172.029.324	1.500,00	\$ 306.102.000,00		\$ -	566,41	\$ 115.586.156							
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3	9.491,00	\$ 250.000	\$ 2.372.750.000		\$ -		\$ -		\$ -							
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	127,00	\$ 3.121.132	\$ 396.383.764	871,34	\$ 2.719.567.156,88	15,00	\$ 46.816.980	105,00	\$ 327.718.860							
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	231,00	\$ 4.939.881	\$ 1.141.112.511		\$ -		\$ -		\$ -							
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	5,00	\$ 10.942.319	\$ 54.711.595		\$ -		\$ -		\$ -							
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11.421,00	\$ 483.389	\$ 5.520.785.769	19.018,44	\$ 9.193.304.693,16	1.656,00	\$ 800.492.184	15.478,00	\$ 7.481.894.942							
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes	m3	204,00	\$ 1.565.552	\$ 319.372.608	100,00	\$ 156.555.200,00	5,50	\$ 8.610.536	5,50	\$ 8.610.536							
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 Mpa	m3	1.736,00	\$ 1.256.503	\$ 2.181.289.208	1.936,00	\$ 2.432.589.808,00	167,83	\$ 210.878.898	1.294,20	\$ 1.626.160.590							
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978,00	\$ 1.186.731	\$ 1.160.622.918	978,00	\$ 1.160.622.918,00	53,58	\$ 63.585.047	746,83	\$ 886.286.313							
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para losa de tablero	m3	457,00	\$ 1.218.318	\$ 556.771.326	457,00	\$ 556.771.326,00		\$ -		\$ -							
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para dados de anclaje	m3	245,00	\$ 1.292.445	\$ 316.649.025	302,20	\$ 390.576.879,00		\$ -	215,46	\$ 278.470.200							

[Handwritten signature]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
												VERSIÓN 1									
												PÁGINA 2 de 6									
FECHA 08/05/2026 (Día / Mes / Año)																					
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CHOCÓ		ACTA No. 18		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 7.265.868.697,02		MES abr-26							
										ACTA FINAL											
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ								RUTA 6002-6003						VR. INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153.399.331.758,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 800.000.000,00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024								INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 154.199.331.758,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 del 31 de enero de 2026		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO								
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	6,00	\$ 1.081.137	\$ 6.486.822	50,00	\$ 54.056.850,00	20,51	\$ 22.174.120	50,00	\$ 54.056.850							
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35,00	\$ 970.637	\$ 33.972.295		\$ -		\$ -		\$ -							
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	3.898,00	\$ 1.191.226	\$ 4.643.398.948	140,00	\$ 166.771.640,00		\$ -		\$ -							
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	846,00	\$ 799.357	\$ 676.256.022	150,00	\$ 119.903.550,00	40,07	\$ 32.030.235	148,07	\$ 118.360.792							
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493.274,00	\$ 8.025	\$ 3.958.523.850	309.197,49	\$ 2.481.309.857,25	24.204,40	\$ 194.240.310	236.625,60	\$ 1.898.920.445							
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102.710,00	\$ 2.185	\$ 224.421.350		\$ -		\$ -		\$ -							
35	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12,00	\$ 1.185.774	\$ 14.229.288	70,00	\$ 83.004.180,00		\$ -		\$ -							
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5.076,00	\$ 22.385	\$ 113.626.260		\$ -		\$ -		\$ -							
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99,00	\$ 940.534	\$ 93.112.866	680,00	\$ 639.563.120,00	75,00	\$ 70.540.050	141,00	\$ 132.615.294							
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93,00	\$ 1.238.648	\$ 115.194.264	80,00	\$ 99.091.840,00		\$ -	10,00	\$ 12.386.480							
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26,00	\$ 1.537.648	\$ 39.978.848		\$ -		\$ -		\$ -							
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8.901,00	\$ 30.311	\$ 269.798.211	8.901,00	\$ 269.798.211,00	196,60	\$ 5.959.143	2.454,87	\$ 74.409.567							
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451,00	\$ 330.611	\$ 149.105.561	20,00	\$ 6.612.220,00		\$ -		\$ -							
42	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	237,00	\$ 1.068.959	\$ 253.343.283		\$ -		\$ -		\$ -							
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408,00	\$ 922.215	\$ 376.263.720		\$ -		\$ -		\$ -							
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1.080,00	\$ 10.550	\$ 11.394.000		\$ -		\$ -		\$ -							
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31.982,00	\$ 12.209	\$ 390.468.238	11.151,70	\$ 136.151.105,30	1.183,00	\$ 14.443.247	7.605,62	\$ 92.857.014							
46	11604		673.1P	Geodrén planar H = 0.5 m	m	15.236,00	\$ 46.855	\$ 713.882.780	2.470,00	\$ 115.731.850,00	49,77	\$ 2.331.973	1.575,47	\$ 73.818.647							
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171,00	\$ 144.750	\$ 24.752.250	200,00	\$ 28.950.000,00		\$ -		\$ -							
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18.234,00	\$ 272.971	\$ 4.977.353.214	23.000,00	\$ 6.278.333.000,00	1.385,00	\$ 378.064.835	21.865,00	\$ 5.968.510.915							
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23.670,00	\$ 30.019	\$ 710.549.730	2.000,00	\$ 60.038.000,00		\$ -		\$ -							
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59.036,00	\$ 36.779	\$ 2.171.285.044	500,00	\$ 18.389.500,00		\$ -		\$ -							
Subtotal								\$ 38.432.604.798		\$ 28.680.324.060		\$ 1.934.212.833		\$ 19.834.891.433							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																					
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	10.497,00	\$ 3.004	\$ 31.532.988	563.257,00	\$ 1.692.024.028,00	151.538,00	\$ 455.220.152	562.481,00	\$ 1.689.692.924							
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52,00	\$ 44.747	\$ 2.326.844	100,00	\$ 4.474.700,00		\$ -		\$ -							
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442,00	\$ 10.292	\$ 4.549.064	14.976,00	\$ 154.132.992,00		\$ -		\$ -							
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93,00	\$ 734.584	\$ 68.316.312	400,00	\$ 293.833.600,00		\$ -	56,00	\$ 41.136.704							
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28,00	\$ 848.204	\$ 23.749.712	60,00	\$ 50.892.240,00		\$ -		\$ -							
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59,00	\$ 681.596	\$ 40.214.164	60,00	\$ 40.895.760,00		\$ -		\$ -							
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534,00	\$ 292.546	\$ 156.219.564	6.000,00	\$ 1.755.276.000,00	140,00	\$ 40.956.440	980,43	\$ 286.820.875							
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16,00	\$ 79.481	\$ 1.271.696	200,00	\$ 15.896.200,00		\$ -		\$ -							

[Handwritten signature]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

3 de 6

FECHA

08/05/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

18

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 7.265.868.697,02

MES

abr-26

ACTA FINAL

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL CO:

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

RU

6002-6003

VR. INICIAL (incluido IVA) (P \$

153.399.331.758,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 800.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 154.199.331.758,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 del 31 de enero de 2026		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
59	11607	740 - 22		Captafaros	u	177,00	\$ 15.674	\$ 2.774.298	700,00	\$ 10.971.800,00	155,00	\$ 2.429.470	272,00	\$ 4.263.328
Subtotal								\$ 330.954.642		\$ 4.018.397.320,00		\$ 498.606.062		\$ 2.021.913.831
OBRAS VARIAS														
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1.499,00	\$ 38.337	\$ 57.467.163	4.486,00	\$ 171.979.782,00	218,00	\$ 8.357.466	417,83	\$ 16.018.349
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74,00	\$ 23.593	\$ 1.745.882	100,00	\$ 2.359.300,00		\$ -		\$ -
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27.489,00	\$ 22.702	\$ 624.055.278	33.218,27	\$ 754.121.165,54		\$ -	21.108,80	\$ 479.211.978
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121.300,00	\$ 17.398	\$ 2.110.377.400	100,00	\$ 1.739.800,00		\$ -		\$ -
64	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	27.489,00	\$ 56.834	\$ 1.562.309.826	44.489,00	\$ 2.528.487.826,00	1.977,06	\$ 112.364.228	34.327,88	\$ 1.950.990.731
65	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2	1.299,00	\$ 96.653	\$ 125.552.247	6.000,00	\$ 579.918.000,00		\$ -		\$ -
66	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónnn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	5.398,00	\$ 96.243	\$ 519.519.714	2.289,00	\$ 220.300.227,00	680,07	\$ 65.451.977	1.229,07	\$ 118.289.384
Subtotal								\$ 5.001.027.510		\$ 4.258.906.100,54		\$ 186.173.671		\$ 2.564.510.442
TRANSPORTES														
67	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.500.000,00	\$ 1.700	\$ 9.350.000.000	1.102.320,60	\$ 1.873.945.020,00	5.983,67	\$ 10.172.239	598.853,67	\$ 1.018.051.239
Subtotal								\$ 9.350.000.000		\$ 1.873.945.020,00		\$ 10.172.239		\$ 1.018.051.239
ITEM NO PREVISTO														
NP1	11601	201-22	201.7	Demolición de Estructuras	m3		\$ 252.373,00		235,00	\$ 59.307.655,00	6,45	\$ 1.627.806	104,13	\$ 26.279.600
NP2	11601	201-22	201.15	Remoción de alcantarillas	m		\$ 118.645,00		200,00	\$ 23.729.000,00		\$ -		\$ -
NP3	11601	201-22	201.16	Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3.981,00		16.000,00	\$ 63.696.000,00		\$ -		\$ -
NP4	11601	211-22	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		\$ 22.185,00		282.900,35	\$ 6.276.144.264,75	12.318,86	\$ 273.293.909	276.120,72	\$ 6.125.738.173
NP5	11602	230-22	230.1	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		\$ 149.567,00		9.337,51	\$ 1.396.583.358,17		\$ -	6.863,68	\$ 1.026.580.027
NP6	11602	310-22	310.1	Conformación de la calzada existente	m2		\$ 2.023,00		119.706,50	\$ 242.166.249,50	6.050,00	\$ 12.239.150	91.030,50	\$ 184.154.702
NP7	11602	311-22	311.1	Afirmado	m3		\$ 159.988,00		3.400,00	\$ 543.959.200,00	341,53	\$ 54.640.702	2.149,16	\$ 343.839.211
NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3		\$ 54.735,00		2.000,00	\$ 109.470.000,00	373,09	\$ 20.421.081	1.653,81	\$ 90.521.292
NP9	11603	630-22	630.1.7	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3		\$ 537.696,00		378,00	\$ 203.249.088,00	152,22	\$ 81.848.085	378,00	\$ 203.249.087
NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2		\$ 104.464,00		59.597,16	\$ 6.225.757.722,24	2.180,83	\$ 227.818.225	20.026,74	\$ 2.092.073.368
NP11	11604	673-22	673.2	Material Granular Drenante	m3		\$ 114.058,00		4.200,00	\$ 479.043.600,00	120,05	\$ 13.692.663	1.473,18	\$ 168.027.964
NP12	11604	900-22	900.3.2	Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km		\$ 1.804,00		3.290.109,16	\$ 5.935.356.924,64	5.178,25	\$ 9.341.563	2.850.290,97	\$ 5.141.924.910
NP13	11604	900-22	900.1.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E		\$ 1.443,00		1.074.804,00	\$ 1.550.942.172,00	158.219,00	\$ 228.310.017	1.045.310,46	\$ 1.508.382.994
NP14	11608		200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 284.383,00		450,00	\$ 127.972.350,00	144,00	\$ 40.951.152	340,00	\$ 96.690.220
NP15	11608		200.1.2P.	Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549.686,00		200,00	\$ 109.937.200,00		\$ -	94,00	\$ 51.670.484
NP16	11601		500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3		\$ 1.313.657,00		2.200,00	\$ 2.890.045.400,00	36,03	\$ 47.331.062	432,13	\$ 567.670.601
NP17	11601		500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3		\$ 1.231.948,00		3.600,00	\$ 4.435.012.800,00		\$ -	3.464,21	\$ 4.267.724.117
NP18	11606		685.1P	Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		\$ 22.328,00		2.500,00	\$ 55.820.000,00		\$ -	343,00	\$ 7.658.504
NP19	11604	633-22	633.1	Tuberia para filtro 15 o 6"	m		\$ 45.493,00		4.000,00	\$ 181.972.000,00		\$ -		\$ -
NP20	11607		700.1P	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	m		\$ 2.492,00		160.000,00	\$ 398.720.000,00	16.000,00	\$ 39.872.000	160.000,00	\$ 398.720.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

4 de 6

FECHA

08/05/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

18

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 7.265.868.697,02

MES

abr-26

ACTA FINAL

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL CO:

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

Ruta 6002-6003

VR. INICIAL (incluido IVA) (A) \$

153.399.331.758,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 800.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 154.199.331.758,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 del 31 de enero de 2026		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	m3		\$ 1.103.903,00		1.800,00	\$ 1.987.025.400,00	175,80	\$ 194.066.147	1.237,75	\$ 1.366.355.938
NP22	11606		630.1P	Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)	m3		\$ 1.440.005,00		4.247,00	\$ 6.115.701.235,00		\$ -	4.247,00	\$ 6.115.701.235
NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457.271,00		400,00	\$ 182.908.400,00		\$ -	323,00	\$ 147.698.533
NP24	14104	650,2		Fabricacion de Estructura Metalica	kg		\$ 22.383,00		305.000,00	\$ 6.826.815.000,00	54.703,60	\$ 1.224.430.679	144.172,70	\$ 3.227.017.545
NP25	11608	650,3		Transporte de estructura metalica	kg		\$ 771,00		305.000,00	\$ 235.155.000,00		\$ -		\$ -
NP26	14104	650,4		Montaje de Estructura Metalica	kg		\$ 9.928,00		305.000,00	\$ 3.028.040.000,00		\$ -		\$ -
NP27	11606	623,4		Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	m		\$ 423.311,00		6.600,00	\$ 2.793.852.600,00	320,00	\$ 135.459.520	1.637,60	\$ 693.214.094
NP28	11606	681-22		Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado	m3		\$ 410.318,00		370,00	\$ 151.817.660,00	120,00	\$ 49.238.160	150,00	\$ 61.547.700
NP29	11604		1P	Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4"	u		\$ 77.726,00		1.200,00	\$ 93.271.200,00	156,00	\$ 12.125.256	1.181,00	\$ 91.794.406
NP30	14103		2P	Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto	m		\$ 143.433,00		100,00	\$ 14.343.300,00		\$ -		\$ -
NP31	14103		3P	Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto	m		\$ 94.072,00		300,00	\$ 28.221.600,00		\$ -	76,20	\$ 7.168.286
NP32	11604		4P	Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa)	m		\$ 389.537,00		500,00	\$ 194.768.500,00	9,00	\$ 3.505.833	9,00	\$ 3.505.833
SUBTOTAL										\$ 52.960.804.879,30		\$ 2.670.213.010,00		\$ 34.014.908.824
ajuste al peso										\$ 85,33				
SUBTOTAL OBRAS										\$ 116.376.148.907		\$ 6.910.930.086,00		\$ 76.293.995.099,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 850.441.088	\$ 856.244.830		\$ 50.502.950,63		\$ 557.533.041,11
	TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)								\$ 117.226.589.995	\$ 118.026.589.995		\$ 6.961.433.036,63		\$ 76.851.528.140,11
	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)								\$ 3.124.483.553	\$ 3.124.483.553				
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ©								\$ 11.635.999.121	\$ 11.635.999.121				\$ 2.813.943.790,99
	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								\$ 500.000.000	\$ 500.000.000				\$ -
	VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D								\$ 132.487.072.669	\$ 133.287.072.669		\$ 6.961.433.036,63		\$ 79.665.471.931,10
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)								\$ 5.042.016.807	\$ 5.042.016.807		\$ 294.117.647,06		\$ 3.065.085.714,06
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F) - 19%								\$ 957.983.193	\$ 957.983.193		\$ 55.882.352,94		\$ 582.366.285,67
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 6.000.000.000	\$ 6.000.000.000		\$ 350.000.000,00		\$ 3.647.451.999,73
	PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)								\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000				\$ -
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)								\$ 12.912.259.089	\$ 12.912.259.089		\$ 63.018.142,96		\$ 699.515.048,10
	VALOR TOTAL								\$ 153.399.331.758	\$ 154.199.331.758		\$ 7.374.451.179,59		\$ 84.012.438.978,93

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU

30%

Utilidad

5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 23.275.229.781,40	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 2.006.243.003,97	29,03%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 13.262.943.071,82	56,98%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 10.012.286.709,58	43,02%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

5 de 6

FECHA

08/05/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

18

VALOR BÁSICO ACTA:

\$7.265.868.697,02

MES

abr-26

ACTA FINAL

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL CO:

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

Ruta 6002-6003

VR. INICIAL (incluido IVA) (A) \$

153.399.331.758,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$800.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$154.199.331.758,00


No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 del 31 de enero de 2026		OBRA EJECUTADA														
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO												
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR											
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO														RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)						RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV					
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																				* Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE.					
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES				G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO		CAPITULOS CONSTRUCTIVOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO					
*OBRA		\$6.910.930.086,00		\$50.502.950,63		\$6.961.433.036,63				E		\$1.426.143.931		\$14.958.848.821		Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601		\$1.748.396.708,00		\$25.946.261.312,00					
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$-		\$-		\$-				SB		\$-		\$1.111.768.209		Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602		\$66.879.852,00		\$2.666.342.149,00					
PROVISIÓN PARA AJUSTES		\$-		\$-		\$-				B		\$-		\$-		Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603		\$287.677.506,00		\$1.062.872.679,00					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		\$-		\$-		\$-				P		\$-		\$-		Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604		\$2.550.876.954,00		\$29.033.589.797,00					
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$-		\$-		\$-				PC		\$185.408.340		\$769.102.300		Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605		\$-		\$-					
*GESTIÓN PREDIAL		\$60.820.963,96		\$2.197.179,00		\$63.018.142,96				EYD		\$1.934.212.833		\$19.834.891.433		Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606		\$362.513.885,00		\$9.852.782.359,00					
*GESTIÓN AMBIENTAL		\$-		\$-		\$-				SYS		\$498.606.062		\$2.021.913.831		Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607		\$546.835.528,00		\$2.436.652.180,00					
*GESTIÓN SOCIAL		\$-		\$-		\$-				OV		\$186.173.671		\$2.564.510.442		Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608		\$51.123.391,00		\$1.166.411.943,00					
*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD		\$-		\$-		\$-				T		\$10.172.239		\$1.018.051.239		Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701		\$-		\$-					
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA		\$294.117.647,06		\$55.882.352,94		\$350.000.000,00				NP		\$2.670.213.010		\$34.014.908.824		Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702		\$-		\$-					
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES				\$-		\$-										Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703		\$-		\$-					
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$7.265.868.697,02		\$108.582.482,57		\$7.374.451.179,59				TOTAL		\$6.910.930.086		\$76.293.995.099		Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704		\$-		\$-					
																Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705		\$-		\$-					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 6 de 6					
FECHA 08/05/2026 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 18 ACTA FINAL		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 7.265.868.697,02				MES abr-26					
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								VR. INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 800.000.000,00			
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 154.199.331.758,00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 del 31 de enero de 2026		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:				\$	7.265.868.697,02							Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706		\$	-	\$	-
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:				\$	5.259.625.693,05							Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707		\$	-	\$	-
												Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708		\$	-	\$	-
												Vías urbanas Estabilización de terreno 11709		\$	-	\$	-
												Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710		\$	-	\$	-
												Transporte elevado Preliminares 14101		\$	-	\$	-
												Transporte elevado Excavación y cimentación 14102		\$	-	\$	-
												Transporte elevado Rellenos 14103		\$	72.195.583,00	\$	902.065.135,00
												Transporte elevado Subestructura 14104		\$	1.224.430.679,00	\$	3.227.017.545,00
												Transporte elevado Superestructura 14105		\$	-	\$	-
												TOTAL ICOCIV		\$	6.910.930.086,00	\$	76.293.995.099,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$5.368.208.175,62 VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS																	
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																	
OBSERVACIONES																	
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																	
Para constancia de lo anterior firman																	
Firma: ING. DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT																	
Firma: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No. 011910073 CPITVC																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	


Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024	2026
								Septiembre	Abril
								Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	126.36	140.93
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	129.28	143.41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	140.08	152.54
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	126.37	139.17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	135.27	152.59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	129.13	141.50
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	142.08	142.67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	124.85	144.25
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	131.26	144.13
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y a	26.65	131.42	142.82
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y a	15.73	136.87	147.90

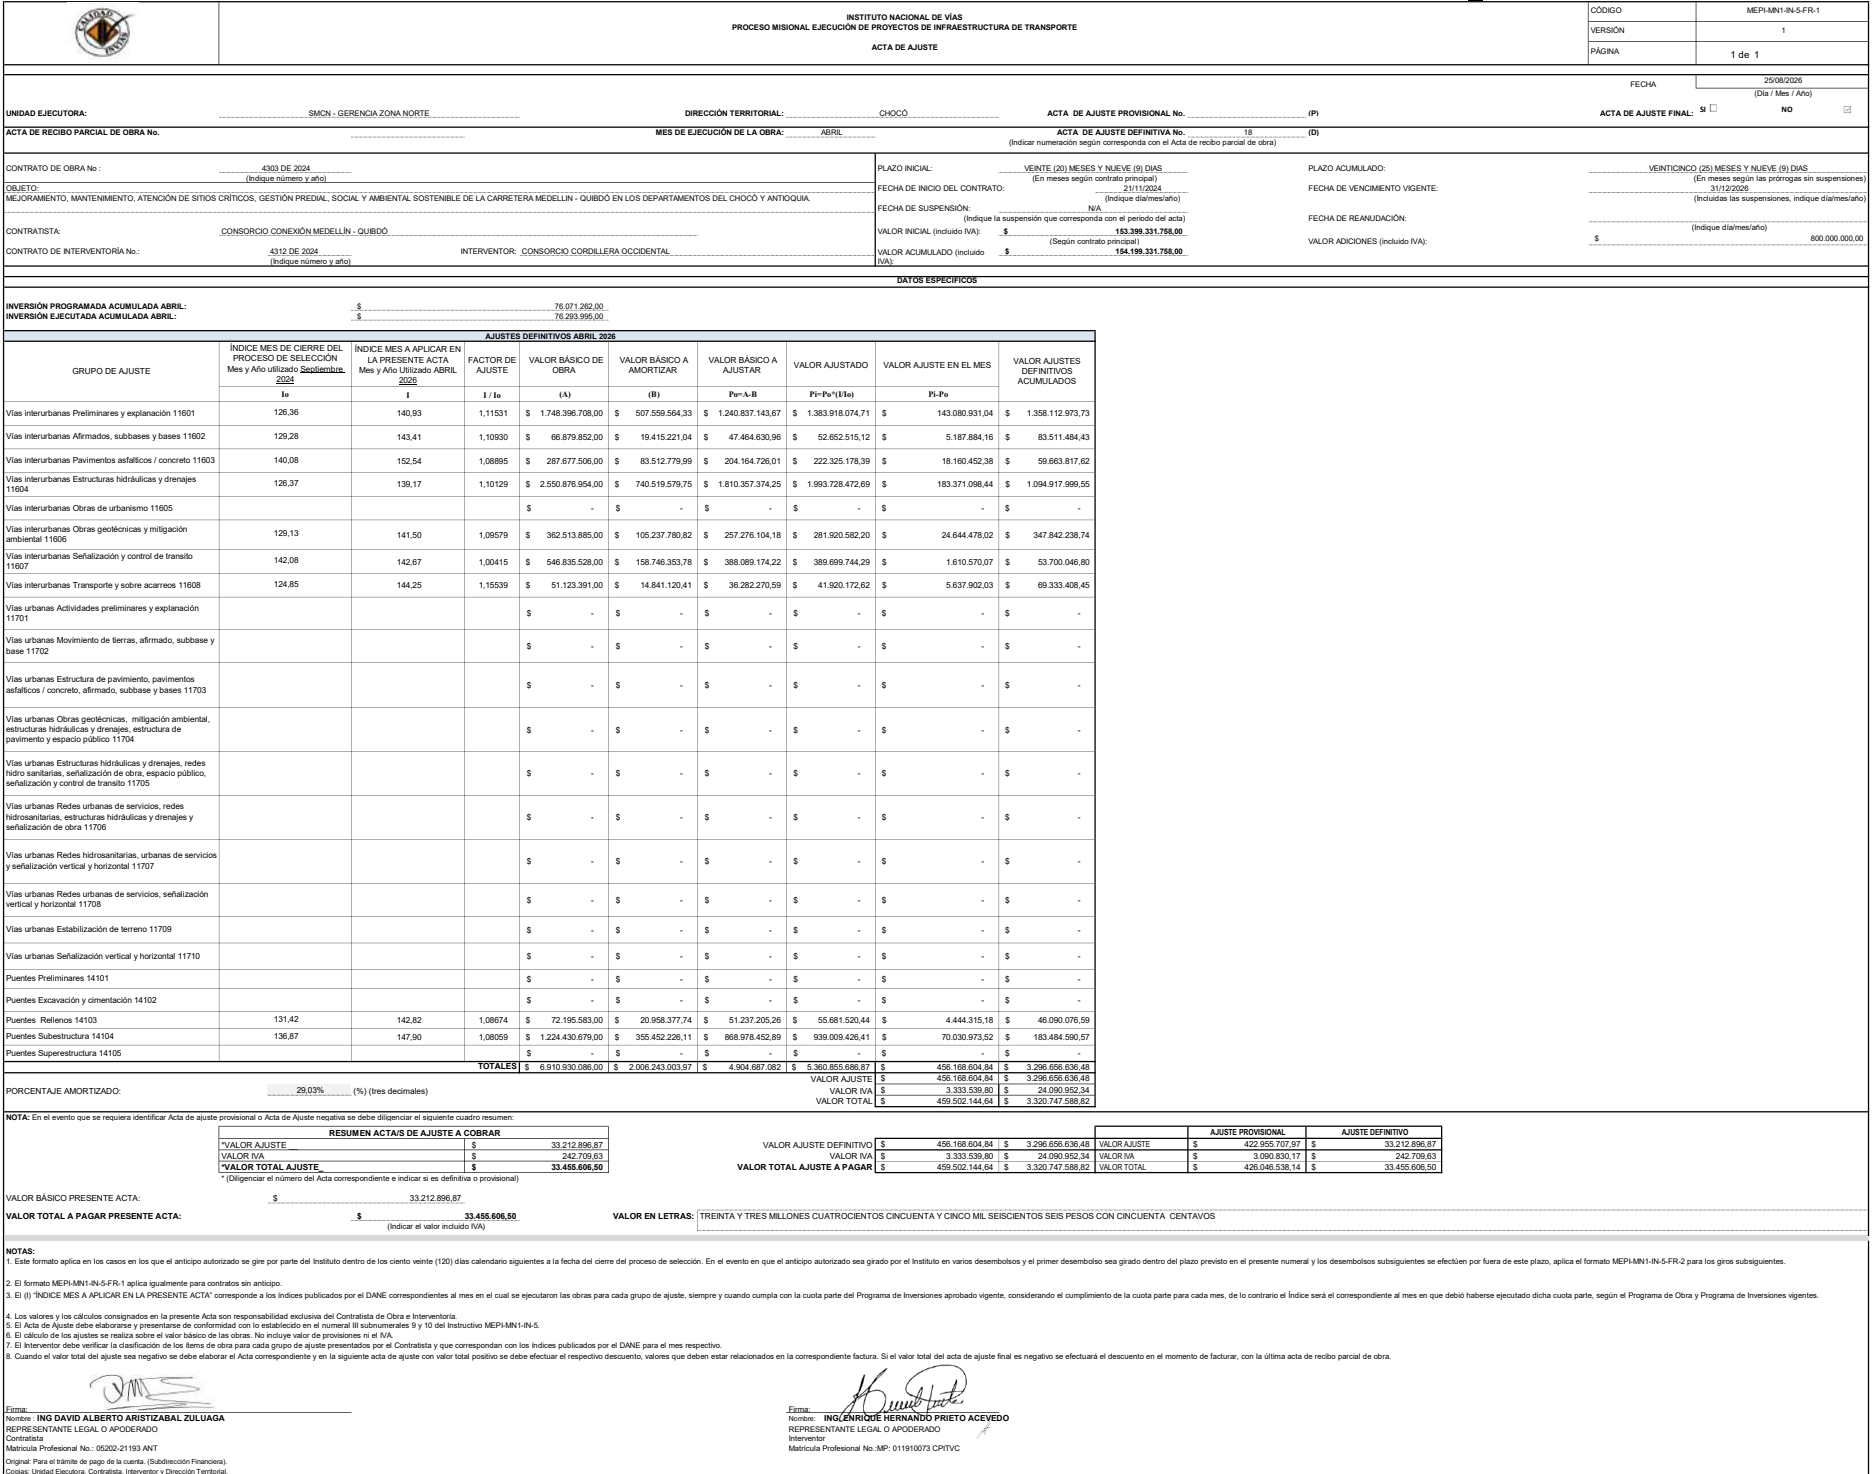

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO VERSION 1 PÁGINA 1 de 2		MEP-MN-IN-15-FR-8	
												FECHA 25/08/2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCHÓ			
CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024												CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO			
MES INFORME MENSUAL: abril - 2026												PROYECTO: CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHÓ Y ANTIOQUIA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024												INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.		VALOR		Saldo del Acta Anterior			
2024		1125924 del 14 de noviembre del 2024		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		11	NACION	PRINCIPAL		\$ 600.000.000,00		\$ -			
2024		1125924 del 14 de noviembre del 2024		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		21	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 2.000.000.000,00		\$ -			
												\$ -			
2025		84525 del 19 de febrero 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		20	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 11.624.000.000,00		\$ -			
2025		84525 del 19 de febrero 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401017-02		20	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 5.084.300.000,00		\$ -			
2025		84525 del 19 de febrero 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401008-02		20	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 60.091.031.758,00		\$ -			
2025		894225 del 27 de Diciembre 2025		C-2401-0600-72-51102D-2401060-02		10	NACION	Adicional No. 1		\$ 800.000.000,00		\$ -			
2026		232426 del 02 de Febrero de 2026		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02		20	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 19.528.000.002,00		\$ -			
2026		232426 del 02 de Febrero de 2026		C-2401-0600-72-51102D-2401008-02		20	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 39.911.000.000,00		\$ 39.673.653.410,41			
2026		232426 del 02 de Febrero de 2026		C-2401-0600-72-51102D-2401017-02		20	PROPIOS	PRINCIPAL		\$ 14.560.999.998,00		\$ 14.560.999.998,00			
TOTAL										\$ 154.199.331.758,00		\$ 54.234.653.408,41			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 154.199.331.758,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
</															

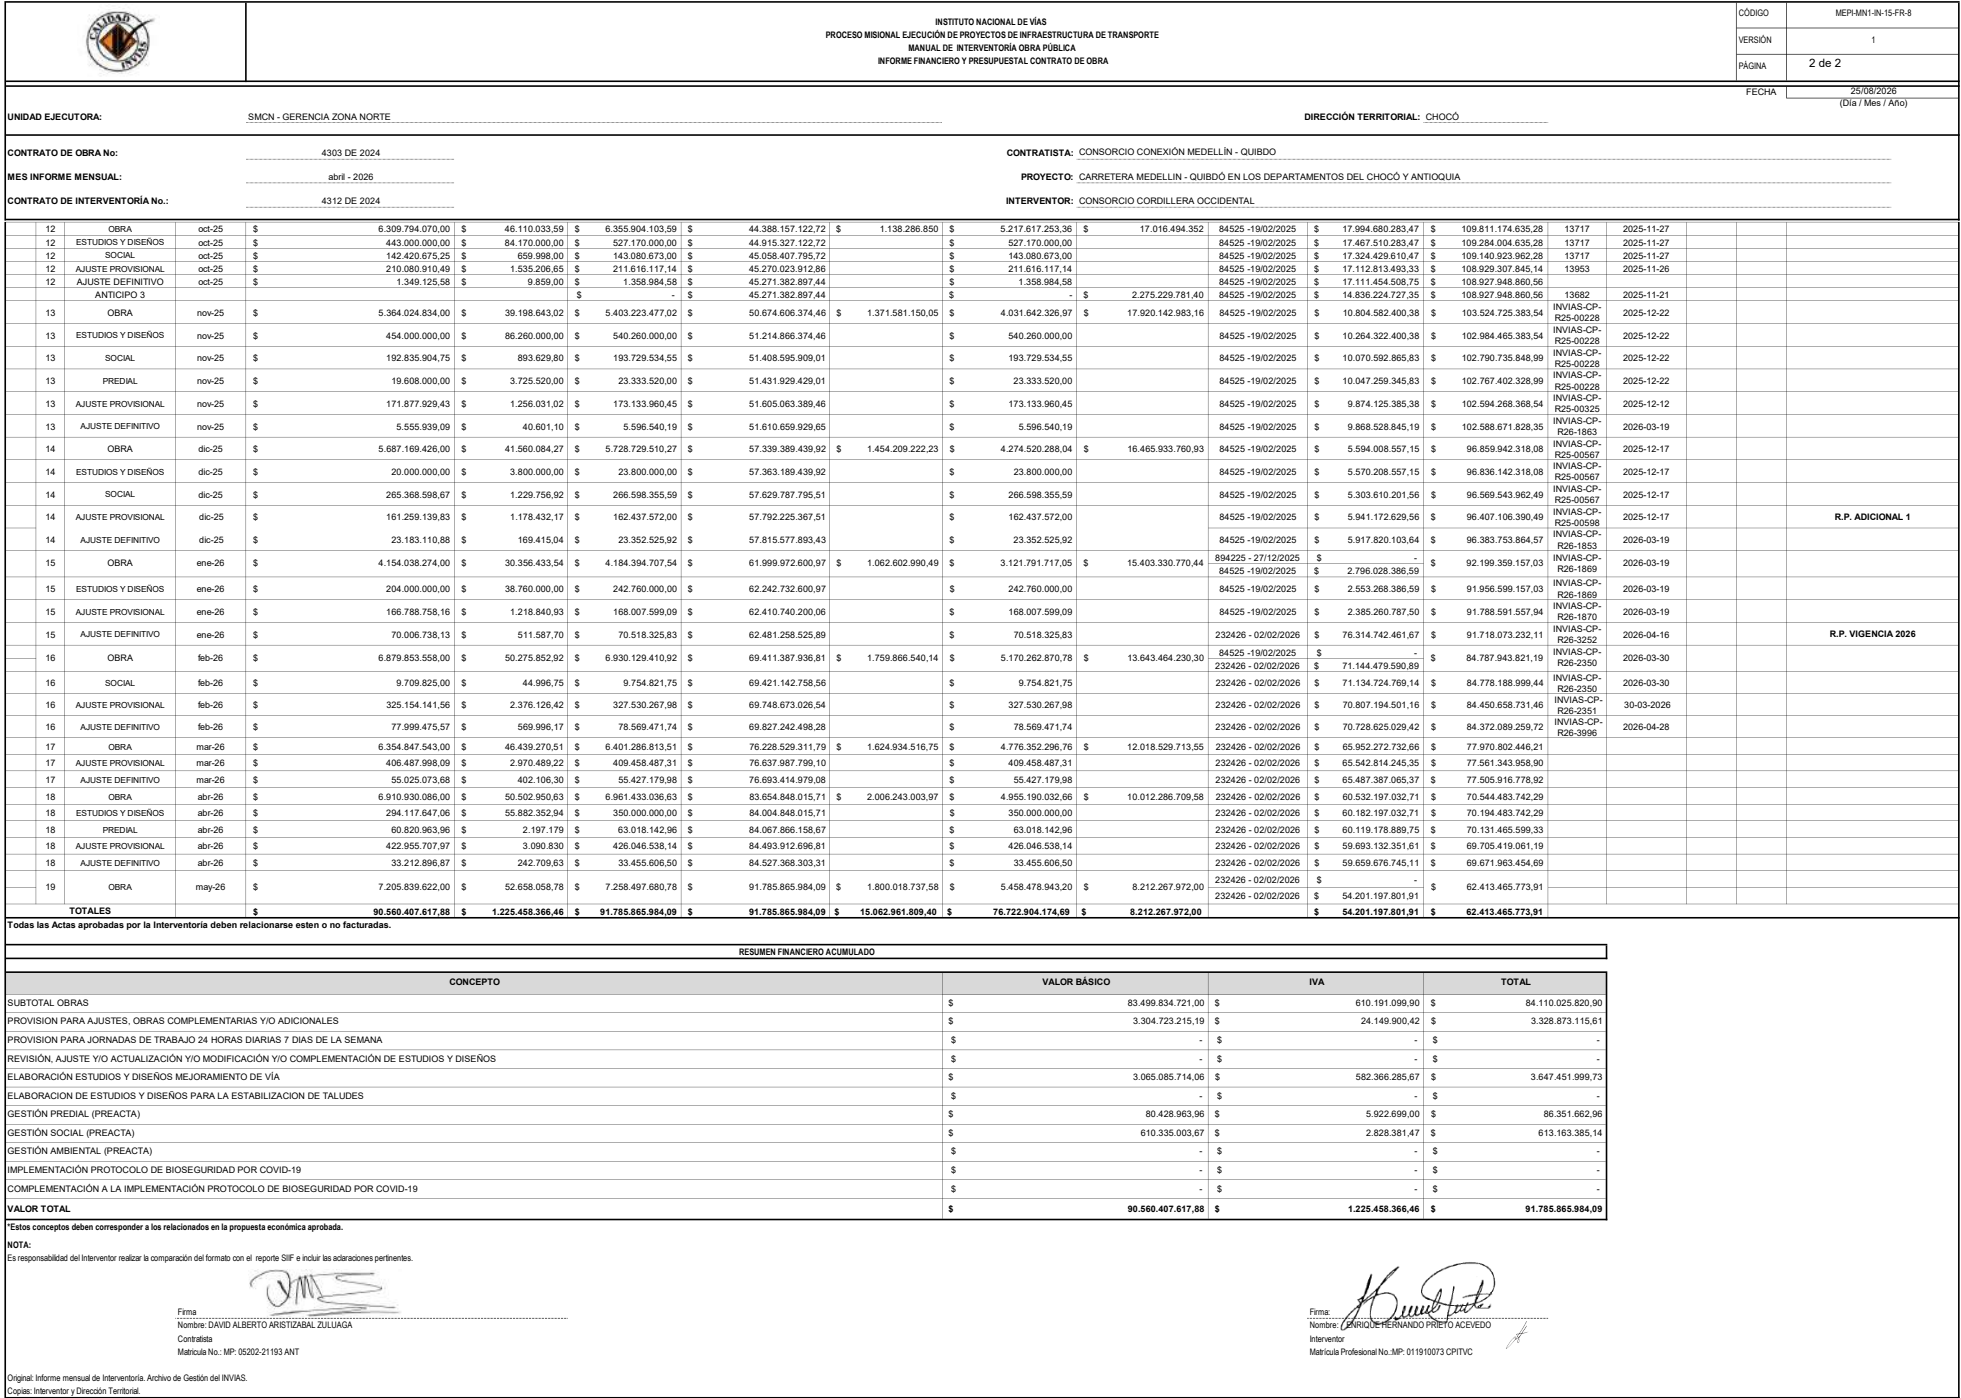



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO CONEXION MEDELLIN QUIBDO** identificada con el número de documento **9018870850** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 12 de noviembre de 2024 con la Cuenta Corriente 408-916245 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO CONEXION MEDELLIN QUIBDO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **28 de agosto de 2026**.

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

**CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024**

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ**, identificado con **NIT: 901.887.085-0**, representado legalmente por el Ing. **DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.619.734, de conformidad con las planillas presentadas, ha realizado los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, para el periodo del 1 al 30 de abril de 2026, derivadas del **CONTRATO No. 4303 DE 2024**, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"**.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día cinco (5) del mes de mayo de 2026.

Atentamente,



ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante Legal
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

**CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ NIT:
901.887.085-0**

Medellín, Mayo 6 de 2026.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ**

CERTIFICA QUE:

EL CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelo todas las obligaciones derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con los dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA

Representante Legal

C.C. 71.619.734





DORALBA CASTAÑO NARANJO

Contadora

T.P. 52875-T

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141241173902			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018870850		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 11	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO		36. Nombre comercial	
37. Sigla		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Antioquia 05		40. Ciudad/Municipio Medellín 001	
41. Dirección principal CR 38 # 26 - 41 oficina 833					
42. Correo electrónico explanan@explanan.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6044440012		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20241101		48. Código 4210	
49. Fecha inicio actividad 20241101		50. Código 1		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7144855					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo		58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-03-16 / 09:09:36AM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO		985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 2 de 5 Hoja 2			
4. Número de formulario		141241173902			
		 (415)7707212489984(8020) 000014124117390 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín	
14. Buzón electrónico		1 1			
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas	
65. Fondos				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
68. Sin personería jurídica		3		67. Sociedades y organismos extranjeros	
				70. Beneficio	
				1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número					
73. Fecha		2 0 2 4 0 9 1 7			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		9 8			
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento		0 5			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde		2 0 2 4 0 9 1 7			
81. Hasta		2 0 2 7 0 7 3 1			
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado	
91. Número de Identificación Tributaria (NIT)		92. DV			
1					
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141241173902			
				 (415)7707212489984(8020) 000014124117390 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DAVID		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ARCILA		106. Primer nombre MATEO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141241173902



(415)7707212489984(8020) 000014124117390 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 8 7 0 8 5 0

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social EXPLANAN S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		9 0 2 0 2 4 0 9 1 7		

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	9 0 1 7 0 4 7 7 5	1	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		1 0 2 0 2 4 0 9 1 7		


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141241173902			
				 (415)7707212489984(8020) 000014124117390 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		2 1 6 6 4 8 1 6		9		5 2 8 7 5 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	CASTAÑO		NARANJO		MARIA		DORALBA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 4 0 1 0 1							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141254521310	
(415)7707212489984(8020) 000014125452131 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín	
14. Buzón electrónico 1 1					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
EXPLANAN S.A.S					
36. Nombre comercial					
EXPLANAN					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Antioquia		Medellín	
1 6 9		0 5		0 0 1	
41. Dirección principal					
CR 38 26 41 OF 833					
42. Correo electrónico explanan@explanan.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
0 5 0 0 1		6 0 4 4 4 0 0 1 2		3 1 1 7 1 9 7 8 4 3	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 2 9 0		1 9 7 1, 1 0, 2 7		4 2 1 0	
				1 9 7 1, 1 0, 2 7	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
		7 7 3 0		7 1 1 2	
52. Número establecimientos					
1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2026-05-29 / 12:05:59PM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO					
985. Cargo Representante legal Certificado					


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 7 Hoja 2		
4. Número de formulario			141254521310		
			 (415)7707212489984(8020) 000014125452131 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5	Impuestos de Medellín		1 1
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 5		0 1	
72. Número		4 8 9 9		4 5	
73. Fecha		1 9 7 1, 1 0, 2 7		2 0 1 8, 1 2, 1 9	
74. Número de notaría		4			
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		1 9 7 1, 1 1, 0 3		2 0 1 8, 1 2, 2 8	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2	
78. Departamento		0 5		0 5	
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 2 1	
Vigencia					
80. Desde		1 9 7 1, 1 0, 2 7		1 9 7 1, 1 0, 2 7	
81. Hasta		2 0 9 9, 1 2, 3 1		2 0 9 9, 1 2, 3 1	
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	2 1	2 0 1 8, 1 2, 1 9		-	
2	8 0	2 0 1 9, 0 1, 0 9		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 7 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141254521310			
				 (415)7707212489984(8020) 000014125452131 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DAVID		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DIEGO		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141254521310



(415)7707212489984(8020) 000014125452131 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DAVID	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 7 2 8 3 2 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 3 0 9 1 1	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 8 5 9 6 4 8 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido RICARDO	117. Primer nombre NORBEY	118. Otros nombres DE JESUS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 4 1 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 8 5 4 5 0 4 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARBELAEZ	116. Segundo apellido ROJAS	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres EDUARDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 4 1 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141254521310



(415)7707212489984(8020) 000014125452131 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ARCILA	117. Primer nombre MATEO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 1 2, 1 9	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 1 7 2 2 3 2 2 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ISAZA	117. Primer nombre ESTEBAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 1 2, 1 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 1 7 2 2 3 2 2 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ISAZA	117. Primer nombre MIGUEL	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 1 2, 1 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 6 4 4 9 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido LA ROCHE	116. Segundo apellido ARISTIZABAL	117. Primer nombre DANIELA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 1 2, 1 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 3 5 2 8 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ARCILA	117. Primer nombre JULIAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 1 2, 1 9	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141254521310			
 (415)7707212489984(8020) 000014125452131 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		9 8 5 5 5 0 1 0		7 3 0 8 4 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	JARAMILLO		VELEZ		RUBEN		DARIO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 0 8 1 1 1 4				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 8 0 1 9 5 8 4		2 6 5 4 8 0		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	VILLEGAS		MONCADA		ANGELICA		JOHANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 2 0 7				
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		2 1 6 6 4 8 1 6		9 5 2 8 7 5 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	CASTAÑO		NARANJO		MARIA		DORALBA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 1 8 0 1 0 1				


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141254521310			
				 (415)7707212489984(8020) 000014125452131 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0							
162. Nombre del establecimiento EXPLANAN							
163. Departamento Antioquia 0 5							
164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1							
165. Dirección CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS							
166. Número de matrícula mercantil 2 1 0 0 0 5 6 5 0 2							
167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 7 3 0 4 2 7							
168. Teléfono 6 0 4 4 4 4 0 0 1 2							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141244303935	
(415)7707212489984(8020) 000014124430393 5					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico	
				1 1	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Antioquia		Medellín	
1 6 9		0 5		0 0 1	
41. Dirección principal					
CL 26 38 26 OF 1125 BL 26					
42. Correo electrónico					
ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		6 0 4 4 4 0 0 1 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 2 1 0		2 0 2 3 0 4 1 9		4 2 9 0	
				2 0 2 1 0 5 0 5	
				50. Código	
				1 2	
				7 7 3 0 7 1 1 2	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
				0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código					
5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exógena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos					
SI NO X					
60. No. de Folios:					
0					
61. Fecha					
2026-04-06 / 05:05:12PM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre					
ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
985. Cargo					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141244303935



(415)7707212489984(8020) 000014124430393 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 0 4 7 7 5 1

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
