

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA-
No. 312-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-
2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E
INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8**

INFORME SEMANAL No.22 DE INTERVENTORIA

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

**CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**


BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

PROGRAMADO VS EJECUTADO

Fecha	Ejecutado Acum.	Programado Acum.	Balance
20/12/2023	7.88%	77.88%	-70.00%
07/02/2023	10.02%	44.99%	-34.97%
20/03/2023	15.63%	18.04%	-2.41%
07/02/2023	10.15%	12.14%	-1.99%
20/03/2023	24.32%	27.37%	-3.05%
07/02/2023	30.48%	33.81%	-3.33%

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL					INFORME SEMANAL No. 22												
Página: 1 de					DIA		1		MES		8		AÑO		2024		
SEMANA N°			22		9 DE SEPTIEMBRE 2024										15 DE SEPTIEMBRE 2024		
Semana	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Fecha	28/02/2024	6/03/2024	SUSPENSIÓN No. 1 PROGRAMACIÓN AJUSTADA		7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	1/09/2024	8/09/2024	15/09/2024		
Proor. Semanal	26.38%	17.11%		1.58%	2.36%	2.61%	2.41%	2.11%	1.99%	2.17%	3.05%	3.11%	3.32%	3.22%			
Programado Acum.	77.88%	94.99%		10.66%	13.02%	15.63%	18.04%	20.15%	22.14%	24.32%	27.37%	30.48%	33.81%	37.02%			
Ejec. Semanal	7.43%	2.75%		9.03%	2.22%	2.31%	0.29%	2.05%	1.31%	1.04%	1.43%	3.19%	3.18%	9.75%			
Ejecutado Acum.	9.73%	12.48%		19.10%	21.32%	23.63%	23.92%	25.97%	27.28%	28.32%	29.75%	32.94%	36.12%	45.87%			
Balance	-68.15%	-82.51%			8.44%	8.30%	8.00%	5.88%	5.82%	5.14%	4.00%	2.38%	2.46%	2.31%	8.84%		
VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES																	
NOVEDADES																	
CALIDAD				MATERIALES												EQUIPOS	
ASPECTOS DE OBRA CIVIL		ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA															
PROGRAMACION AJUSTADA		El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.															
OBRA CIVIL		Se realizan actividades de estuco y primera mano de pintura en el area de sotano se realizó cambio de bajantes y resanes en la fachada oriental sobre el 3 nivel, debido a humedades presentadas por una canal metalica existe.															
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.		A la fecha no se ha recibido respuesta por parte del diseñador del proyecto para dar solución al desarrollo del cuarto de bombas del tanque de almacenamiento															
MAMPOSTERIA		El contratista de obra se encuentra a la espera de la ubicación de la puerta de acceso y el elemento de ingreso al cuarto de bombas para poder dar inicio con el levantamiento de la mamposteria.															
REDES ELECTRICAS		Se evidencia poco personal de la red electrica. Se solicita al contratista el incremento del personal para dar continuidad a las actividades de conexiones electricas.															
REDES HIDROSANITARIAS		El contratista de obra presenta un avance de instalacion de las redes hidrosanitarias en un 95%.															
SISTEMA RCI		El contratista de obra programa las puebas de la red para la semana 23-24															
CIELO RASO		El contratista de obra cubre son lamina de dry wall el cielo del area bajo mezaninne y vestibulo- falta acabado El contratista de obra continua con la estructuración del cielo raso del sotano y del baño de hombres 1er piso															
FACHADAS		A la fecha el enchape de fachadas no ha ingresado a campo A la fecha no se ha tenido respuesta por parte del diseñador del proyecto para el desarrollo de la rampa de la fachada oriental.															
ENCHAPES		El contratista de obra da inicio a la instalacion de guarda escobas en enchape en area de cafetines y da inicio a la pulida del area. Se realiza el suministro del enchape de granito blanco para el area del 3 nivel- cuarto de sonido y cuartos de almacenamiento norte y sur. El contratista de obra da inicio a la instalacion del enchape de muros en el area de baños de mujeres del 1er nivel. Se solicita al contratista de obra intervenir las areas de los baños de los camerinos. Mediante comité de obra el contratista de obra solicito realizar la instalacion de ceramica antideslizante en las areas de baño de los camerino y no la losa de granito estipulada ya que el espesor del enchape le daría una mayor altura al espacio. La interventoria esta de acuerdo y solicita la muestra (blanca con beta)															
PINTURA		El contratista da inicio a actividades de estuco y primera mano de pintura en areas de sotano y muro de vestibulo															
SISTEMA ACUSTICO		Se continua con la instalación de la estructura de soporte para el panel acustico del muro del costado sur. Ingresa aislante a campo (frescasas) En conjunto con el contratista de obra se realiza visita a planta de producción del sistema acustico; la interventoria evidencia el avance de produccion de un 20%. De la paneleria tanto de muros como de cielo raso. El subcontratista informa que en la semana 23 llegaria a campo el primer paquete de producción.															
TAPETE		Se realiza visita técnica a bodega de almacenamiento del proveedor del tapete y se verifica el suministro total de insumo. Se verifica especificacion y tono seleccionado. El insumo debe llegar a campo en la tercera semana del mes de octubre.															
SILLAS		el contratista de obra No ha presentado el replanteo de la ubicación de las sillas para su aprobación. Se aclara que ya se verifico in sitio y se acordo la modulación y la espacialidad de las sillas. El contratista de obra presenta muestra de luz led para piso. La interventoria la aprueba. se realizó visita a la planta de producción de la silleteria del auditorio donde se evidencio que en el proceso de inyeccion de la espuma cuentan con un avance del 80%, el avance de ensamblado de estructura metalica es del 90% y la confeccion del tapizado de la sillas se encuentran en un 50%.															
EQUIPOS ESPECIALES		El contratista de obra notifica a la interventoria de la ruta de trasporte de los equipos. Llegada a sitio en la ultima semana del mes de noviembre.															
ORDEN Y ASEO		Se evidencia que el contratista de obra realiza levantamiento de escombros y limpieza general del teatro.															
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA															
Gestión de comunicaciones		1. Se realiza comite de obra No. 21 2. se entrega informe semanal No. 21 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexon a fibra optica, y la respuesta de la ubicación de la puerta del cuarto de bombas y sus acabados. 4. se espera respuesta de diseño de rampa de acceso-costado oriental.															
Interventoria- Listado de personal		El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales															
Contratista-Listado de personal		La interventoria realiza revision del personal administrativo y operativos los cuales pisan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia. La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de obra civil para dar avance a las ejecuciones de acabados de piso, cielo raso y enchapes y pintura.															

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL No. 22					
Página: 1 de				DIA	1	MES	8	AÑO	2024
SEMANA N°	22	DEL	9 DE SEPTIEMBRE 2024				AL	15 DE SEPTIEMBRE 2024	
ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA								
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de \$1.659.412.087,39, desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago.								
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de \$917.126.075,82, el 5 de septiembre del año en curso. Con corte a semana 20- al 2 de septiembre								
COMPRA DE INSUMOS	El contratista de obra emite informe de plan de manejo de anticipo del mes de septiembre								
<div><div></div><div>REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA</div></div>									

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL</div>				INFORME SEMANAL No. 22			
Código:		Versión:		Fecha de Emisión: 9 DE JULIO		Página:	
SEMANA N°		22		DEL		9 DE SEPTIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :		9/12/2020		FECHA TERMINO :		3/02/2021	
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023							
INTERVENTOR		INPLAYCO SAS - BIC		NIT O C.C.		860524168 8	
CONTRATISTA		CONSORCIO CENAC TEATRO 2023		NIT O C.C.		901.759.617-0	
				CONTRATO N°		314	
				CONTRATO N°		272	
VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
UBICACIÓN: VESTIBULO		UBICACIÓN: BAÑOS MUJERES 1ER PISO		UBICACIÓN: ESCALERA DE EMERGENCIA			
ACTIVIDAD: ESTUCO Y 1 MANO DE PINTURA		ACTIVIDAD: INICIO DE INSTALACION DE ENCHAPE DE MURO		ACTIVIDAD: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS			
							
UBICACIÓN: ACCESO A TEATRO FACHADA ORIENTAL		UBICACIÓN: BAÑO MUJERES 1ER PISO		UBICACIÓN: BAÑO MUJERES 1ER PISO			
ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONCRETO		ACTIVIDAD: INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO		ACTIVIDAD: FUNDIDA DE MEDIA CAÑA			
							
UBICACIÓN: CAFETIN SUR		UBICACIÓN: BAÑO CAMERINO SUR		UBICACIÓN: EXTERIOR-NORTE			
ACTIVIDAD: CONEXION RCI		ACTIVIDAD: REGATAS-CONEXION ELECTRICA		ACTIVIDAD: DEMOLICION ESCALERAS EXISTENTES			
							
UBICACIÓN: VISITA A PLANTA DE PRODUCCION-MADRID		UBICACIÓN: VISITA A PLANTA DE PRODUCCIÓN		UBICACIÓN: VISITA A BODEGA DE ALMACENAMIENTO-COTA			
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN PANEL ACUSTICO DE MURO		ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN PANEL ACUSTICO DE CIELO		ACTIVIDAD: TAPETE IMPORTADO- 100% EN SITIO			
							
UBICACIÓN: VISITA PLANTA DE PRODUCCION		UBICACIÓN: AUDITORIO		UBICACIÓN: SOTANO			
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE SILETERIA-AVANCE DEL 70%		ACTIVIDAD: INSTALACION DE PERFILES LATERALES PARA MURO Y SOPORTE PARA CIELO RASO		ACTIVIDAD: ESTUCO Y 1RA MANO DE INTURA			

					
UBICACIÓN:	DISTRIBUIDOR 2 PISO	UBICACIÓN:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UBICACIÓN:	BAÑO MIXTO 2 PISO
ACTIVIDAD	FUNDIDA DE PISO GRANITO BLANCO	ACTIVIDAD	RESTRICTORES	ACTIVIDAD	FUNDIDA DE MEDIA CAÑA

INFORME SEMANAL No. 22

**CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL N°22						
Página: 1 de				DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023	
SEMANA N°		21	DEL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024			AL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA INICIO :		20/12/2023		FECHA TERMINO :		15/12/2024				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA										
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023								
INTERVENTOR		INPLAYCO SAS - BIC			NIT O.C.C.		860524168 8		CONTRATO N°	314
CONTRATISTA		CONSORCIO CENAC TEATRO 2023			NIT O.C.C.		901.759.617-0		CONTRATO N°	272
II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL										
CONTROL DE PROGRAMACIÓN										
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS					ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO					
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA			PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES		MOTIVOS			
P-1. PRELIMINARES			81,00%	97,00%	MANTEIMIENTO DE MONUMENTO		ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO			
C-2 CIMIENTOS			100%	100,00%						
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			98%	99,00%						
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS			0%	0,00%						
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			38%	92,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA					
M-6 MAMPOSTERÍA			83%	100,00%						
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS			100%	100,00%						
H-7B RED CONTRAINCENDIOS			92%	95,00%						
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS			38%	70,00%						
PR-9 PAÑETES Y RESANES			100%	100,00%						
CB-10 CUBIERTAS			62%	75,00%	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS EN CUBIERTA INCLUYE TRABAJOS DE CANAL Y SELLO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA.					
CR-11 CIELORASOS			0%	35,00%						
PA-12 PISOS - ACABADOS			7%	76,00%						
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS			35%	36,00%	MANTEIMIENTO GENERAL DE MURO					
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS			0%	0,00%						
AS-15 APARATOS SANITARIOS			0%	5,00%						
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO			57%	40,00%						

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL N°22																			
Página: 1 de		DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023																
SEMANA N°	21	DEL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		AL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024																	
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO		0%	0,00%																				
CE-18 CERRADURAS		0%	0,00%																				
PI-19 PINTURA		2%	3,00%																				
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES		45%	60,00%																				
OE-21 OBRAS EXTERIORES		0%	0,00%																				
AG-22 ASEO GENERAL		0%	0,00%																				
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS		0%	0,00%																				
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO		5%	0,00%		CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS T	POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONECCION DE LA FIBRA																	
TOTALES		38%	47,32%																				
III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO																							
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.		VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO ANTIPO	VR. POR EJECUTAR DEL ANTIPO	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO																
		6.376.826.519,54	2.742.213.368,36	3.634.613.151,18	SEMANA 22	\$ 251.571.206,24	\$ 762.261.759,51																
Costo directo		5.237.209.690,82		5.237.209.690,82																			
VALOR CONTRATO ADICION No. 1		\$ 1.444.120.781,24	\$ 7.820.947.300,78	ACUMULADO	\$ 2.895.525.525,24	\$ 3.587.212.029,81																	
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))		NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 8,85 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICION			PORCENTAJE	37,02%	45,87%																
					ADELANTO	8,85%																	
IV. PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA				V. ESTADO DEL TIEMPO																			
PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD	PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS SI ☐ NO ☒															
DIRECTOR DE OBRA	1	ENCARGADO	5		9/09/2024	SOLEADO	SOLEADO																
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	8		10/09/2024	SOLEADO	SOLEADO																
SST	1	AYUDANTE	20		11/09/2024	SOLEADO	SOLEADO																
AMBIENTAL	1	FABRICACIÓN	12		12/09/2024	SOLEADO	SOLEADO																
ALMACENISTA	1				13/09/2024	SOLEADO	SOLEADO																
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	45		14/09/2024	SOLEADO	SOLEADO																
					15/09/2024	SOLEADO	SOLEADO																
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: 70%																							
VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)																							
<div>PROGRAMADO VS EJECUTADO</div> <table><thead><tr><th>Fecha</th><th>Ejecutado Acum.</th><th>Programado Acum.</th><th>Balance</th></tr></thead><tbody><tr><td>20/12/2023</td><td>37,02%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15/09/2024</td><td></td><td>45,87%</td><td></td></tr><tr><td>15/12/2024</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Fecha	Ejecutado Acum.	Programado Acum.	Balance	20/12/2023	37,02%			15/09/2024		45,87%		15/12/2024			
Fecha	Ejecutado Acum.	Programado Acum.	Balance																				
20/12/2023	37,02%																						
15/09/2024		45,87%																					
15/12/2024																							

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL N°22										
Página: 1 de				DIA	15	MES	DICIEMBRE			AÑO	2023			
SEMANA N°		21	DEL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024					AL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Semana	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Fecha	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	1/09/2024	8/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	6/10/2024	13/10/2024	
Progr. Semanal	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%	
Programado Acum.	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,33%	30,48%	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%	
Ejec. Semanal	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%	1,43%	3,19%	3,18%	9,75%	0,00%	0,00%	0,00%	
Ejecutado Acum.	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,28%	28,32%	29,75%	32,94%	36,12%	45,87%	0,00%	0,00%	0,00%	
Balance	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,14%	4,00%	2,42%	2,46%	2,31%	8,85%	-40,43%	-44,54%	-49,99%	
VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES														
1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 37,02 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 45,87% esto para un adelanto del 8,85%														
2-las actividades de esta semana son :Se realiza visita en la fabricas de los paneles acustico y cielo raso acustico, se realiza visita en la bodega donde esta almacenada la alfombra, se hace recorrido para verificación de las sillas del auditorio, producción y llegada a obra puertas de emergencia del teatro, en producción las cabinas en acero inoxidable, se realiza resane de regatas, se comienza aplicar estuco y primera mano de pintura en sotano, se continua con las instalación de las velas de la red contraincendios, se continua con la instalación de tubería eléctricas, se continua con la estructuración de los muros acustico y cielo raso acustico, hacen visita lo del sonido para verificar las conexiones sugieren que el sonido contratado no es eficiente. se realiza dilataciones en las terrazas.														
3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitiría al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envíen las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , 18 , 19 , 20 y 21 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas.														
4- hasta la fecha no tenemos los informes bimensuale y informes semanales aprobados por la interventoría, se le pide mas celeridad en a las aprobaciones de los informes														
REALIZÓ  FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA														




Código:			Versión:		Fecha de Emisión:	
SEMANA N°	22	DEL	09/09/2024		AL	15/09/2024
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	15/12/2024		
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA						
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023					
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC			NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N° 314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023			NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N° 272


VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: LOBBY PRIMER PISO
COMENTARIOS: ESTUCO Y PINTURA

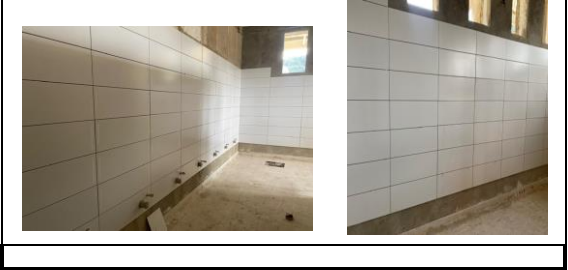

UBICACIÓN: BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO
COMENTARIOS: ENCHAPE DE MUROS




UBICACIÓN: VISITA A LA BODEGA DE ALFOMBRA
COMENTARIOS: ALFOMBRA PARA AUDITORIO



UBICACIÓN: ESCALERA DE EMERGENCIA
COMENTARIOS: ESCALERA DE EMERGENCIA



UBICACIÓN: TERRAZA DEL TERCER PISO
COMENTARIOS: ARREGLO DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA

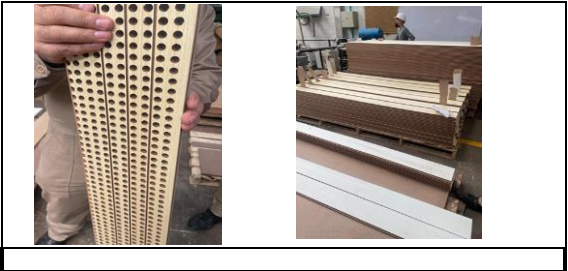


UBICACIÓN:
COMENTARIOS:



UBICACIÓN:	VISITA A LA FABRICA DE LAS SILLAS
COMENTARIOS:	AUDITORIO



UBICACIÓN:	FUNDIDA DE PISO CON GRANITO
COMENTARIOS:	SEGUNDO PISO

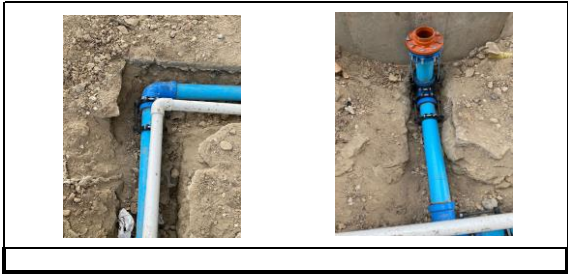

UBICACIÓN:	RETRINCTORES
COMENTARIOS:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO



UBICACIÓN:	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA
COMENTARIOS:	BAÑOS DE SEGUNDO PISO

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL			
Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:	
SEMANA N°		DEL		9 DE SEPTIEMBRE		AL	
FECHA INICIO :		2012/2023		FECHA TÉRMINO :		10/12/2024	
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"							
INTERVENTOR		INPLAYCO SAS		NIT O.C.C.		860 524 16-8	
CONTRATISTA		CONSORCIO CENAC TEATRO 2023		NIT O.C.C.		901 759 617 - 0	
				CONTRATO N°		314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	
				CONTRATO N°		272-CENACINGENIEROS-2023	
VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO AMBIENTAL							



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ASEO BAÑOS



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO OBRA



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO ÁREAS DE TRABAJO



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN



UBICACIÓN:	COSTADO SUROCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			INFORME SEMANAL		
Código:		Versión:		Página:	
SEMANA N°		DEL		9 DE SEPTIEMBRE	
FECHA INICIO :		FECHA TÉRMINO :		10/12/2024	
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"					
INTERVENTOR		INPLAYCO SAS		CONTRATO N°	
CONTRATISTA		CONSORCIO CENAC TEATRO 2023		CONTRATO N°	
		NIT O C.C.		860 524 16-8	
		NIT O C.C.		901 759 617 - 0	
				314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	
				272-CENANCINGENIEROS-2023	

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TIEATRO
COMENTARIOS:	CHARLAS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS




UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	USO CORRECTO DE EPP



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS

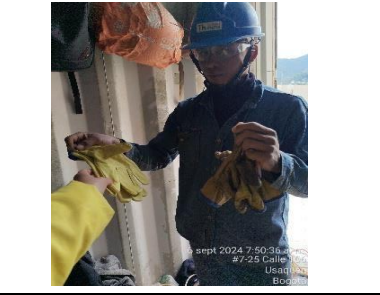

UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	REPOSICION DE EPP

ANEXO No. 4 BITACORA

Personal Interventoría

Director Interventoría, Residente Interventoría, Residente obra

En recorrido de obra se evidenciaron los trabajos en alturas y en cliente del subcontratista Yotex y HKS Ingeniería se recibe acompañamiento a personal de la UPM. Se realiza visita por parte de la Supervisión del contrato y el Arq. Camilo (Diseñador-Consultor) quien mediante recorrido informa lo siguiente: 1. La puerta del cuarto de bombas quedará en la fachada Norte y se deberá realizar una escalera en 2 secciones con descanso - (metálica o en concreto); el acabado tanto del Tanque como el cuarto de bombas será en fachada y la altura será de 2.10/2.30 aprox. 2. Aprueba la instalación del panel acústico en la parte superior en las fachadas Norte y Sur en un ángulo de 45° para cubrir los pes de Amigos de la estructura de Cubierta. 3. El cielo raso de vestíbulo quedará igual que el diseño inicial. 4. La rampa de Acceso será en 2 secciones con bordillo central y acabas en el mismo revestimiento de fachada. El Arq. Camilo remite Dorsal de Tanque y rampa para su desarrollo.

Trabajo 2/ Interventoría
Alfredo R.S.

9.09.24

Clasificación: Solitario

Personal Contratista

Residente de obra, Residente obra, Almacenero, Maestro
Ingeniero obra (3) Operativos 15

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente obra

Se recibe envío de ICD para disposición final, se continúan actividades de trabajo en alturas por parte del contratista Yotex y HKS Ingeniería, se realiza jornada de asco en las diferentes obras

- El personal de Acústica realiza montaje de muestra de panel de cielo raso para su revisión. - El panel de muro no cumple con la especificación se debe cambiar la muestra para revisar el acabado real. El contratista da inicio a actividades de fundición de media cota en baño de mujeres del primer piso y en el baño mixto del 2 nivel.

Se continua con actividades de montaje del 2 tramo de buscalera de Emergencia. La Supervisión informa visita del General Roque para el Da de Abrans.

Guillermo R. Inter 2571113
Hoyas

10.09.24

Clima: Cálido

Personal Contratista:

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenerista, Tacito, Inspectores SST (3), Operativos 27.

Personal Interventor:

Director Interventor, Residente Interventor, Residente SST

Se asiste a comité de obra, se hace seguimiento de recorrido de obra, continúan las actividades de el toricero, trabajo en alturas y trabajo en caliente se continúan los trabajos a nivel. Se realiza visita técnica por parte del Genl Roque; evidencia el avance y se le informa q' a la fecha no se ha procedido con el pago del 1 y 2 corte tanto del Contratista como el de la Interventoria. El Genl solicita al equipo de diseño render del estado final del Tacito. El diseñador del proyecto informa que envía los planos del Cuarto de bombas y el alero de la Rampa.

Guillermo R. Inter 2571113

11.09.24

Clima: Cálido

Personal Contratista

Director de obra, Residente SST, Almacenerista, Tacito, Inspectores SST (3), Operativos 24

Personal Interventor:

Director Interventor, Residente Interventor, Residente SST

En recorrido de obra, se evidencian los trabajos en caliente y otras por parte de Motex y HKB Ingenieros, las demás actividades, son trabajos a nivel en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes laborales, todos los trabajadores cuentan con sus EPP respectivos a la actividad realizada.

La Interventoría realiza visitas a plantas de producción del Panel Acústico (Módulo), Se evidencia un avance del 20% de producción. Informan que en 15 días llega el primer pedido a Srio. Visita a bodega de Almacenamiento en Cota: Se evidencia que ya se encuentra el 100% del Insumo Importado. Visita en la planta de Silbs-Bbs: Se evidencia un avance del 80% de la producción de la Silletería. Se solicita al contratista entregar repuestos de Ubicación

Proyecto 2 Inter sistemas
Alfonso R

12.09.24.

Clima: Cálido

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Maestro, Inspectores SST (3) Operativos 27.

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST

Se solicita recorrido de obra con el profesional SST del Contratista donde se evidencian las actividades de trabajo en altura y en caliente de techos y azoteas, las demás actividades se realizan a nivel piso, civil y mantenimiento, en la jornada no se presentaron accidentes, ni incidentes. El Contratista realiza armado de aceros para fundido de escaleras exteriores, Se continúa con la fundido de la media caña del baño de mujeres del 1er piso. Continúan con la instalaciones de Soportes/estructuras del panel acústico en el muro Sur y las Soportes metálicas para cielo raso, el contratista continúa con fundido de piso en granito blanco en el 2 piso. Adicionalmente continúa con el montaje de la escalera metálica de Emergencia.

Proyecto 2. Inter sistemas
Alfonso R

13.09.24

Clima: Cálido

Personal Contratista

Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Maestro

Inspectores SST (3) Operativos 29, Pto Fabricación 12

Personal Interventor

Residente Interventor, Residente SSTMA

Se realiza recorrido donde encontramos actividades de alto riesgo como son alturas y trabajo en caliente por parte de los contratistas y los trabajos, las demás actividades se encuentran a nivel en la jornada no representan accidentes ni incidentes en obra todo el personal con sus app. Se realiza fundido de concreto para escaleras exteriores. Se evidencia ingreso de material asfáltico (frascos) del Sistema Pasivo. Se continúa con la instalación del soporte metálico de cielo raso - Auditorio. El contratista realiza el muro de 1er mano de pintura en Estano, Se solicita dar celeridad con la instalación del cielo raso pvc del área, Se da inicio a la boquilla de los Gpetures. y wc. *Residente Interventor SSTMA*

14.09.24

Clima: Celido

Personal Contratista

Almacenista, Puerto, Inspectores SST (3) Operativos 28

Personal Interventor

Residente Interventor

Se continúan con actividades de altura y pintura en alturas y trabajo en caliente no representan accidentes ni incidentes en obra. Se evidencia resacas de regatas eléctricas, en fachadas. el contratista realiza la instalación de los restrictores del Tanque de Almacenamiento. Se da continuidad con el Tramo Superior de la escalera de emergencia. Se evidencia instalación de amarres para bajantes de Aguas Pluvias. Se Solicita Aseo que el contratista

16.09.24

Clima: Celido sin lluvias

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Puerto, Inspectores SST (3), Operativos 25, Punto Fabricación 12

ANEXO No. 5 – Listado personal

<p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL</p>	<p>CONTROL MENSUAL DE PERSONAL</p>					

AÑO

FECHA DE REPORTE	DD	15	MM	09	AA	2024
------------------	----	----	----	----	----	------

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

INTERVENTOR

INPLAYCO SAS

NIT O C.C.

860 52416-8

CONTRATO N°

314-COADE-
DICRECENACINGENIEROS-
2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

NIT O C.C.

901.759.617- 0

CONTRATO N°272-
CENANCINGENIEROS-
2023

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL

Nº DE C.C.

CARGO

ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN

EPS

PENSIÓN

ARP

FECHA DE
ENTRADA

DD

MM

AA

FECHA DE SALIDA

DD

MM

AA

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL</div> <div></div>	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					

NOMBRE											
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA											
IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJÉRCITO NACIONAL</div> <div></div>			CONTROL MENSUAL DE PERSONAL			

SUBCONTRATISTA Y&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTA FACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJÉRCITO NACIONAL</div> <div></div>			<div>CONTROL MENSUAL DE PERSONAL</div>					

JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24			
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24			
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24			
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24			
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24			
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJÉRCITO NACIONAL</div> <div></div>		<div>CONTROL MENSUAL DE PERSONAL</div>					

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

ANEXO No. 6 – Documentos SST

	INFORME SEMANAL SST-MA				Código:		
				Versión:	Pág.		
				Vigente desde:			
FECHA	17 DE SEPTIEMBRE 2024	INFORME No	22	DEL	9/09/2024	AL	15/09/2024
1. INFORMACION GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.					
CONTRATO DE OBRA							
CONTRATO No:		314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023					
PLAZO INICIAL:		TRES (3) MESES					
FECHA DE INICIO:		20 DE DICIEMBRE DE 2023					
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A					
FECHA DE REINICIO:		N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		18 DE MARZO DE 2024					
PRORROGA 1:		N/A					
PRORROGA 2:		N/A					
PLAZO ACTUALIZADO:		N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:		18 DE MARZO DE 2024					
VALOR INICIAL:		\$					
VALOR ADICIÓN 1:		524.033.402,49					
VALOR ADICIÓN 2:		1,444,120,181,24					
VALOR ACTUALIZADO		N/A					
		7,820,947,300,78					
2. AVANCE SST-MA							
2.1. Actividades Realizadas en la semana							
Actividades realizadas		Cantidad	Observaciones				
revisión documentación		1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra				
revisión informes semanales contratista		1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación				
Asistencia a comité y visitas programadas		1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.				
inspecciones preoperacionales		12	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras.				
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC		9	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos				
Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico. Arme y Desarme de andamios. Regatas en paredes Orden y Aseo		9	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales.				
Alistamiento de pisos como: orden y aseo, recoger material con pala y trasiego en carretillas a los sitios de acopio de escombros, realizar instalación de estructura para fundir pisos.		3	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.				
Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos Corte, Doblaje e instalación de tuberías en EMT, PVC y cajas eléctricas. Regatas y pasantes en paredes y pisos de concreto Orden y Aseo		8	Firma de ATS e inspecciones de equipos eléctricos, extensiones eléctricas, escaleras y herramientas menores, de trabajos en Alturas, de permiso para trabajos en caliente, de preoperacional de taladros, rotomartillo y pulidoras.				
Se realiza armado de andamios, inspecciones de equipos EPCC, instalación de perfilera.		3	Firmar ATS, permiso de trabajo en caliente, inspecciones de EPCC, charlas de 5 minutos y pausas activas.				

2.2. Temas de capacitación- charla contratista							
Actividades realizadas		Cantidad	Observaciones				
Socialización ATS, factores de riesgo y como se previenen. Orden y aseo en los sitios de trabajo. Uso de epp como el casco con barbuquejo, guantes. Socialización ingreso de obra, reporte de personal. La importancia de las gafas de seguridad. Una cualidad del compañero, empatía en el trabajo.		7	Se realiza para personal administrativo y operativo				
Primeros Auxilios Cables de electricidad elevados Seguridad con la electricidad ICCT Resbalones, Tropezones y Caídas		4	Se realiza para personal administrativo y operativo				
Manejo de herramientas, trabajo seguro en alturas, requerimiento de claridad, trabajo en caliente		4	Se realiza para personal administrativo y operativo				
cuidados con la pulidora para cortar el piso. Todos podemos prevenir accidentes en el trabajo. Socialización ATS, puntos ecológicos no arrojar basuras en gabinetes.		4	Se realiza para personal administrativo y operativo				
Total, capacitaciones		19					
2.3. Manejo integral de residuos							
Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	Porcentaje cumplimiento RCD (t)	Agua (m3)	Madera (t)	Gravilla (t)	Arena (t)	Otros (t)
Semanal	0	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	25	0	0	0	0	8	14
Total, proyecto	539	0	0	1.5	0	24	1.4
2.4. Medidas de manejo ambiental							
Programa		Cantidad	Descripción				
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido		1	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de río, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposición de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.				
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.		1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades				
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.		1	•Se realizo jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizo limpieza y orden de los puntos de acopio temporal				
No. 1-4. Señalización.		1	•Se instalo señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.				
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.		1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.				
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.		1	•Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias.				
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.		1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (t) Semana: 0 Retiro de RCD (t) Acumulado: 539				
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.		1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos				
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.		1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.				
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.		1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.				
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.		1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.				

2.5. Personal en obra						
Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal		
				Femenino	Masculino	
				10,1	89.9	
3	6	26	35			
2.6. Indicadores						
	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)		
Semanal	0	0	0	0		
Mensual (acumulada)	0	0	0	0		
Total, proyecto	0	0	0	0		
2.7. Accidentalidad						
	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	0	0	0	1	0	0
3.8. Conclusiones y recomendaciones						
En la presente semana se asiste a comité de obra, así como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, ingresa nuevo personal del subcontratista Metex y HK3 ingeniería, para esta semana se culmina con un total de 9 profesionales y 26 operarios en obra con un porcentaje de 10.1% personal femenino y 89.9% personal masculino, al igual que la semana pasada se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, no se realiza disposicion de RCD, se realizaron jornadas de orden y aseo en puntos de acopio, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de EPP, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista.						

ELABORO


MIGUEL ANTONIO ORTEGÓN
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
