

10987

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán Paralelo Natural
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 24 de julio del 2026

1090-1332

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
 Secretaria de contratación
 Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
 Recibido por: Karen P
 Fecha: 28 JUL 2026
 Hora: 9:22 am

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 6 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaria de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 6 en el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
 Recibido por: Karen P
 Fecha: 06 OCT 2026
 Hora: 3:53 pm


CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
 Secretario de Infraestructura

Elaboró: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025
 Revisó: Christian Julián Fernández Reyes - Secretario de Infraestructura

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	COMUNICACIONES EXTERNAS	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: junio 2025

10988

Villavicencio, 09 de marzo de 2026

CE-011-2026

Ingeniero:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO

CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

Calle 41B #30 – 11

e-mail: interventoria.acindigenas@gmail.com

Ciudad

Ref.: Contrato de Obra No. 0821 de 2025 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

Asunto: Entrega informe mensual No. 6

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito entregar el informe mensual No.6 del periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, para su respectiva revisión, aprobación y tramite.

Agradeciendo la atención prestada y a la espera de sus indicaciones.

Atentamente,




LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

R.L. CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

Contratista

Anexo: lo enunciado en 1 carpeta

		FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA				
		Infraestructura				
		Código:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025		
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN 05/03/2026						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
Radicado No:		Fecha:				
Periodo del informe:		Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026				
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
1,01	Generalidades del contrato, localización específica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	INFORMACION DEL CONTRATO					
2,01	Cuadro de trazabilidad: 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial, 3) Objeto del contrato, 4) Numero de identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato, 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
4	INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO					
4,01	Plan de inversión de anticipo	X	X			
4,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.	X	X			
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra.	X	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			
4,07	Ordenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)	X	X			
5	INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO					
5,01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			
5,02	Cuadro de avance con acumulado mas a mes	X	X			
5,03	Control del estado del tiempo resumen (día a día mas reportado en el informe)	X	X			
6	INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matrícula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)				X	
7	CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO	X	X			
8	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)	X	X			
9	INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).	X	X			
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales	X	X			
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			
10	ANEXOS					
10,01	Actas de socialización (informes inicial)				X	
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)				X	
10,03	Relación de comités de obra. (según orden cronológico y debidamente numeradas)				X	
10,04	Registro fotográfico del acta de avances con acumulado mes a mes	X	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexar de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)	X	X			
10,07	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA					
Infraestructura						
Codigo:ING-FR-72		Version:05	Vigencia:10-01-2025			
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN 05/03/2026						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
Radicado No:		Fecha:				
Periodo del Informe:		Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026				
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente	X	X			
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)	X	X			
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)	X	X			
10,13	Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)	X	X			
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoría, así como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico), firmado por el profesional (si aplica).				X	
11	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			
NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaría de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.						
Revisó y aprobó:						
						
RIL JORGE ADELINO MUÑOZ SARRIENTO CONSORCIO INTERVENTORIA INDIGENAS 2025						
Nota: se debe pagar los informes						



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 - 1

10989

INFORME DE OBRA



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 821 DE 2025
“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS
RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y
ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”

INFORME MENSUAL No. 6
PERIODO DEL INFORME
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026

CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1
R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
NIT. 901.972.868 – 4
R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO



10991

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo	5
2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba	6
2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas	6
2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome	7
2.1.5 Comunidad beneficiada	8
3. ALCANCE DEL PROYECTO.....	8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.....	9
5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO.....	10
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS	11
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	12
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	12
6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	13
6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	14
6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	15
6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.....	16
6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP	16
6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS.....	16
7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO	17
7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES	17
7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO	18
7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	19
7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.	21
7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	24
7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	22
8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.....	23

**CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**

NIT. 901.965.630 – 1

10992

8.1	RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)	23
8.2	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	24
8.3	ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	25
8.4	PAZ Y SALVO PERSONAL.....	25
9	CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	26
10	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	26
11	INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.	26
12	CONCLUSIONES.....	27
13	ANEXOS	28




1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las leyes y normas, principalmente del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que *“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las actividades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y de agua potable”*, el municipio de Puerto Gaitán en enmarcado en el cumplimiento de las metas de su Plan de Desarrollo **“JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027”** PDM 0344- Construcción, ampliación, optimización, y adecuación de redes de acueducto y plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Atendiendo a la política pública de VIVIENDA, establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.

Algunas comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, presentan vulneración en el servicio de agua potable ya que no cuentan con sistemas de acueductos, se han visto afectadas por la carencia de agua potable, llevando a realizar malas prácticas de la captación del agua, tomando como forma de abastecimiento los pozos profundos rudimentarios en algunas de sus viviendas, que con el tiempo por el desconocimiento sobre las consecuencias que se podrían presentar, algunas familias construyeron pozos sépticos o letrinas a corta distancia de la fuente, lo cual ocasiona la contaminación inmediata de los mismos; evidenciándose condiciones incorrectas para el acceso al agua potable.

Surtidos los tramites de planeación del proyecto, mediante resolución No. 0014 del 10 de junio de 2025 *“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIP-005-2025”* se inició el proceso de contratación el cual culmino con la adjudicación y suscripción del Contrato de Obra Pública No. 821 del 17 de julio de 2025 cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”**.

Así las cosas, con la presentación del presente informe damos cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 821 – 2025 en su cláusula OCTAVA. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** numeral 6. *Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecución, según el avance de la obra (secuencias de actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.*



10994

Así mismo, el presente informe cumple con los requerimientos exigidos en el *FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA (INF-FR-72 V05 vigente desde el 10/01/2025)* establecido por la entidad para tal fin.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza y beneficia a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas de la zona rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta, así:

2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo

RESGUARDO WACOYO									
RESG	COMUNIDAD (POZO)	COMUNIDAD RESGUARDIANO	TOTAL COMUNIDADES	ELE	WENTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	D. CAJAMARCA
WAC01	POZO KAUWIRNAE	ACACIOS	2	898322.2694m	973031.6969m	204.700m	W71° 59' 36.52"	N4° 21' 06.35"	14.00 KM
WAC02	POZO ESMERALDA WALABO	LAS BRISAS, MANANTIAL Y WALABO	4	900418.0667m	972896.7131m	226.400m	W71° 58' 28.56"	N4° 21' 02.04"	16.00 KM
WAC03	POZO PALOGRANDE WALABO	PALOMEKO, PARAISO Y CAIMANA 2	4	900588.5666m	972854.4974m	226.400m	W71° 58' 23.03"	N4° 21' 00.67"	16.00 KM
WAC04	POZO LA UNION		1	902309.5973m	973183.3318m	218.100m	W71° 57' 27.23"	N4° 21' 11.61"	16.00 KM
WAC05	POZO PUNTO GRILLO	CARO CARO, LA BALSA, LLANO ALTO, ACETICO	5	903640.5670m	974473.3613m	221.500m	W71° 56' 44.12"	N4° 21' 53.65"	18.00 KM
WAC06	POZO ALGARROBO	SANTAINES, VILLANIEVA	3	904014.1047m	975025.1358m	221.100m	W71° 56' 32.02"	N4° 22' 11.46"	19.00 KM
WAC07	POZO MATAPALITO	LAS PIEDRAS	2	906626.4761m	979804.6633m	209.800m	W71° 55' 07.48"	N4° 24' 47.14"	27.00 KM
WAC08	POZO LA PORFIA	LA HERMOSA	2	907524.2409m	981153.8279m	191.200m	W71° 54' 38.41"	N4° 25' 31.09"	29.00 KM
WAC09	POZO LA CAIMANA	VERSEL	2	900487.6918m	971329.8396m	202.200m	W71° 56' 26.24"	N4° 20' 11.04"	18.00 KM

Tabla 1. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

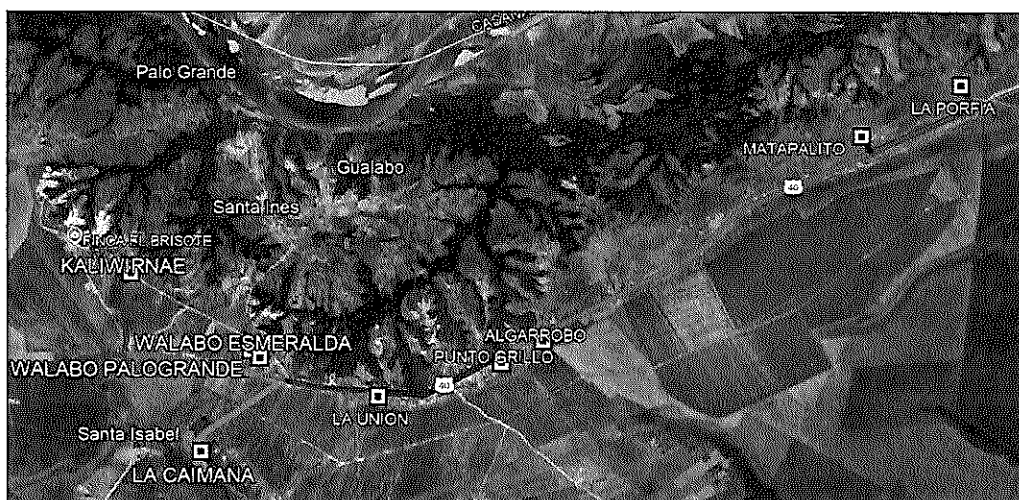


Figura 1. Localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo



2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba

RESGUARDO AWALIBA								
COMUNIDAD	POBLACION	LOCALIDAD	NUMERO	Easting	Northing	Altura	WGS84	UTM
AWA01	POZO MAKAPAY	LA VEREMOS	2	927966.5314m	948604.7669m	234.100m	W71° 43' 34.52"	N4° 07' 52.17"
AWA02	POZO COMUNITARIO AWALIVA CENTRAL	CEREQUITO, LA BRISA, LA PISTA, CHAVALIVALLI, LA ENVIDIA, DESEO	7	932219.8422m	949522.6407m	240.200m	W71° 41' 16.65"	N4° 08' 22.16"
AWA03	POZO PUERTO LOPEZ		1	933332.3132m	944145.5908m	206.500m	W71° 40' 40.45"	N4° 05' 27.15"
AWA04	POZO PUNTO GRILLO		1	932907.1761m	942400.7501m	187.200m	W71° 40' 54.19"	N4° 04' 30.33"
AWA05	POZO SAN GIL	TAPIVA, BELLAVISTA	3	942563.2402m	947574.8922m	203.500m	W71° 35' 41.26"	N4° 07' 18.99"
AWA06	POZO FACUNAE		1	935423.3607m	942265.4095m	194.400m	W71° 39' 32.61"	N4° 04' 25.99"

Tabla 2. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

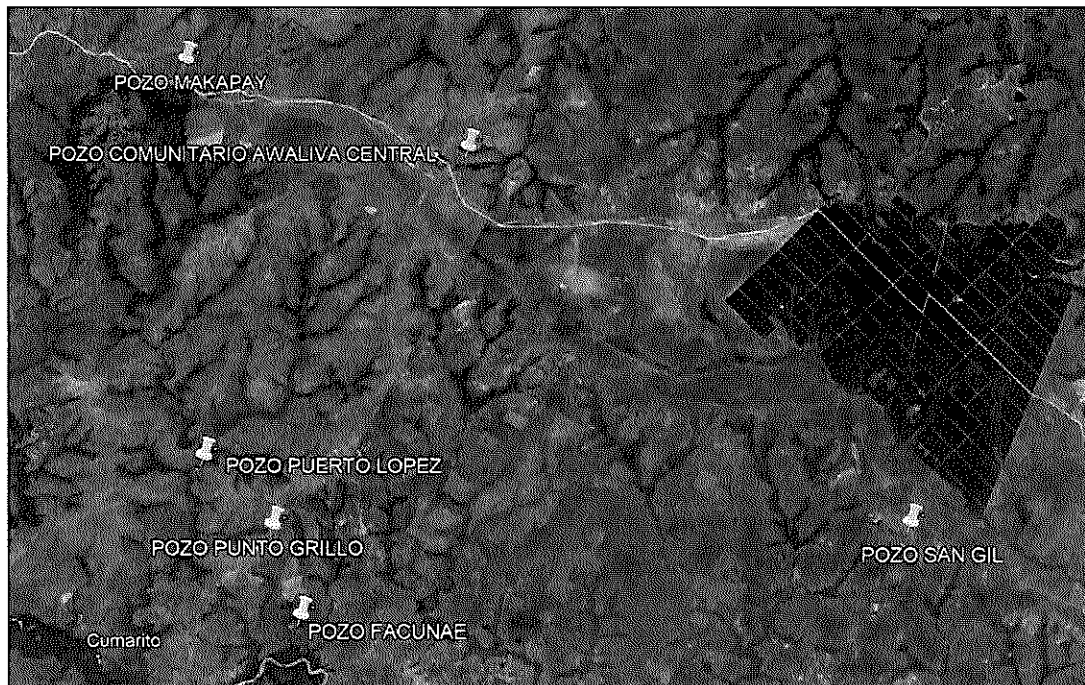


Figura 2. Localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas

RESGUARDO DOMOPLANAS								
COMUNIDAD	POBLACION	LOCALIDAD	NUMERO	Easting	Northing	Altura	WGS84	UTM
DOM01	POZO OLIVOS	WARROJO	2	979779.5881m	963044.8119m	185.800m	W71° 15' 34.74"	N4° 15' 43.15"
DOM02	POZO PARAISO	VISTA HERMOSA	2	970139.3886m	962795.7268m	201.100m	W71° 20' 47.35"	N4° 15' 34.95"
DOM03	POZO BUENAVISTA		1	968668.4144m	953173.8691m	232.350m	W71° 21' 34.94"	N4° 10' 21.70"
DOM04	POZO VILLAMARCIA	DILUVIO	2	976124.0172m	945937.1103m	194.500m	W71° 17' 33.14"	N4° 06' 26.18"
DOM05	POZO LAS BRISAS		1	977507.6932m	947082.3612m	200.550m	W71° 16' 48.28"	N4° 07' 03.47"
DOM06	POZO CUMARALITO		1	977551.1217m	944929.9396m	197.550m	W71° 16' 46.86"	N4° 05' 53.40"
DOM07	POZO YATORROBO		1	976876.8066m	943115.3330m	194.300m	W71° 17' 08.70"	N4° 04' 54.32"
DOM08	POZO CERRITO		1	980241.7249m	947463.0325m	183.500m	W71° 15' 19.64"	N4° 07' 15.89"
DOM09	POZO PUERTO GAVILAN	SOLEDAD	2	983468.1415m	944328.3256m	203.100m	W71° 18' 35.02"	N4° 05' 33.86"
DOM10	POZO LAS DEUCIAS		1	985468.1246m	941561.4449m	180.200m	W71° 12' 30.16"	N4° 04' 03.79"
DOM11	POZO CACHAMITAS		1	979870.7300m	939807.9630m	186.933m	W71° 15' 31.62"	N4° 03' 06.67"

Tabla 3. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

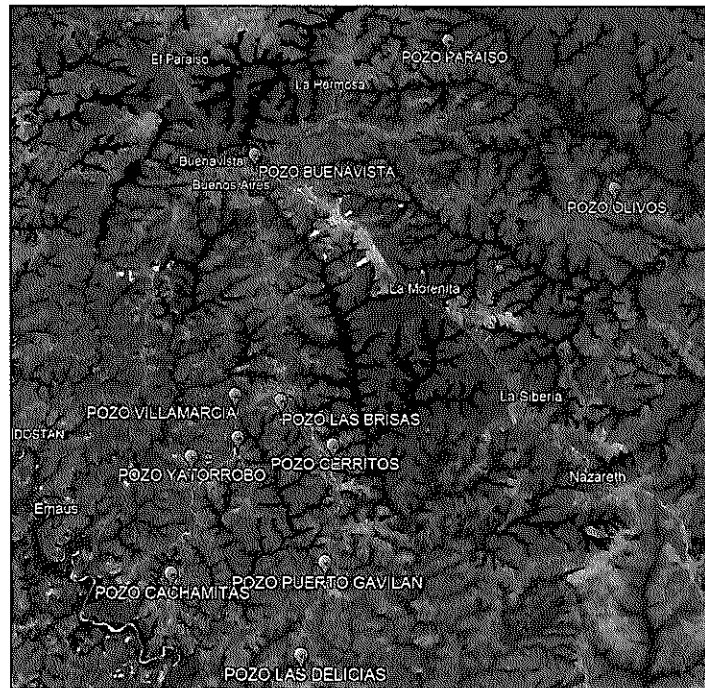


Figura 3. Localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome

RESGUARDO ASEINPOME									
CÓDIGO	COMUNIDAD			EASTE	NORTH	ALTA	LONGITUD	ANCHO	DESCRIPCION
UNU01	KEKO		1	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM
UNU01	SIE TE RODRIGUEZ	SAN FERNANDO	2	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM

Tabla 4. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



Figura 4. Localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



2.1.5 COMUNIDAD BENEFICIADA

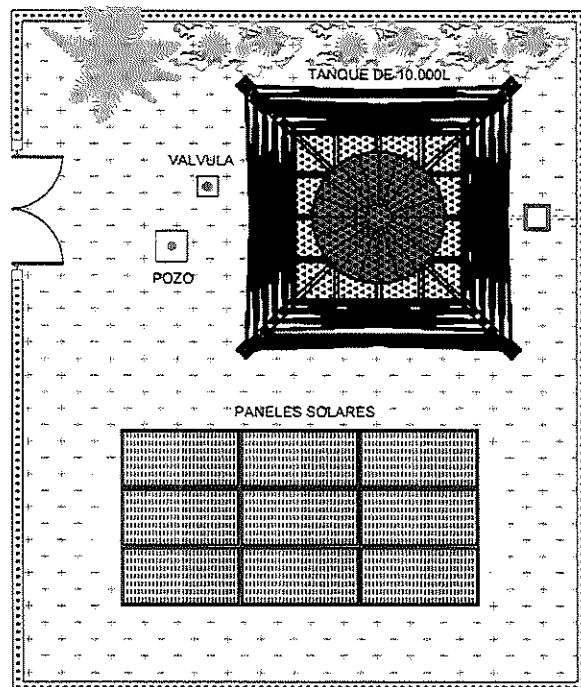
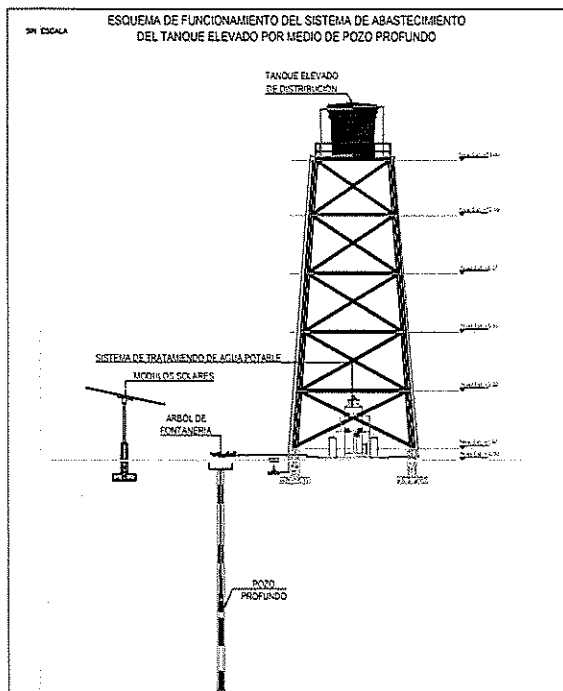
El número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto es de 3.246 habitantes como se muestra a continuación:

GRUPOS ÉTNICOS:		Población Indígena	
ETARIA:	Edad:	0 a 14 años	1.087
		15 a 19 años	390
		20 a 59 años	1.617
		Mayor de 60 años	152
GÉNERO:	Masculino:	1.737	
	Femenino:	1.509	

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto como se mencionó anteriormente beneficiara a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas distribuidos en toda la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, cada sistema está concebido que sea igual para todas las comunidades, que requieran de la menor operación y que brinde agua potable para el beneficio de las comunidades.

El sistema consta de manera general de los siguientes componentes:





0998

- **Pozo profundo:** Se contemplan profundidades de perforación desde 90 metros hasta los 153 metros, en tubería PVC de 6" al igual que los filtros.
- **Equipo de bombeo y sistema de energía solar:** bombas sumergibles solares de potencias entre 1.500, 3.000 y 16.000 wattios. Controladores de carga, sensores de nivel para tanque y pozo, y sistema de protección de malla a tierra. Paneles solares monocristalinos de 570 wattios, distribuidos en módulos de 5, 9 y 22 paneles según las características de cada sistema.
- **Sistema de tratamiento de agua:** compuestos por una unidad presurizada en acero inoxidable que filtra, clarifica y purifica; diseñados para tratar caudales de 0.5 lts/seg, 1 lts/seg y 2 lts/seg según el requerimiento de cada sistema.
- **Redes de acueducto:** 56.682.22 metros de tubería de pvc 2" RDE 21 – 941 acometidas domiciliarias y sus respectivos accesorios (válvulas, uniones, tapones, codos, tees).
- **Tanque elevado de distribución:** tanques plásticos de 6.000 lts, 10.000 lts, y 20.000 lts, soportados en estructuras de acero estructural ASTM de 13.7 metros de altura cimentados en zapatas y pedestales en concreto de 3.000 psi.
- **Cerramiento perimetral:** en tubo galvanizado de 2" soportados en viga de cimentación y concreto ciclópeo con portón de acceso.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DEL PROCESO		LP-SIP-005-2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	NÚMERO:	821 DE 2025
	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
CONTRATISTA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT. 901.965.630 – 1 R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



VALOR DEL CONTRATO	EN LETRAS	CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
	EN NUMEROS	\$42.408.897.278,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		QUINCE (15) MESES
INTERVENTOR DEL CONTRATO:		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 NIT. 901.972.868 – 4 R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO C.C. 79.134.525 DE FONTIBÓN interventoria.acindigenas@gmail.com
SUPERVISOR		CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE INICIO		29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL		28 DE NOVIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		38,61%
COSTO EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$16.373.143.774,00
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		30,70%
COSTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$ 13.018.663.752,00
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO		184 días
DIAS PENDIENTES DE EJECUCION		272 días
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO		40,35%

5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen las pólizas expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. que amparan la ejecución del contrato desde su suscripción y las correspondientes modificaciones que se han realizado a la fecha del presente informe y que aplican para actualización de pólizas.

- Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 93833.
- Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 27002.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 - 1

11000

5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS

PÓLIZAS INICIALES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 DE JULIO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00
CIVIL DERIVADA DE							

PÓLIZAS INICIALES CORRECCIÓN NIT. DEL CONTRATISTA.

Póliza No. 93833				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

11001

Póliza No. 93833				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	01	04	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	01	12	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29	08	2025	01	04	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29	08	2025	28	11	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	29	08	2025	01	12	2026	\$2.120.444.864,00

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato de obra No. 821 de 2025 cuenta con un anticipo del 50% del valor del contrato correspondiente a la suma de \$21.204.448.639,00; por concepto de FONSET la entidad retiene el 5% de este valor que son \$1.060.222.431,95 es decir que el valor neto entregado del anticipo corresponde a \$20.144.226.207,05.

En cumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato, el contratista suscribió con la FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS denominado **PATRIMONIO AUTONOMO ANTICIPO CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, con el fin de manejar y girar los recursos del anticipo del contrato.

De igual manera se registra la cuenta de ahorros No. 500807651648 del Banco Popular correspondiente al fideicomiso donde se deben abonar los recursos objeto del contrato fiduciario.

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo aprobado inicialmente y que se encuentra vigente a la fecha.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

11002

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	% PORCENTAJE PROGRAMADO DE INVERSION EN EL TIEMPO EN MESES				
				1	2	3	4	5
1	MANO DE OBRA, PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS DEL PERSONAL OFERTADO Y OPERATIVO (SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DOTACIONES)	\$2.417.307.144,85	12%	2%	3%	3%	3%	1%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	\$13.496.631.558,72	67%	15%	20%	20%	5%	7%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	\$4.230.287.503,48	21%	3%	5%	5%	5%	3%
TOTALES		\$20.144.226.207,05	100%					

6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

A continuación, se mencionan y describen cada uno de las ordenes de giro a la fiducia durante el periodo del informe

CONSECUTIVO	ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	SALDO ANTICIPO
ORDEN GIRO No. 61	1	12/02/2026	TERRACQUA SAS	\$ 19.052.228,00	\$ 12.425.673.496,73
ORDEN GIRO No. 63	1	13/02/2026	TERRACQUA SAS	\$ 33.600.000,00	\$ 12.392.073.496,73
ORDEN GIRO No. 65	1	2/02/2026	GEODELTA SAS	\$ 49.000.000,00	\$ 12.343.073.496,73
ORDEN GIRO No. 66	1	2/02/2026	EDUAR BENJAMIN PEREZ	\$ 52.500.000,00	\$ 12.290.573.496,73
ORDEN GIRO No. 67	1	13/02/2026	TERRACQUA SAS	\$ 31.500.000,00	\$ 12.259.073.496,73
ORDEN GIRO No. 68	1	3/02/2026	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 20.000.000,00	\$ 12.239.073.496,73
ORDEN GIRO No. 69	1	3/02/2026	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	\$ 16.160.588,00	\$ 12.222.912.908,73
ORDEN GIRO No. 70	1	5/02/2026	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	\$ 7.511.988,00	\$ 12.215.400.920,73
ORDEN GIRO No. 71	1	6/02/2026	TATIANA OSORIO	\$ 11.364.690,00	\$ 12.204.036.230,73



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

11003

ORDEN GIRO No. 72	1	6/02/2026	BRAYAN MURCIA TOBON	\$ 38.379.118,00	\$ 12.165.657.112,73
ORDEN GIRO No. 73	1	6/02/2026	MARLON MURCIA TOBON	\$ 116.068.887,00	\$ 12.049.588.225,73
ORDEN GIRO No. 74	1	6/02/2026	LA COMPUERTA	\$ 604.998,00	\$ 12.048.983.227,73
ORDEN GIRO No. 75	1	6/02/2026	FUENTE VIVA INVERSIONES	\$ 40.097.050,00	\$ 12.008.886.177,73
ORDEN GIRO No. 76	1	9/02/2026	NACIONAL DE ELECTRICOS	\$ 6.552.179,66	\$ 12.002.333.998,07
ORDEN GIRO No. 77	1	9/02/2026	LA COMPUERTA	\$ 77.267.807,00	\$ 11.925.066.191,07
ORDEN GIRO No. 78	1	9/02/2026	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 149.806.720,00	\$ 11.775.259.471,07
ORDEN GIRO No. 79	1	10/02/2026	KARINA LEGUIZAMON VERA	\$ 5.970.000,00	\$ 11.769.289.471,07
ORDEN GIRO No. 80	1	10/02/2026	DISTRACOM	\$ 2.000.000,00	\$ 11.767.289.471,07
ORDEN GIRO No. 81	1	10/02/2026	EDUAR BENJAMIN PEREZ	\$ 27.449.068,00	\$ 11.739.840.403,07
ORDEN GIRO No. 82	1	10/02/2026	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	\$ 19.470.000,00	\$ 11.720.370.403,07
ORDEN GIRO No. 83	1	11/02/2026	ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA	\$ 24.642.288,00	\$ 11.695.728.115,07
ORDEN GIRO No. 84	1	12/02/2026	NELSON MORALES ROJAS	\$ 33.926.688,00	\$ 11.661.801.427,07
ORDEN GIRO No. 85	1	12/02/2026	INMEFRAN SAS	\$ 20.000.000,00	\$ 11.641.801.427,07

Las ordenes 61 y 63 se habían relacionado en el mes de enero, pero hubo inconvenientes con la fiducia para el desembolso (no se hizo efectivo el giro) y se tuvieron que volver a cargar en el mes de febrero.


6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	MES	VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	\$ 1.132.883.754,00	\$ 1.132.883.754,00	\$ 1.165.283.191,00	\$ 1.165.283.191,00

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

11004

2	01-10-25 a 31-10-25	\$ 1.533.938.149,00	\$ 2.666.821.903,00	\$ 1.615.778.986,00	\$ 2.781.062.177,00
3	01-11-25 a 30-11-25	\$ 2.752.982.664,00	\$ 5.419.804.567,00	\$ 4.469.897.773,00	\$ 7.250.959.950,00
4	01-12-25 a 31-12-25	\$ 3.182.797.359,00	\$ 8.602.601.926,00	\$ 3.384.230.051,00	\$ 10.635.190.489,00
5	01-01-26 a 31-01-26	\$ 3.054.586.452,00	\$ 11.657.188.378,00	\$ 4.800.716.596,00	\$ 15.435.907.083,00
6	01-02-26 a 28-02-26	\$ 1.361.475.374,00	\$ 13.018.663.752,00	\$ 937.236.691,00	\$ 16.373.143.774,00
7	01-03-26 a 31-03-06	\$ 1.707.014.984,00	\$ 14.725.678.736,00		
8	01-04-26 a 30-04-26	\$ 2.122.894.222,00	\$ 16.848.572.958,00		
9	01-05-26 a 31-05-26	\$ 3.538.600.653,00	\$ 20.387.173.611,00		
10	01-06-26 a 30-06-26	\$ 5.196.889.486,00	\$ 25.584.063.097,00		
11	01-07-26 a 31-07-26	\$ 6.886.687.533,00	\$ 32.470.750.630,00		
12	01-08-26 a 31-08-26	\$ 4.957.368.139,00	\$ 37.428.118.769,00		
13	01-09-26 a 30-09-26	\$ 3.283.638.775,00	\$ 40.711.757.544,00		
14	01-10-26 a 31-10-26	\$ 1.494.587.472,00	\$ 42.206.345.016,00		
15	01-11-26 a 28-11-26	\$ 202.576.537,00	\$ 42.408.921.553,00		

6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$42.408.897.278,00
VALOR ADICIONES	\$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	\$42.408.897.278,00
VALOR ANTICIPO	\$20.144.226.207,05
ACTAS PARCIALES	\$0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$20.144.226.207,05



6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NÚMERO	DIS.2025000172
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-05-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
CONCEPTO	SPGR CDP 13325 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.921.552,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.921.552,00

6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.

REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO	RS1.2025000156
FECHA DEL REGISTRO	23-07-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
DESCRIPCIÓN	CTO-821 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
FUENTE O RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.897.278,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.897.278,00

6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO 50,00%	2025090008	\$ 20.144.266.208,00	17/09/2025



11006

7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES

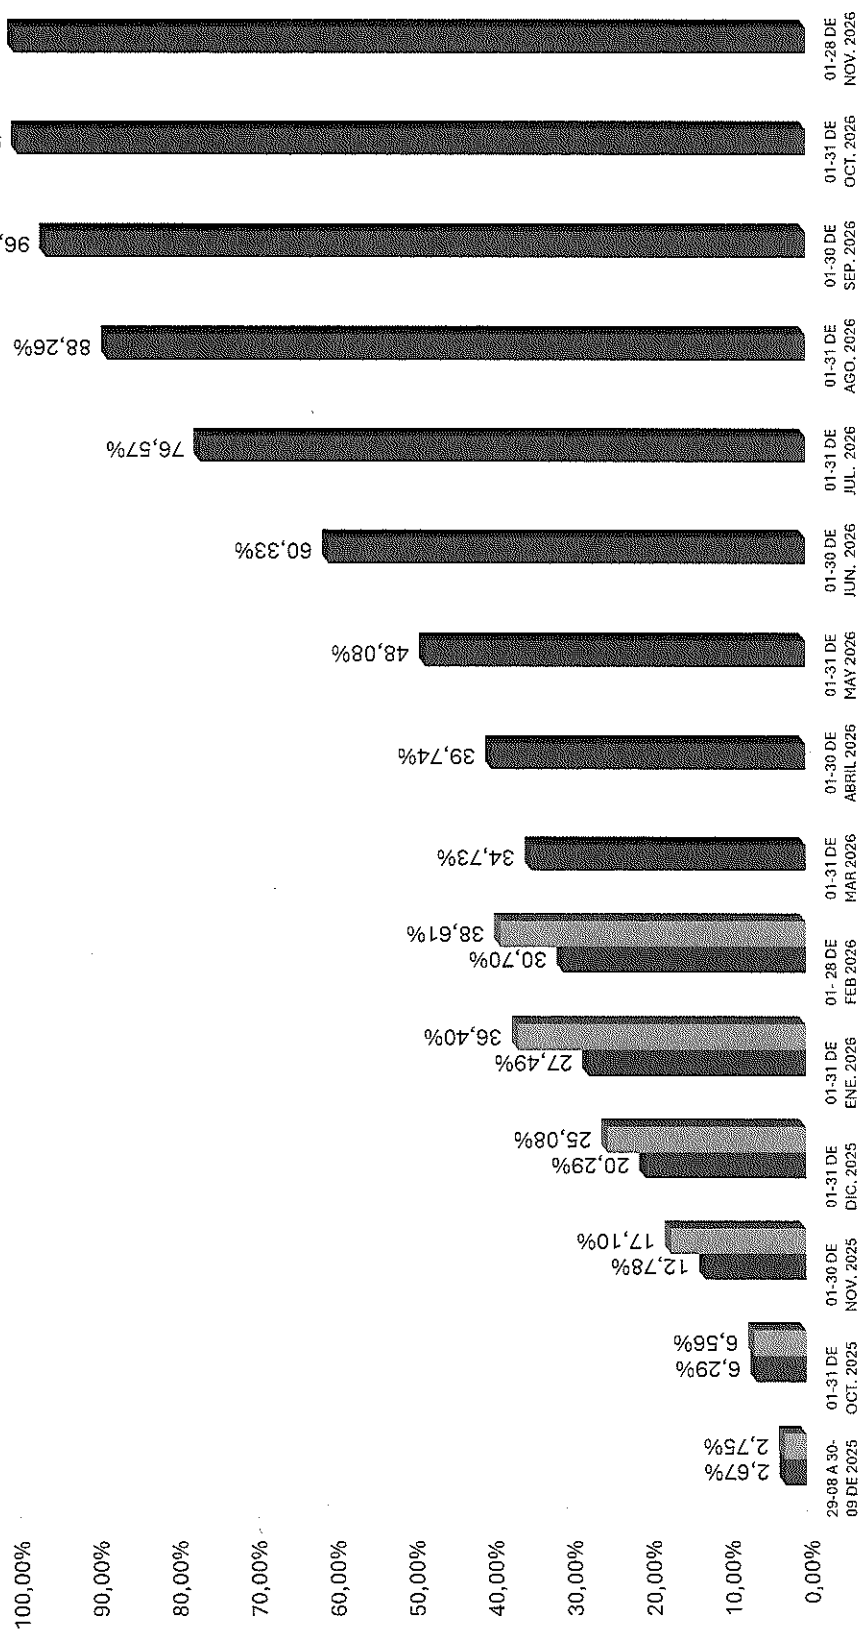
MES		% PROGRAMADO		% EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	2,67%	2,67%	2,75%	2,75%
2	01-10-25 a 31-10-25	3,62%	6,29%	3,81%	6,56%
3	01-11-25 a 30-11-25	6,49%	12,78%	10,54%	17,10%
4	01-12-25 a 31-12-25	7,51%	20,29%	7,98%	25,08%
5	01-01-26 a 31-01-26	7,20%	27,49%	11,32%	36,40%
6	01-02-26 a 28-02-26	3,21%	30,70%	2,21%	38,61%
7	01-03-26 a 31-03-06	4,03%	34,73%		
8	01-04-26 a 30-04-26	5,01%	39,74%		
9	01-05-26 a 31-05-26	8,34%	48,08%		
10	01-06-26 a 30-06-26	12,25%	60,33%		
11	01-07-26 a 31-07-26	16,24%	76,57%		
12	01-08-26 a 31-08-26	11,69%	88,26%		
13	01-09-26 a 30-09-26	7,74%	96,00%		
14	01-10-26 a 31-10-26	3,52%	99,52%		
15	01-11-26 a 28-11-26	0,48%	100,00%		

Ver anexo No. 1 Cuadro de avance actividades ejecutadas.

7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE MENSUAL GENERAL DEL PROYECTO

■ % PROGRAMADO ACUMULADO ■ % EJECUTADO ACUMULADO





11008

7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relaciona las actividades de obra ejecutadas en el presente corte:

RESGUARDO AWALIBA.

COMUNIDAD MAKAPAY

- **TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con la instalación de acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado.

COMUNIDAD PUERTO LOPEZ

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno y se hace la construcción de cabeza de pozo y sello sanitario.

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

- **TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN**

Durante el periodo reportado en este informe, se inició con la instalación de acero estructural A500 y A588 para la estructura del tanque elevado.

RESGUARDO DOMOPLANAS.

COMUNIDAD VILLAMARCIA

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se termina la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación se termina de ejecutar el análisis litológico y granulométrico metro a metro y la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

**COMUNIDAD PUERTO GAVILAN**

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, se hace la construcción de cabeza de pozo y sello sanitario.

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se terminó con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de río para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapones.

COMUNIDAD LAS DELICIAS

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se terminó con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de río para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapones.



RESGUARDO WACOYO.

COMUNIDAD LA UNIÓN

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, se hace la construcción de cabeza de pozo y sello sanitario.

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la instalación de la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, se hace la construcción de cabeza de pozo y sello sanitario.

Las cantidades ejecutadas y mencionadas anteriormente para el periodo referenciado en este informe se pueden verificar en el **Anexo N°1**.

7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

En el **Anexo No. 2** se encontrarán los certificados de calidad de los materiales usados al corte del presente informe, junto con los certificados de calibración de los equipos usados si aplica.

7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se anexa el informe emitido por parte del profesional SISO, entrega de asistencia de charlas de seguridad, salud en el trabajo y las entregas de dotación.

Ver Anexo No. 3 Informe seguridad y salud en el trabajo (SISO)



7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

RESGUARDO WACOYO FEBRERO 2026

RESGUARDO WACOYO FEBRERO 2026																															
DIA	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S			
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
SECO AM	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS AM			X																												
LLUVIAS INTENSAS AM										X																					
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
LLUVIAS MODERADAS PM																															
LLUVIAS INTENSAS PM																															

RESGUARDO AWALIBA FEBRERO 2026

RESGUARDO AWALIBA FEBRERO 2026																															
DIA	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S			
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS AM																				X											
LLUVIAS INTENSAS AM																															
SECO PM	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS PM							X						X																		
LLUVIAS INTENSAS PM																															

RESGUARDO DOMOPLANAS FEBRERO 2026

RESGUARDO DOMOPLANAS FEBRERO 2026																															
DIA	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S			
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS AM											X										X										
LLUVIAS INTENSAS AM																															
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS PM																															
LLUVIAS INTENSAS PM								X																							



RESGUARDO ASEINPOME FEBRERO 2026

DIA	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S			
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS AM																															
LLUVIAS INTENSAS AM																															
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS PM																															
LLUVIAS INTENSAS PM																															

8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)

De acuerdo con las necesidades del proyecto, las actividades ejecutadas durante el presente periodo y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO: FEBRERO 2026

PERSONAL PROFESIONAL						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	R/L Consorcio	86.051.533	PORVENIR	SANITAS	SURA	9501162886
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN	Director de Obra	40.326.478	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9501162886
WENDY VANESA GARZON GARCIA	Residente de Obra 1	1.121.902.403	PROTECCION	SANITAS	SURA	9501162886
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	Residente de Obra 2	1.121.834.340	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9501162886
GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.869.998	PORVENIR	SANITAS	SURA	9501162886
DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	Contadora	40.395.435	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9501162702
LINA MARCELA GOMEZ LEAL	Auxiliar Contable	40.328.285	PORVENIR	SANITAS	SURA	9501162702




110/3

PERSONAL TECNICO OPERATIVO						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFF	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ	Secretaria	1.092.394.700	PORVENIR	SANITAS	SURA	9501162702
JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	Conductor 1	80.013.513	PORVENIR	SANITAS	SURA	9501162702
ROSEMBERG MURCIA JOJOA	Conductor 2	1.003.359.252	PORVENIR	SANITAS	SURA	9501162886
OBER ASMED PEREZ PEREZ	Almacenista	96.193.788	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9501162702
MIGUEL DIOSID CORREA	Oficial de obra	1.103.470.729	PORVENIR	CAJACOPI	SURA	9501162886
YEFERSON ENRIQUE GALVAN	Operador de maquinaria	78.646.546	COLFONDOS	NUEVA EPS	SURA	9501162886
JOSE JAVIER MONCADA	Oficial de tubería	1.093.921.945	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9501162886
EDWIN BARRIOS	Oficial de obra	1.120.864.265	PORVENIR	SALUDTOTAL	SURA	9501162886
DUVAN ARLEY ROMERO	Oficial de tubería	1.004.819.005	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9501162886

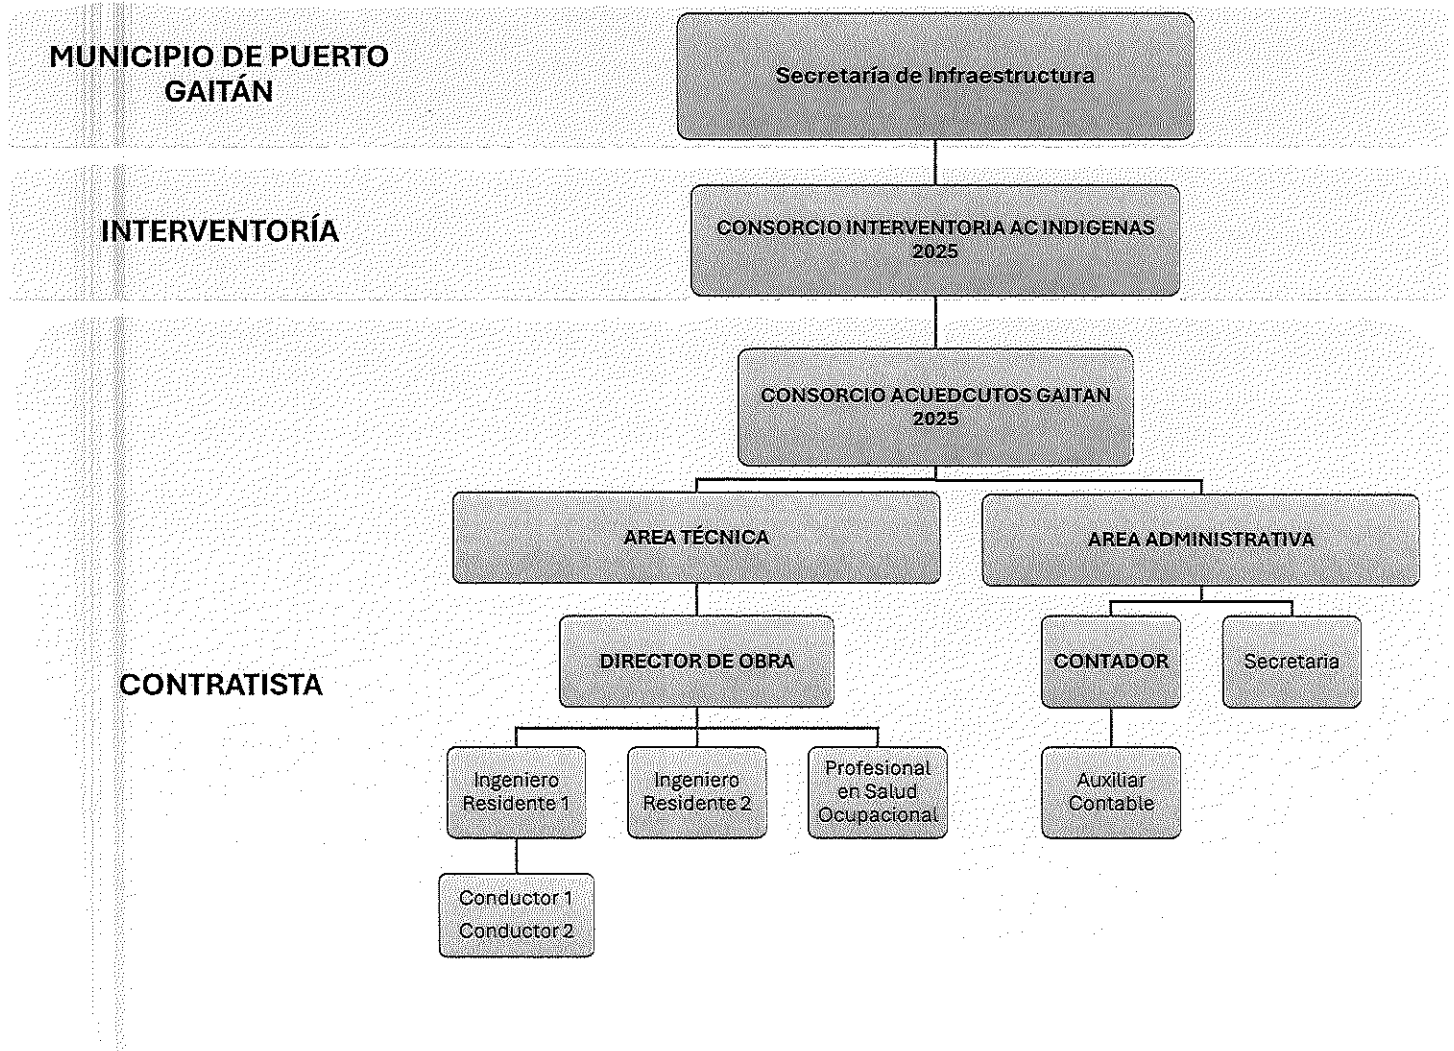
8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

Ver Anexo No. 4. Planillas de pago seguridad social y Certificación contador.



8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO



8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL.

En el presente corte no se retiró personal.



11015

9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se anexo el diseño de mezcla para concretos de 3.000 PSI a utilizar en la construcción de estructuras que lo requieren.

10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
NIVEL DE PRECISIÓN	NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM	1
ESTACIÓN TOTAL	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOPCOM	1
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	2
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	2
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.

En lo corrido del presente mes las actividades ejecutadas no causaron afectación ambiental en la zona de trabajo.

A la fecha el contrato cuenta con los permisos de prospección y exploración en de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales a continuación se relacionan:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA



EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

12 CONCLUSIONES

- Se presenta el siguiente informe con el fin de mantener informadas a las partes involucradas del estado y avance del contrato en el periodo correspondiente al informe mensual No. 6 con corte del (01-02-2026 al 28-02-2026), actividades que se desarrollaron con normalidad.
- Una vez recibidos los recursos de anticipo en la fiducia constituida para el manejo de este, se continua la inversión de tal forma que se logre el cumplimiento del cronograma, priorizando las actividades que más tiempo requieren en su ejecución.
- Al terminar la ejecución de la actividad de localización y replanteo de las redes de acueducto en las comunidades beneficiarias se evidencio la existencia de nuevos usuarios, así como el desplazamiento de algunos usuarios dentro de la misma comunidad, situación que genera mayor cantidad de actividades de obra por lo que se cuantificara junto con interventoría para realizar el balance del contrato.
- Para efectos de precisión, se deja claridad en que el porcentaje acumulado consignado en el cuadro de avance está redondeado a dos decimales.



13 ANEXOS

- **ANEXO No. 1.** CUADRO DE AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- **ANEXO No. 2.** CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.
- **ANEXO No. 3.** INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISO).
- **ANEXO No. 4.** PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.
- **ANEXO No. 5.** NOMINAS DEL PERSONAL.
- **ANEXO No. 6.** REGISTRO FOTOGRAFICO.
- **ANEXO No. 7.** COPIA DE LA BITACORA.
- **ANEXO No. 8.** APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIARIO.
- **ANEXO No. 9.** SOPORTES PAGOS DE FIDUCIA.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS AGUAS 2025
Contratista



ANEXO 1. CUADRO DE CANTIDADES AVANCE DE OBRA.

11019

CONSEJO AGUAYTAY 2023		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACQOY, ANVALIBA, DOKOFLANAS Y ASEIPOINE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META												
CONDICIONES INICIALES		ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA				AVANCE ACUMULADO				
N° ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RESGUARDO ANVALIBA														
COMUNIDAD MAKAPAY (6000 - 11) (E=1,30)														
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00			1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
1.1				TOTAL POZO PROFUNDO	\$	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00				\$ 139.220,00	-	\$ -
REDES DE ACUEDUCTO														
4		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	ML	4.140,26	\$ 4.314,00	\$ 17.861.039,00	3.917,61	\$ 18.900.570,00			3.917,61	\$ 18.900.570,00	222,64	\$ 960.469,00
4.1		RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACIÓN	M3	1.035,06	\$ 43.398,00	\$ 44.919.534,00	932,60	\$ 40.468.635,00			932,60	\$ 40.468.635,00	102,46	\$ 4.450.899,00
4.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	112,90	\$ 98.753,00	\$ 11.109.713,00	112,21	\$ 11.081.074,00			112,21	\$ 11.081.074,00	0,29	\$ 28.638,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	931,96	\$ 169.093,00	\$ 158.153.338,00	845,52	\$ 122.064.604,00			845,52	\$ 122.064.604,00	286,04	\$ 54.088.734,00
4.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.204,50	\$ 44.843,00	\$ 54.016.991,00	1.203,57	\$ 53.971.690,00			1.203,57	\$ 53.971.690,00	1,01	\$ 45.291,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	310,52	\$ 78.783,00	\$ 24.468.802,00	279,75	\$ 22.042.342,00			279,75	\$ 22.042.342,00	30,77	\$ 2.424.461,00
4.6		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/M	327.192,73	\$ 2.309,00	\$ 755.464.921,00	221.081,62	\$ 510.477.922,00			221.081,62	\$ 510.477.922,00	106.100,91	\$ 244.998.996,00
4.7		TUBERÍA PVC DE 21" E INSTALACIÓN	ML	3.680,25	\$ 23.403,00	\$ 81.043.521,00	3.542,36	\$ 82.907.851,00			3.542,36	\$ 82.907.851,00	347,89	\$ 8.141.671,00
4.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN HD 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	\$ 1.148.570,00	\$ 1.148.570,00	1,00	\$ 1.148.570,00			1,00	\$ 1.148.570,00	-	\$ -
4.9		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 1/2"	UN	4,00	\$ 128.043,00	\$ 512.172,00	4,00	\$ 512.172,00			4,00	\$ 512.172,00	-	\$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 1/2"	UN	10,00	\$ 122.884,00	\$ 1.228.840,00	6,00	\$ 737.364,00			6,00	\$ 737.364,00	4,00	\$ 491.576,00
4.11		YEE PVC - PRESIÓN TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA	UN	2,00	\$ 140.168,00	\$ 280.336,00	2,00	\$ 280.336,00			2,00	\$ 280.336,00	-	\$ -
4.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC Ø2" UN	UN	5,00	\$ 94.930,00	\$ 474.650,00	5,00	\$ 474.650,00			5,00	\$ 474.650,00	-	\$ -
4.13		TAPON EN PVC- PRESIÓN TRABAJO 280 PSI/2"	UN	1,00	\$ 4.065,00	\$ 4.065,00	1,00	\$ 4.065,00			1,00	\$ 4.065,00	-	\$ -
4.14		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	2.394,41	\$ 52.355,00	\$ 122.204.423,00	2.125,41	\$ 111.275.841,00			2.125,41	\$ 111.275.841,00	208,74	\$ 10.928.833,00
4.15		ACOMETRIDA DOMIC. ACUED. 2"X12" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA 10M AGUAYTAY Y REGISTRO)	UND	25,00	\$ 265.183,00	\$ 6.629.575,00	25,00	\$ 6.629.575,00			25,00	\$ 6.629.575,00	-	\$ -
4.16				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO MAKAPAY	\$	\$ 1.307.518.690,00		\$ 980.971.281,00				\$ 326.547.420,00		
TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN														
5		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	7,44	\$ 98.753,00	\$ 734.722,00	7,44	\$ 734.722,00			7,44	\$ 734.722,00	-	\$ -
5.3		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	\$ 44.843,00	\$ 219.731,00	4,28	\$ 181.928,00			4,28	\$ 181.928,00	0,62	\$ 27.803,00
5.4		ZAPATA EN CONCRETO 207 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	2,03	\$ 1.591.805,00	\$ 3.231.364,00	2,03	\$ 3.231.364,00			2,03	\$ 3.231.364,00	-	\$ -
5.5		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	\$ 2.251.614,00	\$ 1.733.743,00	0,77	\$ 1.733.743,00			0,77	\$ 1.733.743,00	-	\$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 207 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	481,96	\$ 13.233,00	\$ 6.385.515,00	269,29	\$ 3.563.515,00			269,29	\$ 3.563.515,00	192,27	\$ 2.544.309,00
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KGCAL2 G60) INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,68	\$ 1.095.773,00	\$ 747.846,00	0,68	\$ 747.846,00			0,68	\$ 747.846,00	-	\$ -
5.8		SOLADO LIMEADO CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	KG	2.480,08	\$ 50.061,00	\$ 124.155.265,00			2.200,00	\$ 110.134.200,00	2.200,00	\$ 110.134.200,00	280,08	\$ 14.021.065,00
5.9		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	\$ 51.231,00	\$ 6.813.723,00			110,00	\$ 5.635.410,00	110,00	\$ 5.635.410,00	23,00	\$ 1.178.313,00
5.10		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	133,00	\$ 51.231,00	\$ 6.813.723,00			110,00	\$ 5.635.410,00	110,00	\$ 5.635.410,00	23,00	\$ 1.178.313,00
5.11		TUBERÍA PVC DE 21" 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,45	\$ 104.693,00	\$ 2.037.453,00							19,45	\$ 2.037.453,00
TOTAL TANQUE ELEVADO MAKAPAY					\$	\$ 168.330.572,00		\$ 10.203.118,00				\$ 125.872.728,00		
CERRAMIENTO PERIMETRAL														
6		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENIENCIA TOPOGRAFICA	M2	49,20	\$ 5.300,00	\$ 255.460,00	45,50	\$ 241.150,00			45,50	\$ 241.150,00	2,70	\$ 14.310,00
6.1		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	\$ 98.753,00	\$ 493.765,00	4,37	\$ 480.802,00			4,37	\$ 480.802,00	0,63	\$ 2.863,00
6.2		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 207 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	\$ 1.128.678,00	\$ 4.627.375,00	3,92	\$ 4.424.222,00			3,92	\$ 4.424.222,00	0,18	\$ 203.153,00
6.3		VIGA EN CONCRETO 207 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	2,28	\$ 1.705.560,00	\$ 3.888.677,00	2,18	\$ 3.718.121,00			2,18	\$ 3.718.121,00	0,10	\$ 170.556,00
6.4		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	\$ 2.251.614,00	\$ 427.807,00	0,19	\$ 427.807,00			0,19	\$ 427.807,00	-	\$ -
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 207 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	1,31	\$ 169.936,00	\$ 222.616,00	1,31	\$ 222.616,00			1,31	\$ 222.616,00	-	\$ -
6.6		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,38	\$ 1.591.805,00	\$ 604.886,00	0,38	\$ 604.886,00			0,38	\$ 604.886,00	-	\$ -
6.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KGCAL2 G60) INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	KG	375,41	\$ 13.233,00	\$ 4.967.801,00	374,22	\$ 4.952.053,00			374,22	\$ 4.952.053,00	1,19	\$ 15.747,00
6.8		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITO, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANILLO METÁLICO SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	\$ 815.572,00	\$ 815.572,00	1,00	\$ 815.572,00			1,00	\$ 815.572,00	-	\$ -
6.9		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,44	\$ 44.843,00	\$ 19.731,00	0,44	\$ 19.731,00			0,44	\$ 19.731,00	-	\$ -
6.10		SOLADO LIMEADO CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	\$ 1.095.773,00	\$ 65.986,00	0,06	\$ 65.986,00			0,06	\$ 65.986,00	-	\$ -
6.11		TUBO GALVANIZADO DE 2" (E=1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTI CORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	298,00	\$ 122.681,00	\$ 36.559.938,00	298,00	\$ 36.559.938,00			298,00	\$ 36.559.938,00	-	\$ -
6.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4" (1,5 MM) MALLA ESQUADRA 2X2	M2	9,84	\$ 334.950,00	\$ 3.295.908,00							9,84	\$ 3.295.908,00
6.13				TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL MAKAPAY	\$	\$ 58.244.532,00		\$ 1.043.653.483,00				\$ 52.541.884,00		\$ 3.702.837,00
TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL ANVALIBA					\$	\$ 1.043.653.483,00		\$ 1.043.653.483,00				\$ 1.193.925.193,00		\$ 728.037.936,00
COMUNIDAD ANVALIBA CENTRAL (10.000 - 11) (E=1,30)														
1 POZO PROFUNDO														
1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00			1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
1.1		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PESQUERA DE LUDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	\$ 2.892.980,00	\$ 2.892.980,00	1,00	\$ 2.892.980,00			1,00	\$ 2.892.980,00	-	\$ -
1.2		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 12" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LUDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	102,00	\$ 349.024,00	\$ 35.600.448,00	102,00	\$ 35.600.448,00			102,00	\$ 35.600.448,00	-	\$ -
1.3		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	102,00	\$ 134.131,00	\$ 13.681.362,00	102,00	\$ 13.681.362,00			102,00	\$ 13.681.362,00	-	\$ -
1.4				TOTAL POZO PROFUNDO ANVALIBA	\$	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00				\$ 139.220,00	-	\$ -

2011

CONDICIONES INICIALES																
Nº ITEM		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PERIGUO BI-42.206 AL	PRESENTE ACTA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA)	UND	1,00	\$ 3.993.053,00	\$ 3.993.053,00	1,00	\$ 3.993.053,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	\$ 502.845,00	\$ 51.280.190,00	102,00	\$ 51.280.190,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	60,00	\$ 320.453,00	\$ 21.149.880,00	60,00	\$ 21.149.880,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PIEDRA DE BOMBEO)	UND	1,00	\$ 3.765.869,00	\$ 3.765.869,00	1,00	\$ 3.765.869,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CAJERÍA DE POZO Y SELLO SANITARIO E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESIÓN	UND	1,00	\$ 1.668.279,00	\$ 1.668.279,00	1,00	\$ 1.668.279,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.10		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCAHEOS	ML	36,00	\$ 229.462,00	\$ 8.220.632,00	36,00	\$ 8.220.632,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	M3	5,94	\$ 562.175,00	\$ 3.339.320,00	5,94	\$ 3.139.937,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING,ABE COMPRIUNDO)	BTO	20,40	\$ 42.479,00	\$ 866.572,00	20,40	\$ 866.572,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.13		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	\$ 442.648,00	\$ 442.648,00	1,00	\$ 442.648,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.14		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA	UND	1,00	\$ 405.516,00	\$ 405.516,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.15		TOTAL POZO PROFUNDO ANUALIDAD CENTRAL				\$ 152.128.998,00		\$ 151.621.097,00						\$ 151.621.097,00		\$ 151.621.097,00
4		REDES DE ACUEDUCTO														
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN LOCALIZACIÓN CARTERÍA Y PLANOS	ML	3.747,00	\$ 4.314,00	\$ 16.164.598,00	3.747,00	\$ 16.164.598,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.2		RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACIÓN	M3	938,75	\$ 43.398,00	\$ 40.653.077,00	840,00	\$ 36.801.504,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	319,50	\$ 98.763,00	\$ 31.551.584,00	231,30	\$ 22.841.609,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.4		CANADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	843,08	\$ 189.095,00	\$ 159.422.213,00	597,48	\$ 111.089.931,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.017,60	\$ 44.843,00	\$ 45.632.237,00	1.017,60	\$ 45.632.237,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRIPOE TAMAÑO MAX 3"	M3	281,03	\$ 78.793,00	\$ 22.143.197,00	254,40	\$ 20.044.939,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	281,03	\$ 2.309,00	\$ 655.876.751,00	206.171,19	\$ 476.049.278,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.8		TUBERÍA PVC RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.037,00	\$ 23.403,00	\$ 71.074.911,00	3.037,00	\$ 71.074.911,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" INCLUYE CAJA VALV Y ANCLAJE EN CONCRETO	UN	1,00	\$ 1.148.970,00	\$ 1.148.970,00	1,00	\$ 1.148.970,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")	UN	5,00	\$ 128.043,00	\$ 640.215,00	5,00	\$ 640.215,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")	UN	10,00	\$ 122.884,00	\$ 1.228.840,00	7,00	\$ 860.258,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.12		TEE PVC - PRESIÓN TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")	UN	10,00	\$ 140.168,00	\$ 1.401.680,00	10,00	\$ 1.401.680,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC 827 UM TAPON EN PVC PRESIÓN TRABAJO 280 PSI (2")	UN	10,00	\$ 94.930,00	\$ 949.300,00	10,00	\$ 949.300,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC 827 UM TAPON EN PVC PRESIÓN TRABAJO 280 PSI (2")	UN	5,00	\$ 4.085,00	\$ 20.325,00	2,00	\$ 8.130,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.15		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.822,20	\$ 62.355,00	\$ 95.401.281,00	1.822,20	\$ 95.401.281,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
4.16		ACOMETIDA DÓMIC. ACUED. 2X12" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	71,00	\$ 265.183,00	\$ 18.827.993,00	71,00	\$ 18.827.993,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ANUALIDAD CENTRAL				\$ 1.192.138.842,00		\$ 910.935.934,00						\$ 918.935.954,00		\$ 243.200.888,00
6		TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN														
6.1		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	7,44	\$ 98.753,00	\$ 734.722,00	7,44	\$ 734.722,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.2		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	\$ 44.843,00	\$ 218.731,00	4,28	\$ 191.928,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.3		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	\$ 1.591.805,00	\$ 3.231.384,00	2,03	\$ 3.231.384,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.4		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	\$ 2.251.614,00	\$ 1.733.743,00	0,77	\$ 1.733.743,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.5		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (6200 KGCM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO EGUARDADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	M3	461,56	\$ 13.233,00	\$ 6.107.823,00	361,38	\$ 4.762.142,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.6		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO (3,6 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	\$ 1.099.773,00	\$ 747.846,00	0,68	\$ 747.846,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
		TOTAL TANQUE ELEVADO ANUALIDAD CENTRAL				\$ 207.356.301,00		\$ 114.217.450,00						\$ 114.217.450,00		\$ 195.934.857,00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL														
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIÓNAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	\$ 5.300,00	\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	\$ 98.753,00	\$ 493.765,00	4,00	\$ 395.012,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.3		CONCRETO CICLOFONO 3000 PSI - 20,7 MPA. PIEDRA PROPORCIÓN 60%ZAP. MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	\$ 1.128.628,00	\$ 4.627.375,00	3,50	\$ 3.950.198,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.4		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	\$ 1.591.805,00	\$ 604.886,00	0,38	\$ 604.886,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.5		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (6200 KGCM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO EGUARDADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	376,41	\$ 13.233,00	\$ 4.967.801,00	200,00	\$ 2.646.600,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.6		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,50 X 0,50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	\$ 815.572,00	\$ 815.572,00	1,00	\$ 815.572,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.7		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,44	\$ 44.843,00	\$ 19.731,00	0,40	\$ 17.937,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
6.8		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO (3,6 Mpa (2000 PSI)	M3	0,08	\$ 1.099.773,00	\$ 85.985,00	0,08	\$ 85.985,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
		TOTAL CERRAMIENTO ANUALIDAD CENTRAL				\$ 68.244.822,00		\$ 8.751.031,00						\$ 8.751.031,00		\$ 47.482.971,00
		TOTAL COMUNIDAD ANUALIDAD CENTRAL				\$ 1.795.001.801,00		\$ 1.090.830.447,00						\$ 1.090.830.447,00		\$ 704.371.355,00
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (0400 - 041) (E2-120)																
1		POZO PROFUNDO														
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LÓDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	\$ 2.882.980,00	\$ 2.882.980,00	1,00	\$ 2.882.980,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 1 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LOS DOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	96,00	\$ 346.094,00	\$ 33.506.304,00	96,00	\$ 33.506.304,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	96,00	\$ 134.131,00	\$ 12.876.576,00	96,00	\$ 12.876.576,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA)	UND	1,00	\$ 3.993.053,00	\$ 3.993.053,00	1,00	\$ 3.993.053,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	96,00	\$ 502.845,00	\$ 48.273.120,00	96,00	\$ 48.273.120,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -

Página 4

11023

CONDICIONES INICIALES																						
Nº ITEM		ITEM DE PAGO		DESCRIPCIÓN		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		PERIODO 01/01/2024 AL 30/09/2024		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TANIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALÇARÉOS.		M3	5.46	\$ 562.175,00	\$	3.069.476,00	\$	5,15	\$ 2.695.201,00	\$			\$	2.895.201,00			0,31	\$	174.274,00	
1.12		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO		BTO	18,80	\$ 42.476,00	\$	798.605,00	\$	18,00	\$ 784.622,00	\$			\$	784.622,00			0,80	\$	33.983,00	
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING ARE CONCRETO)		UND	1,00	\$ 4.282.909,00	\$	4.282.909,00	\$	1,00	\$ 4.282.909,00	\$			\$	4.282.909,00			-	\$	-	
1.14		DESINFECCION DEL POZO (DOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO)		UND	1,00	\$ 442.648,00	\$	442.648,00	\$	1,00	\$ 442.648,00	\$			\$	442.648,00			-	\$	-	
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA		UND	1,00	\$ 405.516,00	\$	405.516,00	\$	1,00	\$ 405.516,00	\$			\$	405.516,00			-	\$	-	
		TOTAL POZO PROFUNDO FACUNAE				\$ 141.339.681,00	\$	141.339.681,00	\$		\$ 137.688.104,00	\$			\$	137.688.104,00			-	\$	3.680.456,00	
4		REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	684,00	\$ 4.314,00	\$	2.950.776,00	\$	684,00	\$ 2.950.776,00	\$			\$	2.950.776,00			684,00	\$	-	\$
4.2		RETIRO DE SOBRESANTES DE EXCAVACION		M3	171,00	\$ 43.398,00	\$	7.421.058,00	\$	142,25	\$ 6.173.366,00	\$			\$	6.173.366,00			28,75	\$	1.247.692,00	
4.3		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	103,50	\$ 98.755,00	\$	10.220.936,00	\$	69,00	\$ 6.813.957,00	\$			\$	6.813.957,00			34,50	\$	3.406.979,00	
4.4		CAMADA EN ARENA PARA ORIENTACION DE TUBERIAS		M3	153,50	\$ 159.095,00	\$	24.401.721,00	\$	99,63	\$ 18.649.454,00	\$			\$	18.649.454,00			53,87	\$	10.452.226,00	
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION CONCRETION		M3	170,70	\$ 44.843,00	\$	7.654.700,00	\$	170,70	\$ 7.654.700,00	\$			\$	7.654.700,00			-	\$	-	
4.6		RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION CONCRETION		M3	51,30	\$ 78.793,00	\$	4.042.081,00	\$	42,67	\$ 3.361.703,00	\$			\$	3.361.703,00			8,63	\$	660.378,00	
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3	59,81	\$ 2.908,00	\$	173.596,00	\$	42,68	\$ 2.100,00	\$			\$	97.357.030,00			17,13	\$	40.568.156,00	
4.8		TUBERIA PVC Ø 21" 2" INSTALACION		ML	454,00	\$ 23.403,00	\$	10.624.952,00	\$	454,00	\$ 10.624.952,00	\$			\$	10.624.952,00			-	\$	-	
4.9		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)		UN	1,00	\$ 1.148.570,00	\$	1.148.570,00	\$	-	\$ -	\$			\$	-			1,00	\$	1.148.570,00	
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2")		UN	3,00	\$ 128.043,00	\$	384.129,00	\$	3,00	\$ 384.129,00	\$			\$	384.129,00			-	\$	-	
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2")		UN	1,00	\$ 122.894,00	\$	122.894,00	\$	1,00	\$ 122.894,00	\$			\$	122.894,00			-	\$	-	
4.12		UNION MECANICA X LISO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2"x2")		UN	2,00	\$ 140.166,00	\$	280.336,00	\$	2,00	\$ 280.336,00	\$			\$	280.336,00			-	\$	-	
4.13		SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION EN PVC Ø 21"		UN	2,00	\$ 94.935,00	\$	189.870,00	\$	2,00	\$ 189.870,00	\$			\$	189.870,00			-	\$	-	
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")		UN	3,00	\$ 4.065,00	\$	12.195,00	\$	3,00	\$ 12.195,00	\$			\$	12.195,00			-	\$	-	
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE		M3	272,40	\$ 52.955,00	\$	14.381.502,00	\$	272,40	\$ 14.381.502,00	\$			\$	14.381.502,00			-	\$	-	
4.16		ACOMETIDA DOMIC. AGUED. 2"x1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA Y/O ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	23,00	\$ 285.183,00	\$	6.599.209,00	\$	22,00	\$ 5.834.026,00	\$			\$	5.834.026,00			1,00	\$	265.183,00	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO FACUNAE				\$ 232.651.174,00	\$	232.651.174,00	\$		\$ 174.880.950,00	\$			\$	174.880.950,00			-	\$	57.870.185,00	
5		TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION																	-	\$	-	
5.3		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=2-0,0 M INCLUYE CARGUE		M3	7,44	\$ 98.755,00	\$	734.722,00	\$	7,44	\$ 734.722,00	\$			\$	734.722,00			-	\$	-	
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION CONCRETION		M3	4,90	\$ 44.843,00	\$	218.731,00	\$	4,28	\$ 191.926,00	\$			\$	191.926,00			0,62	\$	27.803,00	
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA		M3	2,03	\$ 1.591.805,00	\$	3.231.364,00	\$	2,03	\$ 3.231.364,00	\$			\$	3.231.364,00			-	\$	-	
5.6		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	0,77	\$ 2.251.614,00	\$	1.733.743,00	\$	0,77	\$ 1.733.743,00	\$			\$	1.733.743,00			-	\$	-	
5.7		ACERO REFORZO FY= 4200 Mpa (6000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	461,56	\$ 13.233,00	\$	6.107.823,00	\$	190,69	\$ 2.523.401,00	\$			\$	2.523.401,00			270,87	\$	3.584.422,00	
5.8		SUMINISTRO FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE ISOLADO, EMPLEO CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)		M3	0,50	\$ 1.089.775,00	\$	544.887,50	\$	0,68	\$ 727.845,00	\$			\$	727.845,00			-	\$	-	
		TOTAL TANQUE ELEVADO FACUNAE				\$ 198.353.593,00	\$	198.353.593,00	\$		\$ 9.163.004,00	\$			\$	9.163.004,00			-	\$	159.200.526,00	
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL																	-	\$	-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVECCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA		M2	48,20	\$ 5.300,00	\$	255.460,00	\$	48,20	\$ 255.460,00	\$			\$	255.460,00			-	\$	-	
		TOTAL CERRAMIENTO FACUNAE				\$ 615.504.393,00	\$	615.504.393,00	\$		\$ 321.758.558,00	\$			\$	321.758.558,00			-	\$	55.980.092,00	
		TOTAL COMUNIDAD FACUNAE				\$ 7.702.931.811,00	\$	7.702.931.811,00	\$		\$ 2.551.513.951,00	\$			\$	2.551.513.951,00			-	\$	433.845.836,00	
RESERVAR DOMICILIOS																						
COMUNIDAD OLIVOS (10.000 - 11) (F.Z. 134)																						
1		POZO PROFUNDO																	-	\$	-	
1.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$ 140.909,00	\$	140.909,00	\$	1,00	\$ 140.909,00	\$			\$	140.909,00			-	\$	-	
		TOTAL POZO PROFUNDO OLIVOS				\$ 154.397.738,00	\$	154.397.738,00	\$		\$ 140.909,00	\$			\$	140.909,00			-	\$	154.256.829,00	
4		REDES DE ACUEDUCTO																	-	\$	-	
4.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	3.250,85	\$ 4.347,00	\$	14.131.445,00	\$	3.250,85	\$ 14.131.445,00	\$			\$	14.131.445,00			-	\$	-	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO OLIVOS				\$ 1.165.031.429,00	\$	1.165.031.429,00	\$		\$ 14.131.445,00	\$			\$	14.131.445,00			-	\$	1.140.951.984,00	
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL																	-	\$	-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVECCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA		M2	48,20	\$ 5.357,00	\$	258.207,00	\$	48,20	\$ 258.207,00	\$			\$	258.207,00			-	\$	-	
		TOTAL CERRAMIENTO OLIVOS				\$ 57.683.364,00	\$	57.683.364,00	\$		\$ 258.207,00	\$			\$	258.207,00			-	\$	57.310.157,00	
		TOTAL COMUNIDAD OLIVOS				\$ 1.802.801.878,00	\$	1.802.801.878,00	\$		\$ 14.530.551,00	\$			\$	14.530.551,00			-	\$	1.788.271.117,00	
COMUNIDAD PARASO (0000 - 11) (F.Z. 134)																						
1		POZO PROFUNDO																	-	\$	-	
1.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$ 140.909,00	\$	140.909,00	\$	1,00	\$ 140.909,00	\$			\$	140.909,00			-	\$	-	
		TOTAL POZO PROFUNDO PARASO				\$ 198.906.511,00	\$	198.906.511,00	\$		\$ 140.909,00	\$			\$	140.909,00			-	\$	189.766.602,00	
4		REDES DE ACUEDUCTO																	-	\$	-	
4.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	2.606,01	\$ 4.347,00	\$	11.326.325,00	\$	2.606,01	\$ 11.326.325,00	\$			\$	11.326.325,00			-	\$	-	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PARASO				\$ 912.843.267,00	\$	912.843.267,00	\$		\$ 11.326.325,00	\$			\$	11.326.325,00			-	\$	901.514.942,00	
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL																	-	\$	-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVECCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA		M2	48,20	\$ 5.357,00	\$	258.207,00	\$	48,20	\$ 258.207,00	\$			\$	258.207,00			-	\$	-	
		TOTAL CERRAMIENTO PARASO				\$ 57.683.364,00	\$	57.683.364,00	\$		\$ 258.207,00	\$			\$	258.207,00			-	\$	67.310.157,00	
		TOTAL COMUNIDAD PARASO				\$ 1.631.595.233,00	\$	1.631.595.233,00	\$		\$ 11.727.441,00	\$			\$	11.727.441,00			-	\$	1.571.841.852,00	
COMUNIDAD BUENAVISTA (0000 - 04) (F.Z. 135)																						
1		POZO PROFUNDO																	-	\$	-	
1.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$ 140.909,00	\$	140.909,00	\$	1,00	\$ 140.909,00	\$			\$	140.909,00			-	\$	-	
		TOTAL POZO PROFUNDO BUENAVISTA				\$ 194.871.869,00	\$	194.871.869,00	\$		\$ 140.909,00	\$			\$	140.909,00			-	\$	154.537.804,00	
4		REDES DE ACUEDUCTO																	-	\$	-	
4.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	826,58	\$ 4.347,00	\$	3.593.143,00	\$	826,58	\$ 3.593.143,00	\$			\$	3.593.143,00			-	\$	-	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BUENAVISTA				\$ 293.023.877,00	\$	293.023.877,00	\$		\$ 3.593.143,00	\$			\$	3.593.143,00			-	\$	269.430.734,00	
8		CERRAMIENTO PERIMETRAL																	-	\$	-	

2011

CONDICIONES INICIALES										ACTAS ANTERIORES			PERIODO 01-02-2014 AL 28-02-2015			AVANCE ACUMULADO			CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR		
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	OBRA	M2	48.20	\$ 5.326.00	\$ 258.810.00	48.20	\$ 258.810.00		\$ -	48.20	\$ 258.810.00		\$ -	48.20	\$ 258.810.00		\$ -		\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO BUENAVISTA						\$ 55.906.420.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL COMUNIDAD BUENAVISTA						\$ 874.933.775.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COMUNIDAD VILLAMARCA (6000 - 13) (F.Z. 134)																					
1	POZO PROFUNDO																				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	CONSTRUCCIÓN DE	UND	1.00	\$ 140.909.00	\$ 140.909.00	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -		\$ -	
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE	PISCINA DE LÓDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1.00	\$ 2.959.841.00	\$ 2.959.841.00	1.00	\$ 2.959.841.00		\$ -	1.00	\$ 2.959.841.00		\$ -	1.00	\$ 2.959.841.00		\$ -		\$ -	
1.3	PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN	DIRECTA POR LÓDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	141.00	\$ 357.987.00	\$ 50.476.167.00	50.00	\$ 17.889.350.00	70.00	\$ 25.059.090.00	120.00	\$ 42.968.440.00	21.00	\$ 7.517.727.00	21.00	\$ 7.517.727.00	21.00	\$ 7.517.727.00	21.00	\$ 7.517.727.00	
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	141.00	\$ 138.935.00	\$ 19.307.835.00	50.00	\$ 6.846.750.00	70.00	\$ 9.595.450.00	120.00	\$ 16.432.200.00	21.00	\$ 2.875.935.00	21.00	\$ 2.875.935.00	21.00	\$ 2.875.935.00	21.00	\$ 2.875.935.00	
1.5	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	141.00	\$ 517.371.00	\$ 72.949.311.00	50.00	\$ 25.888.550.00	70.00	\$ 38.215.970.00	120.00	\$ 62.084.520.00	21.00	\$ 10.864.791.00	21.00	\$ 10.864.791.00	21.00	\$ 10.864.791.00	21.00	\$ 10.864.791.00	
TOTAL POZO PROFUNDO VILLAMARCA						\$ 209.338.132.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
4	REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	COMISIÓN	ML	2.225.57	\$ 9.674.553.00	\$ 9.674.553.00	2.225.57	\$ 9.674.553.00		\$ -	2.225.57	\$ 9.674.553.00		\$ -	2.225.57	\$ 9.674.553.00		\$ -		\$ -	
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO VILLAMARCA						\$ 781.393.859.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	OBRA	M2	48.20	\$ 5.327.00	\$ 258.207.00	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -		\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO VILLAMARCA						\$ 67.668.384.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL COMUNIDAD VILLAMARCA						\$ 1.497.518.506.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COMUNIDAD LAS BRISAS (6000 - 0.61) (F.Z. 134)																					
1	POZO PROFUNDO																				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	CONSTRUCCIÓN DE	UND	1.00	\$ 140.909.00	\$ 140.909.00	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -		\$ -	
TOTAL POZO PROFUNDO BRISAS						\$ 208.870.223.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
4	REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	COMISIÓN	ML	715.07	\$ 3.108.409.00	\$ 3.108.409.00	715.07	\$ 3.108.409.00		\$ -	715.07	\$ 3.108.409.00		\$ -	715.07	\$ 3.108.409.00		\$ -		\$ -	
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BRISAS						\$ 284.196.816.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	OBRA	M2	48.20	\$ 5.327.00	\$ 258.207.00	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -		\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO BRISAS						\$ 67.668.384.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL COMUNIDAD BRISAS						\$ 902.890.144.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COMUNIDAD CUMARALITO (6000 - 0.61) (F.Z. 134)																					
1	POZO PROFUNDO																				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	CONSTRUCCIÓN DE	UND	1.00	\$ 140.909.00	\$ 140.909.00	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -		\$ -	
TOTAL POZO PROFUNDO CUMARALITO						\$ 213.484.201.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
4	REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	COMISIÓN	ML	2.172.98	\$ 9.445.944.00	\$ 9.445.944.00	2.172.98	\$ 9.445.944.00		\$ -	2.172.98	\$ 9.445.944.00		\$ -	2.172.98	\$ 9.445.944.00		\$ -		\$ -	
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMARALITO						\$ 788.947.200.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	OBRA	M2	48.20	\$ 5.327.00	\$ 258.207.00	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -		\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO CUMARALITO						\$ 67.668.384.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL COMUNIDAD CUMARALITO						\$ 1.453.350.916.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COMUNIDAD YATORROBO (6000 - 0.61) (F.Z. 134)																					
1	POZO PROFUNDO																				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	CONSTRUCCIÓN DE	UND	1.00	\$ 140.909.00	\$ 140.909.00	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -		\$ -	
TOTAL POZO PROFUNDO YATORROBO						\$ 216.249.578.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
4	REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	COMISIÓN	ML	1.846.80	\$ 4.347.00	\$ 8.028.474.00	1.846.80	\$ 8.028.474.00		\$ -	1.846.80	\$ 8.028.474.00		\$ -	1.846.80	\$ 8.028.474.00		\$ -		\$ -	
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO YATORROBO						\$ 659.972.829.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	OBRA	M2	48.20	\$ 5.327.00	\$ 258.207.00	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -		\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO YATORROBO						\$ 67.668.384.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL COMUNIDAD YATORROBO						\$ 1.308.816.212.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COMUNIDAD CERRITO (6000 - 0.61) (F.Z. 134)																					
1	POZO PROFUNDO																				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	CONSTRUCCIÓN DE	UND	1.00	\$ 140.909.00	\$ 140.909.00	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -		\$ -	
TOTAL POZO PROFUNDO CERRITO						\$ 211.109.447.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
4	REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	COMISIÓN	ML	522.06	\$ 4.347.00	\$ 2.269.395.00	522.06	\$ 2.269.395.00		\$ -	522.06	\$ 2.269.395.00		\$ -	522.06	\$ 2.269.395.00		\$ -		\$ -	
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CERRITO						\$ 201.835.702.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL TOPOGRAFICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	OBRA	M2	48.20	\$ 5.327.00	\$ 258.207.00	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -	48.20	\$ 258.207.00		\$ -		\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO CERRITO						\$ 67.668.384.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL COMUNIDAD CERRITO						\$ 846.539.154.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN (6000 - 0.61) (F.Z. 134)																					
1	POZO PROFUNDO																				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	CONSTRUCCIÓN DE	UND	1.00	\$ 140.909.00	\$ 140.909.00	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -	1.00	\$ 140.909.00		\$ -		\$ -	
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE	PISCINA DE LÓDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1.00	\$ 2.959.841.00	\$ 2.959.841.00	1.00	\$ 2.959.841.00		\$ -	1.00	\$ 2.959.841.00		\$ -	1.00	\$ 2.959.841.00		\$ -		\$ -	
1.3	PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN	DIRECTA POR LÓDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	150.00	\$ 357.987.00	\$ 53.698.050.00	150.00	\$ 53.698.050.00		\$ -	150.00	\$ 53.698.050.00		\$ -	150.00	\$ 53.698.050.00		\$ -		\$ -	
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	150.00	\$ 138.935.00	\$ 20.840.250.00	142.50	\$ 19.813.233.00	7.50	\$ 1.027.013.00	150.00	\$ 20.840.250.00		\$ -	150.00	\$ 20.840.250.00		\$ -		\$ -	
1.5	ELECCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA	UND	1.00	\$ 4.064.604.00	\$ 4.064.604.00	1.00	\$ 4.064.604.00		\$ -	1.00	\$ 4.064.604.00		\$ -	1.00	\$ 4.064.604.00		\$ -		\$ -	
1.6	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	150.00	\$ 517.371.00	\$ 77.605.650.00	150.00	\$ 77.605.650.00		\$ -	15										

CONDICIONES INICIALES										ACTAS ANTERIORES			PRESUPUESTO 2020-2021			PRESUPUESTO 2020-2021			ANEXOS ACUMULADO			CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR		
Nº ÍTEMA	ÍTEMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC Ø2" UN		UN	3,00	\$ 96.976,00	\$ 290.928,00	-	\$ -	290.928,00	3,00	\$ 290.928,00	290.928,00	-	\$ -	290.928,00	-	\$ -	290.928,00	3,00	\$ 290.928,00	290.928,00	-	\$ -	290.928,00
4.14	TAPÓN EN PVC-PRESIÓN TRABAJO 200 PSI (2")		UN	1,00	\$ 4.191,00	\$ 4.191,00	-	\$ -	4.191,00	1,00	\$ 4.191,00	4.191,00	-	\$ -	4.191,00	-	\$ -	4.191,00	1,00	\$ 4.191,00	4.191,00	-	\$ -	4.191,00
4.15	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	775,91	\$ 53.911,00	\$ 41.830.084,00	592,80	\$ 31.559.441,00	41.830.084,00	183,11	\$ 9.871.643,00	9.871.643,00	775,91	\$ 41.830.084,00	41.830.084,00	775,91	\$ 41.830.084,00	41.830.084,00	775,91	\$ 41.830.084,00	41.830.084,00	-	\$ -	41.830.084,00
4.16	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X12" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	20,00	\$ 273.340,00	\$ 5.466.840,00	-	\$ -	5.466.840,00	20,00	\$ 5.466.840,00	5.466.840,00	-	\$ -	5.466.840,00	-	\$ -	5.466.840,00	20,00	\$ 5.466.840,00	5.466.840,00	-	\$ -	5.466.840,00
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO DELICIAS					\$ 541.848.978,00			\$ 541.848.978,00			\$ 541.848.978,00			\$ 541.848.978,00			\$ 541.848.978,00			\$ 541.848.978,00			\$ 541.848.978,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																							
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICAS (Ø12) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	\$ 5.357,00	\$ 258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	-	\$ -	258.207,00
	TOTAL CERRAMIENTO DELICIAS					\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00
	TOTAL COMUNIDAD DELICIAS					\$ 1.199.171.322,00			\$ 1.199.171.322,00			\$ 1.199.171.322,00			\$ 1.199.171.322,00			\$ 1.199.171.322,00			\$ 1.199.171.322,00			\$ 1.199.171.322,00
1	POZO PROFUNDO																							
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$ 140.909,00	\$ 140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	140.909,00	-	\$ -	140.909,00
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE Lodos Y TRABAJOS PREPARATORIOS		UND	1,00	\$ 2.959.841,00	\$ 2.959.841,00	1,00	\$ 2.959.841,00	2.959.841,00	1,00	\$ 2.959.841,00	2.959.841,00	1,00	\$ 2.959.841,00	2.959.841,00	1,00	\$ 2.959.841,00	2.959.841,00	1,00	\$ 2.959.841,00	2.959.841,00	-	\$ -	2.959.841,00
1.3	PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR Lodos PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	142,00	\$ 357.987,00	\$ 50.834.154,00	142,00	\$ 50.834.154,00	50.834.154,00	142,00	\$ 50.834.154,00	50.834.154,00	142,00	\$ 50.834.154,00	50.834.154,00	142,00	\$ 50.834.154,00	50.834.154,00	142,00	\$ 50.834.154,00	50.834.154,00	-	\$ -	50.834.154,00
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	142,00	\$ 138.935,00	\$ 19.444.770,00	142,00	\$ 19.444.770,00	19.444.770,00	142,00	\$ 19.444.770,00	19.444.770,00	142,00	\$ 19.444.770,00	19.444.770,00	142,00	\$ 19.444.770,00	19.444.770,00	142,00	\$ 19.444.770,00	19.444.770,00	-	\$ -	19.444.770,00
1.5	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELECTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, DATOS SÍMULA)		UND	1,00	\$ 4.064.604,00	\$ 4.064.604,00	1,00	\$ 4.064.604,00	4.064.604,00	1,00	\$ 4.064.604,00	4.064.604,00	1,00	\$ 4.064.604,00	4.064.604,00	1,00	\$ 4.064.604,00	4.064.604,00	1,00	\$ 4.064.604,00	4.064.604,00	-	\$ -	4.064.604,00
1.6	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA-HARTA 12 1/2"		ML	142,00	\$ 517.371,00	\$ 73.466.692,00	142,00	\$ 73.466.692,00	73.466.692,00	142,00	\$ 73.466.692,00	73.466.692,00	142,00	\$ 73.466.692,00	73.466.692,00	142,00	\$ 73.466.692,00	73.466.692,00	142,00	\$ 73.466.692,00	73.466.692,00	-	\$ -	73.466.692,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M		ML	103,00	\$ 327.083,00	\$ 33.689.549,00	93,00	\$ 30.418.719,00	33.689.549,00	10,00	\$ 3.270.830,00	3.270.830,00	93,00	\$ 30.418.719,00	30.418.719,00	10,00	\$ 3.270.830,00	3.270.830,00	93,00	\$ 30.418.719,00	30.418.719,00	10,00	\$ 3.270.830,00	3.270.830,00
1.8	AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)		UND	1,00	\$ 3.853.671,00	\$ 3.853.671,00	1,00	\$ 3.853.671,00	3.853.671,00	1,00	\$ 3.853.671,00	3.853.671,00	1,00	\$ 3.853.671,00	3.853.671,00	1,00	\$ 3.853.671,00	3.853.671,00	1,00	\$ 3.853.671,00	3.853.671,00	-	\$ -	3.853.671,00
1.9	CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRUVALLORES		UND	1,00	\$ 1.685.429,00	\$ 1.685.429,00	1,00	\$ 1.685.429,00	1.685.429,00	1,00	\$ 1.685.429,00	1.685.429,00	1,00	\$ 1.685.429,00	1.685.429,00	1,00	\$ 1.685.429,00	1.685.429,00	1,00	\$ 1.685.429,00	1.685.429,00	-	\$ -	1.685.429,00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M		ML	39,00	\$ 243.661,00	\$ 9.502.779,00	39,00	\$ 9.502.779,00	9.502.779,00	39,00	\$ 9.502.779,00	9.502.779,00	39,00	\$ 9.502.779,00	9.502.779,00	39,00	\$ 9.502.779,00	9.502.779,00	39,00	\$ 9.502.779,00	9.502.779,00	-	\$ -	9.502.779,00
1.11	REPLANTEO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC 6" RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M		M3	8,34	\$ 576.780,00	\$ 4.810.345,00	8,34	\$ 4.810.345,00	4.810.345,00	8,34	\$ 4.810.345,00	4.810.345,00	8,34	\$ 4.810.345,00	4.810.345,00	8,34	\$ 4.810.345,00	4.810.345,00	8,34	\$ 4.810.345,00	4.810.345,00	0,37	\$ 328.764,00	328.764,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADORA Y DE RELLENO		ETO	28,40	\$ 43.532,00	\$ 1.236.309,00	28,40	\$ 1.236.309,00	1.236.309,00	28,40	\$ 1.236.309,00	1.236.309,00	28,40	\$ 1.236.309,00	1.236.309,00	28,40	\$ 1.236.309,00	1.236.309,00	28,40	\$ 1.236.309,00	1.236.309,00	-	\$ -	1.236.309,00
1.13	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING/AIRE COMPRIMIDO)		UND	1,00	\$ 4.410.001,00	\$ 4.410.001,00	1,00	\$ 4.410.001,00	4.410.001,00	1,00	\$ 4.410.001,00	4.410.001,00	1,00	\$ 4.410.001,00	4.410.001,00	1,00	\$ 4.410.001,00	4.410.001,00	1,00	\$ 4.410.001,00	4.410.001,00	-	\$ -	4.410.001,00
1.14	DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPÓCLORITO DE SODIO)		UND	1,00	\$ 452.051,00	\$ 452.051,00	1,00	\$ 452.051,00	452.051,00	1,00	\$ 452.051,00	452.051,00	1,00	\$ 452.051,00	452.051,00	1,00	\$ 452.051,00	452.051,00	1,00	\$ 452.051,00	452.051,00	-	\$ -	452.051,00
1.15	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA		UND	1,00	\$ 417.994,00	\$ 417.994,00	1,00	\$ 417.994,00	417.994,00	1,00	\$ 417.994,00	417.994,00	1,00	\$ 417.994,00	417.994,00	1,00	\$ 417.994,00	417.994,00	1,00	\$ 417.994,00	417.994,00	-	\$ -	417.994,00
	TOTAL POZO PROFUNDO CACHANITAS					\$ 210.984.038,00			\$ 210.984.038,00			\$ 210.984.038,00			\$ 210.984.038,00			\$ 210.984.038,00			\$ 210.984.038,00			\$ 210.984.038,00
4	REDES DE ACUEDUCTO																							
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERÍA Y PLANOS		ML	1.169,03	\$ 5.081.773,00	\$ 5.981.773,00	1.169,03	\$ 5.981.773,00	5.981.773,00	1.169,03	\$ 5.981.773,00	5.981.773,00	1.169,03	\$ 5.981.773,00	5.981.773,00	1.169,03	\$ 5.981.773,00	5.981.773,00	1.169,03	\$ 5.981.773,00	5.981.773,00	-	\$ -	5.981.773,00
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CACHANITAS					\$ 429.167.490,00			\$ 429.167.490,00			\$ 429.167.490,00			\$ 429.167.490,00			\$ 429.167.490,00			\$ 429.167.490,00			\$ 429.167.490,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																							
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICAS (Ø12) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	\$ 5.357,00	\$ 258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	258.207,00	-	\$ -	258.207,00
	TOTAL CERRAMIENTO CACHANITAS					\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00			\$ 57.668.364,00
	TOTAL COMUNIDAD CACHANITAS					\$ 1.072.720.433,00			\$ 1.072.720.433,00			\$ 1.072.720.433,00			\$ 1.072.720.433,00			\$ 1.072.720.433,00			\$ 1.072.720.433,00			\$ 1.072.720.433,00
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CACHANITAS					\$ 1.427.050.950,00			\$ 1.427.050.950,00			\$ 1.427.050.950,00			\$ 1.427.050.950,00			\$ 1.427.050.950,00			\$ 1.427.050.950,00			\$ 1.427.050.950,00
RESGUARDO WACROY																								
1	POZO PROFUNDO																							
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$ 135.845,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	135.845,00	-	\$ -	135.845,00
	TOTAL POZO PROFUNDO KALIMBAY					\$ 135.845,00			\$ 135.845,00			\$ 135.845,00			\$ 135.845,00			\$ 135.845,00			\$ 135.845,00			\$ 135.845,00
4	REDES DE ACUEDUCTO																							
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERÍA Y PLANOS		ML	4.974,57	\$ 21.141.923,00	\$ 105.719.923,00	4.974,57	\$ 105.719.923,00	105.719.923,00	4.974,57	\$ 105.719.923,00	105.719.923,00	4.974,57	\$ 105.719.923,00	105.719.923,00	4.974,57	\$ 105.719.923,00	105.719.923,00	4.974,57	\$ 105.719.923,00	105.719.923,00	-	\$ -	105.719.923,00
4.2	RETIRO DE SOBRESANTES DE EXCAVACIÓN		M3	1.243,64	\$ 50.849.726,00	\$ 62.949.726,00	1.189,43	\$ 48.441.916,00	62.949.726,00	1.189,43	\$ 48.441.916,00	48.441.916,00	1.189,43	\$ 48.441.916,00	48.441.916,00	1.189,43	\$ 48.441.916,00	48.441.916,00	1.189,43	\$ 48.441.916,00	48.441.916,00	54,21	\$ 2.207.811,00	2.207.811,00
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	193,50	\$ 98.525,00	\$ 19.064.598,00	128,10	\$ 12.621.053,00	19.064.598,00	128,10	\$ 12.621.053,00	12.621.053,00	128,10	\$ 12.621.053,00	12.621.053,00	128,10	\$ 12.621.053,00	12.621.053,00	128,10	\$ 12.621.053,00	12.621.053,00	65,40	\$ 6.443.515,00	6.443.515,00
4.4	CANAL EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS		M3	1																				

11027

CONDICIONES INICIALES																						
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	PREVISTA ACTA	PERIODO 01-03-2024 AL 24-02-2024	ANEXOS ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL						
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 MPa (4200 KG/CM2 GRD) INCLUYE SUMINISTRO, FIBRADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	M3	461.58	\$ 12,584.00	\$ 5,808,271.00	361.38	\$ 4,547,606.00			\$	361.38	\$ 4,547,606.00	100.18	\$ 1,260,665.00							
5.8		SOLDADO LÍMPIEZA CONCRETO (13.8 Mpa (2000 PSI))	M3	0.68	\$ 1,040,516.00	\$	0.68	\$ 707,573.00			\$	0.68	\$ 707,573.00	-	\$		1,260,665.00					
		TOTAL TANTOQUE ELEVADO KALIMVRAE				\$ 197,235,148.00		\$ 10,887,183.00			\$		\$ 10,887,183.00	-	\$		186,407,982.00					
6.		CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICAS (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,186.00	\$	45.50	\$ 235,963.00			\$	45.50	\$ 235,963.00	2.70	\$ 14,902.00							
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	5.00	\$ 98,625.00	\$	4.97	\$ 489,669.00			\$	4.97	\$ 489,669.00	0.03	\$ 2,958.00							
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 1:2:4	M3	4.10	\$ 1,074,542.00	\$	3.92	\$ 4,212,205.00			\$	3.92	\$ 4,212,205.00	0.18	\$ 183,118.00							
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	2.28	\$ 1,814,244.00	\$	2.18	\$ 3,518,092.00			\$	2.18	\$ 3,518,092.00	0.10	\$ 161,424.00							
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	0.19	\$ 2,146,100.00	\$	0.19	\$ 407,759.00			\$	0.19	\$ 407,759.00	-	\$							
6.6		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.31	\$ 161,015.00	\$	1.31	\$ 210,950.00			\$	1.31	\$ 210,950.00	-	\$							
6.7		RELLENO CON GRAVILLA	M3	0.38	\$ 1,506,464.00	\$	0.38	\$ 572,457.00			\$	0.38	\$ 572,457.00	-	\$							
6.8		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	KG	375.41	\$ 12,584.00	\$	374.22	\$ 4,760,184.00			\$	374.22	\$ 4,760,184.00	1.19	\$ 14,975.00							
6.9		ACERO REFUERZO FY= 4200 MPa (4200 KG/CM2 GRD) INCLUYE SUMINISTRO, FIBRADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	UND	1.00	\$ 780,751.00	\$	1.00	\$ 780,751.00			\$	1.00	\$ 780,751.00	-	\$							
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0.44	\$ 44,004.00	\$	0.44	\$ 19,382.00			\$	0.44	\$ 19,382.00	-	\$							
6.11		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	0.06	\$ 1,004,548.00	\$	0.06	\$ 60,273.00			\$	0.06	\$ 60,273.00	-	\$							
6.12		SOLDADO LÍMPIEZA CONCRETO (13.8 Mpa (2000 PSI))	UND	298.00	\$ 116,767.00	\$	298.00	\$ 34,796,566.00			\$	298.00	\$ 34,796,566.00	-	\$							
		TOTAL CERRAMIENTO KALIMVRAE				\$ 62,593,681.00		\$ 60,014,171.00			\$		\$ 60,014,171.00		\$		3,579,511.00					
		TOTAL COMUNIDAD KALIMVRAE				\$ 1,848,191,004.00		\$ 1,070,760,333.00			\$		\$ 1,070,760,333.00		\$		775,404,972.00					
COMUNIDAD ESMERALDA VALABO 20.000 - 21.1 (F. 2.12)																						
1		POZO PROFUNDO																				
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 135,845.00	\$	1.00	\$ 135,845.00			\$	1.00	\$ 135,845.00	-	\$							
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LUDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1.00	\$ 2,729,257.00	\$	1.00	\$ 2,729,257.00			\$	1.00	\$ 2,729,257.00	-	\$							
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN	ML	120.00	\$ 331,089.00	\$	120.00	\$ 39,731,880.00			\$	120.00	\$ 39,731,880.00	-	\$							
1.4		DIRECCIÓN POR LUDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	120.00	\$ 128,520.00	\$	120.00	\$ 15,422,400.00			\$	120.00	\$ 15,422,400.00	-	\$							
1.5		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA)	UND	1.00	\$ 3,849,951.00	\$	1.00	\$ 3,849,951.00			\$	1.00	\$ 3,849,951.00	-	\$							
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	120.00	\$ 473,781.00	\$	120.00	\$ 56,854,920.00			\$	120.00	\$ 56,854,920.00	-	\$							
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	94.00	\$ 307,160.00	\$	-	\$ -			\$	86.00	\$ 26,418,340.00	8.00	\$ 2,457,320.00							
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1.00	\$ 3,590,564.00	\$	1.00	\$ 3,590,564.00			\$	1.00	\$ 3,590,564.00	-	\$							
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CARBETA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA	UND	1.00	\$ 1,633,978.00	\$	1.00	\$ 1,633,978.00			\$	1.00	\$ 1,633,978.00	-	\$							
1.10		INSTALACIÓN DE GRAVILLA EN EL FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESIÓN	ML	25.00	\$ 231,060.00	\$	-	\$ -			\$	26.00	\$ 6,007,560.00	-	\$							
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TANIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCAROS	M3	7.02	\$ 532,866.00	\$	6.57	\$ 3,501,587.00			\$	6.57	\$ 3,501,587.00	0.45	\$ 239,935.00							
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BITO	24.00	\$ 40,372.00	\$	24.00	\$ 968,928.00			\$	24.00	\$ 968,928.00	-	\$							
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS CONVENCIONALES (LLETING, AIRE COMBINADO)	UND	1.00	\$ 4,028,724.00	\$	1.00	\$ 4,028,724.00			\$	1.00	\$ 4,028,724.00	-	\$							
1.14		PERFORACIÓN DEL POZO (POSICIONACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1.00	\$ 423,843.00	\$	1.00	\$ 423,843.00			\$	1.00	\$ 423,843.00	-	\$							
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1.00	\$ 380,561.00	\$	-	\$ -			\$	-	\$ -	1.00	\$ 380,561.00							
		TOTAL POZO PROFUNDO ESMERALDA VALABO				\$ 183,375,692.00		\$ 132,871,877.00			\$		\$ 165,297,777.00		\$		380,561.00					
		TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA				\$ 98,295,839.00		\$ -			\$		\$ -		\$		98,295,839.00					
4		REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERÍA Y PLANOS	ML	3,888.98	\$ 4,250.00	\$	3,888.98	\$ 16,528,165.00			\$	3,888.98	\$ 16,528,165.00	-	\$							
4.2		RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACIÓN	M3	972.25	\$ 40,771.00	\$	847.00	\$ 34,495,769.00			\$	847.00	\$ 34,495,769.00	125.25	\$ 5,101,087.00							
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	400.50	\$ 98,525.00	\$	39,455.283.00	\$ 23,054,890.00			\$	234.00	\$ 23,054,890.00	169.50	\$ 16,404,413.00							
4.4		CANAL EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	875.02	\$ 180,167.00	\$	593.07	\$ 108,651,643.00			\$	593.07	\$ 108,651,643.00	281.95	\$ 50,738,088.00							
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	1,033.19	\$ 44,004.00	\$	1,033.19	\$ 45,464,493.00			\$	1,033.19	\$ 45,464,493.00	-	\$							
4.6		SELLO CON COMPACTACIÓN MANUAL	M3	291.67	\$ 76,250.00	\$	254.17	\$ 19,380,463.00			\$	254.17	\$ 19,380,463.00	37.50	\$ 2,859,375.00							
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	188,688.86	\$ 2,309.00	\$ 435,705,639.00	128,952.46	\$ 300,660,230.00			\$	128,952.46	\$ 300,660,230.00	58,746.50	\$ 135,645,669.00							
4.8		TUBERÍA PVC RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2,958.98	\$ 23,070.00	\$	2,958.98	\$ 68,186,469.00			\$	2,958.98	\$ 68,186,469.00	-	\$							
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN HD. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	6.00	\$ 1,077,889.00	\$	-	\$ -			\$	-	\$ -	6.00	\$ 6,467,334.00							
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")	UN	3.00	\$ 120,164.00	\$	3.00	\$ 360,492.00			\$	3.00	\$ 360,492.00	-	\$							
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")	UN	5.00	\$ 115,332.00	\$	5.00	\$ 576,660.00			\$	5.00	\$ 576,660.00	-	\$							
4.12		CODO GRAN RADIO 90° PVC - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")	UN	14.00	\$ 131,542.00	\$	14.00	\$ 1,841,588.00			\$	14.00	\$ 1,841,588.00	-	\$							
4.13		TAPÓN EN PVC - PRESIÓN TRABAJO 200 PSI (2")	UN	15.00	\$ 90,838.00	\$	15.00	\$ 1,362,540.00			\$	15.00	\$ 1,362,540.00	-	\$							
4.14		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	UN	3.00	\$ 3,814.00	\$	3.00	\$ 11,442.00			\$	3.00	\$ 11,442.00	-	\$							
4.15		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1,799.39	\$ 46,518.00	\$	1,799.39	\$ 105,298,704.00			\$	1,799.39	\$ 105,298,704.00	-	\$							
4.16		ACOMETIDA BÓMICO. AQUED. 2"X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANOSUELO, LOM, AJUSTES Y REGISTRO)	UND	89.00	\$ 248,663.00	\$	78.00	\$ 19,411,314.00			\$	78.00	\$ 19,411,314.00	11.00	\$ 2,737,495.00							
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ESMERALDA VALABO				\$ 983,865,248.00		\$ 743,882,822.00			\$		\$ 743,882,822.00		\$		225,013,427.00					
8		CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
8.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICAS (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	54.20	\$ 5,186.00	\$	54.20	\$ 281,081.00			\$	54.20	\$ 281,081.00	-	\$							
		TOTAL CERRAMIENTO ESMERALDA VALABO				\$ 68,938,842.00		\$ 281,081.00			\$											

110201

CONDICIONES INICIALES				ACTAS ANTERIORES				PREVISTO ACTA				PERIODO 01-02-2024 AL 28-02-2024				ANEXO ACUPLADO				CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR																				
N° ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																				
COMUNIDAD PALOGRANDE VALABO (10.000 - 1L) (F.Z. 1.22)																																								
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UNID	1,00	\$ 135.845,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00																				
TOTAL POZO PROFUNDO PALOGRANDE VALABO																																								
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	ML	2.709,38	\$ 11.514.865,00	\$ 11.514.865,00	2.709,38	\$ 11.514.865,00	2.709,38	\$ 11.514.865,00	2.709,38	\$ 11.514.865,00	2.709,38	\$ 11.514.865,00	2.709,38	\$ 11.514.865,00	2.709,38	\$ 11.514.865,00	2.709,38	\$ 11.514.865,00																				
4.1		RETO DE SOBRIANES DE EXCAVACIÓN	M3	877,35	\$ 40.727,00	\$ 35.836.433,00	877,35	\$ 35.836.433,00	877,35	\$ 35.836.433,00	877,35	\$ 35.836.433,00	877,35	\$ 35.836.433,00	877,35	\$ 35.836.433,00	877,35	\$ 35.836.433,00	877,35	\$ 35.836.433,00																				
4.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	342,00	\$ 98.525,00	\$ 33.695.550,00	201,00	\$ 19.803.525,00	201,00	\$ 19.803.525,00	201,00	\$ 19.803.525,00	201,00	\$ 19.803.525,00	201,00	\$ 19.803.525,00	201,00	\$ 19.803.525,00	201,00	\$ 19.803.525,00																				
4.3		CANAL EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	609,61	\$ 180.167,00	\$ 109.831.605,00	399,77	\$ 72.024.461,00	399,77	\$ 72.024.461,00	399,77	\$ 72.024.461,00	399,77	\$ 72.024.461,00	399,77	\$ 72.024.461,00	399,77	\$ 72.024.461,00	399,77	\$ 72.024.461,00																				
4.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	698,81	\$ 44.004,00	\$ 30.750.435,00	698,81	\$ 30.750.435,00	698,81	\$ 30.750.435,00	698,81	\$ 30.750.435,00	698,81	\$ 30.750.435,00	698,81	\$ 30.750.435,00	698,81	\$ 30.750.435,00	698,81	\$ 30.750.435,00																				
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	203,20	\$ 76.250,00	\$ 15.484.000,00	171,33	\$ 13.063.913,00	171,33	\$ 13.063.913,00	171,33	\$ 13.063.913,00	171,33	\$ 13.063.913,00	171,33	\$ 13.063.913,00	171,33	\$ 13.063.913,00	171,33	\$ 13.063.913,00																				
4.6		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TAMARRO MAX. 3"	M3/M3	132.506,32	\$ 2.268,00	\$ 306.949.953,00	89.701,05	\$ 207.119.724,00	89.701,05	\$ 207.119.724,00	89.701,05	\$ 207.119.724,00	89.701,05	\$ 207.119.724,00	89.701,05	\$ 207.119.724,00	89.701,05	\$ 207.119.724,00	89.701,05	\$ 207.119.724,00																				
4.7		TUBERÍA PVC RDE 21" INSTALACIÓN	ML	1.849,38	\$ 23.075,00	\$ 44.972.197,00	1.849,38	\$ 44.972.197,00	1.849,38	\$ 44.972.197,00	1.849,38	\$ 44.972.197,00	1.849,38	\$ 44.972.197,00	1.849,38	\$ 44.972.197,00	1.849,38	\$ 44.972.197,00	1.849,38	\$ 44.972.197,00																				
4.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO	UN	5,00	\$ 1.077.889,00	\$ 5.389.445,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.077.889,00	1,00	\$ 1.077.889,00	1,00	\$ 1.077.889,00	1,00	\$ 1.077.889,00	1,00	\$ 1.077.889,00																				
4.9		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (P")	UN	5,00	\$ 120.164,00	\$ 600.820,00	5,00	\$ 600.820,00	5,00	\$ 600.820,00	5,00	\$ 600.820,00	5,00	\$ 600.820,00	5,00	\$ 600.820,00	5,00	\$ 600.820,00	5,00	\$ 600.820,00																				
4.10		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (P")	UN	8,00	\$ 115.332,00	\$ 922.656,00	8,00	\$ 922.656,00	8,00	\$ 922.656,00	8,00	\$ 922.656,00	8,00	\$ 922.656,00	8,00	\$ 922.656,00	8,00	\$ 922.656,00	8,00	\$ 922.656,00																				
4.11		TEE PVC - PRESIÓN TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2X2X2)	UN	6,00	\$ 131.542,00	\$ 789.252,00	6,00	\$ 789.252,00	6,00	\$ 789.252,00	6,00	\$ 789.252,00	6,00	\$ 789.252,00	6,00	\$ 789.252,00	6,00	\$ 789.252,00	6,00	\$ 789.252,00																				
4.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC 82" UN	UN	10,00	\$ 90.830,00	\$ 908.300,00	10,00	\$ 908.300,00	10,00	\$ 908.300,00	10,00	\$ 908.300,00	10,00	\$ 908.300,00	10,00	\$ 908.300,00	10,00	\$ 908.300,00	10,00	\$ 908.300,00																				
4.13		TAPON EN PVC - PRESIÓN TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	\$ 3.814,00	\$ 11.442,00	3,00	\$ 11.442,00	3,00	\$ 11.442,00	3,00	\$ 11.442,00	3,00	\$ 11.442,00	3,00	\$ 11.442,00	3,00	\$ 11.442,00	3,00	\$ 11.442,00																				
4.14		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.169,63	\$ 58.516,00	\$ 68.444.408,00	1.169,63	\$ 68.444.408,00	1.169,63	\$ 68.444.408,00	1.169,63	\$ 68.444.408,00	1.169,63	\$ 68.444.408,00	1.169,63	\$ 68.444.408,00	1.169,63	\$ 68.444.408,00	1.169,63	\$ 68.444.408,00																				
4.15		ACOMETIDA COM. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJO DE ACCESORIOS Y REGISTRO)	UNID	76,00	\$ 248.965,00	\$ 18.915.598,00	67,00	\$ 16.673.821,00	67,00	\$ 16.673.821,00	67,00	\$ 16.673.821,00	67,00	\$ 16.673.821,00	67,00	\$ 16.673.821,00	67,00	\$ 16.673.821,00	67,00	\$ 16.673.821,00																				
4.16		TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN				\$ 675.775.919,00		\$ -		\$ -		\$ 675.775.919,00		\$ -		\$ 675.775.919,00		\$ -		\$ -																				
6	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	7,44	\$ 98.525,00	\$ 733.026,00	7,44	\$ 733.026,00	7,44	\$ 733.026,00	7,44	\$ 733.026,00	7,44	\$ 733.026,00	7,44	\$ 733.026,00	7,44	\$ 733.026,00	7,44	\$ 733.026,00																				
5.3		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	\$ 44.004,00	\$ 215.620,00	4,28	\$ 188.337,00	4,28	\$ 188.337,00	4,28	\$ 188.337,00	4,28	\$ 188.337,00	4,28	\$ 188.337,00	4,28	\$ 188.337,00	4,28	\$ 188.337,00																				
5.4		ZAPATA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	2,03	\$ 1.506.465,00	\$ 3.058.124,00	2,03	\$ 3.058.124,00	2,03	\$ 3.058.124,00	2,03	\$ 3.058.124,00	2,03	\$ 3.058.124,00	2,03	\$ 3.058.124,00	2,03	\$ 3.058.124,00	2,03	\$ 3.058.124,00																				
5.5		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN COLUMNA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	0,77	\$ 2.146.100,00	\$ 1.652.497,00	0,77	\$ 1.652.497,00	0,77	\$ 1.652.497,00	0,77	\$ 1.652.497,00	0,77	\$ 1.652.497,00	0,77	\$ 1.652.497,00	0,77	\$ 1.652.497,00	0,77	\$ 1.652.497,00																				
5.6		ACERO REFORZADO FYC 4200 Mpa (6200 KG/CM2 GRD) INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	461,56	\$ 12.584,00	\$ 5.808.271,00	361,38	\$ 4.547.608,00	361,38	\$ 4.547.608,00	361,38	\$ 4.547.608,00	361,38	\$ 4.547.608,00	361,38	\$ 4.547.608,00	361,38	\$ 4.547.608,00	361,38	\$ 4.547.608,00																				
5.7		SUMINISTRO FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	M3	0,68	\$ 1.040.548,00	\$ 707.573,00	0,68	\$ 707.573,00	0,68	\$ 707.573,00	0,68	\$ 707.573,00	0,68	\$ 707.573,00	0,68	\$ 707.573,00	0,68	\$ 707.573,00	0,68	\$ 707.573,00																				
5.8		SOLDADO LIMPIEZA CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)				\$ 197.295.146,00		\$ 10.887.153,00		\$ -		\$ 10.887.153,00		\$ -		\$ 10.887.153,00		\$ -		\$ -																				
TOTAL TANQUE ELEVADO PALOGRANDE VALABO																																								
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIÓNAL OBRAS ARQUITECTONICAS (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 5.186,00	\$ 249.965,00	48,20	\$ 249.965,00	48,20	\$ 249.965,00	48,20	\$ 249.965,00	48,20	\$ 249.965,00	48,20	\$ 249.965,00	48,20	\$ 249.965,00	48,20	\$ 249.965,00																				
6.1		TOTAL CERRAMIENTO PALOGRANDE VALABO				\$ 63.693.481,00		\$ 249.965,00		\$ -		\$ 249.965,00		\$ -		\$ 249.965,00		\$ -		\$ -																				
TOTAL COMUNIDAD PALOGRANDE VALABO																																								
COMUNIDAD LA UNIÓN (6000 - 1L) (F.Z. 1.23)																																								
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UNID	1,00	\$ 135.845,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00																				
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UNID	1,00	\$ 135.845,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00																				
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LIDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UNID	1,00	\$ 2.729.257,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00																				
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LIDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	140,00	\$ 331.089,00	\$ 46.353.860,00	140,00	\$ 46.353.860,00	140,00	\$ 46.353.860,00	140,00	\$ 46.353.860,00	140,00	\$ 46.353.860,00	140,00	\$ 46.353.860,00	140,00	\$ 46.353.860,00	140,00	\$ 46.353.860,00																				
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	140,00	\$ 128.530,00	\$ 17.992.820,00	140,00	\$ 17.992.820,00	140,00	\$ 17.992.820,00	140,00	\$ 17.992.820,00	140,00	\$ 17.992.820,00	140,00	\$ 17.992.820,00	140,00	\$ 17.992.820,00	140,00	\$ 17.992.820,00																				
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, BAYOS GAMA)	UNID	1,00	\$ 3.849.951,00	\$ 3.849.951,00	1,00	\$ 3.849.951,00	1,00	\$ 3.849.951,00	1,00	\$ 3.849.951,00	1,00	\$ 3.849.951,00	1,00	\$ 3.849.951,00	1,00	\$ 3.849.951,00	1,00	\$ 3.849.951,00																				
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	140,00	\$ 473.791,00	\$ 66.330.740,00	140,00	\$ 66.330.740,00	140,00	\$ 66.330.740,00	140,00	\$ 66.330.740,00	140,00	\$ 66.330.740,00	140,00	\$ 66.330.740,00	140,00	\$ 66.330.740,00	140,00	\$ 66.330.740,00																				
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	109,00	\$ 307.180,00	\$ 33.483.710,00																																		

1102A

CONDICIONES INICIALES				ACTAS ANTERIORES			PRESNTE ACTA			PERIODO 61-62-63-64			AVANCE ACUMULADO			CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR		
N° ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC Ø2" UN		UN	4,00	\$ 90.836,00	\$ 363.344,00	4,00	\$ 363.344,00		\$ -		\$ -	4,00	\$ 363.344,00	-	\$ -		
4.14	TAPON EN PVC- PRESIÓN TRABAJO 280 PSI (2")		UN	5,00	\$ 3.814,00	\$ 19.070,00	5,00	\$ 19.070,00		\$ -		\$ -	5,00	\$ 19.070,00	-	\$ -		
4.15	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	487,71	\$ 58.518,00	\$ 27.369.454,00	487,71	\$ 27.369.454,00		\$ -		\$ -	487,71	\$ 27.369.454,00	-	\$ -		
4.16	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJO DE UN. ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	28,00	\$ 248.863,00	\$ 6.968.164,00	28,00	\$ 6.968.164,00		\$ -		\$ -	28,00	\$ 6.968.164,00	-	\$ -		
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA UNIÓN					\$ 271.221.712,00		\$ 217.487.274,00		\$ -		\$ -		\$ 217.487.274,00	-	\$ -		\$ 53.734.438,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICAS (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	\$ 5.186,00	\$ 249.995,00	48,20	\$ 249.995,00		\$ -		\$ -	48,20	\$ 249.995,00	-	\$ -		\$ 53.343.716,00
	TOTAL CERRAMIENTO LA UNIÓN					\$ 53.993.651,00		\$ 249.995,00		\$ -		\$ -		\$ 249.995,00	-	\$ -		\$ 53.343.716,00
	TOTAL COMUNIDAD LA UNIÓN					\$ 83.474.051,00		\$ 385.123.692,00		\$ 53.955.007,00		\$ -		\$ 409.085.769,00	-	\$ -		\$ 474.398.392,00
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (10.000 - 11) (E-Z-1,23)																		
1	POZO PROFUNDO																	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$ 135.845,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00		\$ -		\$ -	1,00	\$ 135.845,00	-	\$ -		\$ -
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LADOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS		UND	1,00	\$ 2.729.257,00	\$ 2.729.257,00	1,00	\$ 2.729.257,00		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.729.257,00	-	\$ -		\$ -
1.3	PERFORACIÓN DE PUERA EN 8" 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LADOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		MIL	143,00	\$ 331.099,00	\$ 47.347.157,00	143,00	\$ 47.347.157,00		\$ -		\$ -	143,00	\$ 47.347.157,00	-	\$ -		\$ -
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		MIL	143,00	\$ 128.520,00	\$ 18.376.380,00	143,00	\$ 18.376.380,00		\$ -		\$ -	143,00	\$ 18.376.380,00	-	\$ -		\$ -
1.5	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTENCIA, RAYOS CANAL)		UND	1,00	\$ 3.848.951,00	\$ 3.848.951,00	1,00	\$ 3.848.951,00		\$ -		\$ -	1,00	\$ 3.848.951,00	-	\$ -		\$ -
1.6	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"		MIL	143,00	\$ 473.791,00	\$ 67.752.113,00	143,00	\$ 67.752.113,00		\$ -		\$ -	143,00	\$ 67.752.113,00	-	\$ -		\$ -
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE DA 200 M		MIL	111,00	\$ 307.180,00	\$ 34.098.080,00	-	\$ -	107,00	\$ 32.869.330,00		\$ -	107,00	\$ 32.869.330,00	4,00	\$ 1.228.760,00		\$ -
1.8	Aforo del pozo (prueba de bombeo)		UND	1,00	\$ 3.590.564,00	\$ 3.590.564,00	-	\$ -	1,00	\$ 3.590.564,00		\$ -	1,00	\$ 3.590.564,00	-	\$ -		\$ -
1.9	CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRANULADORES		UND	1,00	\$ 1.633.978,00	\$ 1.633.978,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.633.978,00		\$ -	1,00	\$ 1.633.978,00	-	\$ -		\$ -
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 CALCAEROS		MIL	32,00	\$ 231.060,00	\$ 7.393.920,00	-	\$ -	32,00	\$ 7.393.920,00		\$ -	32,00	\$ 7.393.920,00	-	\$ -		\$ -
1.11	SUMINISTRO DE GRAVILLA TANIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCAEROS		M3	8,40	\$ 532.966,00	\$ 4.478.914,00	-	\$ -	7,00	\$ 3.730.762,00		\$ -	7,00	\$ 3.730.762,00	1,40	\$ 748.152,00		\$ -
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO		8TO	28,60	\$ 40.732,00	\$ 1.154.639,00	-	\$ -	28,60	\$ 1.154.639,00		\$ -	28,60	\$ 1.154.639,00	-	\$ -		\$ -
1.13	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)		UND	1,00	\$ 4.028.724,00	\$ 4.028.724,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.028.724,00		\$ -	1,00	\$ 4.028.724,00	-	\$ -		\$ -
1.14	PERFORACIÓN DEL POZO (POSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)		UND	1,00	\$ 423.843,00	\$ 423.843,00	-	\$ -	1,00	\$ 423.843,00		\$ -	1,00	\$ 423.843,00	-	\$ -		\$ -
1.15	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA		UND	1,00	\$ 380.561,00	\$ 380.561,00	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 380.561,00		\$ -
	TOTAL POZO PROFUNDO PUNTO GRILLO					\$ 197.373.916,00		\$ 140.182.653,00		\$ 54.835.760,00		\$ -		\$ 196.018.413,00	-	\$ -		\$ 2.365.473,00
4	REDES DE ACUEDUCTO																	
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS		MIL	1.351,87	\$ 8.295.448,00	\$ 8.295.448,00	1.351,87	\$ 8.295.448,00		\$ -		\$ -	1.351,87	\$ 8.295.448,00	-	\$ -		\$ -
4.2	RETIRO DE BORRANTES DE EXCAVACIÓN		M3	497,67	\$ 40.727,00	\$ 19.875.554,00	386,72	\$ 15.748.845,00		\$ -		\$ -	386,72	\$ 15.748.845,00	101,25	\$ 4.123.609,00		\$ -
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	274,50	\$ 98.826,00	\$ 27.045.113,00	126,00	\$ 12.414.150,00		\$ -		\$ -	126,00	\$ 12.414.150,00	148,50	\$ 14.630.963,00		\$ -
4.4	CANADA EN ARENA PARA ORIENTACIÓN DE TUBERÍAS		M3	439,17	\$ 180.167,00	\$ 79.123.941,00	267,05	\$ 48.113.597,00		\$ -		\$ -	267,05	\$ 48.113.597,00	172,12	\$ 31.010.344,00		\$ -
4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN DE TUBERÍAS		M3	494,06	\$ 4.004,00	\$ 2.174.016,00	494,06	\$ 2.174.016,00		\$ -		\$ -	494,06	\$ 2.174.016,00	-	\$ -		\$ -
4.6	EXCAVACIÓN DE TUBERÍA DE 12" INCLUIDO EL CARGUE		M3	148,39	\$ 76.250,00	\$ 11.162.238,00	116,39	\$ 8.874.356,00		\$ -		\$ -	116,39	\$ 8.874.356,00	30,01	\$ 2.267.881,00		\$ -
4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/M	98.893,66	\$ 2.309,00	\$ 227.660.671,00	62.922,29	\$ 145.287.568,00		\$ -		\$ -	62.922,29	\$ 145.287.568,00	35.761,37	\$ 82.573.003,00		\$ -
4.8	TUBERÍA PVC RDE 21 2" INSTALACIÓN		MIL	1.341,87	\$ 23.070,00	\$ 30.956.941,00	1.341,87	\$ 30.956.941,00		\$ -		\$ -	1.341,87	\$ 30.956.941,00	-	\$ -		\$ -
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO		UN	2,00	\$ 1.077.869,00	\$ 2.155.778,00	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 2.155.778,00		\$ -
4.10	CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI/EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")		UN	4,00	\$ 120.164,00	\$ 480.656,00	3,00	\$ 360.492,00		\$ -		\$ -	3,00	\$ 360.492,00	1,00	\$ 120.164,00		\$ -
4.11	CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI/EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")		UN	1,00	\$ 115.332,00	\$ 115.332,00	1,00	\$ 115.332,00		\$ -		\$ -	1,00	\$ 115.332,00	-	\$ -		\$ -
4.12	UNIÓN MECÁNICA X LISO (2")		UN	5,00	\$ 131.542,00	\$ 657.710,00	5,00	\$ 657.710,00		\$ -		\$ -	5,00	\$ 657.710,00	-	\$ -		\$ -
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC Ø2" UN		UN	5,00	\$ 90.836,00	\$ 454.180,00	5,00	\$ 454.180,00		\$ -		\$ -	5,00	\$ 454.180,00	-	\$ -		\$ -
4.14	TAPON EN PVC- PRESIÓN TRABAJO 280 PSI (2")		UN	2,00	\$ 3.814,00	\$ 7.628,00	2,00	\$ 7.628,00		\$ -		\$ -	2,00	\$ 7.628,00	-	\$ -		\$ -
4.15	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	805,12	\$ 58.518,00	\$ 47.114.012,00	805,12	\$ 47.114.012,00		\$ -		\$ -	805,12	\$ 47.114.012,00	-	\$ -		\$ -
4.16	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJO DE UN. ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	61,00	\$ 248.863,00	\$ 15.186.043,00	42,00	\$ 10.452.246,00		\$ -		\$ -	42,00	\$ 10.452.246,00	19,00	\$ 4.728.397,00		\$ -
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PUNTO GRILLO					\$ 492.224.341,00		\$ 350.594.221,00		\$ -		\$ -		\$ 350.594.221,00	-	\$ -		\$ 141.639.138,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICAS (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	\$ 5.186,00	\$ 249.995,00	48,20	\$ 249.995,00		\$ -		\$ -	48,20	\$ 249.995,00	-	\$ -		\$ 53.343.716,00
	TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRILLO					\$ 53.993.651,00		\$ 249.995,00		\$ -		\$ -		\$ 249.995,00	-	\$ -		\$ 53.343.716,00
	TOTAL COMUNIDAD PUNTO GRILLO					\$ 1.145.118.624,00		\$ 491.038.869,00		\$ 54.835.760,00		\$ -		\$ 546.882.629,00	-	\$ -		\$ 599.265.594,00
COMUNIDAD ALGARROBO 6000 - 11) (E-Z-1,23)																		
1	POZO PROFUNDO																	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$ 135.845,00	\$ 135.845,00	1,00	\$ 135.845,00		\$ -		\$ -	1,00	\$ 135.845,00	-	\$ -		\$ -
	TOTAL POZO PROFUNDO ALGARROBO					\$ 135.845,00		\$ 135.845,00		\$ -		\$ -		\$ 135.845,00	-	\$ -		\$ 135.845,00
4	REDES DE ACUEDUCTO																	
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS		MIL	2.982,75	\$ 4.250,00	\$ 10.041.688,00	2.982,75	\$ 10.041.688,00		\$ -		\$ -	2.982,75	\$ 10.041.688,00	-	\$ -		\$ -
4.2	RETIRO DE BORRANTES DE EXCAVACIÓN		M3	599,69	\$ 40.727,00	\$ 24.597.032,00	440,00	\$ 17.919.800,00		\$ -		\$ -	440,00	\$ 17.919.800,00	159,69	\$ 6.137.152,00		\$ -
4.3	CANADA EN ARENA PARA ORIENTACIÓN DE TUBERÍAS		M3	531,62	\$ 180.167,00	\$ 95.760.351,00	394,43	\$ 54.846.240,00		\$ -		\$ -	394,43	\$ 54.846.240,00	227,19	\$ 40.932.141,00		\$ -
4.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN DE TUBERÍAS		M3	671,33	\$ 4.004,00	\$ 2.687.733,00	616,00	\$ 2.466.464,00		\$ -		\$ -	616,00	\$ 2.466.464,00	55,33	\$ 2.221.269,00		\$ -
4.5	EXCAVACIÓN DE TUBERÍA DE 12" INCLUIDO EL CARGUE		M3	177,21	\$ 76.250,00	\$ 13.512.263,00	132,00	\$ 10.065.000,00		\$ -		\$ -	132,00	\$ 10.065.000,00	45,21	\$ 3.447.263,00		\$ -
4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/M	119.357,36	\$ 2.309,00	\$ 275.596.144,00	71.602,48	\$ 165.330.128,00		\$ -		\$ -	71.602,48	\$ 165.330.128,00	47.754,88	\$ 110.266.018,00		\$ -
4.7	TUBERÍA PVC RDE 21 2" INSTALACIÓN		MIL	2.112,75	\$ 23.070,00	\$ 48.741.133,00	1.760,00	\$ 40.603.200,00		\$ -		\$ -	1.760,00	\$ 40.603.200,00	352,75	\$ 8.137.933,00		\$ -
4.8	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	1.297,65	\$ 58.518,00	\$ 74.180.343,00	990,51	\$ 57.862.664,00		\$ -		\$ -	990,51	\$ 57.862.664,00	277,14	\$ 16.217.679,00		\$ -
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ALGARROBO					\$ 593.296.357,00		\$ 383.877.262,00		\$ -		\$ -		\$ 383.877.262,00	-	\$ -		\$ 209.419.095,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	

Page 12

1031

CONDICIONES INICIALES				ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA		PERIODO 01-02-2024 AL 31-03-2024		AVANCE ACTUALIZADO		CANTIDAD OTRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.15	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.349,74	\$	50.020,00	\$	67.513.995,00	\$	67.513.995,00	\$	67.513.995,00	1.349,74	\$	-	\$
4.16	ACOMETIDA ACUED. 2X12" (INC. SUMIN. E. INSTAL. MANGUERA 10M. ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	40,00	\$	252.943,00	\$	10.117.720,00	\$	6.576.516,00	\$	6.576.516,00	26,00	\$	14,00	\$
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA PORTEA						\$	677.237.897,00	\$	\$	\$	630.481.383,00	-	\$	-	\$
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL														
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE CONSIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$	5.214,00	\$	251.315,00	\$	251.315,00	\$	251.315,00	48,20	\$	-	\$
TOTAL CERRAMIENTO PORTEA						\$	64.287.743,00	\$	\$	\$	251.315,00	-	\$	-	\$
TOTAL COMUNIDAD PORTEA						\$	1.241.088.235,00	\$	\$	\$	874.075.131,00	-	\$	-	\$
COMUNIDAD LA CAJANA (10.000 - 11) (P.2. 123)															
1	POZO PROFUNDO														
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$	135.845,00	\$	135.845,00	\$	135.845,00	\$	135.845,00	-	\$	-	\$
1.2	INSTALACIÓN Y ACUOCIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 6" 12" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LÓDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	137,00	\$	331.096,00	\$	45.360.563,00	\$	45.360.563,00	\$	45.360.563,00	137,00	\$	-	\$
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	137,00	\$	128.520,00	\$	17.607.240,00	\$	17.607.240,00	\$	17.607.240,00	137,00	\$	-	\$
1.5	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA)	UND	1,00	\$	3.849.951,00	\$	3.849.951,00	\$	3.849.951,00	\$	3.849.951,00	1,00	\$	-	\$
1.6	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	137,00	\$	473.791,00	\$	64.909.387,00	\$	64.909.387,00	\$	64.909.387,00	137,00	\$	-	\$
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA FRECUENCIAS DE 0 A 200 M	ML	105,00	\$	307.190,00	\$	32.254.950,00	\$	31.640.570,00	\$	31.640.570,00	103,00	\$	2,00	\$
1.8	ACUOCIÓN DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	\$	3.590.564,00	\$	3.590.564,00	\$	3.590.564,00	\$	3.590.564,00	1,00	\$	-	\$
1.9	CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRALLADORES	UND	1,00	\$	1.633.978,00	\$	1.633.978,00	\$	1.633.978,00	\$	1.633.978,00	1,00	\$	-	\$
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESIÓN	M3	32,00	\$	231.060,00	\$	7.393.920,00	\$	7.393.920,00	\$	7.393.920,00	32,00	\$	-	\$
1.11	SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	9,04	\$	532.966,00	\$	4.285.047,00	\$	3.987.245,00	\$	3.987.245,00	7,50	\$	0,54	\$
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE TAPÓN Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (GETTING-ARE COMPROMISED)	BTO	27,40	\$	40.372,00	\$	1.106.193,00	\$	1.106.193,00	\$	1.106.193,00	27,40	\$	-	\$
1.13	TAMIZADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (GETTING-ARE COMPROMISED)	UND	1,00	\$	4.028.724,00	\$	4.028.724,00	\$	4.028.724,00	\$	4.028.724,00	1,00	\$	-	\$
1.14	DESINSECCIÓN DEL POZO (DOISIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	\$	423.843,00	\$	423.843,00	\$	-	\$	-	1,00	\$	-	\$
1.15	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	\$	390.561,00	\$	390.561,00	\$	390.561,00	\$	390.561,00	1,00	\$	-	\$
TOTAL POZO PROFUNDO LA CAJANA						\$	108.690.003,00	\$	\$	\$	187.983.417,00	-	\$	-	\$
4	REDES DE ACUEDUCTO														
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE CONSIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	ML	3.393,74	\$	4.250,00	\$	14.423.395,00	\$	14.423.395,00	\$	14.423.395,00	-	\$	-	\$
4.2	RETIRO DE SOBRIANTE DE EXCAVACIÓN	M3	848,44	\$	40.727,00	\$	34.554.416,00	\$	31.879.059,00	\$	31.879.059,00	762,75	\$	85,69	\$
4.3	CARGUE	M3	193,00	\$	98.525,00	\$	15.074.325,00	\$	93,00	\$	9.162.825,00	93,00	\$	60,00	\$
4.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	783,59	\$	180.167,00	\$	137.573.720,00	\$	542,84	\$	97.819.871,00	220,65	\$	39.753.843,00	\$
4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	987,12	\$	44.004,00	\$	42.557.148,00	\$	42.552.748,00	\$	42.552.748,00	987,02	\$	0,10	\$
4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRIFE TAMAÑO MÁX. 3"	M3	284,63	\$	76.250,00	\$	19.407.913,00	\$	17.805.788,00	\$	17.805.788,00	234,83	\$	19,70	\$
4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/M2	167.947,33	\$	2.350,00	\$	387.763.385,00	\$	122.776,81	\$	283.481.654,00	45.170,92	\$	104.298.731,00	\$
4.8	TUBERÍA PVC RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.053,74	\$	23.070,00	\$	70.449.782,00	\$	2.976,00	\$	68.656.320,00	77,74	\$	1.793.462,00	\$
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN HD. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	\$	1.077.889,00	\$	2.155.778,00	\$	1.077.889,00	\$	1.077.889,00	1,00	\$	1,00	\$
4.10	CODO GRAN RADIO 90° PVC PRESIÓN TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	5,00	\$	120.164,00	\$	600.820,00	\$	600.820,00	\$	600.820,00	-	\$	-	\$
4.11	CODO GRAN RADIO 45° PVC PRESIÓN TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	2,00	\$	115.332,00	\$	230.664,00	\$	230.664,00	\$	230.664,00	-	\$	-	\$
4.12	TEE PVC PRESIÓN TRABAJO 200 PSI EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	15,00	\$	131.542,00	\$	1.973.130,00	\$	1.973.130,00	\$	1.973.130,00	1,00	\$	14,00	\$
4.13	JAPÓN EN PVC PRESIÓN TRABAJO 200 PSI (2")	UN	16,00	\$	99.836,00	\$	1.453.376,00	\$	1.453.376,00	\$	1.453.376,00	16,00	\$	-	\$
4.14	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	UND	16,00	\$	3.814,00	\$	61.024,00	\$	7.628,00	\$	7.628,00	2,00	\$	14,00	\$
4.15	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X12" (INC. SUMIN. E. INSTAL. MANGUERA 10M. ACCESORIOS Y REGISTRO)	M3	1.932,24	\$	58.518,00	\$	107.219.020,00	\$	1.785,60	\$	104.489.741,00	1.785,60	\$	46,64	\$
4.16	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA CAJANA					\$	843.088.238,00	\$	\$	\$	651.699.073,00	-	\$	-	\$
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL														
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE CONSIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$	5.188,00	\$	249.965,00	\$	249.965,00	\$	249.965,00	48,20	\$	-	\$
TOTAL CERRAMIENTO LA CAJANA						\$	53.588.881,00	\$	\$	\$	249.965,00	-	\$	-	\$
TOTAL COMUNIDAD LA CAJANA						\$	1.495.155.836,00	\$	\$	\$	804.404,00	-	\$	-	\$
RESIDUADO ASEMPONE (6.000 - 11) (P.2. 130)															
1	POZO PROFUNDO														
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$	139.220,00	\$	139.220,00	\$	139.220,00	\$	139.220,00	-	\$	-	\$
1.2	INSTALACIÓN Y ACUOCIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PRUEBA DE PRUEBA EN 6" 12" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LÓDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	\$	2.882.980,00	\$	2.882.980,00	\$	2.882.980,00	\$	2.882.980,00	1,00	\$	-	\$
1.3	PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 6" 12" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LÓDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	114,00	\$	349.024,00	\$	39.788.736,00	\$	39.788.736,00	\$	39.788.736,00	114,00	\$	-	\$
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	114,00	\$	134.131,00	\$	15.289.934,00	\$	15.289.934,00	\$	15.289.934,00	114,00	\$	-	\$
1.5	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA)	UND	1,00	\$	3.992.033,00	\$	3.993.953,00	\$	3.993.953,00	\$	3.993.953,00	1,00	\$	-	\$
1.6	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	114,00	\$	602.845,00	\$	57.324.330,00	\$	57.324.330,00	\$	57.324.330,00	114,00	\$	-	\$
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA FRECUENCIAS DE 0 A 200 M	ML	84,00	\$	320.453,00	\$	26.918.052,00	\$	26.918.052,00	\$	26.918.052,00	84,00	\$	-	\$
1.8	ACUOCIÓN DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	\$	3.765.969,00	\$	3.765.969,00	\$	3.765.969,00	\$	3.765.969,00	1,00	\$	-	\$
1.9	CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRALLADORES	UND	1,00	\$	1.668.279,00	\$	1.668.279,00	\$	1.668.279,00	\$	1.668.279,00	1,00	\$	-	\$
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESIÓN	ML	30,00	\$	239.462,00	\$	7.183.860,00	\$	6.465.474,00	\$	6.465.474,00	27,00	\$	3,00	\$
1.11	SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	6,66	\$	562.175,00	\$	3.744.086,00	\$	3.507.972,00	\$	3.507.972,00	6,24	\$	0,42	\$

1032

CONDICIONES INICIALES										PRESERVA ACTA			PERIODO 01-02-2009 AL 28-02-2009			AVANCE ACUMULADO			CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE SELLO		BTO	22.80	\$	968.521,00										22.80	\$	968.521,00			
1.13	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING/ABE/COMPRIMIDO)		UND	1,00	\$	4.282.909,00										1,00	\$	4.282.909,00			
1.14	DESINFECTACIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)		UND	1,00	\$	442.648,00										1,00	\$	442.648,00			
1.15	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA		UND	1,00	\$	405.516,00										1,00	\$	405.516,00			
	TOTAL POZO PROFUNDO KERO A SEINPORE					188.783.093,00															
4	REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERÍA Y PLANOS		ML	4.808,36	\$	20.743.285,00										4.808,36	\$	20.743.285,00			
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO KERO A SEINPORE					1.851.193.830,00															
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIÓNAL OBRA ARQUITECTÓNICA (B2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	\$	255.460,00										48,20	\$	255.460,00			
	TOTAL CERRAMIENTO KERO A SEINPORE					56.244.622,00															
	TOTAL COMUNIDAD KERO A SEINPORE					2.279.865.059,00															
	TOTAL POZO PROFUNDO																				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	\$	139.220,00										1,00	\$	139.220,00			
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LÓDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS		UND	1,00	\$	2.882.980,00										1,00	\$	2.882.980,00			
1.3	PERFORACIÓN DE PROBEA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LÓDOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	118,00	\$	41.184.832,00										118,00	\$	41.184.832,00			
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GEOLÓGICO DEL POZO		ML	118,00	\$	15.827.458,00										118,00	\$	15.827.458,00			
1.5	INSTALACIÓN DE GRAVILLAS EN EL FONDO DEL POZO		UND	1,00	\$	3.993.053,00										1,00	\$	3.993.053,00			
1.6	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"		ML	118,00	\$	59.335.710,00										118,00	\$	59.335.710,00			
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDADES DE 0 A 200 M		ML	83,00	\$	320.453,00										83,00	\$	26.597.589,00			
1.8	AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)		UND	1,00	\$	3.765.959,00										1,00	\$	3.765.959,00			
1.9	CONSTRUCCIÓN DE CARGA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLAS EN EL FONDO DEL POZO		UND	1,00	\$	1.668.279,00										1,00	\$	1.668.279,00			
1.10	PROE Y INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESIÓN		ML	35,00	\$	239.462,00										35,00	\$	7.423.322,00			
1.11	SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALZAROS		M3	6,90	\$	562.175,00										6,90	\$	3.631.651,00			
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE SELLO		BTO	23,80	\$	42.479,00										23,80	\$	1.002.504,00			
1.13	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING/ABE/COMPRIMIDO)		UND	1,00	\$	4.282.909,00										1,00	\$	4.282.909,00			
1.14	DESINFECTACIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)		UND	1,00	\$	442.648,00										1,00	\$	442.648,00			
1.15	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA		UND	1,00	\$	405.516,00										1,00	\$	405.516,00			
	TOTAL POZO PROFUNDO SIETE RODRIGUEZ					173.788.855,00															
4	REDES DE ACUEDUCTO																				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERÍA Y PLANOS		ML	1.833,66	\$	4.314,00										1.833,66	\$	7.911.272,00			
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO SIETE RODRIGUEZ					688.518.802,00															
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIÓNAL OBRA ARQUITECTÓNICA (B2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	\$	255.460,00										48,20	\$	255.460,00			
	TOTAL CERRAMIENTO SIETE RODRIGUEZ					56.244.622,00															
	TOTAL COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ					1.341.138.959,00															
	TOTAL RESEGUARDO ASEINPORE					3.813.108.026,00															
	SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE ALI)					38.013.272.215,00															
	COSTOS DIRECTOS OBRA (SIN ALI)					28.368.466.727,61															
SUMINISTROS																					
RESGUARDO AWALIBA																					
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	3.890,25	\$	78.548,00										3.890,25	\$	78.548,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	3.037,00	\$	78.548,00										3.037,00	\$	238.550.276,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	549,00	\$	78.548,00										549,00	\$	43.122.852,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	672,00	\$	78.548,00										672,00	\$	52.784.256,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	2.908,00	\$	78.548,00										2.908,00	\$	228.417.584,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	434,00	\$	78.548,00										434,00	\$	35.660.792,00			
	TOTAL SUMINISTRO AWALIBA					904.107.117,60															
RESGUARDO DONOPLANAS																					
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	2.840,85	\$	80.955,00										2.840,85	\$	160.553.180,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	2.296,01	\$	80.955,00										2.296,01	\$	127.693.140,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	676,50	\$	79.758,00										676,50	\$	32.527.687,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.955,57	\$	80.955,00										1.955,57	\$	109.176.084,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	595,07	\$	80.955,00										595,07	\$	22.491.267,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.932,58	\$	80.955,00										1.932,58	\$	111.262.913,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.685,50	\$	80.955,00										1.685,50	\$	88.605.667,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	372,06	\$	80.955,00										372,06	\$	13.445.858,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	3.024,74	\$	80.955,00										3.024,74	\$	167.890.616,00			
	TOTAL SUMINISTRO DONOPLANAS					244.898.074,00															
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0.61) (F.Z. 1.34)																					
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	2.840,85	\$	80.955,00										2.840,85	\$	160.553.180,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	2.296,01	\$	80.955,00										2.296,01	\$	127.693.140,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	676,50	\$	79.758,00										676,50	\$	32.527.687,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.955,57	\$	80.955,00										1.955,57	\$	109.176.084,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	595,07	\$	80.955,00										595,07	\$	22.491.267,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.932,58	\$	80.955,00										1.932,58	\$	111.262.913,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.685,50	\$	80.955,00										1.685,50	\$	88.605.667,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	372,06	\$	80.955,00										372,06	\$	13.445.858,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	3.024,74	\$	80.955,00										3.024,74	\$	167.890.616,00			
	TOTAL SUMINISTRO LAS DELICIAS					244.898.074,00															
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0.61) (F.Z. 1.34)																					
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	2.840,85	\$	80.955,00										2.840,85	\$	160.553.180,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	2.296,01	\$	80.955,00										2.296,01	\$	127.693.140,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	676,50	\$	79.758,00										676,50	\$	32.527.687,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.955,57	\$	80.955,00										1.955,57	\$	109.176.084,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	595,07	\$	80.955,00										595,07	\$	22.491.267,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.932,58	\$	80.955,00										1.932,58	\$	111.262.913,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	1.685,50	\$	80.955,00										1.685,50	\$	88.605.667,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	372,06	\$	80.955,00										372,06	\$	13.445.858,00			
4.17	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO		ML	3.024,74	\$	80.955,00										3.024,74	\$	167.890.616,00			
	TOTAL SUMINISTRO LAS																				

CONDICIONES INICIALES										2010-2019			ANEXE EJECUCION			CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		
CONDICIONES INICIALES		DESCRIPCION		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
RESERVA WACAYO	COMUNIDAD KALIMIRNIE (10.000 - 11) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	1.283,19	\$	80.965,00	\$	104.703.129,00	\$	79.993.422,00	\$	998,00	\$	79.993.420,00	\$	24.709.708,00		
COMUNIDAD CACHAMITAS (6.000 - 0.84) (F.Z. 1.30)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	979,03	\$	80.965,00	\$	79.287.184,00	\$	62.659.620,00	\$	52.850.620,00	\$	52.850.620,00	\$	28.007.544,00			
COMUNIDAD PAL OGRANDE WALABO (10.000 - 11) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	1.949,38	\$	73.714,00	\$	143.586.597,00	\$	143.608.597,00	\$	143.608.597,00	\$	143.608.597,00	\$	438.115.497,00			
COMUNIDAD LA UNION (6.000 - 11) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	779,52	\$	73.714,00	\$	57.461.537,00	\$	57.461.537,00	\$	57.461.537,00	\$	57.461.537,00	\$	-			
COMUNIDAD PUNTO GALLO (10.000 - 11) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	1.341,87	\$	73.714,00	\$	98.914.605,00	\$	98.914.605,00	\$	98.914.605,00	\$	98.914.605,00	\$	-			
COMUNIDAD AL CARROBO (6.000 - 11) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	2.112,75	\$	73.714,00	\$	155.739.254,00	\$	120.736.640,00	\$	120.736.640,00	\$	120.736.640,00	\$	28.002.614,00			
COMUNIDAD MATAPALTO (6.000 - 11) (F.Z. 1.24)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	2.656,40	\$	74.923,00	\$	199.025.457,00	\$	199.025.457,00	\$	199.025.457,00	\$	199.025.457,00	\$	-			
COMUNIDAD LA PORFIA (10.000 - 11) (F.Z. 1.24)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	2.249,56	\$	74.923,00	\$	168.543.784,00	\$	168.543.784,00	\$	168.543.784,00	\$	168.543.784,00	\$	-			
COMUNIDAD LA CAMANA (10.000 - 11) (F.Z. 1.23)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	3.053,74	\$	73.714,00	\$	225.003.980,00	\$	219.372.864,00	\$	219.372.864,00	\$	219.372.864,00	\$	5.730.526,00			
COMUNIDAD LA CANANA (10.000 - 11) (F.Z. 1.23)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	3.053,74	\$	73.714,00	\$	1.804.149.889,00	\$	1.572.818.729,00	\$	1.572.818.729,00	\$	1.572.818.729,00	\$	31.733.140,00			
RESERVA ASENPOME	COMUNIDAD KERO ASENPOME (6.000 - 11) (F.Z. 1.30)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	4.528,36	\$	78.548,00	\$	355.693.627,00	\$	195.031.649,00	\$	2.490,60	\$	195.031.649,00	\$	160.081.972,00		
COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ (10.000 - 11) (F.Z. 1.30)	TUBERIA PVC-P RDE 21" SUMINISTRO	MIL	1.343,66	\$	78.548,00	\$	105.557.515,00	\$	58.851.304,00	\$	58.851.304,00	\$	58.851.304,00	\$	48.706.212,00			
TOTAL SUMINISTRO ASENPOME							481.251.136,00		254.482.593,00		254.482.593,00		254.482.593,00		208.768.184,00			
							SUB TOTAL DE SUMINISTROS (INCLUYE AUI)		4.395.125.063,00		4.395.125.063,00		4.395.125.063,00		840.690.130,00			
							COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS (SIN AUI)		3.407.973.892,25		3.407.973.892,25		3.407.973.892,25		651.687.775,19			


LUIS FERRNANDO MUÑOZ MURCIA
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2026

ING. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2026

ING. LUIS FERRANDO MUÑOZ MURCIA
R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2026

JORGE ADEMAR GARCIA SORRIMENTO
RUI CONSORCIO DE FOMENTO RIA AC INDIGENAS 2025

RECONOCIMIENTO DE LA COMUNITAT INDÍGENA ACÍNDIGENAS 2025



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

1103*

ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

11035



CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 15-oct-25
Norma: NTC-382/2295

Consecutivo 7.957
Referencia: CODO G.RADIO ACAMP 90°X2"
Lote de Fabricación: 30000079873

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,19
DIAMETRO INT DEL ANILLO	mm	NTC-3358	72,20 - 74,20	72,11
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,50
ESPESOR DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	$\geq 2,87$	3,50
ESPESOR DEL ANILLO	mm	NTC-3358	$\geq 2,87$	2,99
ESPESOR DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	$\geq 3,15$	3,47
LONGITUD DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	$\geq 15,00$	26,70
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	$\geq 95,00$	124,30
ANGULO DE LA CURVA	°	NTC-3358	89,00 - 91,00	90,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2295	100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2295	22 InHg X 1 HORA	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
 Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
 Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
 Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
 Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
 AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
 COTA - CUNDINAMARCA Colombia
 PBX: 8776820 FAX: 8776849
 www.gerfor.com

Pag. 1 of 1

11036

CERTIFICADO DE CALIDAD

Gerfor

Laboratorio de ensayos PVC Gerfor S.A.

Fecha: 05-sept-25
 Norma: NTC-382

Consecutivo: 1535
 Referencia: TUBO U.M. 2"
 Lote de fabricación: 30000052516

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3578	60 - 60	60
OVALAMIENTO	mm	NTC-3578	< 1,60	0,75
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3578	1,78 - 2,45	1,97
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3578	< 12,00	8,62
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3578	6000 - 6012	6009,77

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-3578	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO.	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	88	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	70% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO		NTC-382	LOGO IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE DIAMETRO PULG. - MM RDE PRESION DE TRABAJO	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
 Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
 Muestreo realizado según la NTC 2859-1 Vigente.


 Dra. Yelmi Milena Franco
 Directora Conformidad

Nit: 860 502 509 - 1
 Autopista Medellín Km 2
 600 m. vía parcelas, Cora
 Cundinamarca, Colombia.
 pbx: (1) 877 68 00 / 20
 fax: (1) 877 68 49
 www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

11037



CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 03-sep-25
Norma: NTC-382/2295

Consecutivo 7.261
Referencia: TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
Lote de Fabricación: 30000077123

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	60,17 - 60,47	60,40
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 1,52	0,24
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	2,87 - 3,38	3,14
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6008,30
ESPESOR DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 2,87	3,31
ESPESOR DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 3,15	3,34
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	62,21
DIAMETRO INT DEL ANILLO	mm	NTC-3358	72,20 - 74,20	72,63
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	62,12
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 95,00	116,02
LONGITUD DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 15,00	25,03
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	628,35
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	648,50

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
 Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
 Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos Morales
 Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Rodríguez

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
 Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
 AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
 COTA - CUNDINAMARCA Colombia
 PBX: 8776820 FAX: 8776849
 www.gerfor.com

Pag. 1 of 2

11028

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha: 03-sep-25
Norma: NTC-382/2295

Consecutivo 7.261
Referencia: TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
Lote de Fabricación: 30000077123

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	40,7	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2295	100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2295	22 InHg X 1 HORA	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 2" - 60mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE


Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:



Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor



Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Pag. 2 of 2



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.620 - 1

11039

ANEXO 3. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

FECHA DE INFORME		
MM	DD	AAAA
Marzo	3	2026

MES AL QUE PERTENECE EL INFORME
FEBRERO

CONTRATO N°
821

CONTRATANTE
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN

CONTRATISTA
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG)

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.

SEDE / PROYECTO
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST										
Item	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	No. HORAS	Fecha Programada	Indicador cobertura			Indicador eficacia			Responsable O Lider
				Total asistentes a la capacitación	Numero de trabajadores programados	% de Cumplimiento	Numero trabajadores evaluados	Numero de evaluaciones eficaces	% de Cumplimiento	
1	INDUCCIÓN SGSST	2,00	28/01/2026	4	4	100%	4	4	100%	COORDINADOR SST
2	CONVIVENCIA LABORAL	0,20	2/02/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
3	SENSACIÓN TERMICA POR CALOR	0,20	5/02/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
4	ACTORES VIALES: CUMPLIR NUESTRO ROL	0,15	10/02/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
5	HIDRATACIÓN CONSTANTE	0,15	13/02/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
6	CONDICIONES DE SALUD ÓPTIMAS	0,15	18/02/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
7	ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	0,15	23/02/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
8	ESTIRAMIENTO MUSCULAR	0,15	27/02/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST

2. Programa de Inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)							
Item	Inspección Realizada	Fecha	Periodicidad	Descripción del hallazgo	Plan de acción	Fecha del Cierre	% de Cumplimiento
1	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	2/02/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
2	BOTQUÍN WACOYO	4/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
3	CAMILLA WACOYO	4/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
4	EXTINTOR WACOYO	4/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
5	LOCATIVA	6/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
6	HERRAMIENTAS MECANIZADAS	6/02/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
7	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	9/02/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
8	HERRAMIENTAS MENORES	10/02/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
9	BOTQUÍN AWALIBA	11/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
10	CAMILLA AWALIBA	11/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
11	EXTINTOR AWALIBA	11/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
12	LOCATIVA	13/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
13	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	16/02/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
14	BOTQUÍN ASEIPOME	19/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
15	CAMILLA ASEIPOME	19/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
16	EXTINTOR ASEIPOME	19/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
17	LOCATIVA	20/02/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
18	HERRAMIENTAS MECANIZADAS	20/02/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
19	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	23/02/2026	SEMANAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
20	HERRAMIENTAS MENORES	24/02/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
21	INSPECCIÓN DE EPP	25/02/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%

3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST		
Item	Descripción de Gestión SST y demás Actividades	Observaciones
1	SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SE VALIDÓ DOCUMENTACIÓN DEL OPERADOR.	NINGUNA
2	SE DA CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES PLANEADAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.	NINGUNA
3	SE REALIZAN CHARLAS PRE OPERACIONALES, SOCIALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EJECUTAR.	NINGUNA
4	SEGUIMIENTO AL USO DE EPP Y DOTACIÓN EN OBRA.	NINGUNA
5	INDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NINGUNA
6	ANÁLISIS DE RIESGOS PARA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	NINGUNA
7	PERMISO DE TRABAJO SEGURO PARA ALTURAS	NINGUNA
8	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	NINGUNA

4. Inventario de Maquinaria y Equipos				
Item	Nombre del Equipo	Referencia	Propio o Alquilado	Observaciones
1	EXCAVADORA	97165	PROPIO	YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente						
Item	Descripción del hallazgo encontrado	Plan de Acción	Fecha	Se Notifico al Responsable		Estado
				SI	No	
1	NINGUNA	N/A	N/A			N/A



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

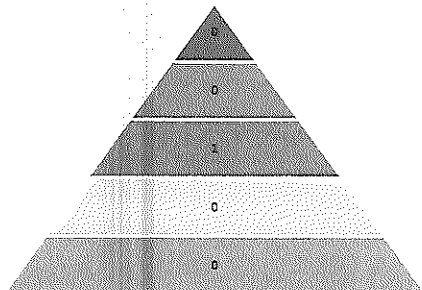
Código: SST-F-077

Versión: 01


Fecha: Agosto 2025

6. Seguimiento Ausentismo Laboral								
Item	Fecha	Nombre del Trabajador	Cedula	Cargo	Periodo de ausentismo		Total Dias de ausentismo	Descripción del ausentismo
					Fecha inicial	Fecha final		

7. Seguimiento a indicadores de Accidentalidad



FATALIDAD
ACCIDENTE TRABAJO GRAVE
ACCIDENTE TRABAJO MODERADO
ACCIDENTE TRABAJO LEVE
INCIDENTES



Ítem	Obra / Proyecto (Empresa contratista)	Promedio Trabajadores en el Mes	Total días trabajados en el Mes	HHT	INCIDENTE	AT LEVE	AT MODERADO	AT GRAVE	FATALIDAD	TOTAL AT	TOTAL DIAS INCAPACIDAD	TOTAL DIAS CARGADOS	ÍNDICES					
													Mes	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	TASA DE AUSENTISMO	TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES
1	CAG	21	24	1872	0	0	0	0	0	0	0	0	FEBRERO	0	0	0	0	0

8. Descripción de los Accidentes e incidentes presentados durante la Semana

Fecha del AT	Nombre	# Cedula	Ubicación y tipo de lesión	Incapacidad	Avance incapacidad	At investigado	Descripción del accidente

9. Registro Fotográfico de Gestión SST

Ubicación: OBRA
Descripción: Comportamiento seguro en el uso de EPP

Ubicación: OBRA
Descripción: Operación segura en limpieza y barrido de pozo.

Ubicación: OBRA
Descripción: Uso correcto de EPP

Ubicación: OBRA
Descripción: Acompañamiento SST al personal de perforación de pozos



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025



Ubicación:

OBRA

Descripción:

Reposición de EPP por desgaste




Ubicación:

OBRA

Descripción:

Reposición de EPP por desgaste




Ubicación:

OBRA

Descripción:

Inspección de equipos de protección contra caídas



Ubicación:

OBRA

Descripción:

Inspección visual de armado de andamios.



Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Mantenimiento de sistema eliminar de bacterias y olores




Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Inspección de sillas para escritorio






Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Mantenimiento de rodamientos de aire acondicionado



Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Inspección de botiquín, camilla y extintores.

10. Comentarios generales SST

- 1 Es importante destacar que se ejecutaron actividades de suministros de equipos, estructura y materiales para el desarrollo del proyecto, por lo tanto no se conto con personal operativo en el proyecto.
- 2 De acuerdo a lo anterior se realiza el presente informe teniendo en cuenta el personal independiente, que debido al desarrollo de proyecto solo se realizaron actividades de inspección.

FIRMA

NOMBRE

CARGO

GUSTAVO MEDINA

RESPONSABLE SST



INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 23 01 26

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: Andrés Nel Salgado - Fernández Documento: 1067867250
Cargo: PINTOR N° de celular: 3209255862

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	SI		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	SI	
Objetivos del SG-SST	SI		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	SI	
Política de SST	SI		COPASST / Vigía de SST	SI	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	SI		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	SI	
Política de Seguridad Vial	SI		Comité de Convivencia laboral	SI	
Definiciones de Riesgo y peligro	SI		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	SI	
Identificación de peligros y controles	SI		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	SI	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	SI		Reglamento de Higiene y seguridad	SI	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	SI
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	SI
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	SI
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	SI
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	SI
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	SI
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	SI



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 28 08 26

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, AUGUSTO SALGADO FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1067867880, desempeñando el cargo de PISTON. Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: AUGUSTO SALGADO F.

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MENDOZA

Firma: [Firma]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: ANDRÉS NEL SAGADO FERNÁNDEZ

Fecha: 28/01/2026

Cedula: 3209255862

Cargo: PINTOR

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

a. Verdadero ☒

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

b. Política de alcohol y drogas.

c. Política SST.

d. Política de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

a. Verdadero ☒

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

a. Verdadero ☒

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

d. Todas las anteriores ☒

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal ☒

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ☒

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo ☒

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. ☒ b. Usar los elementos de protección personal. ☒
c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad. ☒

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores. ☒
b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. ☒
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral ☒
d. Ninguna de las anteriores ☒

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- a) SI ☒ Ubicación: bodega
b) NO ☐

Firma del trabajador PURIS NEL GARCADO FERNANDEZ

c.c.: 1067867530

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEDINA

Cargo:

COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!



INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 28/08/26

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: CARLOS WINCE CASTILLO Documento: 17331371
Cargo: AY TEC N° de celular: 3125621547

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	SI		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	SI	
Objetivos del SG-SST	SI		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	SI	
Política de SST	SI		COPASST / Vigía de SST	SI	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	SI		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	SI	
Política de Seguridad Vial	SI		Comité de Convivencia laboral	SI	
Definiciones de Riesgo y peligro	SI		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	SI	
Identificación de peligros y controles	SI		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	SI	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	SI		Reglamento de Higiene y seguridad	SI	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplice las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	SI
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo) , iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	SI
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	SI
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	SI
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	SI
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	SI
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	SI



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 28 08 26

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE ENTERADO

Yo, carlos hince castillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 1423171, desempeñando el cargo de Ay. Tec Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: carlos castillo

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MORA

Firma: [Firma]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: Carlos Lince Castillo

Fecha: 28.01.2026

Cedula: 17331371

Cargo: AY Tec

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

a. verdadero ☒

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

b. Política de alcohol y drogas ☒

c. Política SST ☒

d. Política de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

a. Verdadero ☒

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

a. Verdadero ☒

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

d. Todas las anteriores ☒

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal. ☒

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. ☒

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. ☒

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN CUC	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035 Versión: 01 Fecha: agosto 2025				
8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:						
a. ~~Realizar~~ trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.						
c. Verificar el área de trabajo. d. ~~Trabajar~~ sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.						
9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?						
a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.						
☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa						
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral						
d. Ninguna de las anteriores						
10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?						
☒ a) SI Ubicación:						
b) NO						
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="142 842 1031 905"> Firma del trabajador <u>Carlos Hince CASTILLO</u> </td> <td data-bbox="1047 842 1425 905"> Responsable de la Inducción <u>GUSTAVO MEDINA</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 905 1031 968"> c.c.: <u>17 331 371</u> </td> <td data-bbox="1047 905 1425 968"> Cargo: <u>COORDINADOR SST</u> </td> </tr> </table>			Firma del trabajador <u>Carlos Hince CASTILLO</u>	Responsable de la Inducción <u>GUSTAVO MEDINA</u>	c.c.: <u>17 331 371</u>	Cargo: <u>COORDINADOR SST</u>
Firma del trabajador <u>Carlos Hince CASTILLO</u>	Responsable de la Inducción <u>GUSTAVO MEDINA</u>					
c.c.: <u>17 331 371</u>	Cargo: <u>COORDINADOR SST</u>					
¡¡Gracias por su participación!!						

11050



INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 28 01 26

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: Johan Banguero Documento: 1121891040
Cargo: Pintor N° de celular: 3117687314

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	SI		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	SI	
Objetivos del SG-SST	SI		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	SI	
Política de SST	SI		COPASST / Vigía de SST	SI	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	SI		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	SI	
Política de Seguridad Vial	SI		Comité de Convivencia laboral	SI	
Definiciones de Riesgo y peligro	SI		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	SI	
Identificación de peligros y controles	SI		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	SI	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	SI		Reglamento de Higiene y seguridad	SI	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	SI
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo) , iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	SI
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	SI
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	SI
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	SI
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	SI
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	SI



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (A) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 28 08 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, Julen Barquera, identificado con cédula de ciudadanía No. 112481040, desempeñando el cargo de Quitar. Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: Julen Barquera

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MEDINA

Firma: [Firma]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: Julian Banguero

Fecha: 28/01/2026

Cedula: 1121891040

Cargo: Painter

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

a. verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

b. Política de alcohol y drogas.

c. Política SST.

d. Política de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

a. Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

a. Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
- c. Verificar el área de trabajo. d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
- b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa.
- c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
- d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- a) ☒ Ubicación: Bodega
- b) NO

Firma del trabajador

Julian Bauguan

C.C.: 1121891040

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEDINA

Cargo:

COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 28/08/26

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: JESUS VILLAMIZAR Document: 1020453178
Cargo: Soldador N° de celular: 3209016492

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	SI		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	SI	
Objetivos del SG-SST	SI		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	SI	
Política de SST	SI		COPASST / Vigía de SST	SI	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	SI		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	SI	
Política de Seguridad Vial	SI		Comité de Convivencia laboral	SI	
Definiciones de Riesgo y peligro	SI		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	SI	
Identificación de peligros y controles	SI		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	SI	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	SI		Reglamento de Higiene y seguridad	SI	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplice las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	SI
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	SI
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	SI
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	SI
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	SI
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	SI
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	SI



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 25/08/25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, JESUS Villanueva, identificado con cédula de ciudadanía No. 1079152178 desempeñando el cargo de Soldador. Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: JESUS Villanueva

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MORALES

Firma: [Firma]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: JESUS Villanizar B

Fecha: 28-01-2026

Cedula: 1090453178

Cargo: Soldador

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

a. verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

b. Política de alcohol y drogas.

c. Política SST

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

a. Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

a. Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- a. ☒ Realizar trabajo en alturas sin uso de amés. b. ☐ Usar los elementos de protección personal.
c. ☐ Verificar el área de trabajo. d. ☒ Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
b. ☒ Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- a) ☒ SI Ubicación: bodega
b) ☐ NO

Firma del trabajador

Jesús Ramírez
C.C.: 1090457178

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEONA
Cargo:
COORDINADOR SST.


¡¡Gracias por su participación!!

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla__ <u>Visita</u> __ Campaña__ Otra__		
Fecha de actividad: <u>2 febrero 2026</u>	Hora: <u>7:00 am</u>	Duración: <u>20 minutos</u>
Tema: <u>Convivencia laboral</u>		Lugar: <u>Pueblo Gaitán</u>

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Francy Carolina Arévalo Garzón	40326478	Director De Obra	<i>[Signature]</i>
2	Diva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	<i>[Signature]</i>
3	Genesis Paola Parada Martínez	1092394700	Secretaria	<i>[Signature]</i>
4	Lina Marcela Gómez Leal	40328285	Auxiliar Contable	<i>[Signature]</i>
5	Jeimmy Alejandro Muñoz Murcia	80013513	Conductor	<i>[Signature]</i>
6	Ober Asmed Pérez Pérez	96193788	Almacenista	<i>[Signature]</i>
7	Wendy Vanesa Garzón García	1121902403	Ingeniero Residente De Obra 2	<i>[Signature]</i>
8	Guillermo Alberto Osorio Vargas	1121834340	Ingeniero Residente De Obra 1	<i>[Signature]</i>
9	Edwin Alejandro Barrios Poloche	1120864265	Oficial De Obra	<i>[Signature]</i>
10	Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar Operativo - Conductor	<i>[Signature]</i>
11	Yeferson Enrique Galván Montes	78646546	Operador De Maquinaria	<i>[Signature]</i>
12	Duván Arley Romero Arévalo	1004819005	Oficial De Tubería	<i>[Signature]</i>
13	José Javier Moncada Cano	1093921945	Oficial De Tubería	<i>[Signature]</i>
14	Miguel Diosid Correa Ojeda	1103470729	Oficial De Obra	<i>[Signature]</i>
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

11660

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla x Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 5 febrero 2025

Hora: 7:00

Duración: 20 minutos

Tema: SENSACIÓN TÉRMICA POR CALOR

Lugar: PUEBLO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Francy Carolina Arévalo Garzón	40326478	Director De Obra	<i>[Firma]</i>
2	Díva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	<i>[Firma]</i>
3	Genesis Paola Parada Martínez	1092394700	Secretaria	<i>[Firma]</i>
4	Lina Marcela Gómez Leal	40328285	Auxiliar Contable	<i>[Firma]</i>
5	Jeimmy Alejandro Muñoz Murcia	80013513	Conductor	<i>[Firma]</i>
6	Ober Asmed Pérez Pérez	96193788	Almacenista	<i>[Firma]</i>
7	Wendy Vanesa Garzón García	1121902403	Ingeniero Residente De Obra 2	<i>[Firma]</i>
8	Guillermo Alberto Osorio Vargas	1121834340	Ingeniero Residente De Obra 1	<i>[Firma]</i>
9	Edwin Alejandro Barrios Poloche	1120864265	Oficial De Obra	<i>[Firma]</i>
10	Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar Operativo - Conductor	<i>[Firma]</i>
11	Yeferson Enrique Galván Montes	78646546	Operador De Maquinaria	<i>[Firma]</i>
12	Duván Arley Romero Arévalo	1004819005	Oficial De Tubería	<i>[Firma]</i>
13	José Javier Moncada Cano	1093921945	Oficial De Tubería	<i>[Firma]</i>
14	Miguel Diosid Correa Ojeda	1103470729	Oficial De Obra	<i>[Firma]</i>
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA: *[Firma]*



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

11061

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla__ <u>X</u> Visita__ Campaña__ Otra__		
Fecha de actividad: <u>30 FEBRERO 2026</u>	Hora: <u>7:00</u>	Duración: <u>35 minutos</u>
Tema: <u>ACTOES VIALES : CUMPLIR NUESTRO ROI</u>		Lugar: <u>FUERTO GARZÓN</u>

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Francy Carolina Arévalo Garzón	40326478	Director De Obra	<i>[Firma]</i>
2	Diva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	<i>[Firma]</i>
3	Genesis Paola Parada Martínez	1092394700	Secretaria	<i>[Firma]</i>
4	Lina Marcela Gómez Leal	40328285	Auxiliar Contable	<i>[Firma]</i>
5	Jeimmy Alejandro Muñoz Murcia	80013513	Conductor	<i>[Firma]</i>
6	Ober Asmed Pérez Pérez	96193788	Almacenista	<i>[Firma]</i>
7	Wendy Vanesa Garzón García	1121902403	Ingeniero Residente De Obra 2	<i>[Firma]</i>
8	Guillermo Alberto Osorio Vargas	1121834340	Ingeniero Residente De Obra 1	<i>[Firma]</i>
9	Edwin Alejandro Barrios Poloche	1120864265	Oficial De Obra	<i>[Firma]</i>
10	Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar Operativo - Conductor	<i>[Firma]</i>
11	Yeferson Enrique Galván Montes	78646546	Operador De Maquinaria	<i>[Firma]</i>
12	Duván Arley Romero Arévalo	1004819005	Oficial De Tubería	<i>[Firma]</i>
13	José Javier Moncada Cano	1093921945	Oficial De Tubería	<i>[Firma]</i>
14	Miguel Diosid Correa Ojeda	1103470729	Oficial De Obra	<i>[Firma]</i>
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA: *[Firma]*



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

11052

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 13 FEBRERO 2026 Hora: 7:00 Duración: 15 minutos

Tema: HIDRATACIÓN CONSTANTE. Lugar: PUEBLO GAITÁN.

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Francy Carolina Arévalo Garzón	40326478	Director De Obra	
2	Diva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	
3	Genesis Paola Parada Martínez	1092394700	Secretaria	
4	Lina Marcela Gómez Leal	40328285	Auxiliar Contable	
5	Jeimmy Alejandro Muñoz Murcia	80013513	Conductor	
6	Ober Asmed Pérez Pérez	96193788	Almacenista	
7	Wendy Vanesa Garzón García	1121902403	Ingeniero Residente De Obra 2	
8	Guillermo Alberto Osorio Vargas	1121834340	Ingeniero Residente De Obra 1	
9	Edwin Alejandro Barrios Poloche	1120864265	Oficial De Obra	
10	Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar Operativo - Conductor	
11	Yeferson Enrique Galván Montes	78646546	Operador De Maquinaria	
12	Duván Arley Romero Arévalo	1004819005	Oficial De Tubería	
13	José Javier Moncada Cano	1093921945	Oficial De Tubería	
14	Miguel Diosid Correa Ojeda	1103470729	Oficial De Obra	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

1063

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla x Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 18 - febrero - 26 Hora: 7:00 am Duración: 15 minutos

Tema: CONDICIONES DE SALUD OPTIMAS. Lugar: Pueblo Garzón

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Francy Carolina Arévalo Garzón	40326478	Director De Obra	
2	Diva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	
3	Genesis Paola Parada Martínez	1092394700	Secretaria	
4	Lina Marcela Gómez Leal	40328285	Auxiliar Contable	
5	Jeimmy Alejandro Muñoz Murcia	80013513	Conductor	
6	Ober Asmed Pérez Pérez	96193788	Almacenista	
7	Wendy Vanesa Garzón García	1121902403	Ingeniero Residente De Obra 2	
8	Guillermo Alberto Osorio Vargas	1121834340	Ingeniero Residente De Obra 1	
9	Edwin Alejandro Barrios Poloche	1120864265	Oficial De Obra	
10	Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar Operativo - Conductor	
11	Yeferson Enrique Galván Montes	78646546	Operador De Maquinaria	
12	Duván Arley Romero Arévalo	1004819005	Oficial De Tubería	
13	José Javier Moncada Cano	1093921945	Oficial De Tubería	
14	Miguel Diosid Correa Ojeda	1103470729	Oficial De Obra	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

11064

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 23 febrero 2026 Hora: 7:00 AM

Duración: 15 minutos

Tema: ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Lugar: PUEBLO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Francy Carolina Arévalo Garzón	40326478	Director De Obra	
2	Diva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	
3	Genesis Paola Parada Martínez	1092394700	Secretaria	
4	Lina Marcela Gómez Leal	40328285	Auxiliar Contable	
5	Jeimmy Alejandro Muñoz Murcia	80013513	Conductor	
6	Ober Asmed Pérez Pérez	96193788	Almacenista	
7	Wendy Vanesa Garzón García	1121902403	Ingeniero Residente De Obra 2	
8	Guillermo Alberto Osorio Vargas	1121834340	Ingeniero Residente De Obra 1	
9	Edwin Alejandro Barrios Poloche	1120864265	Oficial De Obra	
10	Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar Operativo - Conductor	
11	Yeferson Enrique Galván Montes	78646546	Operador De Maquinaria	
12	Duván Arley Romero Arévalo	1004819005	Oficial De Tubería	
13	José Javier Moncada Cano	1093921945	Oficial De Tubería	
14	Miguel Diosid Correa Ojeda	1103470729	Oficial De Obra	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

11065

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla__ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 29 febrero 2026 Hora: 7:00 am Duración: 15 minutos

Tema: ESTIRAMIENTO MUSCULAR Lugar: PUERTO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Francy Carolina Arévalo Garzón	40326478	Director De Obra	
2	Diva Yanira Machado Tejeiro	40395435	Contadora	
3	Genesis Paola Parada Martínez	1092394700	Secretaria	
4	Lina Marcela Gómez Leal	40328285	Auxiliar Contable	
5	Jeimmy Alejandro Muñoz Murcia	80013513	Conductor	
6	Ober Asmed Pérez Pérez	96193788	Almacenista	
7	Wendy Vanesa Garzón García	1121902403	Ingeniero Residente De Obra 2	
8	Guillermo Alberto Osorio Vargas	1121834340	Ingeniero Residente De Obra 1	
9	Edwin Alejandro Barrios Poloche	1120864265	Oficial De Obra	
10	Rosemberg Murcia Jojoa	17497322	Auxiliar Operativo - Conductor	
11	Yeferson Enrique Galván Montes	78646546	Operador De Maquinaria	
12	Duván Arley Romero Arévalo	1004819005	Oficial De Tubería	
13	José Javier Moncada Cano	1093921945	Oficial De Tubería	
14	Miguel Diosid Correa Ojeda	1103470729	Oficial De Obra	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

LISTA DE CHEQUEO
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

11066

Centro de Trabajo: DESHUARO MORGUA ACUALIBA

Fecha: 2 AGOSTO 2025

Inspeccion Visual	BUENO: B									MALO: M									No aplica: NA									OBSERVACIONES
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO									
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A							
Arcaza del equipo	X			X			X			X			X			X			X									
Antillador	X			X			X			X			X			X			X									
Jedas	X			X			X			X			X			X			X									
ntensión Eléctrica, toma y clavija	X			X			X			X			X			X			X									
isible	X			X			X			X			X			X			X									
orta electrodo	X			X			X			X			X			X			X									
mbobinado	X			X			X			X			X			X			X									
inza para masa	X			X			X			X			X			X			X									
mperaje	X			X			X			X			X			X			X									
uiche de encendido	X			X			X			X			X			X			X									
able de pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X									
able de porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X									
olo a tierra	X			X			X			X			X			X			X									
erminales para soldar	X			X			X			X			X			X			X									
xiste ventilacion durante la aplicación de soldadura electrica	X			X			X			X			X			X			X									
stado de los Elementos de Protección personal del soldador.	X			X			X			X			X			X			X									
e cuenta con señalizacion de advertencia	X			X			X			X			X			X			X									
l permiso de Trabajo en Caliente está diligenciado.	X			X			X			X			X			X			X									
stado de la mampara	X			X			X			X			X			X			X									
stado del Extintor en el área de trabajo	X			X			X			X			X			X			X									
FIRMA DE QUIEN ELABORA	carlos			carlos			carlos			carlos			carlos			carlos												

Nombre: carlos Rinca C
Firma: [Signature]
Elabora / Soldador

Nombre: GUSTAVO MEDINA
Firma: [Signature]
Autorizo Responsable SST



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A

Código: SST-F-085

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Lugar: **PUERTO GAITÁN**

Fecha de inspección: **4 2 2026**

Ubicación del botiquín: **WACOCO**

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?

☒ Si

☐ No

Localizado en lugar visible?

☒ Si

☐ No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos?

☒ Si

☐ No

El botiquín se encuentra señalizado?

☒ Si

☐ No

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	60	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	9-27	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2	7-27	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:

GUSTAVO MEDINA

Firmas:

		INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA			Código: SST-F-021
					Versión: 01
					Fecha: agosto 2025
Codigo: N/A		Fecha de Inspección: 4 febrero 2026			
Responsable de la Inspección: Gustavo Medina		Cargo: Coordinador SST			
Lugar: Wacoyo - Puerto Gaitán.		Ubicación de la camilla: Wacoyo			
DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA					
Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2 Estado del soporte	X				
3 Sujetadores o Manijas de agarre	X				
4 Correas de amarre o seguridad	X				
5 Lugar visible y fácil acceso	X				
6 Rotulada / Señalización	X				
7 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				
OBSERVACIONES:					
 Firma					

10009

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2023	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: SST-F-020
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN:	4 febrero 2026	LUGAR:	WACORO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	Guillermo MENDOZA	CARGO:	COORD. SST

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de última recarga	Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A										OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador		Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	WACORO	NA	30 lbs	ABC	PQS	NOV-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

OBSERVACIONES GENERALES:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: SST-F-023

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 06 Febrero 2026

Lugar: PUEBLO GAITÁN

Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
PELIGROS FISICOS					
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores)	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de)	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
PELIGROS ELÉCTRICOS					
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
16	Existe señalización de peligros.	X			
PELIGROS DE SEGURIDAD					
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
PELIGROS BIOLOGICOS					
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
PELIGROS BIOMECANICO					
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.			X	
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: SST-F-023

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

ORDEN Y ASEO

33	El área se encuentra organizada.	X			
34	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
35	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			
36	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			

SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL

37	Baños con canecas	X			
38	Con jabón líquido, con toallas desechables	X			
39	Limpios	X			
40	Escaleras portátiles	X			
41	Sanitarios	X			
42	Lavamanos			X	
43	Orinales			X	
44	Duchas			X	
45	Espejo			X	
46	Acometida Hidrosanitaria			X	
47	Pintura			X	

PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA)

48	Se aplican los preoperacionales y listas de chequeo a la maquinaria en sitio	X			
49	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas y herramientas.	X			

PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)

50	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
51	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
52	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
53	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
54	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

MEDIO AMBIENTE

B.E

RE

MAL

OBSERVACIONES

55	Impresora / fotocopidora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
56	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

NOMBRE

GUSTAVO MEDINA

NOMBRE

CARGO/ FIRMA

[Firma]

CARGO/FIRMA

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S	Descripcion	Responsable	Firma

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio Observaciones

* Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

11073

INSPECCIÓN REALIZADA POR:									
NOMBRE: <u>Carloz Inace Castillo</u>									
CARGO: <u>Amador Torre</u>									
FIRMA: <u>[Signature]</u>									
PARTICIPACIÓN COPASIST. NOMBRE: _____									



CONSORCIO
AGUAS GATÁN
S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

1078

entro de Trabajo: RESERVALDO NOGUEA AVALISA

Fecha: 9-2-2026

arque con una X el estado

BUENO: B

MALO: M

No aplica: NA

INSPECCION VISUAL	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
arcaza del equipo	X			X			X			X			X			X						
entilador	X			X			X			X			X			X						
uedas	X			X			X			X			X			X						
xtensión Eléctrica, toma y clavija	X			X			X			X			X			X						
usible	X			X			X			X			X			X						
orta electrodo	X			X			X			X			X			X						
mbobinado	X			X			X			X			X			X						
ínza para masa	X			X			X			X			X			X						
imperaje	X			X			X			X			X			X						
uiche de encendido	X			X			X			X			X			X						
table de pinza para masa	X			X			X			X			X			X						
table de porta electrodo	X			X			X			X			X			X						
olo a tierra	X			X			X			X			X			X						
erminales para soldar	X			X			X			X			X			X						
xisite ventilacion durante la aplicación de oldadura eléctrica	X			X			X			X			X			X						
estado de los Elementos de Protección ersonal del soldador.	X			X			X			X			X			X						
ie cuenta con señalizacion de advertencia	X			X			X			X			X			X						
El permiso de Trabajo en Caliente está iligenciado.	X			X			X			X			X			X						
estado de la mampara	X			X			X			X			X			X						
estado del Extintor en el área de trabajo	X			X			X			X			X			X						
FIRMA DE QUIEN ELABORA	carlos			carlos			carlos			carlos			carlos			carlos						

Nombre: carlos linec

Firma: [Signature]

Elabora / Soldador

Nombre: GUSTAVO MEDINA

Firma: [Signature]

Autorizó Responsable SST



CONSORCIO
AGUAS CANTÓN
2025

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES

SST-F-066

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

CONTRATISTA:

OBRA: ACEROS Y OBRAS DE PAVIMENTO

FECHA: 30 - Agosto - 2025

ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Herramientas				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturón o caja de herramientas)	X			
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar	X			
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	X			
2	Herramientas de corte				
2,1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X	
2,2	Los cinceles se encuentran afilados			X	
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X	
2,4	Las seguetas están correctamente instaladas (fijas, aseguradas) y no presentan defectos			X	
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X			
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X	
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X			
3	Herramientas manuales y de golpe				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes están en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no está quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X			
4	Herramientas de torsión-llaves				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X			
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas		X		
4,3	Se disponen de llaves para golpear		X		
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas		X		
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X			
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos		X		
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas		X		
5	Herramientas eléctricas				
5,1	Están limpias y lubricadas	X			
5,2	Tiene sus guardas	X			
5,3	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
5,4	El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con protección contra el riesgo mecánico)	X			
5,5	En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes	X			
5,6	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X			
5,7	Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes	X			
5,8	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	X			
5,9	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X			
6	Herramienta neumática				
6,1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)	X			
6,2	Se trabaja a las presiones indicadas	X			
6,3	La herramienta es descargada al terminar	X			
7	Herramienta por detonación				
7,1	El personal se encuentra autorizado			X	
7,2	Se descarga y es almacenada			X	
7,3	Su sistema de disparo es bajo presión			X	

ACCIONES DE MEJORA


Item	Acción	Responsable	Fecha de reinspección


RESPONSABLE SST

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

MEMORIAS DE CANTIDADES										
OBJETO DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, TIGRE, UNUMA Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"								
CAPITULO	3,0	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	ITEM	3.2	DOSIFICADOR DE CLORO EN LÍNEA POR DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE 5 LIBRAS (INCLUYE INSTALACIÓN Y VALVULA DE CONTROL QUE REGULA EL FLUJO).	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	RESGUARDO AWALIBA	COMUNIDAD FACUNAE
DETALLE DOSIFICADOR DE CLORO					LOCALIZACION Y/O DESCRIPCIÓN	ALTO				
					DOSIFICADOR DE CLORO			2,00	2,00	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD DE OBRA				2,00

11077

		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A		Código: SST-F-085	
				Versión: 01	
				Fecha: agosto 2025	
Lugar:		PUERTO GAITÁN		Fecha de inspección: 31 2 26	
Ubicación del botiquín		AQUAIBA			
Marque con una X según las condiciones observadas:					
El botiquín se encuentra instalado en la pared?		☒	No	Localizado en lugar visible?	
		☒	No	☒ No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?		☒	No	El botiquín se encuentra señalizado?	
		☒	No	☒ No	
Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50	32-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	9-27	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2	NA	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	9-27	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				
Observaciones Generales:					
Participantes en la Inspección:		GUSTAVO MEDINA		Firmas:	

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA				Código: SST-F-021	
						Versión: 01	
						Fecha: agosto 2025	
Codigo: N/A		Fecha de Inspeccion: 11 Febrero 2026					
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA		Cargo: COORDINADOR SST.					
Lugar: PUERTO GAITÁN		Ubicación de la camilla: AWAÑIGA.					
DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA							
Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES		
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA				
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X						
2 Estado del soporte	X						
3 Sujetadores o Manijas de agarre	X						
4 Correas de amarre o seguridad	X						
5 Lugar visible y fácil acceso	X						
6 Rotulada / Señalización	X						
7 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X						
OBSERVACIONES:							
 Firma							

11029



CONSORCIO
AGUAS GALLÁN
2025

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST-F-020

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 11 febrero 2026

LUGAR: AWAJUBA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO MEDINA

CARGO: COORD. SST

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de última recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	AWAJUBA	NA	30 lb	ABC	PQS	NOV-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: SST-F-023

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 13 FEBRERO 2026

Lugar: PUEBLO GAITÁN

Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
PELIGROS FISICOS					
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores)	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
PELIGROS ELÉCTRICOS					
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
16	Existe señalización de peligros.	X			
PELIGROS DE SEGURIDAD					
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
PELIGROS BIOLOGICOS					
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
PELIGROS BIOMECANICO					
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.			X	
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaria 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			


11081

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA			Código: SST-F-023 Versión: 01 Fecha: agosto 2025
ORDEN Y ASEO					
33	El área se encuentra organizada.	X			
34	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
35	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			
36	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL					
37	Baños con canecas	X			
38	Con jabón líquido, con toallas desechables	X			
39	Limpios	X			
40	Escaleras portátiles	X			
41	Sanitarios	X			
42	Lavamanos			X	
43	Orinales			X	
44	Duchas			X	
45	Espejo			X	
46	Acometida Hidrosanitaria			X	
47	Pintura			X	
PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA)					
48	Se aplican los preoperacionales y listas de chequeo a la maquinaria en sitio	X			
49	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas y herramientas.	X			
PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)					
50	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
51	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
52	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
53	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
54	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
MEDIO AMBIENTE					
		B.E	RE	MAL	OBSERVACIONES
55	Impresora / fotocopidora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
56	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				
NOMBRE GUSTAVO MEDINA		NOMBRE			
CARGO/ FIRMA [Firma]		CARGO/FIRMA			
Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**					
Fecha	C/S	Descripción		Responsable	Firma

* Escriba toda especificación que requiera aclarar en el espacio Observaciones

* Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.



LISTA DE CHEQUEO

EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

entro de Trabajo: RESERVAO INDIGIA AVALIA

Fecha: 16-2-26

Inspección Visual	BUENO: B			MALO: M			No aplica: NA			OBSERVACIONES											
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
arcaza del equipo	X			X			X			X			X			X					
entilador	X			X			X			X			X			X					
uedas	X			X			X			X			X			X					
xtensión Eléctrica, toma y clavija	X			X			X			X			X			X					
usible	X			X			X			X			X			X					
orta electrodo	X			X			X			X			X			X					
mbobinado	X			X			X			X			X			X					
inza para masa	X			X			X			X			X			X					
mperaje	X			X			X			X			X			X					
uiche de encendido	X			X			X			X			X			X					
table de pinza para masa	X			X			X			X			X			X					
table de porta electrodo	X			X			X			X			X			X					
olo a tierra	X			X			X			X			X			X					
erminales para soldar	X			X			X			X			X			X					
xiste ventilacion durante la aplicacion de oldadura electrica	X			X			X			X			X			X					
estado de los Elementos de Protección ersonal del soldador.	X			X			X			X			X			X					
ie cuenta con señalizacion de advertencia	X			X			X			X			X			X					
il permiso de Trabajo en Caliente está diligenciado.	X			X			X			X			X			X					
estado de la mampara	X			X			X			X			X			X					
estado del Extintor en el área de trabajo	X			X			X			X			X			X					
FIRMA DE QUIEN ELABORA	Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			Carlos					

Nombre: Carlos Prince
Firma: [Signature]
Elabora / Soldador

Nombre: GUSTAVO MEDINA
Firma: [Signature]
Autorizó Responsable SST

11085



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A

Código: SST-F-085

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Lugar: **PUERTO GAITÁN**

Fecha de inspección: **30 7 2025**

Ubicación del botiquín: **ASEPTOMA**

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?

☒

No

Localizado en lugar visible?

☒

No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos?

☒

No

El botiquín se encuentra señalizado?

☒

No

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	9-22	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2	7-29	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	9-22	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				



Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:

GUSTAVO MEDINA

Firmas:

11008

		INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA			Código: SST-F-021
					Versión: 01
					Fecha: agosto 2025
Codigo: N/A		Fecha de Inspeccion: 19 febrero 2026			
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA		Cargo: COORDINADOR SST.			
Lugar: PUERTO GAITÁN		Ubicación de la camilla: ASERPOMA			
DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA					
Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2 Estado del soporte	X				
3 Sujetadores o Manijas de agarre	X				
4 Correas de amarre o seguridad	X				
5 Lugar visible y fácil acceso	X				
6 Rotulada / Señalización	X				
7 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				
OBSERVACIONES:					
 Firma					

Código: SST-F-020

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: J9 FEB 25 2026

LUGAR: 'Asci Pome

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Costaño Medina

CARGO: COLO. SST

[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: SST-F-023

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 20 FEBRERO 2026

Lugar: PUERTO GAITÁN

Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
PELIGROS FISICOS					
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores)	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
PELIGROS ELÉCTRICOS					
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
16	Existe señalización de peligros.	X			
PELIGROS DE SEGURIDAD					
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
PELIGROS BIOLÓGICOS					
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
PELIGROS BIOMECANICO					
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.			X	
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			

11089



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: SST-F-023

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

ORDEN Y ASEO

33	El área se encuentra organizada.	X			
34	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
35	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			
36	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			

SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL

37	Baños con canecas	X			
38	Con jabón líquido, con toallas desechables	X			
39	Limpios	X			
40	Escaleras portátiles	X			
41	Sanitarios	X			
42	Lavamanos			X	
43	Orinales			X	
44	Duchas			X	
45	Espejo			X	
46	Acometida Hidrosanitaria			X	
47	Pintura			X	

PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA)

48	Se aplican los preoperacionales y listas de chequeo a la maquinaria en sitio	X			
49	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas y herramientas.	X			

PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)

50	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
51	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
52	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
53	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
54	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

MEDIO AMBIENTE

B.E

RE

MAL

OBSERVACIONES

55	Impresora / fotocopidora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
56	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

NOMBRE *Gustavo Medina*

NOMBRE

CARGO/ FIRMA *[Firma]*

CARGO/FIRMA

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S	Descripcion	Responsable	Firma

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio Observaciones

* Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

CONSTELECORA DE ACCIDENTES

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INSPECCIONADA (Nombre de la herramienta a inspeccionar)

[illegible]

[illegible]



LISTA DE CHEQUEO
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Código: SST-F-067

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

1090

Lugar de Trabajo: RESERVA W. OREGAN ACUALIZA

Fecha: 23-2-26

Inspeccion Visual	BUENO: B									MALO: M									No aplica: NA									OBSERVACIONES
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO									
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A							
Carcaza del equipo	X			X			X			X			X			X			X									
Entilador	X			X			X			X			X			X			X									
Ruedas	X			X			X			X			X			X			X									
Extensión Eléctrica, toma y clavija	X			X			X			X			X			X			X									
Visible	X			X			X			X			X			X			X									
Porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X									
Embobinado	X			X			X			X			X			X			X									
Pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X									
Impermeable	X			X			X			X			X			X			X									
Interruptor de encendido	X			X			X			X			X			X			X									
Cable de pinza para masa	X			X			X			X			X			X			X									
Cable de porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X									
Cable a tierra	X			X			X			X			X			X			X									
Terminales para soldar	X			X			X			X			X			X			X									
Existe ventilacion durante la aplicación de soldadura electrica	X			X			X			X			X			X			X									
Estado de los Elementos de Protección Personal del soldador.	X			X			X			X			X			X			X									
Se cuenta con señalizacion de advertencia	X			X			X			X			X			X			X									
El permiso de Trabajo en Caliente está diligenciado.	X			X			X			X			X			X			X									
Estado de la mampara	X			X			X			X			X			X			X									
Estado del Extintor en el área de trabajo	X			X			X			X			X			X			X									
FIRMA DE QUIEN ELABORA	Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			Carlos			Carlos												

Nombre: Carlos Linera

Firma: [Signature]

Elabora / Soldador

Nombre: GUSTAVO MEDINA

Firma: [Signature]

Autorizó Responsable SST



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2023

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES

SST-F-066

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

CONTRATISTA:

OBRA: AGUAS MENORES PUERTO GAITÁN

FECHA: 24-2-26

ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Herramientas				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturón o caja de herramientas)	X			
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar	X			
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	X			
2	Herramientas de corte				
2,1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X	
2,2	Los cinceles se encuentran afilados			X	
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X	
2,4	Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, aseguradas) y no presentan defectos			X	
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	X			
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos			X	
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X			
3	Herramientas manuales y de golpe				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos	X			
4	Herramientas de torsion-llaves				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas	X			
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas		X		
4,3	Se disponen de llaves para golpear		X		
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas		X		
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X			
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos	X			
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas			X	
5	Herramientas electricas				
5,1	Estan limpias y lubricadas	X			
5,2	Tiene sus guardas	X			
5,3	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
5,4	El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico)	X			
5,5	En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes	X			
5,6	Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños	X			
5,7	Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes	X			
5,8	Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve	X			
5,9	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X			
6	Herramienta neumatica				
6,1	Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)	X			
6,2	Se trabaja a las presiones indicadas	X			
6,3	La herramienta es descargada al terminar	X			
7	Herramienta por detonación				
7,1	El personal se encuentra autorizado			X	
7,2	Se descarga y es almacenada			X	
7,3	Su sistema de disparo es bajo presión			X	

ACCIONES DE MEJORA

Item	Accion	Responsable	Fecha de reinspeccion

RESPONSABLE SST

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

[illegible]

[illegible]



TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR EL TRABAJO

12 HS

HORA INICIO

7:00 am

HORA DE TERMINACION

10:00

SUB-CONTRATISTA

SANOSOL

RESPONSABLE DEL FRENTE DE TRABAJO

GUILLERMO OSORIO

LOCALIZACION DEL TRABAJO A DESARROLLAR

Arenal de

EL O LOS TRABAJADORES AUTORIZADOS SON APTOS MEDICAMENTE PARA TRABAJO EN ALTURAS

SI

NO

SE HAN VERIFICADO LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

SI

NO

DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR

MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

17 METROS

REVISION DISTANCIA PARA REQUERIMIENTO DE CLARIDAD, SI APLICA

SI

NO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

AFILIACION Y PAGO VIGENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

ARL

EPS

AFP

NUMERO DE PERSONAS A DESARROLLAR LA TAREA

ANEXO LISTADO

VER PAGINA No.

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS.

FENOMENOS NATURALES	FISICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	QUIMICO	BIOMECANICO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICO
☒ SISMO	☒ RUIDO	☒ MECANICO	☒ POLVOS	☒ POSTURA	☒ ORGANIZACION DEL TRABAJO	☒ VIRUS
☒ TERREMOTO	☒ ILUMINACION	☒ ELECTRICO	☒ FIBRAS	☒ ESFUERZO	☒ GRUPO DE TRABAJO	☒ BACTERIAS
☒ VENDAVAL	☒ VIBRACIONES	☒ LOCATIVO	☒ MAT. PARTICULADO	☒ MOV REPETITIVOS	☒ CONDICIONES DE LA TAREA	☒ HONGOS
☒ DERRUMBE	☒ TEMPERATURAS	☒ TECNOLÓGICO	☒ GASES Y VAPORES	☒ M. MANUAL DE CARGAS	☒ INTERFACE PERSONA TAREA	☒ RIQUETSIAS
☒ PRECIPITACIONES	☒ RAD. IONIZANTES	☒ ACCIDENTES DE TRANSITO	☒ LIQUIDOS	☒ M. MANUAL DE CARGAS	☒ JORNADA DE TRABAJO	☒ PARASITOS
	☒ RAD. NO IONIZANTES	☒ PÚBLICOS	☒ HUMUS MET. Y NO MET.	☒ M. MANUAL DE CARGAS	☒ GESTION ORGANIZACIONAL	☒ PICADURAS
	☒ PRES. ATMOSFERICA	☒ TRABAJO EN ALTURAS	☒ HUMUS MET. Y NO MET.	☒ M. MANUAL DE CARGAS	☒ GESTION ORGANIZACIONAL	☒ MORDEDURAS
		☒ ESPACIOS CONFINADOS	☒ HUMUS MET. Y NO MET.	☒ M. MANUAL DE CARGAS	☒ GESTION ORGANIZACIONAL	☒ FLUIDOS O EXCREMENTOS
OTROS/ESPECIFIQUE						

SEMANA DEL 9 AL 14 DE FEBRERO

SI NO N.A. Escriba SI/NO/NA según corresponda

ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBS.
El trabajador (es) están certificado (s) para el trabajo seguro en alturas de acuerdo al nivel de capacitación según la normatividad vigente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Esta delimitada el área de acuerdo a la tarea a realizar, teniendo en cuenta la caída de objetos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Se ha instalado la línea de advertencia de acuerdo a la tarea a realizar.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Se ha colocado la señalización de advertencia requerida como: Uso obligatorio de los equipos contra caídas, Precaución vacío o hueco, izaje de cargas, Caída de objetos, Cinta de señalización (PELIGRO NO PASE), Excavación profunda, Riesgo eléctrico, Uso de los Elementos de Protección Personal, Salida, Ruta de evacuación y otros.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Se han instalado las barandas como medida colectiva de prevención en el área de trabajo de acuerdo al Programa de Protección Contra Caídas	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Se hace control de acceso al personal de obra mediante;	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Se han tapado todos los orificios, vacíos, huecos, ductos y foso del ascensor con una resistencia de dos veces la carga prevista, o en su defecto se han señalado o demarcado.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Se cuenta con el ayudante u oficial de seguridad para trabajo en alturas y ejecuta las tareas asignadas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Los andamios y tabloneros que se utilizan para trabajo en alturas están en buen estado.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Los trabajadores recibieron Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, charlas de seguridad, capacitación haciendo énfasis en los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Se mantiene la distancia mínima de 5,0 metros a las líneas o redes eléctricas de media y alta tensión por parte de los trabajadores para trabajos en andamios, estructuras e izaje de cargas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Se observa iluminación para trabajo en alturas en labores nocturnas, sótanos o caisson, lo cual permite la visualización de huecos, vacíos, ductos, foso del ascensor, escaleras y salidas del área de trabajo.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Se observa sistema de ventilación artificial para labores en espacios confinados, ductos, caisson, sótanos o fosos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Se realizan mediciones de atmosferas peligrosas en espacios confinados, ductos, caisson, sótanos o fosos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Se aplican los procedimientos de trabajo seguro para trabajo en alturas de acuerdo al manual, para armadura o cimbra, descimbrado en vigas-placas, columnas y muros.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR	OBSERVACIONES
MECANISMO DE ANCLAJE	CASCO CON BARBUQUEJO	
PUNTOS DE ANCLAJE	ROPA DE TRABAJO - ROPA DE INVIERNO	
ESLINGA PARA DETENCIÓN DE CAIDAS CORRIENTE	BOTAS DE SEGURIDAD	
MOSQUETONES	GUANTES	
PLAN DE RESCATE	CHALECO REFLECTIVO	
EQUIPOS PARA RESCATE		
BRIGADA DE EMERGENCIA		
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA MALLA ESCOMBRERA PARA CAIDA DE OBJETOS		
SE HA INSTALADO Y SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA RED DE SEGURIDAD PARA CAIDA DE PERSONAS		
Se revisan los Equipos de Protección Contra Caídas antes de cada uso por parte del trabajador.		

SISTEMA DE ACCESO	REVISIÓN VISUAL	BUEN ESTADO	SI	NO	N/A
ESCALERAS	ESCALERAS EN TABLON CON BARANDAS	SI			
ANDAMIO CON ESCALERA INTERNA	ANDAMIO DE CARGA O COLGANTE	SI			
OTRO SISTEMA DE ACCESO:	REVISIÓN VISUAL O INSPECCIÓN TÉCNICA	SI			
OTRO SISTEMA DE ACCESO:	REVISIÓN VISUAL O INSPECCIÓN TÉCNICA	SI			

OBSERVACIONES GENERALES:

PARTE No. 7

AUTORIZACION, REVISION Y VERIFICACION. PERMISO SUSPENDIDO.

NOMBRES Y APELLIDOS		No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS		1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
RESPONSABLE DEL FRENTA OBRA (MAESTRO Y/O ENCARGADO)				
NOMBRES Y APELLIDOS		No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS		1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
PERMISO REVISADO Y VERIFICADO POR (RESIDENTE, INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE S&S-T) COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS				
NOMBRES Y APELLIDOS		No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
JESÚS EVELIO VILLAMIZAR BOTIA		1090453178	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	Jesús Villamizar
PERMISO SUSPENDIDO O TAREA DETENIDA		FECHA:	HORA:	SE REQUIERE RENOVACION DEL PERMISO PARA TERMINAR LA TAREA
NOMBRES Y APELLIDOS		No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
TRABAJADOR AUTORIZADO		No. DE CEDULA	CARGO	FIRMA
SE REPORTA POR PARTE DE ALGUN TRABAJADOR LA CONDICIÓN DE SALUD QUE LE IMPIDA EL TRABAJO EN ALTURAS		SI	NO	CUAL

NOTA

LA (S) PERSONA (S) FIRMANTE (S) CONFIRMAN QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HAN SIDO INSPECCIONADAS Y EL PORTADOR DEL PERMISO (EJECUTANTE) ES RESPONSABLE POR CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE ACTIVIDAD O TAREA.

FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO										PAGINA ____ DE ____	
FECHA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD /TAREA	No. EPCC	Me encuentro en condiciones óptimas de salud para realizar la labor		Inspeccioné el equipo contra caídas antes de iniciar la labor		FIRMA		
LUNES	1	Jesús Villamizar	Soldador		☒	NO	☒	NO	Jesús Villamizar		
	2	Carlos Castillo	Ay Técnico		☒	NO	☒	NO	Carlos Castillo		
	3	Julian Banguera	Pintor		☒	NO	☒	NO	Julian Banguera		
	4				SI	NO	SI	NO			
	5				SI	NO	SI	NO			
MARTES	1	Jesús Villamizar	Soldador		☒	NO	☒	NO	Jesús Villamizar		
	2	Carlos Castillo	Ay TGC		☒	NO	☒	NO	Carlos Castillo		
	3	Julian Banguera	Pintor		☒	NO	☒	NO	Julian Banguera		
	4				SI	NO	SI	NO			
	5				SI	NO	SI	NO			
MIÉRCOLES	1	Jesús Villamizar	Soldador		☒	NO	☒	NO	Jesús Villamizar		
	2	Carlos Castillo	Ay Tec.		☒	NO	☒	NO	Carlos Castillo		
	3	Julian Banguera	Pintor		☒	NO	☒	NO	Julian Banguera		
	4				☒	NO	☒	NO			
	5				SI	NO	SI	NO			
JUEVES	1	Jesús Villamizar	Soldador		☒	NO	☒	NO	Jesús Villamizar		
	2	Carlos Castillo	Ay Tec		☒	NO	☒	NO	Carlos Castillo		
	3	Julian Banguera	Pintor		☒	NO	☒	NO	Julian Banguera		
	4				SI	NO	SI	NO			
	5				SI	NO	SI	NO			
VIERNES	1	Jesús Villamizar	Soldador		☒	NO	☒	NO	Jesús Villamizar		
	2	Carlos Castillo	Ay Tec		☒	NO	☒	NO	Carlos Castillo		
	3	Julian Banguera	Pintor		☒	NO	☒	NO	Julian Banguera		
	4				SI	NO	SI	NO			
	5				SI	NO	SI	NO			
SÁBADO	1	Jesús Villamizar	Soldador		☒	NO	☒	NO	Jesús Villamizar		
	2	Carlos Castillo	Ay Tec		☒	NO	☒	NO	Carlos Castillo		
	3	Julian Banguera	Pintor		☒	NO	☒	NO	Julian Banguera		
	4				SI	NO	SI	NO			
	5				SI	NO	SI	NO			
DOMINGO	1				SI	NO	SI	NO			
	2				SI	NO	SI	NO			
	3				SI	NO	SI	NO			
	4				SI	NO	SI	NO			
	5				SI	NO	SI	NO			

11095



CONSORCIO

AGUAS GAITÁN

2025

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

Código: SST-F-087

VERSION

1

FECHA

cha: 15 Diciembre de 20

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS WACOYO-ASEIPOME-AWALIBA-DOMO PLANA DE PUERTO GAITÁN

OBJETO DEL TRABAJO:

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DEL TANQUE ELEVADO.

TRABAJO A REALIZAR

MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS, ESCALERA, ANDAMIO, CUERDAS DE MANILA, EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR.

FECHA DE INICIO

01- FEBRERO - 2026

FECHA DE CIERRE

28- FEBRERO - 2026

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento).

CLASIFICACION

PELIGROS (Situacion o Fuente).

CONTROLES

RESPONSABLE

ASEGURAMIENTO DEL AREA, ALISTAMIENTO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

DE SEGURIDAD

Locativo: sistemas y medios de almacenamiento (material mal almacenado), Area en desorden, Superficies lisas, húmedas o resbalosas, obstrucción en el área directa de trabajo, caída de objetos; Eléctrico: Baja tensión; Mecánico: elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos; Accidentes de tránsito: atropellamiento entre equipos o de equipos con personas. (caídas a mismo nivel, tropesones, lesiones osteomusculares, electrocución, quemaduras, Atropellos y colisiones)

Inspección pre uso de herramientas menores y equipos a utilizar, Realizar inspección de área, Utilizar senderos o áreas de tránsito seguras y garantizar la adecuada iluminación, Ubicar herramientas y equipos en lugares no transitados, demarcar zonas de almacenamiento de materiales, Coordinación de trabajos con personal y/o subcontratistas previamente al inicio de labores, Hacer uso adecuado de epps y dotación, realizar jornadas de orden y aseo, Charlas de seguridad sobre riesgo mecánico, cuidado de manos.

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

BIOMECÁNICO O

Manipulación manual de cargas: levantamiento de cargas, Adopción de Posturas forzadas (Fatiga muscular, Hernias, Lesiones osteomusculares)

Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg, Carga máxima para transportar 40 kg, Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas.

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

BIOLOGICO

Mordeduras de serpientes, Picaduras de abejas, avispas, pitos, alacranes, arañas, insectos entre otros, Bacterias presentes en el entorno de trabajo (Alergias, Enrojecimiento de la piel, Brote, infecciones cutaneas, intoxicacion, envenenamiento, muerte)

Verificar el área de trabajo: en caso de encontrar un animal peligroso avisar inmediatamente al supervisor para que él se comunique con el area seguridad y medio ambiente. Realizar charlas de cinco minutos que permitan socializar al personal acerca del riesgo biológico y las medidas de prevención a tener en cuenta al desarrollar trabajos. Realizar limpieza de manos antes de alimentarse para prevenir contaminación-cruzada. Uso de dotación y de EPPS (mascarilla, casco, guantes, lentes de seguridad y botas de seguridad). Contar con vacunas (Tétano y fiebre amarilla)

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

QUIMICO

Poivos orgánicos e inorgánicos, Material particulado, Manipulación de solventes y/o sustancias químicas (Afecciones respiratorias, Dermatitis, intoxicación, Irritación de ojos, hipósensibilidad, quemaduras de piel)

Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación. Uso de dique de contención en el momento de trasvase, Seguir indicaciones de la ficha de seguridad y/o técnica del producto, contar con kit antiderrames en el punto de acopio.

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

FISICO

Temperaturas extremas por calor, Radiaciones no ionizantes por exposición a rayos solares, Ruido por utilización de herramienta de golpe y el aportado por el ambiente de trabajo (deshidratación, calambres, fatiga muscular, estrés termico, quemaduras de piel)

Hidratación, Uso de bloqueador solar, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, camisa manga larga, guantes, gafas con filtro uv). Uso de protección auditiva de inserción para todo el personal en las zonas de alta operación de equipos. Sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo.

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

PSICOSOCIAL

Gestión organizacional: estilo de mando, inducción, capacitación, manejo de cambios, evaluación del desempeño; Organización del trabajo: comunicación; Características del grupo social de trabajo: trabajo en equipo; Interfase persona tarea: conocimientos y habilidades, identificación de la tarea; Jornadas de trabajo: horas extras (Stres, Sobrecarga laboral, Conflictos interpersonales, Consecuencias psicológicas (ansiedad, miedo, depresión e inseguridad))

Capacitación del personal en los estándares de seguridad asociados al desarrollo de la labor, Charlas de planeación de trabajos a realizar, asignación adecuada de funciones del personal en función de sus competencias y experiencia, Mantener siempre una comunicación asertiva en el equipo de trabajo, Pausas activas, Rotación del personal, Retomar prácticas de la buena comunicación, Campañas y capacitaciones de autocuidado.

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

FENOMENOS NATURALES

Sismos, Precipitaciones de lluvias, Terremotos, Inundación, Derrumbe. (Fracturas, Lesiones en general, laceraciones, Caídas, Muerte)

Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON). Cuando se presenten tormentas eléctricas se deben detener las actividades, Contar con dotación de invierno (carpas y botas de caucho), contar con parpas o campamento para el resguardo de los trabajadores.

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

MÉTALICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA

BIOMECÁNICO

Manipulación manual de cargas: Levantamiento manual de equipos y materiales; Esfuerzo: traslado de carretilla. Postura prolongada, mantenida, forzada

Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg (Hombres), 12.5 kg (Mujeres) Carga máxima para transportar 40 kg (Hombres), 20 kg (Mujeres), Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas, Rotación del puesto de trabajo, Utilización de ayudas mecánicas (pluma o grua), Capacitación al personal sobre manipulación manual de cargas.

Soldadores, ayudantes, ingeniero residente.

DE SEGURIDAD

Trabajo en alturas: Soldadura a borde de placa en dovelas y andenes a mas de 1.50m de altura; trabajos en plataformas o canastas colgantes; Caídas a distinto nivel, Caída de objetos. (Golpes, contusiones, fracturas, laceraciones, Aplastamiento, traumas, muerte)

Uso de equipos de alturas certificados, Inspección de equipos de Alturas, Uso de Porta herramientas, Uso de personal capacitado y certificado en Trabajo en Alturas (Verificación del certificado de aptitud médica de los trabajadores y del curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas), Verificación del diligenciamiento de los PTS, ATS y documentación requerida para el aseguramiento de la actividad en alturas, Uso de señalización de caída de objetos y trabajo en alturas, Uso de sistemas de acceso certificado, divulgación del plan de rescate, divulgación del procedimiento constructivo, divulgación de plan de emergencias, verificación del estado de salud (lista de chequeo), hacer uso de acompañamiento o ayudante de seguridad, El personal que labora en la parte superior, deberá usar la eslinga de restricción y estar anclado a un punto de anclaje, Hacer uso adecuado de los epps y los EPCC (casco, barbuquejo, ames, eslinga).

Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.

FENOMENOS NATURALES

Sismos, Precipitaciones de lluvias, Terremotos, Inundación, Derrumbe. (Fracturas, Lesiones en general, laceraciones, Caídas, Muerte)

Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON). Cuando se presenten tormentas eléctricas se deben detener las actividades, Contar con dotación de invierno (carpas y botas de caucho), contar con parpas o campamento para el resguardo de los trabajadores.

Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

FISICO

Temperaturas extremas por calor, Radiaciones no ionizantes por exposición a rayos solares, Ruido por utilización de herramienta de golpe y el aportado por el ambiente de trabajo (deshidratación, calambres, fatiga muscular, estrés termico, quemaduras de piel)

Hidratación, Uso de bloqueador solar, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, camisa manga larga, guantes, gafas con filtro uv). Uso de protección auditiva de inserción para todo el personal en las zonas de alta operación de equipos. Sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo.




Soldadores, ayudantes y ingeniero residente

MONTAJE DE PIEZAS	DE SEGURIDAD	Locativo: Area en desorden, Superficies lisas, húmedas, resbalosas o irregulares, obstrucción en el área directa de trabajo, caída de material (caídas a mismo y distinto nivel, tropesones, lesiones osteomusculares)	Realizar inspección de área, Aseguramiento y anclaje de la pluma para izaje de material, Utilizar senderos o áreas de tránsito seguras, La herramienta no debe ser ubicada al borde de la excavación, Se deberá asegurar el amarre de la herramienta y equipos a descender y el personal que labora dentro del caisson deberá ascender previo a la extracción del objeto, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad, gafas, tapabocas) y realizar jornadas de orden y aseo.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
	DE SEGURIDAD	Mecánico: Manipulación de equipos y herramientas manuales y eléctricas (equipo de soldadura, pinza portaelectrodos y masa, martillo, alicate, llave, destornillador, hombrosolo, maceta, etc), coropunzantes, con piezas en movimiento, uso de equipos mecánicos para izaje de cargas como plumas, torreguas o gruas telescópicas (Lesiones osteomusculares, golpes, caída de objetos, cortes, machucones, laceraciones, esguinces, atrapamientos de miembros, fatiga muscular, material particulado, muerte)	Inspección de herramienta, equipos y/o maquinaria, Uso adecuado de equipos, No usar herramientas en mal estado, Contar con extintor en el área, Tener capacitación en uso de equipos (Verificar las competencias y/o experiencia del personal que empleará el equipo), Usar guardas de seguridad en los equipos, Contar con ayudante aparejador o bachero, No dejar la carga suspendida, No transitar por debajo de la carga, Usar manillas o vientos para guiar la carga, Usar equipo de comunicación para el izaje de cargas con torregua, Usar epps adecuados (guantes, casco).	Soldadores, ayudantes y ingeniero residente	
SOLDADURA ELECTRICA	DE SEGURIDAD	Trabajo en alturas: Soldadura a borde de placa en dovelas y andenes a mas de 1.50m de altura; trabajos en plataformas o canastas colgantes: Caídas a distinto nivel, Caída de objetos. (Golpes, contusiones, fracturas, laceraciones, Aplastamiento, traumas, muerte)	Uso de equipos de alturas certificados, Inspección de equipos de Alturas, Uso de Porta herramientas, Uso de personal capacitado y certificado en Trabajo en Alturas (Verificación del certificado de aptitud médica de los trabajadores y del curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas), Verificación del diligenciamiento de los PTS, ATS y documentación requerida para el aseguramiento de la actividad en alturas, Uso de señalización de caída de objetos y trabajo en alturas, Uso de sistemas de acceso certificado, divulgación del plan de rescate, divulgación del procedimiento constructivo, divulgación de plan de emergencias, verificación del estado de salud (lista de chequeo), hacer uso de acompañamiento o ayudante de seguridad, El personal que labora en la parte superior, deberá usar la eslinga de restricción y estar anclado a un punto de anclaje, Hacer uso adecuado de los epps y los EPCC (casco, barbuquejo, ames, eslinga).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
		Locativo: Area en desorden, Superficies lisas, húmedas, resbalosas o irregulares, obstrucción en el área directa de trabajo, caída de material (caídas a mismo y distinto nivel, tropesones, lesiones osteomusculares)	Realizar inspección de área, Aseguramiento y anclaje de la pluma para izaje de material, Utilizar senderos o áreas de tránsito seguras, La herramienta no debe ser ubicada al borde de la excavación, Se deberá asegurar el amarre de la herramienta y equipos a descender y el personal que labora dentro del caisson deberá ascender previo a la extracción del objeto, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad, gafas, tapabocas) y realizar jornadas de orden y aseo.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
		Tecnológicos: Explosiones o incendios de origen eléctrico o por gases inflamables (Quemaduras de 1er, 2do o 3er grado, daños a los órganos, daños a la propiedad y muerte)	Verificar el estado y mantenimiento del equipo, Realice inspeccion de equipos, Señalice y delimite el área de trabajo, Contar con extintor en el área.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
		Mecánico: Manipulación de equipos y herramientas manuales y eléctricas (equipo de soldadura, pinza portaelectrodos y masa, martillo, alicate, llave, destornillador, hombrosolo, maceta, etc), coropunzantes, con piezas en movimiento, uso de equipos mecánicos para izaje de cargas como plumas, torreguas o gruas telescópicas (Lesiones osteomusculares, golpes, caída de objetos, cortes, machucones, laceraciones, esguinces, atrapamientos de miembros, fatiga muscular, material particulado, muerte)	Inspección de herramienta, equipos y/o maquinaria, Uso adecuado de equipos, No usar herramientas en mal estado, Contar con extintor en el área, Tener capacitación en uso de equipos (Verificar las competencias y/o experiencia del personal que empleará el equipo), Usar guardas de seguridad en los equipos, Contar con ayudante aparejador o bachero, No dejar la carga suspendida, No transitar por debajo de la carga, Usar manillas o vientos para guiar la carga, Usar equipo de comunicación para el izaje de cargas con torregua, Usar epps adecuados (guantes, casco).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
		Eléctrico: Manipulación de equipos eléctricos, extensiones. (Quemaduras de 1er, 2do y 3er grado, choques eléctricos, muerte)	Inspección preoperacional de herramienta y equipos, Las extensiones de los equipos deben ser encauchetadas, Uso de equipos con aislamiento o dieléctricos, Uso permanente de Epps dieléctricos, No laborar bajo condiciones de lluvia, aterrizar equipos eléctricos con polo a tierra, No usar extensiones en mal estado, contar con extintor en el área.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
		FISICO	Ruido: Manipulación de herramientas de impacto (martillo, maceta) (Estrés, Dolor de oídos, Zumbidos, Cefalea, Perforación del tímpano, Hipoacusia)	Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, realizar inspección preoperacional de herramientas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	Iluminación: Deficiencia de iluminación (Sobreesfuerzo visual, Agotamiento visual, Encandilamiento, Golpes, Nistagmus, tropesones)		Proveer iluminación artificial resistente al agua.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
	Vibración: Manipulación de equipos (taladro) (Dolor abdominal, Problemas de equilibrio, Cefalea, Artrosis, Problemas neurológicos, Mareo, Vómito).		Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, Realizar los exámenes periódicos, Verificar el estado y mantenimiento de los equipos (preoperacional).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
	Temperaturas Extremas: Calor por luz Solar (Agotamiento físico, Deshidratación, Desmayos, Hipertermia).		Proveer ventilación adecuada para el lugar de trabajo, Realizar rotación de la tarea, Suministrar periódicamente agua potable, Suministrar la cantidad requerida de suero oral.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
	BIOMECÁNICO		Manipulación manual de cargas: Levantamiento manual de equipos y materiales; Esfuerzo: traslado de carretilla. Postura prolongada, mantenida, forzada	Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg (Hombres), 12.5 kg (Mujeres) Carga máxima para transportar 40 kg (Hombres), 20 kg (Mujeres), Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas, Rotación del puesto de trabajo, Utilización de ayudas mecánicas (pluma o grua), Capacitación al personal sobre manipulación manual de cargas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	QUÍMICO		Material particulado: por trabajos con pulidora; Humos metálicos: uso de soldadura eléctrica. (Afecciones respiratorias, Alergias, Carcinogénesis, Dermatitis, intoxicación, irritación nasal y ocular)	Uso de EPP adecuados para cada producto químico utilizado: como caretas, protectores respiratorios con filtro si se requiere, gafas de seguridad. Proveer ventilación artificial adecuada para el lugar de trabajo o si se presenta acumulación de partículas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	BIOLOGICO	Picaduras: presencia de mosquitos y/o zancudos; Mordeduras: presencia de serpientes (Alergias, Enrojecimiento de la piel, Brote, infecciones, transmisión de enfermedades endémicas, intoxicación, muerte)	Verificación del esquema de vacunación, Realizar inspección de áreas de trabajo antes de iniciar la tarea, Capacitación relacionada al peligro, uso de dotación (camisa manga larga, pantalón, botas) y uso de EPP'S (guantes), Eliminar criaderos (orden y aseo en zonas de empozamiento de aguas).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.	
PSICOSOCIAL	Gestión organizacional: estilo de mando, Inducción, capacitación, manejo de cambios, evaluación del desempeño; Organización del trabajo: comunicación; Características del grupo social de trabajo: trabajo en equipo; Interfase persona tarea: conocimientos y habilidades, identificación de la tarea; Jornadas de trabajo: horas extras (Stres, Sobrecarga laboral, Conflictos interpersonales, Consecuencias psicológicas (ansiedad, miedo, depresión e inseguridad))	Capacitación del personal en los estándares de seguridad asociados al desarrollo de la labor, Charlas de planeación de trabajos a realizar, asignación adecuada de funciones del personal en función de sus competencias y experiencia, Mantener siempre una comunicación asertiva en el equipo de trabajo, Pausas activas, Rotación del personal, Retomar prácticas de la buena comunicación, Campañas y capacitaciones de autocuidado.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.		
NATURALES	Precipitaciones de lluvias y Sismos (Atrapamiento por desprendimiento de material, lesiones leves y graves por desprendimiento de material, Hipotermia, Susceptibilidad a los virus (gripe, entre otras), Descargas Eléctricas)	Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON), Uso de carpas, uso de dotación de invierno o lluvia, uso de botas de caucho, apuntalamientos, identificar las rutas de evacuación y punto de encuentro, Inspeccionar las áreas susceptibles a sufrir derrumbes e intervenir con medidas preventivas y/o correctivas, Conformación, identificación y capacitación de las brigadas de emergencias, Contar con kit de rescate, suspender actividades en presencia de lluvia y tormenta eléctrica, Registro de MEDEVAC, Identificar y atender al sistema de ALARMA.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.		

11098

OXICORTE	DE SEGURIDAD	Trabajo en alturas: Soldadura en alturas mayor a 2 metros: Caídas a distinto nivel, Caída de objetos, (Golpes, contusiones, fracturas, laceraciones, Aplastamiento, traumas, muerte)	Uso de equipos de alturas certificados, Inspección de equipos de Alturas, Uso de Porta herramientas, Uso de personal capacitado y certificado en Trabajo en Alturas (Verificación del certificado de aptitud médica de los trabajadores y del curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas), Verificación del diligenciamiento de los PTS, ATS y documentación requerida para el aseguramiento de la actividad en alturas, Uso de señalización de caída de objetos y trabajo en alturas, Uso de sistemas de acceso certificado, divulgación del plan de rescate, divulgación del procedimiento constructivo, divulgación de plan de emergencias, verificación del estado de salud (lista de chequeo), hacer uso de acompañamiento o ayudante de seguridad, El personal que labora en la parte superior, deberá usar la eslinga de restricción y estar anclado a un punto de anclaje, Hacer uso adecuado de los epps y los EPCC (casco, barbuquejo, ames, eslinga).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Locativo: Área en desorden, Superficies lisas, húmedas, resbalosas o irregulares, obstrucción en el área directa de trabajo, caída de material (caídas a mismo y distinto nivel, tropesones, lesiones osteomusculares)	Realizar inspección de área, Aseguramiento y anclaje de la pluma para izaje de material, Utilizar senderos o áreas de tránsito seguras, La herramienta no debe ser ubicada al borde de la excavación, Se deberá asegurar el amarre de la herramienta y equipos a descender y el personal que labora dentro del caisson deberá ascender previo a la extracción del objeto, Hacer uso adecuado de epps y dotación (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad, gafas, tapabocas) y realizar jornadas de orden y aseo.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Tecnológicos: Explosiones o incendios de origen eléctrico o por gases inflamables (Quemaduras de 1er, 2do o 3er grado, daños a los órganos, daños a la propiedad y muerte)	Verificar el estado y mantenimiento del equipo, Realice inspección de equipos, Señalice y delimite el área de trabajo, Contar con extintor en el área.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Mecánico: Manipulación de equipos y herramientas manuales y eléctricas (martillo, alicate, llave, destornillador, hombresolo, maceta, etc), cortopunzantes, con piezas en movimiento, uso de equipos mecánicos para izaje de cargas como plumas, torregruas o gruas telescópicas (Lesiones osteomusculares, golpes, caída de objetos, cortes, machucones, laceraciones, esguinces, atrapamientos de miembros, fatiga muscular, material particulado, muerte)	Inspección de herramienta, equipos y/o maquinaria, Uso adecuado de equipos, No usar herramientas en mal estado, Contar con extintor en el área, Tener capacitación en uso de equipos (Verificar las competencias y/o experiencia del personal que empleará el equipo), Usar guardas de seguridad en los equipos, Contar con ayudante aparejador o bachero, No dejar la carga suspendida, No transitar por debajo de la carga, Usar manillas o vientos para guiar la carga, Usar equipo de comunicación para el izaje de cargas con torregrua, Usar epps adecuados (guantes, casco).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Eléctrico: Manipulación de equipos eléctricos, extensiones, (Quemaduras de 1er, 2do y 3er grado, choques eléctricos, muerte)	Inspección preoperacional de herramienta y equipos, Las extensiones de los equipos deben ser encauchetadas, Uso de equipos con aislamiento o dieléctricos, Uso permanente de Epps dieléctricos, No laborar bajo condiciones de lluvia, aterizar equipos eléctricos con polo a tierra, No usar extensiones en mal estado, contar con extintor en el área.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	FÍSICO	Ruido: Manipulación de herramientas de impacto (martillo, maceta) (Estrés, Dolor de oídos, Zumbidos, Cefalea, Perforación del tímpano, Hipoacusia)	Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, realizar inspección preoperacional de herramientas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Iluminación: Deficiencia de iluminación (Sobreesfuerzo visual, Agotamiento visual, Encandilamiento, Golpes, Nistagmus, tropesones)	Proveer iluminación artificial resistente al agua.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Vibración: Manipulación de equipos (taladro) (Dolor abdominal, Problemas de equilibrio, Cefalea, Artrosis, Problemas neurológicos, Mareo, Vómito).	Reducir el tiempo de exposición a través de la rotación de las tareas, Realizar pausas activas, Realizar los exámenes periódicos, Verificar el estado y mantenimiento de los equipos (preoperacional).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
		Temperaturas Extremas: Calor por luz Solar (Agotamiento físico, Deshidratación, Desmayos, Hipertermia).	Proveer ventilación adecuada para el lugar de trabajo, Realizar rotación de la tarea, Suministrar periódicamente agua potable, Suministrar la cantidad requerida de suero oral.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	BIOMECÁNICO	Manipulación manual de cargas: Levantamiento manual de equipos y materiales; Esfuerzo: traslado de carretilla. Postura prolongada, mantenida, forzada	Calistenia, Respetar pesos en levantamiento y manipulación de cargas, carga máxima para levantar 25 kg (Hombres), 12.5 kg (Mujeres) Carga máxima para transportar 40 kg (Hombres), 20 kg (Mujeres), Adoptar posiciones adecuadas de trabajo, Pausas Activas, Rotación del puesto de trabajo, Utilización de ayudas mecánicas (pluma o grua), Capacitación al personal sobre manipulación manual de cargas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	QUÍMICO	Material particulado: por trabajos con pulidora; Gases y Vapores: por manipulación Gas Propano y oxígeno; Humos metálicos: uso de soldadura eléctrica; (Afecciones respiratorias, Alergias, Carcinogénesis, Dermatitis, Intoxicación, Irritación nasal y ocular)	Uso de EPP adecuados para cada producto químico utilizado: como caretas, protectores respiratorios con filtro si se requiere, gafas de seguridad. Proveer ventilación artificial adecuada para el lugar de trabajo o si se presenta acumulación de partículas.	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	BIOLOGICO	Picaduras: presencia de mosquitos y/o zancudos; Mordeduras: presencia de serpientes (Alergias, Enrojecimiento de la piel, Brote, infecciones, transmisión de enfermedades endémicas, intoxicación, muerte)	Verificación del esquema de vacunación, Realizar inspección de áreas de trabajo antes de iniciar la tarea, Capacitación relacionada al peligro, uso de dotación (camisa manga larga, pantalón, botas) y uso de EPP'S (guantes), Eliminar criaderos (orden y aseo en zonas de empozamiento de aguas).	Soldadores, ayudantes, ingeniero residente y coordinador de alturas.
	PSICOSOCIAL	Gestión organizacional: estilo de mando, inducción, capacitación, manejo de cambios, evaluación del desempeño; Organización del trabajo: comunicación; Características del grupo social de trabajo: trabajo en equipo; Interfase persona tarea: conocimientos y habilidades, identificación de la tarea; Jornadas de trabajo: horas extras (Stres, Sobrecarga laboral, Conflictos interpersonales, Consecuencias psicológicas (ansiedad, miedo, depresión e inseguridad))	Capacitación del personal en los estándares de seguridad asociados al desarrollo de la labor, Charlas de planeación de trabajos a realizar, asignación adecuada de funciones del personal en función de sus competencias y experiencia, Mantener siempre una comunicación asertiva en el equipo de trabajo, Pausas activas, Rotación del personal, Retomar prácticas de la buena comunicación, Campañas y capacitaciones de autocuidado.	Soldadores, ayudantes y coordinador de alturas.
	NATURALES	Precipitaciones de lluvias y Sismos (Atrapamiento por desprendimiento de material, lesiones leves y graves por desprendimiento de material, Hipotermia, Susceptibilidad a los virus (gripe, entre otras), Descargas Eléctricas)	Implementación del plan de emergencias y capacitación a los trabajadores en los procedimientos operativos normalizados (PON), Uso de carpas, uso de dotación de invierno o lluvia, uso de botas de caucho, apuntalamientos, Identificar las rutas de evacuación y punto de encuentro, Inspeccionar las áreas susceptibles a sufrir derrumbes e intervenir con medidas preventivas y/o correctivas, Conformación, identificación y capacitación de las brigadas de emergencias, Contar con kit de rescate, suspender actividades en presencia de lluvia y tormenta eléctrica, Registro de MEDEVAC, Identificar y atender al sistema de ALARMA.	Soldadores, ayudantes y coordinador de alturas.

11099

OBSERVACIONES:		
EQUIPO QUE ELEBORA EL ATS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	COORDINADOR SST	
JESÚS EVELIO VILLAMIZAR BOTIA	COORDINAR DE ALTURAS	JESUS Villamizar
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
SOCIALIZADO A:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Adrián Nel Salgado Fernandez	PINTOR	
Carlos Lince CASTILLO	HY TEC	
Julian Banguera	Pintor	Julian
Jesús Villamizar B.	Soldador	Jesús Villamizar B.
RESPONSABLE DEL TRABAJO		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
SOCIALIZADO POR		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	COORDINADOR SST	



Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito. M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes

Febrero

Año

2026

1. Datos del Equipo y la Inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	307026	Unigero	10 - 2029	NA	AVALIGA
Eslinga	97754	3M	10 - 2027	NA	AVALIGA

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: Julian Banguero Cargo: Solucionador

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
---------------------	-------	--------	-----------	--------	---------	--------	---------	---------------------	-------	--------	-----------	--------	---------	--------	---------

2. Documentación del Equipo

Certificado Inspección Técnica del Equipo	B B B B B B B	Ficha Técnica del Arnes	B B B B B B B
---	---------------	-------------------------	---------------

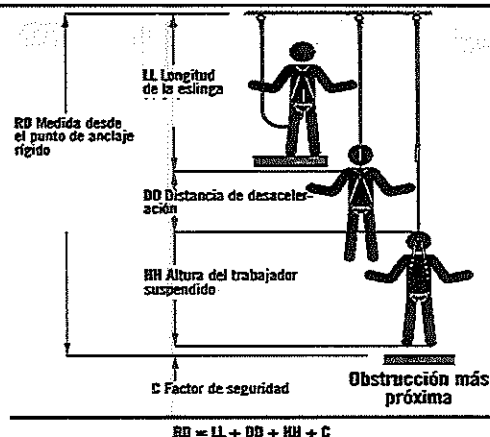
3. Estado General del Equipo

Elementos Blandos del Arnes y Línea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)															
Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	A	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Químicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								
Elementos Duros del Arnes y Línea de Vida (Anillos - Hebillas)															
Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones

5. Personal Responsable de la Inspección

Responsable de la Inspección				
Día	Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma	
Lunes	Julian Banguero	1121891040	Julian	
Martes	Julian Banguero	1121891040	Julian	
Miércoles	Julian Banguero	1121891040	Julian	
Jueves	Julian Banguero	1121891040	Julian	
Viernes	Julian Banguero	1121891040	Julian	
Sábado	Julian Banguero	1121891040	Julian	
Domingo	Julian Banguero	1121891040	Julian	



El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 1.80 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 1.07 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.80 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad: 5.62 metros.
($RD = LL + DD + HH + C$)
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie: 3.7 metros.
($RD = LL + DD + HH + C$)

La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a la distancia libre de caída?

Si

No

Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estas soluciones:

- 1- Elevar el punto de anclaje
- 2- Disminuir la longitud del dispositivo
- 3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorbedores requieren la misma distancia.
- 4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado.
- 5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.

1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$	6.836,00	\$	658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$	81.293,00	\$	7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	20,94	\$	228.146,00	\$	4.777.377,00
					SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES		\$ 20.000.522,00
2.00: CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA							
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$	88.796,00	\$	8.675.369,00
					SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA		\$ 8.675.369,00
3.00: SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA							
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$	697.695,00	\$	5.581.560,00
					SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA		\$ 5.581.560,00
4.00: MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS							
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"x4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$	352.310,00	\$	352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$	550.185,00	\$	1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$	13.906,00	\$	2.792.325,00
					SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS		\$ 4.245.005,00
5.00: GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION							
5.01	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$	123.612,00	\$	60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$	755.140,00	\$	755.140,00
					SUBTOTAL DE GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION		\$ 61.137.130,00
					SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN		\$ 46.654.272,00
					TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO PANORAMA		\$ 146.293.858,00
4. CANCHA SINTETICA BARRIO LA TIZA							
1.00: OBRAS PRELIMINARES							
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$	9.560,00	\$	3.891.589,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$	341.280,00	\$	2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$	6.836,00	\$	658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$	81.293,00	\$	7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	20,94	\$	228.146,00	\$	4.777.377,00
					SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES		\$ 20.000.522,00
2.00: CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA							
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$	88.796,00	\$	8.675.369,00
					SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA		\$ 8.675.369,00
3.00: SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA							
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$	697.695,00	\$	5.581.560,00
					SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA		\$ 5.581.560,00
4.00: MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS							
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"x4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$	352.310,00	\$	352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$	550.185,00	\$	1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$	13.906,00	\$	2.792.325,00
					SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS		\$ 4.245.005,00
5.00: GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION							
5.01	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$	123.612,00	\$	60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$	755.140,00	\$	755.140,00
					SUBTOTAL DE GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION		\$ 61.137.130,00
					SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCION		\$ 46.654.272,00
					TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO LA TIZA		\$ 146.293.858,00
5. CANCHA SINTETICA BARRIO EL TREBOL II							
1.00: OBRAS PRELIMINARES							
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$	9.560,00	\$	3.891.589,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$	341.280,00	\$	2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$	6.836,00	\$	658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$	81.293,00	\$	7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	20,94	\$	228.146,00	\$	4.777.377,00
					SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES		\$ 20.000.522,00
2.00: CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA							
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$	88.796,00	\$	8.675.369,00
					SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA		\$ 8.675.369,00
3.00: SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA							



11102

Marque según el estado: B Buen estado o cumple con el requisito, M Mal estado o No cumple con el requisito

Mes

LEOBERO

Año

2020

1. Datos del Equipo y la Inspección

Elemento	Referencia	Marca	Fecha de Vigencia	Precinto	Ubicación
Arnes	SE 135005C	UNITEO	10-2020	NA	AGUAS GAITÁN
Eslinga	355	WSAFE	10-2020	NA	AGUAS GAITÁN

1.1 Equipo asignado a:

Nombre: SESTO VILAMAZAR Cargo: SOLDADO

Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Item a Inspeccionar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
---------------------	-------	--------	-----------	--------	---------	--------	---------	---------------------	-------	--------	-----------	--------	---------	--------	---------

2. Documentación del Equipo

Certificado Inspección Técnica del Equipo	B	B	B	B	B	B	B	Ficha Técnica del Arnes	B	B	B	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

3. Estado General del Equipo

Elementos Blandos del Arnes y Línea de Vida (Correas - Ajustadores - Eslinga de Anclaje)

Cintas sin Cortes	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin Quemaduras	B	B	B	B	B	B	B
Cintas Puntos Deshilachados	B	B	B	B	B	B	B	Cintas sin partes impregnadas de Químicos	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Abrasión	B	B	B	B	B	B	B	Etiquetas legibles	B	B	B	B	B	B	B
Cintas sin Partes Rotas	B	B	B	B	B	B	B								

Elementos Duros del Arnes y Línea de Vida (Anillos - Hebillas)

Elementos duros sin Deformaciones	B	B	B	B	B	B	B	Elementos duros sin Bordes Cortantes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Grietas	B	B	B	B	B	B	B	Piezas Floja o Ausentes	B	B	B	B	B	B	B
Elementos duros sin Corrosión	B	B	B	B	B	B	B	Gancho de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B

4. Observaciones

5. Personal Responsable de la Inspección

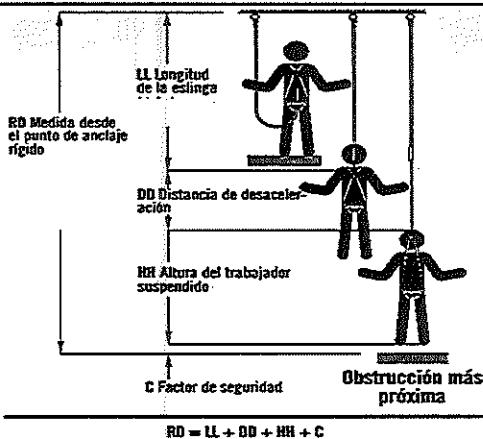
Responsable de la Inspección

Día	Usuario del equipo de alturas	Cedula	Firma
Lunes	Carlos Hince	17331371	
Martes	Carlos Hince	17331371	
Miércoles	Carlos Hince	17331371	
Jueves	Carlos Hince	17331371	
Viernes	Carlos Hince	17331371	
Sábado	Carlos Hince	17331371	
Domingo	Carlos Hince	17331371	

IV/A

El requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo y depende principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

1. Longitud máxima de la eslinga (LL): 100 metros.
2. Distancia máxima de desaceleración (DD): 100 metros.
3. Altura del trabajador (HH): 1.80 metros.
4. Factor de seguridad (C): 1 metro.
5. Requerimiento de claridad:
(RC = LL + DD + HH + C): 572 metros.
6. Medida desde el punto de anclaje rígido hasta la superficie:
(RD = LL + DD + HH + C): 572 metros.



La distancia anclaje-obstáculo (Punto de choque) es mayor o igual a la distancia libre de caída?

Si ☒ No

Si la respuesta es NO, la configuración del sistema no es segura.

Si no existe suficiente distancia libre se pueden aplicar, entre otras, estas soluciones:

- 1- Elevar el punto de anclaje
- 2- Disminuir la longitud del dispositivo
- 3- Revisar la matriz de EPP y seleccionar un dispositivo que requiera poca distancia de frenado, no todos los absorbedores requieren la misma distancia.
- 4- Utilizar un retráctil, que requiera menor distancia de frenado.
- 5- Consulta al coordinador de alturas del proyecto.



ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$5,211,300	\$0	\$0	\$5,211,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$667,000	\$0	\$0	\$667,000	
POIVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$3,877,300	\$0	\$0	\$3,877,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$386,800	\$0	\$0	\$386,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,472,500	\$0	\$0	\$1,472,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$1,472,500	\$0	\$0	\$1,472,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,274,300	\$0	\$0	\$1,274,300	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	\$1,274,300	\$0	\$0	\$1,274,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$1,274,300	\$0	\$0	\$1,274,300	
CAJACOPI	CCFC35	901,543,211	6	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$166,800	\$0	\$0	\$166,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$819,100	\$0	\$0	\$819,100	
TOTAL				11	\$9,232,400	\$0	\$0	\$9,232,400	


aportes
en línea

2026/03/09 10:16 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF							
NT 900751966	6	MUNOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVO	primavera urbana ofc-826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2026-02	2026-03	119557866	9301162702	E	2026/03/16	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	\$3,707,400						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			
No	Identificación	Nombre	Infirmitad o accidente de trabajo o enfermedad profesional	Codigo	Dias	Aporte	IBC	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Dias
SUCURSAL VILLAVO (6 Afiliados)															
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)															
1	CC 40324478	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA			25-14	30	\$3,553,851	\$142,208	CCF34	30	\$3,553,851	\$142,208	14-11	30	\$3,553,851
							\$58,700	EP500	5						\$58,700
2	CC 40322285	GOMEZ LEAL LINA MARCELA			23030	30	\$2,050,905	\$82,108	CCF34	30	\$2,050,905	\$82,108	14-11	30	\$2,050,905
							\$2,050,905	EP500	5						\$2,050,905
3	CC 40395435	WACHADO TEJERO DYNA YANIRA			25-14	30	\$2,840,012	\$113,708	CCF34	30	\$2,840,012	\$113,708	14-11	30	\$2,840,012
							\$454,500	EP500	5						\$454,500
4	CC 1092384700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA			23030	30	\$1,750,905	\$70,108	CCF34	30	\$1,750,905	\$70,108	14-11	30	\$1,750,905
							\$280,208	EP500	5						\$280,208
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)															
5	CC 80013513	MUNOZ AMURCIA JEINAMP ALEJANDRO			23030	30	\$2,143,515	\$3,894,420			\$3,894,420	\$3,894,420			\$3,894,420
							\$2,143,515	EP500	5						\$2,143,515
6	CC 84193788	PEREZ PEREZ OBER ASHED			25-14	30	\$1,750,905	\$70,108	CCF34	30	\$1,750,905	\$70,108	14-11	30	\$1,750,905
							\$280,208	EP500	5						\$280,208
Total	Afiliados (6)						\$14,090,093	\$584,000			\$14,090,093	\$584,000			\$14,090,093

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$2,254,800	\$0	\$0	\$2,254,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,303,400	\$0	\$0	\$1,303,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$951,400	\$0	\$0	\$951,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$324,600	\$0	\$0	\$324,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$324,600	\$0	\$0	\$324,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$564,000	\$0	\$0	\$564,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$564,000	\$0	\$0	\$564,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$564,000	\$0	\$0	\$564,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$564,000	\$0	\$0	\$564,000
TOTAL				6	\$3,707,400	\$0	\$0	\$3,707,400

11/09



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 900751966	6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAYO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META
Teléfono 6849992						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-02	Periodo Salud	2026-03
Fecha limite de pago	2026/03/16	Fecha de pago	2026/03/06
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	\$3,707,400
Intereses de mora	\$0
Saldos e Incapacidades	\$0
Valor total	\$3,707,400

DATOS DE LA TRANSACCION		
Clave planilla	9501162702	
Clave de pago	119557866	
Banco	BANCOLOMBIA	

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: junio 2025

1108


Villavicencio, 06 de marzo de 2026


CERTIFICACIÓN:

Yo, **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**, identificada con Cédula de ciudadanía. No. 40.395.435 de Villavicencio y TP 227117 -T, designada como Contadora del **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con **NIT. 901.965.630-1**, certifico que en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025, CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" la entidad cumplió del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, y en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicios Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, por lo tanto la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de marzo del año 2026.

Cordialmente,


LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025


DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
C.C. 40.395.435 DE VILLAVICENCIO
CONTADORA PUBLICA
TP 227117-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.395.435

MACHADO TEJEIRO

APellidos

DIVA YANIRA

Nombre

[Firma]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1972

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

24-SEP-1990:VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO BANCHEZ TORRES



A-5200100-00126010-F-0040395435-20081108

000557034A 1

6720006039

UN-2011 JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

227117-T

DIVA YANIRA
MACHADO TEJEIRO
C.C. 40385436

RES. INSCRIPCION 267 DEL 31/08/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

231970

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244584

PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMO CONTADOR DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Identificación Profesional A. 1701473117

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 - 1

1110

ANEXO 5. NOMINAS DEL PERSONAL.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.895.630-1

Nomina del día 01 al 15 de Febrero de 2.025

DEVENGADO										DEDUCCIONES								
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Salario	Saldo básico	Días trabajados	Total básico	Ant. de transporte	Licencia remunerada	Incapacidad (EPS/ARL)	Punto No. Estable	Total Devengado	Salud	Previdencia	Fondo de Salubridad Previdencia	Aportes 33 parafiscales y otras	Total Deduciones	Monto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.750.905	15	\$ 875.453	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 35.018	\$ 35.018	\$ -	\$ -	\$ 70.036	\$ 929.964	Se envia despendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2.417.300	15	\$ 1.208.650	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.333.198	\$ 48.346	\$ 48.346	\$ -	\$ -	\$ 96.692	\$ 1.236.506	Se envia despendible de nómina al correo: ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.868.988	COORDINADOR SST	5	\$ 2.732.600	15	\$ 1.366.300	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.490.848	\$ 54.652	\$ 54.652	\$ -	\$ -	\$ 109.304	\$ 1.381.544	Se envia despendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	86.051.633	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.561.000	15	\$ 5.780.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.780.500	\$ 231.220	\$ 231.220	\$ 57.805	\$ -	\$ 520.245	\$ 5.260.255	Se envia despendible de nómina al correo: Ingluisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	\$ 2.009.512	15	\$ 1.004.756	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.129.304	\$ 40.190	\$ 40.190	\$ -	\$ -	\$ 80.380	\$ 1.048.923	Se envia despendible de nómina al correo: asesoriasfyn@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	\$ 2.417.300	15	\$ 1.208.650	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.333.198	\$ 48.346	\$ 48.346	\$ -	\$ -	\$ 96.692	\$ 1.236.506	Se envia despendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						\$ 11.444.309	\$ 622.736	\$ -		\$ -	\$ 12.067.046	\$ 457.772	\$ 457.772	\$ 57.805	\$ -	\$ 973.350	\$ 11.093.696	

CARGO DEL EMPLEADO				CARGO DEL EMPLEADO			
Salud	%	Valor	Provisiones Prest. Soc. y Vac.	%	Valor	Provisiones Prest. Soc. y Vac.	%
Fondo de Pensiones	0,0%	\$ 0,00	Cesantías	8,330%	\$ 1.005.185		
ARL (riesgos laborales)	12%	\$ 1.373.317	Intereses sobre cesantías	1%	\$ 120.670		
	0,522%	\$ 30.174	Prima	8,330%	\$ 1.005.185		
	4,350%	\$ 394.201	Vacaciones	4,170%	\$ 477.228		
	5,900%	\$ 1.737.692	Total prestaciones sociales		\$ 2.608.269		
Seguridad Social							
Parafiscales							
Caja Compensación Familiar	4%	\$ 457.772					
ICBF	0%	\$ 0,00					
SENA	0%	\$ 0,00					
Total Parafiscales		\$ 457.772					
Total a cargo del empleador		\$ 4.863.733					

Días de la nómina				Días de la nómina			
Nombre del Empleado	No. Identificación	Fecha	Valor	Nombre del Empleado	No. Identificación	Fecha	Valor
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	15/02/2025	\$ 929.964	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	15/02/2025	\$ 929.964
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	15/02/2025	\$ 1.236.506	GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	15/02/2025	\$ 1.236.506
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.868.988	15/02/2025	\$ 1.381.544	MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.868.988	15/02/2025	\$ 1.381.544
MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	86.051.633	15/02/2025	\$ 5.260.255	MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	86.051.633	15/02/2025	\$ 5.260.255
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	15/02/2025	\$ 1.048.923	MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	15/02/2025	\$ 1.048.923
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	15/02/2025	\$ 1.236.506	OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	15/02/2025	\$ 1.236.506
TOTALES			\$ 11.093.696	TOTALES			\$ 11.093.696

FECHA ENVÍO DESPENSABLES DE NOMINA	
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	16/01/2025

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,95%

Salario Mínimo Legal Vigente 2025	\$ 1.750.905
Auxilio de Transporte	\$ 249.055

Se encuentra exento de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	
SI	X

DIVA YANIRA MACHADO TEJERO
C.E. CONTADORA

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Francy Carolina Ar

Producto destino

844 - 410092 - 23

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

16 Feb 2026

Identificación destinatario

40326478

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 929.964,00

Código

OKA

1112

Número del registro
2Nombre del destinatario
Wendy Vanesa GarzoProducto destino
844 - 889442 - 31Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
16 Feb 2026Identificación destinatario
1121902403Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 1.236.506,00Código
OKA

1113

Número del registro

3

Nombre del destinatario

Gustavo Adolfo Med

Producto destino

312 - 53640 - 66

Banco

Nequi

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

16 Feb 2026

Identificación destinatario

1121869998

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.381.544,00

Código

OKA

1114

Número del registro

4

Nombre del destinatario

Luis Fernando Mu O

Producto destino

970 - 700522 - 34

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

16 Feb 2026

Identificación destinatario

86051533

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 5.260.255,00

Código

OKB

215

Número del registro
5Nombre del destinatario
Rosemberg MurciaProducto destino
844 - 000062 - 51Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
16 Feb 2026Identificación destinatario
17497322Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 1.048.923,00Código
OKA

1116

Número del registro

6

Nombre del destinatario

Guillermo Alberto

Producto destino

849 - 684865 - 69

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

16 Feb 2026

Identificación destinatario

1121834340

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.236.506,00

Código

OKA

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Francy Carolina Ar

Producto destino
489 - 1904 - 05

Banco
Banco Bbva

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 Feb 2026

Identificación destinatario
40326478

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 929.964,00

Código
OKB

119

Número del registro
2Nombre del destinatario
Wendy Vanesa GarzoProducto destino
844 - 889442 - 31Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
28 Feb 2026Identificación destinatario
1121902403Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 1.236.506,00Código
OKA

1120

Número del registro
3

Nombre del destinatario
Gustavo Adolfo Med

Producto destino
312 - 53640 - 66

Banco
Nequi

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Feb 2026

Identificación destinatario
1121869998

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 1.381.544,00

Código
OKA

1121

1122

Número del registro
1

Fecha de aplicación
17 Feb 2026

Nombre del destinatario
Luis Fernando Mu O

Identificación destinatario
86051533

Producto destino
970 - 700522 - 34

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP \$ 2.500.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Número del registro

4

Nombre del destinatario

Luis Fernando Mu O

Producto destino

970 - 700522 - 34

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

28 Feb 2026

Identificación destinatario

86051533

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.485.255,00

Código

OKB

1123


Número del registro
5Nombre del destinatario
Rosemberg MurciaProducto destino
844 - 000062 - 51Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
28 Feb 2026Identificación destinatario
17497322Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 1.048.923,00Código
OKA

1124

Número del registro
6Nombre del destinatario
Guillermo AlbertoProducto destino
849 - 684865 - 69Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
28 Feb 2026Identificación destinatario
1121834340Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 989.204,00Código
OKA

1125

1128



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901.965.630-1
Nomina del día 01 al 28 de Febrero de 2.026
NOMINA MENSUAL

Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	DEVENGADO					DEDUCCIONES					Total Deduciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
			Salario Básico	Horas Trabajadas	Total Sueldo	Sal de Transporte	Precio de Subsidio	Total Devengado	Salud	Pensión	Fondo Solidario Pensional	Retenente Laboral			
BARRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO	1.120.864.285	OFICIAL DE OBRA	\$ 1.850.905	30	\$ 1.850.905	\$ 249.095	\$ -	\$ 2.100.000	\$ 74.036	\$ 74.036	\$ -	\$ -	\$ 148.072	\$ 1.951.928	Se envia desprendible de nómina al correo: vanessaazuarez1987@gmail.com
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID	1.103.470.729	OFICIAL DE OBRA	\$ 1.850.905	30	\$ 1.850.905	\$ 249.095	\$ 200.000	\$ 2.300.000	\$ 74.036	\$ 74.036	\$ -	\$ -	\$ 148.072	\$ 2.161.928	Se envia desprendible de nómina al correo: taniaflaniscorreaazuarez@gmail.com
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE	78.646.546	OPERADOR DE MAQUINARIA	\$ 1.750.905	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 200.000	\$ 2.200.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ -	\$ -	\$ 140.072	\$ 2.069.928	Se envia desprendible de nómina al correo: jefferson1984@gmail.com
MONCADA CANO JOSE JAVIER	1.093.921.945	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ -	\$ -	\$ 140.072	\$ 1.859.928	Se envia desprendible de nómina al correo: javier030695@gmail.com
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY	1.004.819.005	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 100.000	\$ 2.100.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ -	\$ -	\$ 140.072	\$ 1.959.928	Se envia desprendible de nómina al correo: duvan280425@hotmail.com
TOTALES					\$ 8.954.525	\$ 1.245.475	\$ 500.000	\$ 10.700.000	\$ 358.181	\$ 358.181	\$ -	\$ -	\$ 716.362	\$ 9.983.638	

Total a cargo del empleador	\$ 4.230.683
Días de la nómina	30
Horas trabajadas en el día	7.33

SE INGRESA EL RUBRO HORAS EXTRAS PARA UNO O VARIOS TRABAJADORES

Nombre del Empleado	No. Identificación	Salario	Salario Básico	Horas Trabajadas	Total Sueldo	Sal de Transporte	Precio de Subsidio	Total Devengado	Salud	Pensión	Fondo Solidario Pensional	Retenente Laboral	Total Deduciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
BARRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO	1.120.864.285	\$ 1.850.905	6.417	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID	1.103.470.729	\$ 1.850.905	6.417	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE	78.646.546	\$ 1.750.905	7.592	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
MONCADA CANO JOSE JAVIER	1.093.921.945	\$ 1.750.905	7.592	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY	1.004.819.005	\$ 1.750.905	7.592	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES					0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

NOVEDAD	RETIRO

DIVA YANIRA MACHADO TEJERO
V'B' CONTADORA

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Edwin Alejandro Ba

Producto destino

289 - 964115 - 18

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

28 Feb 2026

Identificación destinatario

1120864265

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.951.928,00

Código

OKA

Número del registro
2

Nombre del destinatario
Miguel Doisid Corr

Producto destino
318 - 39930 - 83

Banco
Nequi

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Feb 2026

Identificación destinatario
1103470729

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 2.151.928,00

Código
OKA

1108

11129

Número del registro
3

Nombre del destinatario
Yeferson Enrique G

Producto destino
849 - 595474 - 91

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Feb 2026

Identificación destinatario
78646546

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 2.059.928,00

Código
OKA

Número del registro

4

Nombre del destinatario

Jose Javier Moncad

Producto destino

312 - 48652 - 77

Banco

Nequi

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

28 Feb 2026

Identificación destinatario

1093921945

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.859.928,00

Código

OKA

Número del registro
5

Nombre del destinatario
Duvan Arley Romero

Producto destino
311 - 49818 - 93

Banco
Nequi

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Feb 2026

Identificación destinatario
1004819005

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 1.959.928,00

Código
OKA

1131



MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.066-6

Notitia del día 01 al 15 de Febrero de 2020

HONRARIA PERSONA CAG 1013

DETALLE DE CARGOS										RESERVACIONES			
Nombre del Empleado	No. Matricula	Cargo	Monto	Subsidio	Seguro Vida	Seguro Salud	Seguro Accidentes	Seguro Cesantia	Seguro Retiro	Seguro Pension	Seguro Invalidez	Seguro Discapacidad	Seguro Faltas
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	\$ 2.050.905	15	\$ 1.025.453	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MACHADO TELERIO DWA YANINA	40.325.435	CONTADOR	1	\$ 2.840.012	15	\$ 1.420.006	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUÑOZ AURORA JENNY ALEXANDRO	80.019.513	CONDUCTOR	1	\$ 2.143.515	15	\$ 1.071.769	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BARBOSA MARTINEZ GIBRIS PAOLA	1.023.241.200	SECRETARIA	1	\$ 1.760.905	15	\$ 875.453	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PEREZ PEREZ OBER ASHED	80.180.700	ALMACENISTA	1	\$ 1.760.905	15	\$ 875.453	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES						\$ 6.280.121	\$ 622.719	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

FECHA ENVIO DE PRECIOS DE MATERIA	
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA LICENCIA	

FECHA ENVIO DE PRECIOS DE MATERIA	\$ 1.700.805
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA LICENCIA	\$ 249.055

RIESGO ARL	
Tipo	Tasa
I	0,62%
II	1,01%
III	2,41%
IV	4,35%
V	6,55%

Si encuentra errores de pago de aportes de Previdencia y Salud por 1607 de 2012, envíelos con una "X" al e-mail: info@ingenieria.com

Si encuentra errores de pago de aportes de Previdencia y Salud por 1607 de 2012, envíelos con una "X" al e-mail: info@ingenieria.com	☒
---	-------------------------------------

DETALLE DE CARGOS										RESERVACIONES			
Nombre del Empleado	No. Matricula	Cargo	Monto	Subsidio	Seguro Vida	Seguro Salud	Seguro Accidentes	Seguro Cesantia	Seguro Retiro	Seguro Pension	Seguro Invalidez	Seguro Discapacidad	Seguro Faltas
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	\$ 2.050.905	15	\$ 1.025.453	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MACHADO TELERIO DWA YANINA	40.325.435	CONTADOR	1	\$ 2.840.012	15	\$ 1.420.006	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUÑOZ AURORA JENNY ALEXANDRO	80.019.513	CONDUCTOR	1	\$ 2.143.515	15	\$ 1.071.769	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BARBOSA MARTINEZ GIBRIS PAOLA	1.023.241.200	SECRETARIA	1	\$ 1.760.905	15	\$ 875.453	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PEREZ PEREZ OBER ASHED	80.180.700	ALMACENISTA	1	\$ 1.760.905	15	\$ 875.453	\$ 124.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES						\$ 6.280.121	\$ 622.719	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Si encuentra errores de pago de aportes de Previdencia y Salud por 1607 de 2012, envíelos con una "X" al e-mail: info@ingenieria.com

Si encuentra errores de pago de aportes de Previdencia y Salud por 1607 de 2012, envíelos con una "X" al e-mail: info@ingenieria.com	☒
---	-------------------------------------

Si encuentra errores de pago de aportes de Previdencia y Salud por 1607 de 2012, envíelos con una "X" al e-mail: info@ingenieria.com	☒
---	-------------------------------------

Si encuentra errores de pago de aportes de Previdencia y Salud por 1607 de 2012, envíelos con una "X" al e-mail: info@ingenieria.com	☒
---	-------------------------------------

11/33



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNOZ AREVALO
NIT: 900751966
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_FEBRER
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 05700001408

Fecha: 16-02-2026
Fecha de Generación: 16-02-2026

Fecha de envío del pago: 16-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-02-2026

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,008,783.00	Valor Registros Procesados: \$6,008,783.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	634,771.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-02-2026
84100000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	1,067,964.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-02-2026
84424812683	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,335,556.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-02-2026
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MU OZ	1,110,564.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-02-2026
58600019048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	929,964.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-02-2026
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	929,964.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-02-2026

10/10/2023 10:10:10 AM 10/10/2023 10:10:10 AM 10/10/2023 10:10:10 AM

NOVEMBRO PERSONA CAG 2025

FECHA EN QUE DESPRENDIBLES DE ROTURA	FECHA DE CONSULTACION DE LA ROTURA
--------------------------------------	------------------------------------

Excluded from Regulatory Oversight Excluded from Regulatory Oversight	\$ 1,750,005 \$ 249,095
---	---

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,06%

MEMORIA	RECONOCIMIENTO	DECLARACION DE AUTENTICIDAD	APORTE AL FONDO	EL DIA 14 DE FEBRERO	NOTA DE INVALIDACION	RECEPCION DE CUENTAS
---------	----------------	-----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------

¡IMPORTANTE!
8a. encuesta cronológica de pago de sports de Paracaidas y S&W Ley 7607 de 2012?
marque con una "x" si es así.

[illegible]

[Signature]

TRUSTEES, E.
DR. J. C. COOPER, JR.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Lina Marcela Gomez

Producto destino
841 - 000003 - 20

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Feb 2026

Identificación destinatario
40328285

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 1.059.661.00

Código
OKA

Número del registro

2

Nombre del destinatario

Diva Machado

Producto destino

844 - 248126 - 83

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

28 Feb 2026

Identificación destinatario

40395435

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.430.953,00

Código

OKA

1136

Número del registro
3

Nombre del destinatario
Alejandro Mu Oz

Producto destino
844 - 248402 - 96

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Feb 2026

Identificación destinatario
80013513

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 1.110.564,00

Código
OKA

1139

Número del registro

4

Nombre del destinatario

Genesis Paola Para

Producto destino

586 - 000190 - 48

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

28 Feb 2026

Identificación destinatario

1092394700

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 929.964,00

Código

OKA

1138

Número del registro

5

Nombre del destinatario

Ober Asmed Perez

Producto destino

313 - 61841 - 67

Banco

Nequi

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

28 Feb 2026

Identificación destinatario

96193788

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 929.964,00

Código

OKA

0039



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

1140

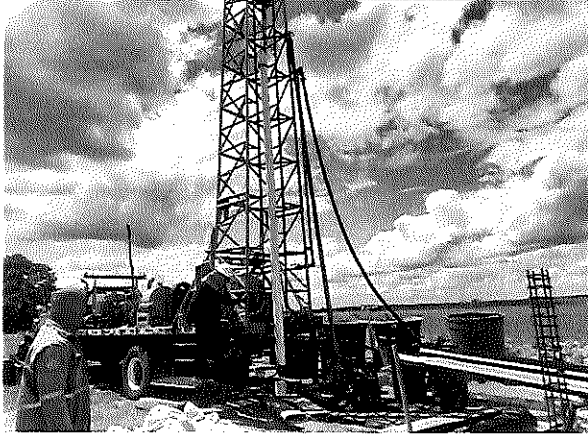
ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO AWALIBA

POZO PROFUNDO

COMUNIDAD PUERTO LOPEZ	
Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M  <i>Suministro tubería 6"</i>	Ítem 1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION  <i>Instalación filtro tubería</i>
Ítem 1,11 SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.  <i>Suministro gravilla</i>	



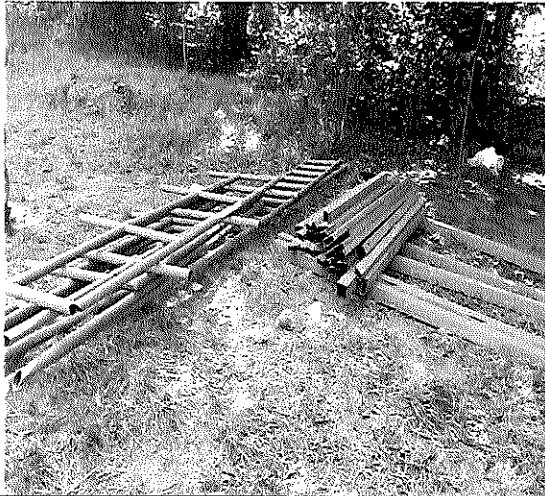
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

1142

TANQUE ELEVADO

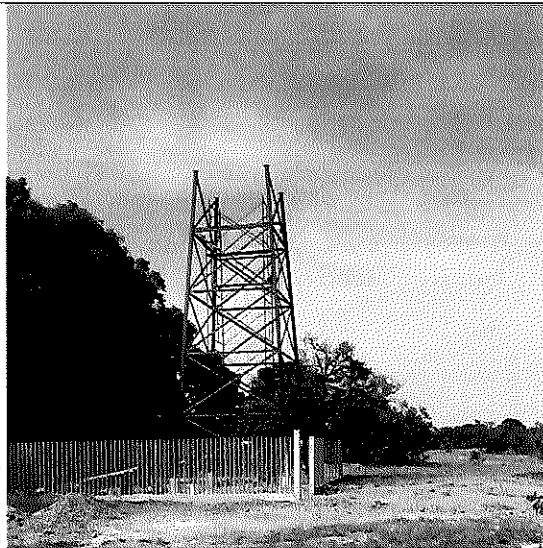
COMUNIDAD MAKAPAY

Ítem 5,9 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)



Acero estructural ASTM A500

Ítem 5,10 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)



Acero estructural ASTM A588



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

Ítem 5,9 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)



Acero estructural ASTM A500

Ítem 5,10 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)



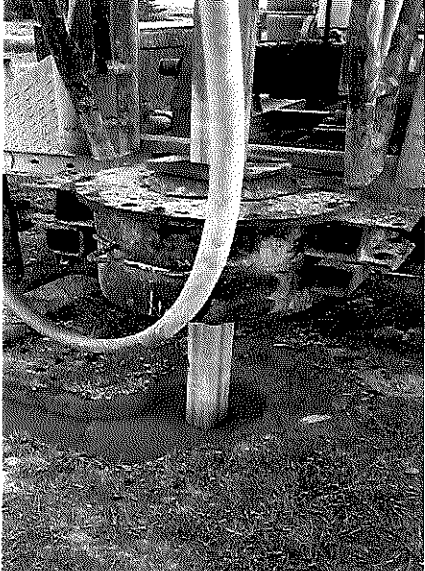
Acero estructural ASTM A588



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO DOMOPLANAS

POZO PROFUNDO

COMUNIDAD VILLAMARCIA	
Ítem 1,3 PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.	Ítem 1,4 ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO
	
<i>perforación de prueba</i>	<i>Análisis litológico</i>
Ítem 1,6 AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	
	
<i>Ampliación perforación</i>	



0145

COMUNIDAD PUERTO GAVILAN

Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M



Suministro tubería 6"

Ítem 1,8 AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)



Prueba de bombeo

Ítem 1,9 CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES



Cabeza de pozo

Ítem 1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION

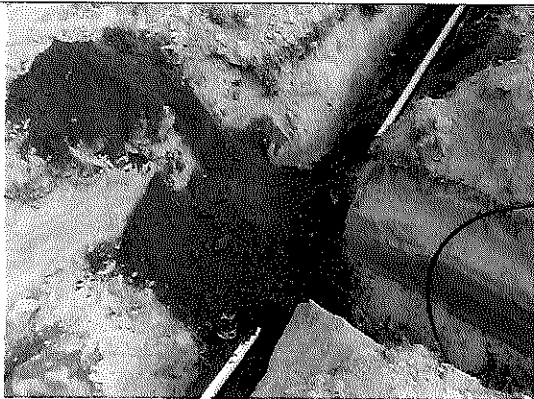
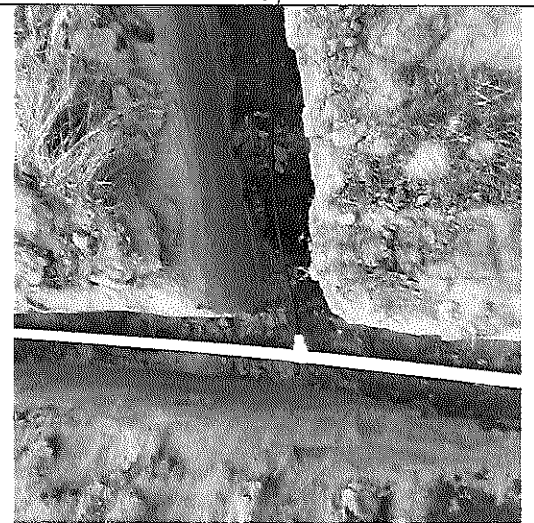


Instalación filtro tubería



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 - 1

REDES DE ACUEDUCTO

COMUNIDAD PUERTO GAVILAN	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS 	Ítem 4,5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL. 
<i>Camada de arena</i>	<i>Relleno proveniente de la excavación</i>
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN 	Ítem 4,16 ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) 
<i>Instalación tubería 2"</i>	<i>Acometida domiciliaria</i>

1149



COMUNIDAD LAS DELICIAS	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS  <i>Camada de arena</i>	Ítem 4,5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.  <i>Relleno proveniente de la excavación</i>
Ítem 4,7 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.  <i>Transporte material</i>	Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN  <i>Instalación tubería 2"</i>

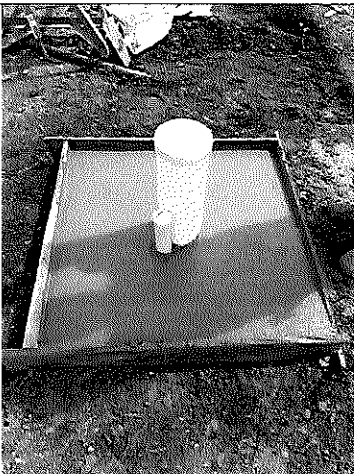
m48



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

RESGUARDO WACOYO

POZO PROFUNDO

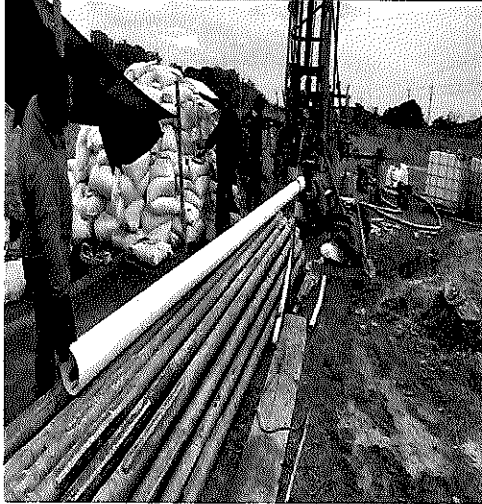
COMUNIDAD LA UNIÓN	
Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M  <i>Suministro de tubería 6"</i>	Ítem 1,9 CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES  <i>Cabeza de pozo</i>
Ítem 1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION  <i>Instalación de filtro tubería de 6"</i>	



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M



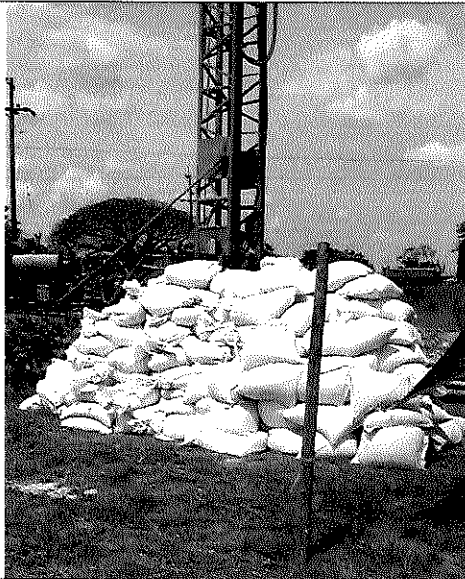
Suministro de tubería 6"

Ítem 1,9 CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES



Cabeza de pozo

Ítem 1,11 SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.



Instalación de gravilla



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 - 1

INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA





CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 - 1

11/51

INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA





CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.680 – 1

1152

ANEXO 7. COPIA DE LA BITACORA.

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Nuestro futuro es aquí
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Domingo 01 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	157	DÍAS PENDIENTES
299				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
				Cascos X
				Gafas X
				Tapabocas X
				Guantes X
				Botas X
				Alcohol X
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

11153

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING. FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán (Nuestro Hogar)
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

11154

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:		Lunes 02 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS		158	DÍAS PENDIENTES			298	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES			SI	NO	

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Guila
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPEL VISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO ORO		
		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

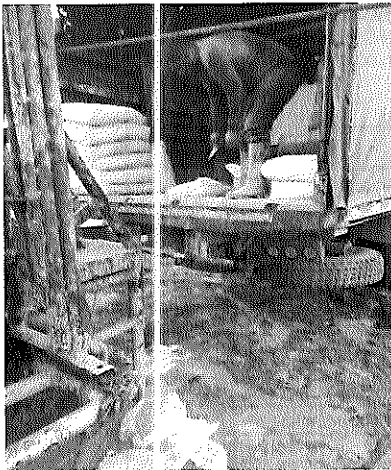
		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Martes 03 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	159	DIAS PENDIENTES		297		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Cafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guanles	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD				
				C	NC			
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
CONTINUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

1155

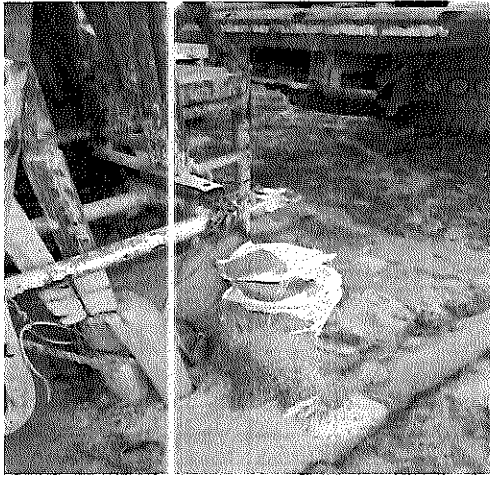
 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Miércoles 04 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	160	DÍAS PENDIENTES
		296		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN		
CONTINUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN		
SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

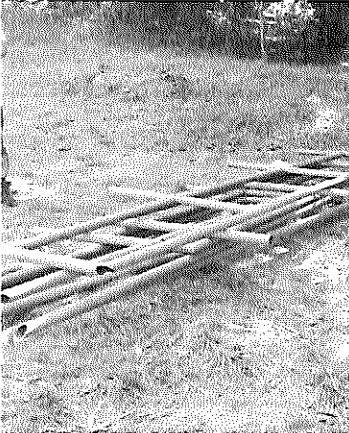
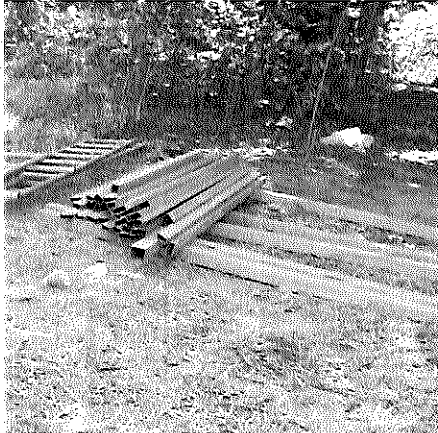
1156

 ALCALDÍA DC PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Puedes y debes más								
	Infraestructura											
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td></td> <td>  FIRMA RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td>  RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					C: Conforme		 FIRMA RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	 RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	NC: No Conforme			
C: Conforme		 FIRMA RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	 RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
NC: No Conforme												
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Jueves 05 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	161	DÍAS PENDIENTES
		295		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
				Cascos X
				Gafas X
				Tapabocas X
				Guantes X
				Botas X
				Alcohol X
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN		
CONTINUACION SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDIA DC PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Parque Nacional
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO C. SORIO		
		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Viernes 06 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	162	DIAS PENDIENTES		294		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Gautes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
SE INICIA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500		KG	COMUNIDAD MAKAPAY					
SE INICIA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588		KG	COMUNIDAD MAKAPAY					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, MEYU	FORMA TO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitan
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
 				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Sabado 07 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	163	DÍAS PENDIENTES		293		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guanles	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500		KG	COMUNIDAD MAKAPAY					
CONTINUACIÓN LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588		KG	COMUNIDAD MAKAPAY					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

1159



FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12

Version:04

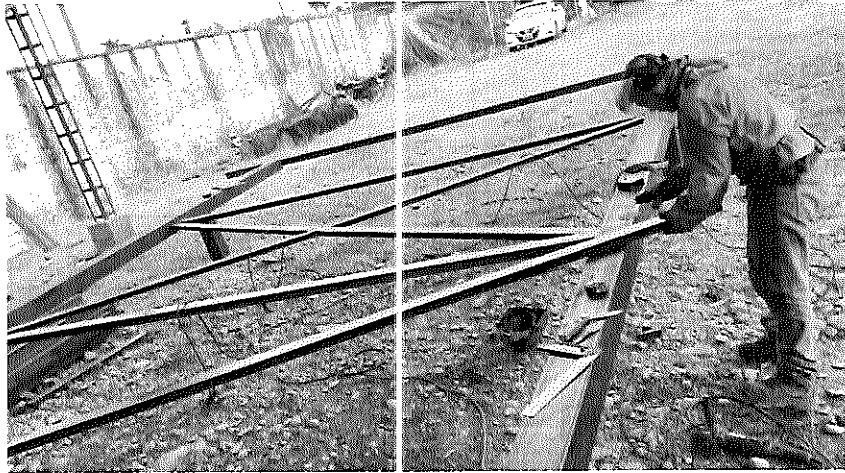
Vigencia: 10-01-2025



Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

FIRMA

RESIDENTE 1 OBRA
ING.GUILLERMO ALBERTO GÓRIO

FIRMA

RESIDENTE 1 INTERVENTORIA
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán METLA
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Domingo 08 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	164	DIAS PENDIENTES		292			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

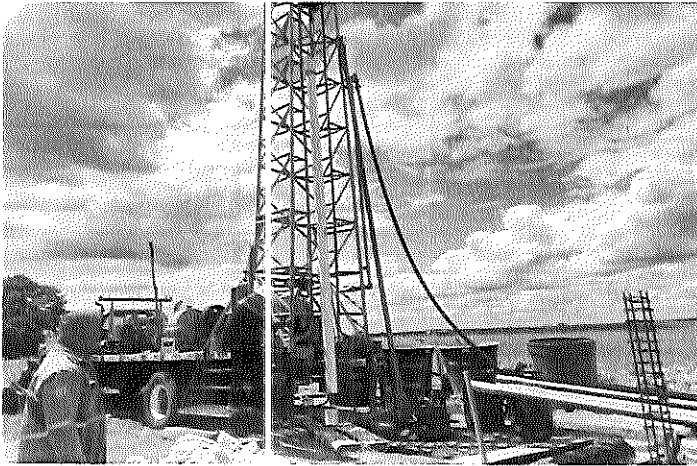
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

1160

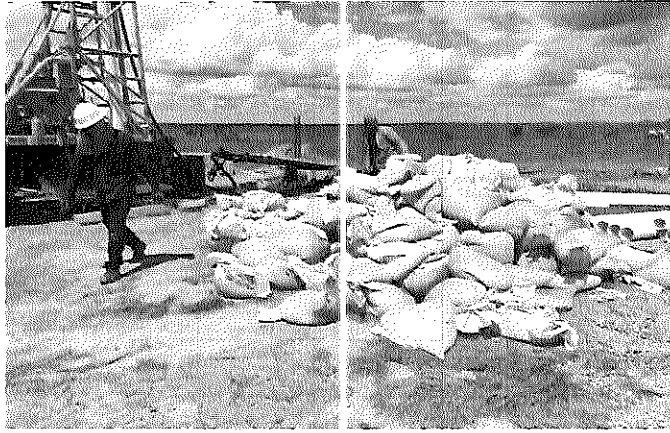
 ALCALDÍA DE PUERTO GARZÓN, MÉRIDA	FORMA O LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Garzón Mérida, Yucatán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:		Lunes 09 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	165	DÍAS PENDIENTES		291		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD				
				C	NC			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESTION		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
Codigo:INF-FR-12		Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Martes 10 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	166	DÍAS PENDIENTES	290			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.		M3	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

1162

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán CAPITAL Y ALICERTE
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Miercoles 11 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	167	DÍAS PENDIENTES
		289		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA		
ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA		
AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

1163

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Páramo Natural
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

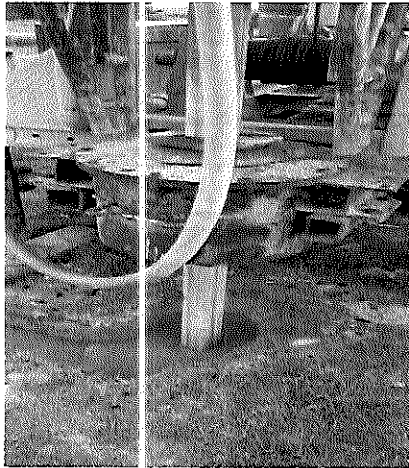
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:		Jueves 12 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	168	DÍAS PENDIENTES		288			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON							
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD				
			C	NC			
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA					
ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA					
AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

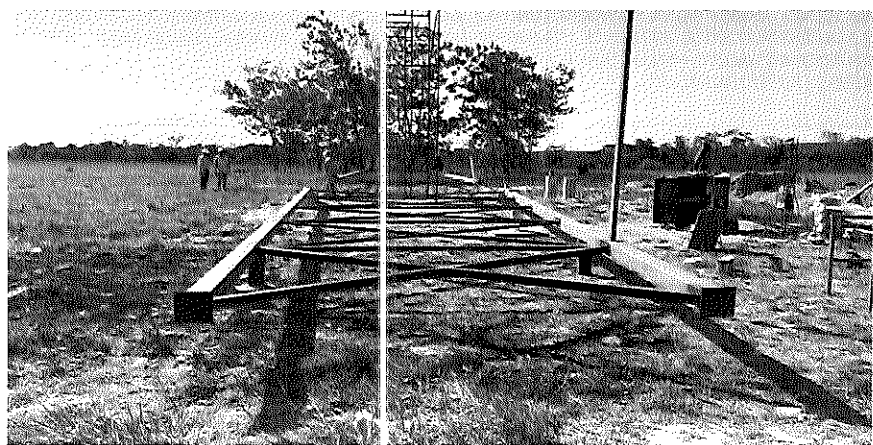
 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMA TO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Guilaín								
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:25%">C: Conforme</td> <td style="width:25%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:25%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> <td></td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA										
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE										
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Viernes 13 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	169	DÍAS PENDIENTES
		287		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		Cascos X
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		Gafas X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes X
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	Botas X
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	Alcohol X
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
SE INICIA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500	KG	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		
SE INICIA LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588	KG	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES			SI	NO
OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES			SI	NO
OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				


1165

 ALCALDIA DC PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Pueblos Unidos
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
 				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme  FIRMA  FIRMA				
NC: No Conforme RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
		Infraestructura							
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Sabado 14 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	170	DÍAS PENDIENTES		286			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO	
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X		
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X		
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X	
AYUDANTE									
TOPOGRAFO									
ALMACENISTA	1								
CONDUCTOR	2								
CONTADOR	1								
SECRETARIA	1								
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON									
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD				
					C	NC			
CONTINUACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500		KG	COMUNIDAD PUNTO GRILLO						
CONTINUACIÓN LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM		KG	COMUNIDAD PUNTO GRILLO						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO		
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.									
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA									
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO							
		C	NC	FECHA					
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO					
OBSERVACIONES:									

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán "LA OTRA METAD"
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO C. SORIO		
		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ				RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:	Domingo 15 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	171	DIAS PENDIENTES		285		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GARZÓN, Mérida	FORMA TO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Garzón Mérida
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRAS ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Lunes 16 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	172	DÍAS PENDIENTES
		284		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (MONTAJE Y PINTURA)	KG	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

1168



FORMA O LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12

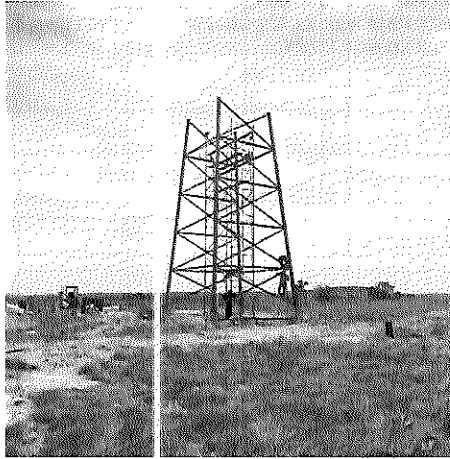
Version:04

Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaítán
MÉRIDA, Yucatán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

FIRMA

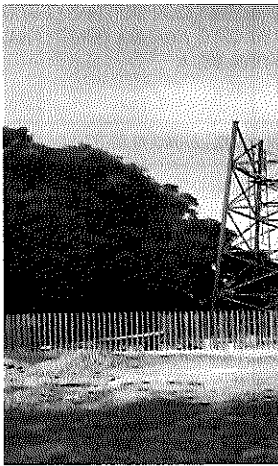
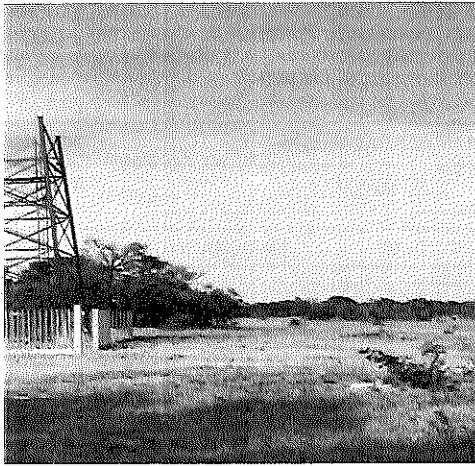
RESIDENTE 1 OBRA
ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO

FIRMA

RESIDENTE 1 INTERVENTORIA
ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

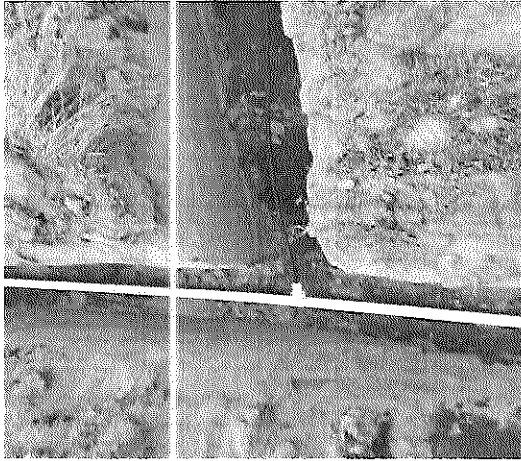
		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
Codigo:INF-FR-12		Version:04		Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:		Martes 17 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	173	DÍAS PENDIENTES		283		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (MONTAJE Y PINTURA)		KG	COMUNIDAD MAKAPAY					
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 (MONTAJE Y PINTURA)		KG	COMUNIDAD MAKAPAY					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio del Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
 				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO C SORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

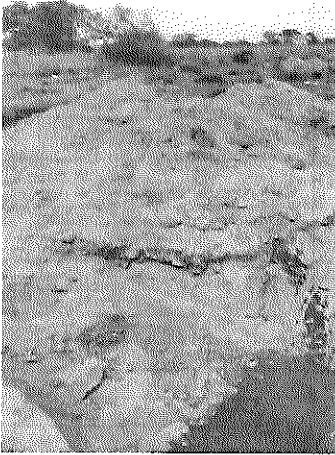
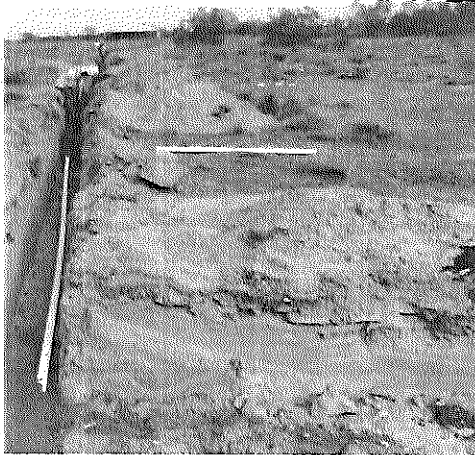
		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
		Infraestructura							
		Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Miercoles 18 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	174	DIAS PENDIENTES	282				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO	
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Gautes	X		
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X		
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X	
AYUDANTE									
TOPOGRAFO									
ALMACENISTA	1								
CONDUCTOR	2								
CONTADOR	1								
SECRETARIA	1								
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON									
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD					
				C	NC				
CONTINUACIÓN EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN						
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN						
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC P RDE 21 2"		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN						
INSTALACION CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO		
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.									
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA									
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO							
		C	NC	FECHA					
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO					
OBSERVACIONES:									

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMA TO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán CONCEJO MUNICIPAL
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
 				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme  FIRMA  FIRMA				
NC: No Conforme RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

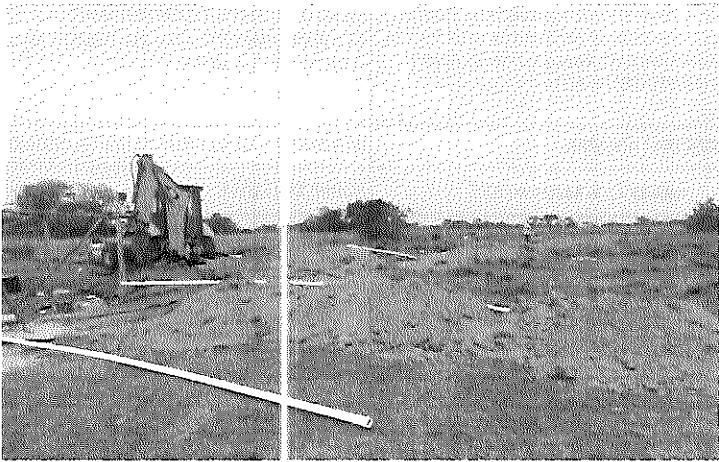
		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:		Jueves 19 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	175	DÍAS PENDIENTES		281		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVC RDE		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
INSTALACIÓN ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DC PUERTO LIBERTAD, META	FORMA O LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Libertad								
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td></td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td></td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO C SORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO C SORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA									
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO C SORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:		Viernes 20 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	176	DIAS PENDIENTES		280		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CANTON CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
CONTINUACIÓN INSTALACION ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/K	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO CAÑÁN, Mérida	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Cañán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
 				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme  FIRMA  FIRMA				
NC: No Conforme RESIDENTE 1 OBRERO ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRÉS DÍAZ AGUIRRE				
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Sabado 21 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	177	DÍAS PENDIENTES		279		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS					
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS					
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC RDE 21.2"		ML	COMUNIDAD LAS DELICIAS					
INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMA O LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán								
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td></td> <td>  FIRMA RESIDENTE 1 OBRA </td> <td>  FIRMA RESIDENTE 1 INTERVENTORIA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td></td> <td>ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO</td> <td>ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE</td> </tr> </table>					C: Conforme		 FIRMA RESIDENTE 1 OBRA	 FIRMA RESIDENTE 1 INTERVENTORIA	NC: No Conforme		ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme		 FIRMA RESIDENTE 1 OBRA	 FIRMA RESIDENTE 1 INTERVENTORIA									
NC: No Conforme		ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												


		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ				RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:	Domingo 22 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	178	DIAS PENDIENTES		278		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guanles	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

1174

 ALCALDÍA DE PUERTO CAÑAN, META	FORMA TO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Cañan Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUI ERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
		Infraestructura							
Codigo: INF-FR-12		Version: 04	Vigencia: 10-01-2025						
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO						
FECHA:		Lunes 23 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	179	DIAS PENDIENTES		277			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO	
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X		
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X		
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X	
AYUDANTE									
TOPOGRAFO									
ALMACENISTA	1								
CONDUCTOR	2								
CONTADOR	1								
SECRETARIA	1								
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON									
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD				
					C	NC			
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE		ML	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
INSTALACION ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO			
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.									
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA									
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO							
		C	NC	FECHA					
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO						
OBSERVACIONES:									

1175

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán (Metadentro)
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA RESIDENTE 1 OBRA			 FIRMA RESIDENTE 1 INTERVENTORIA
NC: No Conforme	ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO			ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Naturaleza Protectora
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META	
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO	
FECHA:	Martes 24 de febrero de 2026	HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	180
		DIAS PENDIENTES	276

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

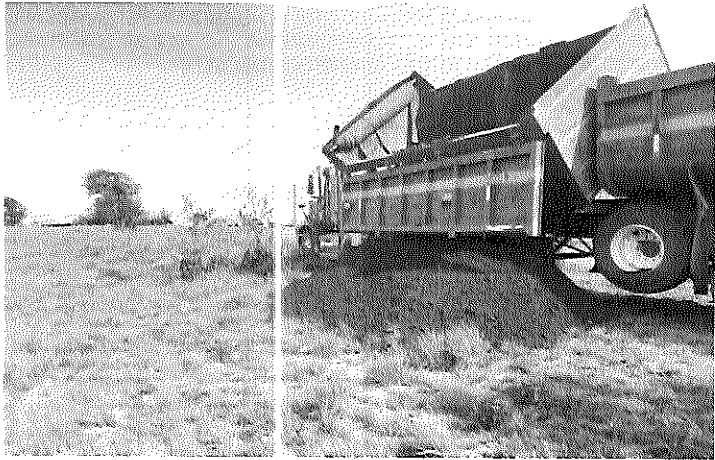
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD LAS DELICIAS		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

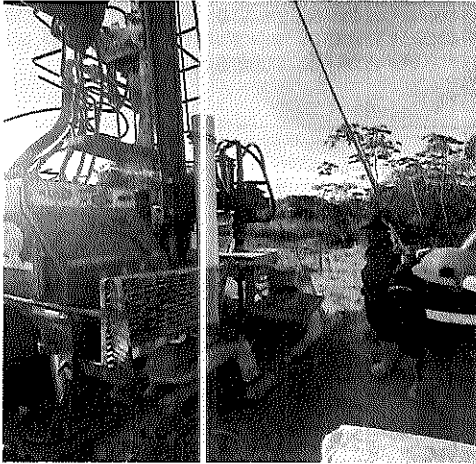
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

11176

 ALCALDÍA DE PUERTO GAIBÁN, META	FORMA TO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaibán Municipio de Meta						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Miercoles 25 de febrero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	181	DÍAS PENDIENTES
		275		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD LA UNIÓN		
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD LA UNIÓN		
SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	COMUNIDAD LA UNIÓN		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

11/77

 ALCALDÍA DE PUERTO GARZÓN, META	FORMA O LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Garzón
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				


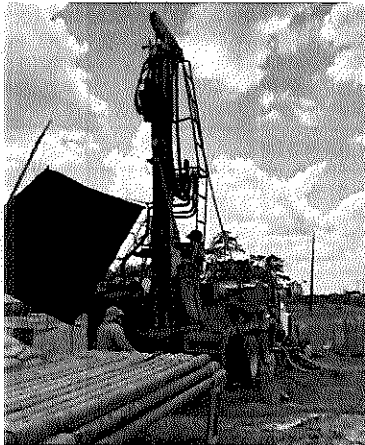
 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Jueves 26 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS		182	DÍAS PENDIENTES		274		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD LA UNIÓN			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	COMUNIDAD LA UNIÓN			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO			
¿LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA?	SI	NO	SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
¿LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD?	SI	NO	SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
¿LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS?	SI	NO	SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
¿SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio de Meta
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
 				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme NC: No Conforme  FIRMA RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA  FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ				
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio del Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

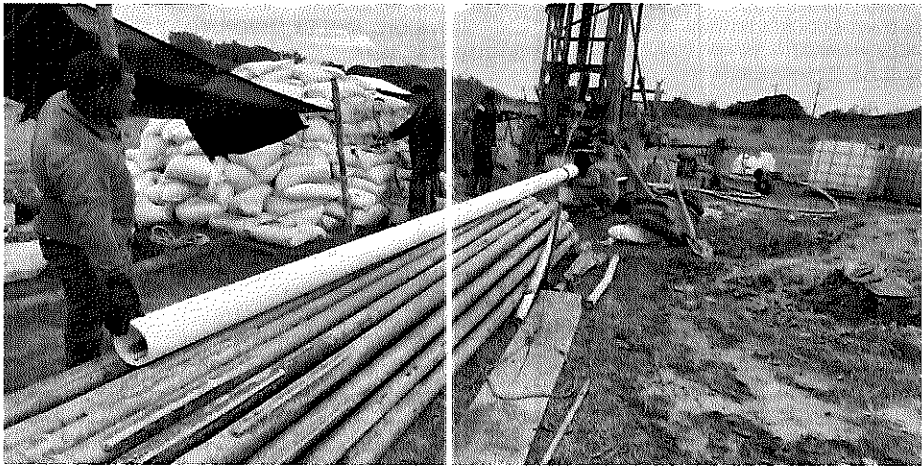
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:	Viernes 27 de febrero de 2026				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	183	DÍAS PENDIENTES		273			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON							
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD				
			C	NC			
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO					
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO					
SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	COMUNIDAD PUNTO GRILLO					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMA O LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA RESIDENTE 2 OBR. </td> <td>  FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td> ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA RESIDENTE 2 OBR.	 FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA	NC: No Conforme	ING.VANESA GARZON GARCIA	ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
C: Conforme	 FIRMA RESIDENTE 2 OBR.	 FIRMA RESIDENTE 2 INTERVENTORIA								
NC: No Conforme	ING.VANESA GARZON GARCIA	ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio Indígena
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Sabado 28 de febrero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	184	DIAS PENDIENTES		272			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	COMUNIDAD PUNTO GRILLO			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES			SI	NO	

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

1180



FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12

Version:04

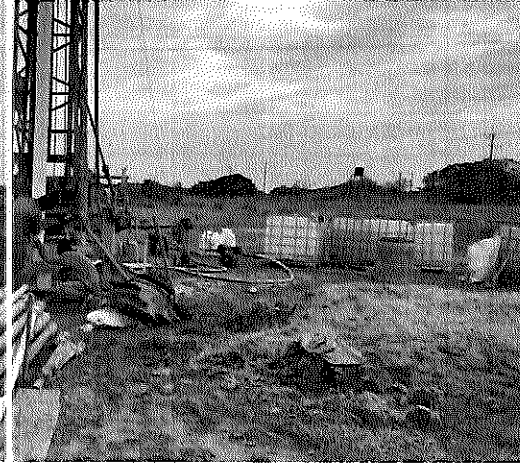
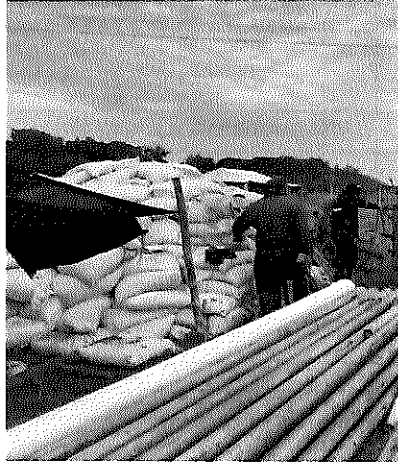
Vigencia: 10-01-2025



Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme


FIRMARESIDENTE 2 OBRA
ING.VANESA GARZON GARCIA
FIRMARESIDENTE 2 INTERVENTORIA
ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1.

11181

ANEXO 8. APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIARIO

	COMUNICACIÓN OFICIAL			
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

11182

Puerto Gaitán, 27 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
 NIT 800.079.035-1 R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 C.C. 86.051.533 de Villavicencio
 Calle 15 No. 40-01 Centro Comercial Primavera Urbana
 Celular 3123143658
Consortioaguasgaitan2025@gmail.com
 Villavicencio Meta


Asunto: ACEPTACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TITULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 (CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025).

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que ustedes atendieron cabalmente los requerimientos que le hiciera la Administración Municipal contenidos en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 0821 de 2025, cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META** " y de conformidad al Art. 91 de la Ley 1474 de 2011, "En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista" y que, frente a nuestro deber legal de pronunciarnos como entidad contratante, debemos indicar que el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) por medio la Secretaria de Contratación, responde **POSITIVAMENTE** a la aceptación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración y pagos, para la Administración de los recursos entregados como anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

La mencionada aceptación, se efectúa de conformidad con el Decreto Administrativo No. 001 del siete (07) de enero de 2025, por medio del cual se deroga el Decreto No. 0180 del tres (3) de julio de 2024, y se delegan unas facultades en materia de contratación pública y ordenación del gasto en el municipio de Puerto Gaitán - Meta

Con todo respeto,


ALEJANDRA CASTILLO BLANDÓN
 Secretaria de Contratación

Elaboró: Herder Faján Burgos García	Revisó: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS SO	Cargo: Secretaria de Contratación	Cargo: Secretaria de Contratación



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

1183

ANEXO 9. SOPORTES PAGOS DE FIDUCIA

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025**,

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 387427 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 788160, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TERRACQUA SAS**, identificado con número de documento **900769044**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$19052228**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900051534** el día **13-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025**,

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 387970 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 789368, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TERRACQUA SAS**, identificado con número de documento **900769044**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$33600000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900051534** el día **18-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

1186

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 384640 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 783555, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **GEODELTA SAS**, identificado con número de documento **901658784**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$49000000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900765083** el día **06-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025**,

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 384645 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 783557, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ**, identificado con número de documento **17414465**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$52500000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 89000027015** el día **06-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025**,

¡Queremos contarte! Tu solicitud de pago número 384661 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 783564, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TERRACQUA SAS**, identificado con número de documento **900769044**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$31500000**, radicada el día **11-02-2026**, fue **RECHAZADA** por Aval Fiduciaria.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11189

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 384719 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 783562, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con número de documento **901975926**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$20000000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008288** el día **06-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 384987 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 785056, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ**, identificado con número de documento **86049229**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$16160588**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 05707417431** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11191

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025**,

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 384998 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 785062, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ**, identificado con número de documento **86049229**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$7511988.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 05707417431** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 385896 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786343, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **TATIANA OSORIO PEREZ**, identificado con número de documento **1121933841**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$11364690**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550488414277373** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 385899 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786351, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **BRAYAN SNEIDER MURCIA TOBON**, identificado con número de documento **1121886701**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$38379118**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CC 28919617371** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11794

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 385901 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786344, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **MARLON STEVEN MURCIA TOBON**, identificado con número de documento **1032410751**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$116068887**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CC 091760000348** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

mas

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 385904 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786348, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.**, identificado con número de documento **900777214**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$604998.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 36432082096** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

1196

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 385906 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786349, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **FUENTEVIVA INVERSIONES SAS**, identificado con número de documento **901678453**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$40097050**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84900003827** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 386170 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786352, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA**, identificado con número de documento **830054002**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$6552179.66**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CC 006869995180** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11198

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 386065 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786363, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.**, identificado con número de documento **900777214**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$77267807**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 36432082096** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

1199

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 386069 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786362, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificado con número de documento **901975926**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$149806720**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008288** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11200

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025**,

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 386217 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786355, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **YENNY KARINA LEGUIZAMON VERA**, identificado con número de documento **1121861869**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$5970000.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84429436621** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11201

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 386303 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 786365, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **DISTRACOM S.A.**, identificado con número de documento **811009788**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$2000000.0**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO BBVA CC 0559106273** el día **11-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11202

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 386434 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 788149, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ**, identificado con número de documento **17414465**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$27449068**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 89000027015** el día **13-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

11203

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 386552 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 788151, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **GILBERTO PIÑEROS CASTRO**, identificado con número de documento **9620227**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$19470000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO AGRARIO CH 445240097186** el día **13-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 387039 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 788153, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA**, identificado con número de documento **17416479**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$24642288**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 28995117209** el día **13-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

1205

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 387570 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 789349, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **NELSON HERNAN MORALES ROJAS**, identificado con número de documento **17335397**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$33926688**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84435574890** el día **24-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

1706

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 387578 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 789356, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **INDUSTRIAS METALICAS INMEFRAM SAS**, identificado con número de documento **901573372**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$20000000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CC 05700005238** el día **18-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Punto Indígena	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		 INF.FR-14
				Versión: 04
		Contrato de Interventoría		1004 de 2025
		Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION				

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1004 DE 2025**,

CERTIFICO QUE:


El **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META**”, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil, M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

11208

  ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META Puerto Gaitán Aurea Hicoria	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
	Versión: 04		
	Contrato de Interventoría		1004 de 2025
Contrato de Obra Pública		0821 de 2025	
CERTIFICACION			


CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES Y PREDIALES PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y SU VIGENCIA

Teniendo en cuenta las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META”**, particularmente la establecida en la **CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**, numeral 34. *“EL CONTRATISTA debe realizar los trámites y atender los requerimientos que le realice la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial “La Macarena”-CORMACARENA y las entidades y/o autoridades con las que se tengan permisos, licencias o autorizaciones”*; en mi calidad de Interventor del contrato mencionado, para el periodo comprendido desde el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026, me permito **CERTIFICAR** el cumplimiento de esta obligación en relación a los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA, los cuales se encuentran vigentes y amparan las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, conforme a la siguiente relación:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	VIGENCIA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

Así mismo, se verificó que las actividades ejecutadas en obra se desarrollan dentro del alcance de los permisos otorgados y conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

El presente certificado se expide a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026, para los fines pertinentes.


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> <i>Punto Inicial</i>	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
				Versión: 04
		Contrato de Interventoría		1004 de 2025
		Contrato de Obra Pública	0821 de 2025	
CERTIFICACION				

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito **CERTIFICAR** que:


Durante el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMAN DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil, M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Auténtico Indígena	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
		Contrato de Interventoría	1004 de 2025	
		Contrato de Obra Pública	0821 de 2025	
CERTIFICACION				

CERTIFICACION CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito **CERTIFICAR** que:


Durante el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización in situ para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de impactos ambientales.

El presente certificado se expide a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.F. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
	Contrato de Interventoría		1004 de 2025
Contrato de Obra Pública		0821 de 2025	

CERTIFICACION
CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No.: No. 821 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITÁN 202

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

FECHA DE CORTE: 28 de febrero de 2026

PERIODO EVALUADO: Del 01 al 28 de febrero de 2026

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.


AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026	3.21%	2.21%
INVERSION ACUMULADA	30.70%	38.61%
ADELANTO EN PROGRAMACION	0.2577%	

Para la fecha de corte del presente informe, se evidencia un avance de obra física ejecutada por un valor de \$16.373.143.774, frente a un avance programado de \$13.018.663.752. Esto otorga al proyecto un margen a favor o adelanto en programación del 0.2577%, equivalente a \$3.354.480.022. Este valor representa en el replanteo de las comunidades indígenas, lo cual fue la actividad que se desarrolló durante el quinto mes de ejecución y se realizó en los tiempos establecidos.

El presente certificado se expide a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Interventoría		
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION			

CERTIFICACION

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de febrero de 2026, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-SIP-005-2025, el **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, identificado con NIT. 901.965.630 - 1 representado legalmente por **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.051.533, certificamos que se **CUMPLIO** con los requisitos exigidos respecto a la maquinaria y equipos establecidos durante el mes de febrero de 2026. Así las cosas, a continuación, enumeramos uno a uno la maquinaria y equipos colocados en la obra en la siguiente tabla:


Tabla 1. Maquinaria y equipo dispuesto por el Consorcio Agua Gaitán 2025.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	1
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
EQUIPO DE PERFORACION	REO, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

Fuente: Elaboración propio Consorcio Interventoría AC Indígenas 2025.

El presente certificado se expide a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M. P. No. 25202-68120 CND
 Director Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
