

Informe No	9	Periodo	1 DE ENERO al 31 DE ENERO/2026	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Foto 1

SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO

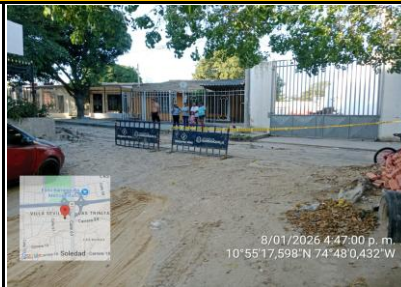


Foto 2

SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 3

CARGUE DEL MATERIAL



Foto 4

SEÑALIZACION EN FRENTE DE OBRA



Foto 5

CARGUE DEL MATERIAL



Foto 6

REPOSICION DE DOTACION (BOTAS DE SEGURIDAD)



Foto 7

ENTREGA DE DOTACION



Foto 8

CARGUE DE MATERIAL FRENTE DE OBRA



Foto 9

SEÑALIZACION DE FRENTE DE OBRA



Foto 10

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA

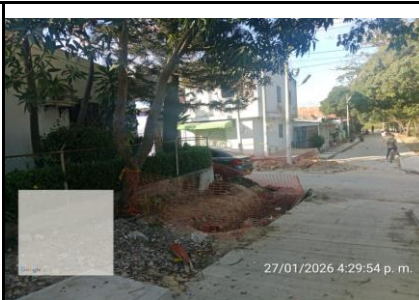


Foto 11

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 12

CHARLA DE SEGURIDAD

Informe No

9

Periodo

1 DE ENERO

al

31 DE ENERO/2026

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Foto 13

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 14

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 15

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 16

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 17

SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 18

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 19

CHARLA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL - SST



Foto 20

SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 21

HUMECTACION DE VIA

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS			
No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	Físicos: ruido, temperaturas extremas, vibración	150	Charlas de seguridas sobre ruido, colocar puntos de hidratacion, realizar mantenimiento preventivo a las maquinas
2	Químicos: Material particulado (polvo)	100	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado
3	Biologicos: Virus, bacterias, picaduras y/o mordeduras de animales	80	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado
4	Biomecanicos: posturas prolongadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	100	Realizar pausas activas, autocuidado, charla riesgo biomecanico
5	Psicosocial: jornadas de trabajo	40	Charla sobre riesgo psicosocial

Informe No	9	Periodo	1 DE ENERO	al	31 DE ENERO/2026	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025				

6	Condiciones de seguridad Mecanico: manejo de herramientas manuales, operación de maquinaria pesada	40	Uso de elementos de proteccion persona, charla sobre manejo de herramientas, distanciamiento hombre-maquina, realizar preoperacionales
7	Condiciones de seguridad Publicos: robos, atracos, atentados	150	Charla sobre riesgo publico, contar con los telefonos de contacto del cuadratne de la policia
8	Condiciones de seguridad Locativo: superficies irregulares, diferente nivel	100	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado, orden y aseo
9	Condiciones de seguridad Accidentes de trabajo (Desplazamiento Vehicular)	360	Charla sobre normas de transito, distanciamiento hombre-maquina
10	Fenomenos naturales: lluvias fuertes, tormentas electricas, vendabal	150	Resguardarse cuando halla cambio climaticos, capacitacion en primeros auxilios
Riesgo promedio dentro de la obra		127	Aceptable con control especifico

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra	Fecha		
1	Se instalo kit de emergencia en el frente del Bosque	26	5	2025
2	Se instalo kit de emergencia en el frente de Las Flores	26	5	2025
3	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carlos Meisel	26	5	2025
4	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carrera 46	26	5	2025
5	Se instalo kit de emergencia en el frente del Romance	26	5	2025
6	Ejecucion Plan de Accion para complementar botiquin de los frentes (compra elementos faltantes)	26	6	2025
7	Inspeccion de botiquin y extintor	25	6	2025
8	Inspecciones de botiquin y extintor	28	7	2025
11	Se instalo kit de emergencia en el frente de Campo Alegre	27	9	2025
12	Se instalo kit de emergencia en el frente de Concepcion	27	9	2025
13	Se instalo kit de emergencia en el frente de la CRA 44	27	9	2025
12	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	24	9	2025
13	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	29	9	2025
14	Inspeccion de botiquin y extintor	30	10	2025
15	Instalacion de punto de encuentro - Frente de trabajo	14	11	2025
16	Inspeccion de botiquin y extintor	26	12	2025
17	Se instalo botiquin en el frente de Villanueva	14	1	2026

2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2025								2026			
	15 AL 31 MAYO 2025	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
UT PAVIMENTOS 2025	22	25	29	36	43	42	28	29	26			
CONSTRUVALEL SAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
ALEX ANGEL GONZALEZ ALEMAN	1	1	1	0	0	0	0	0	0			
IDELFONSO QUIROZ BERNAVIDEZ	1	1	1	1	0	0	0	0	0			
JS INGENIERIA SAS	2	3	3	3	3	3	3	3	3			
JA ASOCIADOS LIMITADA	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	26	37	44	44	52	41	50	47	29			
H&J INGENIERIA	1	1	1	5	6	5	3	3	2			
GCI PROYECTOS SAS	0	3	5	5	5	5	5	5	5			
UT ANTIOQUIA 2025				1	1	1	1	1	1			
CFRS PROYECTOS SAS			5	6	6	7	7	7	5			
Total empleados en el proyecto	56	73	91	103	118	106	99	97	73			
Total horas hombre de exposición	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
Horas hombre acumulada	2576	3358	4004	4532	5192	4664	4356	4462	3358			

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO								
Fecha	Tipo de actividad		Tema				No asistentes	Responsable
5	1	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Autocuidado			4	Loana Bonivento Cabrera
5	1	2026	Charla de Seguridad (CONCEPCION)	Autocuidado			6	Loana Bonivento Cabrera
5	1	2026	Charla de seguridad (CRA 44)	Autocuidado, Pausas activas			12	Manuel Sarmiento Sierra

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	2
			Fecha	06/05/2022

Informe No	9	Periodo	1 DE ENERO	al	31 DE ENERO/2026	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024		Contratista	UT PAVIMENTOS 2025			

5	1	2026	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Autocuidado, pausas activas, induccion personal nuevo	16		Manuel Sarmiento Sierra
6	1	2026	Charla de seguridad (LA MANGA)	Autocuidado, Pausas activas	9		Manuel Sarmiento Sierra
8	1	2026	Charla de seguridad (VILLA SEVILLA)	Estrés	3		Social - SST
8	1	2026	Charla de seguridad (VILLA BLANCA)	Estrés	8		Social - SST
9	1	2026	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Estrés	6		Social - SST
13	1	2026	Charla de seguridad (CRA 44)	Exposicion a ruido, fomento autocuidado	11		Manuel Sarmiento Sierra
14	1	2026	Charla de Seguridad (CONCEPCION)	Analisis de Trabajo Seguro - ATS	7		Loana Bonivento Cabrera
14	1	2026	Charla de seguridad (VILLA BLANCA)	Autocuidado	7		Loana Bonivento Cabrera
14	1	2026	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Exposicion a ruido, fomento autocuidado	8		Manuel Sarmiento Sierra
14	1	2026	Charla de seguridad (LA MANGA)	Exposicion a ruido, fomento autocuidado	9		Manuel Sarmiento Sierra
16	1	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Autocuidado	6		Loana Bonivento Cabrera
16	1	2026	Charla de seguridad (CRA 44)	Reinduccion SST, exposicion a ruido,, fomento autocuidado	1		Manuel Sarmiento Sierra
19	1	2026	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Manipulacion de herramientas	3		Loana Bonivento Cabrera
19	1	2026	Charla de seguridad (CRA 44)	Manipulacion de herramientas	6		Manuel Sarmiento Sierra
20	1	2026	Charla de seguridad (VILLA SEVILLA)	Cuidado con el medio ambiente	9		Loana Bonivento Cabrera
20	1	2026	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Autocuidado	11		Loana Bonivento Cabrera
21	1	2026	Charla de seguridad (VILLA BLANCA)	Manejo de residuos	11		Loana Bonivento Cabrera
22	1	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Riesgo Biologico	9		Loana Bonivento Cabrera
23	1	2026	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Orden y aseo	6		Loana Bonivento Cabrera
23	1	2026	Charla de seguridad (LA MANGA)	Señalización	4		Loana Bonivento Cabrera
26	1	2026	Charla de seguridad (VILLANUEVA)	Analisis de Trabajo Seguro - ATS	12		Loana Bonivento Cabrera
27	1	2026	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Analisis de Trabajo Seguro - ATS	11		Loana Bonivento Cabrera
27	1	2026	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Señalización	5		Loana Bonivento Cabrera
28	1	2026	Charla de seguridad (VILLA BLANCA)	Señalización	8		Loana Bonivento Cabrera
28	1	2026	Charla de seguridad (VILLA SEVILLA)	Señalización	9		Loana Bonivento Cabrera
Promedio de asistencia					7		

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA							
Análisis de Seguridad en el Trabajo							
Fecha			Lugar	Descripción de la tarea		Responsable	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Reparcho		Residente- Inspector SST	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Instalacion de tuberías		Residente- Inspector SST	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Instalacion de tuberías		Residente- Inspector SST	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Estabilizacion del terreno, Demolicion de pavimento		Residente- Inspector SST	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Pavimentacion de vías, andenes		Residente- Inspector SST	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Pavimentacion de vías, andenes		Residente- Inspector SST	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Reparcho		Residente- Inspector SST	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, levantamiento de registro y manholes, empalme		Residente- Inspector SST	
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	Instalacion de tuberías		Residente- Inspector SST	
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	Demolicion de pavimento, estabilizacion del terreno		Residente- Inspector SST	
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	Fundida de concreto		Residente- Inspector SST	
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	Instalacion de tuberías		Residente- Inspector SST	
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	Pavimentos de vías, andenes		Residente- Inspector SST	
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, elaboracion de manholes		Residente- Inspector SST	
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	Reparcho		Residente- Inspector SST	

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL				Formato	15
					Versión	2
					Fecha	06/05/2022

Informe No	9	Periodo	1 DE ENERO	al	31 DE ENERO/2026	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025				

19-ene.	al	25-ene.	Frente de obra	Ampliacion de vias, andenes	Residente- Inspector SST
19-ene.	al	25-ene.	Frente de obra	Estabilizacion del terreno, demolicion de pavimento	Residente- Inspector SST
19-ene.	al	25-ene.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, fundida de concreto	Residente- Inspector SST
19-ene.	al	25-ene.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST
19-ene.	al	25-ene.	Frente de obra	Conformacion de anden y bordillo	Residente- Inspector SST
19-ene.	al	25-ene.	Frente de obra	Fundida de concreto	Residente- Inspector SST
19-ene.	al	25-ene.	Frente de obra	Detalles de pavimento de andenes, jardines	Residente- Inspector SST
26-ene.	al	1-feb.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, fundida de anden y bordillo	Residente- Inspector SST
26-ene.	al	1-feb.	Frente de obra	Estabilizacion del terreno, fundida de concreto	Residente- Inspector SST
26-ene.	al	1-feb.	Frente de obra	Fundida de pavimento	Residente- Inspector SST
26-ene.	al	1-feb.	Frente de obra	Fundida de pavimento	Residente- Inspector SST
26-ene.	al	1-feb.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, fundida de concreto	Residente- Inspector SST

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura.							
Lugar	Nombre del trabajador		No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas

NA							
----	--	--	--	--	--	--	--

Permisos de trabajo de alto riesgo							
Fecha	Lugar	Actividad		Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador		Inspector SST certificado

NA							
----	--	--	--	--	--	--	--

Entrega de elementos de seguridad							
Elemento		Unidad	Cantidad	Observaciones			
Guantes de seguridad		PAR	35				
Protectores auditivos tipo insercion		UND	2				
Protectores auditivos tipo copa		UND	1				
Tapabocas		UND	22				

Inspecciones y observaciones							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fecha		Lugar		Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria		Hallazgos	
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA - PAJARITA			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA - PAJARITA			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 451			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHI 997			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 495			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RANA COMPACTADORA			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RANA COMPACTADORA			
5-ene.	al	11-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DIG DOG			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGA			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 451			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA - PAJARITA			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL EXCAVADORA DE ORUGA			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA - PAJARITA			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX495			
12-ene.	al	18-ene.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO			

Informe No

9

Periodo

1 DE ENERO

al

31 DE ENERO/2026

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

12-ene.	al	18-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
12-ene.	al	18-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
19-ene.	al	25-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274	
19-ene.	al	25-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
19-ene.	al	25-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX451	
19-ene.	al	25-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	
19-ene.	al	25-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	
19-ene.	al	25-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA - PAJARITA	
19-ene.	al	25-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA - PAJARITA	
26-ene.	al	1-feb.	Frete de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHG673	
26-ene.	al	1-feb.	Frete de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274	
26-ene.	al	1-feb.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
26-ene.	al	1-feb.	Frete de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHI 997	
26-ene.	al	1-feb.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	

9. COPASST y/o Vigia													
Cantidad de reuniones ejecutadas		8-31may/25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
		1	1	1	1	1	1	1					
Novedades	El dia 24 de mayo del 2025 se realizo la eleccion del COPASST												
Novedades	El dia 28 de junio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisados en la proxima reunion												
Novedades	El dia 29 de julio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 30 de agosto del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 27 de septiembre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 31 de octubre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 29 de noviembre del 2025 se realizan la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 27 de Diciembre del 2025 se realizan la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 24 de enero del 2026 se realizo la reunicon del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades													

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO													
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA													
EPS		FONDO DE PENSIONES				A.R.L.				CAJA DE COMPENSACION			
Razón social		Cant. Trab		Razón social		Cant. Trab		Razón social		Cant. Trab		Razón social	
MUTUAL SER		13		COLFONDOS		14		SURA		2		COMFAMILIAR	
SALUD TOTAL		22		PORVENIR		34		COLMENA		42		CAJACOPI	
SANITAS		3		PROTECCION		12		AXA COLPATRIA		29			
COOSALUD		2		COLPENSIONES		10							
CAJACOPI		6		NO COTIZA		3							
FAMILIAR EPS		0											
SURA		11											
NUEVA EPS		14											
FAMISANAR		2											
CAPITAL SALUD		0											
TOTAL		73		TOTAL		73		TOTAL		73		TOTAL	

2.3 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0			
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (AWPD) Accidente con	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Informe No

9

Periodo

1 DE ENERO

al

31 DE ENERO/2026

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

daño a la propiedad													
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (NM) Incidente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Accidentes Laborales		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de días perdidos por AT		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Severidad accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de días por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ausentismo por Causa Medica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO													
Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Señales Preventivas	787	0	0	15	15	116	150	160	165	166			
Señales Informativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Señales Institucionales	226	8	22	22	22	22	32	33	33	32			

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Frete de obra	RETROEXCAVADORA	NO APLICA	2013	CATERPILLAR	CAT0420FCLTG1205	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	VIBROCOMPACTADOR	NO APLICA	2016	WACKER NEUSON	24263071	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	EXCAVADORA ORUGA	NO APLICA	2015	CATERPILLAR	CAT0320DVLCA00743	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2013	BOBCAT	A7U711874	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL						Formato	15
							Versión	2
							Fecha	06/05/2022

Informe No	9	Periodo	1 DE ENERO	al	31 DE ENERO/2026	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
		LP-026-2024			UT PAVIMENTOS 2025		
Contrato de obra			Contratista				

Frete de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2010	JHON DEERE	1T0320DAPA0193078	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2024	CASE	NRM453735	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra		NO APLICA				NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Rotativo	VOLQUETA	UYX451	2017	INTENATIONAL	3HTWYATT87N554647	2026-03-07	2026-02-27	Resolucion 0724/2024
Rotativo	VOLQUETA	QHI963	2006	CHEVROLET	9GDP7H1C36B004491	2025-09-12	2025-09-14	Resolucion 0724/2025

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Agregados y arenas	AGREGADOS Y CALIZAS DEL CARIBE	Comercializador y cuenta con el RUCOM	23-10-2024 al 31-07-2025	
2	Materiales de construccion	CANTERA MUNARRIZ LTDA	Resolucion 000312 del 21 de Octubre de 2003 Por la cual se le otorga una licencia ambiental a la cantera Munarriz LTDA	Licencia Ambiental- Vida util TITULO MINERO 31/08/1998- 28/01/2033	GFQE-01- 21087
3	Concreto	ARGOS	Resolucion 756 del 31 de Diciembre del 2021		Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	CFRS PROYECTOS SAS	TRANSPORTADOR DE RCD	RESOLUCION 0724 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 Por medio de la cual se realiza una inscripción como gestor transportador de RCD y se adelanta seguimiento a las actividades de recoleccion, transporte y descargue de residuos de construccion y demolicion RCD a la Sociedad CFRS PROYECTOS SAS	1 AÑO	B/quilla Verde
2	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	RECEPTOR RCD	RESOLUCION L.C. No 012-21 Por medio de la cual se concede una licencia urbanistica (en la modalidad de division en suelo urbano, loteo y construccion en la modalidad de obra nueva para vivienda (V.I.P)	2 AÑOS	Alcaldia de Sabanalarga

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
GENERADOR RCD	RESOLUCION 3333 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2025 Por medio de la cual se realiza una inscripción como generador de residuos de construccion y demolicion (RCD) a la Sociedad denominada UT PAVIMENTOS 2025	B/quilla Verde	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
SM-CVO-20250526-26401	CARRERA 46 ENTRE CALLE 76 Y 79 CALZADA OCC-ORI	26	7	2025
SM-CVO-20250522-26381	CARRERA 58 ENTRE CALLES 81 Y 79	22	7	2025
SM-CVO-20250527-26406	CALLE 64B ENTRE 14 Y 11	7	8	2025
SM-CVO-20250829-27029	CARRERA 56 Y 57 ENTRE CALLES 79 Y 84	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27060	CALLE 99B ENTRE CARRERA 1 SUR A LA CARRERA 3 SUR Y LA CALLE 99C ENTRE CARRERA 1SUR A LA CARRERA 3 SUR	1	11	2025
SM-CVO-20250829-27028	CALLE 94 ENTRE CARRERA 55 Y 56 Y LA CARRERA 65 ENTRE CALLE 94 Y 98	1	11	2025
SM-CVO- 20250904- 27063	CALLE 84 ENTRE LA CARRERA 39 Y 41	8	11	2025
SM-CVO-20250908-27078	CALLE 72 ENTRE CRA 43 Y CRA 54 CALZADA OCCIDENTAL (SENTIDO N-S)	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27062	CARRERAS 58 Y 59 ENTRE CALLE 79 Y 84	1	11	2025
SM-COV-20251015-27386	CALLE 77 B ENTRE CRA 70 Y 74, CRA 72 ENTRE CALLE 77B Y 77, CRA 73 ENTRE CALLE 77B Y 77	13	12	2025
SM-CVO-20251015-27385	CRA 44 ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76	14	12	2025
SM-CVO-20251106-27515	CARRERA 26B ENTRE CALLE 76B Y CALLE 78	7	1	2025

Informe No

9

Periodo

1 DE ENERO

al

31 DE ENERO/2026

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

SM-CVO-20251106-27514	CARRERA 21B ENTRE CALLE 76B Y CALLE 78	7	1	2026
-----------------------	--	---	---	------

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Residuos Ordinarios (Kg)		340	38	37	38	39	38	39	37	38	36			
Reciclables	Papel (Kg)	114	10	11	10	12	13	14	15	16	13			
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Poda de Arboles (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Bolsas de Cemento (Kg)	5822	200	360	320	620	809	820	800	850	1043			
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación				1,2					Fcator de Expansión de Demolición					1,3
TIPO DE RESIDUOS m3		TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros		24285,806	1697,52	1745,23	3811,78	3098,784	1322,24	4079,652	2872,91	2314,236	3343,452			
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.		N/A												
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros		9827,01	606,16	489,02	2196,27	1702,58	589,02	1097,84	1037,71	492,87	1615,54			
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		N/A												
Volumen Dispuesto en sitio autorizado		27904,273	2142,24	1931,14	5904,42	4676,7	1911,26	3842,89	3044,34	2021,07	2430,21			
Volumen Reutilizado		6082,527	161,43	303,107	103,63	124,66	0	1208,6	866,28	786,04	2528,78			

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Informe No 9 Periodo 1 DE ENERO al 31 DE ENERO/2026 Proyecto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III.

Contrato de obra LP-026-2024 Contratista UT PAVIMENTOS 2025

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Concreto MR 45 (m3)	3632,398	384,15	225,27	1037,55	0	151,98	1123,45	710					
Concreto MR 39 (m3)	6090,779	108,744	205,64	1718,85	2183,034	294,193			697,7165	882,6015			
Material Seleccionado (m³)	4585,18		188,2	566,82	198,34	159,55	403,92		2589,38	478,97			
Concreto 3000 PSI	451,31	0,64	26,19	145,42	87,98		57,43		57,79	75,86			
Triturado 3/4	286,42	17,55	49,32	58,71	72,94	8,00	19,04		42,58	60,86			
Concreto fluido 1500 PSI	4143,172	296,18	160,88	1118,25	921,6915	475,0335	678,04	145	120,501	227,85			
Suelo Cemento (m³)	3945,144	161,3	213,22	1079,69	1071,322		106,22	164,98	927,152	221,26			
Arena	37,78			4,68	4,68		28,42						
Productos Quimicos		Antisol	Antisol ACPM Gasolina	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Eucobar	Antisol ACPM Gasolina Eucobar			

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Cantidad de puntos de acopio de materiales	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
Humectación (m³)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60			
Cantidad de vehiculos en obra	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Cantidad de Maquinaria	9,222222222	4	4	4	4	15	15	14	14	9			
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	23	2	2	3	3	4	3	2	2	2			

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tala de Árboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Poda de Árboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Consumo de Agua (m³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Consumo de Energia Electrica (Kw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de baños en obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Informe No

9

Periodo

1 DE ENERO

al

31 DE ENERO/2026

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

Cantidad de Aseos a baños portátiles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de Puntos Ecologicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL																											
INDICADORES		TOTAL		2025								2026												2027			
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	8 AL 30 MAY	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb		
Manejo de emision de material particulado y ruido	# de vehiculos inspeccionados		4,0	3	4	3	4	4	4	6	4	4															
	# de Vehiculos ingresados en los frentes de trabajo		4,0	3	4	3	4	4	4	6	4	4															
	Manejo de emisiones de material particulado y ruido		100%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>															
Manejo de residuos de construccion y demolicon	Cantidad de RCD dispuestos con empresa gestora	27904,27	3100,5	2142	1931	5904	4677	1911,26	3842,89	3044	2021	2430															
	Cantidad de RCD generados	34112,816	3790,3	2304	2234	6008	4801	1911	5177	3911	2807	4959															
	Manejo de residuos de construccion y demolicon	82%	82%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>														
Manejo de residuos solidos convencionales y peligrosos	Cantidad de residuos aprovechables generados	114	12,7	10	11	10	12	13	14	15	16	13															
	Cantidad de residuos ordinarios generados	340	37,8	38	37	38	39	38	39	37	38	36															
	Manejo de residuos solidos convencionales y peligrosos	34%	34%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>														
Charlas y capacitaciones en temas ambientales	# de charlas realizadas	22		3	2	2	3	2	2	2	3	3															
	# charlas programadas	36		4	4	4	4	4	4	4	4	4															
	Manejo de aguas superficiales	61%		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>														
Manejo de materiales de construccion	M3 de material petreo utilizado	4909,56		636	880		0	0	637	798	398	1560															
	M3 de material petreo certificado	3916,71		597	304		1703	589	335	240	94,5	55,3															
	Manejo de materiales de construccion	125%		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		0%	0%	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>														
Manejo de residuos liquidos, productos de la utilizacion de baños	# de aseo realizado a los baños portátiles			0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	# de aseo programados a los baños portátiles			0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Manejo de residuos liquidos, productos de la utilizacion de baños			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															
Injuncionamiento y slamiento de amentos	# medidas ambientales realizadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	# de medidas ambientales programadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0															

Informe No	<u>9</u>	Periodo	<u>1 DE ENERO</u> al <u>31 DE ENERO/2026</u>	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III'.
Contrato de obra		LP-026-2024		UT PAVIMENTOS 2025	
		Contratista			

[illegible]

4. OBSERVACIONES

Para el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de julio del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el Volumen dispuesto en el proyecto esde 5904.42 m3, la generacion de este periodo fue de 6008.06 m3 con una eficiencia de aprovechamiento del 98%

Para el periodo de agosto 2025, se aprovecharon en obra 124,66 m3 de material de excavación, se dispusieron 2974,13 m3 y 1702,58 m3 de petreos, realizando la simbiosis industrial para el proyecto MIRADOR DE LA SABANA con una eficiencia de aprovechamiento del 97%

Entre el 1 al 30 de septiembre del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el volumen dispuesto en el periodo 1322,24 m3 de excavacion y 589,02 m3 de petreos

Para periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre. Se aprovecharon en obra 571,34 m3 de material de excavación y 637,26m3 de material de demolición. Se aprovecharon (simbiosis industrial) 3508,31 m3 excavación y 334,58m3 de pétreos. para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Entre el 1 al 30 de noviembre del 2025 se aprovecharon en obra 68,53 m3 de material de excavación y 797,75 m3 de material de demolición. Se aprovecharon (simbiosis industrial) 2804.38 m3 excavación y 239.96 m3 para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Para este periodo comprendido del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, se aprovecharon 387,65m3 de material de excavacion y 398,39 m3 de demolicion, se dispusieron 1926,59 m3 excavacion y 94,48 m3 demolicion realizando la simbiosis industrial para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Para el periodo de enero 2026, se aprovecharon en obra 968,52 m3 de material de excavacion y 1560,26 m3 de demolicion, se dispusieron 2374,93 m3 de excavacion y 55,28 m3 de demolicion realizando simbiosis industrial para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

5. ANEXOS

No	Descripción			Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos			
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado			
SST-3	Registros de ATS			
SST-4	Certificados de trabajos en altura			
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad			
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo			
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social			
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social			
SST-9	Registro fotográfico			
SST-10	Otros anexos	(Especificar cual)		

No	Descripción			Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos			
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD			
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD			
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda			
AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo			
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos			
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos			
AMB-8	Inventario forestal			
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones			
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos			

Firma _____
Nombre LOANA BONIVENTO CABRERA
Responsable del área ambiental
Contratista

Firma 
Nombre LOANA BONIVENTO CABRE
Responsable del área SST
Contratista

Firma E. Yalcin
Nombre _____
Responsable del área ambiental
Interventoría _____

Firma	Firma en original
Nombre	ROSA ELENA CARDENAS
Responsable del área SST	
Interventoría	

DATOS BASICOS DEL RECEPTOR		
Nombre o razón social	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
NIT	830504499-6	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección	Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal	
Teléfono:	3013789801	
Correo electrónico:	recepcion@jsingc.com	
Municipio o distrito	Sabanalarga	
DATOS BASICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental del proyecto	En gestión	
Nombre o razón social	UT PAVIMENTOS 2025	
Documento de identificación o NIT	9 0 1 9 4 3 0 5 3-5	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección domicilio	Carrera 65 # 84-162	
Teléfono	3212446743	
Correo electrónico	utpavimentos2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Frentes de obra	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	Cantidad de RCD Entregados por el generador (M3)	Tipo de aprovechamiento
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	2374,93	Relleno del terreno
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás		
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	55,28	Relleno del terreno
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
Total de RCD recibidos(M3)	2430,21	
Fecha de recepción de los RCD	30 de Enero del 2026	

Notas:

1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.
2. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental y copia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Cordialmente,



Firma: (Receptor – Representante Legal)

Nit: 830504499-6

NOMBRE: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado)

C.C. 32.774.321 Bquilla

No. Tarjeta Profesional: 08236120601ATL

NOMBRE: LOANA NIVENTO CABRERA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Yo, **JOSE JULIAN SAADE CURE** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.001.818.920 de Barranquilla en calidad de Representante Legal de la empresa **JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 1257 de 2021, a continuación, autodeclaro mi calidad de receptor para el aprovechamiento de los RCD con finalidad de relleno y/o adecuación del terreno, los cuales fueron generados por la empresa contratista **UT PAVIMENTOS 2025** con NIT.901943053-5.

Los RCD fueron generados en el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, en el desarrollo del proyecto **OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III**". de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) manifestando que los datos expuestos son reales y están debidamente diligenciados y sustentados mediante anexos fotográficos que hacen parte de la presente.

**Firma del Receptor****Nit: 830504499-6****Nombre: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS****Firma Profesional Ambiental****CC. 32.774.321 Barranquilla****N° Tarjeta Profesional: 08236120601ATL****Nombre: LOANA BONIVENTO CABRERA****Ciudad: Sabanalarga****Fecha: 30 de enero del 2026****Dirección: Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal****Cantidad RCD aprovechada: 2430,21 m3**
