
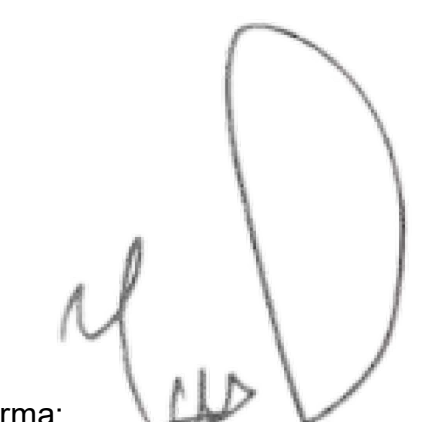

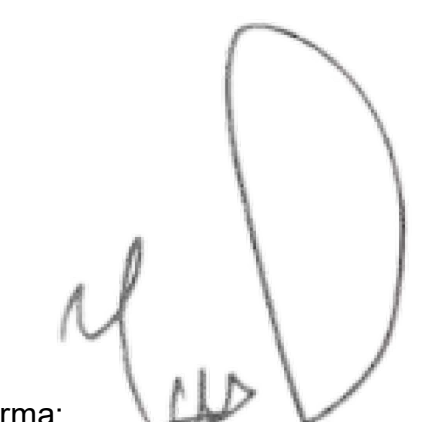

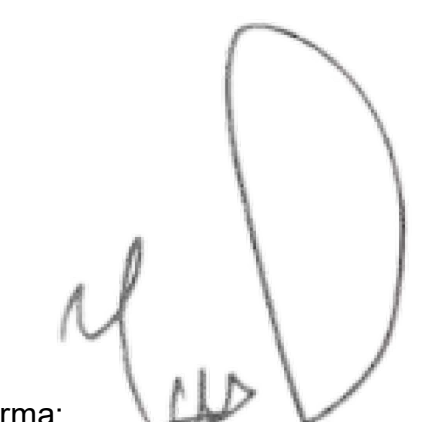


<div></div>				<div>FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</div>				<div>CÓDIGO MA-GP-FR-038</div>														
				<div>VERSIÓN 1,00</div>																		
				<div>FECHA 6/11/2025</div>																		
				<div>FECHA (07/09/2026)</div>																		
<div>DEPENDENCIA: Subdirección de Caminos vecinales - ICCU</div>				<div>ACTA No. 2</div>		<div>VALOR BÁSICO ACTA: \$ 277.093.880,00</div>																
				<div>ACTA FINAL ☐</div>		<div>MES ABRIL</div>																
<div>CONTRATO No.: 139-2025 (Indique número y año)</div>				<div>PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal)</div>																		
<div>OBJETO: Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en las provincias de Ubaté, Almeida y Rionegro, en el departamento de Cundinamarca</div>				<div>PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)</div>																		
<div>CONTRATISTA: Consorcio YYY (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)</div>				<div>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/04/2025 (Indique día/mes/año)</div>																		
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 050</div>				<div>FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/05/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</div>																		
<div>INTERVENTOR: Consorcio interval ICCU 050</div>				<div>FECHA DE REANUDACIÓN: 17/09/2026 (Indique día/mes/año)</div>																		
				<div>VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 34.436.321.680,00 (Según contrato principal)</div>		<div>VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -</div>																
				<div>VLADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 34.436.321.680,00</div>																		
No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 24/08/2026			OBRA EJECUTADA											
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO									
		DESCRIPCIÓN ÍTEM						UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
PROVINCIA DE UBATÉ																						
PRELIMINARES																						
1	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	93789,00	\$	2.125,00	\$	199.301.625,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																						
2	3,15	311,1		AFIRMADO	M3	246,00	\$	106.997,00	\$	26.321.262,00	64,17		\$	6.965.997,00		\$	-	0,00	\$	-		
3	1,1	201 P		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	105,00	\$	260.204,00	\$	27.321.420,00	0,00		\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
4	APU 1			REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	60,00	\$	85.750,00	\$	5.145.000,00	67,00		\$	5.745.250,00		\$	-	66,95	\$	5.740.963,00		
5	2,13	600,4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	417,00	\$	76.770,00	\$	32.013.090,00	124,00		\$	9.519.480,00		\$	-	123,55	\$	9.484.934,00		
6	2,9	600,1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	883,00	\$	34.452,00	\$	30.421.116,00	652,00		\$	22.462.704,00		\$	-	417,38	\$	14.379.576,00		
MANTENIMIENTO RASANTE																						
7	APU 2			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	5146,00	\$	79.478,00	\$	408.993.788,00	5146,00		\$	408.993.788,00		\$	-	0,00	\$	-		
8	APU 3			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) - (Material puzolánico (D-STBWAY, 3% de cemento y suelo in situ)	M3	5146,00	\$	206.074,00	\$	1.060.456.804,00	5146,00		\$	1.060.456.804,00		\$	-	0,00	\$	-		
9	APU 4			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	1286,00	\$	303.192,00	\$	389.904.912,00	1286,00		\$	389.904.912,00		\$	-	0,00	\$	-		
10	APU 5			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1286,00	\$	113.900,00	\$	146.475.400,00	1286,00		\$	146.475.400,00		\$	-	0,00	\$	-		
11	APU 6			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1286,00	\$	262.268,00	\$	337.276.648,00	1286,00		\$	337.276.648,00		\$	-	0,00	\$	-		
12	APU 7			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	1286,00	\$	56.889,00	\$	73.159.254,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
13	APU 8			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	229.362,00	\$	294.959.532,00	1286,00		\$	294.959.532,00		\$	-	0,00	\$	-		
14	APU 9			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	179.229,00	\$	230.488.494,00	895,3364348		\$	160.470.254,00		\$	-	0,00	\$	-		
15	APU 10			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	157.229,00	\$	202.196.494,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
16	APU 11			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	157.229,00	\$	202.196.494,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
17	APU 12			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	133.869,00	\$	172.155.534,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
18	APU 13			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	29.697,00	\$	38.190.342,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
19	APU 14			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	58.175,00	\$	74.813.050,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
20	APU 15			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	\$	250.009,00	\$	321.511.574,00			\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
21	3,16			TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	18009,00	\$	32.939,00	\$	593.198.451,00	53369,00		\$	1.757.921.491,00		\$	-	0,00	\$	-		
ALCANTARILLAS																						
22	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	64,00	\$	879.228,00	\$	56.270.592,00	21,00		\$	18.463.788,00		\$	-	20,94	\$	18.411.034,00		
23	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	40,00	\$	1.062.546,00	\$	42.501.840,00	75,00		\$	79.690.950,00		\$	-	52,99	\$	56.304.313,00		
24	4,24	630,6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	60,00	\$	546.629,00	\$	32.797.740,00	6,00		\$	3.279.774,00		\$	-	5,38	\$	2.940.864,00		
25	4,52	640,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	12625,00	\$	9.922,00	\$	125.265.250,00	8172,00		\$	81.082.584,00		\$	-	8165,09	\$	81.014.023,00		
26	4,23	610,1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	158,00	\$	118.628,00	\$	18.743.224,00	234,00		\$	27.758.952,00		\$	-	222,35	\$	26.376.343,00		
27	4,48	661,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	60,00	\$	1.074.206,00	\$	64.452.360,00	0,00		\$	-		\$	-	0,00	\$	-		
28	APU 16			CUNETAS EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0,75MM	M	16422,00	\$	48.388,00	\$	794.627.736,00	26393,00		\$	1.277.104.484,00		\$	-	0,00	\$	-		
29	6,5	801,1		ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	11,00	\$	911.724,00	\$	10.028.964,00	11,00		\$	10.028.964,00		\$	-	0,00	\$	-		
30	6,2	801,6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	13,00	\$	276.929,00	\$	3.600.077,00	48,00		\$	13.292.592,00		\$	-	48,00	\$	13.292.592,00		
31	6,6	801,4		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	\$	2.984,00	\$	24.170.400,00	8100,00		\$	24.170.400,00		\$	-	0,00	\$	-		
	NP-01			GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (UBATÉ)	M3		\$	242.056,00	\$	-	15,00		\$	3.630.840,00		\$	15,10	\$	3.655.046,00	15,10	\$	3.655.046,00
	NP-04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (UBATÉ)	M		\$	1.074.206,00	\$	-	78,00		\$	83.788.068,00		\$	78,00	\$	83.788.068,00	78,00	\$	83.788.068,00

		FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MA-GP-FR-038						
												VERSIÓN		1.00						
												FECHA		6/11/2025						
														FECHA		(24/ 08 / 2026)				
30	6,2	801,6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE	UN	46,00	\$	276.929,00	\$	12.738.734,00	335,00	\$	92.771.215,00	\$	-	21,00	\$	5.815.509,00		
31	6,6	801,4		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	\$	2.984,00	\$	24.170.400,00	8100,00	\$	24.170.400,00	\$	-	0,00	\$	-		
	NP-02			GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (RIONEGR0)	M3		\$	265.451,00	\$	-	208,00	\$	55.213.808,00	58,24	\$	15.459.866,00	58,24	\$	15.459.866,00	
	NP-05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (RIONEGR0)	M		\$	1.155.456,00	\$	-	299,00	\$	345.481.344,00	87,50	\$	101.102.400,00	87,50	\$	101.102.400,00	
MUROS																				
32	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	105,00	\$	997.397,00	\$	104.726.685,00	105,00	\$	104.726.685,00	\$	-	0,00	\$	-		
33	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	105,00	\$	1.185.364,00	\$	124.463.220,00	105,00	\$	124.463.220,00	\$	-	0,00	\$	-		
34	4,24	630,60		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	18,00	\$	660.135,00	\$	11.882.430,00	18,00	\$	11.882.430,00	\$	-	0,00	\$	-		
35	4,23	610,10		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	290,00	\$	135.827,00	\$	39.389.830,00	290,00	\$	39.389.830,00	\$	-	0,00	\$	-		
36	4,22	673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	18,00	\$	256.246,00	\$	4.612.428,00	18,00	\$	4.612.428,00	\$	-	0,00	\$	-		
37	4,42	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	255,00	\$	16.010,00	\$	4.082.550,00	255,00	\$	4.082.550,00	\$	-	0,00	\$	-		
38	3,11	0		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	150,00	\$	53.895,00	\$	8.054.250,00	150,00	\$	8.054.250,00	\$	-	0,00	\$	-		
39	4,32	640,10		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	14860,00	\$	10.674,00	\$	158.615.640,00	12460,03	\$	132.998.378,00	\$	-	0,00	\$	-		
				SUBTOTAL PROVINCIA DE RIONEGR0				\$	16.744.625.691,00			\$	16.744.625.691,00	\$	116.562.266,00		\$	261.743.957,00		
												\$	-		\$	-				
				PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)				\$	181.896.592,00			\$	181.896.592,00	\$	2.771.773,00		\$	5.543.546,00		
				* PAGA (GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL)				\$	287.536.530,00			\$	287.536.530,00	\$	-		\$	-		
				* CARACTERIZACIÓN VIAL Y ENSAYOS				\$	1.451.702.415,00			\$	1.451.702.415,00		0,75		\$	1.089.776.811,25		
				VALOR TOTAL RIONEGR0				\$	16.665.761.228,00			\$	16.665.761.228,00	\$	119.334.039,00		\$	1.356.064.314,25		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																				
PROVINCIA DE ALMEIDAS																				
PRELIMINARES																				
1	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	95238,00	\$	2.125,00	\$	202.380.750,00	5545,53	\$	11.784.251,00	\$	-	0,00	\$	-		
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																				
2	3,15	311,1		AFIRMADO	M3	276,00	\$	137.322,00	\$	37.900.872,00	70,69	\$	9.707.292,00	\$	-	0,00	\$	-		
3	1,1	201 P		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	140,00	\$	260.204,00	\$	36.428.560,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
4	APU 1			REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	80,00	\$	69.213,00	\$	5.537.040,00	81,35	\$	5.630.478,00	\$	-	24,00	\$	1.661.112,00		
5	2,13	600,4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	534,00	\$	76.770,00	\$	40.995.180,00	2510,93	\$	192.764.273,00	\$	-	0,00	\$	-		
6	2,9	600,1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1085,00	\$	34.452,00	\$	37.380.420,00	1109,11	\$	38.210.920,00	\$	-	449,28	\$	15.478.595,00		
MANTENIMIENTO RASANTE																				
7	APU 2			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	6591,00	\$	79.126,00	\$	521.519.466,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
8	APU 3			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	6591,00	\$	205.722,00	\$	1.355.913.702,00	0,00	\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
9	APU 4			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	1648,00	\$	303.509,00	\$	500.182.832,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
10	APU 5			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1648,00	\$	112.732,00	\$	185.782.336,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
	APU 5_v2			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos y Emulsiones Enzimáticas para suelo in situ)	M3					3093,00	\$	298.995,00	\$	924.791.535,00			\$	-		
11	APU 6			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1648,00	\$	260.209,00	\$	428.824.432,00	9757,00	\$	260.209,00	\$	2.538.859.213,00	\$	-	923,78	\$	240.375.870,00
12	APU 7			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	1648,00	\$	56.530,00	\$	93.161.440,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
13	APU 8			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	227.676,00	\$	375.210.048,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
14	APU 9			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	178.860,00	\$	294.761.280,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
15	APU 10			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	156.863,00	\$	258.510.224,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
16	APU 11			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	156.863,00	\$	258.510.224,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
17	APU 12			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	133.518,00	\$	220.037.664,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
18	APU 13			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	29.347,00	\$	48.363.856,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
19	APU 14			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	57.824,00	\$	95.293.952,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
20	APU 15			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	\$	249.434,00	\$	411.067.232,00		\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
21	3,16			TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	18126,00	\$	32.403,00	\$	587.336.778,00	64246,00	\$	2.081.763.138,00	\$	-	0,00	\$	-		
ALCANTARILLAS																				
22	4,60	630,40		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	86,00	\$	921.384,00	\$	79.239.024,00	20,00	\$	18.427.680,00	\$	-	13,56	\$	12.493.967,00		
23	4,70	630,40		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	54,00	\$	1.106.384,00	\$	59.744.736,00	72,00	\$	79.659.648,00	\$	-	36,61	\$	40.504.718,00		
24	4,24	630,60		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	79,00	\$	592.764,00	\$	46.828.356,00	5,00	\$	2.963.820,00	\$	-	5,86	\$	3.473.597,00		
25	4,52	640,10		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	16833,00	\$	9.659,00	\$	162.589.947,00	7526,00	\$	72.693.634,00	\$	-	5177,60	\$	50.010.436,00		
26	4,23	610,10		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	211,00	\$	151.176,00	\$	31.896.136,00	270,00	\$	40.817.520,00	\$	-	161,12	\$	24.357.477,00		
27	4,48	661,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	80,00	\$	1.046.535,00	\$	83.722.800,00	0,00	\$	-	\$	-	0,00	\$	-		
28	APU 16			CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	21036,00	\$	48.109,00	\$	1.012.020.924,00	30412,00	\$	1.463.090.908,00	\$	-	0,00	\$	-		
29	6,50	801,10		ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	14,00	\$	911.724,00	\$	12.764.136,00	10.5020727	\$	132999	\$	-	3,59	\$	3.273.089,00		
30	6,20	801,60		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE	UN	16,00	\$	276.929,00	\$	4.430.864,00	86,00	\$	23.538.965,00	\$	-	42,00	\$	11.631.018,00		
31	6,60	801,40		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	\$	2.984,00	\$	24.170.400,00	16006,00	\$	47.761.904,00	\$	-	0,00	\$	-		
	NP-03			GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (ALMEIDAS)	M3		\$	203.185,00	\$	-	233,00	\$	47.342.105,00	27,53	\$	5.593.683,00	27,53	\$	5.593.683,00	
	NP-06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (ALMEIDAS)	M		\$	1.046.535,00	\$	-	117,00	\$	122.444.595,00	54,41	\$	56.941.969,00	54,41	\$	56.941.969,00	
MUROS																				
32	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	56,00	\$	921.384,00	\$	51.597.504,00		\$	-	\$						

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS										CÓDIGO MA-CP-FR-038																								
											VERSIÓN 1.00																								
											FECHA 6/11/2025																								
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																																			
FECHA (24/ 08 / 2028)																																			
35	4,23	610,10		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	154,00	\$	151.176,00	\$	23.281.104,00																									
36	4,22	673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	10,00	\$	204.345,00	\$	2.043.450,00	10,00																								
37	4,42	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	136,00	\$	14.666,00	\$	1.994.576,00	136,00																								
38	3,11	0		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	80,00	\$	50.111,00	\$	4.008.880,00	79,84																								
39	4,52	640,10		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7925,00	\$	9.659,00	\$	76.547.575,00																									
SUBTOTAL PROVINCIA DE ALMEIDAS							\$	7.739.865.844,00	\$	7.739.865.844,00																									
PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)							\$	84.078.010,00	\$	84.078.010,00																									
* PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)							\$	132.907.929,00	\$	132.907.929,00																									
* CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS							\$	671.019.992,00	\$	671.019.992,00																									
VALOR TOTAL ALMEIDAS							\$	8.627.871.775,00	\$	8.627.871.775,00																									
* PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS							\$	198.000.000,00	\$	198.000.000,00																									
VALOR TOTAL							\$	34.436.321.680,00	\$	34.436.321.680,00																									
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																																			
AIU 35 % Utilidad 2,5 %																																			
<table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 10.330.896.504,00</td><td>30,00%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 1</td><td>\$ 199.712.583,00</td><td>1,93%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 2</td><td>\$ 199.712.583,00</td><td>1,93%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 3</td><td>\$ 199.712.583,00</td><td>1,93%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acta No 1</td><td>\$ 236.081.718,60</td><td>2,29%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 83.128.164,00</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 9.412.548.872,40</td><td>27,33%</td></tr></table>													Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ 10.330.896.504,00	30,00%	Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 1	\$ 199.712.583,00	1,93%	Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 2	\$ 199.712.583,00	1,93%	Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 3	\$ 199.712.583,00	1,93%	Valor Amortizado Acta No 1	\$ 236.081.718,60	2,29%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 83.128.164,00	0,80%	Valor Saldo por Amortizar	\$ 9.412.548.872,40	27,33%
	Valor	%																																	
Valor Anticipo Otorgado	\$ 10.330.896.504,00	30,00%																																	
Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 1	\$ 199.712.583,00	1,93%																																	
Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 2	\$ 199.712.583,00	1,93%																																	
Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 3	\$ 199.712.583,00	1,93%																																	
Valor Amortizado Acta No 1	\$ 236.081.718,60	2,29%																																	
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 83.128.164,00	0,80%																																	
Valor Saldo por Amortizar	\$ 9.412.548.872,40	27,33%																																	
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES																																
*	\$ 180.111.022,00	\$ 96.982.858,00	\$ 277.093.880																																
*																																			
*																																			
*																																			
*																																			
*																																			
*																																			
*																																			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			\$ 277.093.880																																
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 277.093.880 VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 193.965.716																																			
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 193.965.716 VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.																																			
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																			
OBSERVACIONES																																			
NOTAS:																																			
1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																																			
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																																			
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																																			
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																																			
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																																			
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																																			
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																			
Para constancia de lo anterior firman																																			
<table><tr><td>Firma:  Nombre: Yeiner Rafael Sierra Sandoval REPRESENTANTE LEGAL CAMINOS Contratista: Consorcio VVV Matrícula Profesional No.:</td><td>Firma:  Nombre: Claudia Liliana Ramirez Galan REPRESENTANTE LEGAL Interventor: Consorcio Intervial Iccu 050 Matrícula Profesional No.:</td><td>Firma:  Nombre: Cesar Lizano Ponguta GESTOR CONTRATO ICCU-139-2025 LOTE 2 ICCU Matrícula Profesional No.:</td><td>Firma:  Nombre: Luz Angeles Sanabria SUBDIRETORA TECNICA - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES ICCU Matrícula Profesional No.:</td><td>Firma:  Nombre: Yair Esteban Contreras Delgadillo (E) DIRECTOR TECNICO - DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES ICCU Matrícula Profesional No.:</td></tr></table>												Firma:  Nombre: Yeiner Rafael Sierra Sandoval REPRESENTANTE LEGAL CAMINOS Contratista: Consorcio VVV Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Claudia Liliana Ramirez Galan REPRESENTANTE LEGAL Interventor: Consorcio Intervial Iccu 050 Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Cesar Lizano Ponguta GESTOR CONTRATO ICCU-139-2025 LOTE 2 ICCU Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Luz Angeles Sanabria SUBDIRETORA TECNICA - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES ICCU Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Yair Esteban Contreras Delgadillo (E) DIRECTOR TECNICO - DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES ICCU Matrícula Profesional No.:																			
Firma:  Nombre: Yeiner Rafael Sierra Sandoval REPRESENTANTE LEGAL CAMINOS Contratista: Consorcio VVV Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Claudia Liliana Ramirez Galan REPRESENTANTE LEGAL Interventor: Consorcio Intervial Iccu 050 Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Cesar Lizano Ponguta GESTOR CONTRATO ICCU-139-2025 LOTE 2 ICCU Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Luz Angeles Sanabria SUBDIRETORA TECNICA - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES ICCU Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: Yair Esteban Contreras Delgadillo (E) DIRECTOR TECNICO - DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES ICCU Matrícula Profesional No.:																															
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera). Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.																																			
